
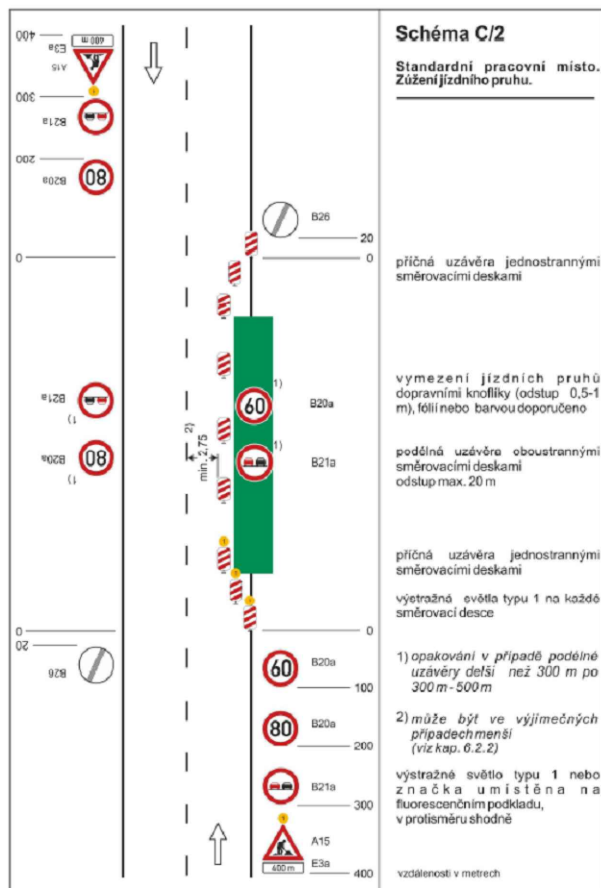


rekonstrukce krytu vozovky v místě najezdu na provizorní komunikaci
dle TP66 schéma C/2

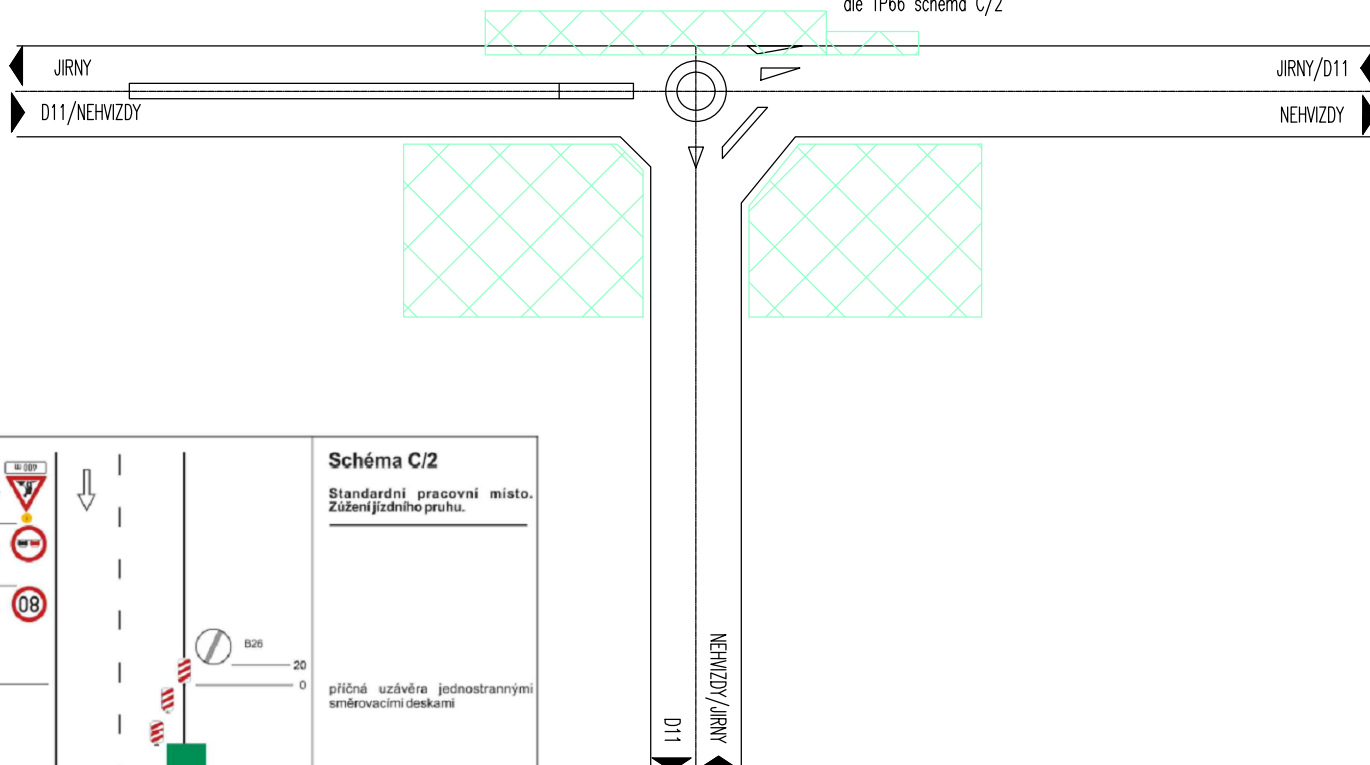


ETAPA 4 – provádění stavební práce:

- odstranění provizorní komunikace v JZ kvadrantu dle TP 66 schéma C/2
- odstranění provizorní komunikace v JV kvadrantu dle TP 66 schéma C/2
- odstranění provizorní komunikace v S kvadrantu dle TP 66 schéma C/2 včetně dobudování nového krytu vozovky v SV části křižovatky
- odfrézování stávajícího vodorovného dopravního značení
- realizace definitivního dopravního značení
- odstranění a rekultivace ploch zařízení staveniště

Doba trvání etapy cca 4 týdny

 pracovní místo v rámci dané etapy



Investor: Lettenmayer & Partner, s.r.o. Zámecká 2, 250 90 Jirny lettenmayer@lettenmayer.cz, Ing. Daniel Janík			
Zpracovatel: Ing. Miroslav Kalina – MKdoprava Mimoňská 628, 190 00 Praha kalina@mkdoprava.cz, www.mkdoprava.cz; 777 073 064			
Akce: Jirny – okružní křižovatka	Datum:		2023.03
	Stupeň:		PDPS
	Měřítko:		1:500
Příloha: Zásady organizace výstavby – ETAPA 4	Číslo přílohy: D.7.4		Souprava:
