


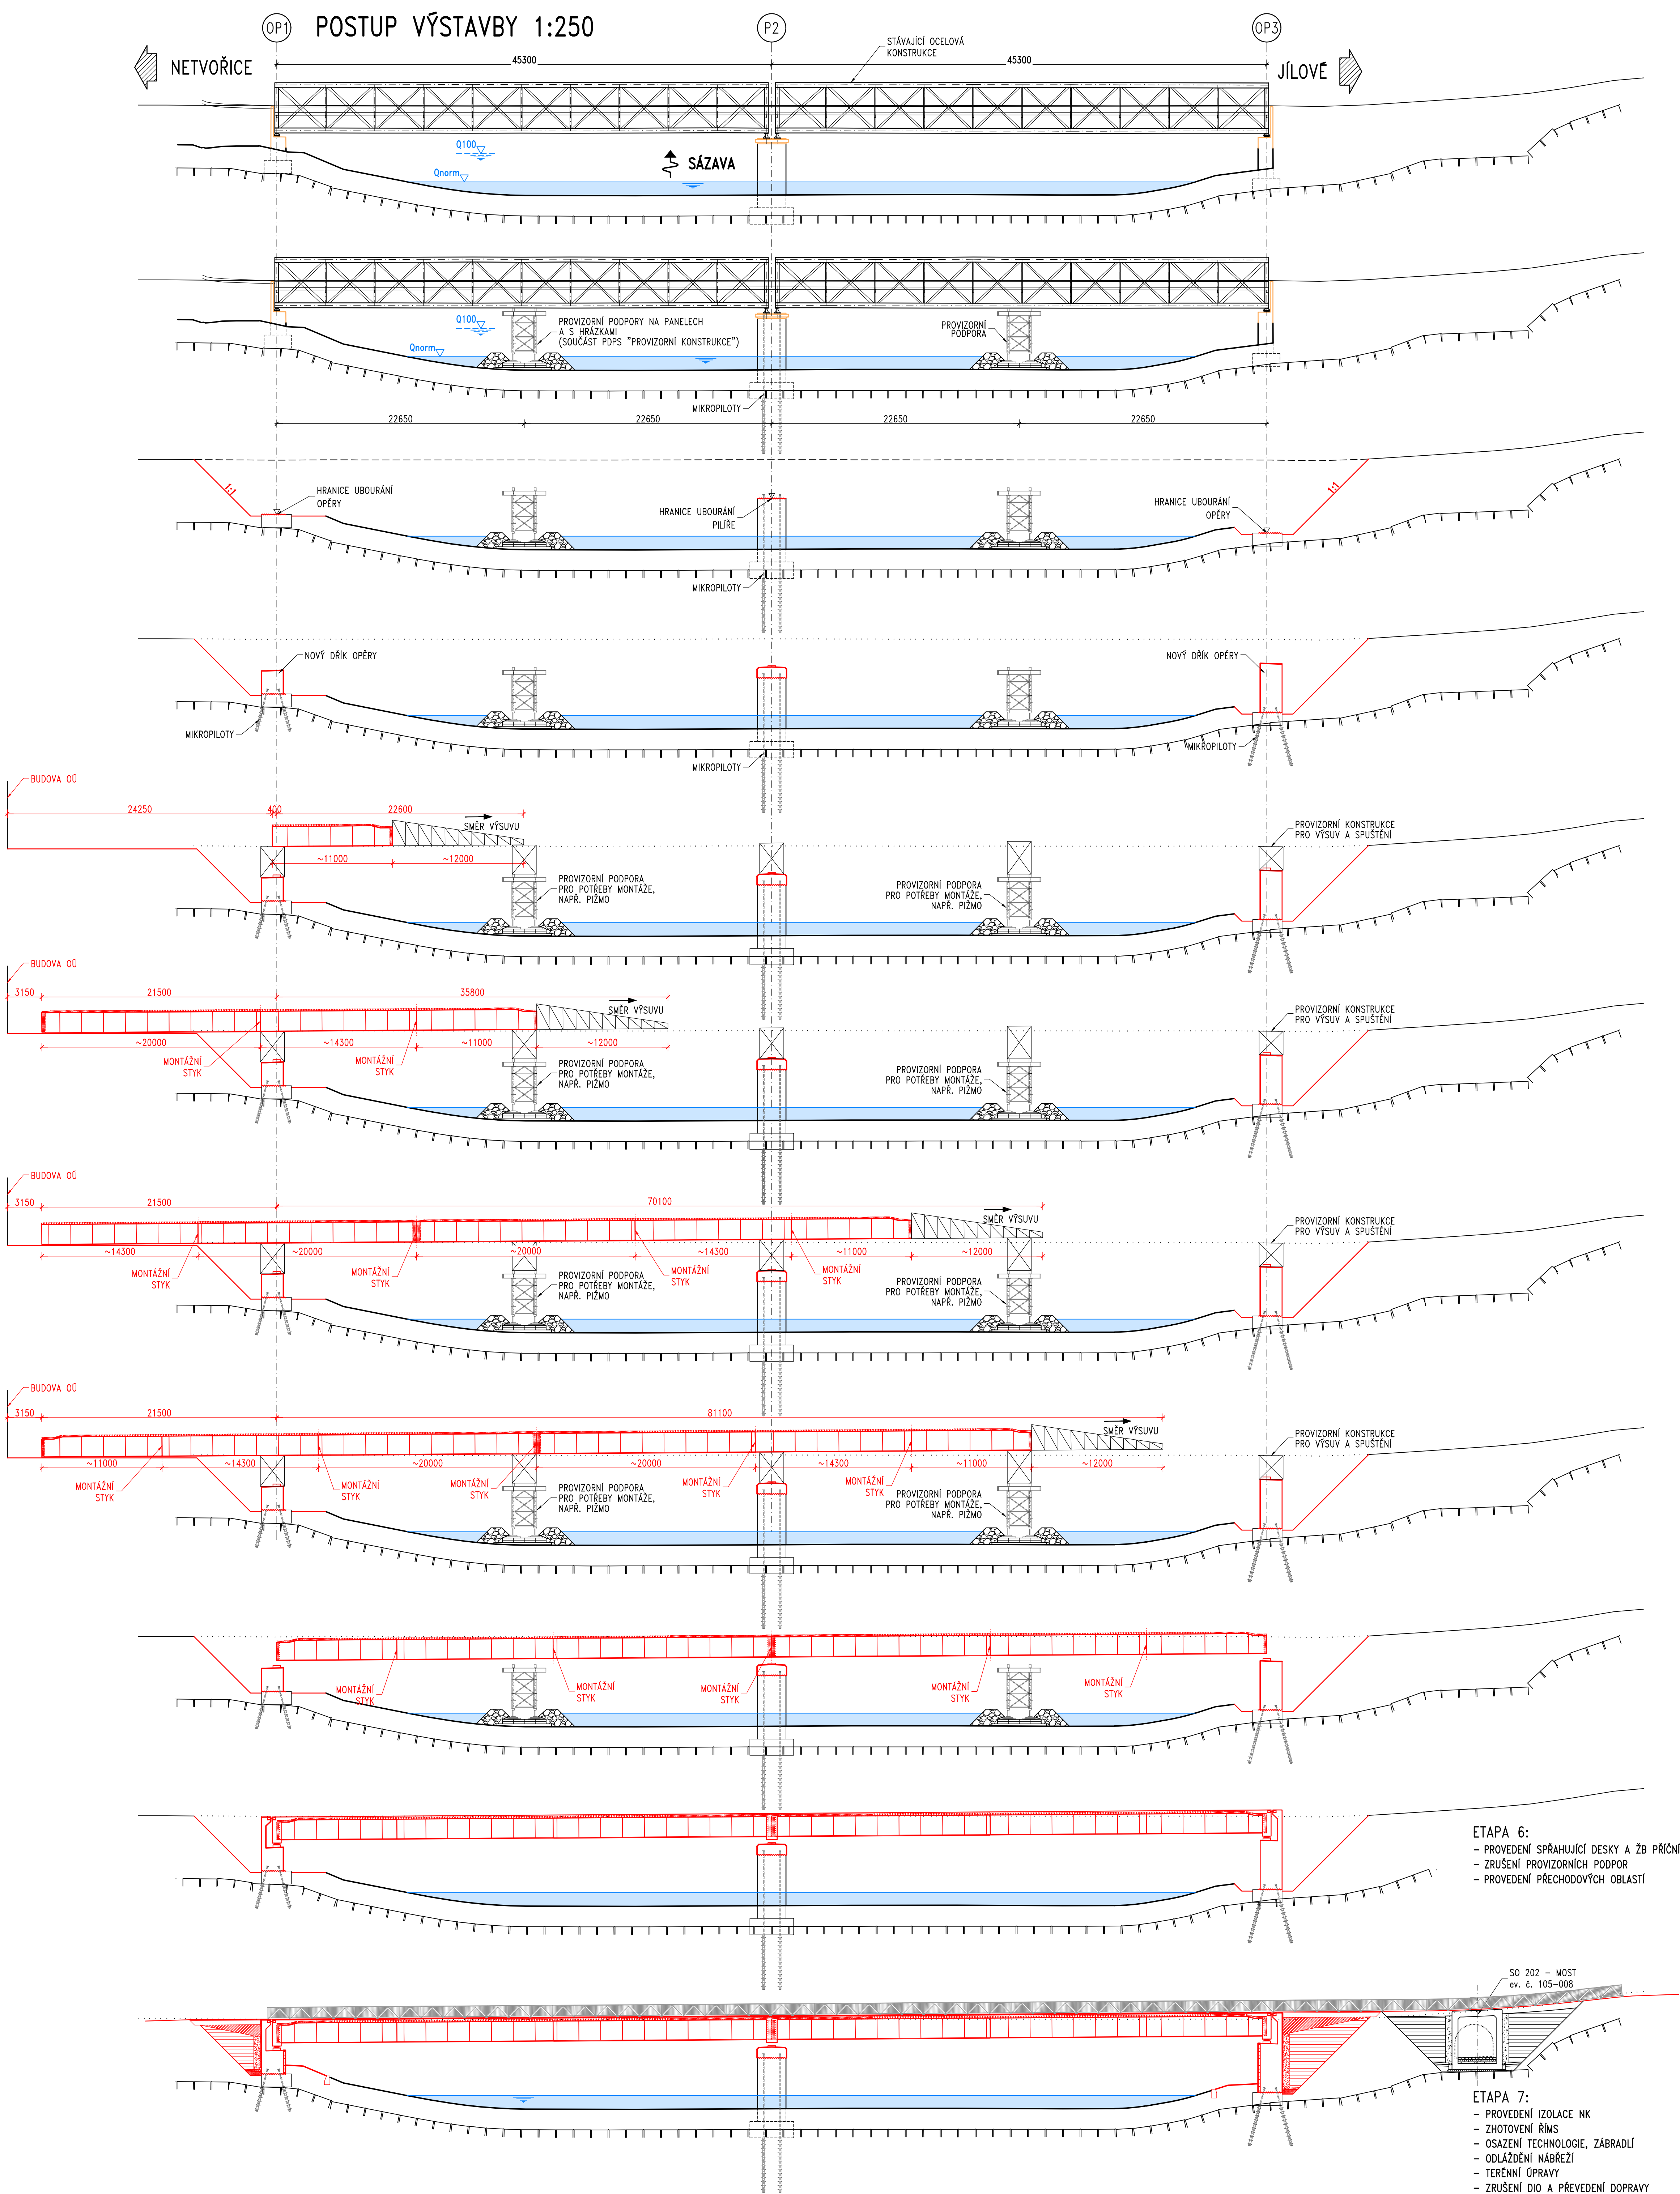

ETAPA 0:
- STÁVAJÍCÍ STAV

ETAPA 1:
- ZŘÍZENÍ PROVIZORNÍCH PODPOR V ZIMNÍM OBDOBÍ
- VRTÁNÍ MIKROPILOT STŘEDNÍHO PILÍŘE ZE STÁVAJÍCÍHO MOSTU

ETAPA 2:
- VYTÝČENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ, OCHRANA SÍTÍ
- ZŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ A DIO
- ODSTRANĚNÍ VOZOVKY A VYBAVENÍ MOSTU
- ODSTRANĚNÍ ISOLACE A VYROVNÁVACÍHO BETONU
- ODDĚLENÍ JEDNOTLIVÝCH NOSNÍKŮ A ODSTRANĚNÍ NK
- UBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH OPĚR
- ČÁSTEČNÉ UBOURÁNÍ PILÍŘE
- PROVEDENÍ VÝKOPŮ
- PROVEDENÍ PŘELOŽEK IS

ETAPA 3:
- PROVEDENÍ MIKROPILOT OPĚR
- NOVÉ DRÁKY OPĚR A OLOŽNÝ PRAH PILÍŘE

ETAPA 4:
- VYSOUVÁNÍ NOSNÉ KONSTRUKCE

ETAPA 5:
- ULOŽENÍ NOSNÉ KONSTRUKCE DO DEFINITIVNÍ POLOHY

Objednatel:		STŘEDOČESKÝ KRAJ		KRAJSKÝ ÚŘAD	
				ZBOROVSKÁ 11, 150 21 PRAHA 5	

Souřadnicový systém S-JTSK, Výškový systém Bpv		Ing. Pavel HRDINA		Ing. Michal CHÓRA	
Číslo zakázky:	20 307 00	HIP:	738662206, phr@pontex.cz		
Schválil:	Ing. Petr SPOUČEK	Zodp. projektant:	Ing. Michal CHÓRA		
Tech. kontrola:	Ing. Jan VESELÝ	Vypracoval:	777598859, chura@pontex.cz		
		Jiří POKORNÝ		Papež, Na Hřebeně 1 178/10, 140 00 tel. +4202482210, email: pji@pontex.cz	

Objednatel:	Středočeský kraj	Obec:	Kamenný Přívoz	Kraj:	Středočeský
Akce:	II/105 Kamenný Přívoz, mosty ev. č. 105-008 a 105-009 přes řeku Sázavu v obci Kamenný Přívoz				
Část:	D. STAVEBNÍ ČÁST				
Objekt:	D.1.2.1 SO 201.2-MOST EV. Č. 105-009 PŘES SÁZAVU				
Příloha:	SCHÉMA POSTUPU VÝSTAVBY				
				Datum:	09/2024
				Stupeň:	PDPS
				Souprava:	Č. přílohy
				2.f	
