

Protokol

o ukončení přerušení prací a stanovení nového termínu dokončení díla

Na základě oznámení ze dne 28.11.2024 došlo v souladu s článkem II odstavec 2.6 a 2.7 Smlouvy o dílo k přerušení prací v zimním období v případě poklesu vnějších teplot pod úroveň, kdy hrozí při betonáži poškození a zhoršení kvality betonovaných částí zdi a povrchových stěrek.

Celkový počet dní, kdy kvůli nepříznivým podmínkám nebylo možné pokračovat v pracích, je v období od 30.11.2024 do 17.3.2025 celkem 97, viz příloha s vývojem teplot. Závazným termínem dokončení stavby je tedy středa **30.4.2025**.

Dne: 18.3.2025



.....

Za dodavatele
Ing. Zdeněk Habáň
HaServices s.r.o.
se sídlem Huštěnovice 367, 68703 Huštěnovice


Dne: 18.3.2025




.....

Za objednatele
Ing. Václav Bohata
ředitel školy

Únor 2025 27 dnů s teplotním režimem do +5°C

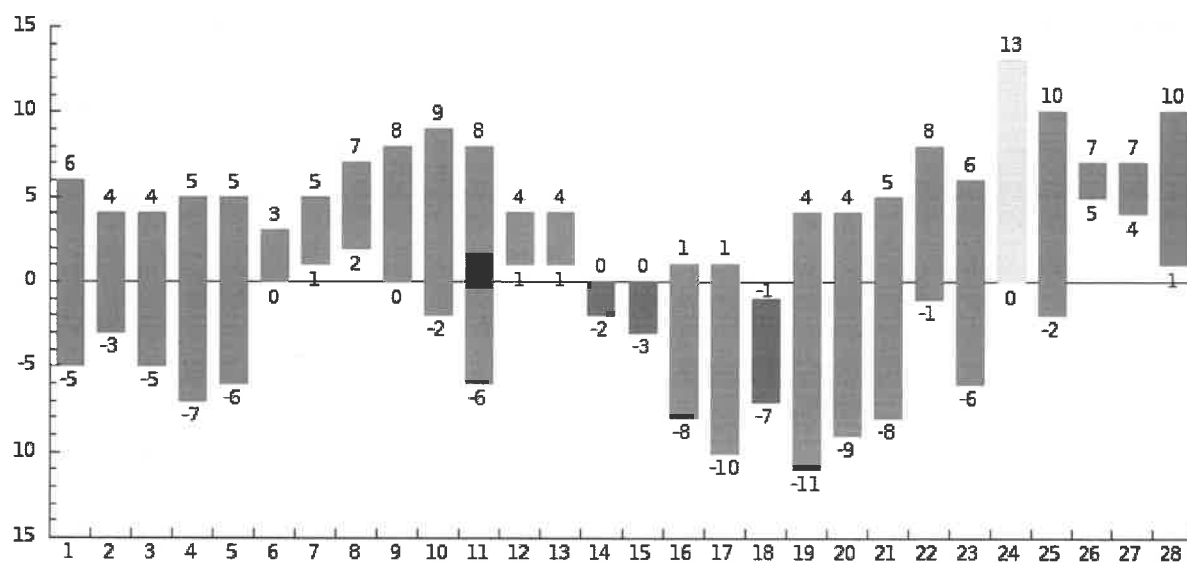

Březen 2025 13 dnů s teplotním režimem do +5°C

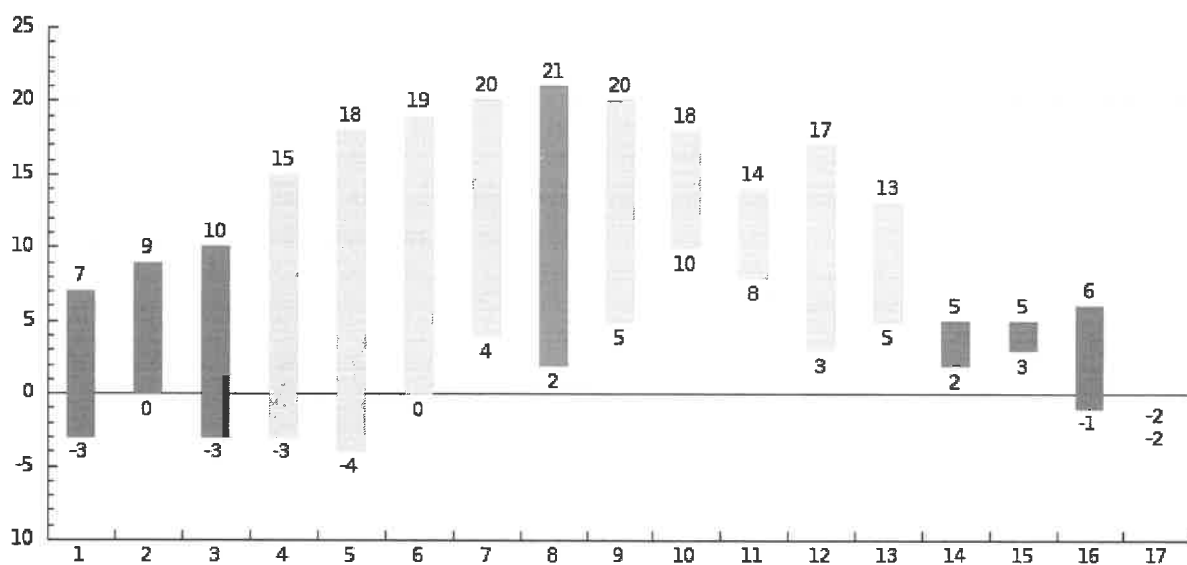

Celkem30+27+27+13 = 97 dnů
