

MODELOVÉ SCHÉMA - ETAPA 1


3 týdny

Probíhající práce

- vytyčení inženýrských sítí na mostě a provedení jejich přeložky protlakem pod dálnicí D11
- po celou dobu výstavby bude zachován přístup k pozemkům dotčených stavbou

Dopravní omezení

- na dálnici D11 bez dopravního omezení
- na silnici II/101 při provádění přeložek případné zúžení jízdních pruhů nebo zavedení střídavého provozu

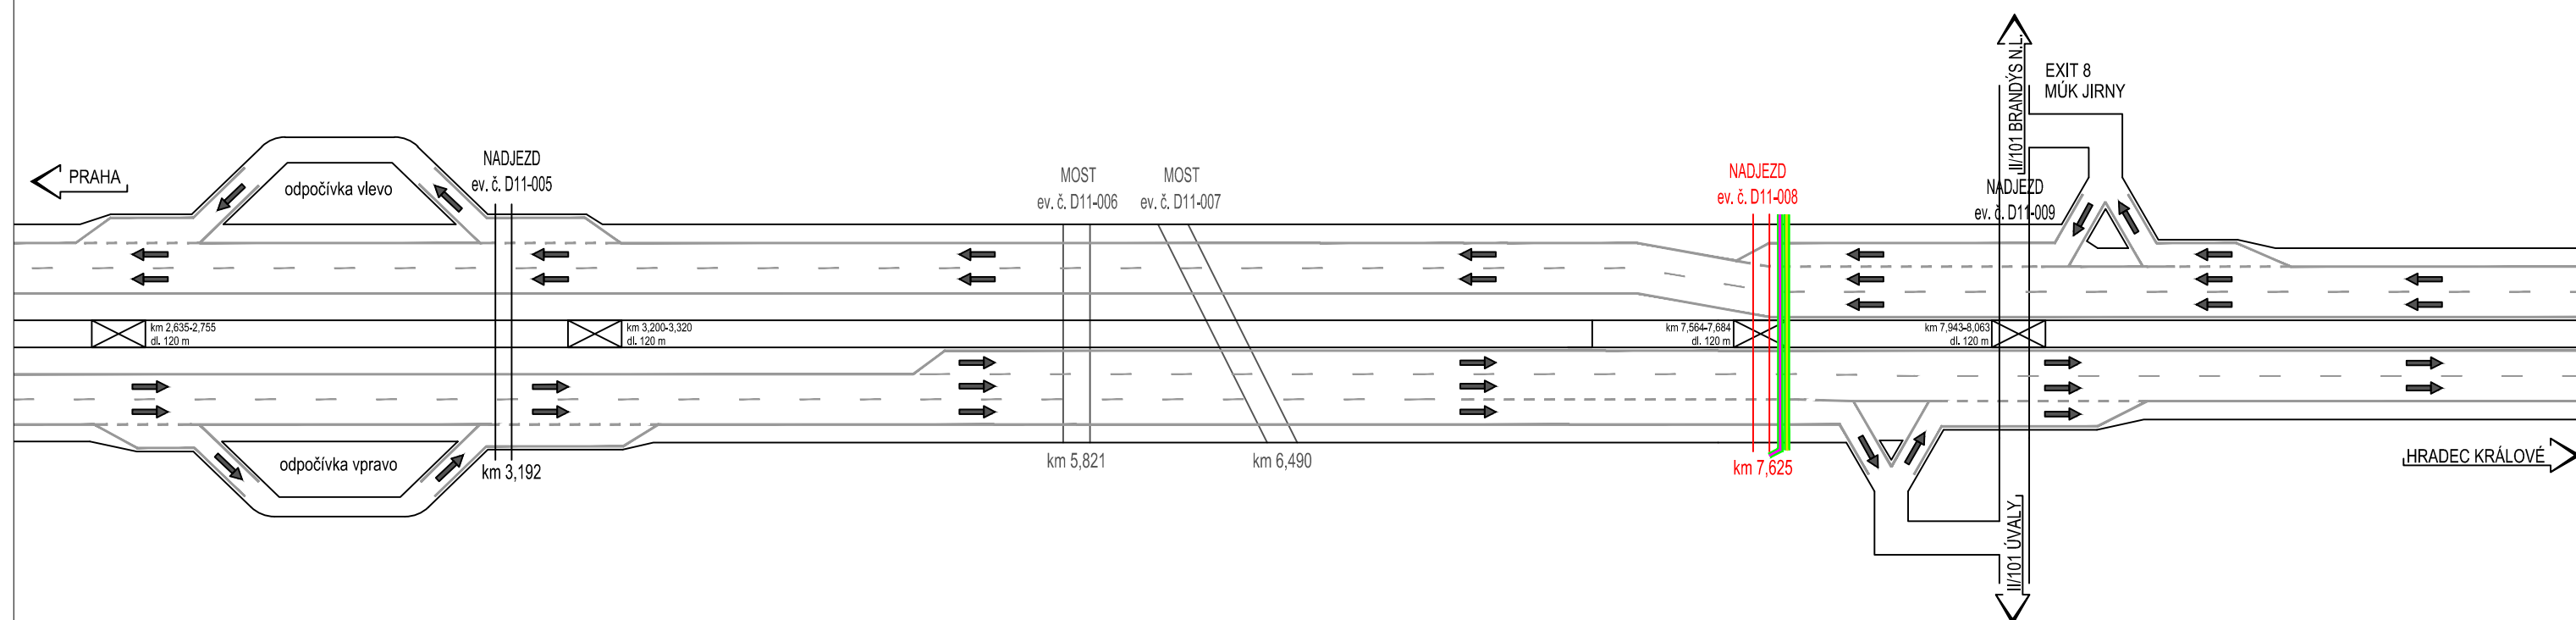

MODELOVÉ SCHÉMA - ETAPA 2a



6 hodin

Probíhající práce

- přípravné práce na snesení mostu

Dopravní omezení

- dlouhodobé uzavření mostu ev.č. 101-075A (nadjezd ev.č. D11-008) na silnici II/101 s několikaenním předstihem před touto etapou, vyznačení objízdné trasy
- v místě nadjezdu na D11 veden provoz v režimu 1+1

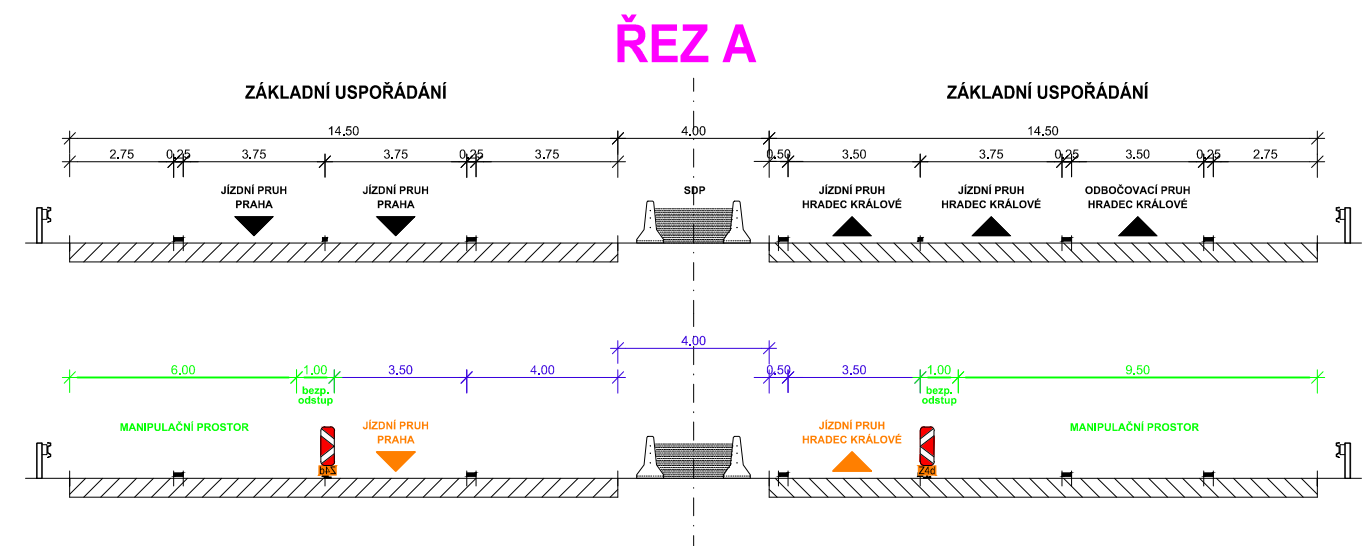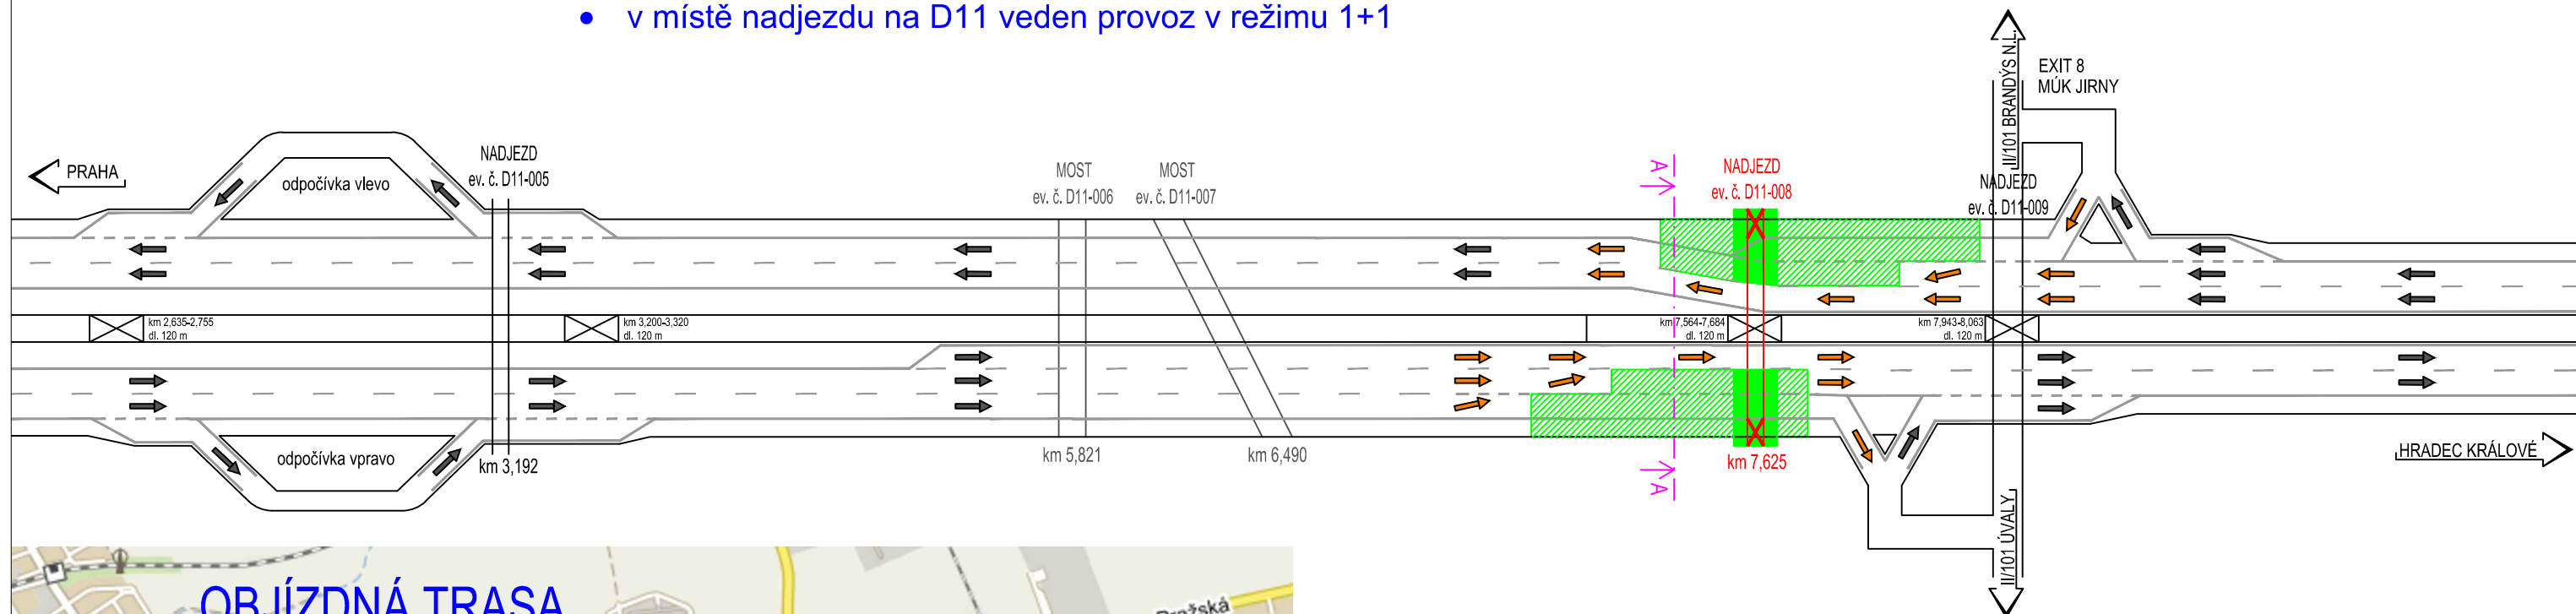

MODELOVÉ SCHÉMA - ETAPA 2b


14 hodin

Probíhající práce


- uzavírka dálnice D11 mezi exity 1 až 8 na dobu max. 14 hodin v noci ze soboty na neděli
- dokončení přípravných prací - zřízení ochranné vrstvy pod mostem, dočasná demontáž svodidla na přejezdu v SDP
- následné snesení mostu a jeho odstranění z dálnice včetně ochranné vrstvy vozovky, zpětná montáž svodidla v SDP

Dopravní omezení

- doprava vedena po objízdných trasách
 - ve směru na Hradec Králové osobní vozidla z MÚK Běchovice po silnici I/12 + II/113 + II/330 do exitu 25
 - ve směru na Hradec Králové nákladní vozidla z MÚK Běchovice po silnici I/12 + I/38 do exitu 39
 - ve směru na Prahu nákladní vozidla nad 12t vedena z exitu 39 po silnici I/38 + I/12 do MÚK Běchovice
 - ve směru na Prahu osobní vozidla vedena z exitu 8 po silnici II/101 na dálnici D10 (exit 10)

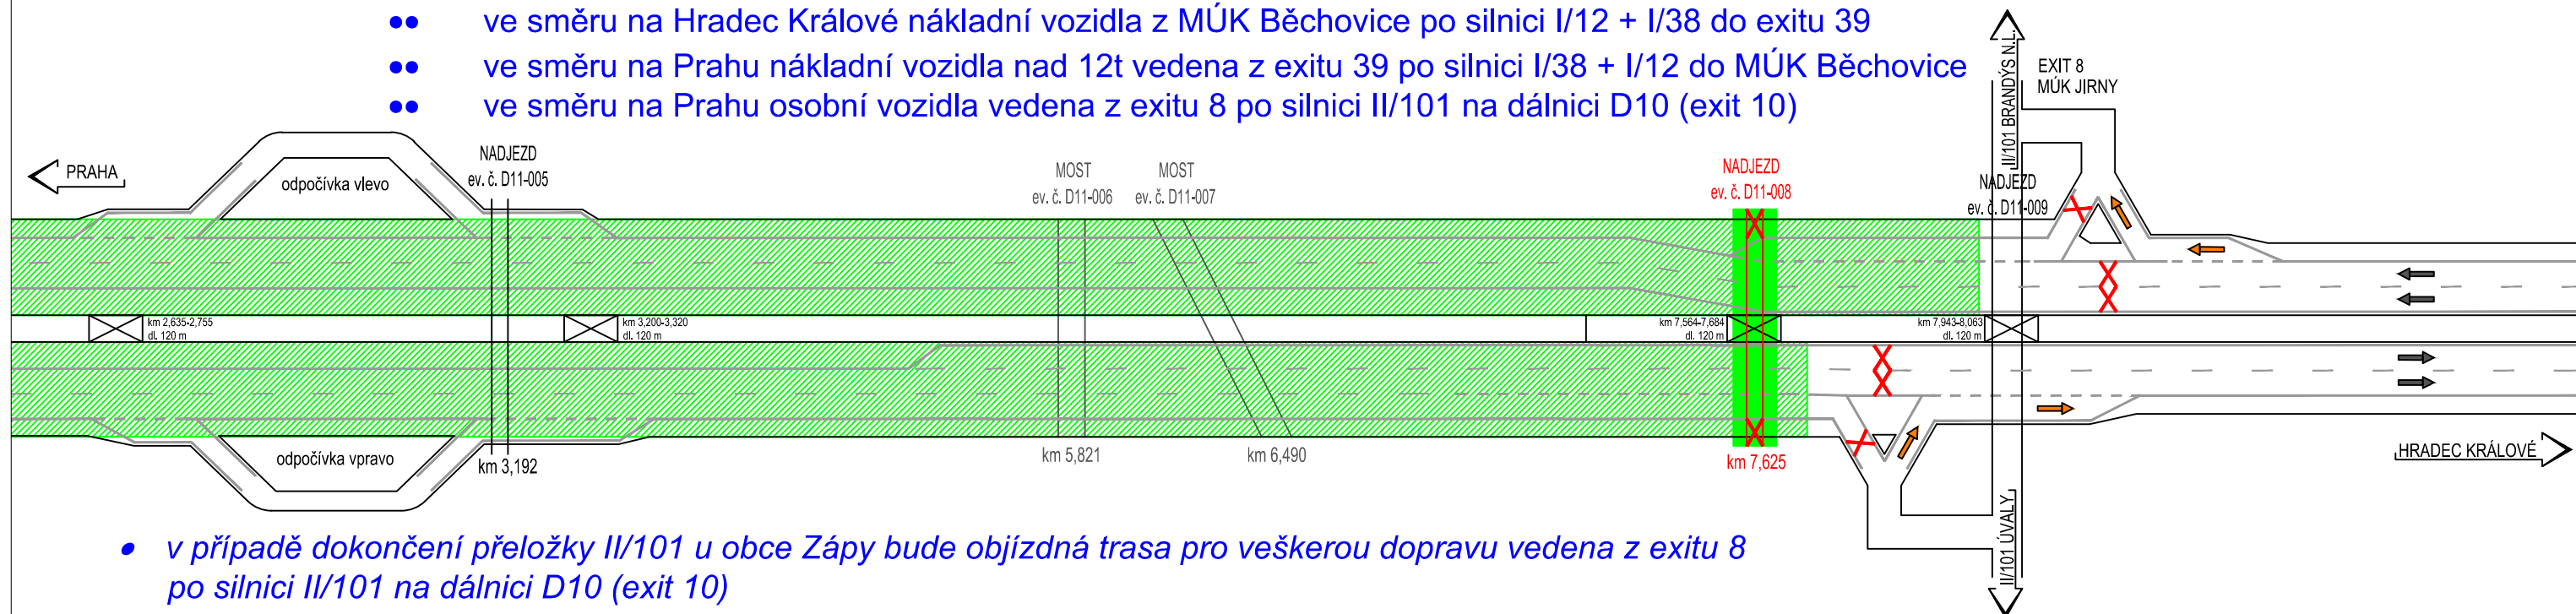

- v případě dokončení přeložky II/101 u obce Zápy bude objízdná trasa pro veškerou dopravu vedena z exitu 8 po silnici II/101 na dálnici D10 (exit 10)

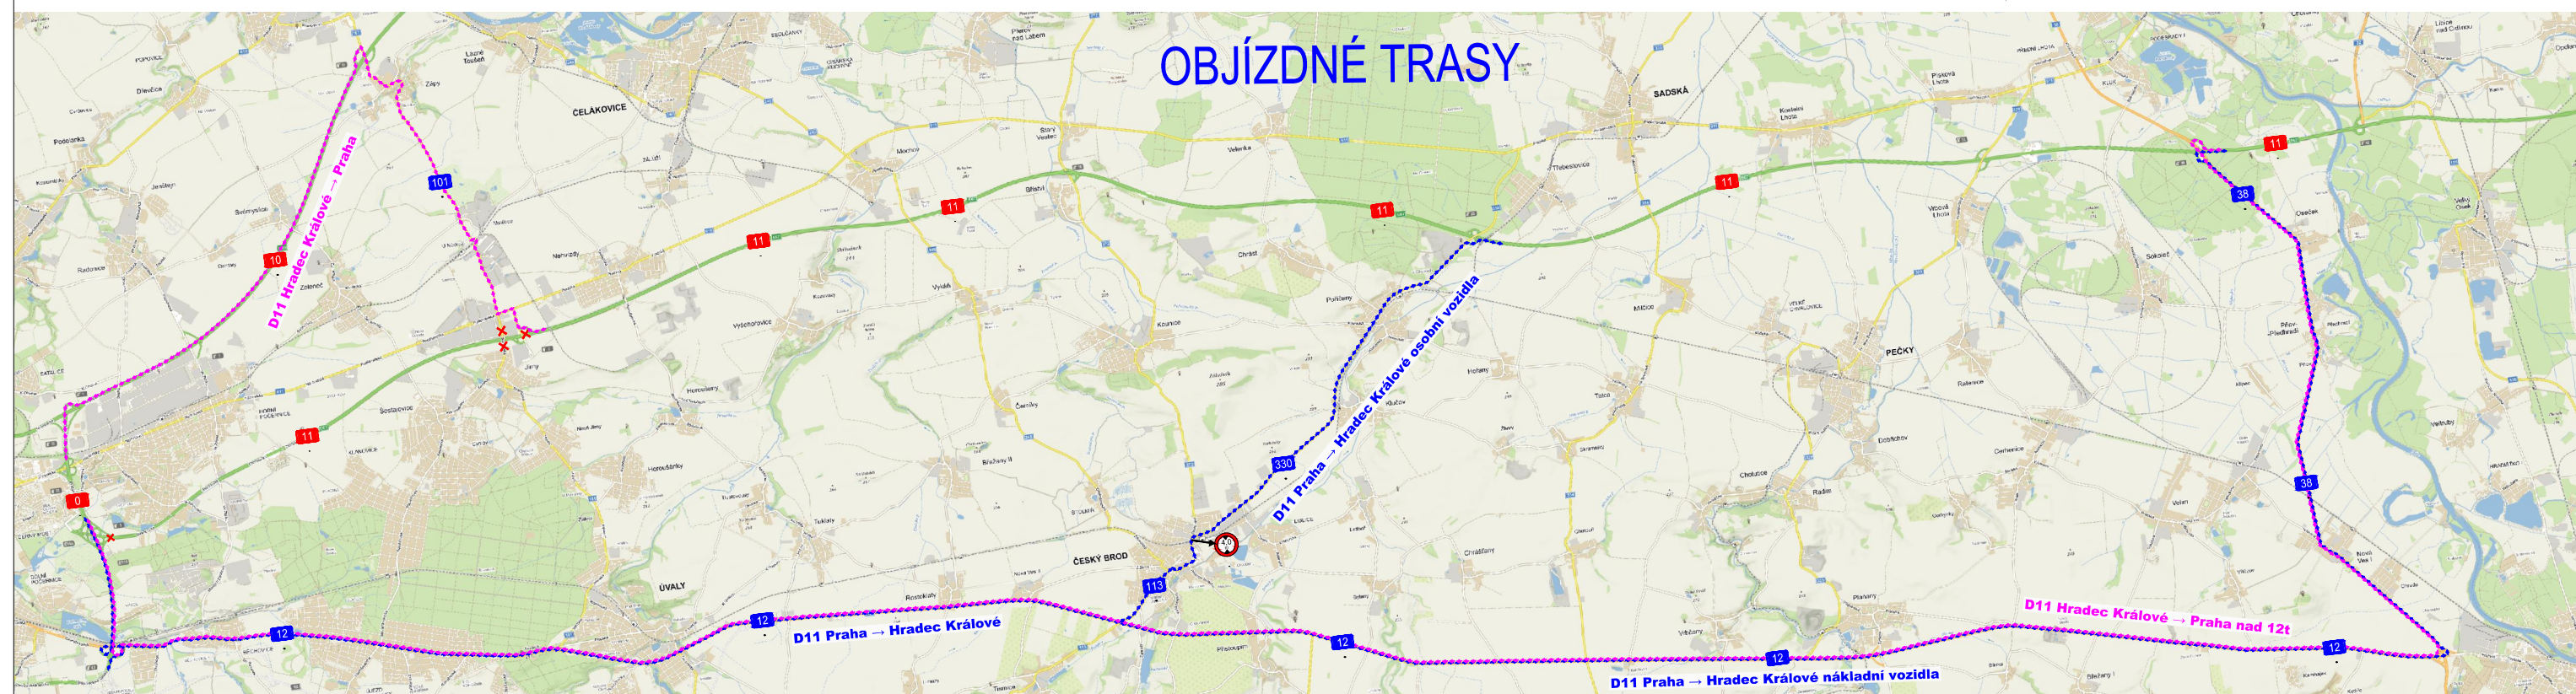

MODELOVÉ SCHÉMA - ETAPA 2c



6 hodin

Probíhající práce

- odstranění zbylých částí snášeného mostu ev.č. 101-075A včetně ochranné vrstvy vozovky

Dopravní omezení

- v místě nadjezdu na D11 veden provoz v režimu 1+1

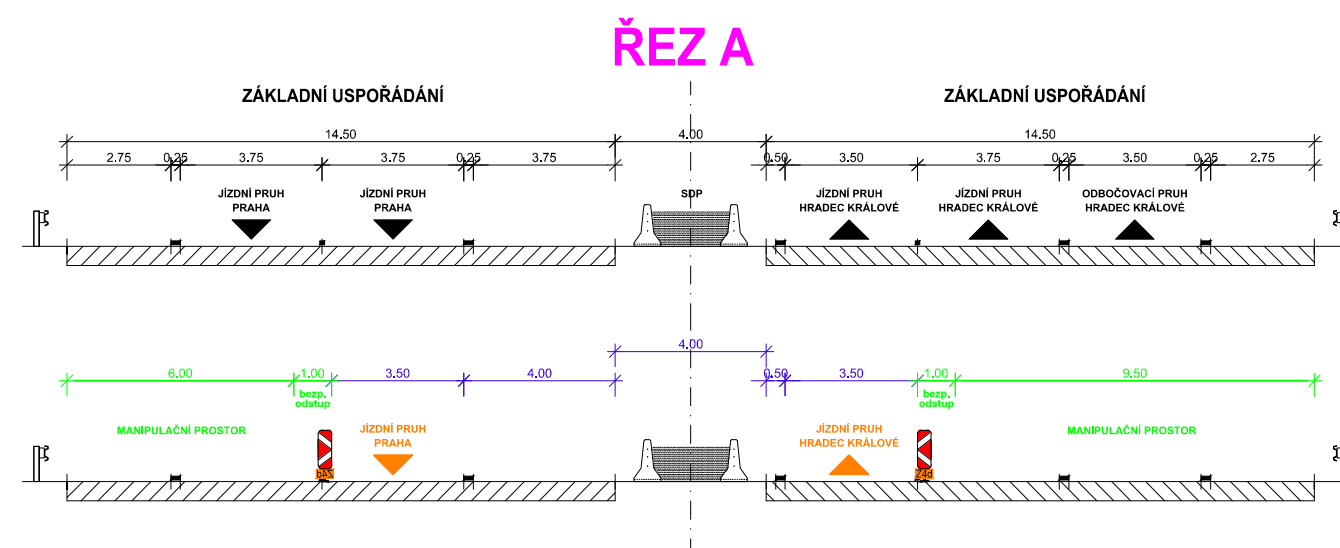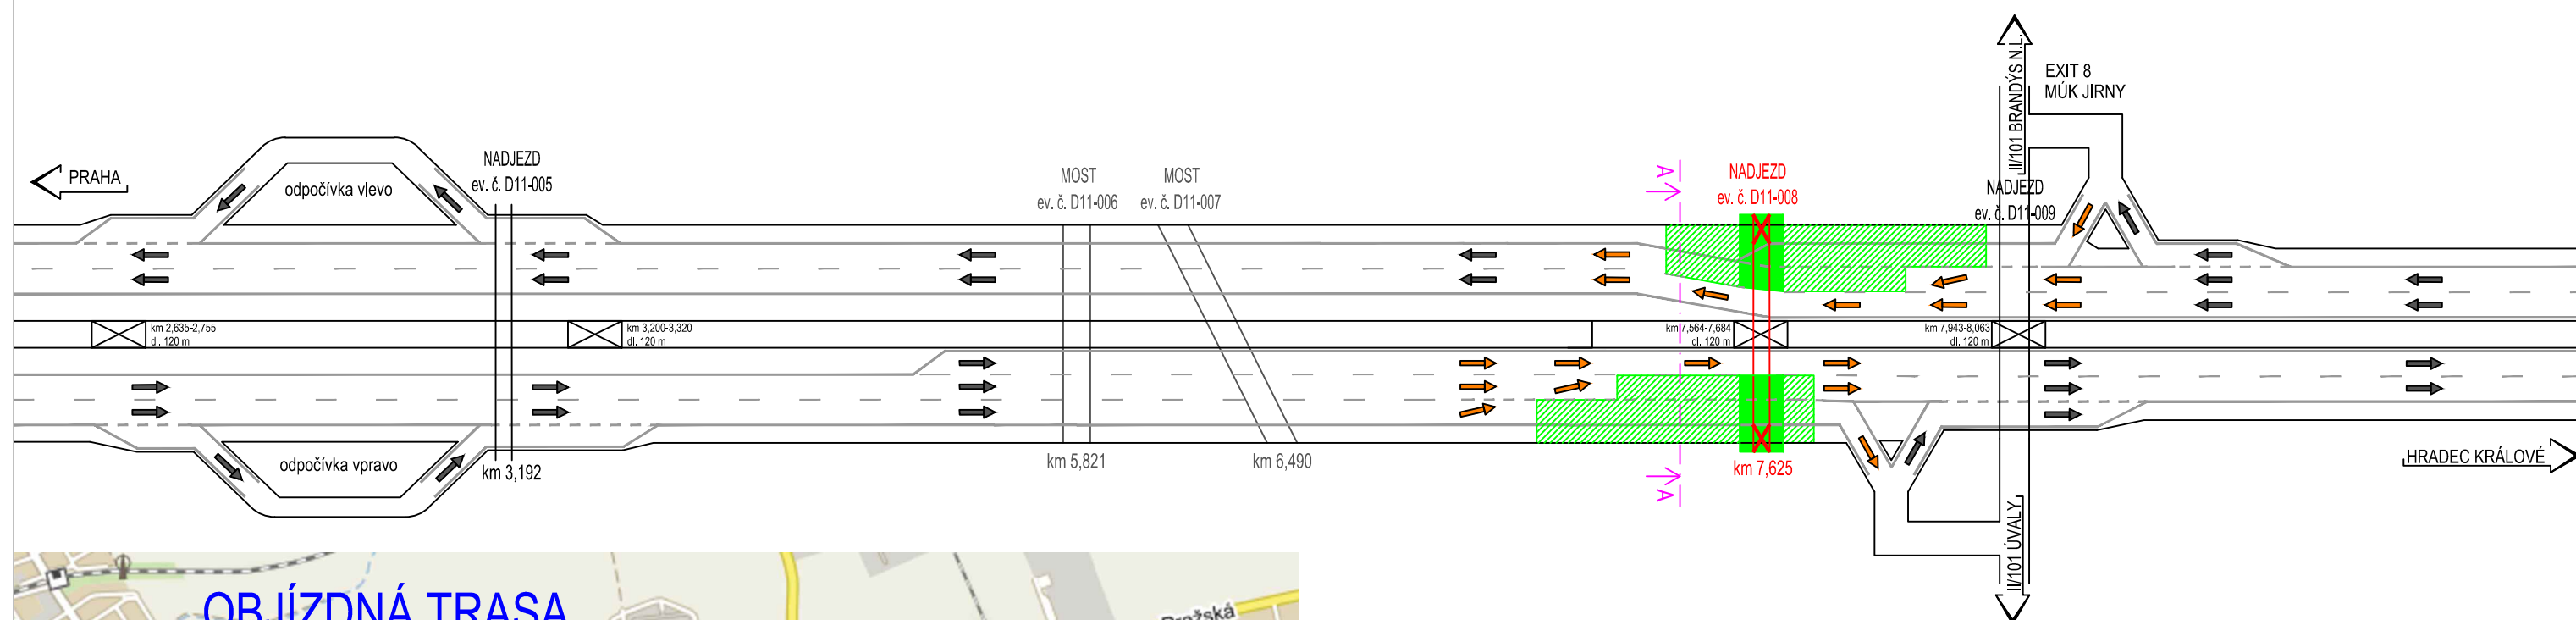


8 týdnů

Probíhající práce

- dokončení odbourání stávajících opěr mostu
- otevření výkopů, provedení pažení
- výstavba základů a vybudování nových opěr mostu


Dopravní omezení

- v místě nadezdu na dálnici D11 bude uzavřena zpevněná krajnice, doprava v obou směrech vedena bez dopravního omezení

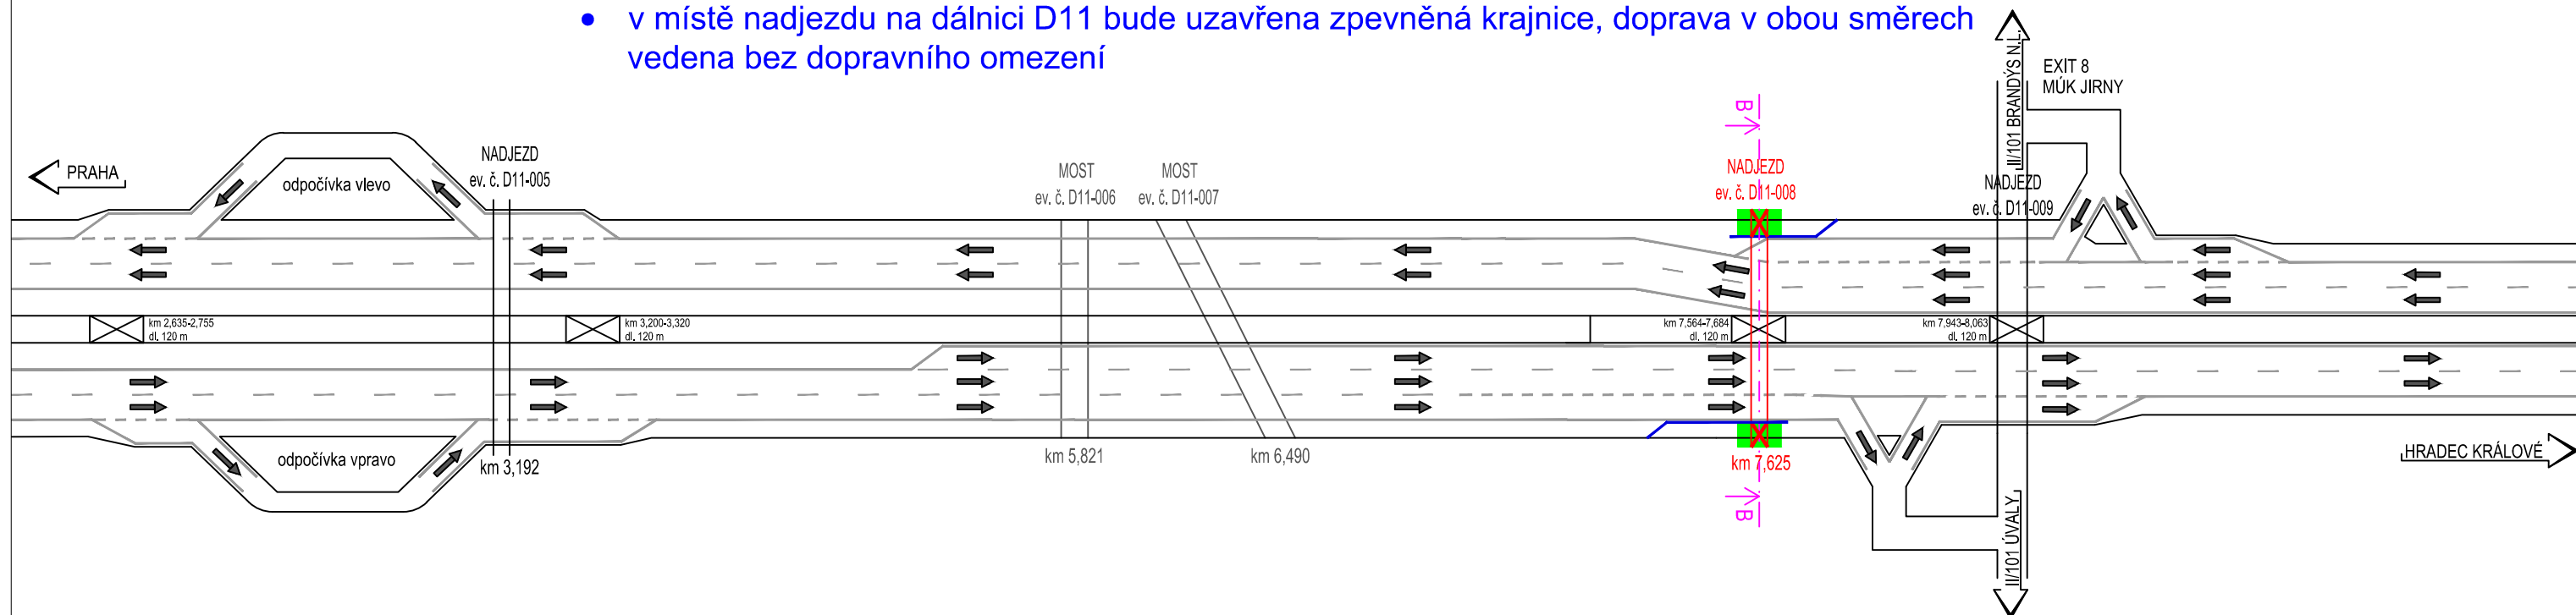

PŘÍČNÝ ŘEZ V MÍSTĚ NADJEZDU SO 201

ŘEZ B

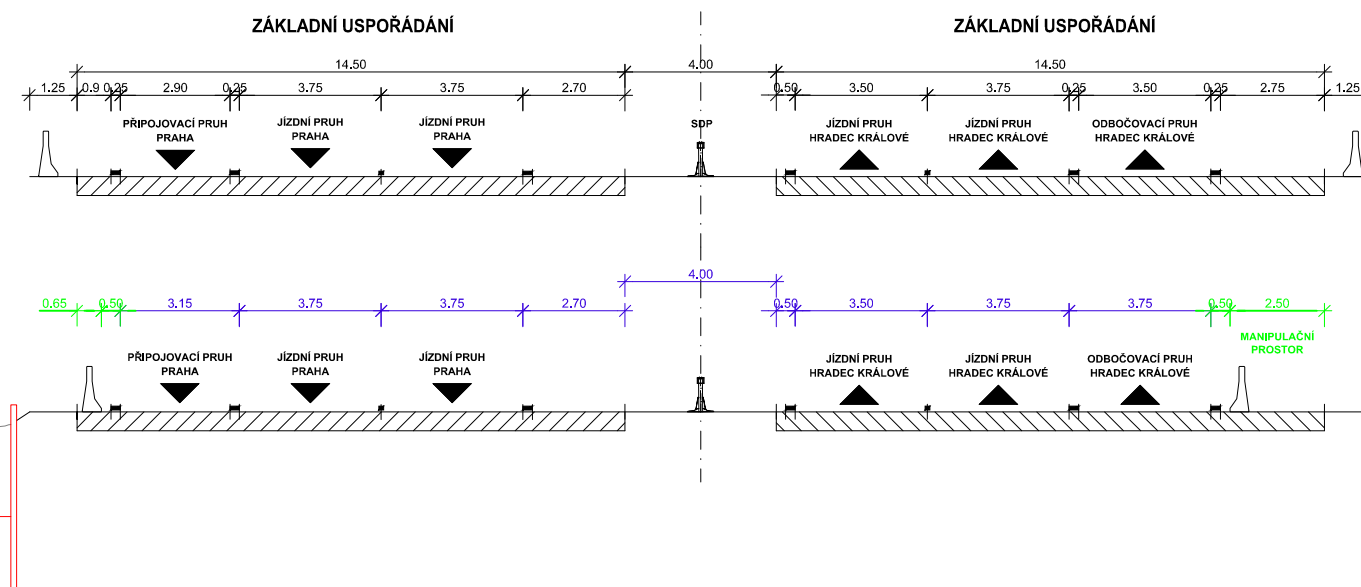

MODELOVÉ SCHÉMA - ETAPA 4


12 hodin

Probíhající práce


- uzavírka dálnice D11 mezi exity 1 až 8 na dobu max. 12 hodin v noci ze soboty na neděli
- osazení ocelových nosníků, ztraceného bednění desky a mostních odvodňovačů
- výstavba montážních podpěr

Dopravní omezení

- doprava vedena po objízdných trasách
 - ve směru na Hradec Králové osobní vozidla z MÚK Běchovice po silnici I/12 + II/113 + II/330 do exitu 25
 - ve směru na Hradec Králové nákladní vozidla z MÚK Běchovice po silnici I/12 + I/38 do exitu 39
 - ve směru na Prahu nákladní vozidla nad 12t vedena z exitu 39 po silnici I/38 + I/12 do MÚK Běchovice
 - ve směru na Prahu osobní vozidla vedena z exitu 8 po silnici II/101 na dálnici D10 (exit 10)

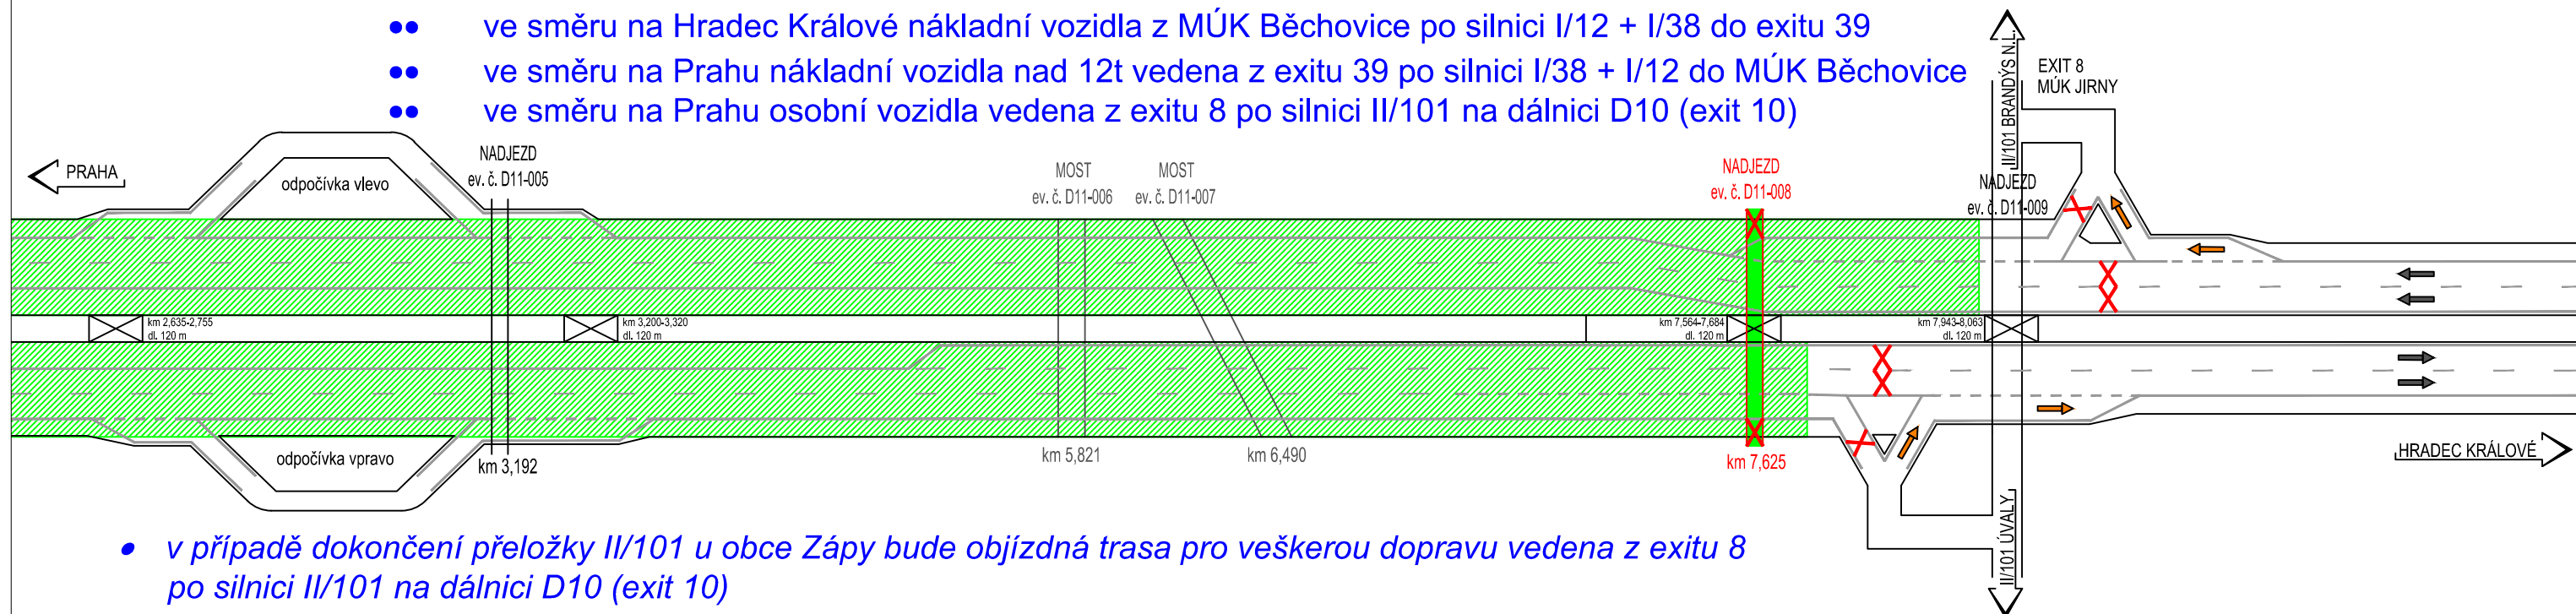

- v případě dokončení přeložky II/101 u obce Zápy bude objízdná trasa pro veškerou dopravu vedena z exitu 8 po silnici II/101 na dálnici D10 (exit 10)

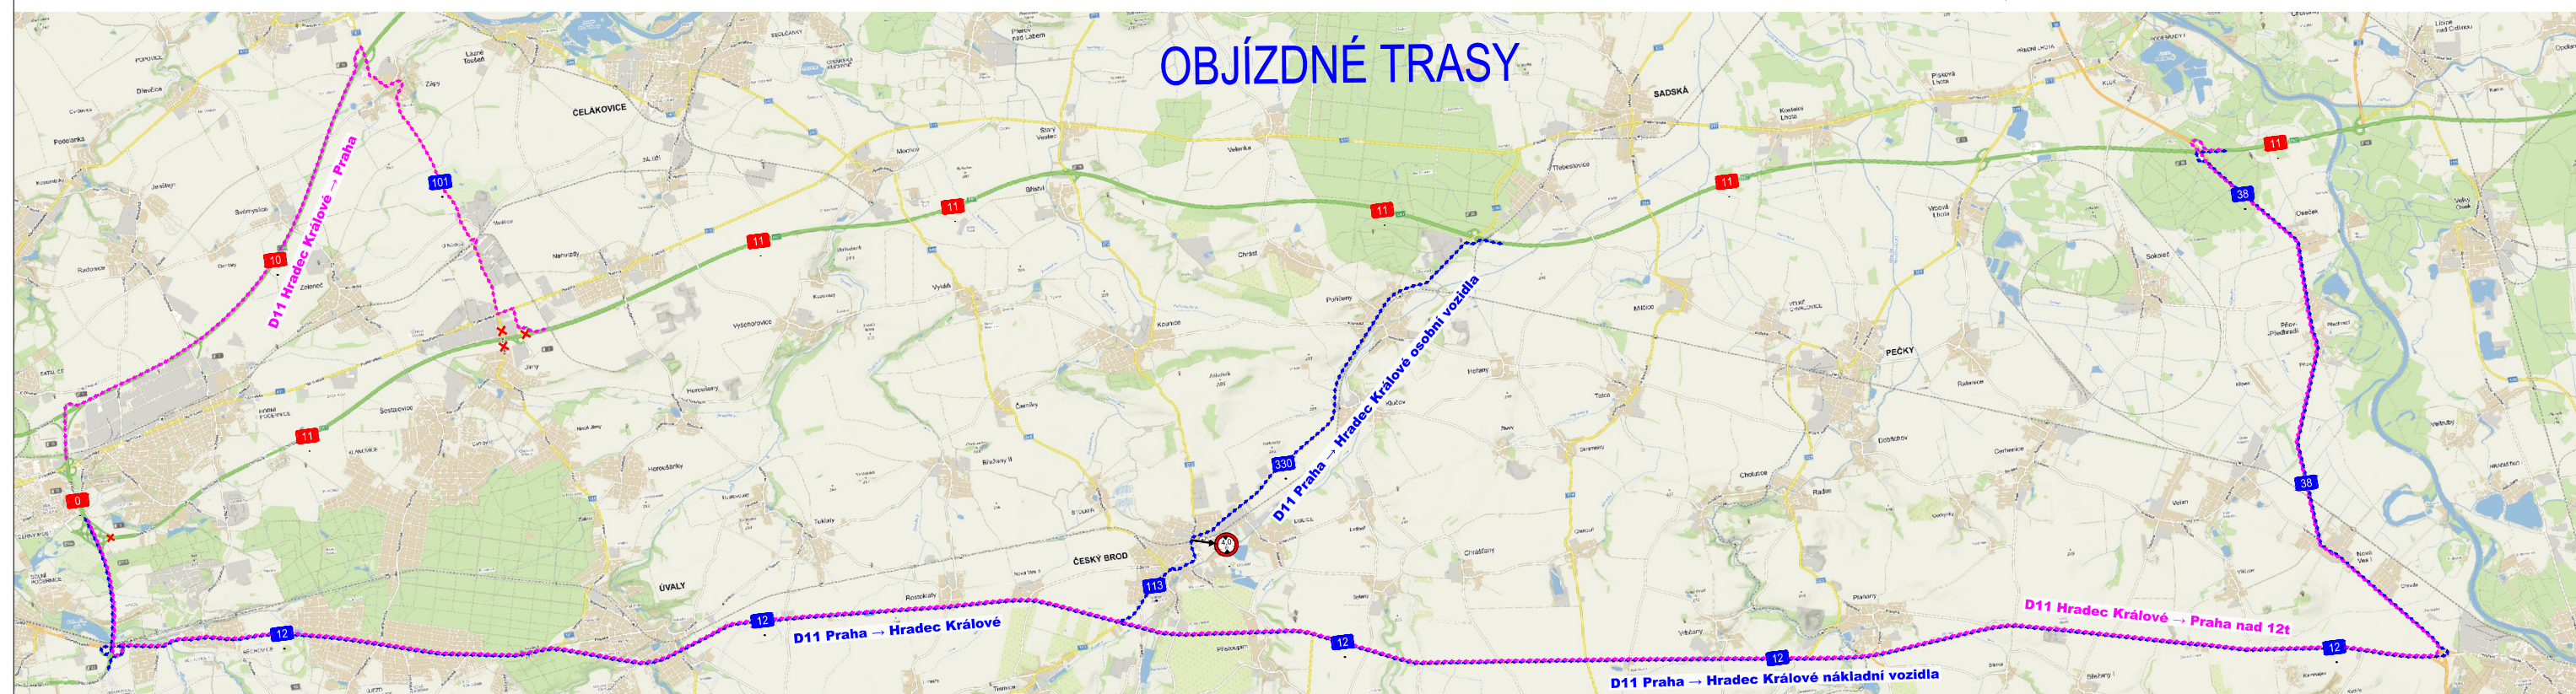

MODELOVÉ SCHÉMA - ETAPA 5a


3 týdny

Probíhající práce

- betonáž křídel pro pracovní spáru, částečné provedení zásypů základů
- zmonolitnění rámových rohů



Dopravní omezení

- v místě nadjezdu na dálnici D11 bude uzavřena zpevněná krajnice, zúžení levého jízdního pruhu z důvodu osazení montážní podpěry v SDP

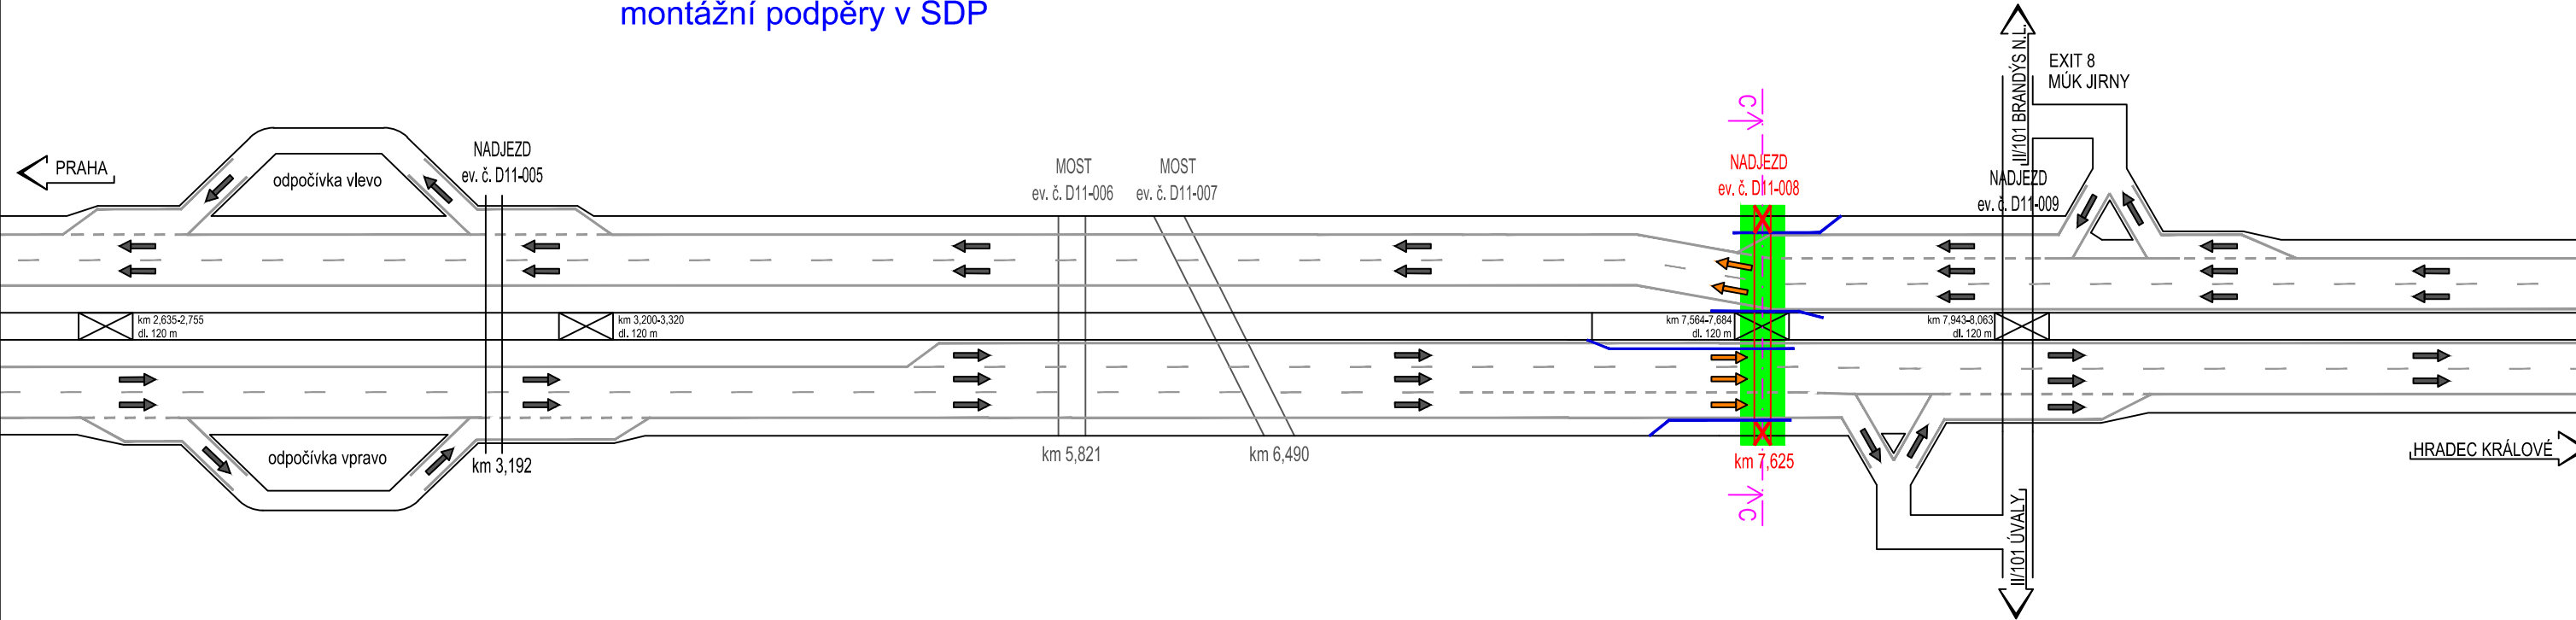

PŘÍČNÝ ŘEZ V MÍSTĚ NADJEZDU SO 201

ŘEZ C

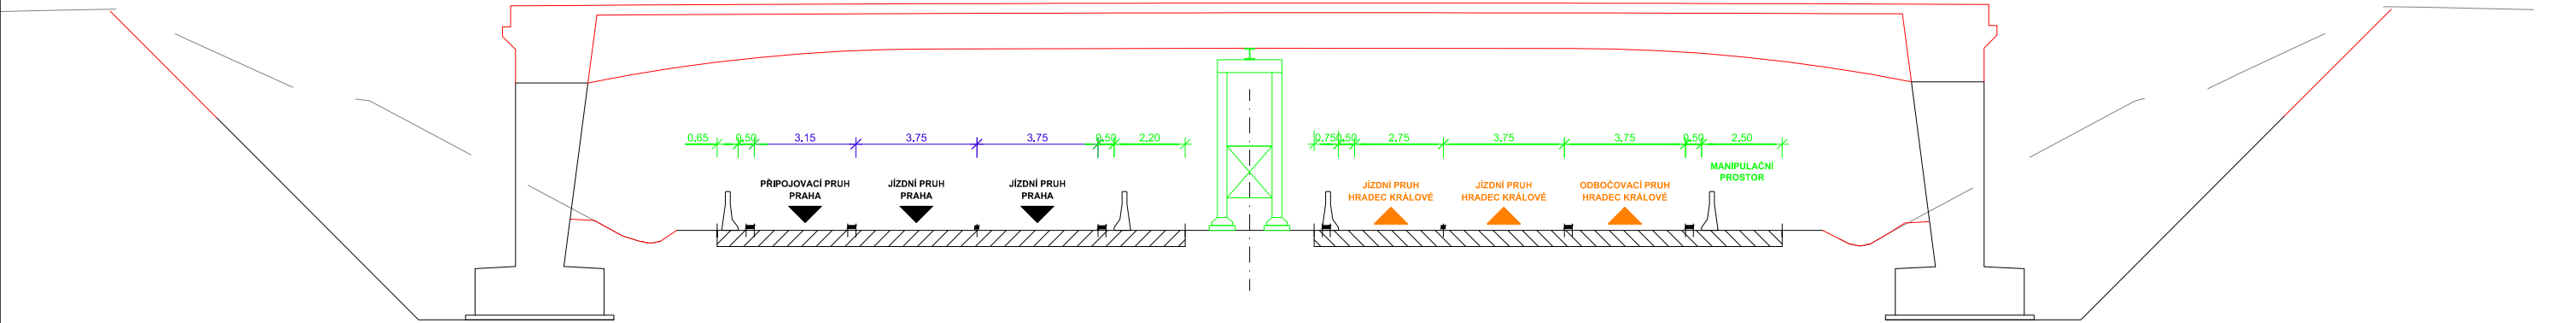

MODELOVÉ SCHÉMA - ETAPA 5b


9 týdnů

Probíhající práce

- betonáž spřažené desky, výstavba samostatných křídel, provedení přechodové oblasti a přechodových desek
- provedení izolace, říms, pokládka vozovky, osazení zábradlí a svodidel
- dokončení mostu

Dopravní omezení

- v místě nadjezdu na dálnici D11 bude uzavřena zpevněná krajnice, doprava v obou směrech vedena bez dopravního omezení

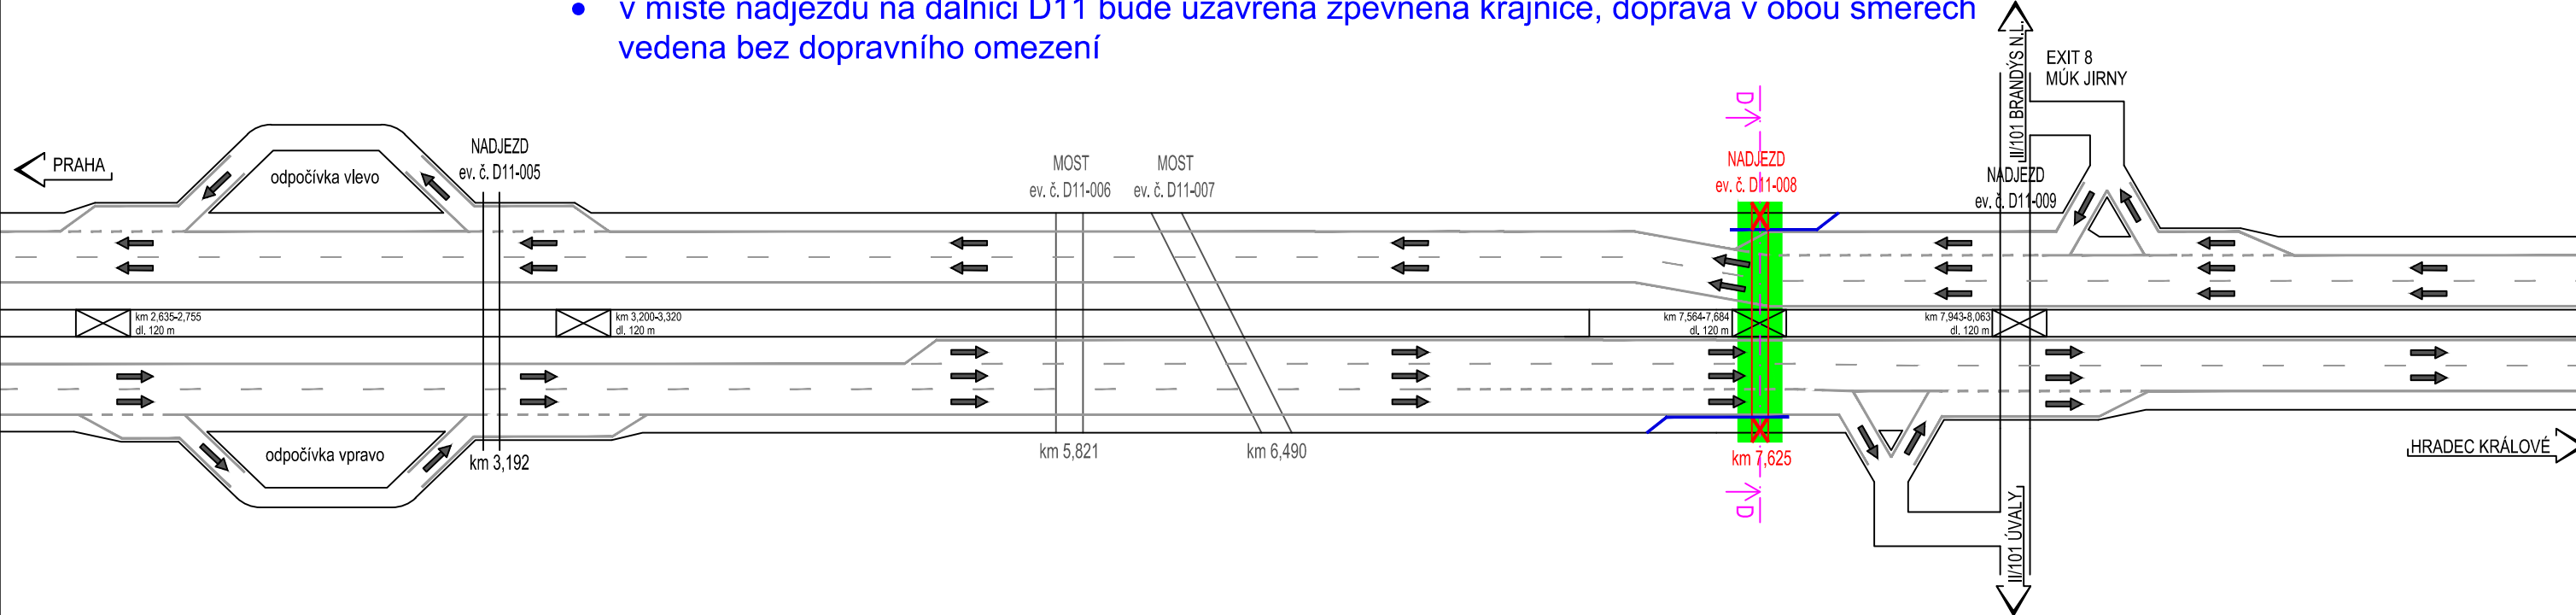

PŘÍČNÝ ŘEZ V MÍSTĚ NADJEZDU SO 201

ŘEZ D

