

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

II/335 Stříbrná Skalice, průtah - stavební práce

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Stavební úpravy mostu ev.č. 335-008

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

202/1

Číslo ZBV:

1

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
 Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
 IČ: 000 66 001
 Obec Stříbrná Skalice
 Sázavská 3, 281 67 Stříbrná Skalice
 IČ: 002 35 750

Zhotovitel: Společnost Stříbrná Skalice, B E S - MTS Infra
 Sukova 625, 256 01 Benešov
 IČ: 437 92 553

Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.3	-152 610,72	1 310 962,99	1 158 352,27

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1	-152 610,72	1 310 962,99	1 158 352,27

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
 Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
 a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré:

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: II/335 Stříbrná Skalice, průtah - stavební práce Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Stavební úpravy mostu ev.č. 335-008	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 202/1	Číslo ZBV: 1.3
--	---	--------------------------

Strany smlouvy o dílo objednatel č.: S-3430/00066001/2020 a zhotovitel č.: S 131/2020 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 8.12.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Objednatel: Obec Stříbrná Skalice, Sázavská 3, 281 67 Stříbrná Skalice

Zhotovitel: Společnost Stříbrná Skalice, B E S - MTS Infra, Sukova 625, 256 01 Benešov

Přílohy Změnového listu:			Paré č.	Příjemce
1. Krycí list	1	počet listů	1, 2	Objednatel
2. Změnový list	1	počet listů	3	Zhotovitel
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů	4	Projektant (AD)
4. Rozpis ocenění Změn položek ZBV 1	1	počet listů	5	Stavební dozor
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů	6	Supervize
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů		
Další doklady dle přehledu dokladů	52	počet listů		

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Změna založení a převedení vody

Změna vznikla na základě zvýšeného množství protékající vody v období začátku stavby. Zvýšené množství vody by nedokázalo plynule odtékat a docházelo k zaplavování sousedních pozemků. Další změnou bylo zvýšené množství štetových stěn ve vazbě na nestabilní pažený svah v kombinaci s novou zástavbou poblíž mostu. Ve vazbě na aktuální zhoršené geotechnické podmínky a navazující práce (přechodová oblast mostu) bylo nezbytné štetovnice vytáhnout. S velkým množstvím vody byla spojena i změna v založení mostu. Vlivem nevhodného stávajícího podloží a neunosné základové spáry vznikly dodatečné práce spočívající v rozšíření zemních prací a zlepšení únosností podloží. Oproti PDPS, byl ve vazbě na aktuálně zastíženou vysokou hladinu podzemní vody, materiál nahrazen za šetrkóut.

Zástupcem autorského dozoru bylo navrženo zlepšení podloží tak, že do základové spáry se zatlačí 60cm jako podklad z lomového kamene. Na tuto vrstvu bude podkladní vrstva tl. 90cm z kameniva drceného. Pro zpevnění únosnosti bylo i navýšeno množství základového betonu. Kvůli vyšší hladině spodní vody byl změněn materiál na obrys mostních základů a byla použita stěrka drt. Zmíněné Stanovisko autorského dozoru je přílohou č. 14 tohoto ZBV.

Aby se zajistilo, že bude zabráněno zaplavování pozemků, bylo zástupci objednatele a zhotovitele domluveno navýšení kapacity potrubí k převodu vody z DN 600 na DN 1000. Souhlas s navrženým řešením je přílohou č. 13.

Závěrem Zhotovitel doplňuje, že výše popsané nepředvídatelné fyzické podmínky Zhotovitel nemohl rozumně předvídat. Zhotovitel při zpracování cenové nabídky, respektive pro potřeby stanovení příjatečné smluvní částky, vycházel z rozsahu prací definovaných Zadávací dokumentací stavby. S ohledem na majetkoprávní vztahy k dotčené stavbě a časový rámec nebylo v možnostech Zhotovitele realizovat k tomu vedoucí k ověření těchto skutečností.

Jedná se o Změnu nepodstatnou, která je tak podle § 5, odst. 1, písmeno c) resp. § 10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29.5.2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazený do Skupiny 3 jako změna nepředvídatelná.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná o změnu nezbytnou u níž není změna v osobě dodavatele možná z ekonomických anebo technických důvodů, kdy změna v osobě dodavatele by způsobila zadavateli značné obtíže (narušení postupů výstavby, nedodržení technických a technologických postupů, nebo rozdělení odpovědnosti za vady) nebo výrazné zvýšení nákladů a hodnota těchto dodatečných stavebních prací nepřekračuje 50 % původní hodnoty závazku.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-152 610,72	1 310 962,99	1 158 352,27	1 463 573,71

Podpis vyjadruje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí): B E S s.r.o.	jméno	Milan Sochůrek	datum	podpis	
Projektant (autorský dozor):	jméno	Ing. Tomáš Kaplan	datum	podpis	
Stavební dozor:	jméno	Mgr. Tomáš Koranda	datum	podpis	
Supervize (Regionální dotační kancelář)	jméno		datum	podpis	
Technická asistence	jméno		datum	podpis	
Zástupce Objednatele:	jméno	Jan Zákostelský	datum	podpis	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Ing. Jan Fidler, DiS	datum	podpis	
Zhotovitel (jednatel)	jméno	Petr Váňa	datum	podpis	
				Číslo paré:	

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 1**

Název Stavby: II/335 Stříbrná Skalice, průtah - stavební práce
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 202/1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Stavební úpravy mostu ev.č. 335-008

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
6 883 714,13

Poznámka:

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	6 883 714,13	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-152 610,72	1 310 962,99	1 310 962,99	19,04%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-152 610,72	8 042 066,40	1 158 352,27	16,83%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):	souhlasím	Milan Sochůrek	
Projektant (autorský dozor):	souhlasím	Ing. Tomáš Kaplan	
Stavební dozor:	souhlasím	Mgr. Tomáš Koranda	
Zástupce Objednatele:	souhlasím	Jan Zákostelský	
Supervize (RDK)	souhlasím		
Zaměstnanec KSÚS SK odpovědný za cenové projednání Změny:	souhlasím	Ing. Jaroslava Jurková	

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 1.3													
Evidenční číslo a název stavby: II/335 Stříbrná Skalice, průtah - stavební práce Číslo a název SO/PS: 202 Stavební úpravy mostu ev.č. 335-008 Číslo a název rozpočtu: 202 Stavební úpravy mostu ev.č. 335-008								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								SO 202					
								Skupina Změn: 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
45	014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	498,800	625,136	126,336	104,000	51 875,20	0,00	13 138,94	65 014,14	13 138,94	25,33%
37	11525	PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 600 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,0M	M	26,000	0,000	-26,000	1025,600	26 665,60	-26 665,60	0,00	0,00	-26 665,60	-100,00%
7	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	323,600	0,000	-323,600	389,200	125 945,12	-125 945,12	0,00	0,00	-125 945,12	-100,00%
55	23117A	ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ PROVIZORNÍ (PLOCHA)	M2	213,000	267,000	54,000	6652,000	1 416 876,00	0,00	359 208,00	1 776 084,00	359 208,00	25,35%
56	45152	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	25,856	80,000	54,144	1151,600	29 775,77	0,00	62 352,23	92 128,00	62 352,23	209,41%
Položky z jiných objektů													
110	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	0,000	90,240	90,240	11,600	0,00	0,00	1 046,78	1 046,78	1 046,78	100,00%
Nové položky													
111	11527.N	PŘEV VOD NA POVRCHU POTR DN NAD 1600MM NEBO ŽLAB R.O. DO 3,6M	M	0,000	36,000	36,000	2620,000	0,00	0,00	94 320,00	94 320,00	94 320,00	100,00%
112	124838.N	VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM	M3	0,000	126,340	126,340	767,000	0,00	0,00	96 902,78	96 902,78	96 902,78	100,00%
113	17481.N	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	0,000	323,600	323,600	585,000	0,00	0,00	189 306,00	189 306,00	189 306,00	100,00%
114	23717A.N	VYTAŽENÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ V PLOŠE	M2	0,000	267,000	267,000	865,000	0,00	0,00	230 955,00	230 955,00	230 955,00	100,00%
115	27232A.N	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C20/25	M3	0,000	13,540	13,540	3850,000	0,00	0,00	52 129,00	52 129,00	52 129,00	100,00%
116	421366.N	VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z KARI SÍTÍ	T	0,000	0,881	0,881	25700,000	0,00	0,00	22 641,70	22 641,70	22 641,70	100,00%
117	452211.N	PODKLAD KONSTR Z LOM KAMENE NA SUCHO	M3	0,000	54,144	54,144	3490,000	0,00	0,00	188 962,56	188 962,56	188 962,56	100,00%
		Celkem							- 152 610,72	1 310 962,99		1 158 352,27	

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Milan Sochůrek (stavbyvedoucí)

Datum:

Podpis:

Za Objednatele:

Datum:

Podpis:

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	1
Název a evidenční číslo stavby:	II/335 Stříbrná Skalice, průtah - stavební práce
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Stavební úpravy mostu ev.č. 335-008
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	202/1

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
Soupis prací SO po změnách	6	
Zápisy SD	10	
Geodetický protokol	5	
Geodetický protokol 2	5	
Ohlášení ZBV - SO 201 a 202	4	
Ohlášení ZBV - zásyp mostních základů	2	
Ohlášení ZBV_DMT štětovnice+ zatrubnění	2	
Stanovisko AD	2	
Souhlas KSÚS	2	
Zápis z KD	14	
Počet listů celkem	52	

Rozpis ocenění Změn položek - celkem														
Evidenční číslo a název stavby: II/335 Stříbrná Skalice, průtah - stavební práce Číslo a název SO/PS: SO 202 Stavební úpravy mostu ev.č. 335-008 Číslo a název rozpočtu: SO 202									ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
									SO 202					
									celkem					
Poř. č. pol.	Kód položky		Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1			Zemní práce						369 020,99	- 152 610,72	0,00	216 410,27	- 152 610,72	- 2,00
41	11313	MĚŘ	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM	M3	11,738	11,738	0,000	427,350	5 016,23	0,00	0,00	5 016,23	0,00	0,00%
			10,05*5,84*0,2=11,738 [A]											
			Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).											
6	11511		ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN	HOD	1 500,000	1500,000	0,000	40,430	60 645,00	0,00	0,00	60 645,00	0,00	0,00%
			za účelem zhotovení základů, dlažby z lomového kamene a dále dle potřeby											
			Položka čerpání vody na povrchu zahrnuje i potrubí, pohotovost záložní čerpací soupravy a zřízení čerpací jímky. Součástí položky je také následná demontáž a likvidace těchto zařízení											
37	11525	MĚŘ	PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 600 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,0M	M	26,000	0,000	-26,000	1025,600	26 665,60	-26 665,60	0,00	0,00	-26 665,60	-100,00%
			plastová trouba DN 600 včetně přesunu											
			2*13=26,000 [A]											
			Položka převezení vody na povrchu zahrnuje zřízení, udržování a odstranění příslušného zařízení. Převezení vody se uvádí buď průměrem potrubí (DN) nebo délkou rozvinutého obvodu žlabu (r.o.).											
44	12110	MĚŘ	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY	M3	43,800	43,800	0,000	38,200	1 673,16	0,00	0,00	1 673,16	0,00	0,00%
			(127+118+23+24)*0,15=43,800 [A]											
			položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu											
			nezahrnuje uložení na trvalou skládku											
50	12573		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I	M3	43,800	43,800	0,000	69,300	3 035,34	0,00	0,00	3 035,34	0,00	0,00%
			naložení ornice na mezideponii											

Rozpis ocenění Změn položek - celkem														
Evidenční číslo a název stavby: II/335 Stříbrná Skalice, průtah - stavební práce Číslo a název SO/PS: SO 202 Stavební úpravy mostu ev.č. 335-008 Číslo a název rozpočtu: SO 202								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)						
								SO 202						
								celkem						
Poř. č. pol.	Kód položky		Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)											
8	17780	MĚŘ	ZEMNÍ HRÁZKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	8,000	8,000	0,000	462,000	3 696,00	0,00	0,00	3 696,00	0,00	0,00%
			zajištění stavební jámy na začátku a konci zatrubnění hrázku z pytlů vyplněných pískem											
			položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)											
57	18130	MĚŘ	ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ	M2	292,000	292,000	0,000	5,800	1 693,60	0,00	0,00	1 693,60	0,00	0,00%

Rozpis ocenění Změn položek - celkem														
Evidenční číslo a název stavby: II/335 Stříbrná Skalice, průtah - stavební práce Číslo a název SO/PS: SO 202 Stavební úpravy mostu ev.č. 335-008 Číslo a název rozpočtu: SO 202									ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
									SO 202					
									celkem					
Poř. č. pol.	Kód položky		Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2		3 - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu.	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	272365		VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B	T	4,807	4,807	0,000	33650,000	161 755,55	0,00	0,00	161 755,55	0,00	0,00%
3									1 942 912,81	0,00	0,00	1 942 912,81	0,00	0,00
14	317325	MĚŘ	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37	M3	20,102	20,102	0,000	17275,000	347 262,05	0,00	0,00	347 262,05	0,00	0,00%

Rozpis ocenění Změn položek - celkem														
Evidenční číslo a název stavby: II/335 Stříbrná Skalice, průtah - stavební práce Číslo a název SO/PS: SO 202 Stavební úpravy mostu ev.č. 335-008 Číslo a název rozpočtu: SO 202								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)						
								SO 202						
								celkem						
Poř. č. pol.	Kód položky		Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			položka zahrnuje: - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74) - povrchovou antikorozní úpravu výztuže, - separaci výztuže, - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.											
16	333325	MĚŘ	MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37)	M3	97,132	97,132	0,000	10805,000	1 049 511,26	0,00	0,00	1 049 511,26	0,00	0,00%
			dílek opěr včetně křídel											
			2*3,05*8,6+2*13,96*(0,55+1,05)=97,132 [A]											
			- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrůžovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných											
17	333365		VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10S05, B500B	T	12,628	12,628	0,000	33650,000	424 932,20	0,00	0,00	424 932,20	0,00	0,00%

[illegible]

Rozpis ocenění Změn položek - celkem									ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Evidenční číslo a název stavby: II/335 Stříbrná Skalice, průtah - stavební práce Číslo a název SO/PS: SO 202 Stavební úpravy mostu ev.č. 335-008 Číslo a název rozpočtu: SO 202									SO 202					
									celkem					
Poř. č. pol.	Kód položky		Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			položka zahrnuje: - dodávku a zához lomového kamene předepsané frakce včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál											
54	465512	MĚŘ	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	17,218	17,218	0,000	5486,300	94 463,11	0,00	0,00	94 463,11	0,00	0,00%
			84,37*0,2+2*0,1*0,2*8,6=17,218 [A]											
			položka zahrnuje: - nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.) - zřízení spojovací vrstvy - zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky - dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru - spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody - nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45											
23	467385	MĚŘ	STUPNĚ A PRAHY VOD KORYT ZE ŽELBET DO C30/37 (B37) VČET VÝZT	M3	2,363	2,363	0,000	9751,100	23 041,85	0,00	0,00	23 041,85	0,00	0,00%
			vtokový práh											
			0,39*(2,68+2,38+1)=2,363 [A]											
			položka zahrnuje: - nutné zemní práce (hloubení rýh apod.) - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrůžovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných											
5 Komunikace									174 179,67	0,00	0,00	174 179,67	0,00	0,00
25	572213	MĚŘ	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	180,600	180,600	0,000	9,300	1 679,58	0,00	0,00	1 679,58	0,00	0,00%

Rozpis ocenění Změn položek - celkem														
Evidenční číslo a název stavby: II/335 Stříbrná Skalice, průtah - stavební práce Číslo a název SO/PS: SO 202 Stavební úpravy mostu ev.č. 335-008 Číslo a název rozpočtu: SO 202									ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
									SO 202					
									celkem					
Poř. č. pol.	Kód položky		Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			- položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.											
61	78383	MĚŘ	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C)	M2	4,410	4,410	0,000	173,250	764,03	0,00	0,00	764,03	0,00	0,00%
			(0,15+0,15)*14,7=4,410 [A]											
			- položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.											
28	7838B	MĚŘ	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S7	M2	106,400	106,400	0,000	224,400	23 876,16	0,00	0,00	23 876,16	0,00	0,00%
			penetrační nátěr - hydroizolace											
			- položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.											
9 Ostatní konstrukce a práce									623 448,44	0,00	0,00	623 448,44	0,00	0,00
32	9112B1	MĚŘ	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	14,900	14,900	0,000	8823,800	131 474,62	0,00	0,00	131 474,62	0,00	0,00%
			ocel. mostní zábradlí žárově stříkané kovem s nátěrem, zábradlí městského typu, kompletní, včetně PKO, včetně lepení kotev a vyvrtání otvorů											
			14,9=14,900 [A]											
			položka zahrnuje:											
			dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy											
			kotvení sloupků, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrtý a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak											
			případné nivelační hmoty pod kotevní desky											
40	9112B3	MĚŘ	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	22,000	22,000	0,000	299,100	6 580,20	0,00	0,00	6 580,20	0,00	0,00%
			10+12=22,000 [A]											
			položka zahrnuje:											
			- demontáž a odstranění zařízení											
			- jeho odvoz na předepsané místo											
52	9117C1	MĚŘ	SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	18,000	18,000	0,000	9123,000	164 214,00	0,00	0,00	164 214,00	0,00	0,00%
			položka zahrnuje:											
			- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích a díltačních prvků											
			- montáž a osazení svodidla, kotvení, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrtý a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak,											
			případné nivelační hmoty pod kotevní desky											
			- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr											
			- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření											
			nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie											
33	91355		EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU	KUS	2,000	2,000	0,000	1795,000	3 590,00	0,00	0,00	3 590,00	0,00	0,00%
			položka zahrnuje štítek s evidenčním číslem mostu, sloupek dopravní značky včetně osazení a nutných zemních prací a zabetonování											
34	931326	MĚŘ	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2	M	29,400	29,400	0,000	155,500	4 571,70	0,00	0,00	4 571,70	0,00	0,00%

Rozpis ocenění Změn položek - celkem														
Evidenční číslo a název stavby: II/335 Stříbrná Skalice, průtah - stavební práce Číslo a název SO/PS: SO 202 Stavební úpravy mostu ev.č. 335-008 Číslo a název rozpočtu: SO 202								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)						
								SO 202						
								celkem						
Poř. č. pol.	Kód položky		Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů											
42	97817	MĚŘ	ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE	M2	61,400	61,400	0,000	115,500	7 091,70	0,00	0,00	7 091,70	0,00	0,00%
			(5,84+2*0,15)*10=61,400 [A]											
			- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů											
Položky z jiných objektů						0,000,001 046,781 046,781 046,78100,00%								
110	18110		UPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM V HORNINE TR. I	M2	0,000	90,240	90,240	11,600	0,00	0,00	1 046,78	1 046,78	1 046,78	100,00%
			ZBV č. 1 9,6*4,7*2=90,24											
Nové položky						0,000,00875 217,04875 217,04875 217,04100,00%								
111	11527.N		PŘEV VOD NA POVRCHU POTR DN NAD 1000MM NEBO ŽLAB R.O. DO 3,6M	M	0,000	36,000	36,000	2620,000	0,00	0,00	94 320,00	94 320,00	94 320,00	100,00%
			ZBV č. 1 36m											
112	124838.N		VYKOPAVKY PRO KORYTA VODOTEČI TR. II, ODVOZ DO 20KM	M3	0,000	126,340	126,340	767,000	0,00	0,00	96 902,78	96 902,78	96 902,78	100,00%
			ZBV č. 1 podkladní vrstva tl. 60cm (9,6*4,7*2)*1,4=126,34 [A]											
113	17481.N		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	0,000	323,600	323,600	585,000	0,00	0,00	189 306,00	189 306,00	189 306,00	100,00%
			ZBV č. 1 obsyp mostních základů šterkodrtí 323,600m3 [A]											
114	23717A.N		VYTAŽENÍ STĚTOVÝCH STEN Z KOVOVÝCH DILCU V PLOŠE	M2	0,000	267,000	267,000	865,000	0,00	0,00	230 955,00	230 955,00	230 955,00	100,00%
			ZBV č. 1 267m2											
115	27232A.N		ZAKLADY ŽE ŽELEZOBETONU DO C20/25	M3	0,000	13,540	13,540	3850,000	0,00	0,00	52 129,00	52 129,00	52 129,00	100,00%
			ZBV č. 1 (32,6+35,1)*0,2=13,54m3											
116	421366.N		VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z KARI SITI	T	0,000	0,881	0,881	25700,000	0,00	0,00	22 641,70	22 641,70	22 641,70	100,00%
			ZBV č. 1 0,88146t											
117	452211.N		PODKLAD KONSTR Z LOM KAMENE NA SUCHO	M3	0,000	54,144	54,144	3490,000	0,00	0,00	188 962,56	188 962,56	188 962,56	100,00%
			ZBV č. 1 zatlačení tl. 60cm (9,6*4,7*2*0,3)*2=54,144 [A]											
									6 883 714,13	- 152 610,72	1 310 962,99	8 042 066,40	1 158 352,27	16,83%

Denní záznam stavby

S.D. 1

Název akce: #/335 STŘÍBRNÁ SEALICE

List číslo: 3

Datum

Číslo akce: 30: 21, 101, 102, 181, 190, 1, 201, 202, 203, 204, 301, 302, 303, 401

ARCHEOLOGICKÝ DOHLED: KONTROLA STAVBY NA TRASE

26.3.21

I-ETAPY NEGATIVNÍ ZJIŠTĚNÍ ŽEHNÍ A STAVEBNÍ

TAJKA

PRÁCE MOHOU PROBÍHAT BEZ OMEZENÍ

ZA HADROU BERNAT JERUŠAL

Počasí 4,5° = 14°C POLOJEDNO

26.3.21

PRAC. DOBA: 4^h 11^m 12^m 14^m

TAJKA

TRAV: BOCHUS (BO) ALINKAUA, MACHUPEA,

4x STROJNÍK, 1x DĚLNÍK (BOUCHUS)

MĚCHANÍ ZACE: TAJKA 2x; JH 30P 2x; HUTNÍCI

DESKA 500x

ZÁPIS KOORDINÁT BĚH → PRÁCE KONTROLA STAVBY

PRÁCE: -

→ BRZ ŽIVNO/KOLANOV JERUŠAL

30, 202 - MOST 335-00P

- ÚPRAVA CHODNÍKU K PROVÍZORNÍ LAVCE

- ZATŘEBUJENÍ POTŘEBA PŘÍPRAVA PRO HRAZ ZATŘEBUJENÍ

- 30 101 HLAVNÍ TRASA

- ZAMONTOVÁNÍ ODPRUŽOVACÍ SILNICE

30 102

- UY MÍSTNÍ CHODNÍK V ŘEŠU 7:00 - 8:24

ZÁPIS ZHODNUTÍ:

ZDŮVODNĚNÍ NEPŘEDLOŽENÍ KABELŮ ČEZ distr.

BUDĚ NUTNÉ SÍTĚ PŘEVÉST NA DOČASNOU

KONSTRUKCI Z DŮVODU DEMOLICE MOSTU A

OCHRANOVNÍ PÁSMO SÍTĚ ČEZ distribuce

U MOSTU 30 201; 202, ŽIJE VZNIKLOU

UČES NA KLADY U BĚHOLICE, ZALOŽENÍ A VÝSTRA-

BĚ TĚMTO OBJEKTŮ.

26.3.2021

TD: Zpracování kontrola provádění

stavby - neprovedeno přípravy.

Denní záznam stavby

S.D.C.1

Název akce: 11/335 STABILIZACE SKALIC
1900

List číslo: 12

Datum

Číslo akce: SO: 01.021.101.102.181.190.1.201.202.203.204.301.302.303.401

POČASÍ: - 1,5° - 4° ZATÁŽENO

16.4.21

STAV: SOCHOBSE, PLEČAVA, MATUCHA, 4x STROJNÍK
4x DĚLNÍK, FA HYČA 1x STROJNÍK, 1x DĚLNÍK

PAŘEZ

PRAC.DOBY: 11⁰⁰ 11²⁰ 12³⁰ 16⁰⁰

MCHANIZACE: DH 316, DH 308, 2x TATRA, HYČA - 1x DVS 20

PRÁCE: SO 201

- ČERPADLO VODY Z VÝKOPU 8h
- VÝKOP PRO ZÁKLADOVOU SPÁRU
- PŘELOŽENÍ KABELŮ ČEZ, ČSTN MIMO PŘELOŽENÍ PRÁSU, ODVOZ VÝKOPU
- ÚPRAVA BAJPASU, LAVEČ PRO PGBI
- LOM. KUMENEM ŠD
- SO 202
- BERANENÍ STROJNÍK OPČ.2
- ZATĚŽENÍ POTOKA DN 1000
- VÝKOP V STĚTOVÉM PÁZLU OPČ.1

ZÁPIS TDI:

Pracovní kontrola stavby - bez zárad.

POČASÍ: 0° - 4° ZATÁŽENO, DOLE

17.4.21

STAV: PLEČAVA, MATUCHA, 3x STROJNÍK, 4x DĚLNÍK SOBOFA

PRAC.DOBA: 11⁰⁰ 11²⁰ - 12⁰⁰ - 14⁰⁰

MCHANIZACE: DH 320, 2x TATRA

PRÁCE: - SO 201

- VÝKOP PRO ZALOŽENÍ MOSTU NA ZÁKL. SPÁRU, ODVOZ VÝKOPU, ČO
- ČERPADLO VODY 6h
- SO 202
- VÝKOP V STĚTOVÉM PÁZLU NA ZÁKLAD. SPÁRU, ODVOZ VÝKOPU OP 1, 2
- ČERPADLO VODY 6h

Denní záznam stavby

S.D.C.1

Název akce:

11/335 STŘEDNĚNÍ ŠKOLY

List číslo:

13

Datum

Číslo akce:

30.01.02.101.102.101.190.1201.202.203.204.301.302.303.401

Začíná geologická průzkum:

byla provedena kontrola základových spár, SO 201. 2S a 1000A
slyšely místy odtokovou pumou, klobouk klobouk.

Zatímže geotechnické podmínky jsou zcela nepřehledné pro
posouzení možností opěr mostu. Doporučuji klobouk
základu pomocí mikropilot.

Další byla provedena kontrola základových spár, SO 202.
2S jsou, klobouk klobouk slyšely, klobouk klobouk klobouk
klobouk klobouk. Zatímže geotechnické podmínky jsou
zcela nepřehledné pro posouzení možností opěr mostu.

Doporučuji klobouk klobouk základu pomocí mikropilot.

Z. TERESA

106.0.100.100.100

POČASÍ: 3.5° - 6° ZATAŽENO

STAV: SOUVISLÝ, POČASÍ, MAMULKA, 4x300000
4x300000, 1000000, (1000000 / 1000000, 1000000)

PRAC. DOBA: 4" 11" 11" 16"

METANIZACE: 14 316; 300; 2x 1000, 4x 1000 (1000000)

PRÁCE: SO 601

- ČERPAK. VODY Z VÝKOPU MOSTU 3h

- ZACHYTÁVÁNÍ ZÁKLADOVÉ SPÁRY VIZ.

ZÁPIS GEOLOGA

SO 202

- ČERPAK. VODY Z VÝKOPU MOSTU 3h

- ZACHYTÁVÁNÍ ZÁKL. SPÁRY VIZ. ZÁPIS

GEOLOGA

- ÚPRAVA ZATRUŽENOSTI MOSTU

- KONTROLA OBVĚZOVÝCH PRÁS STAVBY

19.4.21

PODZEMÍ

Denní záznam stavby

Název akce: 11/335 STĚŽENA' SEALICE

List číslo: 14

Datum

Číslo akce: 1900 30.01; 021; 101; 102; 181; 190.1; 201; 202; 203; 204; 301; 302; 303; 401

ZÁPIS KOORDINÁTORA BOP?

20.4.21 ÚTERÝ

→ PROVÁZENÍ EDVINOVI MOULIŠKY STAVNÍKŮ, UPOROVNĚNO
NA DOTLIVĚNÍ SEUVISÍCÍHO OCHRANĚNÍ STAVNÍKŮ JAVY U ODRAH
SO 201 A SO 202 + OCHRANĚNÍ PILOTŮVŮV NĚJOUVITŮV
VSTUP ZKŮVĚN. TERMÍN ODSŤRANĚNÍ: BIZBOZKOVNĚ
ZÁSTIL. FORMY LÁZKOV

POČASÍ: 6° - 12° JASNO

STAV: SOUVISLÝ, POKRÝVKA, MACHUŠKA, 21. STAVNÍK
4. DĚLNÍK

20.4.21

ÚTERÝ

PRAC. DOBA: 11³⁰ 12³⁰ 16³⁰

MISLIV. ZÁČ. DH 308, 1718A

PRÁČE SO 101

- ÚPRAVA STAVNÍKŮVŮV COST

SO 201

- MONITŮV ZÁKROVŮV NA LÁZKOV PRO PGTI

- ÚPRAVA COSTY

ZÁPIS ZAPOVĚDÍVŮV:

21.4.21

STŘEDA

① NA ZÁKLADĚ JEDNÁKŮV ZALOŽENÍ MOŠTŮ
NA ZÁKLADOVOU SPÁVU SO 201, 202 KĚ GOSL-
QICKÉ PODHÍVĚV. NĚJOUVITŮV PLOŠNÍMU ZALOŽENÍ
OŠEV MOŠTŮ VIZ ZÁPIS GOSLOV. ZÁSTAVNÍ PRÁČE
NA TĚCHTO OŠEVŮV DOKUD NĚJOUVITŮV VYŠŠÍMU
A ODSOUVITŮV TĚCHNICKÉ DĚLNÍ ZALOŽENÍZE SPÁV AD

② PO VYŠŠÍMU GOSLOVICKÉV. ADOVITŮV V SO 102
ZÁSTAVNÍ PRÁČE NA TĚCHTO OŠEVŮV DOKUD NĚJOUVITŮV
PODÁNŮ TĚCHNICKÉ DĚLNÍ ÚPRAVY PLÁVŮV ZO
STAVNÍ AD.

TD1 bura na vědomí

Denní záznam stavby

5.5.21

Název akce: 11/335 STAVBA SANKCE

List číslo: 14.

Datum

Číslo akce: 30: 01.01, 101, 102, 181, 190, 1.20, 201, 203, 204, 301, 302, 303, 401

Počasí: 5° - 11°C POLOJASNO

4.5.2021

STAV: SOCHŮREK, CBPEK (BES) PĚNKAVA, 2x STROJNÍK, 2x DĚLNÍK

2x DĚLNÍK (STROJNÍK)

PRAC. DOBA: 1^h 11^h 12^h 16^h 15

MECHANIZACE: DH 308, TRAKTOR BAG, 2x TATRA, 1x

PRÁCE:

SO 201

- ČERPÁNÍ VODY 10h

- ÚPRAVA ZÁKLADOVÉ SPARKY 140STU

- ODVOZ ZODNĚNÉ ZOMINY NA DEPONII

- VYKOPÁVÁNÍ UVIŽNUTÉHO DH 308 20

ZODNĚNÍ, NEJENOSNĚ ZS

Počasí: 6° - 12°C POLOJASNO, PĚNKAVA

5.5.2021

STAV: SOCHŮREK, CBPEK (BES) PĚNKAVA, 2x STROJNÍK

STROJNÍK

2x DĚLNÍK

PRAC. DOBA: 1^h 11^h 12^h 17^h 30

MECHANIZACE: DH 308, DH 340, TRAKTOR BAG, 2x TATRA, 1x

2x TATRA, 1x

PRÁCE:

SO 201

- ČERPÁNÍ VODY 8,5h

- ÚPRAVA ZÁKL. SPARKY

- ODVOZ ZOMINY NA SCLADEN

Počasí: 4° - 11°C ZATAŽENO, POLOJASNO, OBČASNÝ DEŠT

6.5.2021

STAV: SOCHŮREK, CBPEK (BES); PĚNKAVA, 4x STROJNÍK,

ČTVRTEK

2x DĚLNÍK

PRAC. DOBA: 7^h 00 - 11^h 30 12^h 30 - 16^h 30 HOD

MECHANIZACE: DH 308, DH 340, TRAKTOR BAG, 2x TATRA,

EL. CENTRÁLA, HUTNÍ DESKA 500KG

PRÁCE: SO 201

- ČERPÁNÍ VODY 8,5 HOD

- ZASYP 1. VRSTVY FRAKCE 150/300

Denní záznam stavby

SD.Č 1.

Název akce: 11/335 - STŘÍBRNÁ SKALICE
1900

List číslo: 18.

Datum

Číslo akce: SO:01,021,101,102,181,190.1,201,202,203,204,301,302,303,401

DALŠÍ PRÁCE : SO 201

6.5. ÚTŘEK

- HUTNĚNÍ 1. VRSTVY ZÁŠYPU
- ZÁŠYP 2. VRSTVY TRAKCE B3/150
- HUTNĚNÍ 2. VRSTVY
- VÝŠKOVÉ ZAMĚŘENÍ Z. S.

SO 202

- ČERPÁNÍ VODY 8,5 HOD ✓
- ODSTRANĚNÍ ČÁSTI ZATRUBNĚNÍ POTOKA
- KONTROLA OBJÍZDNÝCH TRAS STAVBY

POČASÍ : ZATÍŽENO, OBLAČNO - PŘEHÁNKY, VÍTR
+8° - 13°C

7.5. PÁTEK

STAV : SOCHŮREK, CEPEK (BES), PĚNKAVA, 3x STROJNÍK, 2x DĚLNÍK

PRAC. DOBA : 4⁰⁰ - 11³⁰ 12³⁰ - 16³⁰ HOD

MECHANIZACE : DH 308, DH 340, TRAKTORBAGR, 2x TATRA,
EL. CENTRÁLA, HUTNÍCI, DESKA 500KG

PRÁCE : SO 201

- ČERPÁNÍ VODY 8,5 HOD

SO 202

- ÚPRAVA ZATRUBNĚNÍ - OPĚTOVNĚ PO POUKONČENÍ
- ČERPÁNÍ VODY 8,5 HOD
- ÚPRAVA TERÉNU PŘÍJ. CESTY

POČASÍ : +8° - 21°C POLOJASNO, JASNO

8.-9.5.

STAV : CEPEK, PĚNKAVA, 1x STROJNÍK, 2x DĚLNÍK

SO + NE

PRAC. DOBA : 8⁰⁰ - 16⁰⁰ HOD

MECHANIZACE : TRAKTORBAGR, EL. CENTRÁLA, KAL. ČERPADLO

PRÁCE : SO 201, SO 202

- ČERPÁNÍ VODY 14 HOD

TDI : uvnitř stále čerpat vodu!
SO 201 + SO 202

Denní záznam stavby

SD 8.1.

Název akce: 11/335 PŘÍJEZD NA LICHO
1900

List číslo: 20.

Datum

Číslo akce: SO 01, 021, 101, 102, 1P1, 1P0 1, 201, 202, 203, 204, 301, 302, 303, 401

DALŠÍ PRÁCE: SO 202

ÚTERY 11.5.2021

- ČERPÁNÍ SPODNÍ VODY P. 5 HOD.

- ÚPRAVA ZÁKL. SPÁRY

- ZÁSYP 1. VRSTVY A ZATLAČOVÁNÍ KAMENE
FRÁKCI SD. 100/300 + HUTNĚNÍ OP1

- ZÁSYP 2. VRSTVY PO/150, 3. VRSTVY SD. 32/63,
4. VRSTVY 32/63 - (PO NÁSYPU KAŽDÉ VRSTVY
BYLO LOŽE Z. S. ZHUTNĚNO)

- ÚPRAVA PŘÍJEZDOVÝCH A PŘÍSTUPOVÝCH
CEST

SO 201 - PROVEDENÍ ŽEBOŘKY LDD ZÁKL. SPÁRY
ZALOŽENÍ MOSTU viz protokol

POČASI: ZATAŽENO, OBLAČNO - PŘEHÁNKY BOUVLEK
+14°C/18°C

12.5.2021
STŘEDA

STAV: SOCHŮREK, ČEPEK (BES), PĚNKAVA - 2x, 4x STROJNÍK,
2x DĚLNÍK, 2x STAROSTA

MECHANIZACE: DH 30P, DH 340, TRAKTORBAGR, 2x TATRA, EL.
CENTRÁLA, HUTNÍCI DESKA 500KG, 2x ČERPADLO

PRÁCE: SO 202

- ČERPÁNÍ SPODNÍ VODY P. 5 HOD

- ÚPRAVA ZÁKL. SPÁRY OP2, OP1

- ZÁSYP 1. VRSTVY A ZATLAČOVÁNÍ KAMENE SD 100/300,

2. VRSTVY PO/150, 3. VRSTVY SD. 32/63, 4. VRSTVY 32/63

- KAŽDÁ VRSTVA BYLA ZHUTNĚNA!

SO 201, SO 402, SO 403

- ČERPÁNÍ SPODNÍ VODY 6 HOD

SO 402, 403

- VÝKOPOVÉ PRÁCE PRO ULOŽENÍ DNA ŠA1, ŠA2

- ULOŽENÍ DNA ŠA1

ZÁPAS ZHOUBNÝ

ZÁBAH ZASTAVEN

SPÁRY MOSTU SO 201, 202 NA ZÁKLADĚ

ŽEBOŘKY LDD A NOVÝMI K BOSTONÁŘI

PODKLADNÍ BOSTONÁŘ ZALOŽENÍ MOSTU:

BUDOU DODATKY PROTOKOLY Z ŽEBOŘKY LDD

12.5.2021
STŘEDA

Denní záznam stavby

SD 1.

Název akce: 11/335 STRÍBRNÁ SKALICE
1900

List číslo: 21.

Datum

Číslo akce: SO 01, 02, 101, 102, 190, 1, 201, 202, 203, 204, 301, 302, 303, 401

POČASÍ: +11/16°C - PŘEHANKY DEŠT - ZATAŽENO, OBLAČNO

ČTVRTEK

STAV: SOCHŮREK, CEPEK (DES), PĚNKAVA, 4x STROJNÍK, 1x DĚLNÍK,

13. 5. 2021

6x STARMOSTY, SQZ-1x, GEODET

MECHANIZACE: DH 30P, TRAKTORBAGR, 3x EL. CENTRÁLA, 2x TATRA,
2x EL. ČERPADLO, 1x KAL. ČERPADLO

POPIS PRACÍ: SO 202

- OP1, OP2 - ČERPÁNÍ VODY P5+
- PROVEDENÍ STATICKÉ ZATĚŽOVÉ ZKOUŠKY ZA DOZORU TDI (VIZ. PROTOKOL - SQZ) + LDD
- ZAMĚŘENÍ A VYTYČENÍ ZÁKLADŮ OP1, OP2 (VIZ. PROTOKOL GEODETA)
- PŘÍPRAVA ŠALOVÁNÍ PODKLADNÍHO BETONU.

SO 201

- ČERPÁNÍ VODY P5 HO
- ÚPRAVA ZÁKL. SPÁRY PO DEŠTI A EROZI
- VYTYČENÍ A ZAMĚŘENÍ ZÁKLADŮ

ZÁPIS TDI:

14. 5. 2021
pátek 6⁰⁰ hod

Po provedení kontrole zákl. spár na SO 201 a 202 a provedeních stat. zkoušek s výsledkem v souladu s normou přikládám zákládové spáry SO 201 a SO 202 a souhlasím s betonářským podkl. betonem na položení křiží 6T.

Žádám fotografa, aby zajistil snímky pro čerpání vody u základů SO 201 a SO 202 příslušně.

Denní záznam stavby

Název akce: 11/335 STŘÍBRNÁ SKALICE
1900

List číslo: 3.

SO 2.

Datum

Číslo akce: SO 001 021 101 102 181 190 1 201 202 203 204 301 302 303 401
DALŠÍ POPIS PRACÍ: SO 201

28.5.2021
PÁTEK

- ČERPÁNÍ SPODNÍ VODY 24 HOD
 - NATĚRY ZAKLADŮ OP1, OP2 1x ALP, 2x ALN
- SO 202
- ČERPÁNÍ SPODY VODY 24 HOD
 - ODBEDNĚNÍ ZAKLADŮ OP1, OP2
 - OŠETŘOVÁNÍ BETONŮ
 - ÚPRAVA PŘÍJEZDOVÝCH CEST A KOMUNIKACE

POČASÍ: ZATAŽENO, OBLAČNO - PŘEHAŇKY +P/16°C

29.5 - 30.5.2021

PRAC. DOBA: 4⁰⁰ - 11³⁰ 12³⁰ - 16⁰⁰ HOD

SOBOTA - NEDELE

STAV: CEPEK, DUBSKÝ, ŽALUD, 4x TESAR, 3x DĚLNÍK (STAROSTY)

MECHANIZACE: 2x EL. CENTRÁLA, 2x KAL. ČERPADLO

POPIS PRACÍ: SO 201

- NATĚRY ZAKLADŮ OP1, OP2 - ALP 1x, 2x ALN
- ČERPÁNÍ VODY (2x 24 HOD)

SO 202

- DEMONTÁŽ BEDNĚNÍ ZAKLADŮ
- ČISTĚNÍ BEDNĚNÍ
- OŠETŘOVÁNÍ BETONŮ
- ČERPÁNÍ SPODNÍ VODY (4x 24 HOD)
- KONTROLA OBJÍZVÝCH TRAS A DIO STAVBY

POČASÍ: +5/18°C POLOJASNO, JASNO

30.5.2021

STAV: SOCHŮREK, CEPEK (BES), PĚNKAVA, 4x STROJNÍK, 3x DĚLNÍK, PONDĚLÍ
(BENEŠ), ŽALUD, DUBSKÝ, 4x TESAR, 4x DĚLNÍK (STAROSTY), GEODET

PRAC. DOBA: 4⁰⁰ - 11³⁰ 12⁰⁰ - 16⁰⁰ HOD

MECHANIZACE: DH 30P, D304, TRAKTOR BAGR, 2x TATRA VIBR.,
VÁLEC, VIBRAČNÍ DESKA 500kg, 2x EL. CENTRÁLA,
2x KAL. ČERPADLO, DHB 16

PRÁCE: SO 201

- ČERPÁNÍ VODY 24 HOD
 - VRŤÁNÍ TRUP PRO DORAZY BEDNĚNÍ KŘÍDEL A ZÍDKY
 - VYTÝČENÍ VÝŠKOVÝCH A SMĚROVÝCH BODŮ KŘÍDEL A ZÍDKY OP1, OP2
 - ZASYP KABELŮ A POLOŽENÍ OCHRANNÉ FOLIE -
- SD 0/4

Denní záznam stavby

Název akce: 11/335 STŘÍBRNÁ SKALICE
1900

List číslo: 4.

SD 2.

Datum

Číslo akce: SO: 01, 021, 101, 102, 101, 190.1, 201, 202, 203, 204, 301, 302, 303, 401

PRÁCE: SO 202

31.5.2021
PONĚLÍ

- ČERPÁNÍ VODY 24HOD
- ZASYP OKOLO ZAKLADU SD 32/63 u OP1, OP2
- HUTNĚNÍ ZASYPU ZAKLADU
- ÚPRAVA TERÉNU A ODTĚŽENÍ MATERIÁLU PRO PŘÍSTUP A DEMONTÁŽ LARSEN
- VYTÝČENÍ BODŮ PRO KŘÍDLA AZÍDKY u OP1, OP2
- ZAMĚŘENÍ ZAKLADU, PODKLAD, BETONU - SKYT. STAV
- KONTROLA A UKLID PRACOVÍ ŠTĚ

POČASÍ: -9/21°C POLOJASNO, JASNO

PRÁČ. DOBA: 7⁰⁰ - 11³⁰ - 12³⁰ - 17⁰⁰

1.6.2021
ÚTERÝ

STAV: SOCHŮREK, ČEPEK (BES), PĚNKAVA, 4x STROJNÍK, 3x DĚLNÍK
(BENEŠER), ŽALUD, DUBSKÝ, 6x TESÁŘ, 4x DĚLNÍK, 2x STROJNÍK
(STAROSTA)

MECHANIZACE: DH 308, DH 304, DH 316, VIBRAČNÍ DESKA 900KG,
VIBRAČNÍ VÁLEČ, TRAKTOR BAGR, BAGR - IT, 2x TATRA,
2x KAL. ČERPADLO, 2x EL. CENTRÁLNÍ AUTOSPRUKA

POPIS PRÁCE: SO 202

- ČERPÁNÍ VODY 24HOD
- VRTÁNÍ TRNŮ PRO DORAZY BEDNĚNÍ KŘÍDEL
A Z. ŽÍDKY OP1, OP2
- ÚPRAVA TERÉNU PRO PĚŠÍ LÁVKU DLE BOZP
- DOVOZ A SKLÁDÁNÍ BEDNĚNÍ

SO 201

- ČERPÁNÍ VODY 24HOD
- ZASYP OKOLO ZAKLADU OP1, OP2 SD 32/63
- HUTNĚNÍ PO VRSTVÁCH ZASYPU ZAKLADU
- ÚPRAVA TERÉNU A SVAHU OKOLO SO 201
- ZAKOPÁNÍ A ZAKRYTÍ STAV. KABELŮ V CHRÁNICI DLE
BOZP

GEODETIKÝ PROTOKOL

Zápis o předání výsledků geodetických prací číslo 362/2021/JŠ-4

Číslo zakázky: 20210277

Název akce: Zaměření a výpočet průměrné výšky podkladního betonu na SO 201 a 202

Název stavby: II/335 Stříbrná Skalice, průtah

Objednatel: BES s.r.o.

Sukova 625

Benešov 256 01

Zhotovitel: TKP geo s.r.o.

Pracoviště: TKP geo s.r.o.

Plánská 1854/6

JE Temelín

370 07 České Budějovice

373 05 Temelín - elektrárna

Souřadnicový systém: JTSK

Výškový systém: Bpv

Použité podklady: dle skutečnosti

Použité přístroje: Leica TS 16 R500 v.č. 3011311 - kalibrační list VÚGTK/46851/2021

Postup prací: Dne 14.5. 2021 bylo provedeno zaměření podkladního betonu na SO 201 a 202. Zaměření bylo provedeno polární metodou z měřické sítě, která byla stabilizována firmou TKP geo s.r.o. Průměrná výška podkladního betonu na SO 201 odpovídá **300.685m** na ploše **86.4m²**, na SO 202 část a **298.138m** na ploše **32.6m²** a na SO 202 části b odpovídá průměrná výška **298.138m** na ploše **35.1m²**.

Seznam dokumentace:

Seznam souřadnic 2 x A4
Náčrt podkladního betonu 2 x A4


...../4

Zaměřil: Jan Šnorek	Ověřil: Ing. Zuzana Ženíšková	Převzal:
Dne: 14. 5. 2021	Dne: 29. 6. 2021 Číslo: 11/C 2021	Dne:
Zhotovil: Jan Šnorek	Náležitostmi a přesností odpovídá právním předpisům a podmínkám písemně dohodnutým s objednatelem	za BES s.r.o.
Dne: 29. 6. 2021		
Předal:		
Dne:		
za TKP geo s.r.o.		

GROMA v. 7.0		SEZNAM SOUŘADNIC			str. 1/1
Číslo	Y	X	Z	Popis	
101	716 077.421	1 067 389.339	300.682	201-PB	
102	716 076.607	1 067 388.115	300.687	201-PB	
103	716 075.567	1 067 386.304	300.683	201-PB	
104	716 074.140	1 067 384.042	300.674	201-PB	
105	716 072.619	1 067 382.921	300.690	201-PB	
106	716 071.926	1 067 382.322	300.704	201-PB	
107	716 070.966	1 067 382.120	300.707	201-PB	
108	716 069.793	1 067 383.009	300.696	201-PB	
109	716 071.219	1 067 384.950	300.681	201-PB	
110	716 072.696	1 067 386.840	300.677	201-PB	
111	716 073.875	1 067 388.428	300.680	201-PB	
112	716 074.946	1 067 389.904	300.672	201-PB	
113	716 075.470	1 067 390.685	300.670	201-PB	
114	716 074.298	1 067 391.826	300.658	201-PB	
115	716 072.776	1 067 389.899	300.676	201-PB	
116	716 071.710	1 067 388.395	300.684	201-PB	
117	716 070.513	1 067 386.695	300.689	201-PB	
118	716 069.351	1 067 385.182	300.687	201-PB	
119	716 068.459	1 067 384.030	300.697	201-PB	
120	716 066.988	1 067 385.170	300.685	201-PB	
121	716 068.554	1 067 387.184	300.692	201-PB	
122	716 069.851	1 067 389.157	300.686	201-PB	
123	716 071.166	1 067 391.042	300.675	201-PB	
124	716 072.626	1 067 392.953	300.672	201-PB	
125	716 071.304	1 067 393.566	300.711	201-PB	
126	716 070.078	1 067 392.179	300.687	201-PB	
127	716 068.880	1 067 390.567	300.689	201-PB	
128	716 067.749	1 067 388.560	300.685	201-PB	
129	716 066.699	1 067 386.954	300.682	201-PB	
130	716 065.990	1 067 385.926	300.681	201-PB	
131	716 064.715	1 067 386.819	300.678	201-PB	
132	716 066.038	1 067 388.957	300.681	201-PB	
133	716 066.981	1 067 390.569	300.686	201-PB	
134	716 069.310	1 067 393.279	300.700	201-PB	
135	716 070.004	1 067 394.046	300.691	201-PB	
136	716 071.158	1 067 393.606	300.694	201-PB	
137	716 071.911	1 067 393.174	300.684	201-PB	


GROMA v. 7.0		SEZNAM SOUŘADNIC			str. 1/1
Předč.	Číslo	Y	X	Z	Popis
	201	715 957.521	1 067 462.201	298.149	202-PB Část A
	202	715 958.530	1 067 464.157	298.148	202-PB Část A
	203	715 959.500	1 067 466.128	298.141	202-PB Část A
	204	715 960.420	1 067 467.960	298.132	202-PB Část A
	205	715 961.266	1 067 469.544	298.127	202-PB Část A
	206	715 961.899	1 067 470.771	298.132	202-PB Část A
	207	715 960.360	1 067 471.772	298.123	202-PB Část A
	208	715 959.307	1 067 469.951	298.137	202-PB Část A
	209	715 958.382	1 067 468.252	298.148	202-PB Část A
	210	715 957.565	1 067 466.693	298.148	202-PB Část A
	211	715 956.527	1 067 464.924	298.142	202-PB Část A
	212	715 955.816	1 067 463.265	298.143	202-PB Část A
	213	715 953.989	1 067 464.383	298.129	202-PB Část A
	214	715 955.003	1 067 466.661	298.138	202-PB Část A
	215	715 956.263	1 067 468.789	298.133	202-PB Část A
	216	715 957.776	1 067 470.734	298.141	202-PB Část A
	217	715 958.677	1 067 472.275	298.137	202-PB Část A
	218	715 959.363	1 067 472.497	298.133	202-PB Část A
	219	715 951.234	1 067 466.549	298.126	202-PB Část B
	220	715 949.277	1 067 467.971	298.148	202-PB Část B
	221	715 947.959	1 067 469.060	298.144	202-PB Část B
	222	715 949.018	1 067 471.604	298.133	202-PB Část B
	223	715 950.610	1 067 470.611	298.128	202-PB Část B
	224	715 952.349	1 067 469.292	298.124	202-PB Část B
	225	715 953.206	1 067 471.175	298.126	202-PB Část B
	226	715 951.442	1 067 472.431	298.132	202-PB Část B
	227	715 949.741	1 067 473.255	298.145	202-PB Část B
	228	715 950.809	1 067 475.319	298.143	202-PB Část B
	229	715 952.454	1 067 474.403	298.139	202-PB Část B
	230	715 954.287	1 067 473.570	298.139	202-PB Část B
	231	715 954.980	1 067 475.026	298.149	202-PB Část B
	232	715 953.617	1 067 476.286	298.139	202-PB Část B
	233	715 952.615	1 067 477.195	298.150	202-PB Část B
	234	715 951.670	1 067 477.396	298.136	202-PB Část B

Náčrt podkladního betonu SO 201

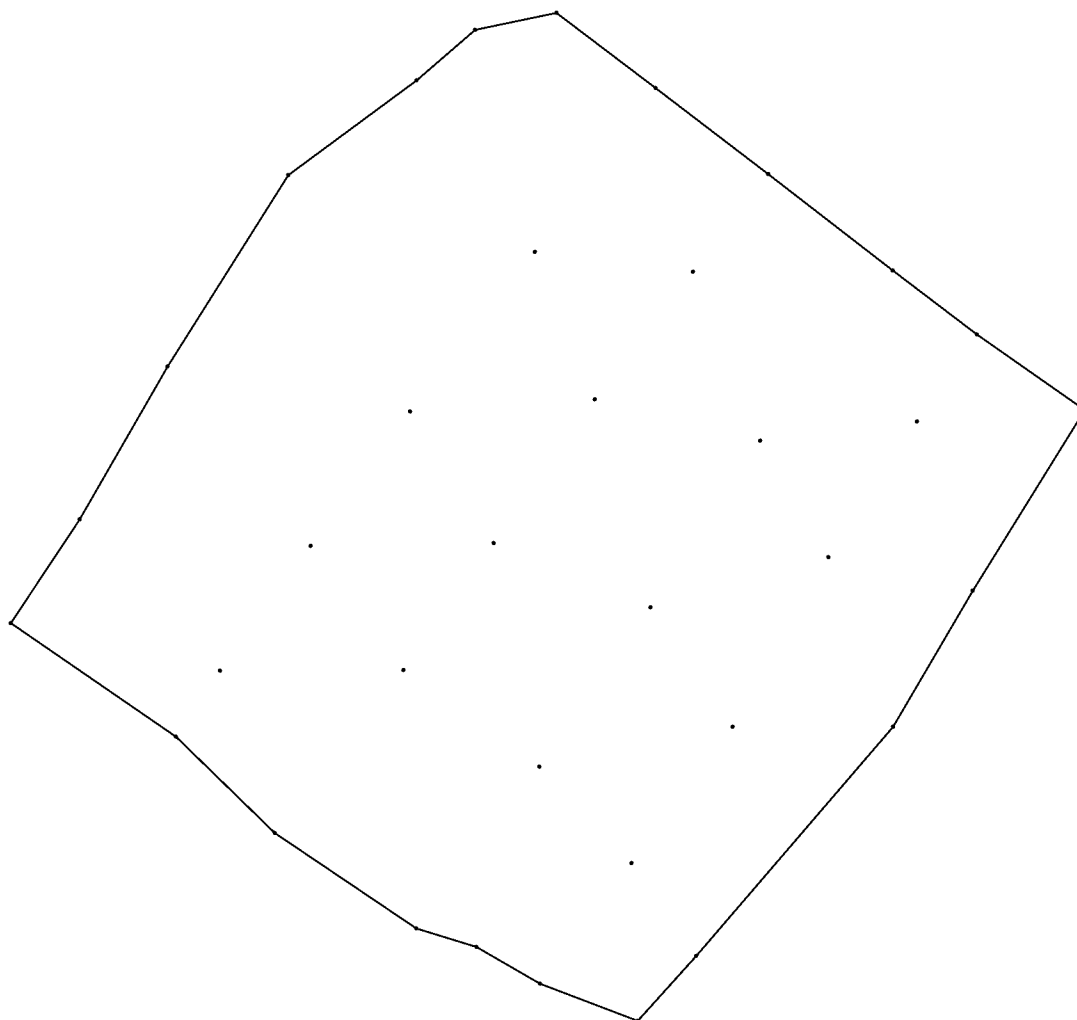

<--- Hradové Střimelice Stříbrná Skalice --->

Náčrt podkladního betonu SO 202

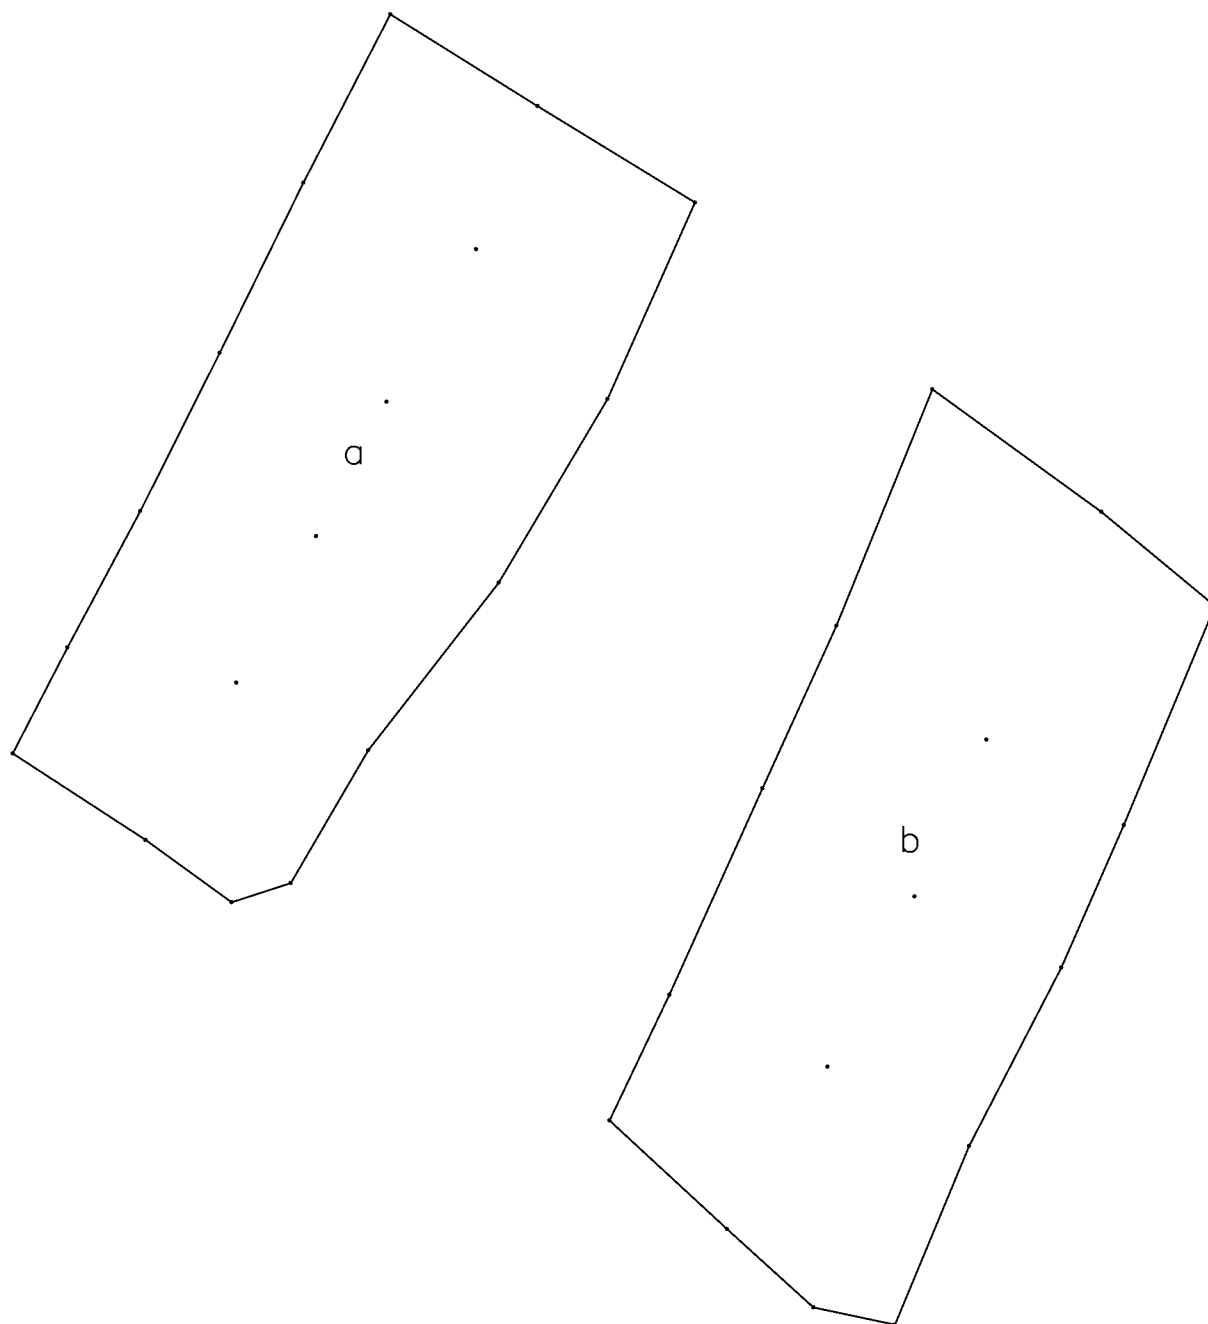

<---Hradové Střimelice Stříbrná Skalice --->

GEODETIKÝ PROTOKOL

Zápis o předání výsledků geodetických prací číslo 366/2021/JŠ-5

Číslo zakázky: 20210277

Název akce: Zaměření a výpočet výšky základové spáry na SO 201 a 202

Název stavby: II/335 Stříbrná Skalice, průtah

Objednatel: BES s.r.o.
Sukova 625
Benešov 256 01

Zhotovitel: TKP geo s.r.o.
Plánská 1854/6
370 07 České Budějovice

Pracoviště: TKP geo s.r.o.
JE Temelín
373 05 Temelín - elektrárna

Souřadnicový systém: JTSK

Výškový systém: Bpv

Použité podklady: dle skutečnosti

Použité přístroje: Leica TS 16 R500 v.č. 3011311 - kalibrační list VÚGTK/46851/2021

Postup prací: Ve dnech 13. 5. 2021 bylo provedeno zaměření základové spáry na SO 201 a 202. Zaměření bylo provedeno polární metodou z měřické sítě, která byla stabilizována firmou TKP geo s.r.o. Výpočet byl proveden v Groma v.7 (data uložena u zpracovatele). Průměrná výška ZS na SO 201 odpovídá **300.555 mnm** na ploše **78.68m²**. Průměrná výška SO 202 A je **297.923 mnm** na ploše **32.23m²** a SO 202 B odpovídá **297.949 mnm** na ploše **35.29m²**.

Seznam dokumentace:

Seznam souřadnic	2 x A4
Náčrt zaměřené frézy	2 x A4


...../4

Zaměřil: Jan Šnorek	Ověřil: Ing. Zuzana Ženíšková	Převzal:
Dne: 13. 5. 2021	Dne: 29. 6. 2021	Číslo: 12/C 2021
Zhotovil: Jan Šnorek	Náležitostmi a přesností odpovídá právním předpisům a podmínkám písemně dohodnutým s objednatelem	
Dne: 29. 6. 2021		
Předal:		
Dne:		
za TKP geo s.r.o.		za BES s.r.o.

GROMA v. 7.0		SEZNAM SOUŘADNIC			str. 1/1
Soubor:					
Předč.	Číslo	Y	X	Z	Popis
	101	716 070.196	1 067 393.935	300.521	ZS SO 201
	102	716 072.132	1 067 392.684	300.548	ZS SO 201
	103	716 073.991	1 067 391.644	300.526	ZS SO 201
	104	716 075.635	1 067 390.292	300.521	ZS SO 201
	105	716 077.147	1 067 388.975	300.625	ZS SO 201
	106	716 075.391	1 067 386.646	300.620	ZS SO 201
	107	716 073.921	1 067 384.651	300.571	ZS SO 201
	108	716 072.303	1 067 382.662	300.611	ZS SO 201
	109	716 071.805	1 067 382.075	300.669	ZS SO 201
	110	716 069.535	1 067 383.636	300.578	ZS SO 201
	111	716 071.347	1 067 385.470	300.522	ZS SO 201
	112	716 072.673	1 067 387.168	300.539	ZS SO 201
	113	716 074.110	1 067 389.376	300.508	ZS SO 201
	114	716 072.078	1 067 390.982	300.475	ZS SO 201
	115	716 070.362	1 067 389.077	300.538	ZS SO 201
	116	716 069.169	1 067 387.358	300.537	ZS SO 201
	117	716 067.700	1 067 385.351	300.524	ZS SO 201
	118	716 065.718	1 067 386.823	300.536	ZS SO 201
	119	716 067.638	1 067 388.345	300.499	ZS SO 201
	120	716 069.208	1 067 389.954	300.538	ZS SO 201
	121	716 070.725	1 067 391.986	300.499	ZS SO 201
	122	716 068.789	1 067 392.855	300.627	ZS SO 201
	123	716 067.244	1 067 391.003	300.614	ZS SO 201
	124	716 065.897	1 067 389.259	300.592	ZS SO 201
	125	716 064.756	1 067 387.697	300.512	ZS SO 201


GROMA v. 7.0		SEZNAM SOUŘADNIC			str. 1/1
Soubor:					
Předč.	Číslo	Y	X	Z	Popis
	201	715 954.631	1 067 474.850	297.924	ZS SO 202 Část B
	202	715 953.774	1 067 476.074	298.023	ZS SO 202 Část B
	203	715 952.767	1 067 476.947	297.991	ZS SO 202 Část B
	204	715 951.785	1 067 477.510	297.928	ZS SO 202 Část B
	205	715 950.754	1 067 474.963	297.921	ZS SO 202 Část B
	206	715 952.557	1 067 474.002	297.951	ZS SO 202 Část B
	207	715 953.793	1 067 472.883	297.937	ZS SO 202 Část B
	208	715 953.282	1 067 471.300	297.914	ZS SO 202 Část B
	209	715 951.316	1 067 472.471	297.947	ZS SO 202 Část B
	210	715 950.062	1 067 473.777	297.929	ZS SO 202 Část B
	211	715 949.135	1 067 471.635	297.951	ZS SO 202 Část B
	212	715 951.133	1 067 470.738	297.924	ZS SO 202 Část B
	213	715 952.848	1 067 470.126	297.968	ZS SO 202 Část B
	214	715 951.937	1 067 468.557	297.943	ZS SO 202 Část B
	215	715 950.208	1 067 469.290	297.926	ZS SO 202 Část B
	216	715 948.561	1 067 470.483	297.898	ZS SO 202 Část B
	217	715 948.061	1 067 468.947	297.989	ZS SO 202 Část B
	218	715 949.855	1 067 467.679	297.974	ZS SO 202 Část B
	219	715 951.297	1 067 466.753	297.990	ZS SO 202 Část B
	220	715 961.631	1 067 470.522	297.947	ZS SO 202 Část A
	221	715 960.134	1 067 471.430	297.917	ZS SO 202 Část A
	222	715 958.883	1 067 471.942	297.921	ZS SO 202 Část A
	223	715 957.701	1 067 470.177	297.918	ZS SO 202 Část A
	224	715 958.948	1 067 469.368	297.885	ZS SO 202 Část A
	225	715 960.542	1 067 468.537	297.924	ZS SO 202 Část A
	226	715 959.488	1 067 466.672	297.922	ZS SO 202 Část A
	227	715 957.973	1 067 467.665	297.902	ZS SO 202 Část A
	228	715 956.255	1 067 468.862	297.875	ZS SO 202 Část A
	229	715 955.443	1 067 467.163	297.915	ZS SO 202 Část A
	230	715 956.947	1 067 466.086	297.920	ZS SO 202 Část A
	231	715 958.868	1 067 465.330	297.925	ZS SO 202 Část A
	232	715 957.837	1 067 463.631	297.954	ZS SO 202 Část A
	233	715 956.229	1 067 465.105	297.940	ZS SO 202 Část A
	234	715 954.825	1 067 465.923	297.920	ZS SO 202 Část A
	235	715 954.478	1 067 464.235	297.961	ZS SO 202 Část A
	236	715 955.838	1 067 463.435	297.936	ZS SO 202 Část A
	237	715 957.351	1 067 462.544	297.958	ZS SO 202 Část A

Náčrt základové spáry 201

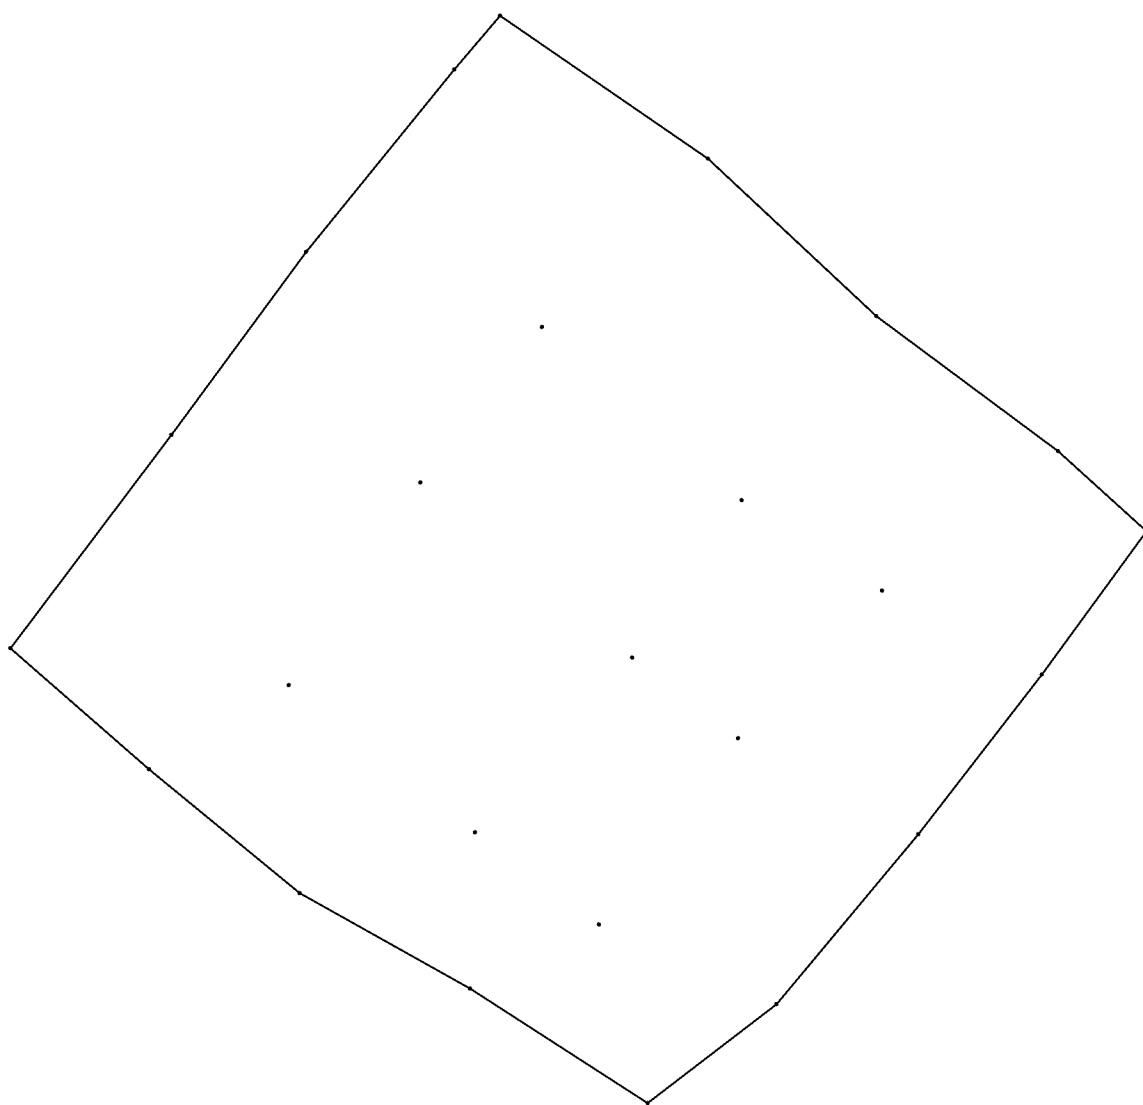

<--- Hradové Střimelice Stříbrná Skalice --->

Náčrt základové spáry SO 202

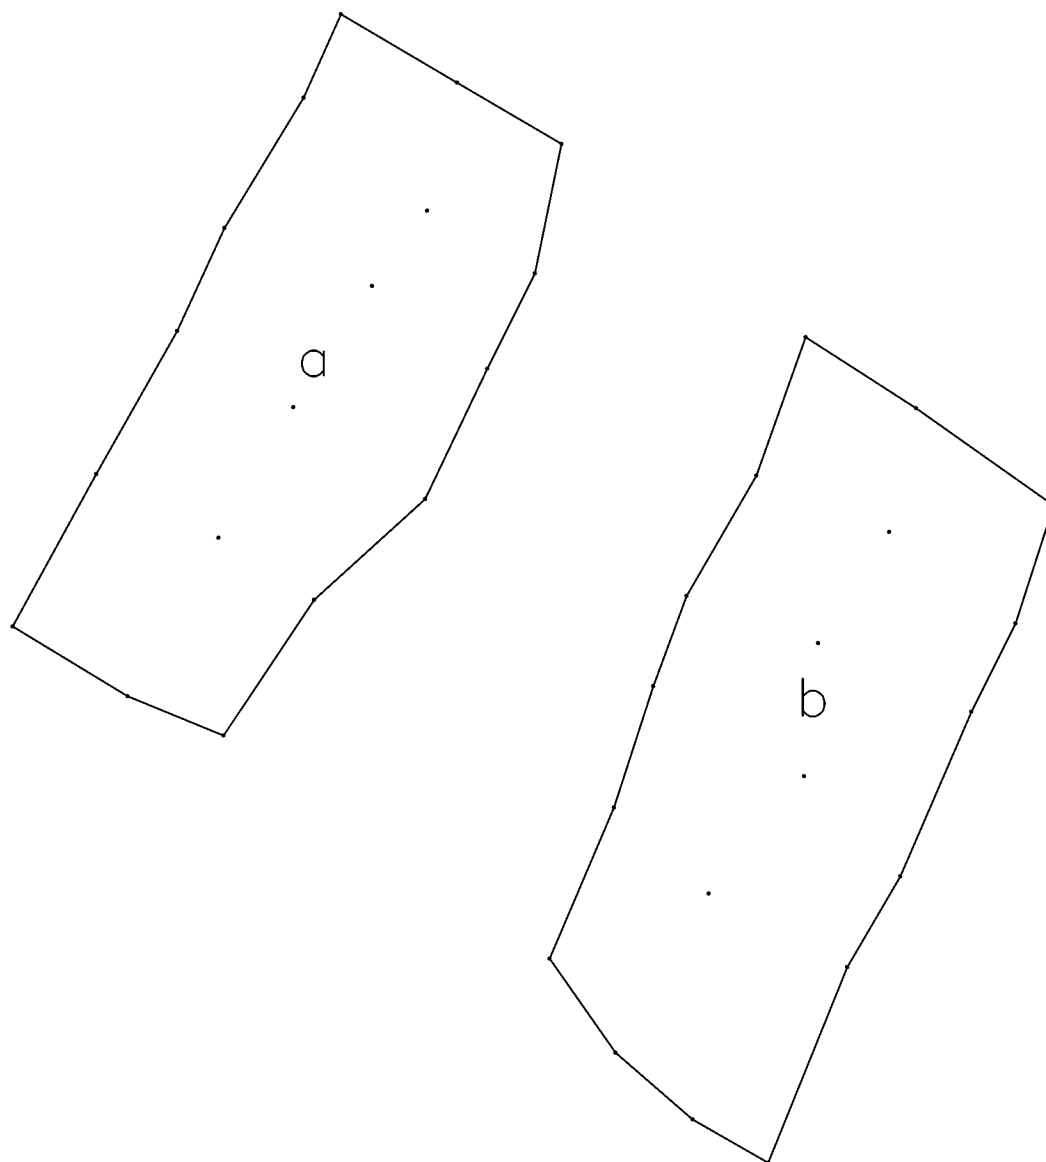

<--- Hradové Střimelice Stříbrná Skalice --->

FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY

„II/335 Stříbrná Skalice – průtah, stavební práce“

K rukám:

Jan Zákostelský – Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o.

Ing. Jan Sedláček – Technický dozor investora

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název stavby/projektu	II/335 Stříbrná Skalice – průtah, stavební práce
Název veřejné zakázky	II/335 Stříbrná Skalice – průtah, stavební práce
Zhotovitel	Společnost Stříbrná Skalice, B E S – MTS Infra
	B E S s.r.o. (vedoucí společník) se sídlem Sukova 625, 256 01 Benešov, IČO 437 92 553
	Metrostav Infrastructure a.s. se sídlem Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8, IČO 242 04 005
Osoba oprávněná jednat za zhotovitele	Ing. Luboš Kurz a Petr Váňa – jednatele vedoucího společníka

SMLOUVA O DÍLO

Číslo SoD objednatele	S-3430/00066001/2020
Číslo SoD zhotovitele	S 131/2020
Termín plnění	14 měsíců od předání staveniště Zhotoviteli (tj. od 23.3.2021)
Celková cena díla	72 999 240,68 Kč bez DPH

Ve vztahu k nadepsané smlouvě o dílo uzavřené v návaznosti na výše uvedenou veřejnou zakázku ohlašujeme v souladu s čl. 2 smlouvy o dílo a v souladu s její přílohou č. 4 – *Směrnice upřesňující provádění změn závazků podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek („Směrnice“)*, změnu stavby, která dle analýzy zhotovitele představuje v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („ZZVZ“), změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

Dle názoru zhotovitele se dle ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ jedná o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku nepředvídatelných okolností. Bližší informace jsou uvedeny dále.

Zhotovitel předkládá za účelem zajištění řádného postupu ohlášení změny tento formulář, jehož součástí tvoří veškeré přílohy vyžadované ustanovením § 18 odst. 1 Směrnice.

Zhotovitel níže uvádí přehled skutečností nutných k posouzení této změny a její dopady na termín plnění a celkové náklady stavby.


PŘEHLED ZAMÝŠLENÉ ZMĚNY ZÁVAZKU ZE SMLOUVY

Podstata změny	Navýšení nákladů změnu založení stavebních objektů SO 201 a SO 202 - mosty v intravilánu obce Stříbrná Skalice.
Důvody potřeby změny, popis problému	Na SO 201 a SO 202, vzniknou na základě nevhodného stávajícího podloží, zvodnatělá a neúnosná základová spára, vícepráce. Vícepráce spočívají v rozšíření zemních prací a zlepšení únosnosti podloží a základové spáry. Řešení tohoto problému má i negativní dopad na průběh stavby, jelikož její průběh pozdržel již o více jak 30 dní.
Čeho se zhotovitel domáhá	Úhrady vícenákladů za provádění prací na objektech SO 201 a SO 202.
Vliv na termín plnění	Prodloužení termínu plnění
Vliv na celkovou cenu díla	Navýšení celkových nákladů
Kategorizace změny dle ZZVZ	Změna nepředvídatelná

V Benešově dne 31.5.2021

V Praze dne

Za objednatele změnu potvrzuje


Ing. Luboš Kurz
jednatel

Počet listů: 2

Seznam příloh:

Příloha č. 1 – Kalkulace vícenákladů – SO 201 a SO 202

Soupis prací objektu

Stavba:

ZBV Mosty

434 856,91

Rozpočet:

SO 201

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
0			Všeobecné konstrukce a práce				12 579,84
6	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	120,960	104,00	12 579,84
			zemina 120,96m3				
			zahrnuje veškeré poplatky provozovatele skládky související s uložením odpadu na skládce				
1			Zemní práce				81 527,04
1	124838		VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČI TR. II, ODVOZ DO 20KM	M3	120,960	664,00	80 317,44
			jáma mostu SO 201 9,6x9x1,4=120,96m3				
			položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapážené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztlížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztlížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytažování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepážování (výjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, slěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č. 0141**				
7	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	86,400	14,00	1 209,60
			položka zahrnuje úpravu pláň včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt				
2			Zaklady				64 627,20
9	27232A		ZAKLADY ŽE ŽELEZOBETONU DO C20/25	M3	19,008	3 400,00	64 627,20
			9,6x9,9x0,2=19,008m3				
			požadované množství betonu "betonové směsi" požadované kvality, jeho "druhem" do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odběhovacích a odkružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, náhlků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztlížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztlížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu				
4			Vodorovné konstrukce				276 122,83
8	421366		VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z KARI SITI	T	0,928	25 200,00	23 385,60
			0,92835				
			položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnírostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,				
3	45152		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRČENÉHO	M3	77,568	1 151,60	89 327,31
			Podkladní vrstva II. 90cm 25,856x3=77,568m3				
			položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnírostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál				
10	452211		PODKLAD KONSTR. Z LOM KAMENE NA SUCHO	M3	51,712	3 160,00	163 409,92
			Zatlačovaný kámen - 60cm 25,856x2=51,712m3				
			položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnírostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením				

Soupis prací objektu

Stavba:

ZBV Mosty

415 303,73

Rozpočet:

SO 202

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
0			Všeobecné konstrukce a práce				13 138,94
5	014101		POPLATKY ZA SKLADKU	M3	126,336	104,00	13 138,94
1			Zemní práce				85 153,12
1	124838		VYKOPAVKY PRO KORYTA VODOTEČI TR. II, ODVOZ DO 20KM (9,6x4,7x2)x1,4=126,34m ³	M3	126,340	664,00	83 889,76
2			ÚPRAVA PLANE SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I				1 263,36
2	18110		9,6x4,7x2=90,24m ²	M2	90,240	14,00	1 263,36
2			Zaklady				61 363,20
7	27232A		ZAKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C20/25 9,6x4,7x2x0,2=18,048m ³	M3	18,048	3 400,00	61 363,20
4			Vodoravné konstrukce				255 648,47
6	421366		VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z KARI SITI 0,88146t	T	0,881	25 200,00	22 201,20
4			Podkladní a vyplňovací vrstvy z kameniva drceného				62 352,23
4	45152		podkladní vrstva II, 60cm (9,6x4,7x2x0,3)x2=54,144m ³	M3	54,144	1 151,60	62 352,23
8			Podklad konstrukce z lom kamene na sucho				171 095,04
8	452211		zatláčení II, 60cm (9,6x4,7x2x0,3)x2=54,144m ³	M3	54,144	3 160,00	171 095,04

FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY

„II/335 Stříbrná Skalice – průtah, stavební práce“

K rukám:

Jan Zákostelský – Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o.

Ing. Jan Sedláček – Technický dozor investora

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název stavby/projektu	II/335 Stříbrná Skalice – průtah, stavební práce
Název veřejné zakázky	II/335 Stříbrná Skalice – průtah, stavební práce
Zhotovitel	Společnost Stříbrná Skalice, B E S – MTS Infra
	B E S s.r.o. (vedoucí společník) se sídlem Sukova 625, 256 01 Benešov, IČO 437 92 553
	Metrostav Infrastructure a.s. se sídlem Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8, IČO 242 04 005
Osoba oprávněná jednat za zhotovitele	Ing. Luboš Kurz a Petr Váňa – jednatele vedoucího společníka

SMLOUVA O DÍLO

Číslo SoD objednatele	S-3430/00066001/2020
Číslo SoD zhotovitele	S 131/2020
Termín plnění	14 měsíců od předání staveniště Zhotoviteli (tj. od 23.3.2021)
Celková cena díla	72 999 240,68 Kč bez DPH

Ve vztahu k nadepsané smlouvě o dílo uzavřené v návaznosti na výše uvedenou veřejnou zakázku ohlašujeme v souladu s čl. 2 smlouvy o dílo a v souladu s její přílohou č. 4 – *Směrnice upřesňující provádění změn závazků podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek („Směrnice“)*, změnu stavby, která dle analýzy zhotovitele představuje v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („ZZVZ“), změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

Dle názoru zhotovitele se dle ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ jedná o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku nepředvídatelných okolností. Bližší informace jsou uvedeny dále.

Zhotovitel předkládá za účelem zajištění řádného postupu ohlášení změny tento formulář, jehož součástí tvoří veškeré přílohy vyžadované ustanovením § 18 odst. 1 Směrnice.


Zhotovitel níže uvádí přehled skutečností nutných k posouzení této změny a její dopady na termín plnění a celkové náklady stavby.

PŘEHLED ZAMÝŠLENÉ ZMĚNY ZÁVAZKU ZE SMLOUVY

Podstata změny	Navýšení nákladů změnou materiálu k obsypům/zásypům objektů SO 201 a SO 202 - mosty v intravilánu obce Stříbrná Skalice.
Důvody potřeby změny, popis problému	Na SO 201 a SO 202 byl dle zadávací PD navržen obsyp mostních základů ze zeminy. Z důvodu vyšší hladiny spodní vody byla navržena výměna zeminy za štěrkodrt', aby docházelo k lepšímu odvodňování v okolí mostních základů.
Čeho se zhotovitel domáhá	Úhrady vícenákladů za provádění prací na objektech SO 201 a SO 202.
Vliv na termín plnění	Nemá vliv na termín
Vliv na celkovou cenu díla	Navýšení celkových nákladů
Kategorizace změny dle ZZVZ	Záměna položek

V Benešově dne 18.8.2021

Za zhotovitele


Petr Váňa
jednatel

V Praze dne

Za objednatele změnu potvrzuje



Počet listů: 2

Seznam příloh:

Bez příloh

FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY

„II/335 Stříbrná Skalice – průtah, stavební práce“

K rukám:

Jan Zákostelský – Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o.
Ing. Jan Sedláček – Technický dozor investora

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název stavby/projektu	II/335 Stříbrná Skalice – průtah, stavební práce
Název veřejné zakázky	II/335 Stříbrná Skalice – průtah, stavební práce
Zhotovitel	Společnost Stříbrná Skalice, B E S – MTS Infra
	B E S s.r.o. (vedoucí společník) se sídlem Sukova 625, 256 01 Benešov, IČO 437 92 553
	Metrostav Infrastructure a.s. se sídlem Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8, IČO 242 04 005
Osoba oprávněná jednat za zhotovitele	Ing. Luboš Kurz a Petr Váňa – jednatele vedoucího společníka

SMLOUVA O DÍLO

Číslo SoD objednatele	S-3430/00066001/2020
Číslo SoD zhotovitele	S 131/2020
Termín plnění	14 měsíců od předání staveniště Zhotoviteli (tj. od 23.3.2021)
Celková cena díla	72 999 240,68 Kč bez DPH

Ve vztahu k nadepsané smlouvě o dílo uzavřené v návaznosti na výše uvedenou veřejnou zakázku ohlašujeme v souladu s čl. 2 smlouvy o dílo a v souladu s její přílohou č. 4 – *Směrnice upřesňující provádění změn závazků podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek („Směrnice“)*, změnu stavby, která dle analýzy zhotovitele představuje v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („ZZVZ“), změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

Dle názoru zhotovitele se dle ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ jedná o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku nepředvídatelných okolností. Bližší informace jsou uvedeny dále.

Zhotovitel předkládá za účelem zajištění řádného postupu ohlášení změny tento formulář, jehož součástí tvoří veškeré přílohy vyžadované ustanovením § 18 odst. 1 Směrnice.

Zhotovitel níže uvádí přehled skutečností nutných k posouzení této změny a její dopady na termín plnění a celkové náklady stavby.

PŘEHLED ZAMÝŠLENÉ ZMĚNY ZÁVAZKU ZE SMLOUVY

Podstata změny	Navýšení nákladů změnou zatrubnění k převedení vody a opomenutí položky vytažení štětových stěn na SO 202. U štětové stěny bylo při realizaci navíc zjištěno, že je nutné navýšení celkové plochy štětovnic.
Důvody potřeby změny, popis problému	Na SO 202 byla navýšena kapacita potrubí k převedení vody z DN 600 na DN 1000. Důvodem tohoto zkapacitnění bylo zvýšené průtokové množství vody v období započetí stavby což vedlo k zaplavení pozemků s rodinným domem a dalších nemovitostí po přítoku Jevanského potoka. V soupisu prací byla opomenuta položka demontáže štětovnicové stěny. Tyto práce totiž nejsou zahrnuty v položce 23117A – <i>Štětové stěny beraněné u kovových dílců provizorní</i>. Aby štětovnice splňovaly svou funkci, bylo nutné navýšit jejich množství oproti původnímu výkazu výměr.
Čeho se zhotovitel domáhá	Úhrady vícenákladů za provádění prací na SO 202.
Vliv na termín plnění	Nemá vliv na termín plnění
Vliv na celkovou cenu díla	Navýšení celkových nákladů
Kategorizace změny dle ZZVZ	Změna nezbytná

V Benešově dne 14.7.2021

Za zhotovitele


Ing. Luboš Kurz
jednatel

V Praze dne

Za objednatele změnu potvrzuje

Počet listů: 2

Seznam příloh:

Bez příloh

BES s.r.o., Sukova 625, 256 17 Benešov

Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 7496

IC 43792553 DIC CZ43792553 Bankovní spojení – Česká spořitelna a.s., č. ú. 321096349/0800, Komerční banka a.s., 3300121/0100

T +420 317 722 811, +420 317 725 691 F +420 317 725 691

www.besbn.cz

Firma je registrována v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze – oddíl C, vložka 31260

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Naše zn.: APIS-0107/2021

Vyřizuje: Ing. Libor Pokorný

Tel: +420 602 142 660

E-mail: tomas.kaplan@apis-sro.eu

**Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, přísp. org.**

k rukám p. Zákostelského
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Datum: 27.4.2021

Věc: „II/335 Stříbrná Skalice, průtah“

Vyjádření AD – Založení mostního objektu SO 201 a SO 202

Vážený pane Zákostelský,

na základě Vaší výzvy z jednání 21.4.2021 na KSÚS Vám z hlediska způsobu založení sdělujeme následující stanovisko:

Realizace plošného založení SO 201 a 202 dle našeho návrhu v PDPS je možná, pouze vyžaduje technologickou kázeň zhotovitele při následném principiálním postupu prací:

Současný stav:

- trvalé průsaky podzemních (i povrchových) vod do výkopu
- občasné a nedostatečné čerpání vod z výkopu
- základová spára (ZS) je prohloubena o cca 0,5 m u SO 201 a 0,3 m u SO 202
- po přetěžení ZS u SO 201 tvoří podloží zeminy charakteru zahliněných písčitých štěrků (G4 - G3)

Nutná opatření u objektu SO 201

- v rohu stavební jámy (mimo základ) zřídit jímku se dnem min. 0,5 m pod úroveň základové spáry (ZS)
- trvalé čerpání průsakových vod - v nočních hodinách nelze čerpání přerušit - zřídit službu
- následně odstranit značně degradované zeminy ZS v tl. cca 0,3 m

Sanace základové spáry u objektu SO 201

- uložit 1. vrstvu fr. 63/125, resp. v případě kašovitého stavu zemin bude vhodnější fr. 63/250, tl. cca 0,3 (0,4) m a zavibrovat do podloží (deska 500kg, alt. válec 1t)
- 2. vrstvu tl. 0,3 m vytvořit z frakce 63/125 - resp. v případě vyhovujícího stavu 1. vrstvy po zavibrování realizovat 2. vrstvu z fr. 0/63 (bude upřesněno v průběhu prací)
- povrch vyrovnat do úrovně kóty ZS fr. 0/32 (v případě fr. 0/63 nebude nutné)

Vzhledem ke specifickým podmínkám v místě stavby nelze zcela přesně predigovat sled vrstev při sanaci ZS, je však bezpodmínečně nutné výše uvedené trvalé čerpání průsakových vod, do doby realizace základové konstrukce a následně pak při provádění zpětných zásypů.

Na takto vytvořeném dnu (kóta dna dle projektu) v prostoru jímek zhotovit (resp. nahradit) původně navrhované podkladní vrstvy (štěrkopísek + podkladní beton, celkem 200 mm) pouze podkladním betonem tloušťky 200 mm s výztužnými sítěmi při obou površích a v celé šířce jímky. U objektu SO 202 lze doporučit separování líce štětovnic od betonování této desky, aby se mohly následně snadno vytahovat (pásek lepenky, nátěr pruhu štětovnic vyjetým motorovým olcjem apod.) .

Na podkladní desce dále pokračuje výstavba dle vypracované RDS (izolace, bednění, kladení výztuže základů atd.).

Sanace základové spáry u objektu SO 202

postup sanace základové spáry bude upřesněn po odčerpání průsakových vod a ověření kvality materiálu v ZS. Předpokládám obdobný postup jako u SO 201, případně mírně modifikovaný s ohledem na stabilitu štětovnicových pažících stěn.

Provádění zlepšování základové půdy musí být potvrzeno technickým dozorem.

Technických řešení založení je samozřejmě více, ale oba IG – průzkumy zjištěnou kvalitou zemin v podloží základových spár potvrzují možnost plošného založení. V případě objevení odlišných vlastností podloží (přitom bylo provedeno v obou průzkumech celkem 6 vrtů pro účel založení mostů) lze výše uvedeným způsobem rovněž umožnit plošné založení.

Děkuji za spolupráci a jsem s pozdravem



Ing. Tomáš Kaplan
autorský dozor

BES s.r.o.
Sukova 625
256 01 Benešov
IČO: 43792553

vyřizuje telefon
Jan Zákostelský Dis.

Říčany
24.8.2021

Věc: Souhlas s navrženým řešením u akce „II/335 Stříbrná Skalice, průtah“

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o. v rámci akce „**II/335 Stříbrná Skalice, průtah**“ po projednání s TDS a AD **souhlasí** s navrženým řešením.

Stručný popis změn včetně návrhu řešení:

- SO 201 a SO 201
 - Na základě nevhodného stávajícího podloží vznikla zvodnatělá a neúnosná základová spára. Zhotovitel provede rozšíření zemních prací a zlepšení únosnosti podloží a základové spáry, dle návrhu geotechnika.
 - nutnost provedení manipulace s kabelem NN. S manipulací jsou spojeny další práce včetně ručně kopaných sond, montáž a přestavba podpěrných konstrukcí, jeřábnické práce, zásypy a vytyčení odborným pracovníkem
 - Z důvodu vyšší hladiny spodní vody byla navržena výměna materiálu pro obsyp mostních základů. Oproti zadávací PD bude použita štěrkožlutá.

- SO 202
 - Navýšení kapacity potrubí k převedení vody z DN 600 na DN 1000. Z důvodu zvýšení průtokového množství vody v období zahájení stavby, což vedlo k zaplavení pozemků s rodinným domem a dalších nemovitostí.
- SO 101
 - Po odkrytí pláně byly provedeny zkoušky akreditovanou laboratoří. Statické zatěžovací zkoušky dle ČSN 721006. Na základě jejích výsledků došlo k provedení posouzení zemin a výsledky těchto zkoušek navrhuji úpravu aktivní zóny za pomoci hydraulických pojiv.

Tímto žádáme zhotovitele, aby zpracoval dokumentaci ZBV k výše uvedeným změnám v souladu s příslušnou směrnicí KSÚS SK.

S pozdravem



Ing. Jan Lichtneger
ředitel KSÚS

Zápis z kontrolního dne stavby

II/335 Stříbrná Skalice – průtah

Kontrolní denčíslo **4** konaný dne **27.4.2021****Etapa č.1 – ZÚ obce až po křižovatku s III/1082****Účastníci**

Seznam účastníků je uveden v příloze č.1 - Prezenční listina

Program kontrolního dne

1. Kontrola úkolů a prací
2. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby:
 - a) plnění věcného harmonogramu
 - b) popis provedených prací
 - c) finanční plnění
 - d) fotodokumentace
3. Kontrola kvality
4. Stav BOZP a PO
5. Různé
6. Nové úkoly

1. Kontrola úkolů a prací

Úkol číslo	Název	Skutečný stav plnění úkolu	Splněno
	SO 101	- provedeno kácení porostů v době vegetačního klidu - provedeno seřiznutí krajnic a čištění příkopů - provedeno odfrézování konstrukčních vrstev a odvoz vyteženého materiálu - provedeno provizorní zatrubnění	Ano Ano Ano Ano
	SO 201	- dokončeno bourání mostu - provedeno provizorní vyvěšení kabelů - provedeno přeložení vodoteče (bajpás)	Ano Ano Ano
	SO 202	- dokončeno bourání mostu - dokončena montáž provizorní lávky a schodů pro pěší - provedeno provizorní vyvěšení kabelů - provedena staveništní komunikace (bajpás) - provedeno zatlučení štětovnic	Ano Ano Ano Ano Ano

Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby

a) plnění věcného harmonogramu	Práce probíhají v souladu s předloženým HGM
b) popis provedených prací	viz.1. Kontrola úkolů
c) finanční plnění	Za 03/2021 byla odsouhlasena fakturace zhotovitele
d) fotodokumentace	Je prováděna průběžně TDS, zhotovitelem a KooBOZP

3. Kontrola kvality

zpráva o hodnocení kvality za uplynulé období	Práce jsou prováděny v souladu s PD, zhotovitel předkládá TDS k odsouhlasení TePř pro provádění stavebních prací postupně v souladu s HMG stavby T: průběžně
zkoušky dle KZP	Termín zkoušek bude včas oznámen TDS, nejméně 5 dnů předem, v případě změny termínu zkoušky volat TDS (731 648 885).

4. Stav BOZP

KooBOZP informuje, že závady řeší operativně na místě se zástupcem zhotovitele popř. zápisem do stavebního deníku a protokolem o provedené kontrole zaslané emailem (viz. samostatné zápisy KooBOZP)

5. Různé

Zhotovitel informuje, že velikost zatrubnění potoka, vzhledem k průtoku vody, změnil oproti PDPS z 2xDN600 na 2xDN1000 – nutno projednat s AD stavby Ing. Kaplanem-bylo odsouhlaseno

Objednatel upozorňuje zhotovitele, že veškeré změny oproti PDPS je předem nutno konzultovat s AD projektanta a objednatelem.

6. Nové úkoly

Úkol číslo	Název	Obsah úkolu a požadovaný cílový stav	Odpovídá	Termín
1	DIO	Zhotovitel prostřednictvím svého subdodavatele 3K značky bude pravidelně kontrolovat správné značení vč. objízdnych tras	zhotovitel	T: průběžně
2	SO 201	Zhotovitel dokončil bourání mostu a provedl přeložku vodoteče Další postup prací závisí na vyjádření nezávislého Geotechnika a následně AD, který předá stanovisko	Zhotovitel+AD	T: 27.4.2021
3	SO 202	Zhotovitel dokončil bourání mostu a odvodnění základové spáry pomocí štětovnic a čerpáním vody, další postup prací resp. založení opěr mostu závisí na vyjádření nezávislého Geotechnika a následně AD projektanta, který předá stanovisko	Zhotovitel+AD	T: 27.4.2021
4	Přeložky kabelů	Budou prověřeny možnosti překládky kabelů s pracovníkem ČEZ p. Šmejkaem a projektantem (urychlit žádost + návrh varianty)	objednatel zhotovitel	T: 27.4.2021 trvá
5	Pasportizace	Zhotovitel zajistí pasport přilehlých objektů průtahu obce Stříbrná Skalice Zhotovitel informuje, že jedná s firmou, která se specializuje na pasport staveb	zhotovitel	T: co nejdříve
6	RDS	Zhotovitel bude svolávat výrobní výbory k projednání RDS a provede z těchto VV zápis	zhotovitel	T: průběžně
7	RDS podpisový rámec	Zhotovitel zpracuje podpisový rámec pro evidenci odsouhlasených RDS	zhotovitel	T: průběžně
8	Zpráva o postupu prací – měsíční zprávy	Zhotovitel vždy do 7 dnů od ukončení každého kalendářního měsíce předá el. poštou objednateli KSÚS, obci Stříbrná Skalice a Tech. dozorům staveb písemnou zprávu o postupu prací za uplynulý měsíc vč. fotodokumentace	zhotovitel	T: průběžně
9	SO 102 - chodníky	Zhotovitel informuje investora-obec Stříbrná Skalice, že se založením chodníků I.etapy bude požadovat vícenáklady – investor tento návrh zásadně odmítá a sděluje, že zhotovitel si	Objednatel	T: 4.5.2021

		musí tento návrh vyřešit v rámci své cenové nabídky, kterou předal investorovi ve výběrovém řízení před zahájením stavby. Koncept RDS byl předán k připomínkám objednateli, který se vyjádří do příštího KD.	
--	--	--	--

7. Závěr

Datum konání příštího KD	úterý 4.5.2021 od 10hod na OÚ Stříbrná Skalice
--------------------------	--

Zapsal Ing. Jan Sedláček - TDS



PREZENČNÍ LISTINA

NÁZEV AKCE, PŘEDMĚT JEDNÁNÍ	II/335 Stříbrná Skalice, průtah 4.kontrolní den
DATUM	27.4.2021
MÍSTO	OÚ Stříbrná Skalice

JMÉNO A PŘÍJMENÍ	ORGANIZACE	TELEFON / E-MAIL	PODPIS
Jan Zákostelský	KSÚS Stř.kr.	601 450 684	
Ing. Tomáš Kaplan	APIS, s.v.č.		
PhDr. Miroslav Šmied, Ph.D.	Obec Stříbrná Skalice		
Ing. Jan Sedláček	SUDOP PRAHA a.s.		
Mgr. Tomáš Koranda	SUDOP PRAHA a.s.		
Ing. Rudolf Havlík	Obec Stříbrná Skalice		
Ing. Zdeněk Račan	BES s.r.o.		
Milan Sochůrek	BES s.r.o.		
Jakub Žalud	STARMOSTY s.r.o.		
Vojtěch Brodský	STARMOSTY s.r.o.		
Ing. Marek Sládek	BES s.r.o.		
PEVKA VAČLAV	ČENEGEB s.v.č.		



Zápis z kontrolního dne stavby

II/335 Stříbrná Skalice – průtah

Kontrolní den

číslo **6** konaný dne **11.5.2021**

Etapa č.1 – ZÚ obce až po křižovatku s III/1082

Účastníci

Seznam účastníků je uveden v příloze č.1 - Prezenční listina

Program kontrolního dne

1. Kontrola úkolů a prací
2. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby:
 - a) plnění věcného harmonogramu
 - b) popis provedených prací
 - c) finanční plnění
 - d) fotodokumentace
3. Kontrola kvality
4. Stav BOZP a PO
5. Různé
6. Nové úkoly

1. Kontrola úkolů a prací

Úkol číslo	Název	Skutečný stav plnění úkolu	Splněno
	SO 101	- provedeno kácení porostů v době vegetačního klidu	Ano
		- provedeno seřiznutí krajnic a čištění příkopů	Ano
		- provedeno odfrézování konstrukčních vrstev a odvoz vytěženého materiálu	Ano
		- provedeno provizorní zatrubnění	Ano
		- dokončeno bourání mostu	Ano
	SO 201	- provedeno provizorní vyvěšení kabelů	Ano
		- provedeno přeložení vodoteče (bajpás)	Ano
		- dokončeno provedení aktivní zóny (lomový kámen+štěrk)	Ano
		- dokončeno bourání mostu	Ano
	SO 202	- dokončena montáž provizorní lávky a schodů pro pěší	Ano
		- provedeno provizorní vyvěšení kabelů	Ano
		- provedena staveništní komunikace (bajpás)	Ano
		- provedeno zatlučení štětovnic	Ano
		- Dokončuje se výměna aktivní zóny (lomový kámen +štěrk)	Ano

Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby

a) plnění věcného harmonogramu	Práce probíhají v souladu s předloženým HGM
b) popis provedených prací	viz.1. Kontrola úkolů
c) finanční plnění	Za 04/2021 byla odsouhlasena fakturace zhotovitele
d) fotodokumentace	Je prováděna průběžně TDS, zhotovitelem a KooBOZP

3. Kontrola kvality

zpráva o hodnocení kvality za uplynulé období

Práce jsou prováděny v souladu s PD, zhotovitel předkládá TDS k odsouhlasení TePř pro provádění stavebních prací postupně v souladu s HMG stavby. **Zhotovitel provede aktualizaci HMG s ohledem ukončeného stanoviska AD a Geotechnika pro zakládání SO 201 a SO 202, dále v návaznosti prací na provádění SO 203 T: 11.5.2021**
Aktualizovaný HMG rozešle zhotovitel všem účastníkům stavby.

ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE STAVBY	
II/335 STŘÍBRNÁ SKALICE – PRŮTAH	
KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE	STRANA: 1/3

zkoušky dle KZP	Termín zkoušek bude včas oznámen TDS, nejméně 5 dnů předem, v případě změny termínu zkoušky volat TDS (731 648 885).
-----------------	--

4. Stav BOZP

KooBOZP informuje, že závady řeší operativně na místě se zástupcem zhotovitele popř. zápisem do stavebního deníku a protokolem o provedené kontrole zaslané emailem (viz. samostatné zápisy KooBOZP)

5. Různé

Zhotovitel informuje, že v pátek 14.5.2021 bude zahájena betonáž podkladních betonů na SO 201 celoplošně s kari sítěmi a na SO 202 stejným způsobem dle pokynu AD projektanta

Objednatel upozorňuje zhotovitele, že veškeré změny oproti PDPS je předem nutno konzultovat s AD projektanta a objednatelem.

6. Nové úkoly

Úkol číslo	Název	Obsah úkolu a požadovaný cílový stav	Odpovídá	Termín
1	DIO	Zhotovitel prostřednictvím svého subdodavatele 3K značky bude pravidelně kontrolovat správné značení vč. objízdných tras	zhotovitel	T: průběžně
2	SO 201	Stanovisko AD ohledně plošného založení bylo zhotoviteli předáno. Provedena sanace aktivní zóny lomovým kamenem a šterku dnes byly provedeny statické/rázové zkoušky na základové spáře, které byly vyhovující, zhotovitel pošle kopii protokolu a zaznamená do SD. Zhotovitel zajistí stálé čerpání vody	Zhotovitel	T: 27.4.2021 Splněno T: průběžně
3	SO 202	Stanovisko AD bylo zhotoviteli předáno. Provedena sanace aktivní zóny lomovým kamenem a šterku, ve čtvrtek kontrola základové spáry statickou/rázovou zkouškou v 9:00hod. Zhotovitel zajistí stálé čerpání vody	Zhotovitel	T: 27.4.2021 Splněno T: průběžně
4	Přeložky kabelů	Budou prověřeny možnosti překládky kabelů s pracovníkem ČEZ p. Šmejkallem a projektantem (urychlit žádost + návrh varianty) Na dnešním KD zhotovitel informuje, že se možnosti řeší s p.Šmejkallem z ČEZu.	objednatel zhotovitel	T: 27.4.2021 trvá
5	Pasportizace	Zhotovitel zajistí pasport přilehlých objektů průtahu obce Stříbrná Skalice Zhotovitel informuje, že jedná s firmou, která se specializuje na pasport staveb Zhotovitel na dnešním KD informuje, že tento týden zahájila odborná firma pasportizaci.	zhotovitel	T: probíhá
6	RDS	Zhotovitel bude svolávat výrobní výbory k projednání RDS a provede z těchto VV zápis	zhotovitel	T: průběžně
7	RDS podpisový rámec	Zhotovitel zpracuje podpisový rámec pro evidenci odsouhlasených RDS	zhotovitel	T: průběžně
8	Zpráva o postupu prací – měsíční zprávy	Zhotovitel vždy do 7 dnů od ukončení každého kalendářního měsíce předá el. poštou objednateli KSÚS, obci Stříbrná Skalice a Tech. dozorům staveb	zhotovitel	T: průběžně

		pisemnou zprávu o postupu prací za uplynulý měsíc vč. fotodokumentace		
9	SO 102 - chodníky	Zhotovitel informuje investora-obec Stříbrná Skalice, že se založením chodníků I.etapy bude požadovat vícenáklady – investor tento návrh zásadně odmítá a sděluje, že zhotovitel si musí tento návrh vyřešit v rámci své cenové nabídky, kterou předal investorovi ve výběrovém řízení před zahájením stavby. Koncept RDS byl předán k připomínkám objednateli, který se vyjádří do příštího KD. Na dnešním KD zástupce objednatele sděluje, že k předanému konceptu RDS SO 102-Chodníky nemá připomínky.	Objednatel	T: 4.5.2021 splněno

7. Závěr

Datum konání příštího KD	úterý 18.5.2021 od 10hod na OÚ Stříbrná Skalice
--------------------------	---

Zapsal

Ing. Jan Sedláček - TDS



PREZENČNÍ LISTINA

NÁZEV AKCE, PŘEDMĚT JEDNÁNÍ	II/335 Stříbrná Skalice, průtah 6.kontrolní den
DATUM	11.5.2021
MÍSTO	ÓÚ Stříbrná Skalice

JMÉNO A PŘÍJMENÍ	ORGANIZACE	TELEFON / E-MAIL	PODPIS
Jan Zákostelský	KSÚS Stř.kr.		
Ing. Tomáš Kaplan	APIS, s.r.o.		
PhDr. Miroslav Šmied, Ph.D.	Obec Stříbrná Skalice		
Ing. Jan Sedláček	SUDOP PRAHA a.s.		
Mgr. Tomáš Koranda	SUDOP PRAHA a.s.		
Ing. Rudolf Havlík	Obec Stříbrná Skalice		
Ing. Zdeněk Račan	BES s.r.o.		
Milan Sochůrek	BES s.r.o.		
Jakub Žalud	STARMOSTY s.r.o.		
Vojtěch Brodský	STARMOSTY s.r.o.		
Ing. Martin Sládek	BES s.r.o.		
Václav Pěnkava	BENEGB s.r.o.		
Fizka Jm			
MIRKA HORNEK	STARMOSTY		



Zápis z kontrolního dne stavby

II/335 Stříbrná Skalice – průtah

Kontrolní denčíslo **12** konaný dne **23.6.2021****Etapa č.1 – ZÚ obce až po křižovatku s III/1082****Účastníci**

Seznam účastníků je uveden v příloze č.1 - Prezenční listina

Program kontrolního dne

1. Kontrola úkolů a prací
2. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby:
 - a) plnění věcného harmonogramu
 - b) popis provedených prací
 - c) finanční plnění
 - d) fotodokumentace
3. Kontrola kvality
4. Stav BOZP a PO
5. Různé
6. Nové úkoly

1. Kontrola úkolů a prací

Úkol číslo	Název	Skutečný stav plnění úkolu	Splněno
SO 101		- provedeno kácení porostů v době vegetačního klidu - provedeno seřiznutí krajnic a čištění příkopů - provedeno odfrézování konstrukčních vrstev a odvoz vytěženého materiálu - provedeno provizorní zatrubnění - pokračuje pokládka dešťové kanalizace	Ano Ano Ano Ano Ano
SO 201		- dokončeno bourání mostu - provedeno provizorní vyvěšení kabelů - provedeno přeložení vodoteče (bajpás) - dokončeno provedení aktivní zóny (lomový kámen+štěrk) - provedeny podkladní betony - provedeny základové patky - dokončena montáž výztuže opěr - provedena betonáž opěr	Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano
SO 202		- dokončeno bourání mostu - dokončena montáž provizorní lávky a schodů pro pěší - provedeno provizorní vyvěšení kabelů - provedena staveništní komunikace (bajpás) - provedeno zatlučení štětovnic - dokončena výměna aktivní zóny (lomový kámen+štěrk) - provedeny podkladní betony - provedeny základové patky - dokončena a převzata výztuž opěr - dokončena betonáž opěr	Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano, Ano

Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby

a) plnění věcného harmonogramu	Práce probíhají v souladu s předloženým HGM, zhotovitel provedl aktualizaci HMG pro I. etapu
b) popis provedených prací	viz. 1. Kontrola úkolů
c) finanční plnění	Za 05/2021 byla odsouhlasena fakturace zhotovitele

ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE STAVBY

II/335 STŘÍBRNÁ SKALICE – PRŮTAH

KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INŽENÝRING

STRANA: 1/4

d) fotodokumentace

Je prováděna průběžně TDS, zhotovitelem a KooBOZP

3. Kontrola kvality

zpráva o hodnocení kvality za uplynulé období	Práce jsou prováděny v souladu s PD, zhotovitel předkládá TDS k odsouhlasení TePř pro provádění stavebních prací postupně v souladu s HMG stavby. Zhotovitel provedl aktualizaci HMG, který rozeslal všem účastníkům stavby.
zkoušky dle KZP	Termín zkoušek bude včas oznámen TDS, nejméně 3 dny předem, v případě změny termínu zkoušky volat TDS (731 648 885).

4. Stav BOZP

KooBOZP informuje, že závady řeší operativně na místě se zástupcem zhotovitele popř. zápisem do stavebního deníku a protokolem o provedené kontrole zaslané emailem (viz. samostatné zápisy KooBOZP)

5. Různé

Byla provedena betonáž podkladních betonů na SO 201 celoplošně s kari sítěmi a na SO 202 stejným způsobem dle pokynu AD projektanta. Byly provedeny základové patky u obou objektů a byla dokončena montáž výztuže opěr. TDS povolil betonáž u obou mostních objektů SO201 a SO202.

TDS upozorňuje zhotovitele na nutnost čerpání vody a to průběžně až do ukončení zásypů opěr.

Objednatel upozorňuje zhotovitele, že veškeré změny oproti PDPS je předem nutno konzultovat s AD projektanta a objednatelem.

Bylo dohodnuto, že zhotovitel nechá odebrat laboratorní vzorky zapáchající vody, která vtéká do silničního příkopu z areálu autoservisu. Zároveň ÚM Stříbrná Skalice prověří, jakým způsobem řeší odpady autoservis. Na základě těchto ověření bude rozhodnuto o napojení do dešťové kanalizace. Na dnešním KD zhotovitel informuje, že odebrané vzorky vody laboratoří dne 14.6.2021 vykazují splaškové znečištění. Zhotovitel přišel s návrhem, že před zaústěním kanalizace z autoservisu osadí revizní šachtu a následně bude provedeno napojení na dešťovou kanalizaci. V revizní šachtě tak bude sledována přitékající voda z autoservisu. Dnes byly zahájeny práce s tímto spojené.

- **AD prověří vhodnou frakci materiálu do zásypů pod hladinou spodní vody (cca 0,5 – 0,7m)**
- **napojení dešťové kanalizace trasy A a trasy B bude po provedeném projektovém návrhu projednáno s vodoprávním úřadem-zajistí AD**
- **byl projednán koncept RDS pro II.etapu a bylo schváleno vydání čistopisu**
- **projednání RDS pro III.etapu zhotovitel předpokládá do konce 07/2021**

6. Nové úkoly

Úkol číslo	Název	Obsah úkolu a požadovaný cílový stav	Odpovídá	Termín
1	DIO	Zhotovitel prostřednictvím svého subdodavatele 3K značky bude pravidelně kontrolovat správné značení vč. objízdných tras Zhotovitel projedná a připraví DIO pro III.etapu. II.etapa se zahájí v příštím roce.	zhotovitel	T: průběžně Trvá
2	SO 201	TDS převzal základovou spáru na nově Zhotovitel vybudovaném polštáři AZ a povolil pokládku podkladního betonu. Od 18.5.2021 zahájena montáž výztuže základové patky opěr, převzetí osazené výztuže TDS je plánováno na		

		pátek 21.5.2021 – splněno, výzuž a bednění bylo převzato a povolena betonáž 24.5.2021 - splněno. Provedeny zásypy patek dle pokynů geotechnika. Byla dokončena montáž výztuže opěr, TDI potvrdil převzetí výztuže do SD. Po kontrole osazené výztuže bylo povoleno osadit bednění s následnou betonáží. Zhotovitel zajistí stálé čerpání vody.		T: průběžně
3	SO 202	TDS převzal základovou spáru na nově vybudovaném polštáři AZ a povolil pokládku podkladního betonu. Od 18.5.2021 zahájena montáž výztuže základové patky opěr, převzetí osazené výztuže a bednění se uskutečnilo dnes 25.5.2021 a betonáž proběhne 26.5.2021 - splněno . Provedeny zásypy patek dle pokynů geotechnika a byla zahájena montáž výztuže opěr- v pátek 11.6. TDI provedl kontrolu osazené výztuže a povolil osadit bednění. Ve středu 16.6.2021 byla povolena a dokončena betonáž OP1 a OP2. Zhotovitel zajistí stálé čerpání vody	Zhotovitel	T: průběžně
4	Přeložky kabelů	Budou prověřeny možnosti překládky kabelů s pracovníkem ČEZ p. Šmejkalem a projektantem (urychlit žádost + návrh varianty). Zhotovitel informuje, že se možnosti řeší s p.Šmejkalem z ČEZu.	objednatel zhotovitel	T: 27.4.2021 trvá
5	Pasportizace	Zhotovitel zajistí pasport přilehlých objektů průtahu obce Stříbrná Skalice. Zhotovitel informuje, že odborná firma dokončila pasportizaci stavby	zhotovitel	T: 15.6.2021
6	RDS	Zhotovitel bude svolávat výrobní výbory k projednání RDS a provede z těchto VV zápis Byly projednány koncepty RDS pro II.etapu a dán souhlas s vydáním čistopisu.	zhotovitel	T: průběžně
7	RDS podpisový rámec	Zhotovitel zpracuje podpisový rámec pro evidenci odsouhlasených RDS	zhotovitel	T: průběžně
8	Zpráva o postupu prací – měsíční zprávy	Zhotovitel vždy do 7 dnů od ukončení každého kalendářního měsíce předá el. poštou objednateli KSÚS, obci Stříbrná Skalice a Tech. dozorum staveb písemnou zprávu o postupu prací za uplynulý měsíc vč. fotodokumentace	zhotovitel	T: průběžně
9	SO 102 - chodníky	Zhotovitel informuje investora-obec Stříbrná Skalice, že se založením chodníků I.etapy bude požadovat vícenáklady – investor tento návrh zásadně odmítá a sděluje, že zhotovitel si musí tento návrh vyřešit v rámci své cenové nabídky, kterou předal investorovi ve výběrovém řízení před zahájením stavby. Koncept RDS byl předán k připomínkám objednateli, který se vyjádří.	Zhotovitel+Objednatel	

		Objednatel sděluje, že k předanému konceptu RDS SO 102-Chodníky nemá připomínky. Dne 18.5.2021 zhotovitel informuje objednatele, že ještě provedl z pohledu provádění funkční úpravu konceptu SO 102 - Chodníky a předá objednateli k vyjádření. Investor s provedením funkčních úprav zhotovitelem souhlasí nicméně nabídková cena zůstává stejná. Byly zahájeny práce na SO 102 Chodníky v km 0,0 - 1,2 a záznamy k tomuto SO 102 budou v hlavním SD, statické zkoušky budou po dohodě řešeny s TDI.	
--	--	--	--

7. Závěr

Datum konání příštího KD

mimořádně v úterý 29.6.2021 od 10hod

na OU Stříbrná Skalice

Zapsal

Ing. Jan Sedláček - TDS



PREZENČNÍ LISTINA

NÁZEV AKCE, PŘEDMĚT JEDNÁNÍ	II/335 Stříbrná Skalice, průtah 12.kontrolní den
DATUM	23.6.2021
MÍSTO	OÚ Stříbrná Skalice

JMÉNO A PŘÍJMENÍ	ORGANIZACE	TELEFON / E-MAIL	PODPIS
Jan Zákostelský	KSÚS Stř.kr.		
Ing. Tomáš Kaplan	APIS, s.r.o.		
PhDr. Miroslav Šmied, Ph.D.	Obec Stříbrná Skalice		
Ing. Jan Sedláček	SUDOP PRAHA a.s.		
Mgr. Tomáš Koranda	SUDOP PRAHA a.s.		
Ing. Rudolf Havlík	Obec Stříbrná Skalice		
Ing. Zdeněk Račan	BES s.r.o.		
Milan Sochůrek	BES s.r.o.		
Jakub Žalud	STARMOSTY s.r.o.		
Vojtěch Brodský	STARMOSTY s.r.o.		
Ing. Martin Sládek	BES s.r.o.		
Václav Pěnkava	BENEGB s.r.o.		
Líza VOŠÁHOVÁ	KSÚS		
APIS s.r.o.	KSÚS		



ALÉSLADEK

BES

