

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

II/508 Mirošovice - Mnichovice, obnova protismykových vlastností a rovnosti krytu, provozní staničení 1,503-3,702

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Přechodné dopravní značení

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

182 / 1

Číslo ZBV:

3

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov

IČ: 00066001

Zhotovitel: PORR a.s.

Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

úsek Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Čechy - Střed

Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

IČ: 43005560

Rekapitulace ZBV č. 3 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3.3	0,00	372.186,00	372.186,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3.4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3	0,00	372.186,00	372.186,00

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.

Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy

a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré:

1.

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: II/508 Mírošovice - Mnichovice, obnova protismykových vlastností a rovnosti krytu, provozní staničení 1,503-3,702 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Přechodné dopravní značení		Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 182 / 1	Číslo ZBV: 3																															
Strany smlouvy o dílo č. 436/00066001/2019 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 1.3.2019 (dále jen Smlouva): Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov Zhotovitel: PORR a.s., Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10																																		
<u>Přílohy Změnového listu:</u> <table border="0"> <tr> <td>1. Krycí list</td> <td>1</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>2. Změnový list</td> <td>1</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací</td> <td>1</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>4. Rozpis ocenění Změn položek</td> <td>1</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>5. Přehled zařazení změn do skupin</td> <td>1</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>6. Přehled dalších dokladů</td> <td>1</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>Další doklady</td> <td>23</td> <td>počet listů</td> </tr> </table>		1. Krycí list	1	počet listů	2. Změnový list	1	počet listů	3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů	4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů	5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů	6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů	Další doklady	23	počet listů	<table border="0"> <tr> <td>Paré č.</td> <td>Příjemce</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>AD</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>TDI</td> </tr> </table>		Paré č.	Příjemce	1	Objednatel	2	Zhotovitel	3	AD	4	TDI
1. Krycí list	1	počet listů																																
2. Změnový list	1	počet listů																																
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů																																
4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů																																
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů																																
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů																																
Další doklady	23	počet listů																																
Paré č.	Příjemce																																	
1	Objednatel																																	
2	Zhotovitel																																	
3	AD																																	
4	TDI																																	
Iniciátor změny: Zhotovitel Popis a zdůvodnění Změny: a) Prodloužení doby výstavby z důvodu etapizace stavby V rámci PDPS stavby bylo předpokládáno s úplným uzavřením prostoru výstavby v délce trvání 3 měsíce. V rámci projednání na uzavírkové komisi bylo rozhodnuto o realizaci stavby ve čtyřech etapách s výstavbou pouze v jednom jízdním pruhu. Z tohoto důvodu byla prodloužena doba realizace stavby na 5 měsíců a zároveň dochází k úměrnému navýšení přechodného dopravního značení. Jedná se o změnu, která vznikla v rámci projednání DIR. Celkově se jedná o Změnu nepodstatnou, nepředvídanou, která je tak podle § 5, odst. 1, písm.c) resp. §10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29. 05. 2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná o změnu nepředvídanou.																																		
Údaje v Kč bez DPH: <table border="1"> <tr> <th>Cena navrhovaných Změn záporných</th> <th>Cena navrhovaných Změn kladných</th> <th>Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem</th> <th>Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných</th> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>372.186,00</td> <td>372.186,00</td> <td>372.186,00</td> </tr> </table>				Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	0,00	372.186,00	372.186,00	372.186,00																							
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných																															
0,00	372.186,00	372.186,00	372.186,00																															
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:																																		
Zhotovitel (stavbyvedoucí)	jméno	Adam Přibyl, DiS.	datum - 6 -01- 2020 podpis																															
Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Tomáš Roztočil	datum - 6 -01- 2020 podpis																															
Technický dozor investora	jméno	Ing. Jindra Flanderková	datum - 6 -01- 2020 podpis																															
Supervize	jméno	xxx	datum podpis																															
Zástupce Objednatel:	jméno	Ing. Ján Kukura	datum - 6 -01- 2020 podpis																															
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny. Jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.																																		
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel)	jméno	Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA	datum podpis																															
Zhotovitel	jméno	Ing. Pavel Hirsch Ing. František Buršík	datum - 7 -01- 2020 podpis																															
			Číslo paré: 1.																															

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 3**

Název Stavby: II/508 Mirošovice - Mnichovice, obnova protismykových vlastností a rovnosti krytu, provozní staničení 1,503-3,702	
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	182 / 1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Přechodné dopravní značení	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
558.000,00

Poznámka:

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	558.000,00	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	372.186,00	372.186,00	66,70%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	0,00	930.186,00	372.186,00	66,70%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis			
		jméno	datum
Zhotovitel (stavbyvedoucí):	souhlasím	Adam Příbyl, DiS.	- 6 -01- 2020
Projektant (autorský dozor):	souhlasím	Ing. Tomáš Roztočil	- 6 -01- 2020
Stavební dozor:	souhlasím	Ing. Jindra Flanderková	- 6 -01- 2020
Zástupce Objednatel:	souhlasím	Ing. Ján Kukura	- 6 -01- 2020
Zaměstnanec KSÚS SK odpovědný za cenové projednání změny:	souhlasím	Petr Heinrich	- 6 -01- 2020

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 3

Ev. č. a název stavby: II/508 Mirošovice - Mnichovice, obnova protismykových vlastností a rovností krytu, provozní staničení 1,503-3,702

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

Číslo a název SO/PS: SO 182 Přechodné dopravní značení

č. 1

Číslo a název rozpočtu: SO 182 Přechodné dopravní značení

Skupina změn: 3

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	02710	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	kpl	1,000	1,867	0,867	328.000,00	328.000,00	0,00	218.776,00	546.776,00	218.776,00	68,70
2	02720	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	kpl	1,000	1,667	0,667	230.000,00	230.000,00	0,00	153.410,00	383.410,00	153.410,00	66,70
Celkem								558.000,00	0,00	372.186,00	930.186,00	372.186,00	

PŘEHLED ZAŘAZENÍ

Název a evidenční číslo Stavby:

II/508 Mirošovice - Mnichovice, obnova protismykových vlastností a rovnosti krytu, prov

1	Přijaté smluvní částka bez rezervy a DPH	35 810 700,00
2=1+18+19	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	36 378 823,63
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	44 018 376,58
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	101,59%
4=(25/1)*100	Středování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	Středování změny položek (Skupina 2)	0,00%
40=(19/1)*100	Středování limitu 15 % pro oodržetou změnu pro změny záporné dle § 14, odst. 3), písm. b)	-0,59%

6=32+38	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	568.123,63
7=8/1)*100	Středování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	1,59%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	10.743.210,00

- 1 -						- 2 -					
Vyhrazená změna (Dodatek)						Změna položek (Započítává)					
Změny záporné (žadovat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadovat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadovat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadovat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných
23	24	25=23+24	26	27	28	29	30	31=29+30	32	33	34=32+33
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (žadovat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (žadovat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadovat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných
16	17	18	19=23+26+29+33	20=24+27+30+34+37+39	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28
		II/508 Mirošovice - Mnichovice, obnova protismykových vlastností a rovnosti krytu, provozní staničení 1,503-3,702	- 202 238,03	770 361,66	568 123,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VON	1	Vedlejší a ostatní náklady/Navýšení dočasných položek z důvodu prodloužení doby výstavby	0,00	398 175,66	398 175,66						
193	1	Stálé dopravní značení/Zmenšení šířky vodicích čar	-202 238,03	0,00	-202 238,03						
182	1	Přechodné dopravní značení/ Navýšení dočasných položek z důvodu prodloužení doby výstavby	0,00	372 186,00	372 186,00						

VÍ ZMĚN DO SKUPIN

Zní staničení 1,503-3,702

$9=(32A/1)*100$	Sledování limitu 50 % Skupina 3	2,72%
$10=(36A/1)*100$	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,00%
$10A=32A+36A$	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	972.599,68
$11=1*0,5$	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	17.905.350,00

$12=(37/1)*100$	Sledování limitu 15 %	0,00%
$13=37$	Sledování limitu 149 224 000 Kč	0,00
$14=149224000-37$		149.224.000,00

- 3 -						- 4 -					- 5 -	
Nepředvídanost						Nezbytnost					Změny de minimis	
Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Procentní vyjádření Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Procentní vyjádření Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny de minimis (15% nebo limit 149 224 000 Kč)	limit 15 %	
29	30	$31=(30/1)*100$	$32=29+30$	$32A=ABS(29)+30$	33	34	$35=(34/1)*100$	$36=33+34$	$36A=ABS(33)+34$	37	$38=(37/1)*100$	
- 202 238,03	770 361,66	2,16%	568 123,63	972 599,68	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	
0,00	398 175,66	1,11%	398 175,66	398 175,66								
-202 238,03	0,00	0,00%	-202 238,03	202 238,03								
0,00	372 186,00	1,04%	372 186,00	372 186,00								

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	3
Název a evidenční číslo stavby:	II/508 Mirošovice - Mnichovice, obnova protismykových vlastností a rovnosti krytu, provozní staničení 1,503-3,702
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Přechodné dopravní značení
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	182 / 1

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
07 Změnový rozpis prací SO 182	1	
08 Projednání uzavírky ze dne 25.3.2019	1	
09 Rozhodnutí o uzavírcce MÚ Říčany	3	
10 Opatření obecné povahy MÚ Říčany	2	
11 Žádost o prodloužení doby výstavby ze dne 29.3.2019	1	
12 Přechodné dopravní opatření - SO 182	5	
13 Dodatek SOD č.1 - prodloužení dob výstavby	9	
14 Žádost o změnu rozsahu díla	1	
Počet listů celkem	23	

Rozpis ocenění Změn SO 182 po ZBV 1													
Ev. č. a název stavby:		II/508 Mirošovice - Mnichovice, obnova protismykových vlastností a rovnosti krytu, provozní staničení 1,503-3,702											
Číslo a název SO/PS:		SO 182 Přechodné dopravní značení											
Číslo a název rozpočtu:		SO 182 Přechodné dopravní značení											
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	02710	POMOC PRACE ZRIZ NEBO ZAJIST OBJÍZDKY A PŘÍSTUP CESTY	kpl	1,000	1,667	0,667	328.000,00	328.000,00	0,00	218.776,00	546.776,00	218.776,00	66,70
		Položka zahrnuje projednání a koordinaci s DIO navazující stavby. STANOVISKO GP: Detailní návrh přechodného dopravního značení bude proveden až po vydání finálního harmonogramu stavebních úprav a záborů vybraným zhotovitelem včetně koordinace se stavbou „D1 modernizace – úsek 02, exit 21 Mirošovice – exit 29 Hvězdovice – SO 02-130 Silnice II/508 v km 22,190“ na kterou přímo navazuje tato stavba a předpokládá se, že objízdné trasy pro obě stavby budou shodné. položka čerpána v rozsahu dle pokynů a pouze se souhlasem zadavatele! ZBV1: Změny dle skutečného provedení - Prodloužení doby výstavby Doba výstavby dle zadávací dokumentace - 3 měsíce (plná uzávěra) Doba výstavby pro uzávěry po polovinách silnice - 5 měsíců 1 kpl / 3 měsíce * 2 měsíců = 0,667 kpl Celkem 1,667 kpl											
2	02720	POMOC PRACE ZRIZ NEBO ZAJIST REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	kpl	1,000	1,667	0,667	230.000,00	230.000,00	0,00	153.410,00	383.410,00	153.410,00	66,70
		Položka zahrnuje vypracování návrhu DIO, projednání návrhu s DOSS, zajištění DIR a vlastní provedení DIO dle TP66 - osazení, pronájem, přesuny a následná demontáž DZ. položka čerpána v rozsahu dle pokynů a pouze se souhlasem zadavatele! ZBV1: Změny dle skutečného provedení - Prodloužení doby výstavby Doba výstavby dle zadávací dokumentace - 3 měsíce (plná uzávěra) Doba výstavby pro uzávěry po polovinách silnice - 5 měsíců 1 kpl / 3 měsíce * 2 měsíců = 0,667 kpl Celkem 1,667 kpl											
Celkem								558.000,00	0,00	372.186,00	930.186,00	372.186,00	66,70



Jiráskova 1519, 251 01 Říčany; IČO: 25056271, DIČ: CZ25056271
Společnost zapsána v obchodním rejstříku, který vede Městský soud Praha, oddíl C, vložka 45840
www.3kznackv.cz

mail:

GSM:

Akce: oprava vozovky - II/508; Mirošovice – Mnichovice

Projednání ze dne 25.3.2019 v 9h, MÚ Říčany

Termín uzavírky: 8.4.2019 – 1.9.2019

I. – IV. Etapizace částečná uzavírka

Před zahájením stavby udělat kontrolní prohlídku stavu komunikací – obec Mnichovice. Zhotovitel následně zajistí pasportizaci komunikace v obci Mnichovice. Po ukončení akce se zkontrolují škody.

Doplnit značení 1x IP22 → neprůjezdná oblast + „Mountfield otevřen“

Pro pokládku ohrusné vrstvy + recyklace za studena, bude vždy v každé etapě nutná úplná uzavírka (1 den). Ohledně úplné uzavírky musí zhotovitel informovat 7 dní dopředu odbor dopravy MÚ Říčany + dotčené obce.

Zapsal:

Prezenční listina

Ústní jednání k uzavírcce silnice II/508 Mnichovice Mirošovice konaná dne 25.3.2019 na MěÚ
Říčany

[illegible]



MĚSTSKÝ ÚŘAD V ŘÍČANECH

Masarykovo náměstí 53/40 | 251 01 Říčany

| www.ricany.cz

Č.j. : 86912/2019-MURI/OSAD

27.3.2019

Č.ev.: 94457/2019

Vyřizuje: Marie Raková DiS.

PORR a.s.

Dubečská 3238

100 00 Praha 10

ROZHODNUTÍ

Odbor správních agend a dopravy Městského úřadu v Říčanech, jako příslušný silniční správní úřad ve věcech silnic II. a III. třídy a místních komunikací podle ust. § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů (dále jenom zákon o pozemních komunikacích) stanoviska Policie ČR DI Praha venkov – Jih ze dne 26.3.2019, rozhodl podle ust. § 24 zákona o pozemních komunikacích takto:

Na základě žádosti žadatele – PORR a.s., Dubečská 3238, 100 00 Praha 10, který na základě plné moci zastupují 3K značky s.r.o., Jiráskova 1519, 251 01 Říčany IČ:2505627 ze dne 26.3.2019 se

p o v o l u j e

uzavírka pozemní komunikace silnice II. třídy č. II/508 staničení v km 1,503 – 3,702 v k. ú. Mnichovice z důvodu opravy komunikace.

Údaje o uzavírci:

úsek uzavírky:

- 1) II. třídy č. II/508 staničení v km 1,503 – 3,702 v úseku Mnichovice Mirošovice
- 2) II. třídy č. II/508 staničení v km 1,503 – 3,702 v úseku Mnichovice Mirošovice

dobu uzavírky:

1) částečná uzavírka se bude konat v následujících termínech:

1. etapa 8.4.2019 – 9.6.2019
2. etapa 10.6.2019 – 1.9.2019
3. etapa 22.7.2019 – 1.9.2019
4. etapa 10.4.2019 – 7.7.2019

2) úplná uzavírka se bude konat v následujících termínech:

Termíny úplné uzavírky budou stanoveny nejpozději 7. dní předem všem zúčastněným účastníkům. V průběhu výstavby budou určeny nejvíce 4 jednodenní uzavírky

důvod uzavírky:

oprava komunikace

žadatel: PORR a.s., Dubečská 3238, 100 00 Praha 10
IČ: 43005560
investor: KSÚS Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5
IČ: 000 66 001
odpovědný pracovník: Adam Příbyl tel.

stanovená trasa objížďky: Při částečné uzavírci bude provoz řízen SSZ v jednom jízdním pruhu. Při úplné uzavírci bude využita uzavírka mostu na silnici č. II/508 v Mirošovicích podle stanovení přechodné úpravy č.j. 61087/2019-MURI/OSAD

pravidelná autobusová doprava: není dotčena

Uzavírka se povoluje za dodržení těchto podmínek:

1. Uzavírka bude řádně označena dopravními značkami, zábranami a informačními tabulemi v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích.
2. Žadatel zodpovídá po celou dobu uzavírky za řádné rozmístění stanoveného dopravního značení a za jeho údržbu.
3. Stavebník s městem Mnichovice a obcemi Mirošovice a Hrusice zajistí prokazatelně informování občanů a firem v uzavřeném úseku o uzavírci silnice č. II/508.
4. Přechodná úprava silničního provozu byla stanovena Odborem správních agend a dopravy Městského úřadu v Říčanech pod č.j. 86912/2019-MURI/OSAD, č.ev. 94532/2019 ze dne 27.3.2019.
5. V případě jakýchkoliv změn v harmonogramu stavební činnosti, stavebník neprodleně informuje silniční správní úřad MěÚ Říčany o těchto změnách.
6. Po ukončení uzavírky bude ihned odstraněno dopravní značení a všechna dopravní zařízení umístěná v souvislosti s uzavírkou.

Uzavírka a návrh dopravního značení byly odsouhlaseny Policií ČR DI Praha venkov – jih.

Při nesplnění podmínek tohoto rozhodnutí může silniční správní úřad na základě ust. § 24 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích povolení zrušit nebo omezit.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 správního řádu):

- PORR a.s., Dubečská 3238, 100 00 Praha 10
- Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Odůvodnění:

Po posouzení žádosti žadatele – PORR a.s., Dubečská 3238, 100 00 Praha 10, kterého na základě plné moci zastupují 3K značky s.r.o., Jiráskova 1519, 251 01 Říčany IČ: 25056271 a souhlasu Policie ČR DI Praha venkov – Jih, na základě § 24 odst. 1, 2 zákona o pozemních komunikacích byla povolena uzavírka pozemní komunikace tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů od jeho doručení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 00 Praha 5 – Smíchov, prostřednictvím Odboru správních agend a dopravy Městského úřadu v Říčanech.

Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá podle ust. § 24 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích odkladný účinek.

Ing. Přemysl Douša
oprávněná úřední osoba

„otisk úředního razítka“

Rozdělovník:

- KSÚS Středočeského kraje, oblast Kutná Hora
- Policie ČR DI Praha venkov – JIH
- HZS Středočeského kraje
- PORR a.s.
- 3K značky s.r.o.
- Město Mnichovice
- Obec Mirošovice
- Obec Hrusice



MĚSTSKÝ ÚŘAD V ŘÍČANECH

Masarykovo náměstí 53/40 | 251 01 Říčany

www.ricany.cz

Č.j.: 86912/2019-MURI/OSAD

27.3.2019

Č.ev.: 94532/2019

Vyřizuje: Marie Raková DiS.

PORR a.s.

Dubečská 3238

100 00 Praha 10

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Odbor správních agend a dopravy Městského úřadu v Říčanech jako příslušný orgán státní správy ve věcech provozu na pozemních komunikacích dle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu § 77 odst. 1 písm. c), na základě žádosti žadatele – PORR a.s., Dubečská 3238, 100 00 Praha 10 IČ: 43005560, kterého na základě plné moci zastupují 3K Značky s.r.o., Jiráskova 1519, 251 01 Říčany, IČ: 264 87 985 ze dne 26.3.2019

s t a n o v í

přechodnou úpravu silničního provozu na silnici II. třídy č. II/508 staničení 1,503 – 3,702 a komunikacích dotčených objízdou trasou z důvodu opravy povrchu silnice.

Termín: dle rozhodnutí o uzavírci ze dne 27.3.2019 č.j.: 86912/2019-MURI/OSAD, č.ev.: 94457 (termín 8.4.2019 – 1.9.2019)

Odpovědná osoba: Ing. Jan Vaněk, tel.:

Dopravní značení bude umístěno v intencích návrhu DZ zpracovaného firmou 3K Značky s.r.o., Jiráskova 1519, 251 01 Říčany, zpracovatel Ing. Jan Vaněk, datum 3/2019, přílohy C.1, C.2, D.1, D.2, E.1, E.2, F.1, F.2 a G.

Dopravní značení bude umístěno v intencích návrhu DZ předloženého silničnímu správnímu úřadu a schválené Policií ČR DI Praha venkov – JIH.

Dopravní značení zajistí žadatel a bude provedeno podle odsouhlasené situace odbornou firmou. Jedná se o užití přenosného dopravního značení na pozemních komunikacích, podle TP 66 „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“.

Dopravní značení a dopravní zařízení bude instalováno v souladu s ČSN EN 12899-1 a ČSN EN 1436.

Zhotovitel bude provádět nejméně jednou denně kontrolu přenosného dopravního značení. Případné závady je nutné neprodleně odstranit a chybějící DZ doplnit.

Odůvodnění

Odbor správních agend a dopravy Městského úřadu v Říčanech jako příslušný orgán státní správy obdržel dne 26.3.2019 žádost firmy PORR a.s., Dubečská 3238, 100 00 Praha 10 IČ: 43005560, kterou na základě plné moci zastupují 3K Značky s.r.o., Jiráskova 1519, 251 01 Říčany, IČ: 264 87 985, o vydání stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích z důvodu opravy povrchu silnice č. II/508. Protože navržená přechodná úprava provozu odpovídá zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu a byla splněna zákonná podmínka pro vydání opatření obecné povahy, kterou je předchozí projednání s příslušným orgánem policie, byl vydán návrh opatření obecné povahy.

Na základě výše uvedených stanovisek byla Odborem správních agend a dopravy Městského úřadu v Říčanech stanovena přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích, jak je uvedeno ve výrokové části.

Poučení

Opatření obecné povahy se oznamuje veřejnou vyhláškou a nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.

Proti opatření obecné povahy dle ust. § 173 odst. 2 zák. č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů, nelze podat opravný prostředek.

Odbor správních agend a dopravy Městského úřadu v Říčanech a Policie ČR DI Kolín si vyhrazují právo toto ustanovení změnit nebo doplnit, pokud si to bude vyžadovat změna silničního provozu nebo veřejný zájem.

Proti tomuto stanovení nejsou přípustné opravné prostředky ve smyslu obecných předpisů o správním řízení

Ing. Přemysl Douša
oprávněná úřední osoba

„otisk úředního razítka“

Přílohy:
- dle textu

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 5 dnů.

Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:

Razítka a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí:

Rozdělovník:

- PORR a.s.,
- 3K značky s.r.o
- Policie ČR DI Praha venkov - Jih
- KSÚS Středočeského kraje
- Město Říčany (k vyvěšení na úřední desce)
- Město Mnichovice (k vyvěšení na úřední desce)
- Obec Mirošovice (k vyvěšení na úřední desce)
- Obec Hrusice (k vyvěšení na úřední desce)



PORR a.s., závod Čechy
Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace
k rukám Bc. Zdeněk Dvořák
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5 - Smíchov

Vaše značka:
Váš dopis ze dne:
Naše značka: II/508/AP/2019/001
Náš dopis:
Jméno: Adam Příbyl, DiS.
Mobil:
Email:

Praha, 29.03.2019

Věc „II-508 Mirošovice - Mnichovice, obnova protismykových vlastností a rovnosti krytu, provozní staničení km 1,503-3,702“ - Žádost o stanovisko objednatele k prodloužení doby výstavby

Vážený pane řediteli,

Tímto si Vás dovoluji požádat o stanovisko (pokyn) k prodloužení doby výstavby akce „II-508 Mirošovice - Mnichovice, obnova protismykových vlastností a rovnosti krytu, provozní staničení km 1,503-3,702“, dle přiloženého harmonogramu. Zhotovitel žádá prodloužit dobu výstavby oproti SOD o dva měsíce tj. na měsíců pět (147 dnů).

Důvodem k prodloužení termínu předmětné stavby je změna dopravně inženýrského opatření oproti zadávací dokumentaci, která byla projednána a odsouhlasena zástupci jednotlivých organizací na uzavírkové komisi, včetně následného vydání rozhodnutí a stanovení pro tuto akci. Konkrétně se jedná o změnu z úplného omezení celého prostoru výstavby, tj. s vyloučenou dopravou, na realizaci stavby ve čtyřech etapách s výstavbou pouze v jednom jízdním pruhu.

Zhotovitel plánuje zahájit stavební práce od 08.04.2019 a akci dokončit k 01.09.2019.

Přílohy:

Harmonogram stavby	1xA3
Harmonogram stavby - podrobný	6xA3
Rozhodnutí o uzavírce	3xA4
Stanovení	2xA4
Zápis z uzavírkové komise	2xA4
Technická zpráva zadávací dokumentace SO 182	5xA4

S pozdravem

Adam Příbyl, DiS.
Dopravní a inženýrské stavby, oblast Čechy, Provoz Střed
Stavbyvedoucí

PORR a.s.
Dubečská 3238/36
Strašnice, 100 00 Praha 10

Sídlo: Dubečská 3238/36
Strašnice, 100 00 Praha 10
OR u MS v Praze, Oddíl B, Vložka 1006
IČO 43005560, DIČ CZ43005560

www.porr.cz

1. Identifikační údaje

a) Označení stavby

Název stavby: II/508 Mirošovice – Mnichovice, obnova protismykových vlastností a rovnosti krytu, provozní staničení km 1,503 – 3,702

Místo stavby: Středočeský kraj
Okres Praha - východ
k.ú. Mnichovice u Říčan (695741), Mirošovice u Říčan (695475), Hrusice (648655)

Charakter stavby: oprava pozemní komunikace

b) Stavebník

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Zborovská 11, 150 21 Praha 5

c) Projektant

Projektant: Atelier PROMIKA s.r.o.
Bc. Zuzana Šperlová, Ing. Tomáš Roztočil,
Ing. Petr Macek
Muchova 9/223, 160 00 Praha 6

ič: 260 80 273

Stupeň PD: Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení
a pro provádění stavby dle vyhlášky Ministerstva dopravy
č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové
dokumentace dopravních staveb

Část: **SO 182 PŘECHODOVÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ**

Datum zpracování: 06/2018

2. Základní údaje

2.1. Zdůvodnění stavby a jejího umístění

Jedná se o opravu krytu vozovky silnice II/508 v Mirošovice – Mnichovice, provozní staničení km 1,503 – 3,702. Součástí je pročištění systému odvodní (propustky, příkopy) a obnova šířky vozovky včetně nezpevněné krajnice, které budou očištěny od nánosů. Dále je pak součástí obnova vodorovného a svislého dopravního značení. Součástí akce je i oprava poškozených propustků (8 ks). Součástí akce není oprava mostních objektů a jiných objektů v trase. Stávající šířkové uspořádání komunikace se nemění. Délka řešeného úseku je 2 199 m.

Celá oprava silnice řešeného úseku II/508 bude provedena najednou. Začátek úseku navazuje na plánovanou přestavbu mostu přes D1 (provozní staničení začátku úseku km 1,503). Projektové staničení přibližně odpovídá provoznímu staničení dle podkladů silniční databanky.

2.2. Návrh na zatřídění místních komunikací

Navrhovanými stavebními úpravami se dosavadní zatřídění dotčených pozemních komunikací nemění.

3. Použité podklady

- Smlouva o dílo na zpracování projektové dokumentace a inženýrskou činnost,
- zaměření současného stavu (polohopis a výškopis) v digitální podobě v souřadnicích JTSK a výškovém systému Bpv, včetně zákresu pozemkových hranic,
- orientační zákres stávajících inženýrských sítí dle podkladů příslušných správců,
- Diagnostika a návrh opravy vozovky Silnice II/508,
- údaje o intenzitách automobilové dopravy z celostátního sčítání dopravy 2016,
- webový portál ČÚZK,
- vlastní průzkum a fotodokumentace projektanta,
- závěry konzultací a připomínek z uskutečněných jednání v průběhu zpracování dokumentace, vyjádření dotčených orgánů státní správy a jednotlivých správců inženýrských sítí.

4. Návrh dopravního značení

Stavba by měla být realizována v průběhu stavební sezóny 2019 a bude koordinována s akcí „D1 modernizace – úsek 02, exit 21 Mirošovice – exit 29 Hvězdovice – SO 02-130 Silnice II/508 v km 22,190“, kterou připravuje firma Sudop Praha a.s.. Termín zahájení stavby se v době přípravy tohoto projektu předpokládal 04/2019. Doba trvání stavby bude závislá především na dodavatelem zvoleném postupu prací.

Stavební práce budou zásadním způsobem omezovat provoz na silnici II/508 i navazujících pozemních komunikacích, bude prováděna za úplné uzavírky.

Dopravní napojení staveniště bude zajištěno ze silnice II/508. Jiný přístup není třeba zřizovat. V případě předpokládaného termínu zahájení stavby „D1 modernizace – úsek 02, exit 21 Mirošovice – exit 29 Hvězdovice“ bude umožněn přístup pouze ze směru Mnichovice.

Dopravní omezení v souvislosti s umístěním záboru staveniště na silnici II/508 bude řešeno provizorním dopravním značením v souladu s TP 66 „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích (II. vydání)“. Dopravní značení v úsecích opravy vozovky se předpokládá s užitím typového schématu C/10.b dle výše uvedených TP 66, které je doloženo na konci této technické zprávy. Detailní návrh přechodného dopravního značení bude proveden až po vydání finálního harmonogramu stavebních úprav a záborů vybraným zhotovitelem včetně koordinace se stavbou „D1 modernizace – úsek 02, exit 21 Mirošovice – exit 29 Hvězdovice – SO 02-130 Silnice II/508 v km 22,190“ na kterou přímo navazuje naše stavba a předpokládá se, že objízdné trasy pro obě trasy se budou shodovat.

Při zpracování PD bylo užito především těchto norem a předpisů:

- Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,
- Vyhláška MDS č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava řízení provozu na pozemních komunikacích,
- ČSN EN 12899 – 1 Svislé dopravní značení, část 1: Stálé dopravní značky včetně Národní přílohy NA 1,
- ČSN EN 1436 Vodorovné dopravní značení,
- Vzorové listy staveb pozemních komunikací, VL 6-Vybavení pozemních komunikací, část 6.1 Svislé dopravní značky a část 6.2 Vodorovné dopravní značky,
- TP 65 - Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích (II. vydání),
- TP 66 – Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích (II. vydání),
- TP 133 - Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích (II. vydání),
- TP 169 – Zásady pro označování dopravních situací na pozemních komunikacích.

Provedení přenosných i trvalých svislých dopravních značek musí splňovat podmínky ČSN EN 12899-1, včetně národní přílohy, TKP a ZTKP vydané MD. Veškeré přenosné dopravní značky musí splňovat podmínky TP 66. Všechny standardní značky budou provedeny v základním rozměru dle ČSN EN 12 899-1. Činná plocha dopravních značek musí být provedena z retroreflexní fólie min. tř. RA1. Všechny standardní značky se provedou lisované s dvojitým ohybem z pozinkovaného plechu s plnými rohy. Spojovací materiál bude nekorodující, objímky mohou být z Al slitin. Uchycení přenosných dopravních značek na nosnou konstrukci musí být provedeno pomocí speciální příchytky zabírající jejímu pootočení či uvolnění, pevně spojené se zadní stěnou značky. Značky budou připevněny na nosné konstrukce (sloupky) z Al nebo FeZn profilu o průřezu 40 x 40 mm (tzv. jáckl) s červenobílým reflexním polepem a osazené do přenosných podstavců z recyklovaných materiálů.

Dočasná neplatnost svislých dopravních značek bude provedena jejich zakrytím plachtou, škrtnutím nebo překrytím páskou s oranžovo-černým pruhem, která musí být v šířce min. 50 mm a provedena z takového materiálu, aby při odstraňování nedošlo k poškození činné plochy značek. Doporučuje se užít pásky z retroreflexního materiálu třídy RA1 dle ČSN EN 12899-1. Tímto způsobem ale nelze zrušit platnost

značky upravující přednost.


Dodavatel je povinen zajistit údržbu svislého i vodorovného dopravního značení tak, aby byla zajištěna nepřetržitě jeho plná funkčnost po celou dobu užití v rámci stavby. V případě vyznačení úseku komunikace se zákazem zastavení, budou svislé dopravní značky č. B28 osazeny týden před začátkem příslušné fáze výstavby.

Stavba ověření nové technologie bude prováděna takovým způsobem, aby všechny vjezdy a hlavní pěší tahy a přístupy ke vstupům do stávajících objektů byly zachovány po co nejdelší dobu i za cenu použití provizorních pěších lávek. Zařízení staveniště se předpokládá pouze velmi malého rozsahu s využitím mobilních objektů a bude řešeno v rámci vlastních pozemků stavby. Tato plocha bude sloužit i jako případná deponie pro materiál. Plochy pro větší skládky se neuvažují. Parkování mechanismů, bude-li potřebné, je v omezené míře možné na staveništi. Staveniště bude řádně oploceno, otevřené výkopy budou ohrazeny kovovými zábranami, v noci a za snížené viditelnosti označeny výstražným osvětlením. Výkopový ani stavební materiál se nesmí ukládat na tělese silnice, vozovku je nutné udržovat v čistotě, případné znečištění neodkladně odstraňovat. Vozidla vyjíždějící ze stavby musí být řádně očištěna, aby nedocházelo k zanášení zeminy na veřejné komunikace.

5. Závěr

Vzhledem k časovému předstihu vydání dokumentace před skutečným uvedením stavby do provozu je nutné ještě před zahájením vlastní realizace dopravního značení provést aktualizaci dokumentace dopravního značení. Aktualizace je nutná vzhledem k možným změnám jak v právní, tak technicko - kvalitativní oblasti dopravního značení, ke kterým může dojít v době mezi zpracováním návrhu a samotnou realizací stavby. Dále je nutné přezkontrolovat, zda aktuální podoba stávajícího dopravního značení v řešeném území, případně poloha sloupů veřejného osvětlení uvažovaných pro osazení svislých dopravních značek, odpovídá stavu zakreslenému v projektové dokumentaci. V případě, že budou shledány odlišnosti oproti dokumentaci, je třeba kontaktovat projektanta a dohodnout případnou úpravu navrhovaného značení.

Před vlastní realizací je nutné požádat o stanovení užití místní nebo přechodné úpravy silničního provozu, návrh DIO je nejprve nutno opětovně projednat s Policií ČR. Stanovení vydává příslušný orgán státní správy, ve smyslu ustanovení § 77 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů.

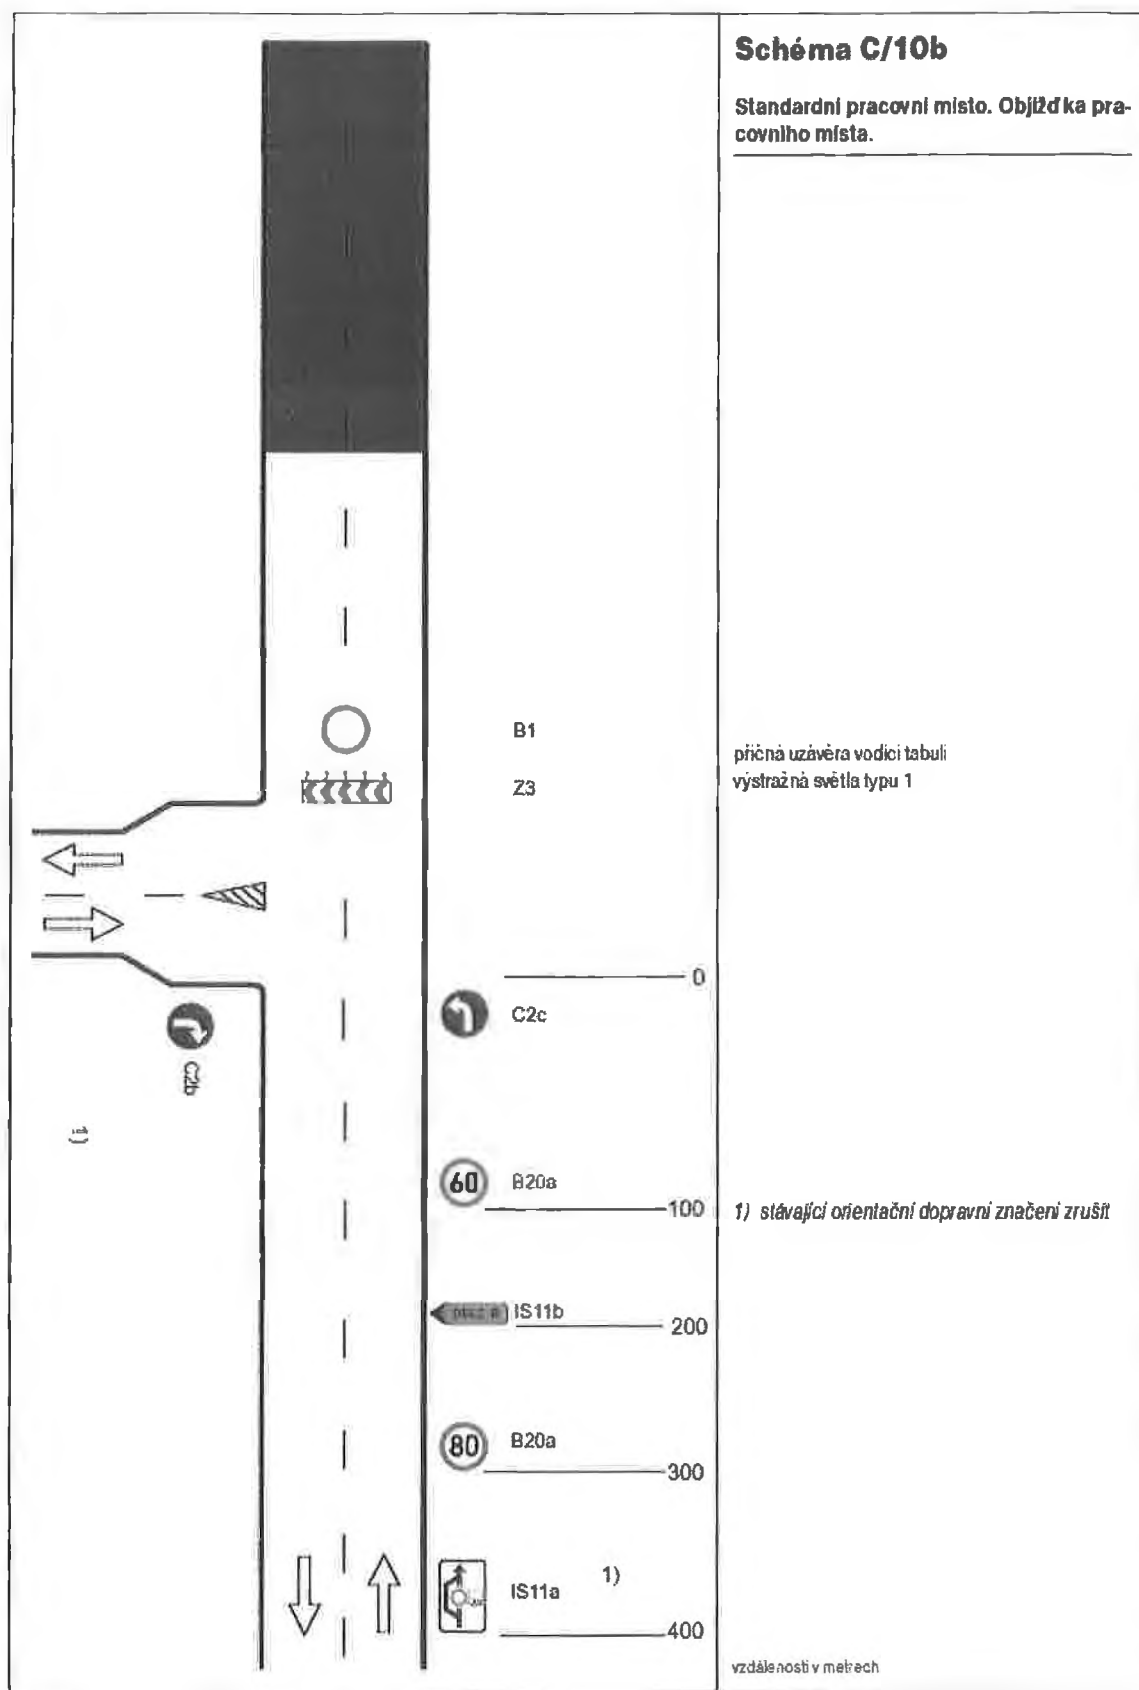

Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“)
ke Smlouvě o dílo ze dne 1.3.2019, uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami
(dále jen „Smlouva“)

„111-508 Mirošovice - Mnichovice, obnova protismykových vlastností a rovnosti krytu, provozní staničení km 1,503-3,702“

Číslo smlouvy objednatele: 436/00066001/2019

č. smlouvy zhotovitele : 7-0021A19

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

IČ : 00066001

DIČ: CZ00066001

Jednající: Mgr. Zdeněk Dvořák MPA, ředitel

osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních: Mgr. Zdeněk Dvořák MPA, ředitel

(dále jen „**Objednatel**“)

na straně jedné

a

PORR a.s.

se sídlem: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

IČO: 43005560

DIČ: CZ43005560

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006

jejímž jménem jedná: Ing. Pavel Hirsch, ředitel úseku Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s.,

Oblast Čechy - Střed (na základě plné moci), a Ing. František Buršík, vedoucí technického úseku

Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Čechy – Střed.

(dále jen „**Zhotovitel**“)

na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl., § 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek dále uvedených, tento Dodatek:

- I. Smluvní strany se dohodly na základě změny dopravně inženýrského opatření oproti zadávací dokumentaci, která byla projednána a odsouhlasena zástupci jednotlivých organizací na uzavírkové komisi, včetně vydání rozhodnutí. Jedná se o změnu úplného omezení celého prostoru výstavby, tj. s vyloučenou dopravou, na realizaci stavby ve čtyřech etapách s výstavbou pouze v jednom jízdním pruhu.

2. Opravený harmonogram je přílohou tohoto dodatku.
3. Na základě těchto změn se smluvní strany dohodly na úpravě článku č. 4.1 Smlouvy a to následovně:

Článek 4. Doba a místo plnění

- 4.1 Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 10 dnů od převzetí Staveniště a Dílo dokončit a předat Objednateli **do 5 měsíců** od předání Staveniště Zhotoviteli.
4. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.
5. Tento Dodatek je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, které mají platnost originálu. Zhotovitel obdrží po dvou (2) stejnopise a Objednatel obdrží po třech (3) stejnopisech.
6. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

V Říčanech dne _____

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace
Mgr. Zdeněk Dvořák MPA, ředitel

V Praze dne _____

**Pavel
Hirsch**

Ing. Pavel Hirsch
ředitel úseku Dopravních a inženýrských staveb
PORR a.s., Oblast Čechy- Střed
na základě plné moci

**František
Buršík**

Ing. František Buršík
vedoucí technického úseku Dopravních a
inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Čechy - Střed
na základě plné moci

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	červen 2019	červenec 2019	srpen 2019	září
					3 8 13 18 23 28 3 8 13 18 23 28 2 7 12 17 22 27 2 7 12 17 22 27 1 6 11 16 21 26 31			
1	II-508 Mírošovice - Mnichovice, obnova protismykových vlastností a rovnosti krytu, provozní staničení km 1,503-3,702	147 dny	8.4. 19	1.9. 19				
2	SO 101 - Hlavní trasa	140 dny	8.4. 19	25.8. 19				
3	Etapa I. - km 1,503 - 2,250	63 dny	8.4. 19	9.6. 19				
39	Etapa II. - km 2,250 - 2,900	77 dny	10.6. 19	25.8. 19				
71	Etapa III. - km 2,900 - 3,060	35 dny	22.7. 19	25.8. 19				
88	Etapa IV. - km 3,060 - 3,703	89 dny	10.4. 19	7.7. 19				
123	SO 182 - DIO	140 dny	8.4. 19	25.8. 19				
124	Etapa I. - km 1,503 - 2,250	63 dny	8.4. 19	9.6. 19				
125	Etapa II. - km 2,250 - 2,900	77 dny	10.6. 19	25.8. 19				
126	Etapa III. - km 2,900 - 3,060	35 dny	22.7. 19	25.8. 19				
127	Etapa IV. - km 3,060 - 3,703	89 dny	10.4. 19	7.7. 19				
128	SO 193 - SDZ, VDZ	21 dny	12.8. 19	1.9. 19				
129	Realizace SDZ	14 dny	12.8. 19	25.8. 19				
130	Realizace VDZ	7 dny	26.8. 19	1.9. 19				

Projekt II-508, Mírošovice - Mn
Datum: 21.3. 19


Úkol	Neaktivní úkol
Rozdělení	Neaktivní milník
Milník	Neaktivní souhm
Souhmý	Ruční úkol
Souhm projektu	Pouze s dobou trvání


Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu	Vnější milník
Ruční souhm	Konečný termín
Pouze zahájení	Průběh
Pouze s datem dokončení	Průběh ručně zadaného úkolu
Vnější úkoly	

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	úben 2019	květe
					3.	8. 13. 18. 23. 28. 3.
1	II-508 Mírošovice - Mnichovice, obnova protismykových vlastností a rovnosti krytu, provozní staničení km 1,503-3,702	147 dny	8.4. 19	1.9. 19		
2	SO 101 - Hlavní trasa	140 dny	8.4. 19	25.8. 19		
3	Etapa I. - km 1,503 - 2,250	63 dny	8.4. 19	9.6. 19		
4	SO 101 - levá strana	63 dny	8.4. 19	9.6. 19		
5	Frézování vozovky	1 den	8.4. 19	8.4. 19		
6	Demontáž ocelových svodidel v km 1,503 - 1,584 a odstranění směrových sloupků	1 den	8.4. 19	8.4. 19		
7	Odtěžení svahu v km 1,633 - 1,700 a 1,850 - 2,070 a 2,170 - 2,207	7 dny	9.4. 19	15.4. 19		
8	Odtěžení drnu na krajnici a pročištění příkopů	7 dny	9.4. 19	15.4. 19		
9	Výměna čela propustku v km 1,807 s opravou vtokového vývažíště	7 dny	16.4. 19	22.4. 19		
10	Oprava vtokového vývažíště propustku v km 2,207	7 dny	16.4. 19	22.4. 19		
11	Realizace propustku na sjezdu DN 300 v km 2,240	14 dny	23.4. 19	6.5. 19		
12	Rozšíření násypového tělesa a jeho zpevnění geosyntetikou v km 2,170 - 2,207	7 dny	16.4. 19	22.4. 19		
13	Realizace AZ, k-ční vrstvy z ŠD a Rmat včetně dosypávky zemní krajnice	7 dny	16.4. 19	22.4. 19		
14	Realizace obrubníku a podkladního betonu v km 1,633 - 1,700 a 1,850 - 2,070	6 dny	14.5. 19	19.5. 19		
15	Realizace rigolu z kamenných kostek v km 1,633 - 1,700 a 1,850 - 2,070	14 dny	24.5. 19	6.6. 19		
16	Recyklace za studena a úprava pláně	1 den	13.5. 19	13.5. 19		
17	Realizace k-čních vrstev SAL a ACL16+	3 dny	20.5. 19	22.5. 19		
18	Realizace k-ční vrstvy ACO 11+	1 den	23.5. 19	23.5. 19		
19	Realizace zpevnění krajnice asf.rec.	13 dny	24.5. 19	5.6. 19		
20	Montáž ocelových svodidel v km 1,503 - 1,584	2 dny	6.6. 19	7.6. 19		
21	Ohumusování svahů a osetí travním semenem s protierozní geomříží	17 dny	24.5. 19	9.6. 19		


n 2019 červen 2019 červenec 2019 srpen 2019 září

8.	13.	18.	23.	28.	2.	7.	12.	17.	22.	27.	2.	7.	12.	17.	22.	27.	1.	6.	11.	16.	21.	26.	31.
----	-----	-----	-----	-----	----	----	-----	-----	-----	-----	----	----	-----	-----	-----	-----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----

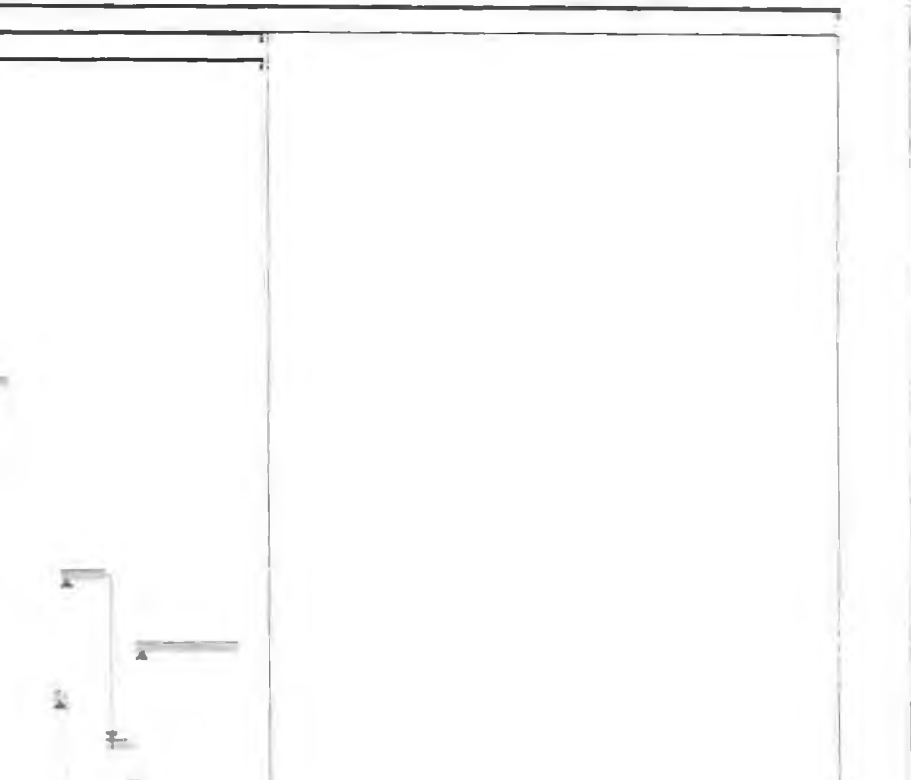

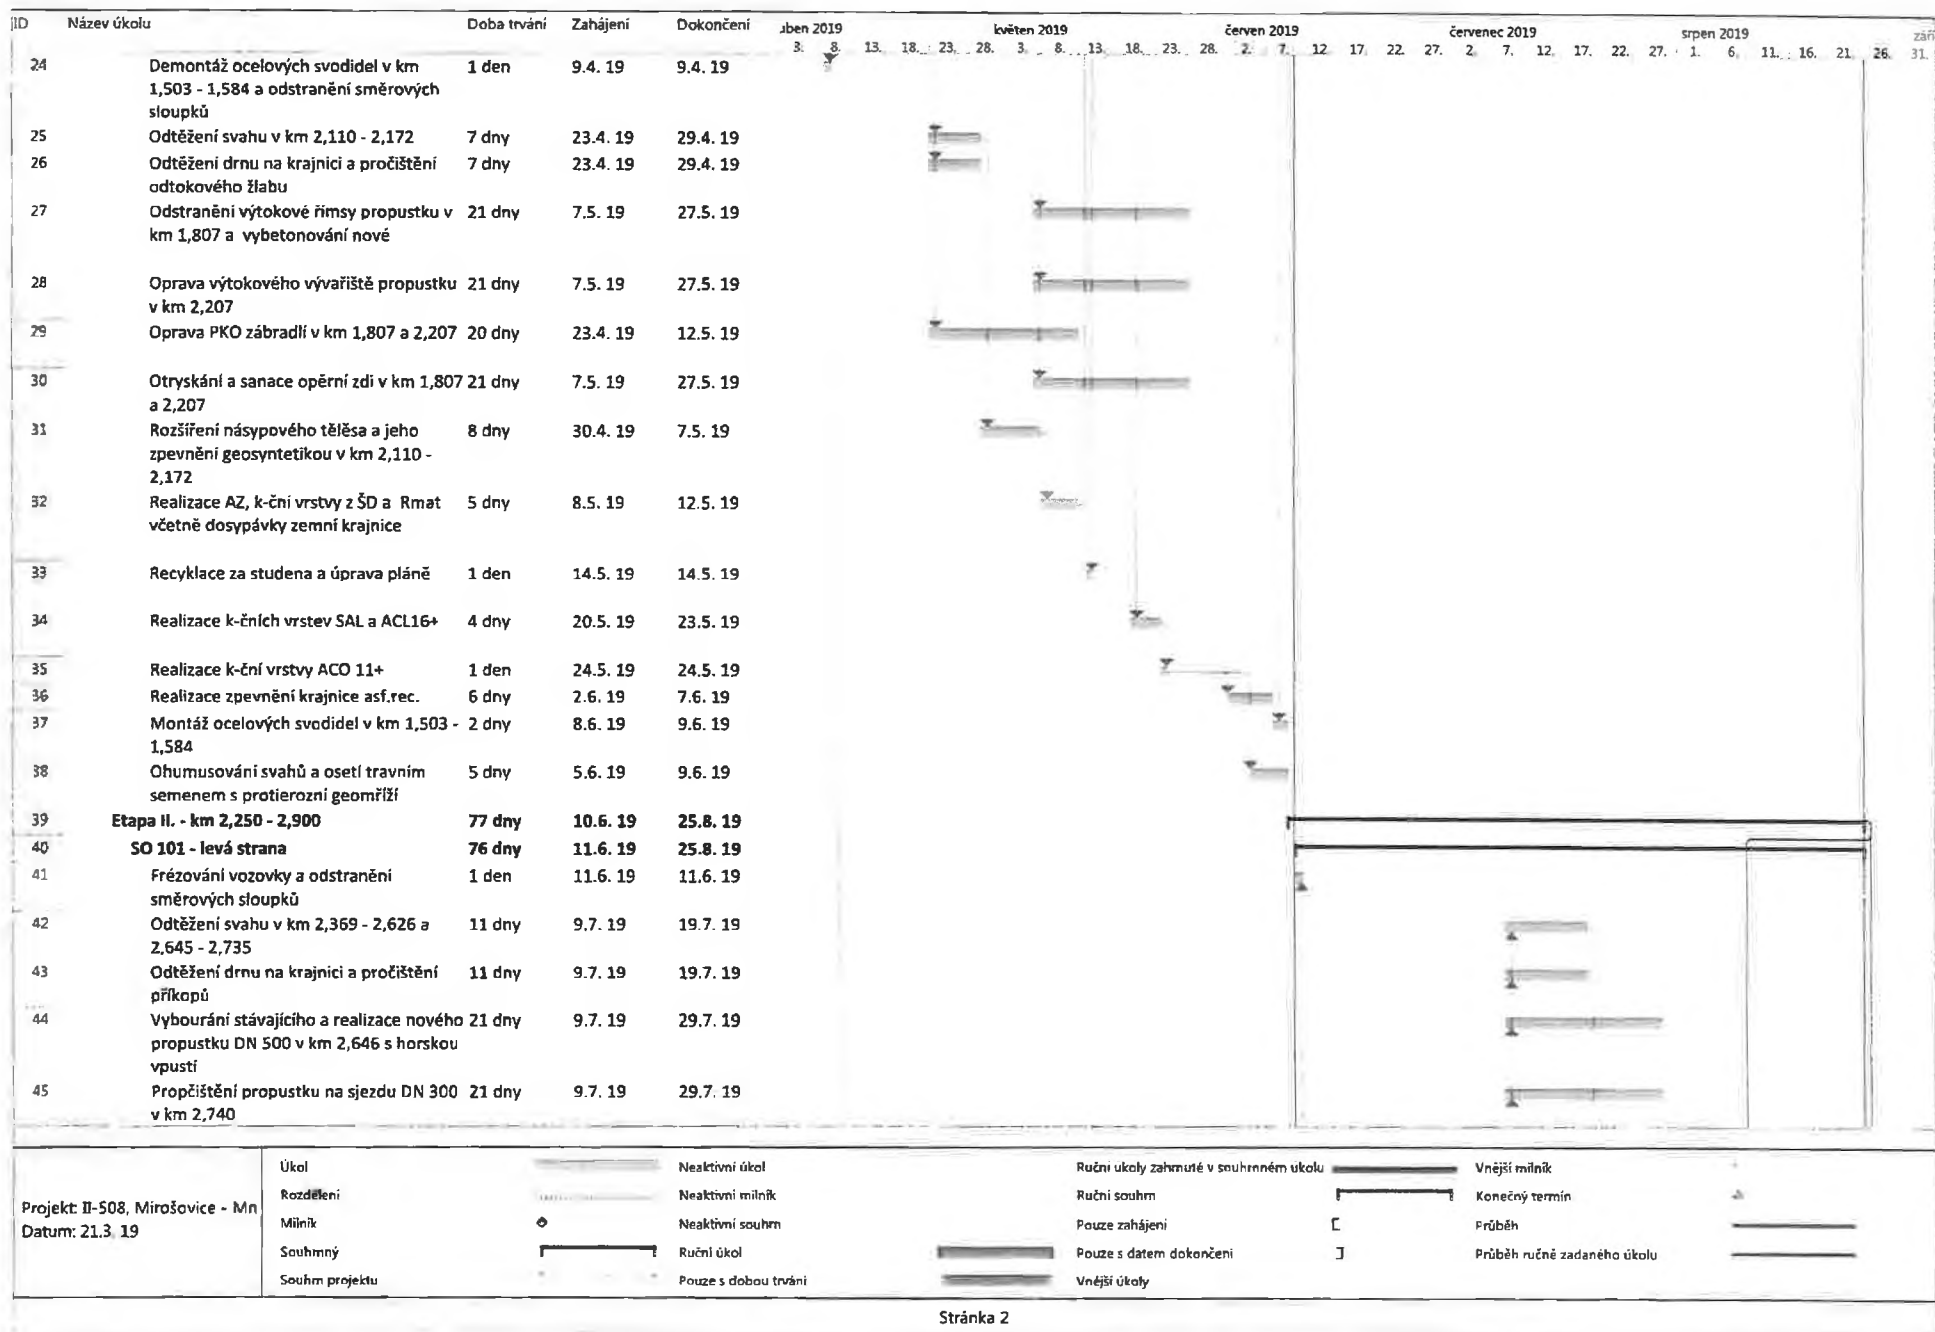

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	červen 2019			
					3	8	13	1
46	Vybourání stávajícího a realizace nového propustku DN 500 v km 2,862 s horskou vpustí	21 dny	9.7. 19	29.7. 19				
47	Realizace propustku na sjezdu DN 300 v km 2,870	14 dny	30.7. 19	12.8. 19				
48	Rozšíření násypového tělesa a jeho zpevnění geosyntetikou v km 2,645 - 2,735	10 dny	20.7. 19	29.7. 19				
49	Realizace AZ, k-ční vrstvy z ŠD a Rmat včetně dosypávky zemní krajnice	5 dny	25.7. 19	29.7. 19				
50	Realizace obrubníku a podkladního betonu v km 2,369 - 2,626	5 dny	31.7. 19	4.8. 19				
51	Realizace rigolu z kamenných kostek v km 2,369 - 2,626	14 dny	9.8. 19	22.8. 19				
52	Realizace betonových žlabovek v km 2,626 - 2,734 a 2,862 - 2,870	14 dny	9.8. 19	22.8. 19				
53	Recyklace za studena a úprava pláně	1 den	30.7. 19	30.7. 19				
54	Realizace k-čních vrstev SAL a ACL16+	3 dny	5.8. 19	7.8. 19				
55	Realizace k-ční vrstvy ACO 11+	1 den	8.8. 19	8.8. 19				
56	Realizace zpevnění krajnice asf.rec.	17 dny	9.8. 19	25.8. 19				
57	Ohumusování svahů a osetí travním semenem s protierozní geomříží	17 dny	9.8. 19	25.8. 19				
58	SO 101 - pravá strana	77 dny	10.6. 19	25.8. 19				
59	Frézování vozovky a odstranění směrových sloupků	1 den	10.6. 19	10.6. 19				
60	Odtěžení svahu v km 2,270 - 2,305 a 2,350 - 2,607 a 2,647 - 2,774	14 dny	11.6. 19	24.6. 19				
61	Odtěžení drnu na krajnici a rozšíření krajnice v km 2,790 - 2,860	14 dny	11.6. 19	24.6. 19				
62	Vybourání stávajícího a realizace nového propustku DN 500 v km 2,646 se šikmým čelem a opevněním	28 dny	11.6. 19	8.7. 19				
63	Vybourání stávajícího a realizace nového propustku DN 500 v km 2,862 s horskou vpustí	28 dny	11.6. 19	8.7. 19				

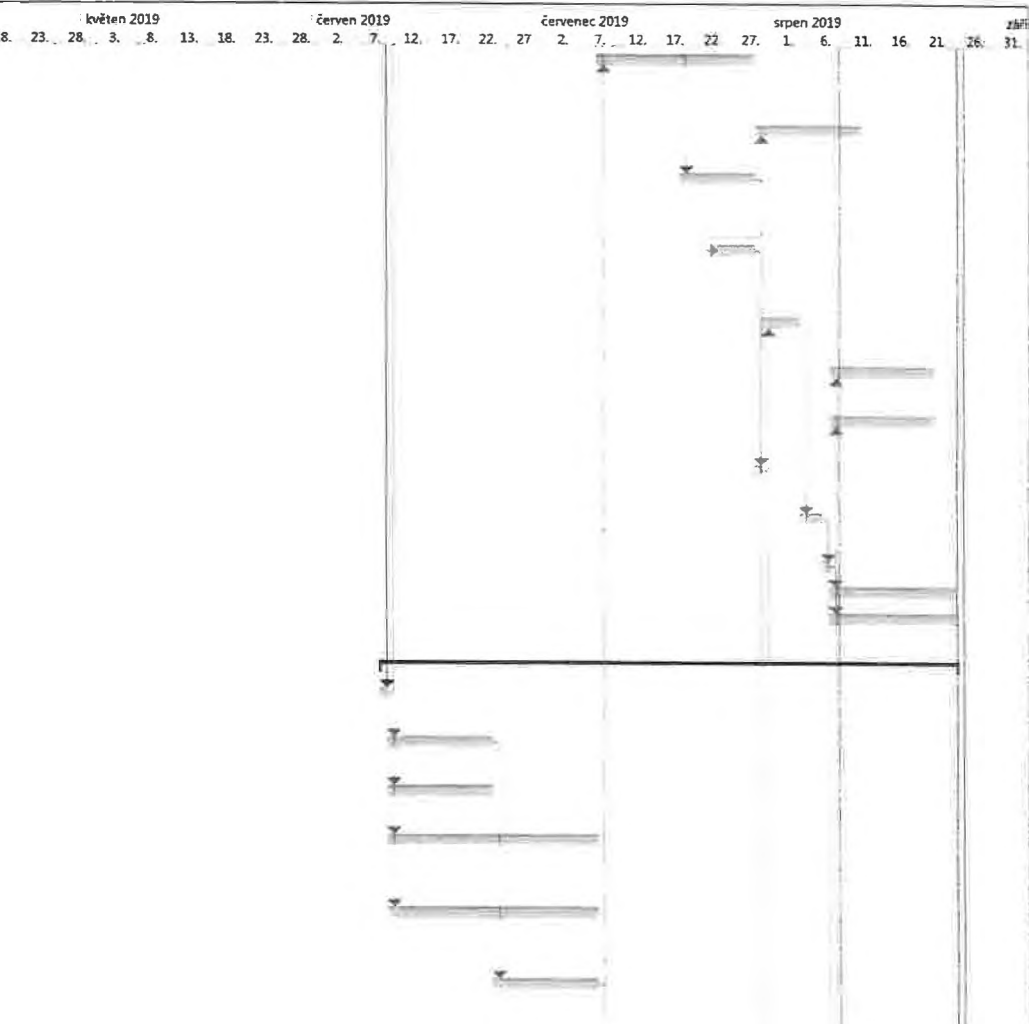


ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	leden 2019	únor 2019	březen 2019	květen 2019	červen 2019	červenec 2019	srpen 2019	září																							
66	Recyklace za studena a úprava pláň	1 den	31.7. 19	31.7. 19	3.	8.	13.	18.	23.	28.	3.	8.	13.	18.	23.	28.	2.	7.	12.	17.	22.	27.	2.	7.	12.	17.	22.	27.	1.	6.	11.	16.	21.	26.	31.
67	Realizace k-čních vrstev SAL a ACL16+	3 dny	5.8. 19	7.8. 19																															
68	Realizace k-ční vrstvy ACO 11+	1 den	8.8. 19	8.8. 19																															
69	Realizace zpevnění krajnice asf.rec.	17 dny	9.8. 19	25.8. 19																															
70	Ohumusování svahů a osetí travním semenem s protierozní geomříží	17 dny	9.8. 19	25.8. 19																															
71	Etapu III. - km 2,900 - 3,060	35 dny	22.7. 19	25.8. 19																															
72	SO 101 - levá strana	35 dny	22.7. 19	25.8. 19																															
73	Frézování vozovky a odstranění směrových sloupků	1 den	22.7. 19	22.7. 19																															
74	Odtěžení drnu na krajnici a pročištění příkopů	7 dny	23.7. 19	29.7. 19																															
75	Recyklace za studena a úprava pláň	1 den	30.7. 19	30.7. 19																															
76	Realizace k-čních vrstev SAL a ACL16+	3 dny	5.8. 19	7.8. 19																															
77	Realizace k-ční vrstvy ACO 11+	1 den	8.8. 19	8.8. 19																															
78	Realizace zpevnění krajnice asf.rec.	17 dny	9.8. 19	25.8. 19																															
79	Ohumusování svahů a osetí travním semenem	17 dny	9.8. 19	25.8. 19																															
80	SO 101 - pravá strana	34 dny	23.7. 19	25.8. 19																															
81	Frézování vozovky a odstranění směrových sloupků	1 den	23.7. 19	23.7. 19																															
82	Odtěžení drnu na krajnici	6 dny	24.7. 19	29.7. 19																															
83	Recyklace za studena a úprava pláň	1 den	31.7. 19	31.7. 19																															
84	Realizace k-čních vrstev SAL a ACL16+	3 dny	5.8. 19	7.8. 19																															
85	Realizace k-ční vrstvy ACO 11+	1 den	8.8. 19	8.8. 19																															
86	Realizace zpevnění krajnice asf.rec.	17 dny	9.8. 19	25.8. 19																															
87	Ohumusování svahů a osetí travním semenem s protierozní geomříží	17 dny	9.8. 19	25.8. 19																															
88	Etapu IV. - km 3,060 - 3,703	89 dny	10.4. 19	7.7. 19																															
89	SO 101 - levá strana	88 dny	11.4. 19	7.7. 19																															
90	Frézování vozovky a odstranění směrových sloupků	1 den	11.4. 19	11.4. 19																															
91	Odtěžení svahu v km 3,394 - 3,691	8 dny	18.5. 19	25.5. 19																															
92	Odtěžení drnu na krajnici a pročištění příkopů	8 dny	18.5. 19	25.5. 19																															
93	Realizace trativodu v km 3,394 - 3,691	8 dny	26.5. 19	2.6. 19																															

Projekt: II-508, Mirošovice - Mn Datum: 21.3. 19	Úkol		Neaktivní úkol		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu		Vnější milník	
	Rozdělení		Neaktivní milník		Ruční souhrn		Konečný termín	
	Milník		Neaktivní souhrn		Pouze zahájení		Průběh	
	Souhrnný		Ruční úkol		Pouze s datem dokončení		Průběh ručně zadáného úkolu	
	Souhrn projektu		Pouze s dobou trvání		Vnější úkoly			

Stránka 4

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	červen 2019 3. 8. 13
94	Vybourání stávajícího a realizace nového 23 dny propustku DN 600 v km 3,161 s šikmým čelem a vývařštěm		18.5. 19	9.6. 19	
95	Vybourání stávajícího a realizace nového 23 dny propustku DN 500 v km 3,230 s horskou vpustí		18.5. 19	9.6. 19	
96	Vybourání stávajícího a realizace nového 23 dny propustku DN 500 v km 3,394 s horskou vpustí		18.5. 19	9.6. 19	
97	Vybourání stávajícího a realizace nového 23 dny propustku DN 500 v km 3,529 s horskou vpustí		18.5. 19	9.6. 19	
98	Realizace AZ, k-ční vrstvy z ŠD a Rmat 7 dny včetně dosypávky zemní krajnice		3.6. 19	9.6. 19	
99	Realizace obrubníku a podkladního 7 dny betonu v km 3,394 - 3,691		12.6. 19	18.6. 19	
100	Realizace rigolu z kamenných kostek v 13 dny km 3,394 - 3,691		25.6. 19	7.7. 19	
101	Recyklace za studena a úprava pláň 1 den		10.6. 19	10.6. 19	
102	Realizace k-čních vrstev SAL a ACL16+ 5 dny		19.6. 19	23.6. 19	
103	Realizace k-ční vrstvy ACO 11+ 1 den		24.6. 19	24.6. 19	
104	Realizace zpevnění krajnice asf.rec. 13 dny		25.6. 19	7.7. 19	
105	Ohumusování svahů a osetí travním 13 dny semenem s protierozní geomříží		25.6. 19	7.7. 19	
106	SO 101 - pravá strana 89 dny		10.4. 19	7.7. 19	
107	Frézování vozovky a odstranění 1 den směrových sloupků		10.4. 19	10.4. 19	
108	Odtěžení svahu v km 3,164 - 3,507 a 15 dny 3,507 - 3,551		11.4. 19	25.4. 19	
109	Odtěžení drnu na krajnici 15 dny		11.4. 19	25.4. 19	
110	Vybourání stávajícího a realizace nového 30 dny propustku DN 600 v km 3,161 s šikmým		11.4. 19	10.5. 19	

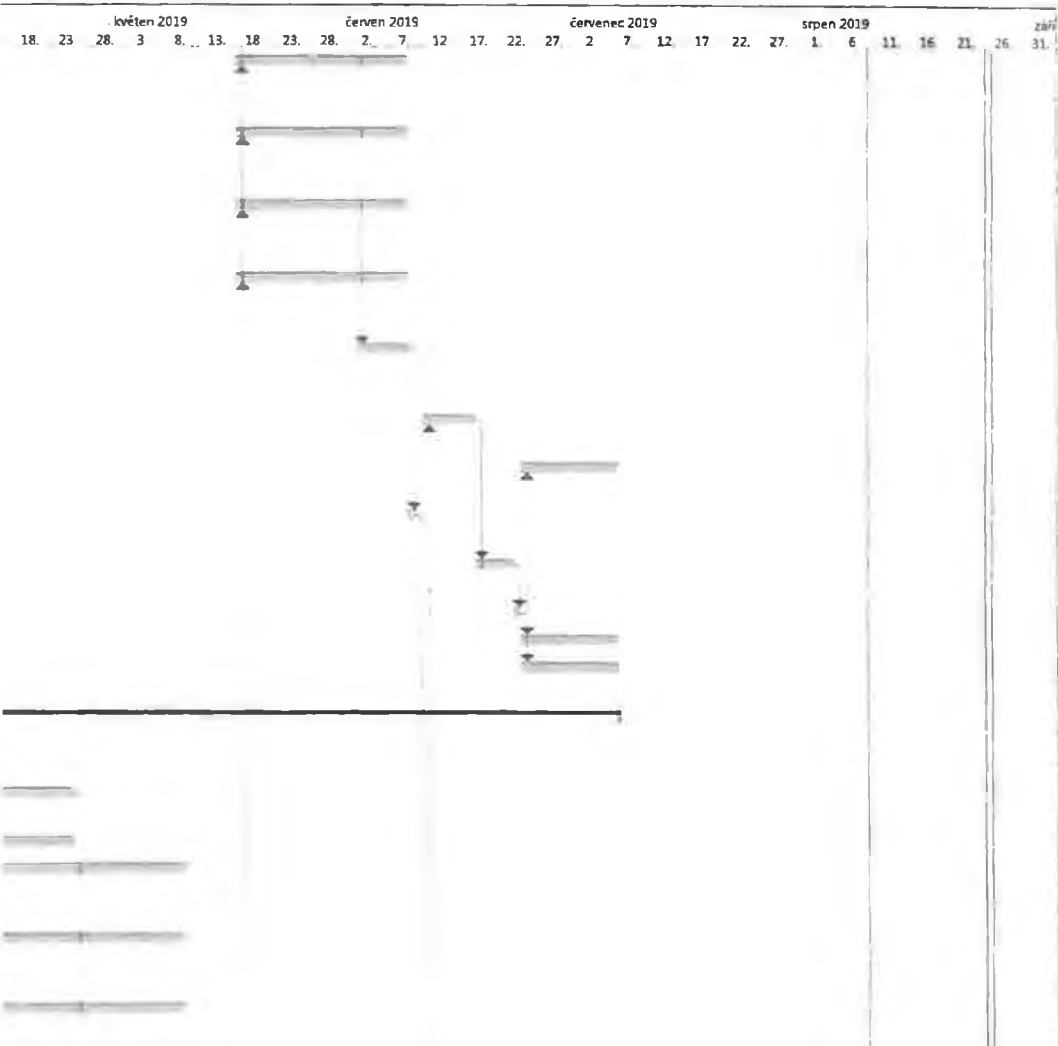

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	leden 2019	únor 2019	březn 2019	květen 2019	červen 2019	červenec 2019	srpen 2019	září
114	Rozšíření násypového tělesa a jeho zpevnění geosyntetikou v km 3,164 - 3,507	15 dny	26.4. 19	10.5. 19								
115	Rozšíření násypového tělesa a jeho zpevnění gabionem a geosyntetikou v km 3,507 - 3,551	15 dny	26.4. 19	10.5. 19								
116	Realizace AZ, k-ční vrstvy z ŠD a Rmat včetně dosypávky zemní krajnice	7 dny	11.5. 19	17.5. 19								
117	Recyklace za studena a úprava pláňe	1 den	11.6. 19	11.6. 19								
118	Realizace k-čních vrstev SAL a ACL16+	5 dny	19.6. 19	23.6. 19								
119	Realizace k-ční vrstvy ACO 11+	1 den	24.6. 19	24.6. 19								
120	Realizace zpevnění krajnice asf.rec.	11 dny	25.6. 19	5.7. 19								
121	Montáž ocelových svodidel v km 3,507 - 3,551	2 dny	6.7. 19	7.7. 19								
122	Ohumusování svahů a osetí travním semenem s protierozní a zatravňovací geomříží	13 dny	25.6. 19	7.7. 19								
123	SO 182 - DIO	140 dny	8.4. 19	25.8. 19								
124	Etapa I. - km 1,503 - 2,250	63 dny	8.4. 19	9.6. 19								
125	Etapa II. - km 2,250 - 2,900	77 dny	10.6. 19	25.8. 19								
126	Etapa III. - km 2,900 - 3,060	35 dny	22.7. 19	25.8. 19								
127	Etapa IV. - km 3,060 - 3,703	89 dny	10.4. 19	7.7. 19								
128	SO 193 - SDZ, VDZ	21 dny	12.8. 19	1.9. 19								
129	Realizace SDZ	14 dny	12.8. 19	25.8. 19								
130	Realizace VDZ	7 dny	26.8. 19	1.9. 19								

Projekt: II-508, Mirošovice - Mn
Datum: 21.3. 19

Úkol

Rozdělení

Mílník

Souhrnný

Souhrn projektu

Neaktivní úkol

Neaktivní mílník

Neaktivní souhrn

Ruční úkol

Pouze s dobou trvání

Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu

Ruční souhrn

Pouze zahájení

Pouze s datem dokončení

Vnější úkoly

Vnější mílník

Konečný termín

Průběh

Průběh ručně zadaného úkolu

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

PORR a.s.
Dubečská 3238/36
100 Praha 10
Strašnice

Věc: „II/508 Mirošovice – Mnichovice, obnova protismykových vlastností a rovnosti krytu, provozní staničení km 1,503 – 3,702“

S odvoláním na ust. čl. 6. Práva a povinnosti Objednatele Smlouvy o dílo č. 436/00066001/2019, odst. 6.7. může Objednatel požadovat změnu rozsahu Díla, a to při respektování povinností Objednatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „Zákon o ZVZ“). Zhotovitel je v takovém případě povinen vyhovět požadavku Objednatele a (i) snížit rozsah Díla nebo (ii) bez zbytečného odkladu podat nabídku na zvýšení rozsahu Díla o plnění stejného charakteru jako Dílo sjednané ve smlouvě s tím, že:

- a) při snížení rozsahu se Cena Díla odpovídajícím způsobem sníží,
- b) při zvýšení rozsahu bude Cena Díla v nabídce Zhotovitele stanovena na základě cen uvedených v nabídce v Oceněném soupisu prací,
- c) termín dokončení Díla se ve vhodných případech přiměřeně upraví dohodou smluvních stran,
- d) snížení či zvýšení rozsahu bude upraveno písemným dodatkem Smlouvy, kterým může být i evidenční list změny stavby podepsaný ze strany osob oprávněných jednat za Objednatele a Zhotovitele.

Žádáme o změnu rozsahu díla v souladu s návrhem :

SO 182 – Přejížděcí dopravní značení:

Zvýšit rozsah ceny díla o:

- Prodloužení DIO o dva měsíce, z důvodu výstavby po polovinách při zachování silničního provozu (odsouhlasený požadavek investorem z uzavírkové komise) – viz. dodatek smlouvy

SO 193 – Stálé dopravní značení:

Snížit rozsah ceny díla o:

- VDZ plastu a barvě, z důvodu zmenšení šířky vodičích čar z 0,25 m na 0,125 m, požadavek dopravního inspektorátu z místního šetření

SO VON – Vedlejší a ostatní náklady:

Zvýšit rozsah ceny díla o:

- Pomocné práce při regulaci dopravy, fotodokumentaci a provozování zařízení staveniště z důvodu prodloužení doby výstavby o dva měsíce – viz. dodatek smlouvy

Tyto změny rozsahu Díla tedy vznikly z nepředvídatelných důvodů. Změnám nebylo možné v zadávací dokumentaci předložit ani při vynaložení náležité péče ze strany všech věcně příslušných útvarů odpovědných za zpracování zadávací dokumentace. Položky jsou - podle § 5, odst. 1, písm. c) Směrnice R-Sm-36 (změna č. 2 účinná od 29.5.2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek - zařazeny do Skupiny 3.

V Praze dne:
