



Etapa č. 1

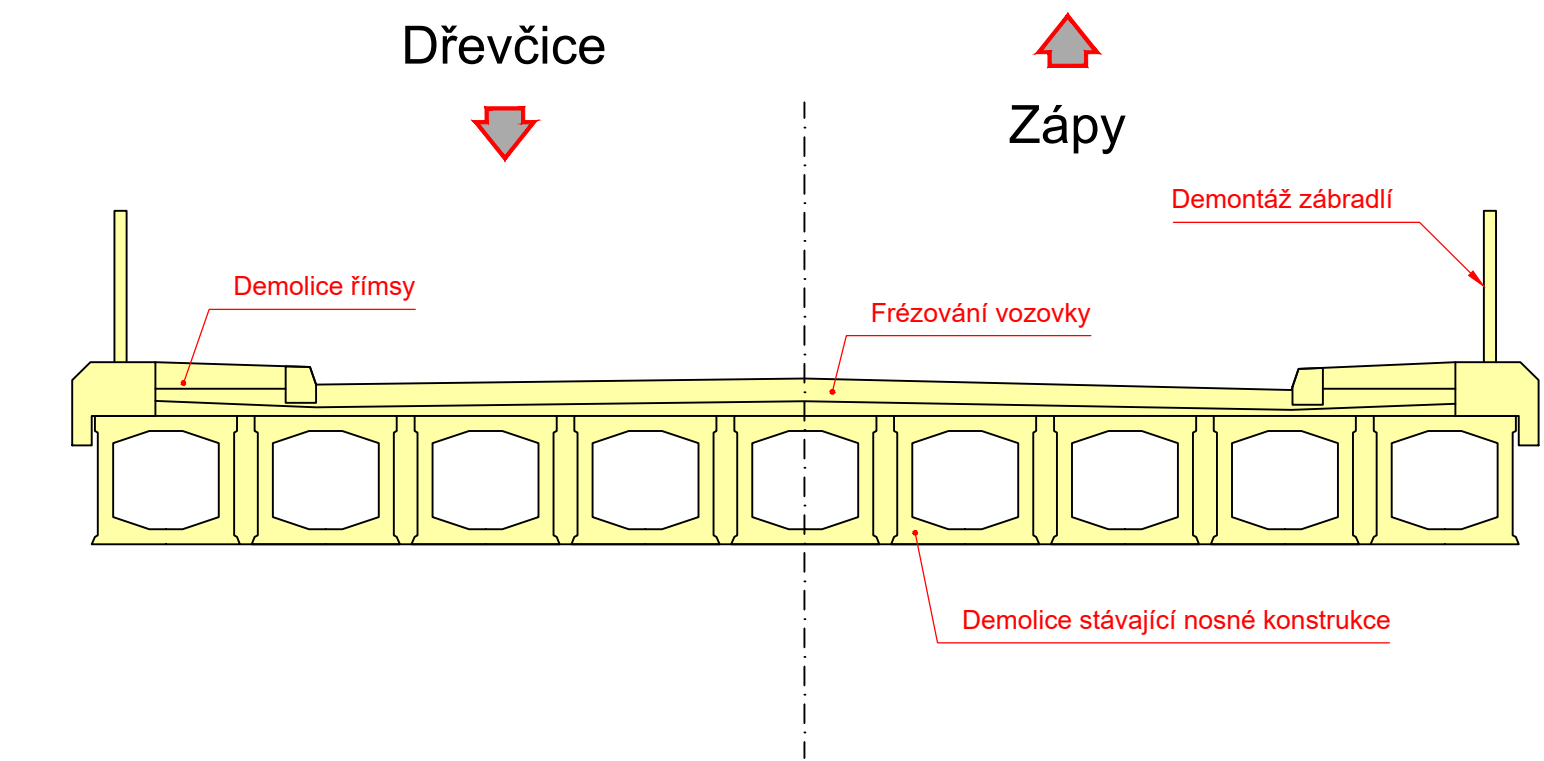


- Etapa č. 1 - Demolice stávající konstrukce**
- Zařízení staveniště, zaměření, vytyčení a ochrana inženýrských sítí.
  - Přípravné práce.
  - Zřízení DIO - krátkodobé uzavření dálnice D10, vyznačení objížděných tras, uzavření komunikace na mostě.
  - Demolice stávající konstrukce - podrobně viz SO 001.
  - Úprava DIO dálnice - režim 2+2, zrušení objížděných tras.

Etapa č. 2

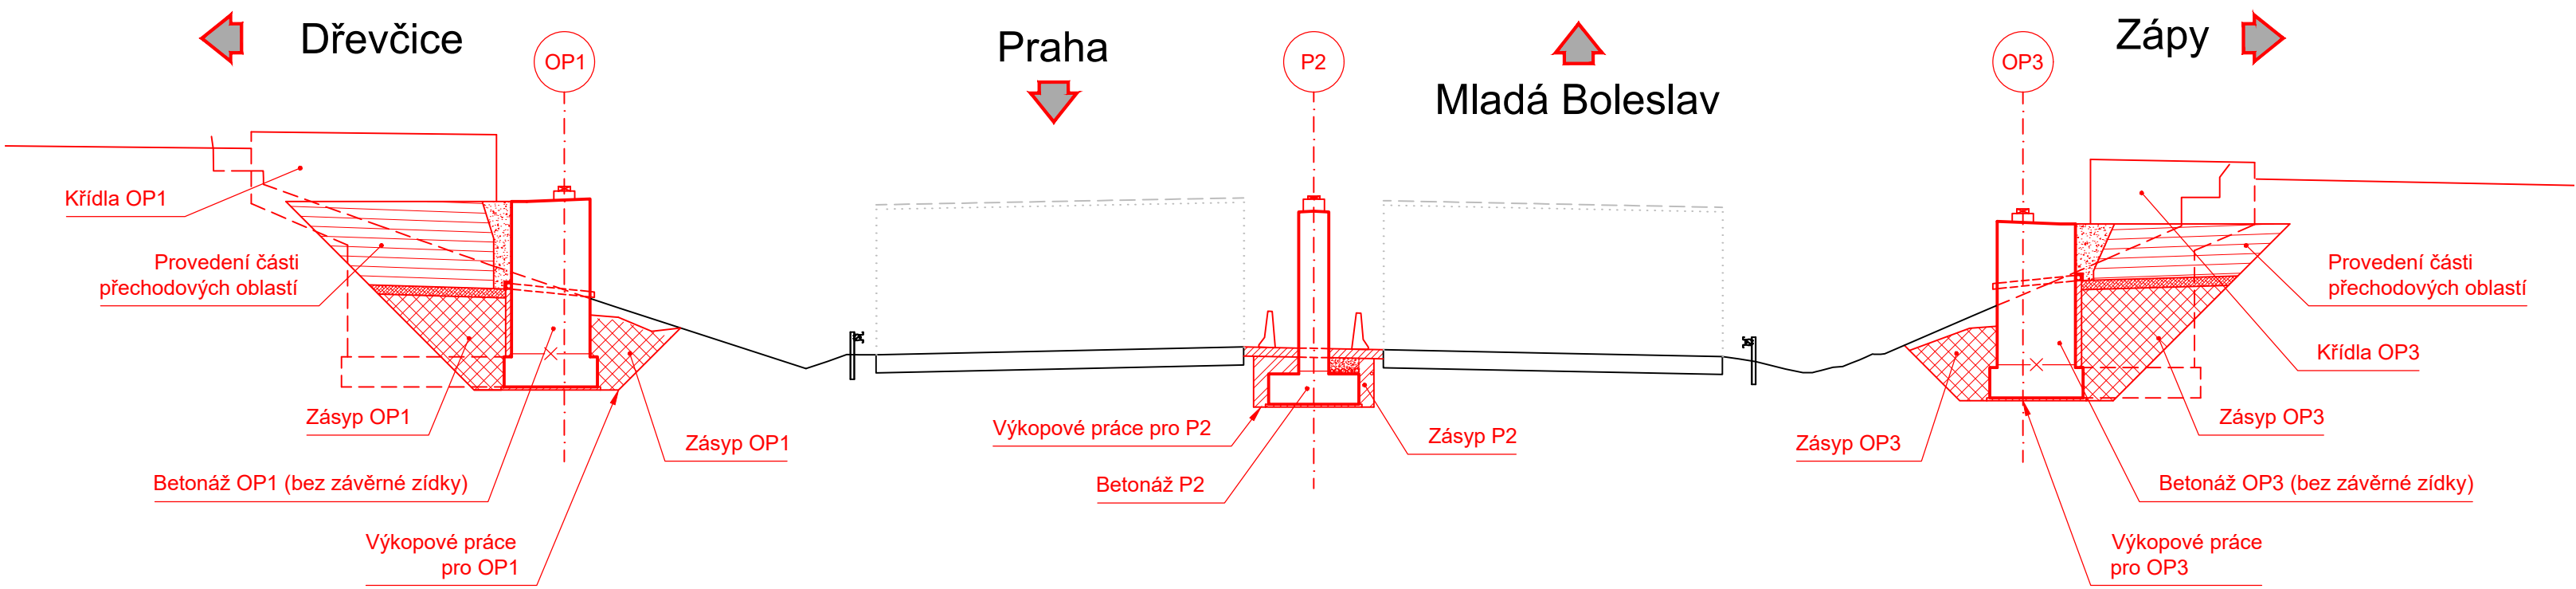


- Etapa č. 2 - Výstavba spodní stavby**
- Výkopové práce.
  - Podkladní betony.
  - Provedení založení.
  - Betonáž podpěr (opěry bez závěrných zidek).
  - Osazení ložisek.
  - Zасыпání základů.
  - Zhotovení části přechodových oblastí.

Etapa č. 3a

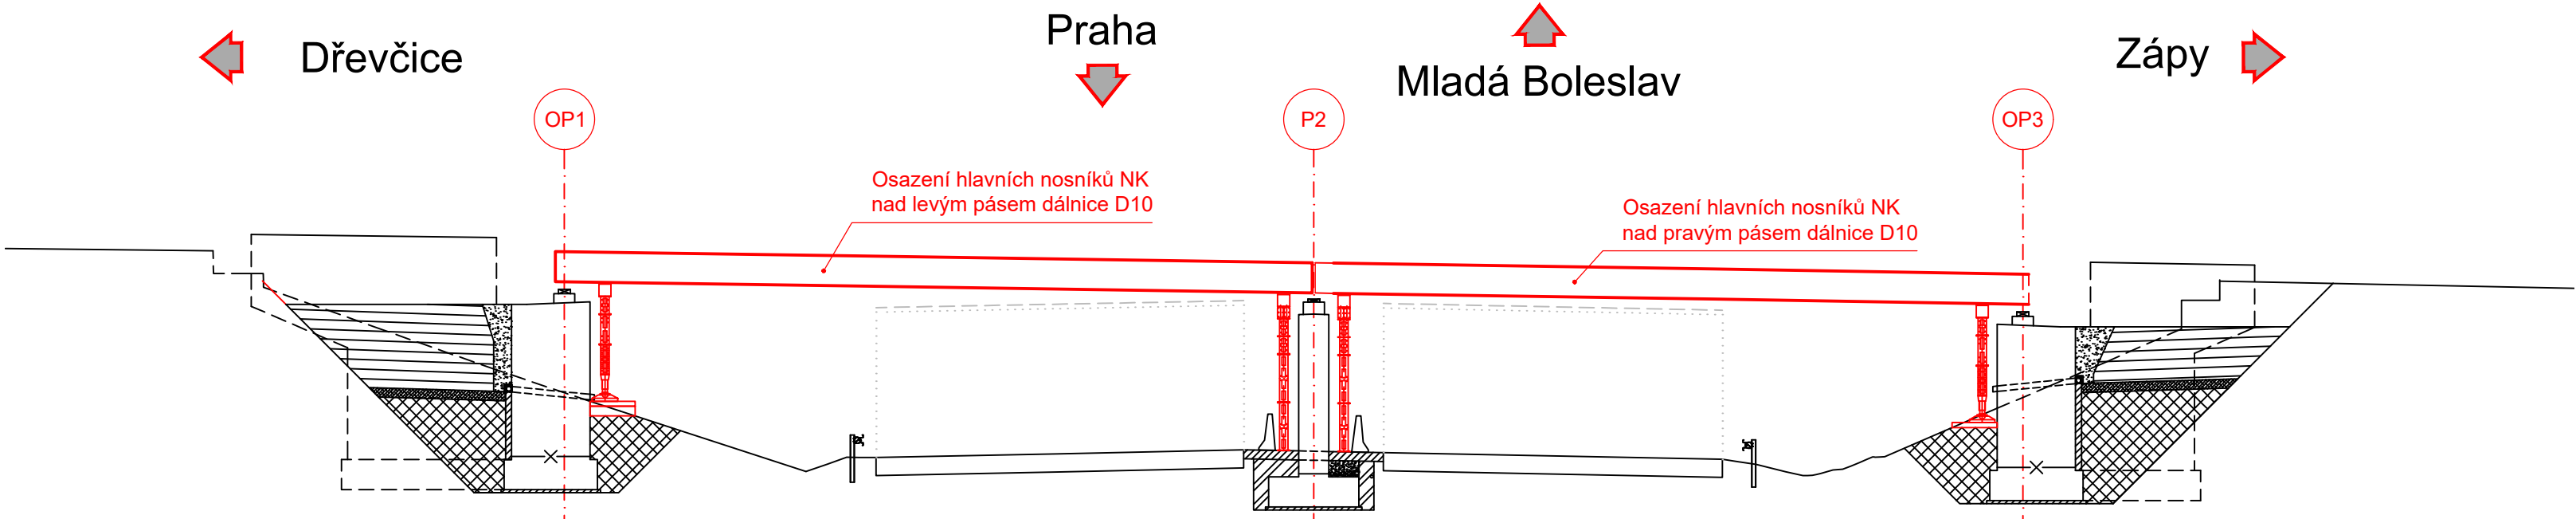


- Etapa č. 3 - Výstavba nosné konstrukce**
- Úprava DIO - uzavření pravého pásu dálnice D10, vytyčení objížděných tras.
  - Osazení provizorních stojek hlavní nosné konstrukce.
  - Osazení hlavních nosníků NK nad pravým pásem.
  - Montáž ochranné podlahy na spodních pásnicích nosníků, osazení ochranné konstrukce na boky nosné konstrukce a montáž montážních tlužidel.
  - Úprava DIO - uzavření levého pásu dálnice D10, vytyčení objížděných tras.
  - Osazení provizorních podpor hlavní nosné konstrukce.
  - Osazení hlavních nosníků NK nad pravým pásem.
  - Montáž ochranné podlahy na spodních pásnicích nosníků, osazení ochranné konstrukce na boky nosné konstrukce a montáž montážních tlužidel.
  - Úprava DIO - zrušení omezení na dálnici D10.
  - Příprava a betonáž koncových příčníků a sřažené desky mostovky nad opěrami a v polích.
  - Příprava a betonáž příčniku a sřažené desky mostovky na P2.
  - Osazení odvodňovačů, provedení podélných svodů odvodnění.
  - Odstranění ochranných konstrukcí pod NK, demontáž montážních tlužidel (za krátkodobých pracovních omezení dálnice D10).
  - Betonáž závěrných zidek.
  - Dokončení přechodových oblastí.
  - Provedení přechodových desek.
  - Osazení mostních závěrů.
  - Provedení izolací.
  - DIO je součástí SO 180.


Etapa č. 3b

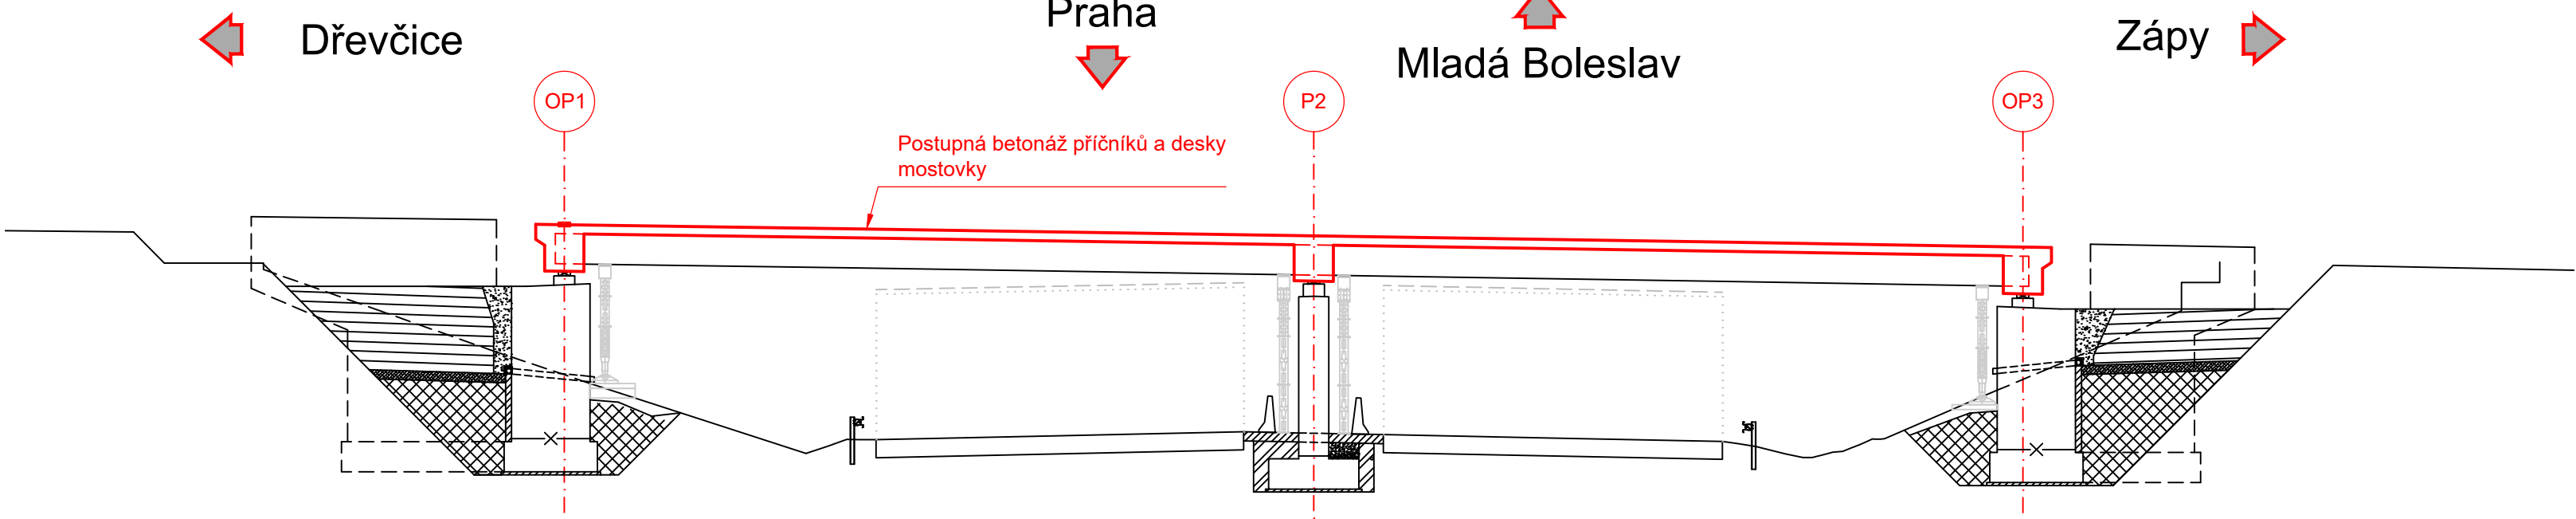

Etapa č. 3c

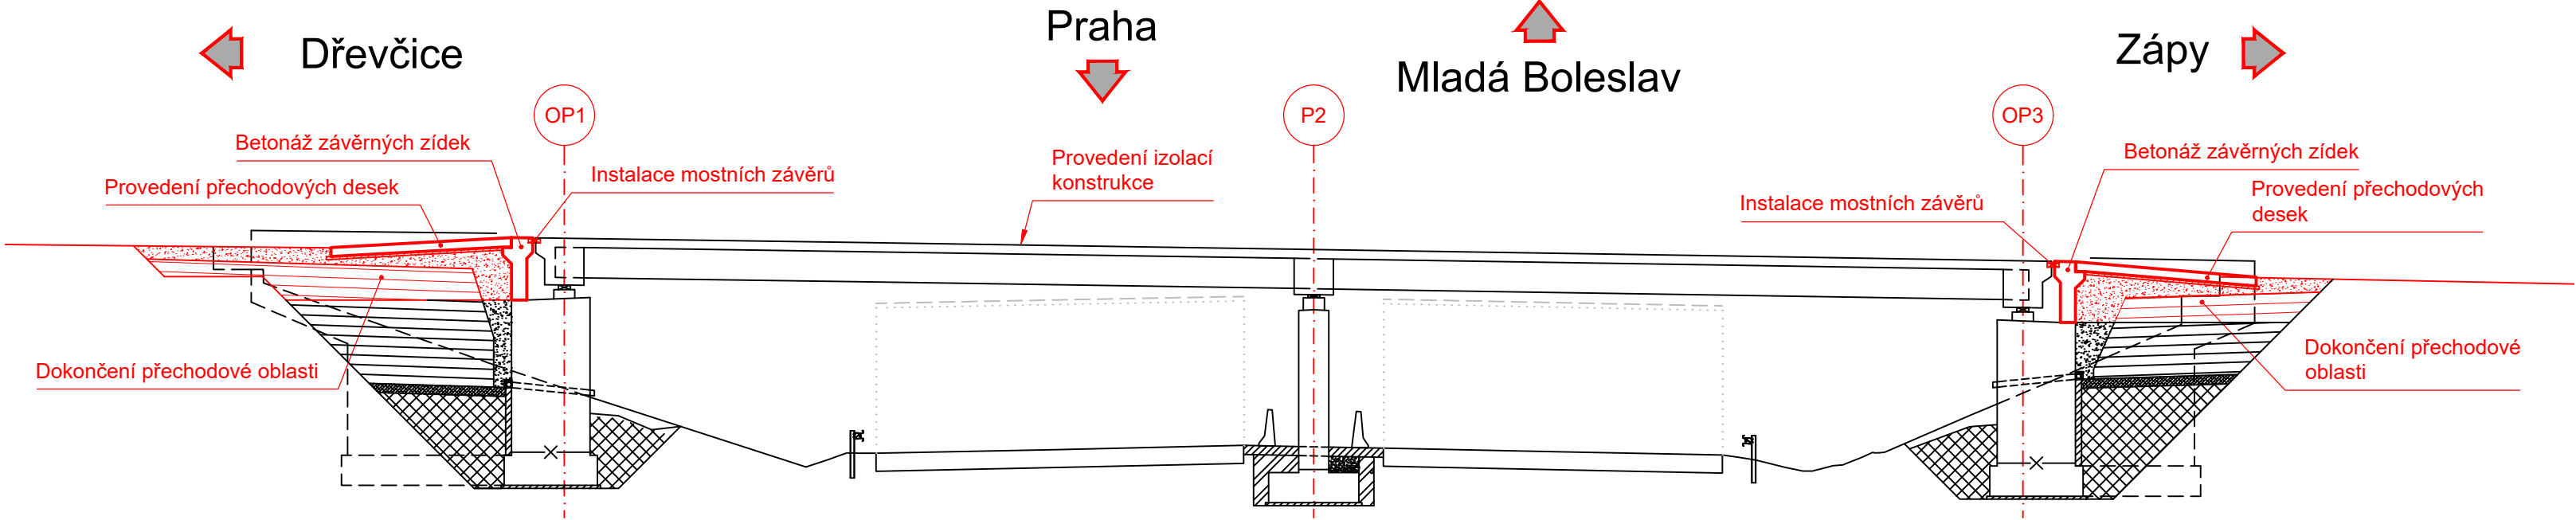

Etapa č. 4

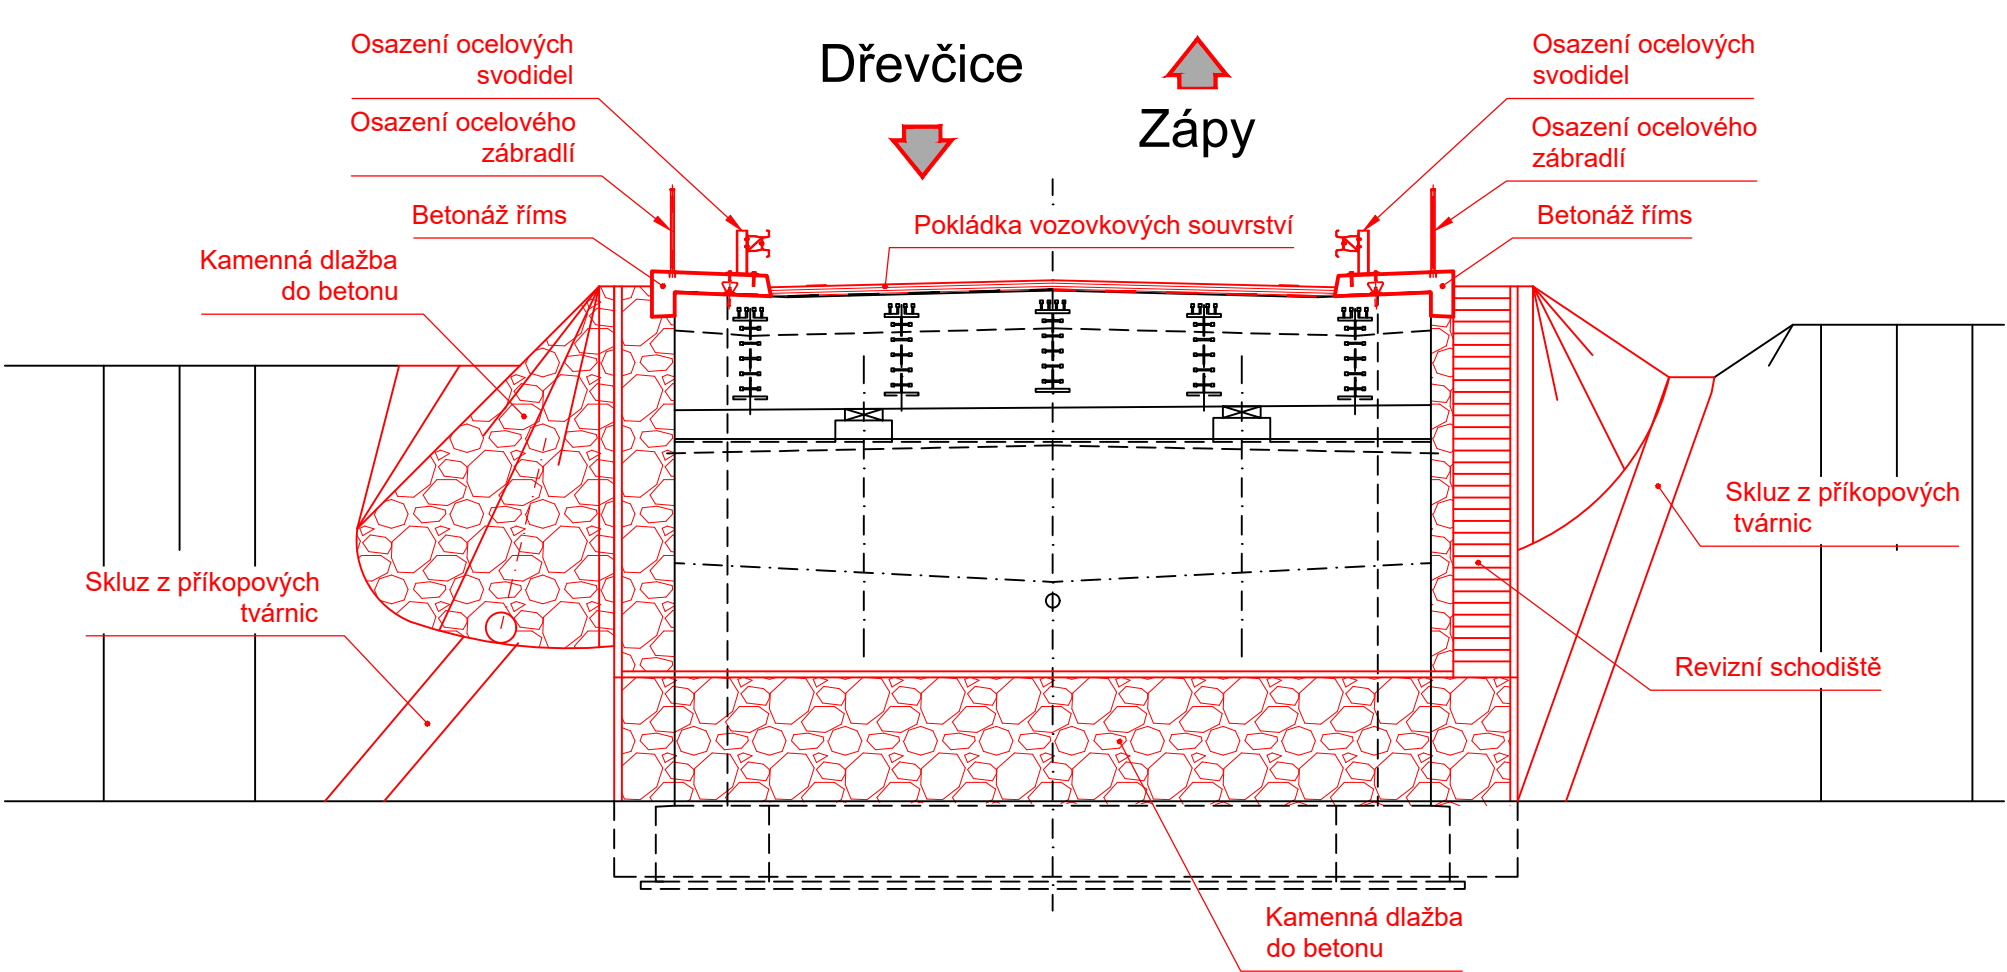

- Etapa č. 4 - Mostní svršek, vybavení a vozovka na přepolích**
- Provedení říms.
  - Dokončení prvků odvodnění mostu.
  - Osazení zábradlí a svodidel.
  - Demontáž ochranných konstrukcí na boku NK.
  - Provedení vozovky na mostě a předpolích.
  - Dokončení úprav okolo mostu.
  - Zřízení dopravního značení.
  - Dokončovací práce.

# PDPS SO 201

Souřadný systém S-JTSK; výškový systém Bpv

Přehled revizí přílohy					
01	2020-07-08	MPe	Čistopis PDPS	MDr	VHa
00	2020-06-15	MPe	Koncept PDPS	MDr	VHa
Rev.	Datum	Vypr.	Popis obsahu revize	Kontr.	Schv.

Objednatel	Razítko
<b>Středočeský kraj</b>	Středočeský kraj Krajský úřad Zborovská 11 150 21 Praha 5 www.kr-stredocesky.cz
Datum	Kontroloval Podpis

Projektant	Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. Národní 984/15 110 00 Praha 1 Česká republika T +420 221 412 800 F +420 221 412 810 W http://www.mottmac.com/czech-republic
------------	---

Kraj: Středočeský Obec: Zápy Katastrální území: Zápy
--

Akce III/01011 Zápy, most ev. č. 01011-1 přes dálnici D10 před obcí Zápy
---

Část dokumentace D1 Stavební část
--------------------------------------

SO/PS SO 201 Most ev. č. 01011-1
--

Projektant Ing. Milan Petřík	Kontrola Ing. Michal Drahorád Ph.D.
Vypracoval Ing. Pavel Sochor	Hlav. inž. proj. Ing. Michal Drahorád Ph.D.

Název přílohy Schéma technologie výstavby	Měřítko 1:200/100/50	Č. kopie
--	-------------------------	----------

Stupeň dok. PDPS	Číslo zakázky 398169 BR03	Číslo části D1.2	Číslo přílohy D1.2.14	Revize 01
---------------------	------------------------------	---------------------	--------------------------	--------------
