

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

II/239 Šlapanice, most ev.č. 239-007 pro odtok přivalové vody

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 201 - Most ev. č. 239-007

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

201/2

Číslo ZBV:

2

Objednatel:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov

IČ: 00066001

Zhotovitel:

Swietelsky stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby střed

Sokolovská 192/79, 186 00 Praha 8 Karlín

IČ: 48035599

Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.3	0,00	192 254,00	192 254,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1	0,00	192 254,00	192 254,00

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré:

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 2**

Název Stavby: II/239 Šlapanice, most ev.č. 239-007 pro odtok přívalové vody	
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	201 /2
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	Most ev. č. 239-007

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
2 635 935,87

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	216 720,00	2 852 655,87	216 720,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	192 254,00	408 974,00	15,52%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	0,00	3 044 909,87	408 974,00	15,52%

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 1													
Evidenční číslo a název stavby: II/239 Šlapanice, most ev.č. 239-007 pro odtok přívalové vody								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: SO 201 - Most ev. č. 239-007								SO201/2					
Číslo a název rozpočtu: SO 201 - Most ev. č. 239-007								Skupina Změn: 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	9 Ostatní konstrukce a práce												
1	014112	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	T	510,300	684,900	174,600	300,00	153 090,00	0,00	52 380,00	205 470,00	52 380,00	34,22%
5	13173	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	283,500	380,500	97,000	322,00	91 287,00	0,00	31 234,00	122 521,00	31 234,00	34,22%
14	27152	POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	63,648	160,648	97,000	1 120,00	71 285,76	0,00	108 640,00	179 925,76	108 640,00	152,40%
		Celkem						315 662,76	0,00	192 254,00	507 916,76	192 254,00	60,90%

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu. Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Milan Listopad

Datum:

Podpis:

Za Objednatele: Pavel Šeda, TDI

Datum:

Podpis:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: II/239 Šlapanice, most ev.č. 239-007 pro odtok přívalové vody

1	Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH	4 876 543,48
2=1+18+19	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	5 285 517,48
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) vč. DPH	6 395 476,15
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	108,39%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	408 974,00
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	8,39%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	1 462 963,04

9=(32A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	8,39%
10=(36A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,00%
10A=32A+36A	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	408 974,00
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	2 438 271,74

12=(37/1)*100	Sledování limitu 15 %	0,00%
13=37	Sledování limitu 140 448 000 Kč	0,00
14=140 448 000-37		140 448 000,00

						- 1 -			- 2 -			- 3 -					- 4 -					- 5 -	
						Vyhrazená změna (Doměrky)			Záměna položek (Započítávání)			Nepředvidanost					Nezbytnost					Změny de minimis	
SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Procentní vyjádření Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Procentní vyjádření Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny de minimis (15% nebo limit 140 448 000 Kč)	limit 15 %
16	17	18	19=23+26+29+33	20=24+27+30+34+37+39	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	31=(30/1)*100	32=29+30	32A=ABS(29)+30	33	34	35=(34/1)*100	36=33+34	36A=ABS(33)+34	37	38=(37/1)*100
		II/239 Šlapanice, most ev.č. 239-007 pro odtok přívalové	0,00	408 974,00	408 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 974,00	8,39%	408 974,00	408 974,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
201	1	SO 201 - Most ev. č. 239-007/ změna rozsahu svodidel	0,00	216 720,00	216 720,00			0,00			0,00	0,00	216 720,00	4,44%	216 720,00	216 720,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
201	2	SO 201 - Most ev. č. 239-007/ sanace základové spáry	0,00	192 254,00	192 254,00			0,00			0,00	0,00	192 254,00	3,94%	192 254,00	192 254,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	2
Název a evidenční číslo stavby:	II/239 Šlapanice, most ev.č. 239-007 pro odtok přívalové vody
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Most ev. č. 239-007
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	SO.201/2

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
07 Změnový soupis prací SO 201 po změně 2	2	
08 Zápisy ve stavebním deníku 18.a 19.9.2022	2	
09 Fotodokumentace	1	
10 Oznámení zhotovitele o změně	3	
11 Pokyn objednatele ke zpracování ZBV	2	
12 Vyjádření AD k ZBV 2	1	
13 Vyjádření TDS k ZBV 2	1	
14 Geodetický protokol - objem prací	3	
15 Zápis z KD2	4	
Počet listů celkem	19	

Změnový soupis prací SO 201 po změně													
Evidenční číslo a název stavby: II/239 Šlapanice, most ev.č. 239-007 pro odtok přívalové vody Číslo a název SO/PS: SO 201 - Most ev. č. 239-007 Číslo a název rozpočtu: SO 201 - Most ev. č. 239-007								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								SO 201/2					
								celkem					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0 Všeobecné konstrukce a práce													
1	014112	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	T	510,300	684,900	174,600	300,00	153 090,00	0,00	52 380,00	205 470,00	52 380,00	34,22%
		ZBV2 - Sanace základové spáry. Pol 13173*1,8 t/m3, doklad 14											
2	014112	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	T	9,738	9,738	0,000	300,00	2 921,40	0,00	0,00	2 921,40	0,00	0,00%
3	014132	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	T	0,403	0,403	0,000	20 000,00	8 060,00	0,00	0,00	8 060,00	0,00	0,00%
1 Zemní práce													
4	11525	PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 600 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,0M	M	7,000	7,000	0,000	2 700,00	18 900,00	0,00	0,00	18 900,00	0,00	0,00%
5	13173	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	283,500	380,500	97,000	322,00	91 287,00	0,00	31 234,00	122 521,00	31 234,00	34,22%
		ZBV2 - Sanace základové spáry, viz geodetický protokol - doklad č.14											
6	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	56,000	56,000	0,000	930,00	52 080,00	0,00	0,00	52 080,00	0,00	0,00%
7	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	176,000	176,000	0,000	930,00	163 680,00	0,00	0,00	163 680,00	0,00	0,00%
8	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	49,500	49,500	0,000	960,00	47 520,00	0,00	0,00	47 520,00	0,00	0,00%
9	17750	ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH	M3	31,200	31,200	0,000	497,00	15 506,40	0,00	0,00	15 506,40	0,00	0,00%
2 Základy													
10	21205	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 300MM	M	6,000	6,000	0,000	752,00	4 512,00	0,00	0,00	4 512,00	0,00	0,00%
11	21331	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO)	M3	14,400	14,400	0,000	3 800,00	54 720,00	0,00	0,00	54 720,00	0,00	0,00%
12	21341	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY)	M3	0,023	0,023	0,000	181 900,00	4 183,70	0,00	0,00	4 183,70	0,00	0,00%
13	261414	VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ. IV NA POVRCHU D DO 35MM	M	2,400	2,400	0,000	1 450,00	3 480,00	0,00	0,00	3 480,00	0,00	0,00%
14	27152	POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	63,648	160,648	97,000	1 120,00	71 285,76	0,00	108 640,00	179 925,76	108 640,00	152,40%
		ZBV2 - Sanace základové spáry. Objem dle položky 13173, doklad 14											
15	272314	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30)	M3	7,600	7,600	0,000	4 420,00	33 592,00	0,00	0,00	33 592,00	0,00	0,00%
16	272325	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	23,740	23,740	0,000	6 520,00	154 784,80	0,00	0,00	154 784,80	0,00	0,00%
17	272365	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B	T	3,561	3,561	0,000	44 000,00	156 684,00	0,00	0,00	156 684,00	0,00	0,00%
18	28999	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE	M2	49,600	49,600	0,000	150,00	7 440,00	0,00	0,00	7 440,00	0,00	0,00%
3 Svislé konstrukce													
19	31717	KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY	KG	96,000	96,000	0,000	159,00	15 264,00	0,00	0,00	15 264,00	0,00	0,00%
20	317325	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	6,269	6,269	0,000	13 500,00	84 631,50	0,00	0,00	84 631,50	0,00	0,00%
21	317365	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B	T	1,097	1,097	0,000	44 000,00	48 268,00	0,00	0,00	48 268,00	0,00	0,00%
22	333325	MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37)	M3	19,278	19,278	0,000	9 180,00	176 972,04	0,00	0,00	176 972,04	0,00	0,00%
23	333365	VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B	T	3,374	3,374	0,000	44 000,00	148 456,00	0,00	0,00	148 456,00	0,00	0,00%
4 Vodorovné konstrukce													
24	421325	MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37	M3	9,520	9,520	0,000	12 200,00	116 144,00	0,00	0,00	116 144,00	0,00	0,00%
25	421365	VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B	T	1,666	1,666	0,000	44 000,00	73 304,00	0,00	0,00	73 304,00	0,00	0,00%
26	43111	SCHODIŠTĚ KONSTR. Z DÍLCŮ BETON	M3	0,743	0,743	0,000	13 300,00	9 881,90	0,00	0,00	9 881,90	0,00	0,00%
27	451312	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	8,040	8,040	0,000	3 810,00	30 632,40	0,00	0,00	30 632,40	0,00	0,00%
28	451312	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	3,600	3,600	0,000	3 810,00	13 716,00	0,00	0,00	13 716,00	0,00	0,00%
29	451314	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	20,406	20,406	0,000	4 930,00	100 601,58	0,00	0,00	100 601,58	0,00	0,00%
30	45157	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	14,880	14,880	0,000	956,00	14 225,28	0,00	0,00	14 225,28	0,00	0,00%
31	45157	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	5,856	5,856	0,000	956,00	5 598,34	0,00	0,00	5 598,34	0,00	0,00%
32	45852	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	42,000	42,000	0,000	1 060,00	44 520,00	0,00	0,00	44 520,00	0,00	0,00%
33	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	16,892	16,892	0,000	6 080,00	102 703,36	0,00	0,00	102 703,36	0,00	0,00%
5 Komunikace													
34	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	49,200	49,200	0,000	30,00	1 476,00	0,00	0,00	1 476,00	0,00	0,00%
35	574A04	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S	M3	1,968	1,968	0,000	7 510,00	14 779,68	0,00	0,00	14 779,68	0,00	0,00%
36	574C06	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S	M3	1,230	1,230	0,000	7 910,00	9 729,30	0,00	0,00	9 729,30	0,00	0,00%
7 Přidružená stavební výroba													
37	711412	IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	55,100	55,100	0,000	579,00	31 902,90	0,00	0,00	31 902,90	0,00	0,00%
38	711502	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	5,740	5,740	0,000	610,00	3 501,40	0,00	0,00	3 501,40	0,00	0,00%

Změnový soupis prací SO 201 po změně													
Evidenční číslo a název stavby: II/239 Šlapanice, most ev.č. 239-007 pro odtok přívalové vody Číslo a název SO/PS: SO 201 - Most ev. č. 239-007 Číslo a název rozpočtu: SO 201 - Most ev. č. 239-007								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								SO 201/2					
								celkem					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
39	711509	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILÍ	M2	153,780	153,780	0,000	218,00	33 524,04	0,00	0,00	33 524,04	0,00	0,00%
40	78382	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B)	M2	8,576	8,576	0,000	396,00	3 396,10	0,00	0,00	3 396,10	0,00	0,00%
41	78383	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C)	M2	5,415	5,415	0,000	459,00	2 485,49	0,00	0,00	2 485,49	0,00	0,00%
8 Potrubí													
42	87533	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM	M	12,600	12,600	0,000	465,00	5 859,00	0,00	0,00	5 859,00	0,00	0,00%
43	87634	CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 200MM	M	0,600	0,600	0,000	856,00	513,60	0,00	0,00	513,60	0,00	0,00%
9 Ostatní konstrukce a práce													
44	9113B1	SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ	M	31,500	117,500	86,000	2 520,00	79 380,00	0,00	216 720,00	296 100,00	216 720,00	273,02%
		ZBV 1: Navýšení dáno ve výkresu"SO201_06_zadrzny_system", doklad 9 - délka svodidel 117,5M											
45	9117C1	SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	18,000	18,000	0,000	9 620,00	173 160,00	0,00	0,00	173 160,00	0,00	0,00%
46	91355	EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU	KUS	2,000	2,000	0,000	1 970,00	3 940,00	0,00	0,00	3 940,00	0,00	0,00%
47	914113	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ	KUS	4,000	4,000	0,000	230,00	920,00	0,00	0,00	920,00	0,00	0,00%
48	917223	SILNÍČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM	M	23,360	23,360	0,000	557,00	13 011,52	0,00	0,00	13 011,52	0,00	0,00%
49	917224	SILNÍČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	8,000	8,000	0,000	627,00	5 016,00	0,00	0,00	5 016,00	0,00	0,00%
50	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	12,000	12,000	0,000	110,00	1 320,00	0,00	0,00	1 320,00	0,00	0,00%
51	93132	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK	M3	0,038	0,038	0,000	310 000,00	11 780,00	0,00	0,00	11 780,00	0,00	0,00%
52	935212	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	M	6,000	6,000	0,000	954,00	5 724,00	0,00	0,00	5 724,00	0,00	0,00%
53	96611	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	M3	0,895	0,895	0,000	4 440,00	3 973,80	0,00	0,00	3 973,80	0,00	0,00%
54	96613R	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC	M3	61,920	61,920	0,000	2 850,00	176 472,00	0,00	0,00	176 472,00	0,00	0,00%
55	96616	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU	M3	3,000	3,000	0,000	6 010,00	18 030,00	0,00	0,00	18 030,00	0,00	0,00%
56	96718	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH	T	0,086	0,086	0,000	4 730,00	406,78	0,00	0,00	406,78	0,00	0,00%
57	97817R	ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE	M2	33,600	33,600	0,000	208,00	6 988,80	0,00	0,00	6 988,80	0,00	0,00%
								2 635 935,87	0,00	408 974,00	3 044 909,87	408 974,00	15,52%

22.6.2023

Zápis geologa:

Dnes provedena prohlídka stavební jámy pro založení patky opěr. K datu prohlídky probíhá těžba do úrovně ~~základové spáry~~ ^{základové spáry} ~~základové spáry~~ ^{základové spáry}. Základová spára tvoří jílu se střední plasticitou, kašovité konzistence FG CI ve smyslu ČSN 73 6133.

V úrovni základové báze štěrkuho polštáře jsou zřetelné přítoky podzemní vody, které nevytvářejí souvislou hladinu.

Ve výše uvedených zemnicích při zjištění konzistence není technicky možné provedení štěrkuho polštáře tak, jak je uvádí projektová dokumentace. Aby bylo možné štěrkuho polštář provést dle návrhu, bude nutné upravit bázi sanace (technický spáru) tak, aby umožnila pohyb techniky. Zvažet lze přetěžení báze cca o 0,5 m a zatlačení lomového kamene frakce 0/125 do takto přetěžení báze.

Po zatlačení LK do jílu je nutné položení separační geotextie do úrovně, která bude totožná s projektem uvažovanou základovou spárou. Dále je možné pokračovat ve shodě s PD. Upozornění na riziko

"drežování" vody do vrstvy štěrku polštáře což je za určitých okolností pro řešení třídy FG problematické a to zejména z důvodu zrnitostní konzistence a pokles uvnitřní na minimum.

Shoda s projektovou dokumentací byla ověřována dle vln V1 uvedeném v dispozici výkresu B.2. Konzistence není v uvedeném dokumentu specifikována.

Bude-li přes rizika spojená s provedením štěrku polštáře v jílovitých zemínkách nadále preferováno toto řešení je teoreticky možné pro zvýšení uvnitřní na základové spáře umístit vhodnou geometrii.

Uvedený návrh je třeba vždy předložit autorskému dozoru stavby, kterému jsou známy všechny konsekvence návrhu.

Za LG conseil pro
Hr. Michael Werkmann

Zápis Zhotovitele: ^{V V V} Po geologickém průzkumu 22.6.2023.
stavby jámy a rozhodnutí projektanta bude
báze štěrku polštáře přetěžena o 0,10m
a dojde k zatlačení lom. kamene 0/125 do této
přetěžovací báze. Po zatlačení k dojezdu bude
náskladně položena sepná geotextilie a dále budou
místodout vrstvy S1 dle DDr.

Zápis TD1: 22.6.23
Provedena kontrola stavu stavební jámy, popsaný
stav odpovídá. Během na místě náhodně zhotovitel
a projektanta.





Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem:
Zborovská 11, 150 21 Praha 5
IČ: 00066001

SWIETELSKY stavební s.r.o.
o. z. Dopravní stavby STŘED
Sokolovská 192/79
180 00 Praha 8
T: +420 296 177 825
E: ds.stred@swietelsky.cz
www.swietelsky.cz

K rukám: ing. **Michal Šťastný**

Váš dopis zn. / ze dne:	Naše značka	Vyřizuje:	M:	Datum:
	Šla/ML/Změna2	Ing. Milan Listopad	724 548 373	07.07.2023

Oznámení nároku zhotovitele

Vážený pane,

Chtěl bych touto cestou oznámit zjištěné odchylky od zadávací dokumentace, které byly zastíženy při provádění díla „**II/239 Šlapanice, most ev.č. 239-007 pro odtok přívalové vody**“.

Po provedené demolici stávajícího objektu a následných zemních pracích bylo přivolaným geotechnikem konstatováno, že základová spára nesplňuje předpoklad/ požadavky projektové dokumentace a je nutné provést sanaci.

Zjištěná odchylka může mít dopad do délky realizace/ dokončení díla v délce 3 dny.

Odhadovaný finanční dopad prací 50 tis Kč.

Skutečný rozsah bude dodán geodetickým zaměřením.

Předem děkuji za potvrzení pokynu pro zpracování ZBV a tím i přesné vyčíslení pro dodatek smlouvy o dílo.

S pozdravem

Ing. Milan Listopad
Ředitel oblasti
SWIETELSKY stavební s.r.o.

Příloha: Zápis ve SD ze dne 22.6.2023

Kopie:

Převzal:

zápis geologa:

Dnes provedena prohlídka stavební jámy pro založení patky opěr. K dalším prohlídkám prohlídka základů do úrovně základové spáry. Základová spára tvoří jílu se střední plasticitou, kašovité konzistence FG CI ve smyslu ČSN 73 6133.

V úrovni základové báze šterkového polštáře jsou zřetelné přítoky podzemní vody, které nerytmicky souvislou hladinou.

Ve výše uvedených zeminech při zjištěné konzistenci není technicky možné provedení šterkového polštáře tak, jak jej uvádí projektová dokumentace. Aby bylo možné šterkový polštář provést dle návrhu, bude nutné upravit bázi sanace (technický spár) tak, aby umožnil pohyb techniky. Zvažet lze přetěžení báze cca o 0,5 m a zatlačení lomového kamene frakce 0/125 do takto přetěžení báze.

Po zatlačení LK do jílu je nutné položení separační geotexty do úrovně, která bude totožná s prahem, kterým uvažovanou základovou spárou. Dále je možné pokračovat ve shodě s PD. Upozornění na riziko

"drainováním" vody do vrstvy štěrkuového polštáře což je za určitých okolností pro kemny třídy FG problematické a to zejména z důvodu změny konzistence a pokles únosnosti na minimum.

Shodě s projektovou dokumentací byla určována dle vstupu S1 uvedenému v dispozičním výkresu B.2. Konzistence není v uvedeném dokumentu specifikována.

Bude-li přes rizika spojená s provedením štěrkuového polštáře v jílovitých zemínkách nadále přetrvává toto řešení je teoreticky možné pro zvýšení únosnosti na základové spáře umístit vhodnou geometrii.

Uvedený návrh je třeba vždy předložit autorštině dozoru stavby, kterému jsou známy veškeré konsekvence návrhu.

Za LG konsilke pro
Hr. Michel Werkmann

Zápis zhotovitele: Po geologickém průzkumu stavební jámy a rozhodnutí projektanta bude báze štěrkuového polštáře přetěžena o 0,10m a dojde k zatlačení lom. kamem 0/25 do této přetěženi báze. Po zatlačení k dojetu bude následně položena sepná geotextilie a dále budou instalovány vrstvy S1 dle PDI.

22.6.2023.

Zápis PDI:

Provedena kontrola státní stavební jámy, popsaný stav odpovídá. Beru na vědomí návrh zhotovitele a projektanta.

22.6.23

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11**

SWIETELSKÝ stavební s.r.o.
Ing. Milan Listopad
Sokolovská 192/79
186 00 Praha 8

Tel. 724 548 373

v Kladně 5.9.2023

Akce: II/239 Šlapanice, most ev.č. 239-007 pro odtok přívalové vody

S odvoláním na článek 6 Práva a povinnosti objednatele Smlouvy o dílo S-1447/00066001/2023, odst 6.8:

Objednatel může požadovat změnu rozsahu Díla či schválit změnu rozsahu Díla navrženou Zhotovitelem, a to při respektování povinností objednatele dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a interních předpisů Objednatele, zejména pak Směrnice ředitele Objednatele ke změnám staveb (dále jen „Směrnice“), která tvoří přílohu této smlouvy. Zhotovitel bere obsah Směrnice na vědomí a zavazuje se, že při administraci změn nebude postupovat v rozporu se směrnicí a že nebude na Objednateli uplatňovat nároky ze změn před schválením těchto změn postupem, který Směrnice stanoví. Zhotovitel je v případě takového rozhodnutí Objednatele o změně rozsahu Díla povinen Objednateli vyhovět a (i) snížit rozsah Díla nebo (ii) bez zbytečného odkladu podat nabídku na zvýšení rozsahu Díla o plnění stejného charakteru jako Dílo sjednané ve smlouvě s tím, že:

- a) při snížení rozsahu se Cena Díla odpovídajícím způsobem sníží,
- b) při zvýšení rozsahu bude Cena Díla v nabídce Zhotovitele stanovena na základě cen uvedených v nabídce v Oceněném soupisu prací. V případě, že není možné Cenu Díla stanovit tímto způsobem, bude Cena Díla stanovena na základě expertních cen uvedených v Oborovém třídílníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací (OTSKP-SPK) platných pro dané období nebo v cenách nižších. V případě, že není možné Cenu Díla stanovit ani tímto způsobem, bude Cena Díla stanovena ve výši ceny obvyklé v místě a čase, zjištěné na podkladě průzkumu trhu provedeného Zhotovitelem formou získání alespoň tří nezávislých nabídek jiných zhotovitelů. Doklady o provedeném průzkumu trhu a jeho výsledcích je Zhotovitel povinen předat Objednateli
- c) změny budou administrovány postupem stanoveným ve Směrnici, přičemž snížení či zvýšení rozsahu bude upraveno písemným dodatkem smlouvy, kterým může být změnový list změny stavby podepsaný ze strany osob oprávněných jednat za Objednatele a Zhotovitele
- d) případná změna termínu plnění bude vždy sjednána formou písemného dodatku k této smlouvě (tj. nikoli formou Změnového listu) a to i v případě, pokud by souvisela se změnami sjednanými Změnovým listem. Změna termínu plnění je možná pouze v případě, že taková změna nemá charakter podstatné změny závazku ve smyslu §222 Zákona o ZVZ.
- e) Zhotovitel se zavazuje vyhotovovat Změnové listy a jejich přílohy a předkládat je Objednateli výlučně ve formátu, který stanoví Směrnice.

***Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11***

Žádáme o změnu rozsahu díla v souladu s návrhem (ZBV2):

1. Při kontrole základové spáry uzavřeného rámu mostu byla geotechnikem vyhodnocena nedostatečná kvalita a únosnost materiálu podloží. Tato skutečnost neodpovídá předpokladu ve schválené projektové dokumentaci. Proto byla geotechnikem navržena sanace podloží v celé ploše základové desky.

Ing. Michal Šťastný
Mostní technik KSÚS SK_Kladno

Adresát:**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje**

Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5-Smíchov

Ing. Michal Štátný

mostní technik - oblast Kladno

IČ: 00066001

DIČ: CZ00066001

Odesílatel:**M - PROJEKCE s.r.o.**

Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové

Ateliér Liberec

Lípová 665/1, 460 01 Liberec IV-Perštýn

IČ: 05061415

DIČ: CZ05061415

Vyřizuje:**Ing. Jiří Ehrenberger****Mobil:****+420 724 973 655****E-mail:****jiri.ehrenberger@m-projekce.cz****Naše zn.:****AD-01****Č. zakázky:****16-106-02****Datum:****14.09.2023****Akce: III/239 Šlapanice, most ev.č. 239-007 pro odtok přívalové vody****Věc: SO 201 – Most ev.č. 239-007****Změna během výstavby (ZBV) č. 2 – Sanace podloží**

Na základě žádosti zhotovitele Vám dále zasíláme vyjádření autorského dozoru (AD) ke změně během výstavby (ZBV) č. 2 zahrnující sanaci podloží v rámci realizace stavby „III/239 Šlapanice, most ev.č. 239-007 pro odtok přívalové vody“.

ZBV č. 2 – Sanace podloží

Po dokončení demolice stávajícího mostu a následném otevření stavební jámy bylo zjištěno, že základová spára nesplňuje předpoklady, respektive požadavky dané dokumentací PDPS a dokumentací RDS. V základové spáře byly zastíženy jíly se střední plasticitou třídy F6 CI kašovité konzistence. Z tohoto důvodu geolog stavby navrhl provést pod polštářem ze ŠD sanaci základové spáry z lomového kamene otevřené frakce 63-125. Dále je doporučeno vrstvu sanace oddělit od polštáře separační geotextílií.

Autorský dozor (AD) souhlasí s navrženou sanací základové spáry. Bez jejího provedení prakticky není možné realizovat roznášecí polštář ze ŠD dle dokumentace PDPS.

Ing. Jiří Ehrenberger

M - PROJEKCE s.r.o.

M - PROJEKCE s.r.o.

Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové

pracoviště**Pardubice** - Husova 1697, 530 03 Pardubice**Praha** - Freyova 82/27, 190 00 Praha 9**Liberec** - Lípová 665/1, 460 01 Liberec IV-Perštýn

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v oddílu C, vložka č. 37094

IČ: 050 61 415, **DIČ:** CZ05061415**bankovní spojení:** ČSOB, a.s. pobočka Hradec Králové**číslo účtu:** 274779891/0300**telefon:** + 420 495 842 111**e-mail:** m-projekce@m-projekce.cz**web:** www.m-projekce.cz

Vaše spis. zn. Vaše č.j. Naše spis. zn. Naše č.j. 7-0514-00/JoEr/2023/002 Vyřizuje: Ing. Josef Erben Tel.: +420 724 192 002 E-mail: josef.erben@pudis.cz Datum: 11.9.2023	Adresa: Krajská správa a údržba silnic Ing. Michal Šťastný
---	---

**Věc: II/239 Šlapanice, most ev.č. 239-007 pro odtok přívalové vody
SO 201
Vyjádření k ZBV 2 – sanace základové spáry**

Po odkrytí základové spáry dle PD, byla ta posouzena geotechnikem zhotovitele. Ten doporučil její sanaci viz zápis. Zhotovitel si doporučený postup sanace odsouhlasil s projektantem.

Já jsem provedl kontrolu zjištěných skutečností a souhlasil s navrženým řešením.

Předložená část dokumentace je pro princip žádosti dostačující.

Pro vlastní realizaci - potvrzení provedení prací dle ZBV předpokládám doložení rozsahu změny geodetickým protokolem.

Vyjádření TDS:

1. K předložené dokumentaci ZBV 2 nemám připomínky - souhlasím

Ing. Josef Erben
II/239 Šlapanice, most 239-007
TDI

DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY

Akce: II/239 Šlapanice, most ev.č. 239-007 pro odtok přívalové vody
měření kubatury přetěžené báze štěrkového polštáře


K.ú.: Šlapanice u Velvar

Investor: KSÚS Středočeského kraje

Měřítko: 1 : 500

Souřadnicový/ výškový systém: S-JTSK/ Bpv

Zaměřil:/Vyhotovil: Ing.Martin Kolář 23.6.2023/8.9.2023

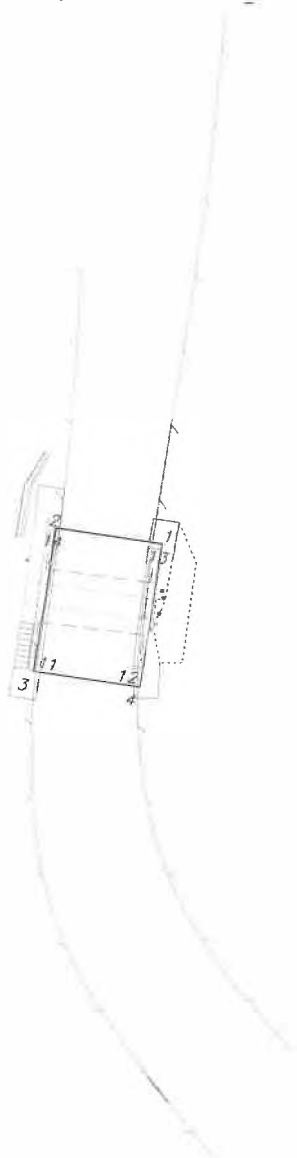

43/2023
12.9.2023

Ing. Martin Kolář
geodetické služby
150 00 Praha 5, Maršálkova 18
IČO: 27336013

***** WOBJEM - výpočet objemu prostorového útvaru *****
01-09-2023 12:27

Akce: II/239 Šlapanice, most ev.č. 239-007 pro odtok vody
měření kubatury přetěžené báze štěrkového polštáře
Zaměřil:/Vyhotočil: Ing.Martin Kolář 23.6.2023/8.9.2023

Hraniční body :
2 >> 3 >> 4 >> 1 >> 2

Hlavní model : "C:\GE...SLAPANICE\SANACE\SAN"
Srovnávací model : "C:\GE...LAPANICE\SANACE\SANO"

VÝSLEDNÝ OBJEM :

V[+] =	0.00
V[-] =	-97.04
V[+] + V[-] =	-97.04
abs(V[+]) + abs(V[-]) =	97.04 m3

CELKOVÁ PLOCHA :

A[+] =	0.00
A[-] =	67.88
A[0] =	0.00
	67.88

POVRCH MODELU :

Hlavní m. S[celk] =	114.16
Srovnávací m. S[celk] =	67.89

Ing. Martin Kolář
geodetické služby
150 00 Praha 5, Mlýnská 18
IČO: 67366013

DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY

Akce: II/239 Šlapanice, most ev.č. 239-007 pro odtok vody
měření kubatury přetěžené báze štěrkového polštáře

K.ú: Šlapanice u Velvar

Investor: KSÚS Středočeského kraje

Souřadnicový systém: S-JTSK

Výškový systém: Bpv

Zaměřil:/Vyhotovil: Ing.Martin Kolář 23.6.2023/8.9.2023

SEZNAM SOUŘADNIC (S-JTSK,Bpv)

CB	Y	X	Z	poznámka
1	761250.33	1015119.97	213.03	sanace
2	761257.31	1015118.91	213.01	sanace
3	761258.77	1015128.40	213.04	sanace
4	761251.76	1015129.44	213.00	sanace
11	761258.72	1015128.37	211.60	sanace
12	761251.77	1015129.42	211.64	sanace
13	761250.35	1015119.99	211.53	sanace
14	761257.29	1015118.97	211.61	sanace



43/2023
12.9.2023
Ing. Martin Kolář
geodetické služby
150 00 Praha 5, Matrušova 18
IČO: 67496919

Zápis z kontrolního dne KD č. 5 stavby

II/239 Šlapanice, most ev.č. 239-007 pro odtok přívalové vody

Kontrolní den			
Číslo	5	konaný dne	16.8.2023
Účastníci			
Seznam účastníků KD je uveden v příloze č.1 Prezenční listina			

Program kontrolního dne
0. Informace o předaných dokladech (TDI)
1. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby:
a) popis provedených prací
b) plnění věcného HMG
c) finanční plnění
2. Kontrola úkolů z minulého KD
3. Kontrola kvality - zpráva o hodnocení kvality za uplynulé období
4. Stav BOZP a PO
5. Nové úkoly
6. Různé
7. Závěr

0. Informace o předaných dokladech (<i>šedivě uvedeny předané k minulému KD, v dalším KD bude seznam dokladů vypuštěn</i>), černě nové doklady
a) Zhotovitelem byly předány tyto doklady
- RDS schválena – (v.č.6 zádržný systém; potvrzen PČR; žádost na ODSH Slaný předána.)
- Práce probíhají na základě schválené stavební části
- Zhotovitel předložil ke schválení TePř 201-05 pro provádění nestmelených kcí a AHV a Tepř 201-06 na terénní a dokončovací práce - schváleno
- Týdenní plán prací na 33 a 34zah týden
b) Objednatel byl doplněn podklady (nad rátimec zadávací dokumentace a SoD)
- 0

1. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby	
a) popis provedených prací	- Provedené práce : - Izolace NK - Zásyp přech oblasti - Montáž bednění a výztuže říms - Demont bednění NK - Betonáž říms - Zahájeny dokončovací práce a dlažby -
b) plnění časového HMG	Časový HMG: - zahájení prací dle aktualizovaného HMG - zhotovitel potvrzuje dokončení v původním termínu dle SoD
c) finanční plnění	Soupisy prací jsou zasílány na konci každého měsíce Zhotovitelem zpracovány v soft. ASPE v dostatečném předstihu ke kontrole a odsouhlasení TDI v elektronické podobě. Po odsouhlasení TDI (el podp) je fakturace předána zhotovitelem přímo objednateli. Průběh finančního plnění je v souladu s předloženým finančním HMG, resp s jeho aktualizovanou verzí.

KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC	ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE KD č. 5 STAVBY	
EVIDENČNÍ ČÍSLO KD 5/2023	II/239 ŠLAPANICE, MOST EV.Č. 239-007 PRO ODTOK PŘÍVALOVÉ VODY	FORMULÁŘ KD/OP
	KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE	STRANA: 1/3

2. Kontrola úkolů z minulých KD				
Úkol číslo	Název	Skutečný stav plnění úkolu	Zodpovídá	Stav úkolu (termín)
2/1	RDS	- Práce (stavební část – schválená) probíhají na základě RDS 2.8. doplněno – zhotovitel dopracuje žádost o potvrzení změny v.č 6., o vyjádření PČR ke změně, předá ji objednateli – 16.8.doplněno – v.č. zádržný systém schváleno PČR, zhotovitel zašle žádost na ODSH Slaný k dokončení procesu.	zhotovitel	Do příštího KD <i>Nejpozději k zahájení prací na zádrž syst</i>

3. Kontrola kvality – zpráva o hodnocení kvality za uplynulé období

Provedeny kontrolní zk při betonáži říms dle KZP

V uplynulém období byly dále provedeny kontrolní zkoušky na zásypech přech oblastí a nestmelených vrstvách dle KZP viz laboratorní deník.

4. Stav BOZP a PO

Všichni pracovníci zhotovitele (ev. Noví podzhotovitelé) seznámí všechny své zaměstnance s Plánem BOZP a s požadavky na dodržování zásad bezpečnosti práce.

Zaměstnanci písemně potvrdí, že byli s Plánem BOZP seznámeni.

Zjištěné drobné závady jsou na stavbě průběžně odstraňovány. Veden EID

5. Nové úkoly				
Úkol číslo	Název	Skutečný stav plnění úkolu	Zodpovídá	Stav úkolu
3/1	Upřesnění detailů na vtoku a výtoku	Zhotovitel provede vytyčení prostoru na vtoku a výtoku a hranic přilehlých pozemků pro orientaci v prostoru a svolá místní šetření. 2.8. dopsáno : zhotovitel provedl vytyčení hranic dle dohody. Dále doložil orientační zákres projektované zádlažby do katastrální mapy; z doloženého vyplývá, že stavba zasahuje do obecních pozemků. Objednatel ve provede projednání této záležitosti s obcí. Zjištěné skutečnosti pro postup prací nečiní překážku.	Zhotovitel	Do KD 4 Zhotovitel splnil zadání bude vypuštěno
5/1	ZBV	Konstatovány skutečnosti : - změna rozsahu zádržného systému (změna legislativy) - geotechnikem navržena sanace základové spáry mostu. Zhotovitel vypracuje patřičné dokumenty dle SoD	Zhotovitel	Do KD 6
5/2	Dokončení prací	1) zhotovitel písemně sdělí přesný termín dokončení prací a termín závěrečných prohlídek (minimálně 30 dní předem) 2) k tomuto termínu bude mít připraveny všechny doklady dle SoD	Zhotovitel	Nejpozději do KD 6

6. Různé

KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC	ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE KD Č. 5 STAVBY		
EVIDENČNÍ ČÍSLO KD 5/2023	II/239 ŠLAPANICE, MOST EV.Č. 239-007 PRO ODTOK PŘÍVALOVÉ VODY	FORMULÁŘ KD	
	KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE	STRANA: 2/3	

7. Závěr

KD č. 6 bude 6.9.2023 na stavbě ve 8,00 hod, sraz u buněk SW

Rozdělovník

Vyhotoveno v jediném exempláři, který bude založen do spisu stavby, scan dokumentu je rozeslán elektronicky všem účastníkům .

Elektronicky odeslán koncept na adresy uvedené v Prezenční listině (PL).

PODPISOVÁ DOLOŽKA ÚČASTNÍKŮ JEDNÁNÍ

Účastníci jednání berou na vědomí, že:

- z jednání je vyhotoven koncept písemného zápisu, který bude zaslán všem účastníkům jednání, a to na jejich e-mailovou adresu uvedenou v prezenční listině.
- Účastník jednání je oprávněn do tří pracovních dnů do 14:00 hodin vznést vůči obsahu zápisu námitky s řádným zdůvodněním. Obsah zápisu lze napadnout v případě, že vyhotovený zápis obsahuje buď nepravdivé údaje, nebo některá závažná vyjádření neobsahuje vůbec či je v určitých částech nesrozumitelný a účastník požaduje doplnění / přepracování.
- Nevznese-li účastník jednání vůči obsahu konceptu zápisu žádné námitky v předepsané lhůtě, považuje se pak tento zápis za potvrzený účastníkem jednání a stává se čistopisem a není opětovně odeslán elektronicky.
- Účastník svým podpisem potvrzuje, že je oprávněn zastupovat a jednat v zájmu firmy, kterou na tomto jednání zastupuje a na základě toho činit návrhy, zaujímat stanoviska k jednotlivým bodům jednání, vznášet námitky a zavazovat svou firmu k úkolům z tohoto jednání pro ni vyplývající.

Zapsal Ing. Josef Erben – asistent specialista pro PK

KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC	ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE KD Č. 5 STAVBY	
EVIDENČNÍ ČÍSLO	II/239 ŠLAPANICE, MOST EV.Č. 239-007 PRO ODTOK PŘÍVALOVÉ VODY	FORMULÁŘ KD
KD 5/2023	KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE	STRANA: 3/3

[illegible]
