

Zjišťovací a předávací protokol

k provedeným pracím dle SoD :

číslo objednatele: 000023/61924008/2018

číslo dodavatele: SOD-23666-18-0688

název stavby:	Oprava dílen a odborných učeben
předmět díla:	Nové podlahy do dílen
místo plnění:	VOŠ, SPŠ a OA Čáslav
dne:	9. 7. 2018 - 23. 7. 2018
pozn.:	

VOŠ, SPŠ a OA
Přemysla Otakara II. 938
Čáslav
286 14
IČO: 61924008 DIČ: CZ61924008

Dnešního dne předal zhotovitel objednateli hotovou montáž na objektu VOŠ, SPŠ a OA Čáslav – Nové podlahy do dílen.

Objednatel byl vyzván, aby do doby vyvrání betonů je chránil před statickými a mechanickými účinky. Dále před pojezdem vozíků, účinky chemických látek, mrazem a průvanem.

Zrání betonu stanoveno na 28 dní od betonáže (tj. do 16. 8. 2018) – termín stěhování strojů dle SoD je 9. 8. 2018. - viz záruční podmínky.

Stěrky: Objednatel byl vyzván, aby do doby vyvrání stěrek je chránil před jakýmkoliv mechanickými účinky Do 16. 8. 2018 . Dále před chemickými účinky a mytí vodou do 1. 8. 2018 – viz záruční podmínky.

Práce jsou provedeny bez vad a nedodělků a takto je objednatel přebírá.

Rekapitulace výměr a cen dle SoD:


číslo objednatele: 000023/61924008/2018

číslo dodavatele: SOD-23666-18-0688




Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.J.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		
							Dotávka	Montáž	Celkem
			Odkopávky a prokopávky				0,00	17 168,50	17 168,50
1		122301101R00	Odkopávky nezapážené v hor. 4 do 100 m ³ - odstranění podkladu a násypu pod stávající podlahou na požadovanou úroveň -0,300	m ³	55,35	250,00	0,00	13 837,50	13 837,50
2		122301109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 4	m ³	55,35	60,00	0,00	3 321,00	3 321,00
			Přemístění výkopků				0,00	96 119,10	96 119,10
3		162201203R00	Vodorovné přemístění výkopku, kolečko hor. 1-4, do 10m	m ³	45,99	30,00	0,00	1 379,70	1 379,70
4		162201210R00	Příplatek za další 10 m, kolečko, výkop. z hor. 1- 4	m ³	91,98	80,00	0,00	7 358,40	7 358,40
5		162501102RT3	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 3000 m - odvoz na skládku	m ³	45,99	700,00	0,00	32 193,00	32 193,00
6		162702199R00	Poplatek za skládku zemliny	m ³	45,99	400,00	0,00	18 396,00	18 396,00
7		167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství do 100 m ³	m ³	91,98	400,00	0,00	36 792,00	36 792,00
			Konstrukce ze zemlin				0,00	14 040,00	14 040,00
8		174101101R00	D+M Zásyp jam, rýh, šachet se zhuštěním - zásyp montážní jámy před realizací nové podlahy	m ³	9,36	1 500,00	0,00	14 040,00	14 040,00
			Rovňovací úpravy terénu				39 993,67	36 881,33	76 875,00
9		181201102R00	Úprava pláně v hor. 1-4, se zhuštěním deskou - hutnění stávajícího podkladu pod novým násypem	m ²	307,50	100,00	0,00	30 750,00	30 750,00
10		18-VD-01	D+M provedení hutněné pláně na úrovni - 15 cm, přehutnění násypu 15 cm, vč. kalci vrstvy z kameniva 0-4 mm	m ²	307,50	150,00	39 993,67	6 131,33	46 125,00
			Úprava podlaží základové spáry				6 944,90	6 293,67	13 238,57
11		213151121R00	Montáž geotextilie pod hydroizolační vrstvou	m ²	322,88	20,00	163,93	6 293,67	6 457,50
12		69366197	Geotextilie 200 g/m ² š. 200cm 100% PP	m ²	339,02	20,00	6 780,38	0,00	6 780,38
			ZÁKLADY				27 354,61	52 675,74	309 930,26
13		273325321R00	D+M Plovoucí drábkobetonová deska tl. 150 mm - Beton C 20/25 s rozptýlenou výtluží 50 mm, 20 kg/m ³ , vč. D+M oddělování od okolních konstrukcí	m ³	50,74	4 840,00	227 994,25	17 575,25	245 569,50
14		273361921RT9	D+M Kari sít' v místnosti s montážní jámou (105) při spodním okraji 150/150/8 vč. plast distančníku	t	1,99	6 250,00	9 970,28	2 483,47	12 453,75
15		273361921RT9	D+M Kari sít' po obvodě místnosti š. 1bm při spodním lemu z důvodu základového pasu pod stěnou (103,104) 150/150/8 vč. plast distančníku	t	0,61	6 250,00	3 047,82	759,18	3 807,00
16		27-VD-01	D+M Dowzlužení polosoupu	ks	9,00	1 500,00	10 216,22	3 283,78	13 500,00
17		27-VD-02	D+M Dowzlužení rohů	ks	11,00	1 400,00	11 307,66	4 092,31	15 400,00
18		27-VD-03	D+M Dowzlužení sloupu + výklenku	m	16,00	1 200,00	14 818,26	4 381,74	19 200,00
			Izolace průmyslové				6 355,07	6 559,93	12 915,00
19		711171559RT2	D+M Izolace proti vlhkosti vodoravná, fólii, volně - PVC 0,8 mm	m ²	322,88	40,00	6 355,07	6 559,93	12 915,00
20		998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,46	8,00	0,00	3,72	3,72
			Konstrukce doplnkové stavební (zámečnické)				6 929,28	1 914,62	8 843,90
21		767591230R00	D+M Okování okraje podlahy - ocelový L profil 50/50/5 s bednicím plechem	m	13,00	690,00	6 929,28	1 910,72	8 840,00
22		998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	0,08	50,00	0,00	3,90	3,90
			Podlahy povlakové				0,00	11 625,00	11 625,00
23		778511610RT1	Odstranění PVC a kerobců lepených bez podložky	m ²	77,50	150,00	0,00	11 625,00	11 625,00
			Lité podlahy				330 991,82	85 101,80	416 093,63
24		777511112R00	D+M Samonivelační polymercementové podlahové stěrka systémová tl. 6-8 mm, vč. D+M kompletních dilatačních spar a oddělení od kci - specifikace níže	m ²	307,50	1 353,15	330 991,82	85 101,80	416 093,63
			Odbourání konstrukcí				0,00	99 937,50	99 937,50
25		965042241RT4	Bourání stávajících betonových podlah - pneumat. kladivo, tl. mazaniny 10 - 15 cm, vč. odbourání betonových soklů pod stroji	m ³	38,44	2 600,00	0,00	99 937,50	99 937,50
			Budovy občanské výstavby				0,00	5 813,27	5 813,27
26		998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	290,66	20,00	0,00	5 813,27	5 813,27
			Přesuny suť				0,00	677,05	677,05
27		979081111RT3	Odvoz suť a výbour. hmot na skládku do 1 km	t	84,64	1,00	0,00	84,64	84,64
28		979081121RT3	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	253,92	1,00	0,00	253,92	253,92
29		979082212R00	Vodorovná doprava suť a vybouraných hmot po suchu do 50 m - vnitrostaveništní doprava	t	84,64	1,00	0,00	84,64	84,64
30		979087212R00	Nakládání suť a vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	169,28	1,00	0,00	169,28	169,28
31		979990103R00	Poplatek za skládku suť - beton	t	84,56	1,00	0,00	84,56	84,56
32		979990181R00	Poplatek za skládku suť - PVC podlahová krytina	t	0,01	1,00	0,00	0,01	0,01
							Celkem:		1 083 269,79

Fakturace na kompletní provedení podlah bude vystavena do 3 dnů od předání a převzetí prací se splatností 30 dní.



 objednatel díla



 zhotovitel díla


V ČKSLAVI, dne 24.7.2018








Photo Booth

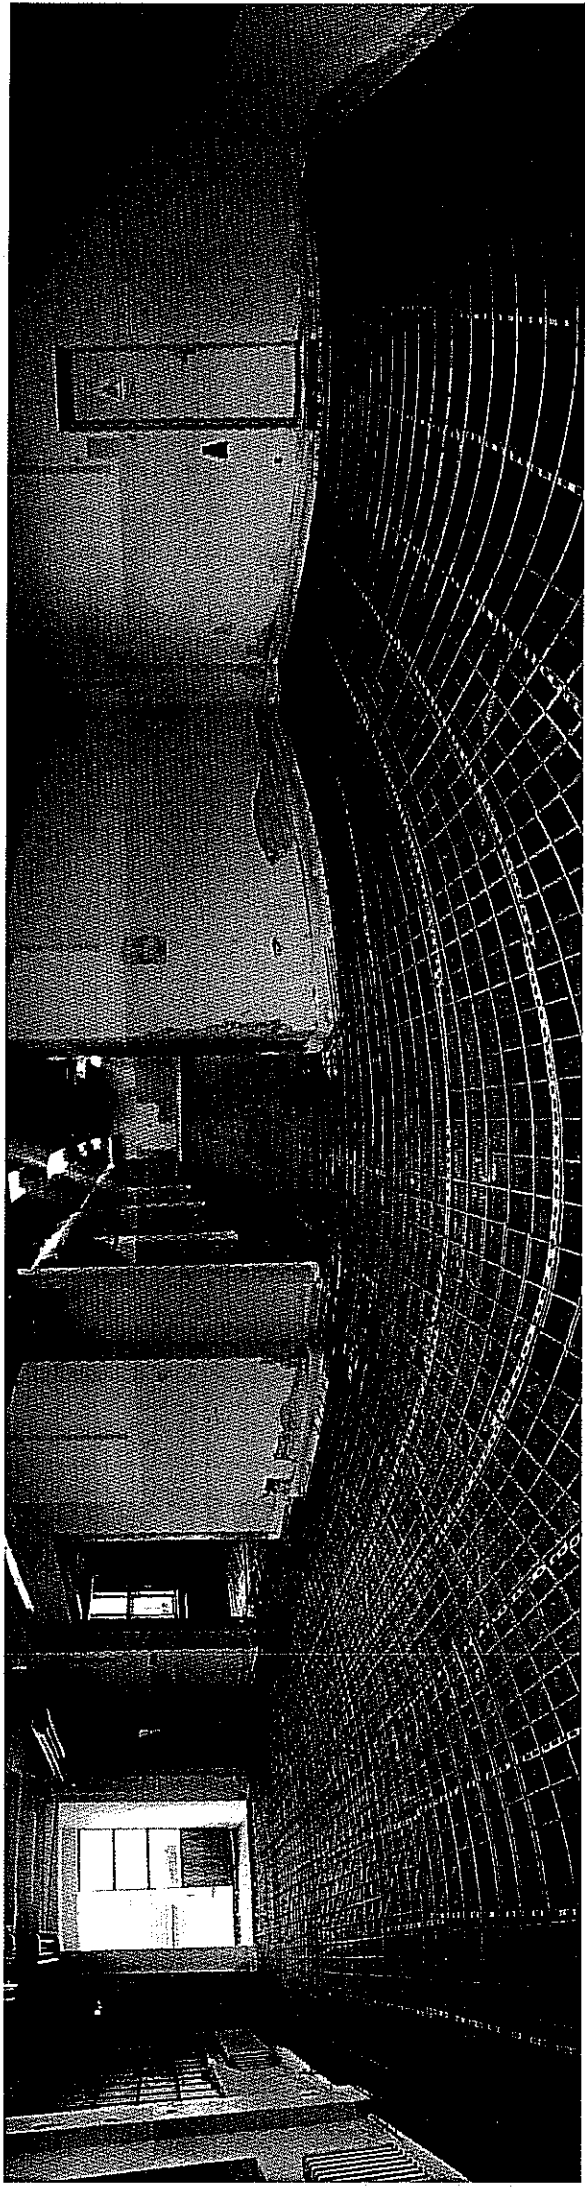


P. Jacobson


79 7 2004

Project

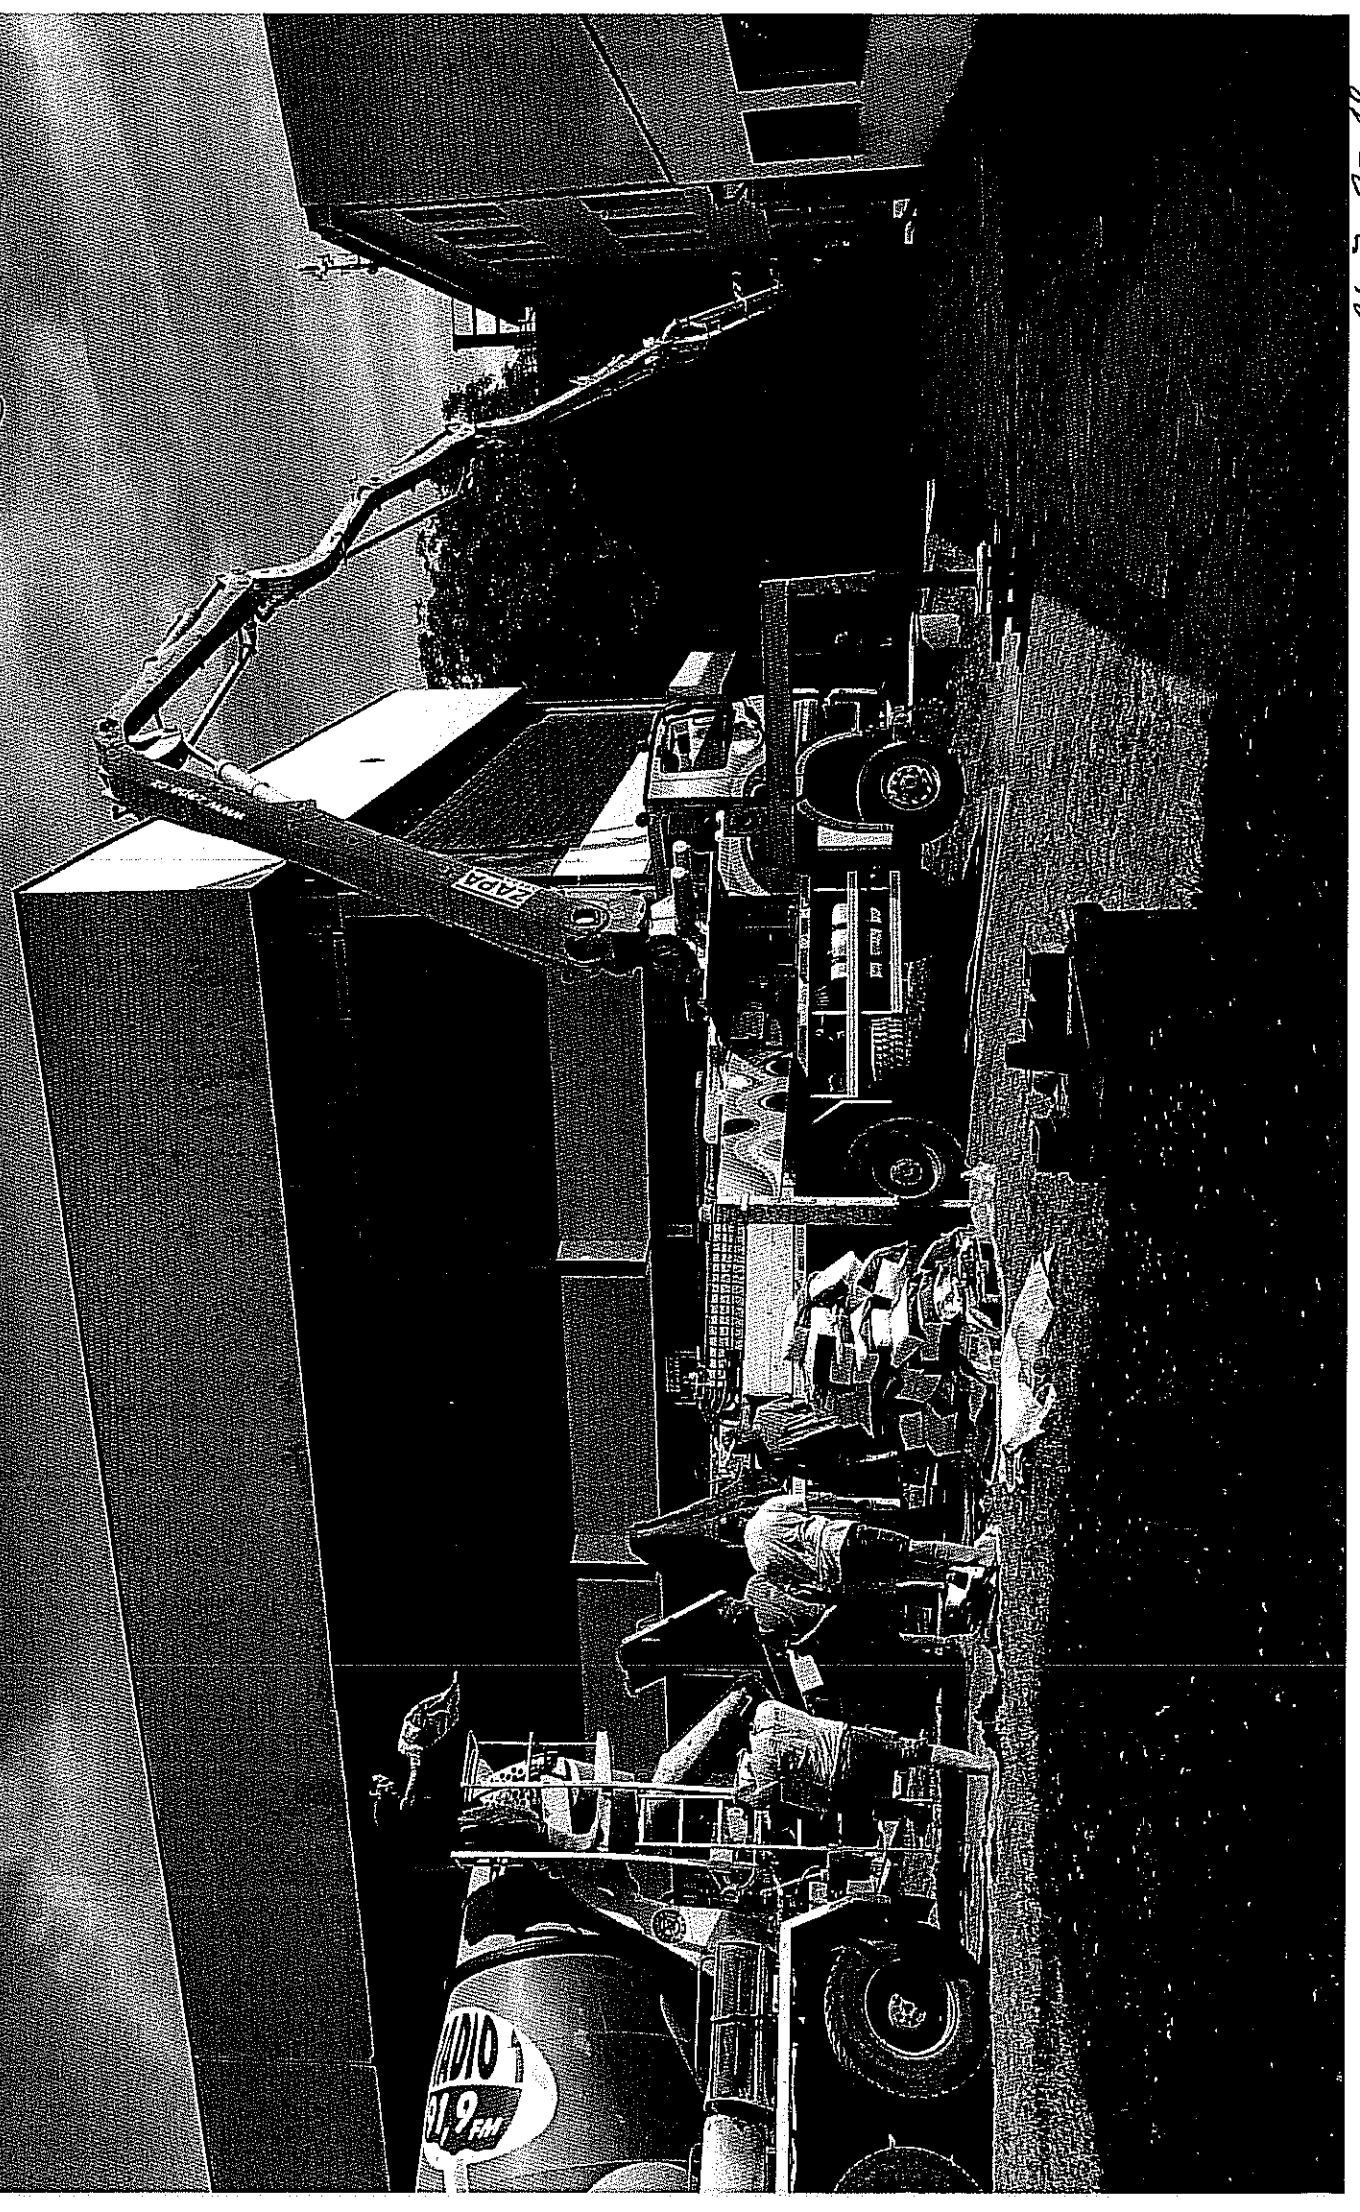

WIDIO
ST. 9 FM

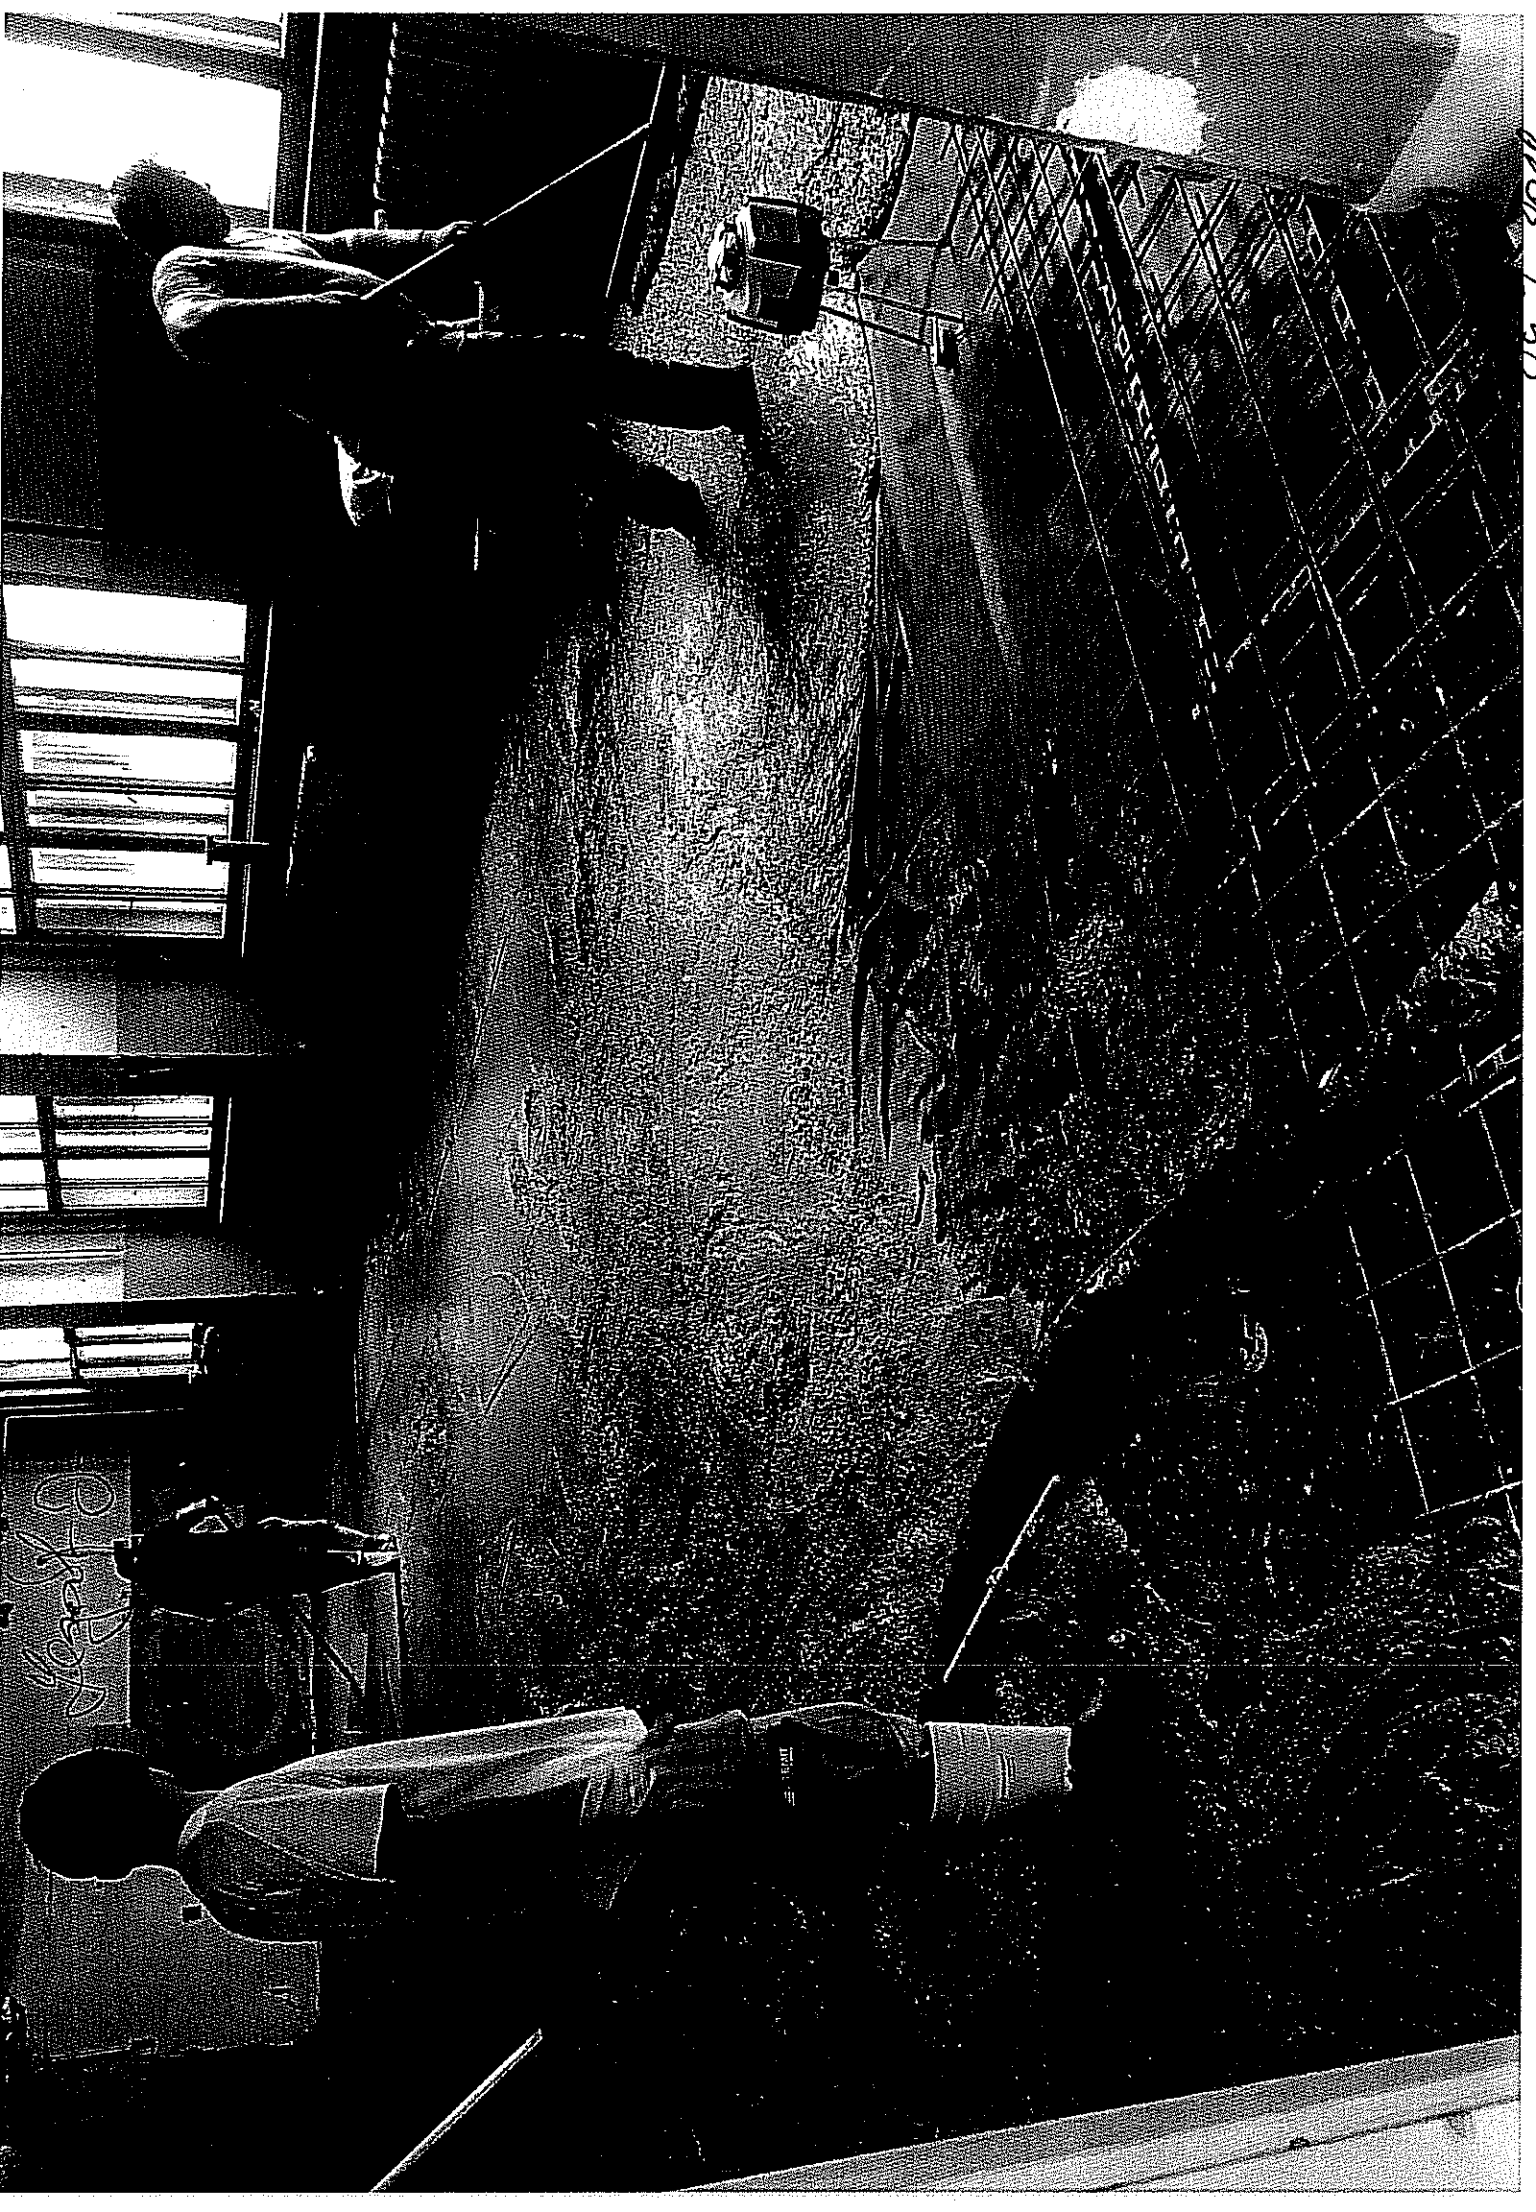

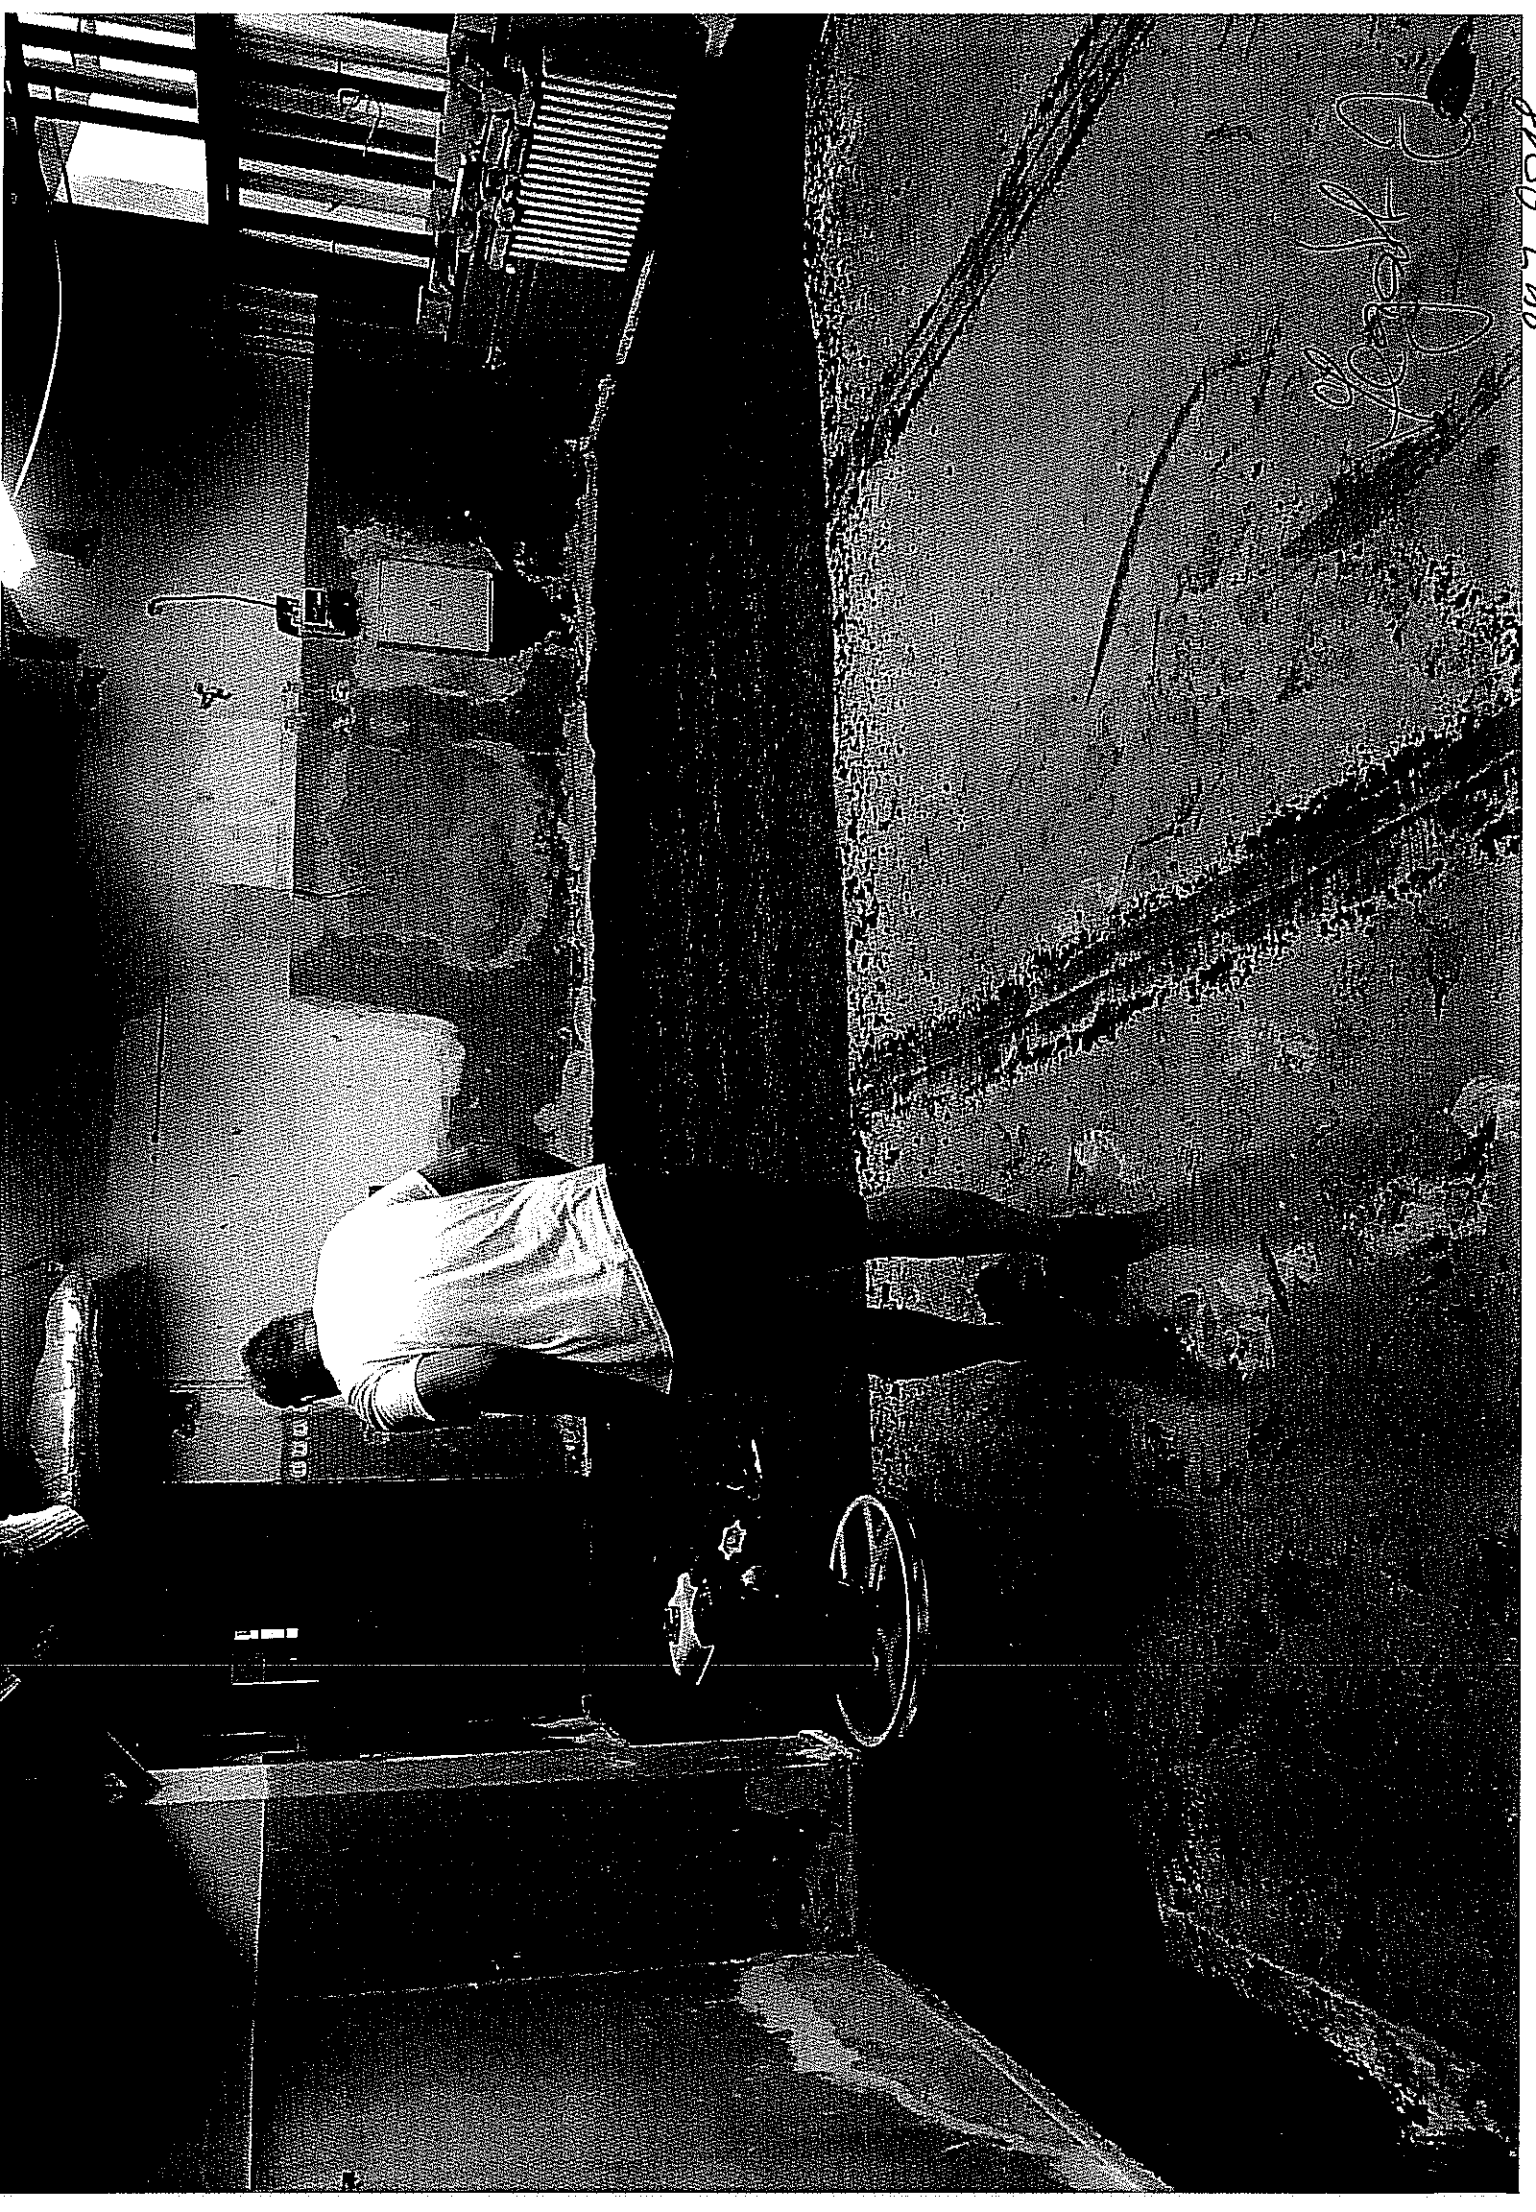

P-100
02/5/2010



Handwritten text on a piece of paper or a wall panel, possibly a signature or a label. The text is illegible due to the high contrast and graininess of the image.
