

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

Most ev.č 245-008 přes suchou strouhu v obci Mochov, most ev.č.279-017 přes potok před obcí Skyšice- neodkladná oprava

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Most ev.č.245-008 Mochov

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

201 / 1

Číslo ZBV:

1

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001

Zhotovitel: Sistomont, s.r.o.
Korycanska 855/10, 181 00 Praha 8
IČ: 06210422

Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.1	0.00	0.00	0.00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.2	0.00	0.00	0.00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.3	0.00	532,317.50	532,317.50

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.4	0.00	0.00	0.00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.5	0.00	0.00	0.00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1	0.00	532,317.50	532,317.50

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré: 1

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: Most ev.č 245-008 přes suchou strouhu v obci Mochov, most ev.č.279-017 přes potok před obcí Skyšice- neodkladná oprava Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Most ev.č.245-008 Mochov		Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 201 / 1	Číslo ZBV: 1																													
Strany smlouvy o dílo č. S-2983/00066001/2019 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 8.10.2019 (dále jen Smlouva): Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov Zhotovitel: Sistomont, s.r.o., Korycanska 855/10, 181 00 Praha 8																																
Přílohy Změnového listu:		Paré č.	Příjemce																													
<table border="1"> <tr><td>1. Krycí list</td><td>1</td><td>počet listů</td></tr> <tr><td>2. Změnový list</td><td>1</td><td>počet listů</td></tr> <tr><td>3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací</td><td>1</td><td>počet listů</td></tr> <tr><td>4. Rozpis ocenění Změn položek</td><td>1</td><td>počet listů</td></tr> <tr><td>5. Přehled zařazení změn do skupin</td><td>1</td><td>počet listů</td></tr> <tr><td>6. Přehled dalších dokladů</td><td>1</td><td>počet listů</td></tr> <tr><td> Další doklady - viz př. 6. Přehled dalších dokladů</td><td>23</td><td>počet listů</td></tr> </table>	1. Krycí list	1	počet listů	2. Změnový list	1	počet listů	3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů	4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů	5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů	6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů	Další doklady - viz př. 6. Přehled dalších dokladů	23	počet listů	<table border="1"> <tr><td>1, 2</td><td>Objednatel</td></tr> <tr><td>3</td><td>Zhotovitel</td></tr> <tr><td>4</td><td>TDI</td></tr> <tr><td>5</td><td>Projektant</td></tr> </table>	1, 2	Objednatel	3	Zhotovitel	4	TDI	5	Projektant		
1. Krycí list	1	počet listů																														
2. Změnový list	1	počet listů																														
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů																														
4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů																														
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů																														
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů																														
Další doklady - viz př. 6. Přehled dalších dokladů	23	počet listů																														
1, 2	Objednatel																															
3	Zhotovitel																															
4	TDI																															
5	Projektant																															
Iniciátor změny: zhotovitel (Sistomont, s.r.o., Korycanska 855/10, 181 00 Praha 8)																																
Popis a zdůvodnění Změny:																																
<p>Při provádění čištění a odstraňování nánosů z říms byla zjištěna na pravé římse prasklina a na levé římse několik hlubších trhlin. Zároveň bylo zjištěno po odstranění nečistot značné přebalení vozovky na levé straně mostu. Prodloužené křídlo pod římsou na levé straně mostu je rozpadlé a neplní svou funkci. Na pravé straně je niveleta povrchu vozovky v úrovni římsy. Beton říms je degradovaný. Po odstranění nánosů zeminy a očištění zděných křídel na pravé straně mostu bylo konstatováno, že zděná křídla jsou z větší části rozpadlá, nesoudržná s absencí koruny - zhlaví.</p> <p>Na základě tohoto zjištění budou provedeny nové železobetonové římsy (vlevo i vpravo) s odrazným obrubníkem a nové prodloužené křídlo na levé straně mostu tak, aby po instalaci nového záchytného systému byla zajištěna jeho 100% záchytná funkce. Je nutné provést přezdění rozpadlých částí křídel vpravo s vybudováním nového betonového zhlaví.</p> <p>Z důvodu přerušení stavby v zimním období bylo upřesněno DIO vzhledem k celkovému termínu trvání stavby. Rozhodnutím č.j. OD-112380/2019-MASPE ze dne 4.11.2019 o povolení zvláštního užívání komunikací a částečně uzavírky je prodloužen termín od 11.11.2019 do 31.3.2020 (16 ks dopr.značek+9 ks směrovacích desek+2 soupravy 3 ks výstražných světel)</p> <p>Uvedené změny vznikly na základě nepředvídaného zjištěného skutečného stavu stávajících stavebních konstrukcí po zahájení stavby. Jsou nevyhnutelné a technicky i ekonomicky neoddelitelné od realizované stavby.</p> <p>Jedná se o Změny nepodstatné, nepředvídané, které jsou tak podle § 10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29. 05. 2017) upřeshňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazené do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.</p> <p>Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tyto Změny nepředstavují vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná o změny nepředvídané.</p>																																
Údaje v Kč bez DPH:																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Cena navrhovaných Změn záporných</th> <th>Cena navrhovaných Změn kladných</th> <th>Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem</th> <th>Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0.00</td> <td>532,317.50</td> <td>532,317.50</td> <td>532,317.50</td> </tr> </tbody> </table>	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	0.00	532,317.50	532,317.50	532,317.50																								
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných																													
0.00	532,317.50	532,317.50	532,317.50																													
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:																																
x;	jméno	Ing. Martin Jílek	datum 23. 03. 2020 podpis																													
Projektant (autorský dozor):	jméno	_____	datum podpis																													
Technický dozor investora: KSÚS SK, p.o.	jméno	Jan Boček	datum 23. 03. 2020 podpis																													
Zástupce objednatel: KSÚS SK, p.o.	jméno	Bc. Miroslav Dostál	datum 23. 03. 2020 podpis																													
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitel sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.																																
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel)	jméno	Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA	datum podpis																													
Zhotovitel	jméno	Ing. Martin Jílek	datum 23. 03. 2020 podpis																													
			Číslo paré: 1																													

ZÁPIS**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 1**

Název Stavby: Most ev.č 245-008 přes suchou strouhu v obci Mochov, most ev.č.279-017 přes potok před obcí Skyšice- neodkladná oprava		
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	201 / 1	
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Most ev.č.245-008 Mochov		

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
1,450,059.09

Poznámka:

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0.00	0.00	1.450.059.09	0.00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0.00	532,317.50	532,317.50	36.71%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	0.00	1,982,376.59	532,317.50	36.71%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

Sistomont, s.r.o. Ing. Martin Jílek souhlasím 23. 03. 2020

Projektant (autor. dozor):

Stavební dozor:

KSÚS SK Jan Boček souhlasím 23. 03. 2020

Zástupce objednatele:

KSÚS SK Bc. Miroslav Dostál souhlasím 23. 03. 2020

Zaměstnanec objednatele

odpovědného za cenové

projednání změny:

Ing. Jaroslava Jurková souhlasím 23. 03. 2020

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 1													
Evidenční číslo a název stavby: "Most ev.č.245-008 přes suchou strouhu v obci Mochov, most ev.č.279-017 přes potok před obcí Skyšice- neodkladná oprava"								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: SO 201/Most ev.č.245-008 Mochov								č.1					
Skupina Změn: 3													
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
39	122838	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM	M3	40.000	91.000	51.00	959.60	38 384.00	0.00	48 939.60	87 323.60	48 939.60	127.50
41	12940	ČIŠTĚNÍ RÁMOVÝCH A KLENBOVÝCH PROPUSTŮ OD NÁNOSŮ	M3	3.000	40.000	37.00	488.70	1 466.10	0.00	18 081.90	19 548.00	18 081.90	1 233.33
8	9117C1	SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	13.000	13.500	0.50	7 137.10	92 782.30	0.00	3 568.55	96 350.85	3 568.55	3.85
12	914119	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL NEREFLEXNÍ - NÁJEMNÉ	KS DEN	144.000	2352.000	2 208.00	10.40	1 497.60	0.00	22 963.20	24 460.80	22 963.20	1 533.33
60	914122	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	8.000	16.000	8.00	405.30	3 242.40	0.00	3 242.40	6 484.80	3 242.40	100.00
61	914123	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	8.000	16.000	8.00	236.90	1 895.20	0.00	1 895.20	3 790.40	1 895.20	100.00
	916339	SMĚROVACÍ DESKY Z4 - NÁJEMNÉ	KS DEN	240.000	1323.000	1 083.00	17.90	4 296.00	0.00	19 385.70	23 681.70	19 385.70	451.25
24	966168	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM	M3	0.500	12.000	11.50	8 805.90	4 402.95	0.00	101 267.85	105 670.80	101 267.85	2 300.00
2	015113	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - III. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T	60.000	173.000	113.00	93.90	5 634.00	0.00	10 610.70	16 244.70	10 610.70	188.33
4	015140	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV	T	0.500	30.000	29.50	149.00	74.50	0.00	4 395.50	4 470.00	4 395.50	5 900.00
		Nové položky											
101	31717	KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY	KG	0.00	78.00	78.00	135.00	0.00	0.00	10 530.00	10 530.00	10 530.00	100.00
102	317326	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C40/50 (B50)	M3	0.00	8.78	8.78	10 260.00	0.00	0.00	90 082.80	90 082.80	90 082.80	100.00
103	317365	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10S05	T	0.00	0.76	0.76	26 600.00	0.00	0.00	20 216.00	20 216.00	20 216.00	100.00
104	327215	PŘEZDĚNÍ ZDÍ Z KAMENNÉHO ZDIVA	M3	0.00	2.50	2.50	3 940.00	0.00	0.00	9 850.00	9 850.00	9 850.00	100.00
105	327325	ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37)	M3	0.00	1.54	1.54	5 790.00	0.00	0.00	8 916.60	8 916.60	8 916.60	100.00
	9113C1	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 -DODÁVKA A MONTÁŽ	M	0.00	60.00	60.00	1 520.00	0.00	0.00	91 200.00	91 200.00	91 200.00	100.00
107	917223	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM	M	0.00	10.50	10.50	329.00	0.00	0.00	3 454.50	3 454.50	3 454.50	100.00
108	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	0.00	7.50	7.50	342.00	0.00	0.00	2 565.00	2 565.00	2 565.00	100.00
109	916139	DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÉ SOUPRAVA 3 KUSŮ - NÁJEMNÉ	KS DEN	0.00	294.00	294.00	208.00	0.00	0.00	61 152.00	61 152.00	61 152.00	100.00
		Celkem						153,675.05	0.00	532,317.50	685,992.55	532,317.50	

Za Zhotovitele: Ing. Martin Jílek

Za Objednatele: Jan Božek

Datum: 3/12/2020

Datum: 23. 03. 21

PREHLED ZARAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: "Most ev.č.248-008 přes suchou strouhu v obci Mochov, most ev.č.279-017 přes potok před obcí Škyšice- neodkladná oprava"

1	Přijaté smluvní částka bez rezervy a DPH	3,837,176.47
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)bez DPH	4,169,493.97
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) vč. DPH	5,045,087.70
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	114.84%
4=(28/1)*100	sledování vyhraněných změn (Skupina 1)	0.00%
5=(28/1)*100	sledování změny položek (Skupina 2)	0.00%
6=(19/1)*100	sledování limitu 18 % pro podstatnou změnu pro změny záporné viz § 14, odst. (8), písm. b)	0.00%

8=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	832,317.80
7=(8/1)*100	sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	14.84%
9=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	1,001,182.94

8=(32A/1)*100	sledování limitu 80 % Skupina 3	14.84%
10=(38A/1)*100	sledování limitu 80 % Skupina 4	0.00%
10A=32A+38A	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	832,317.80
11=1*0,8	Zákonný limit 80 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	1,018,888.24

12=(39a/1)*100	sledování limitu 18 %	0.00%
13=39a	sledování limitu 140 234 000 Kč	0.00
14=149224000-39a	Zbývá do limitu	149,234,000.00

Skupiny změn

ZBV č.	Název ČO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávatel se znamenkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	- 1 - Výkazné změny (Doměrky)						- 2 - Základna položek (Zepočítávání)						- 3 - Nepřevýšenost						- 4 - Načtyřnost						- 5 - Změny do minima			
					Změny záporné (zadávatel se znamenkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávatel se znamenkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávatel se znamenkem minus)	Změny kladné	Procentní vyjádření Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (zadávatel se znamenkem minus)	Změny kladné	Procentní vyjádření Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (zadávatel se znamenkem minus)	Změny kladné	limit 18 %	Suma hodnot Změn záporných a Změn kladných								
17	18	19=23+26+28+33	20=24+27+30+34+37+39	21=18+20	22	23	24=21+24	25	26	27	28=26+27	29	30	31=(30/1)*100	32=29+30	33A=ABE(29)+30	33	34	35=(34/1)*100	36=33+34	36A=ABE(33)+34	37	38	39=(38a/1)*100	39a=ABB(37)+38							
izov stavby/	Most ev.č.248-008 přes suchou strouhu v obci Mochov, most ev.č.279-017 přes potok před obcí Škyšice- neodkladná oprava	0.00	832,317.80	832,317.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	832,317.80	14.84%	832,317.80	832,317.80	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00								
31	1	Most ev.č.248-008 Mochov / nová římsy , oprava křídla + DIO	0.00	832,317.80	832,317.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	832,317.80	14.84%	832,317.80	832,317.80	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00								

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	1	
Název a evidenční číslo stavby:	Most ev.č 245-008 přes suchou strouhu v obci Mochov, most ev.č.279 017 přes potok před obcí Skyšice- neodkladná oprava	
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Most ev.č.245-008 Mochov	
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	201 / 1	

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
07 Změnový soupis prací SO 201 po změně 1	4	
08 Zápisy ze stavebního deníku	2	
09 Projednání změn Skyšice-Mochov	1	
10 Fotodokumentace	5	
11 Zápis ze stavebního deníku - přerušení prací	1	
12 Protokol o přerušení prací Skyšice-Mochov	1	
13 Protokol o znovuzahájení prací Skyšice-Mochov	1	
14 Rozhodnutí o DIO Mochov + situace	4	
15 Souhlas s prodloužením termínu rozhodnutí o DIO	2	
16 Žádost o změnu rozsahu díla	2	
Počet listů celkem	23	

Změnový soupis prací SO 201 po změně 1

Evidenční číslo a název stavby: "Most ev.č.245-008 přes suchou strouhu v obci Mochov,
most ev.č.279-017 přes potok před obcí Skyšice- neodkladná oprava"

Číslo a název SO/PS: SO 201/Most ev.č.245-008 Mochov

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

č.1

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
45	11010	VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ	M2	10.000	10.000	0.00	223.50	2 235.00	0.00	0.00	2 235.00	0.00	0.00
34	111208	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 20KM	M2	50.000	50.000	0.00	311.40	15 570.00	0.00	0.00	15 570.00	0.00	0.00
35	11130	SEJMUTÍ DRNU	M2	35.000	35.000	0.00	40.20	1 407.00	0.00	0.00	1 407.00	0.00	0.00
46	112148	KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,3M, ODVOZ DO 20KM	KUS	10.000	10.000	0.00	996.80	9 968.00	0.00	0.00	9 968.00	0.00	0.00
47	112218	ODSTRANĚNÍ PÁŘEZŮ D DO 0,5M, ODVOZ DO 20KM	KUS	10.000	10.000	0.00	1 209.90	12 099.00	0.00	0.00	12 099.00	0.00	0.00
37	113728	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM	M3	50.000	50.000	0.00	2 249.90	112 495.00	0.00	0.00	112 495.00	0.00	0.00
39	122838	ODKOPÁVKY A PROKOPAVKY OBECNÉ TR. II, ODVOZ DO 20KM	M3	40.000	91.000	51.000	959.60	38 384.00	0.00	48 939.60	87 323.60	48 939.60	127.50
48	128418	DOLAMOVNÍ ODKOPÁVEK TR. II, ODVOZ DO 20KM	M3	10.000	10.000	0.00	1 728.40	17 284.00	0.00	0.00	17 284.00	0.00	0.00
40	12920	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU	M3	1.000	1.000	0.00	604.90	604.90	0.00	0.00	604.90	0.00	0.00
49	12930	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU	M3	10.000	10.000	0.00	455.90	4 559.00	0.00	0.00	4 559.00	0.00	0.00
41	12940	ČIŠTĚNÍ RÁMOVÝCH A KLENBOVÝCH PROPŮSTŮ OD NÁNOSŮ	M3	3.000	40.000	37.000	488.70	1 466.10	0.00	18 081.90	19 548.00	18 081.90	1 233.33
	18090	VŠEOBECNÉ ÚPRAVY OSTATNÍCH PLOCH	M2	100.000	100.000	0.00	31.30	3 130.00	0.00	0.00	3 130.00	0.00	0.00
62	261312	VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TR III NA POVRCHU D DO 16MM	M	56.000	56.000	0.00	821.00	45 976.00	0.00	0.00	45 976.00	0.00	0.00
42	272125	ZÁKLADY Z DÍLCŮ ŽELEZOBETONOVÝCH DO C30/37	M3	10.000	10.000	0.00	13 022.60	130 226.00	0.00	0.00	130 226.00	0.00	0.00
43	281451	INJEKTOVÁNÍ NÍZKOTLAKÉ Z CEMENTOVÉ MALTY NA POVRCHU	M3	5.000	5.000	0.00	9 044.30	45 221.50	0.00	0.00	45 221.50	0.00	0.00
52	572224	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	40.000	40.000	0.00	23.80	952.00	0.00	0.00	952.00	0.00	0.00
53	574B31	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 8 TL. 40MM	M2	40.000	40.000	0.00	360.60	14 424.00	0.00	0.00	14 424.00	0.00	0.00

21	935212	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	M	6.000	6.000	0.00
22	938541	OCISTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 200 BARŮ	M2	46.000	46.000	0.00
23	94190	LEHKÉ PRACOVNÍ LEŠENÍ DO 1,5 KPA	M30 P	15.000	15.000	0.00
56	966138	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM	M3	2.000	2.000	0.00
24	966168	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ZELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM	M3	0.500	12.000	11.50
26	97619	VYBOURÁNÍ DROBNÝCH PŘEDMĚTŮ OSTATNÍCH	KUS	9.000	9.000	0.00
25	97816	ODSEKÁNÍ VRSTVY VYROVNÁVACÍHO BETONU NA MOSTECH	M3	2.000	2.000	0.00
63	78383	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS- C)	M2	20.000	20.000	0.00
51	014003	POPLATKY-zařízení staveniště	KPL	1.000	1.000	0.00
3	014002	POPLATKY-nájem komunikace	KPL	1.000	1.000	0.00
44	014001	POPLATKY-zás.vodou, elektrinou	KPL	1.000	1.000	0.00
2	015115	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - III. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T	60.000	173.000	113.00
7	015130	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU	T	12.000	12.000	0.00
		POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ				

Příloha č. 7

748.00	4 488.00	0.00	0.00	4 488.00	0.00	0.00
222.00	10 212.00	0.00	0.00	10 212.00	0.00	0.00
84.90	1 273.50	0.00	0.00	1 273.50	0.00	0.00
4 306.10	8 612.20	0.00	0.00	8 612.20	0.00	0.00
8 805.90	4 402.95	0.00	101 267.85	105 670.80	101 267.85	2 300.00
4 544.50	40 900.50	0.00	0.00	40 900.50	0.00	0.00
5 393.80	10 787.60	0.00	0.00	10 787.60	0.00	0.00
564.70	11 294.00	0.00	0.00	11 294.00	0.00	0.00
67 050.00	67 050.00	0.00	0.00	67 050.00	0.00	0.00
59 600.00	59 600.00	0.00	0.00	59 600.00	0.00	0.00
223 500.00	223 500.00	0.00	0.00	223 500.00	0.00	0.00
93.90	5 694.00	0.00	10 610.70	16 244.70	10 610.70	198.93
302.50	3 630.00	0.00	0.00	3 630.00	0.00	0.00
149.00	74.50	0.00	4 395.50	4 470.00	4 395.50	5 900.00

		Nové položky (JC dle OTSKP-SPK 2019)											
101	31717	KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY po 1 m na NK	KG	0.00	78.000	78.00	135.00	0.00	0.00	10 530.00	10 530.00	10 530.00	100.00
102	317326	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C40/50 (B50) C35/45 XF4 vč.bednění, vč.výplně a těsnění prac. a dilat. Spaz (0,65*0,8+0,3*0,3)*13,5+2,1*0,6*0, 2+2,4*0,6*0,2=8,78 m3	M3	0.00	8.780	8.78	10 260.00	0.00	0.00	90 082.80	90 082.80	90 082.80	100.00
103	317365	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI B50B5	T	0.00	0.76	0.76	26 586.00	0.00	0.00	20 216.00	20 216.00	20 216.00	100.00
104	327215	PŘEZDĚNÍ ZDÍ Z KAMENNÉHO ZDIVA	M3	0.00	2.50	2.50	3 940.00	0.00	0.00	9 850.00	9 850.00	9 850.00	100.00
105	327325	ZDÍ OBERNĚ, ZARUBNÍ, NABREZNI ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37) C30/37 XF2 vč.bednění, nátěru zасыpaných ploch proti zemi vlhkosti vč.ochrany geotextilií, vč.výplně a těsnění prac. a dilat. Spaz 0,5*0,4*0,9+1,6*0,9*1,8+1,5*0,3 =3,54 m3	M3	0.00	1.54	1.54	5 790.00	0.00	0.00	8 916.60	8 916.60	8 916.60	100.00
106	911301	SVODIČ OCELI SILNIC JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 -DODÁVKA A MONTÁŽ	M	0.00	60.00	60.00	1 520.00	0.00	0.00	91 200.00	91 200.00	91 200.00	100.00
107	917223	SILNICNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM ochráníení dlažby přechodů říms	M	0.00	10.50	10.50	329.00	0.00	0.00	3 454.50	3 454.50	3 454.50	100.00
108	917224	SILNICNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM přechody říms - zlom	M	0.00	7.50	7.50	342.00	0.00	0.00	2 565.00	2 565.00	2 565.00	100.00
109	916139	DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÉ SOUPRAVA 3 KUSŮ - NÁJEMNĚ (90x2+57x2)=294	KSDE M	0.00	294.00	294.00	208.00	0.00	0.00	61 152.00	61 152.00	61 152.00	
Celkem								1,450,059.09	0.00	532,317.50	1,982,376.59	532,317.50	136.71

Datum	Denní záznamy stávkby
14.11.2019	<p>ZÁPIS ODJEZD NATELE: MOCHOV EV.Ú - 245-002 PŘI PROVÁZENÍ ČIŠTĚNÍ A OBSTRUKČNÍMÍ NÁROČNÝ RŮS BYLA ZJIŠTĚNA NA PRAVÉ RŮSE PRASKLINA A NA LEVÉ RŮSE NĚKOLIK TRHLIN. ZÁROVEŇ BYLO ZJIŠTĚNO PŘI ODSTRANĚNÍ NĚKTERÝCH NEČISTOT ZNÁČNĚ PŘEBÁLENÍ VOZOVKY NA LEVÉ STRANĚ MOSTU, PRODLOUŽENÍ ŽEBROU ROZPAKĚ, ATD... VIZ ZÁPIS ZHOTOVITĚLE ZE DNE 12.11.2019. NA ZÁKLADĚ ZJIŠTĚNÍHO STAVU RŮS BYLO NA HOSTĚ SVOLENO MÍSTNÍ SEŠTĚNÍ ZÚČASTI ING. A. VAVŘENY - PONTEX S.P.O. PŘI ZJIŠTĚNÍ ROZSAHU PORUCH STÁVAVÍČÍCH RŮS A DEGRADACI BETONU NEBE ZARUČIT PŮVODNÍ FUNKCI ZÁCHYT. SYSTÉMU ROZPAKĚ PRODLOUŽENÍ ŽEBROU POD ÚROVŇ BĚŽNOU JEŘÁKOVCI ŽIVOTNOSTI. JE NUTNĚ VYBUDOVAT NOVÉ NORDOVÉ RŮSY.</p>
14.11.2019	<p>SLYŠACE: J. BOŽEK: ING. VAVŘENY: Docistování příklopů uzemí mostu, křídla, koutky, povlaky, křídla, koutky a uhlazení koutků 3 pracovníci, zataženo, 9°C.</p>
15.11.2019	<p>ZÁPIS ODJEZD NATELE: NA ZÁKLADĚ ZJIŠTĚNÍ OVEŘENÝM SKYŠICE V ZÁPISU ZHOTOVITĚLE ZE DNE 12.11.2019 BYLO NA 249-017 MOSTĚ EV.Ú. 249-017 PŘES POTOK PŘED OBCÍ SKYŠICE PROVEDENO MÍSTNÍ SEŠTĚNÍ. ZADÁNÍ OPRAV VYCHÁZĚLO Z POSLEDNÍ HPT Z 31.12.2018 OB TĚ DOBE DOŠLO KE VÝVOJI DEGRADACE BETONU RŮS & PROGRESI, KTERÁ NEUDRŽÍ NOVĚ OBZPEČENÍ KOTVENÍ ZÁCHYT. SYSTÉMU NA ZÁKLADĚ OZJ. ZJIŠTĚNÍ TĚCH. PODOBÍ, BYL O POSOUZENÍ KONOPNÍ ING. VAVŘENY - PONTEX S.P.O. Z PŮVODNÍ KOTVENÍ KOTVENÍ KOTVENÍ ZÁCHYT. SYSTÉMU ZÁCHYT. SYSTÉMU SVOLENO S PROVEDENÍM KOTVENÍ MONUMENTÁLNÍ ZS RŮS.</p>
15.11.2019	<p>MOCHOV: Bolesti zbytků panelů na pravé straně mostu elektrickým kladivem, detailní docistování panelů 3 pracovníci, zataženo, 9°C</p>

ZDE ODTAHNĚTE 1

WWW.OPTIS.CZ

Datum	Denní zápisný stavby
15.11.2019	ZÁPIS OBEDNATELE :
HOCHOV	NAVRHOVATÉ ZMĚNY BYLÝ PŘEVĚDĚNÝ . OBJEKTY
ZM-DK	SOUBRÁSI S NAVRHOVANÝMI ZMĚNAMI ZA PŘEDKONNÉ
	DOKŘEŠENÍ POSTUPU ZPRACOVÁNÍ A PROFESNÍ ZODP
	DLE SOB S-2983/100066001/2019, čl.6, odst.6.4.
	V. BOČEK
15.11.2019	SKÝPCE:
	Polozimní úklebi a úklebi čeršní koberu usotny, dířeni
	lozta potoka
	Z prauvili, křivčeno, 90°.
16.11.2019	ZÁPIS OBEDNÝ TISCE :
SKÝPCE	NAVRHOVATÉ ZMĚNY BYLÝ PŘEVĚDĚNÝ. DNĚ DVA TEL
ZM-014	SOUBRÁSI S NAVRHOVANÝMI ZMĚNAMI, ŽY PŘEDKONNÉ
	ADBEŽENÍ DASTOPU ZPRACOVÁNÍ ZMĚN DLE SOB
	S-2983/100066001/2019, čl.6, odst.6.4.
	V. BOČEK
16.11.2019	HOCHOV:
	Kvalita korigování, dokonalá spádka zadržitel a zplytkus pracle.
	Z prauvili, oblazno, 100°.
	SKÝPCE:
	Kvalita korigování, dokonalá úklebi koberu usotny.
	Z prauvili, oblazno, 100°.
18.11.2019	HOCHOV:
	Čistota spát v kamenných zděm, kvalitníka opadu na
	korigovat, úklebi korigování.
	Z prauvili, polořeno, 100°.

Stavba: „Most ev.č. 245-008 přes suchou strouhu v obci Mochov, most ev.č. 279-017 přes potok před obcí Skyšice – neodkladná oprava“

Datum: 15.11.2019

Zápis z projednání změn během výstavby.

Projednání se zúčastnili: Jan Boček, mostní technik KSÚS, Miroslav Dostál vedoucí mostního úseku KSÚS, ing. Jílek, Sistomont, s.r.o., ing. Martin Vavřena, Pontex s.r.o.

Stavební objekt: „Most ev.č. 279-017 přes potok pře obcí Skyšice“

Zhotovitel při stanoveném postupu prací předcházejících sanaci betonu říms (čištění betonu říms tlakovou vodou, odstraňování nesoudržných a separovaných částí krycí vrstvy výztuže, odstraňování nečistot) a demontáži nefunkčního zábradlí, upozornil na stav, kdy není možné z důvodu pokročilé degradace betonu říms zajistit maximální spolehlivost kotvení nového záchytného systému. Zadání opravy vycházelo z poslední HPM z 31.12.2018 a od této prohlídky došlo do současné doby ve vývoji degradace betonu říms k další progresi. Na základě „Zajištění technické pomoci“ posoudil navrhované změny také ing. Vavřena, Pontex s.r.o.

Je nezbytné provedení těchto změn se všemi přímými souvislostmi: odstranit staré římsy a nahradit je novými železobetonovými s parametry dle platné legislativy.

Navrhované změny byly projednány a objednatel požaduje jejich zpracování a provedení dle SOD S-2983/00066001/2019, článek 6, odst. 6.2

Stavební objekt: „Most ev.č. 245-008 přes suchou strouhu v obci Mochov“

Při provádění čištění a odstraňování nánosů z říms byla zjištěna na pravé římsě prasklina a na levé římsě několik trhlin. Zároveň bylo zjištěno po odstranění nečistot značné přebalení vozovky na levé straně mostu. Prodloužené křídlo pod římsou na levé straně mostu je rozpadlé a neplní svojí funkci. Na pravé straně je nivelita povrchu vozovky v úrovni římsy. Beton říms degraduje. Po odstranění nánosů zeminy a očištění zděných křídel na pravé straně mostu bylo konstatováno, že zděná křídla jsou z větší části rozpadlá, nesoudržná s absencí koruny – zhlaví.

Na základě tohoto stavu navrhuje zhotovitel provedení nových železobetonových říms (vlevo i vpravo) a nového prodlouženého křídla na levé straně mostu tak, aby po instalaci nového záchytného systému byla zajištěna jeho 100% záchytná funkce. Je nutné také přezdění rozpadlých částí křídel vpravo s vybudováním nového betonového zhlaví.

Navrhované změny byly projednány a objednatel požaduje jejich zpracování a provedení dle SOD S-2983/00066001/2019, článek 6, odst. 6.2


Jan Boček, KSÚS

Miroslav Dostál, KSÚS.....

ing. Jílek, Sistomont s.r.o..... ing. M. Vavřena, Pontex s.r.o.





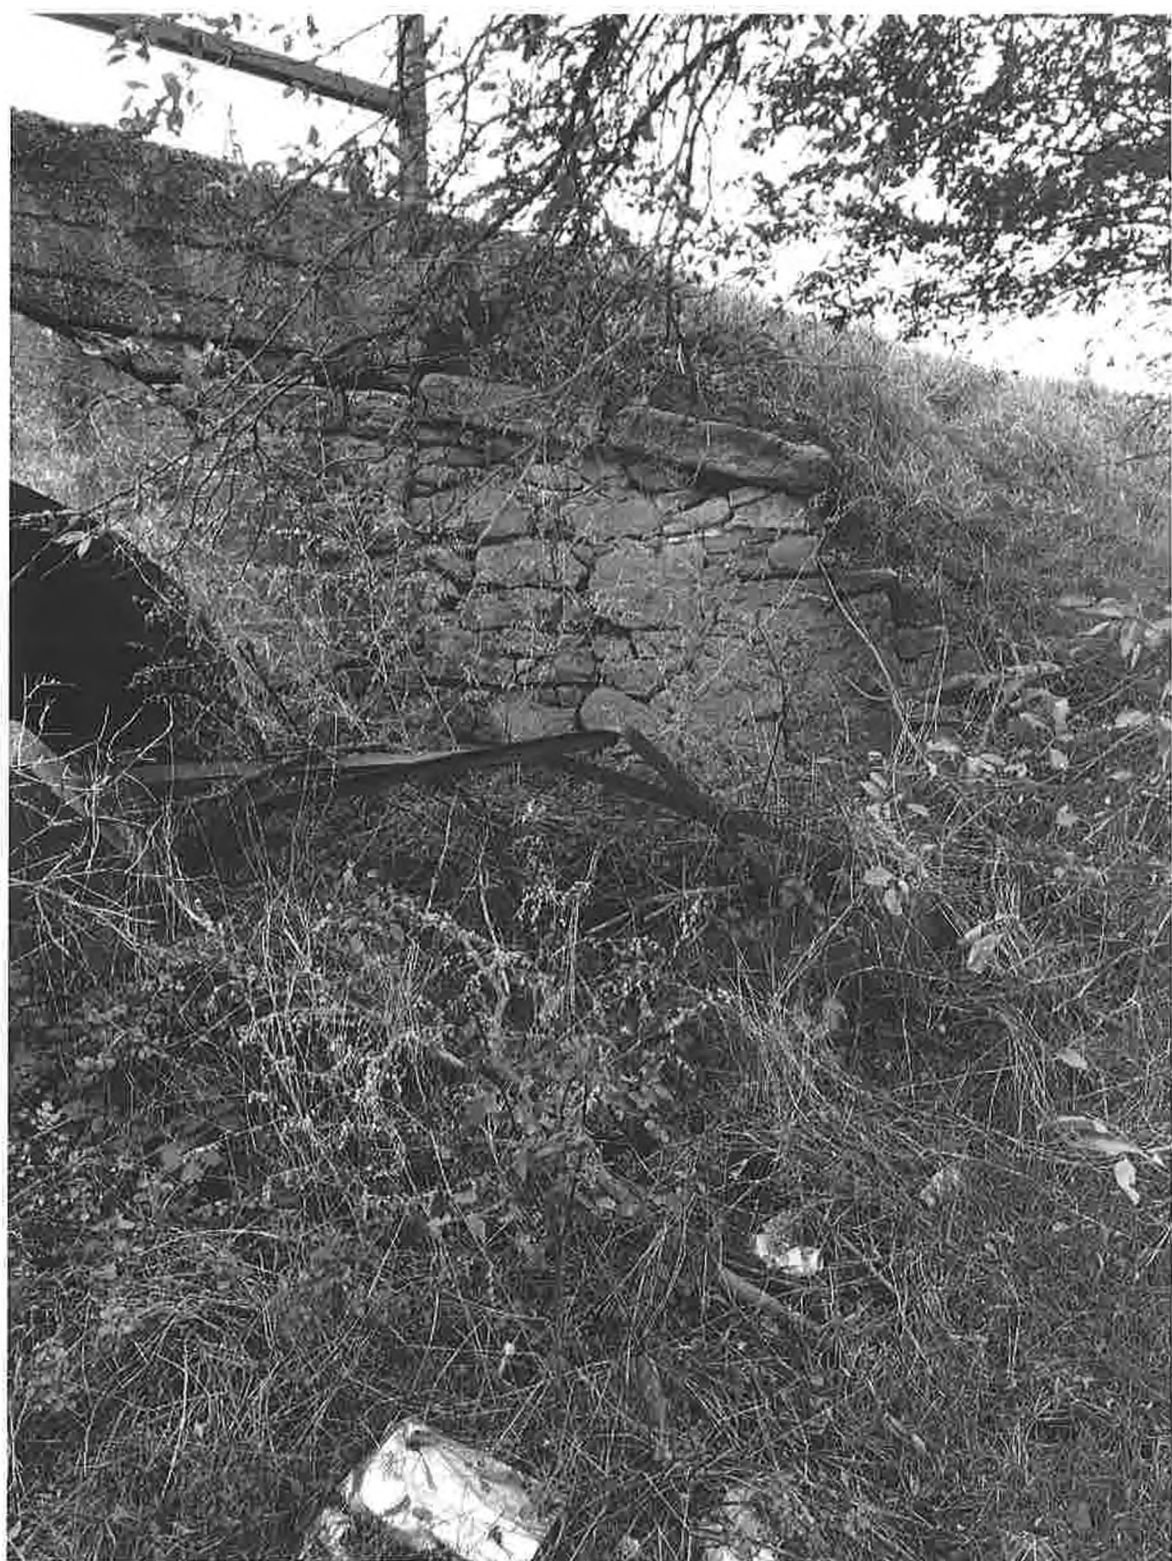







Datum	Denní záznamy stavby
29.11.2019	<p>HOCHOV:</p> <p>Dokování předválců kamenných křídél, dokování brázdění a armatury na levé straně mostu. Zabalování bednění ztlaví kamenných křídél mostu vpravo.</p> <p>3 pracovní, oblačno, 8°C</p> <p>SKÝTICE:</p> <p>Dokování a zakládání betonu. Čištění skřobových vrstev a spojů mostu. Ukládání předválců kamenných křídél na osovém mostu a pod mostem.</p> <p>3 pracovní, oblačno, přeháňka, 6°C.</p>
2.12.2019	<p>ZÁPIS OBJEDNATELE:</p> <p>BÝLA PROVEDENA PREVIKÁ BĚDNĚNÍ A ARMATURY RIMSŮ VLEVO MOSTU EV.Č. 245-008 HOCHOV. BETONÁŽ MŮŽE BÝT PROVEDENA ZA PŘÍMIVÝCH KLIMATICKÝCH PODMÍNEK.</p>
2.12.2019	<p>ZÁPIS ZHOTOVITELE</p> <p>Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek byly dno 1.12.2019 přerušeny stavební práce. Z důvodu nízkých teplot a vysoké vlhkosti není možné aplikovat pečetící vrstvu pod izolaci rímů a následně hotování izolace. Technologie schváleného kotveního materiálu vyžaduje dle technického listu určitého minimální teploty vzduchu a podkladu +12°C. Při současných nízkých teplotách jsou pozastaveny také betonářské práce. Přeháňka prací je v souladu s SOD čl. 4 - „Doba a místo plnění“ odst. 4.2.</p> <p>JILEK SVOHLASIT J. BOCEK</p>
27.1.2020	<p>ZÁPIS ZHOTOVITELE:</p> <p>Dnes, 27.1.2020 byly znovu zahájeny stavební práce.</p> <p>JILEK SVOHLASIT J. BOCEK</p>

ZDE ODDRHNĚTE ↓

HW 0115 CE



Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IČ 00066001,
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

Protokol o přerušení stavebních prací

Stavba: „Most ev.č. 245-008 přes suchou strouhu v obci Mochov, most ev.č. 279-017 přes potok před obcí Skyšice – neodkladná oprava“

Smlouva o dílo č. S-2983/00066001/2019

Zhotovitel: Sistomont, s.r.o., Korycanská 855/10, Praha 8, 181 00
Její jménem jedná Ing. Martin Jílek, jednatel

Termín dokončení dle SOD: do 3měsíců od předání Staveniště Zhotoviteli

Předání staveniště: 31.10.2019 **Termín dokončení:** 31.1.2020

Přerušení prací dle SOD č. S-2983/00066001/2019, článek 4 „Doba a místo plnění“, odstavec 4.2: „V případě nevhodných klimatických podmínek lze provádění stavebních prací přerušit (zimní přestávka v termínu od 1.11. do 31.3.). O zimní přestávce rozhoduje objednatel na návrh zhotovitele případně i bez návrhu. O počátku zimní přestávky bude proveden písemný protokol, do kterého budou uvedeny důvody, proč byly práce přerušeny. V případě příznivých klimatických podmínek lze po dohodě smluvních stran zimní přestávku zrušit či upravit. O zkrácení či úpravě zimní přestávky rozhoduje objednatel na návrh zhotovitele, případně i bez návrhu. O ukončení zimní přestávky bude proveden protokol.“

Datum přerušení stavebních prací: od 1.12.2019 včetně

Důvod přerušení stavebních prací:

Z důvodu nevhodných klimatických podmínek byly dne 1.12.2019 přerušeny stavební práce. Vlivem nízkých teplot pod bodem mrazu a vysoké vlhkosti není možné aplikovat nátěrovou technologii pečetiví vrstvy pod izolaci říms a následně také provádět natavení izolace, Technologie schváleného kotevního nátěru vyžaduje dle technického listu výrobce minimální teplotu vzduchu a podkladu +12°C. Při současných nízkých teplotách jsou pozastaveny také betonářské práce.

Dne 2.12.2019

.....
Za objednatele J.Boček

.....
za zhotovitele Ing. M. Jílek

Protokol o zahájení stavebních prací

Stavba: „Most ev.č. 245-008 přes suchou strouhu v obci Mochov, most ev.č. 279-017 přes potok před obcí Skyšice – neodkladná oprava“

Smlouva o dílo č. S-2983/00066001/2019

**Zhotovitel: Sistomont, s.r.o., Korycanská 855/10, Praha 8, 181 00
Jejíž jménem jedná Ing. Martin Jílek, jednatel**

Termín dokončení dle SOD: do 3měsíců od předání Staveniště Zhotoviteli

Předání staveniště: 31.10.2019 Termín dokončení: 31.1.2020

Přerušení prací dle SOD č. S-2983/00066001/2019, článek 4 „Doba a místo plnění“, odstavec 4.2: „V případě nevhodných klimatických podmínek lze provádění stavebních prací přerušit (zimní přestávka v termínu od 1.11. do 31.3.). O zimní přestávce rozhoduje objednatel na návrh zhotovitele případně i bez návrhu. O počátku zimní přestávky bude proveden písemný protokol, do kterého budou uvedeny důvody, proč byly práce přerušeny. V případě příznivých klimatických podmínek lze po dohodě smluvních stran zimní přestávku zrušit či upravit. O zkrácení či úpravě zimní přestávky rozhoduje objednatel na návrh zhotovitele, případně i bez návrhu. O ukončení zimní přestávky bude proveden protokol.

Dne 27.1.2020 byla ukončena zimní přestávka a byly znovu zahájeny stavební práce.

Datum přerušení stavebních prací: 1.12.2019 včetně

Datum znovuzahájení stavebních prací: 27.1.2020

Celková doba přerušení stavebních prací: 57 dní

Termín dokončení díla po přerušení stavebních prací: 23.3.2020

Dne 27.1.2020

.....
Za objednatele J.Boček

.....
za zhotovitele ing. M. Jílek



Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Masarykovo náměstí 1, 2
250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav



brnivp19v00rz1

Odbor dopravy

Váš dopis č.:

Ze dne:

Naše č.: MÚBNLSB-OD-112380/2019-MASPE SEDOZ DZ s.r.o. IČ 24218537

Naše sp. zn.: OD-28662/2019-MASPE Primátorská č.p. 296/38
180 00 PRAHA 8

Vyřizuje: Petra Mašková

Tel.:

E-mail:

Datum: 04.11.2019

Rozhodnutí

Městský úřad Brandýs nad Labem–Stará Boleslav, odbor dopravy, pracoviště Stará Boleslav, jako příslušný silniční správní úřad ve věcech silnic II. a III. tříd a veřejně přístupných účelových komunikací podle ust. § 40 odst. 4), písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“),

na základě žádosti společnosti SISTOMONT s.r.o., IČ: 06210422 se sídlem Korycanská 855/10, 181 00 Praha 8 – Čimice zastoupena na základě plné moci společností SEDOZ DZ s.r.o., IČ: 24218537 se sídlem Primátorská 296/38, 180 00 Praha 8 - Libeň (dále jen „žadatel“) podané dne 31.10.2019 ve věci povolení zvláštního užívání silnice II/245 v k.ú. Mochov a její částečné uzavírky z důvodu provádění stavebních prací – oprava zádržného systému mostu, v rámci realizace stavby: „*Most 245-008 – neodkladná oprava zádržného systému mostu ev. č. 245-008*“, rozhodl takto:

- I. Povoluje dle ust. § 25 odst. (6), písm. c) bod 3. zákona o pozemních komunikacích, zvláštní užívání komunikace silnice II/245 v k.ú. Mochov z důvodu provádění stavebních prací.
- II. Povoluje dle ust. § 24 zákona o pozemních komunikacích částečnou uzavírku - zúžení silnice II/245, v k.ú. Mochov.

Termín provádění stavebních prací a částečné uzavírky: 11.11.2019 – 31.01.2020

Povolení se uděluje za dodržení těchto podmínek:

1. Uspořádání podzemního vedení bude v souladu s ČSN 73 6005. Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.
2. Budou dodrženy podmínky uvedené v předchozím souhlasu ke zvláštnímu užívání pozemní komunikace a její částečné uzavírce KSÚS č.j.: 6727/19/KSUS/MHT/POL ze dne 31.10.2019, Policie ČR Krajské ředitelství SK, DI Praha-venkov-východ č. j.: KRPS-295811-1/ČJ-2019-011506 ze dne 30.10.2019.

3. Dotčený úsek silnice II/245 smí být uzavřen max. na dobu uvedenou v rozhodnutí. Zhotovitel je povinen využít všech možností ke zkrácení doby uzavírky.
4. Částečná uzavírka musí být označena dopravními značkami v souladu se Stanovením přechodné úpravy provozu vydaným zdejším odborem dopravy jako Opatření obecné povahy pod č.j. OD-112700/2019-MASPE ze dne 01.11.2019. Po celou dobu uzavírky bude dopravní značení udržováno v řádném stavu. Označení zabezpečuje žadatel o částečnou uzavírku na svůj náklad a odpovídá za jeho stav po celou dobu uzavírky.
5. Na začátku uzavírky žadatel umístí orientační tabuli s uvedením dat zahájení a ukončení uzavírky, svůj název a sídlo, popř. další vhodný údaj související se stavební akcí.
6. V případě vzniku dopravních komplikací zajistí zhotovitel řízení dopravy za pomoci dostatečného počtu pověřených osob, vybavených a označených dle TP 66 – Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích.
7. Škody způsobené částečnou uzavírkou budou neprodleně odstraněny a komunikace bude uvedena do původního stavu. Náhrada případných škod vzniklých vlivem uzavírky se uskuteční na náklad žadatele o částečnou uzavírku.
8. **Autobusová linková doprava:** úsekem projíždí linka PID č. 662, která nebude nijak dotčena částečnou uzavírkou – zúžením silnice č. II/245.
9. Po ukončení částečné uzavírky budou neprodleně odstraněny dopravní značky a zařízení umístěné na silnici v souvislosti s tímto rozhodnutím.
10. Zhotovitel stavby bude společnost SISTOMONT s.r.o., IČ: 06210422 se sídlem Korycanská 855/10, Praha 8 - Čimice.
11. Za organizování a zabezpečení akce a dodržování stanovených podmínek zodpovídá za zhotovitele **Ing. Martin Jílek, T.: 777 202 630.**
12. Dotčená obce budou informovat o částečné uzavírce způsobem v místě obvyklým.
13. Toto rozhodnutí bude po dobu částečné uzavírky k dispozici na staveništi ke kontrole osobám pověřeným výkonem státního dozoru na silnicích.
14. Při nedodržení podmínek rozhodnutí odejme silniční správní úřad na základě § 25 odst. 3 zákona o pozemních komunikacích, vydané povolení. Nepovolené zvláštní užívání a nedodržení podmínek v rozhodnutí je skutkovou podstatou správního deliktu, za který bude uložena pokuta.
15. Stavební práce budou zahájeny po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Účastník řízení, na něhož se toto rozhodnutí vztahuje ve smyslu § 27 odst. 1 správního řádu:

- SISTOMONT s.r.o., Korycanská 855/10, Praha 8 - Čimice

Odůvodnění

Dne 31.10.2019 obdržel MěÚ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, odbor dopravy, pracoviště Stará Boleslav žádost žadatele o povolení zvláštního užívání silnici II/245, povolení částečné uzavírky uvedené komunikace z důvodu provádění stavebních prací a stanovení přechodné úpravy provozu během této uzavírky.

Jelikož byly předloženy zákonem požadované náležitosti a nebyly shledány důvody žádosti nevyhovět, rozhodl silniční správní úřad tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze podat do 15 dnů ode dne oznámení odvolání ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 prostřednictvím podání u Městského úřadu Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, odbor dopravy, pracoviště Stará Boleslav, Mariánské náměstí 28, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

Odvolání proti výrokové části bod II. dle § 24 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích, v platném znění, nemá odkladný účinek.

Podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES Vám oznamujeme, že na základě plnění úkolů, které nám ukládají právní předpisy, shromažďujeme a dále zpracováváme Vaše osobní údaje za účelem výkonu agendy silničního správního úřadu a speciálního stavebního úřadu. Bližší informace naleznete na stránkách <http://www.brandysko.cz/>.

[otisk úředního razítka]

Petra Mašková
referent odboru dopravy

Podle položky 36 písm. a) zákona č. 634/2004 Sb. O správních poplatcích, byl stanoven správní poplatek ve výši 500,- Kč a byl uhrazen dne 01.11.2019.

Obdrží:

- SEDOZ DZ s.r.o., IČ: 24218537; IDDS: mrr9x73
- Krajská správa a údržba silnic Středočeský kraj,; IDDS: a6ejgmx
- Obec Mochov, Sokolovská 92, 250 89 Mochov; IDDS: gqcbsh6

Dotčené orgány:



- Policie ČR DI Praha venkov-VÝCHOD; IDDS: 2dtai5u

Na vědomí:

- HZS Středočeského kraje
- Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje
- ROPID
- Centrální evidence uzavírek – přes internet

Mochov

razítko DOSS

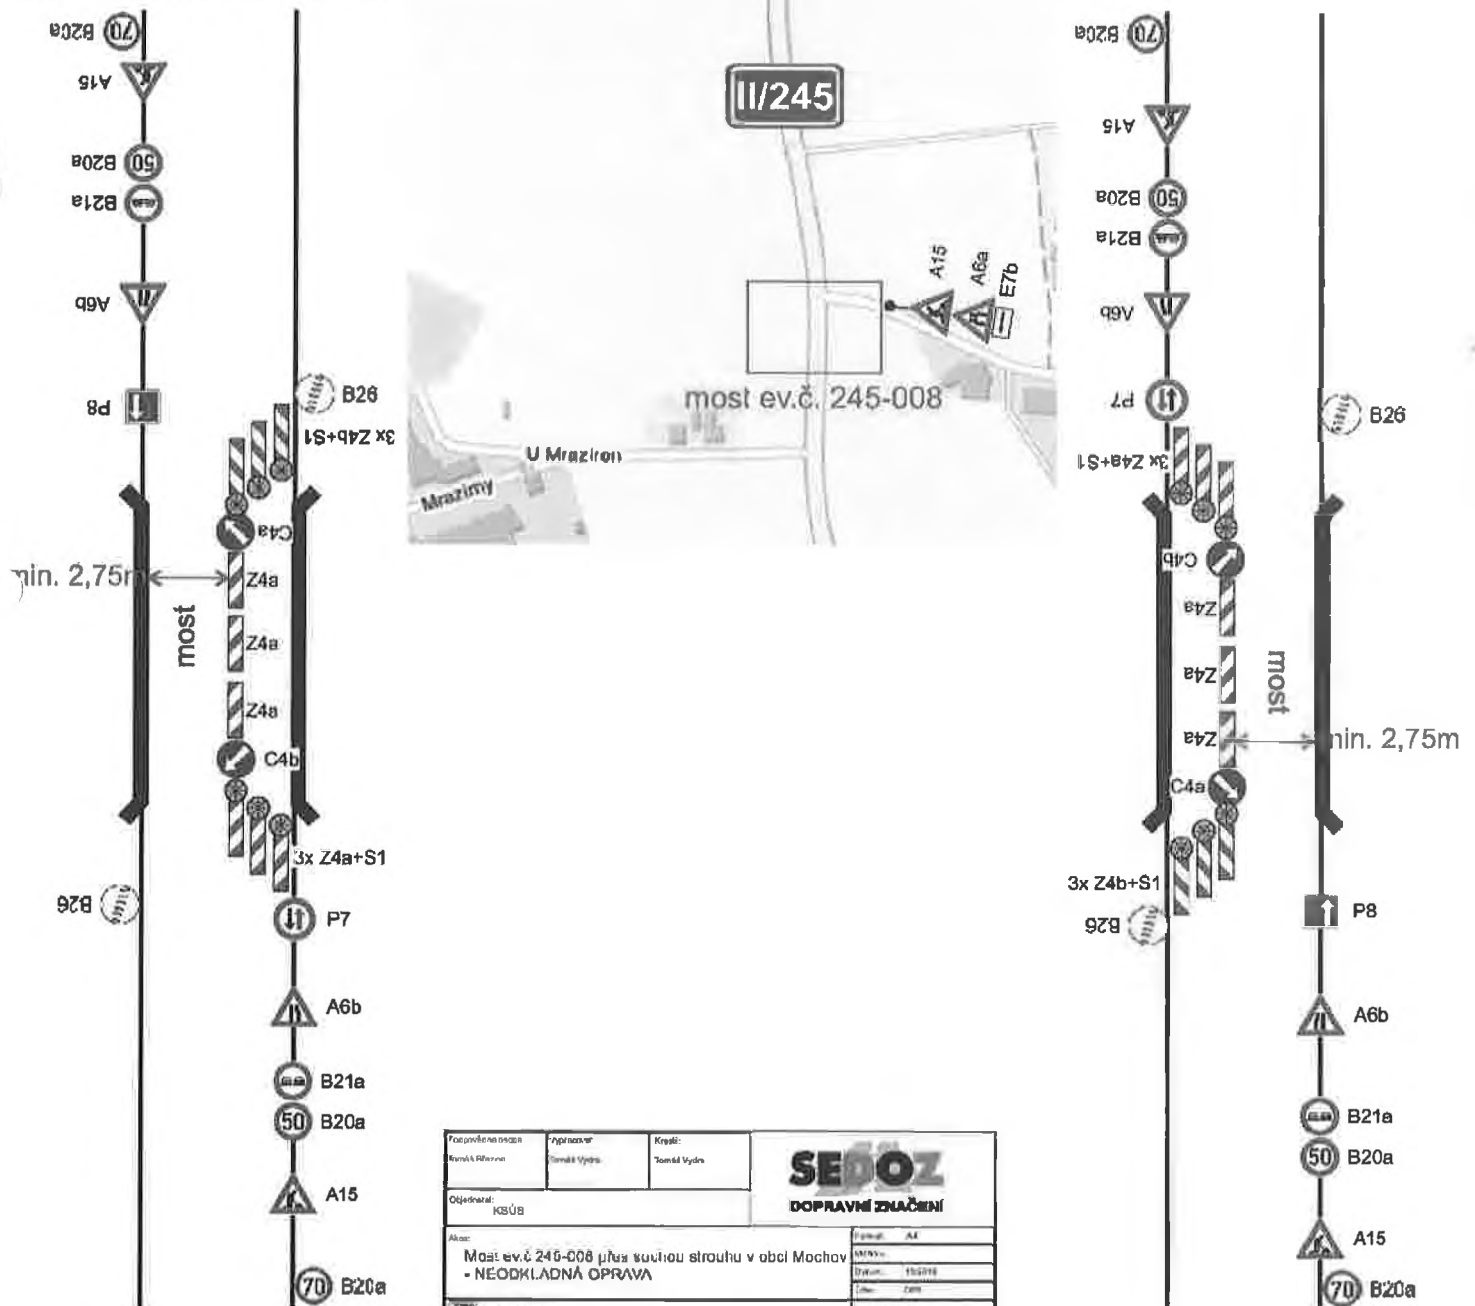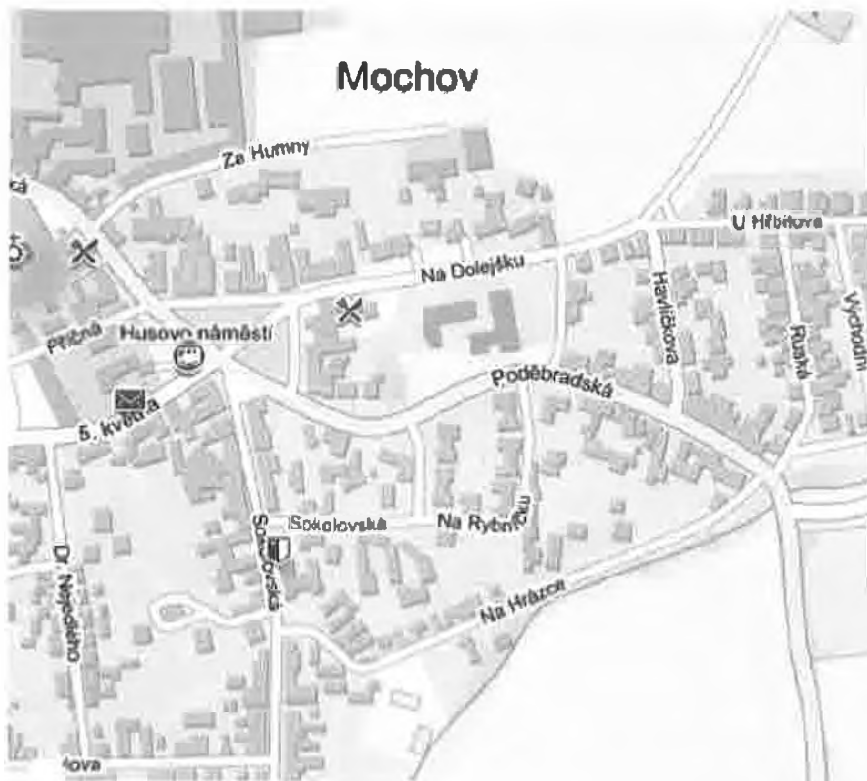

Pracovní nařízení Řevnická Řízení	Vypracoval Tomáš Vydral	Kreslil Tomáš Vydral	 SEDOZ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
Objednatel: KSÚB			
Adresa: Most ev.č. 245-008 přes současnou strouhu v obci Mochov - NEODKLADNÁ OPRAVA			Datum: 14.11. Město: Mochov Území: 150208 Typ: 208
Datum: Návňh DIO			Číslo výzvací: Part. č.:



Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Masarykovo náměstí 1, 2
250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav



brnlvp20v001m4

Odbor dopravy

Váš dopis č.:

Ze dne:

Naše čj.: MÚBNLSB-OD-6672/2020-MASPE SEDOZ DZ s.r.o.

Naše sp. zn.: OD-28662/2019-MASPE Primátorská 296
180 00 PRAHA 8

Vyřizuje: Petra Mašková

Tel.:

E-mail:

Datum: 20.01.2020

Souhlas s prodloužením termínu rozhodnutí o povolení zvláštního užívání komunikací (stavební práce) a částečné uzavírky č.j.: OD-112380/2019-MASPE ze dne 04.11.2019 na akci: „Most 245-008 – neodkladná oprava zádržného systému mostu ev. č. 245-008“, k.ú. Mochov

Městský úřad Brandýs nad Labem–Stará Boleslav, odbor dopravy, pracoviště Brandýs nad Labem, jako příslušný silniční správní úřad ve věcech silnic II. a III. tříd a veřejně přístupných účelových komunikací podle ust. § 40 odst. (4) písm. a) a místních komunikací podle ust. § 40 odst. (5) písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění a podle ust. § 124 odst. 6) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v platném znění, na základě písemné žádosti společnosti SEDOZ DZ s.r.o. ze dne 17.01.2020 a současně se souhlasem Krajské správy a údržby silnic jako vlastníka - správce silnice č. II/245 v k.ú. Mochov tímto provedl

prodloužení termínu rozhodnutí č.j.: OD-112380/2019-MASPE ze dne 04.11.2019 o povolení zvláštního užívání komunikací a částečné uzavírky

silnice č. II/245 z důvodu provádění stavebních prací a částečné uzavírky při opravě zádržného systému mostu ev. č. 245-008 v k.ú. Mochov, v rámci realizace akce: „*Most 245-008 – neodkladná oprava zádržného systému mostu ev. č. 245-008*“ a stanovuje namísto termínu od 11.11.2019 – 31.01.2020, **nový termín: od 11.11.2019 do 31.03.2020.**

Důvodem prodloužení termínu bylo zpoždění dodávky technologie, tudíž nebylo možno termín stihnout.

Od 1.11. – 31.3. je období zimní údržby, práce mohou probíhat jen za příznivých klimatických podmínek.

Rozhodnutí o povolení zvláštního užívání komunikací (stavební práce) a částečné uzavírky na původní termín od 11.11.2019 – 31.01.2020 bylo vydáno MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav, odborem dopravy, pracoviště Brandýs nad Labem pod č.j.: OD-112380/2019-MASPE dne 04.11.2019 s nabytím právní moci dne 05.11.2019.

Ostatní části výroků původního rozhodnutí včetně podmínek zůstávají v platnosti.

[otisk úředního razítka]

Petra Mašková, v.r.
Referent odboru dopravy

Obdrží:

- SEDOZ DZ s.r.o., IČ: 24218537; IDDS: mrr9x73
- Krajská správa a údržba silnic Středočeský kraj,; IDDS: a6ejgmx
- Obec Mochov, Sokolovská 92, 250 89 Mochov; IDDS: gqcbsh6

Dotčené orgány:

- Policie ČR DI Praha venkov-VÝCHOD; IDDS: 2dtai5u

Na Vědomí:

- HZS Středočeského kraje
- Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje
- ROPID
- Centrální evidence uzavírek – přes internet

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11**

Sistomont, s.r.o.
Korycanská 855/10
181 00 Praha 8

Vás dopis značky/ze dne

Naše značka

Vyřizuje/telefon
J. Boček

Praha

**Věc: Žádost č.1, o změnu rozsahu díla – stavby „Most ev.č. 245-008 přes suchou strouhu
v obci Mochov, most ev.č. 279-017 přes potok před obcí Skyšice“**

S odvoláním na článek 6 Práva a povinnosti objednatele Smlouvy o dílo S-2983/00066001/2019, odst. 6.6:

Objednatel může požadovat změnu rozsahu Díla či schválit změnu rozsahu Díla navrženou zhotovitelem, a to při respektování povinností Objednatele dle Zákona o ZVZ a interních předpisů objednatele, zejména pak Směrnice ředitele Objednatele ke změnám staveb (dále jen „Směrnice“, která tvoří přílohu č. 4 této Smlouvy). Zhotovitel bere obsah Směrnice na vědomí a zavazuje se, že při administraci změn nebude postupovat v rozporu se Směrnicí a že nebude na Objednateli uplatňovat nároky ze změn před schválením těchto změn postupem, který Směrnice stanoví.

Zhotovitel je v případě takového rozhodnutí Objednatele o změně rozsahu Díla povinen Objednateli vyhovět a (i) snížit rozsah Díla nebo (ii) bez zbytečného odkladu podat nabídku na zvýšení rozsahu Díla o plnění stejného charakteru jako Dílo sjednané ve smlouvě s tím, že:

- a) při snížení rozsahu se Cena Díla odpovídajícím způsobem sníží,
- b) při zvýšení rozsahu bude Cena Díla v nabídce Zhotovitele stanovena na základě cen uvedených v Nabídce v Oceněném soupisu prací. V případě, že není možné Cenu Díla stanovit tímto způsobem, bude Cena Díla stanovena na základě expertních cen uvedených v Oborovém třídíniku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací (OTSKP-SPK) platných pro dané období nebo v cenách nižších. V případě, že není možné cenu Díla stanovit ani tímto způsobem, bude Cena Díla stanovena ve výši ceny obvyklé v místě a čase, zjištěné na podkladě průzkumu trhu provedeného Zhotovitelem formou získání alespoň tří nezávislých nabídek jiných zhotovitelů. Doklady o provedeném průzkumu trhu a jeho výsledcích je Zhotovitel povinen předat Objednateli.
- c) změny budou administrovány postupem stanoveným ve směrnici, přičemž snížení či zvýšení rozsahu bude upraveno písemným dodatkem Smlouvy, kterým může být i Změnový list změny stavby podepsaný ze strany osob oprávněných jednat za Objednatele a Zhotovitele,

1/2

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11**

- d) případná změna termínů plnění bude vždy sjednána formou písemného dodatku k této Smlouvě (tj. nikoliv formou Změnového listu), a to i v případě, pokud by souvisela se změnami sjednanými změnovým listem. Změna termínů plnění je možná pouze v případě, že taková změna nemá charakter podstatné změny závazku ve smyslu § 222 Zákona o ZVZ,
- e) Zhotovitel se zavazuje vyhotovovat Změnové listy a jejich přílohy a předkládat je objednateli výlučně ve formátu, který stanoví Směrnice.

Žádáme o změnu rozsahu díla v souladu s těmito zjištěnými skutečnostmi:

Stavební objekt: „Most ev.č. 279-017 přes potok pře obcí Skyšice“

Zhotovitel při stanoveném postupu prací předcházejících sanaci betonu říms (čištění betonu říms tlakovou vodou, odstraňování nesoudržných a separovaných částí krycí vrstvy výztuže, odstraňování nečistot) a demontáži nefunkčního zábradlí, upozornil na stav, kdy není možné z důvodu pokročilé degradace betonu říms zajistit maximální spolehlivost kotvení nového záchytného systému. Zadání opravy vycházelo z poslední HPM z 31.12.2018 a od této prohlídky došlo do současné doby ve vývoji degradace betonu říms k další progresi. Na základě „Zajištění technické pomoci“ posoudil navrhované změny také ing. Vavřena, Pontex s.r.o.

Je nezbytné provedení těchto změn se všemi přímými souvislostmi: odstranit staré římsy a nahradit je novými železobetonovými s parametry dle platné legislativy.

Stavební objekt: „Most ev.č. 245-008 přes suchou strouhu v obci Mochov“

Při provádění čištění a odstraňování nánosů z říms byla zjištěna na pravé římsě prasklina a na levé římsě několik trhlin. Zároveň bylo zjištěno po odstranění nečistot značné přebalení vozovky na levé straně mostu. Prodloužené křídlo pod římsou na levé straně mostu je rozpadlé a neplní svojí funkci. Na pravé straně je nivelita povrchu vozovky v úrovni římsy. Beton říms degraduje. Po odstranění nánosů zeminy a očištění zděných křídel na pravé straně mostu bylo konstatováno, že zděná křídla jsou z větší části rozpadlá, nesoudržná s absencí koruny – zhlaví.

Na základě tohoto stavu budou provedeny nové železobetonové římsy (vlevo i vpravo) a nové prodloužené křídlo na levé straně mostu tak, aby po instalaci nového záchytného systému byla zajištěna jeho 100% záchytná funkce. Je nutné také přezdění rozpadlých částí křídel vpravo s vybudováním nového betonového zhlaví.

2/2

Jan Boček
Mostní technik, KSÚS SK
Oblast Mnichovo Hradiště
