

## Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby: <b>2017 - 395, II/101 Dolní Břežany - Zbraslav - havárie</b>	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: <b>251/1</b>	Číslo ZBV: <b>1</b>
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>SO 251.1 - Opěrné zdi</b>		

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace  
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov  
IČ: 00066001

Zhotovitel: Skanska, a.s.  
Křížkova 682/34a, 186 00 Praha 8 - Karlín  
IČ:26271303

## Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.3	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.4	-2 190 730,32	4 397 040,00	2 206 309,68

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
<b>1</b>	<b>-2 190 730,32</b>	<b>4 397 040,00</b>	<b>2 206 309,68</b>

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.  
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy  
a pro Rozpis ocenění změn položek.

## Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: 2017 - 395, II/101 Dolní Břežany - Zbraslav - havárie Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 251.1 - Opěrné zdi	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS:  251/1	Číslo ZBV:  1.4
---	--	-----------------------

Strany smlouvy o dílo objednatel č.:S-2537/00066001/2021 a zhotovitele č.10000156093 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 11.11.2021 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: Skanska, a.s., Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8 - Karlin

Přílohy Změnového listu:		Paré č.	Příjemce
1. Krycí list	1 počet listů	1, 2	Objednatel
2. Změnový list	1 počet listů	3	Zhotovitel
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1 počet listů	4	Projektant (AD)
4. Rozpis ocenění Změn položek	1 počet listů	5	Stavební dozor
5. Přehled zařazení změn do skupin	1 počet listů		
6. Přehled dalších dokladů	1 počet listů		
Další doklady dle přehledu dokladů	36 počet listů		

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny: **Záměna mikropilot a průměru vrtů**

Dle zadávací dokumentace bylo obsahem stavebního objektu SO 251 zajištění stability zemního tělesa. Z důvodu osazení nezbytného zádržného systému komunikace jsou lokálně v místech souběhu s potokem vybudovány železobetonové opěrné zdi, které mají proměnnou výšku podle geometrie komunikace. Založení opěrných zdí je lokálně zesíleno mikropilotami, pro jejichž zhotovení předpokládala zadávací dokumentace použití bezešvých trubek průměru 108/16 z oceli S355.

Z důvodu válečného konfliktu na území Ukrajiny a sankcím EU a ČR vůči Rusku upozornil Zhotovitel na úplnou nedostupnost ocelových bezešvých trubek, které měly být použity pro mikropilotáž, konkrétně průměru 108/16 z oceli S355 (viz doklad č. 10 - Doklady k poptávce a doklad č. 13 - Zápis ze 3. KD stavby ze dne 07.04.2022, bod 5).

Jako alternativu navrhl Zhotovitel výše uvedené ocelové trubky nahradit válcovanými profily HEB 140 z oceli S235JR. S touto náhradou ocelové části mikropilot bylo nutné zvětšení vrtů z průměru D 150 mm na průměr D 250mm.

Změna byla zpracována do aktualizace RDS a odsouhlasena AD (viz doklad č. 11 - Vyjádření AD) a stavebním dozorem ( viz doklad č. 12 - Vyjádření TDI).

Tato změna je vyjádřena smluvními položkami č. 10, 11, 48 a zvyšuje smluvní cenu stavby o 2 206 309,68 Kč bez DPH.

Jedná se o Změnu nepodstatnou, která je podle § 5, odst.1 písm.d), resp.podle § 11 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29. 05. 2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek zařazena do skupiny 4 jako nezbytná. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 5) se jedná o změnu nezbytnou.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-2 190 730,32	4 397 040,00	2 206 309,68	6 587 770,32

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí): Skanska, a.s.	jméno	Ing. Jaroslav Svoboda	datum	podpi
Projektant (autorský dozor): GeoTec-GS, a.s.	jméno	Mgr. Filip Dudík	datum	podpi
Stavební dozor: BUNG CZ, s.r.o.	jméno	Bc. Jakub Slánský	datum	podpi
Supervize (Regionální dotační kancelář)	jméno	xxx	datum	podpi
Zástupce Objednatele: KSÚS	jméno	Ing. Martin Staněk	datum	podpi

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněně jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Ing. Jan Fidler, DiS.	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	Jiří Červenka	datum	podpis

Číslo paré:

**ZÁPIS**

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)  
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 1

Název Stavby:	2017 - 395, II/101 Dolní Břežany - Zbraslav - havárie
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	251/1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	SO 251.1 - Opěrné zdi

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
31 471 725,86

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nulno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	31 471 725,86	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-2 190 730,32	4 397 040,00	4 397 040,00	13,97%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-2 190 730,32	33 678 035,54	2 206 309,68	7,01%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): Ing. Jaroslav Svoboda  
Skanska, a.s. souhlasím

Projektant (autorský dozor): Mgr. Filip Dudík  
GeoTec-GS, a.s. souhlasím

Stavební dozor: Bc. Jakub Slánský  
BUNG CZ, s.r.o. souhlasím

Zástupce Objednatele KSÚS: Ing. Martin Staněk  
souhlasím

Zaměstnanec KSÚS  
odpovědný za cenové  
projednání Změny: Ing. Jaroslava Jurková  
souhlasím

## Rozpis ocenění Změn položek - celkem

Evidenční číslo a název stavby: 2017 - 395 - II/101 Dolní Břežany - Zbraslav - havárie

## ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

Číslo a název SO/PS: SO 251.1 - Opěrné zdi

SO 251/1

Číslo a název rozpočtu: SO 251.1 - Opěrné zdi

Skupina změn 4

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	26174	VRTY PRO KOTV., INJEKT., MIKROPIL. NA POVR. TŘ I A II D DO 200MM	M	1736,000	0,000	-1736,000	981,510	1 703 901,36	-1 703 901,36	0,00	0,00	-1 703 901,36	-100,00%
11	26184	VRTY PRO KOTV., INJEKT., MIKROPIL. NA POVR. TŘ. III A IV D DO 200MM	M	496,000	0,000	-496,000	981,510	486 828,96	-486 828,96	0,00	0,00	-486 828,96	-100,00%
Nové položky - JC dle OTSKP 2021													
48	26175.N	VRTY PRO KOTV., INJEKT., MIKROPIL. NA POVR. TŘ I A II D DO 300MM	M	0,000	2232,000	2232,000	1970,000	0,00	0,00	4 397 040,00	4 397 040,00	4 397 040,00	100,00%
<b>Celkem</b>									<b>- 2 190 730,32</b>	<b>4 397 040,00</b>		<b>2 206 309,68</b>	

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.  
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Jaroslav Svoboda - hlavní stavbyvedoucí

Za Objednatele: Bc. Jakub Slánský - stavební dozor

Datum:

Datum:

Podpis:

Podpis:



PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: 2017 - 395 - II/101 Dolní Břežany - Zbraslav - havárie a 2019 - 113, II/101 Břežanské údolí, sanace skalních svahů

1	Přijátá smluvní částka bez rozvahy a DPH	54 776 990,66
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	55 083 300,24
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	60 949 793,29
3=(2/1)*100	Procento změny Přijáté smluvní částky	104,03%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(23/1)*100	Sledování změn položek (Skupina 2)	0,00%
40=(10/1)*100	Sledování limitu 10 % pro pracovatelnou změnu pro Změny záporné (dle § 14, odst. 2b), item 1)	-4,66%

6=20/30	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	2 206 309,68
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	4,03%
8=1/30	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4.	16 433 097,17

9=(24/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	0,00%
10=(24/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	12,03%
10A=(22A+23A)	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	6 587 770,32
11=1/50	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	27 386 495,26

12=(1/10)*100	Limit	8 316 648,56
13=(30/1)*100	Sledování limitu (15%)	0,00%
14=(A02(37)+28)	Hodnota skupiny 2	0,00

		- 1 -			- 2 -			- 3 -			- 4 -			- 5 -									
		Vyhrazení změny (Doměšky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)			Změna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nepředvídané (dle §222 odst. (8) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nastupné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny ústní (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)									
SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Limit 15 %	
16	17	18	19=23+26+29+33	20=24+27+30+34+37+38	21=18+20	22	23	24=23+24	25	26	27=26+27	28	29	30=28+29	31A=ABS(30)+30	32	33	34=33+34	35A=ABS(33)+34	36	37	38=ABS(37)+38	
		2017 - 395 - II/101 Dolní Břežany - Zbraslav - havárie a 2019 - 113, II/101	-2 190 730,32	4 387 040,00	2 206 309,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 190 730,32	4 387 040,00	2 206 309,68	6 587 770,32	0,00	0,00	0,00	0,00
281	1	Opěrná cihla/Zaměna mikropil a přírůstky vln				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předání Zmínového listu.

## Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	1
Název a evidenční číslo stavby:	<b>2017 - 395, II/101 Dolní Břežany - Zbraslav - havárie</b>
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 251.1 - Opěrné zdi
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	251/1

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
07 Soupis prací SO po změnách	21	
08 Oznámení Zhotovitele	2	
09 Pokyn Objednatele	2	
10 Doklady k poptávce	7	
11 Vyjádření AD	1	
12 Vyjádření TDI	1	
13 Zápis ze 3.KD stavby dne 7.4.2022	2	
Počet listů celkem	36	



## Rozpis ocenění Změn položek - celkem

## ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

## SO 251

## celkem

Evidenční číslo a název stavby: 2017 - 395 - II/101 Dolní Břežany - Zbraslav - havárie

Číslo a název SO/PS: SO 251.1 - Opěrné zdi

Číslo a název rozpočtu: SO 251.1 - Opěrné zdi

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm doprava dřevin na předepsanou vzdálenost spálení na hromadách nebo štěpkování											
5	112018	KACENÍ STROMŮ D KMENĚ DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, ODVOZ DO 20KM položka zahrnuje zejména: - poražení stromu a osekání větví - spálení větví na hromadách nebo štěpkování - dopravu a uložení kmenů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména: - vytrhání nebo vykopání pařezů - veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů - dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace <del>1/5=0,200 [A] ..... předpoklad 1 strom na 5,0 m<sup>2</sup></del> <del>310,0*2,0=620,000 [B] ..... uvažovaná plocha celkem</del> <del>Celkem: A*B=124,000 [C]</del>	KUS	124,000	124,000	0,000	1 474,63	182 854,12	0,00	0,00	182 854,12	0,00	0,00%
		Kaceni stromu se meri v [ks] porazených stromu (prumer stromu se meri ve výšce 1,3m nad terémem) a zahrnuje zejména: - poražení stromu a osekání větví - spálení větví na hromadách nebo štěpkování - dopravu a uložení kmenů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména: - vytrhání nebo vykopání pařezů - veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů - dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace <del>1/5=0,200 [A] ..... předpoklad 1 strom na 5,0 m<sup>2</sup></del> <del>310,0*2,0=620,000 [B] ..... uvažovaná plocha celkem</del> <del>Celkem: A*B=124,000 [C]</del>											
6	11511	ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN <del>16 [počet dílat. úseků] * 5 [hod/díl. úsek] =80,000 [A]</del>	HOD	80,000	80,000	0,000	75,68	6 134,40	0,00	0,00	6 134,40	0,00	0,00%
		Položka čerpání vody na povrchu zahrnuje i potrubí, pohotovost záložní čerpací soupravy a zřízení čerpací jímky. Součástí položky je také následná demontáž a likvidace těchto zařízení											
7	131738	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽÍ NEPAŽ TR. 1, ODVOZ DO 20KM <del>5030,0=5 030,000 [A] ..... celkem k vytěžení</del> <del>444,0=444,000 [B] ..... z toho objem gabionů (odhadem)</del> <del>zemina k vytěžení: A-B=4 586,000 [C] [m3]</del>	M3	4 586,000	4 586,000	0,000	412,90	1 893 559,40	0,00	0,00	1 893 559,40	0,00	0,00%









Rozpis ocenění Změn položek - celkem

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

SO 251

celkem

Evidenční číslo a název stavby: 2017 - 395 - II/101 Dolní Břežany - Zbraslav - havárie

Číslo a název SO/PS: SO 251.1 - Opěrné zdi

Číslo a název rozpočtu: SO 251.1 - Opěrné zdi

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoli hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,</li> <li>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,</li> <li>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,</li> <li>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,</li> <li>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odkružovacích prostředků,</li> <li>- poopěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,</li> <li>- vytvoření kotevnicích čel, kapes, náltků, a sedel,</li> <li>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,</li> <li>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,</li> <li>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,</li> <li>- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,</li> <li>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevnicích prvků a doplňkových konstrukcí,</li> <li>- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,</li> <li>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,</li> <li>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,</li> <li>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,</li> </ul>												
13	289971	<p><b>OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE</b></p> <p>ochrana izolace u drenáže viz PD příloha č.8 "Detaily" příloha č.1 "Drenáž"</p> <p>ochrana izolace u drenáže viz PD příloha č.8 "Detaily" příloha č.1 "Drenáž"</p> <p>309,10=309,100 [A] ..... délka pásu (0,3+0,3+0,3+0,05)=0,950 [B] ..... šířka pásu Celkem: A+B=310,050 [C]</p> <p>ochrana izolace u dilatace</p>	M2	310,050	310,050	0,000	160,44	49 744,42	0,00	0,00	49 744,42	0,00	0,00%	



## Rozpis ocenění Změn položek - celkem

## ZMĚNA SOUPOISU PRACÍ (SO/PS)

## SO 251

## celkem

Evidenční číslo a název stavby: 2017 - 395 - II/101 Dolní Břežany - Zbraslav - havárie

Číslo a název SO/PS: SO 251.1 - Opěrné zdi

Číslo a název rozpočtu: SO 251.1 - Opěrné zdi

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Položka zahrnuje: - dodávku předepsané geotextilie - úpravu, očištění a ochranu podkladu - přichycení k podkladu, případně zatížení - úpravy spojů a zajištění okrajů - úpravy pro odvodnění - nutné přesahy - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu											
14	28999	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE těsnící fólie pod drenáží 4,4*(2,0+309,1+2,0)=1 377,640 [A]	M2	1 377,640	1 377,640	0,000	132,13	182 027,57	0,00	0,00	182 027,57	0,00	0,00%
		Položka zahrnuje: - dodávku předepsané fólie - úpravu, očištění a ochranu podkladu - přichycení k podkladu, případně zatížení - úpravy spojů a zajištění okrajů - úpravy pro odvodnění - nutné přesahy - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu						12 242 402,66	0,00	0,00	12 242 402,66	0,00	0,00
15	31717	SVISLÉ KONSTRUKCE KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY včetně vrtání a vlepění 309=309,000 [A] ..... počet kusů 6,0=6,000 [B] ..... odhad 6 kg/kus Celkem: A*B=1 854,000 [C]	KG	1 854,000	1 854,000	0,000	244,20	452 746,80	0,00	0,00	452 746,80	0,00	0,00%
		Položka zahrnuje dodávku (výrobu) kotevního prvku předepsaného tvaru a jeho osazení do předepsané polohy včetně nezbytných prací (vrty, zálivky apod.)											
16	327325	ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 včetně vložení trubek (HDPE, PE nebo PVC pr. 125 mm) do bednění; 62 ks, délka 0,8 m včetně vložení šablon s letopočtem do bednění včetně provedení nátěru ALP a 2 x ALN ( s minimální spotřebou 0,3 kg/m2 a vrstvou ) v místě styku se zeminou nebo kamenivem (zemní vlhkosti) včetně kompletního provedení dilatačních spár (viz PD příloha č.8 "DETAILY" příloha č.2, 3.1 a 3.2) ostatní viz technická specifikace této položky 993,2=993,200 [A] [m3] (podle přesného 3D modelu)	M3	993,200	993,200	0,000	7 657,43	7 605 359,48	0,00	0,00	7 605 359,48	0,00	0,00%











Rozpis ocenění Změn položek - celkem

Evidenční číslo a název stavby: 2017 - 395 - II/101 Dolní Břežany - Zbraslav - havárie

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

Číslo a název SO/PS: SO 251.1 - Opěrné zdi

SO 251

Číslo a název rozpočtu: SO 251.1 - Opěrné zdi

celkem

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,</li> <li>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,</li> <li>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,</li> <li>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,</li> <li>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odkružovacích prostředků,</li> <li>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,</li> <li>- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedeí,</li> <li>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich,</li> <li>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,</li> <li>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,</li> <li>- zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,</li> <li>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,</li> <li>- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,</li> <li>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,</li> <li>- opatření povrchů betonu izolaci proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,</li> <li>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,</li> </ul>											
21	45131A	<p>PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25</p> <p>lože dlažby tl. 100 mm C 20/25 XF3                      ( viz PD příloha č.8 "DETAILY" příloha č.7 "Úprava za koncem zdi" )                      pod schodištěm na začátku a konci zdi:  <math>0,75 \cdot (2,2 \cdot 1,2 \cdot 0,2 + 0,8 \cdot 0,5) \cdot 2 = 1,392 [A]</math>                      lavice před zdi:  <math>1,0 \cdot 0,15 \cdot 309,1 = 46,365 [B]</math>                      rozšíření na začátku a na konci zdi:  <math>1/2 \cdot (1,0 + 1,3) \cdot 10 \cdot 0,15 \cdot 2 = 3,450 [C]</math></p> <p><i>Celkem: A+B+C=51 207 [D]</i></p>	M3	51,207	51,207	0,000	3 680,66	188 475,56	0,00	0,00	188 475,56	0,00	0,00%

## Rozpis ocenění Změn položek - celkem

## ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

## SO 251

## celkem

Evidenční číslo a název stavby: 2017 - 395 - II/101 Dolní Břežany - Zbraslav - havárie

Číslo a název SO/PS: SO 251.1 - Opěrné zdi

Číslo a název rozpočtu: SO 251.1 - Opěrné zdi

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odkružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, náliček, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zemínou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, <del>úpravy povrchu požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení</del>												
22	45147R1	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z MALTY PLASTICKÉ Zálivková hmota viz PD příloha č.8 "Detaily" č.přílohy 5 "Odvodňovací žlab chrlič" 62=62,000 [A] ..... počet kusů 0,8*0,530*0,04=0,017 [B] ..... objem hmoty pro 1 chrlič  Celkem: A*B=1,054 [C] Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení.	M3	1,054	1,054	0,000	103 105,78	108 673,49	0,00	0,00	108 673,49	0,00	0,00%	
23	45147R2	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z MALTY PLASTICKÉ Těsnící zálivka, viz PD příloha č.8 "Detaily" č.přílohy 5 "Odvodňovací žlab chrlič"	M3	0,310	0,310	0,000	103 105,77	31 962,79	0,00	0,00	31 962,79	0,00	0,00%	





## Rozpis ocenění Změn položek - celkem

Evidenční číslo a název stavby: 2017 - 395 - II/101 Dolní Břežany - Zbraslav - havárie

## ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

Číslo a název SO/PS: SO 251.1 - Opěrné zdi

SO 251

Číslo a název rozpočtu: SO 251.1 - Opěrné zdi

celkem

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál											
29	45860	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z MEZEROVITĚHO BETONU obetonování drenážního potrubí 0,3*0,3*309,1=27,819 [A] odpočet objemu potrubí zanedbán	M3	27,819	27,819	0,000	2 050,32	57 037,85	0,00	0,00	57 037,85	0,00	0,00%
		položka zahrnuje: - dodávku mezerovitěho betonu předepsané kvality a zásyp se ztuhnutím včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy											
30	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC lomový kámen minim. tl. 200 mm z nenásávkového kameniva (např. žula) třídy jakosti I podle ČSN 721860) spárování dlažby maltou cementovou podle ČSN EN 998-2, SVP XF4 lavice před zdi: 0,75*0,2*309,1=46,365 [A]  rozšíření na začátku a na konci zdi: 1/2*(1,0+1,3)*10*0,2*2=4,600 [B] ( viz PD příloha č.8 "DETAILY" příloha č.7 "Úprava za koncem zdi" - půdorys)  Celkem: A+B=50,965 [C]	M3	50,965	50,965	0,000	6 158,03	313 844,00	0,00	0,00	313 844,00	0,00	0,00%
		položka zahrnuje: - nutné zemní práce (svahování, úpravu pláňe a pod.) - zřízení spojovací vrstvy - zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky - dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru - spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody - nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45											
	6	Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů						47 526,88	0,00	0,00	47 526,88	0,00	0,00
31	625451	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠ KONSTR BETON OMÍT CEMENT BEZ VLOŽKY vytvoření fabionu u pracovní spáry viz PD př.č.8 "Detaily" č.1 "Drenáž" a č.2 "Pracovní spára mezi základem a dříkem" (0,05+0,05) odhad *(309.1+0,8)*2=61.980 [A]	M2	61,980	61,980	0,000	766,81	47 526,88	0,00	0,00	47 526,88	0,00	0,00%
		položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdva položení vrstvy v předepsané tloušťce potřebná lešení a podpěrné konstrukce											
	7	Přidružená stavební výroba						696 598,65	0,00	0,00	696 598,65	0,00	0,00
32	711112	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	83,700	83,700	0,000	738,49	61 811,61	0,00	0,00	61 811,61	0,00	0,00%

## Rozpis ocenění Změn položek - celkem

## ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

## SO 251

## celkem

Evidenční číslo a název stavby: 2017 - 395 - II/101 Dolní Břežany - Zbraslav - havárie

Číslo a název SO/PS: SO 251.1 - Opěrné zdi

Číslo a název rozpočtu: SO 251.1 - Opěrné zdi

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		<p>natavený AIP viz PD příloha č.8 "DETAILY" příloha č.1 "Drenáž"</p> <p>62=62,000 [A] ..... počet kusů 1,0*(0,3+0,5+0,3+0,25)=1,350 [B] ..... plocha izolace u prostupu drenáže (průměr - odhad) Celkem: A*B=83,700 [C]</p>											
		<p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání předepsaného izolačního materiálu</li> <li>- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení</li> <li>- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu</li> <li>- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů</li> <li>- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.</li> <li>- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace</li> <li>pro zadání stavby nestanoví jinak</li> <li>- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce</li> <li>- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace</li> <li>- provedení požadovaných zkoušek</li> <li>- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilie</li> </ul>											
33	711509	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILII	M2	846,841	846,841	0,000	115,61	97 903,29	0,00	0,00	97 903,29	0,00	0,00%
		<p>geotextilie - rub opěrné zdi geotextilie s ochrannou a drenážní funkcí minimální gramáž 300 g/m2tl. 3 mm, tažnost minimálně 70% viz PD příloha č.8 "DETAILY" příloha č.8 "Rub zdi mimo příčnou drenáž"</p> <p>geotextilie - rub opěrné zdi (4,0+0,8+309,1+4,0+0,8)=318,700 [A] ..... délka pásu (včetně úprav u konců zdi) (2,214-0,05)=2,164 [B] ..... šířka pásu pásu (podle průměrné výšky opěrné zdi) Celkem: A*B=689,667 [C]</p> <p>geotextilie - líc opěrné zdi (-4,0+309,1-4,0)=301,100 [D] ..... délka pásu (0,572-0,05)=0,522 [E] ..... šířka pásu pásu - odhad (průměr) Celkem: D*E=157,174 [F]</p>											
		<p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání předepsaného ochranného materiálu</li> <li>- zřízení ochrany izolace</li> </ul>											
35	76299R	OSTATNÍ ATYPICKÉ TESARSKÉ KONSTRUKCE	KS	5,000	5,000	0,000	1 698,77	8 493,85	0,00	0,00	8 493,85	0,00	0,00%





## Rozpis ocenění Změn položek - celkem

Evidenční číslo a název stavby: 2017 - 395 - II/101 Dolní Břežany - Zbraslav - havárie

## ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

Číslo a název SO/PS: SO 251.1 - Opěrné zdi

## SO 251

Číslo a název rozpočtu: SO 251.1 - Opěrné zdi

## celkem

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		<p>položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)</li> <li>- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (troubky, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav</li> <li>- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr</li> <li>- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu</li> <li>- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.</li> <li>- úprava vstupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výusti</li> <li>- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky</li> <li>- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí</li> <li>- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapáženém i nezapáženém a i v kolektorech, chráničkách</li> <li>- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody</li> </ul>											
43	89914	ŠACHTOVÉ BETONOVÉ SKRUŽE SAMOSTATNÉ	KUS	64,000	64,000	0,000	2 418,39	154 776,96	0,00	0,00	154 776,96	0,00	0,00%
		16*4=64,000 [A]											
		- Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením											
	9	Ostatní konstrukce a práce						3 571 046,05	0,00	0,00	3 571 046,05	0,00	0,00
44	9117C1	SVOD OCEĽ ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	309,100	309,100	0,000	8 269,70	2 556 164,27	0,00	0,00	2 556 164,27	0,00	0,00%
		309,10=309,100 [A]											
		<p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích a diltačních prvků</li> <li>- montáž a osazení svodidla, kotvení, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a závluku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak, případně nivelační hmoty pod kotevní desky</li> <li>- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr</li> <li>- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření</li> </ul>											
45	917223	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM	M	33,880	33,880	0,000	424,69	14 388,50	0,00	0,00	14 388,50	0,00	0,00%





## Rozpis ocenění Změn položek - celkem

## ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

Evidenční číslo a název stavby: 2017 - 395 - II/101 Dolní Břežany - Zbraslav - havárie

Číslo a název SO/PS: SO 251.1 - Opěrné zdi

Číslo a název rozpočtu: SO 251.1 - Opěrné zdi

## SO 251

## celkem

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
47	966128	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA SUCHO S ODVOZEM DO 20KM bourání gabionů v rámci hlavního výkopu včetně uložení na skládce 444,0=444,000 [A]	M3	444,000	444,000	0,000	2 233,17	991 527,48	0,00	0,00	991 527,48	0,00	0,00%
		položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů											
	N	<b>Nové položky</b>											
	2	Základy						0,00	0,00	4 397 040,00	4 397 040,00	4 397 040,00	1,00
48	26175.N	VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVR TR I A II D DO 300MM SOD ZBV 1 Připčet podle Formuláře pro ohlášení změn stavby č.1 1736+496=2 232,000 [A] j.c. podle OTSKP 2021	M	0,000	2 232,000	2 232,000	1 970,00	0,00	0,00	4 397 040,00	4 397 040,00	4 397 040,00	100,00
		položka zahrnuje: přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav svíslou dopravu zeminy z vrtu vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé											
	C	<b>Celkem</b>						31 471 725,86	- 2 190 730,32	4 397 040,00	33 678 035,54	2 206 309,68	- 1,00

**FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY Č.1  
„II/101 Dolní Břežany – Zbraslav - havárie“**

Určeno: Ing. Jan Lichtneger, ředitel KSÚS Sk, p.o.

Číslo SoD: S-2537/00066001/2021

Termín plnění: 7.3.2022 – 6.12.2022 (9 měsíců)

Celková cena díla: 54 776 990,56 Kč bez DPH

Zhotovitel: Skanska a.s., Křížíkova 682/34a, Praha 8 - Karlín

IČ: 26271303

Oprávněná osoba: Jiří Červenka

Telefonní spojení: 737257423

**Popis předmětu informace:** změna během výstavby podle aktuálního stavu na trhu se stavebním materiálem a jeho dostupnosti

**Popis problému:** Z důvodu válečného konfliktu na území Ukrajiny a sankcím EU a ČR vůči Rusku a tím způsobenému nedostatku resp. úplné nedostupnosti ocelových profilů do mikropilot (bezešvé trubky průměr 108/16 z oceli S355) jsou výše uvedené ocelové trubky nahrazeny válcovanými profily HEB 140 z oceli S235JR. S touto náhradou ocelové části mikropilot je nutné zvětšení vrtů z průměru D 150 mm na průměr D 250mm (projekčně zpracováno jako aktualizace RDS a odsouhlaseno AD).

**Čeho se zhotovitel domáhá:** Zhotovitel uplatňuje změnu položky:

SO 201 pol.17 26174 Vrtý pro kotvení, injektáž mikropilot na povrchu tř I a II do D 200 mm  
SO 201 pol.18 26184 Vrtý pro kotvení, injektáž mikropilot na povrchu tř III a IV do D 200 mm  
SO 251 pol.10 26174 Vrtý pro kotvení, injektáž mikropilot na povrchu tř I a II do D 200 mm  
SO 251 pol.11 26184 Vrtý pro kotvení, injektáž mikropilot na povrchu tř III a IV do D 200 mm

na položku

26175 Vrtý pro kotvení, injektáž mikropilot na povrchu tř. I a II do D 300 mm  
(OTSKP 2021)

**Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla: 27.4.2022**

**Datum, podpis oprávněné osoby**

**Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele:**

V Říčanech  
27. 04. 2022  
Evidenční číslo:  
Číslo jednací:

Vážený pan  
Jiří Červenka  
Skanska a.s.  
Křižíkova 682/34a  
Praha 8 - Karlín

**Věc: II/101 Dolní Břežany – Zbraslav - havárie - Ohlášení změn během výstavby**

Dobrý den,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o. (dále jen KSÚS), jako investor akce „II/101 Dolní Břežany – Zbraslav - havárie“ je seznámena se žádostí o zpracování ZBV jehož předmětem je:

- Po očištění skalního masivu od vegetace bylo zjištěno větší rozvolnění skály než se předpokládalo v původní PD. Aby bylo možné skálu zabezpečit sítěmi (kotvami), musela být tato rozvolněná část skály odstraněna až na soudržnou horninu. Z tohoto důvodu došlo k navýšení objemu odbourané hmoty skalního masivu (zvětralé části). Dále došlo k navýšení plochy opláštění z geomřížovin a redukci svorníků a vrtů.
- Z důvodu odlehčení objízdnych tras prováděné stavby a z důvodu návaznosti na další stavby prováděné v okolí bude po dohodě s ŘSD ČR Praha dočasně zprovozněny MUK Písnice na D0. Před zprovozněním pro účely objízdny trasy je nutné provést opatření na vodorovném dopravním značení žlutou folií na MUK Písnice a osazení svíslého DZ na MUK a dalších místech, která jsou součástí objízdnych tras prováděné stavby.
- Z důvodu válečného konfliktu na území Ukrajiny a sankcím EU a ČR vůči Rusku a tím způsobenému nedostatku resp. úplné nedostupnosti ocelových profilů do mikropilot (bezešvé trubky průměr 108/16 z oceli S355) jsou výše uvedené ocelové trubky nahrazeny válcovanými profily HEB 140 z oceli S235JR. S touto náhradou ocelové části mikropilot je nutné zvětšení vrtů z průměru D 150 mm na průměr D 250mm (projekčně zpracováno jako aktualizace RDS a odsouhlaseno AD).

KSÚS bere na vědomí, že zhotovitel nemohl v době zadávací lhůty soutěže předvídat výskyt těchto okolností, a proto KSÚS žádá zhotovitele společnost Skanska a.s. o vypracování Změnových listů, a to v souladu se směrnici KSÚS, která je nedílnou součástí Smlouvy o dílo.



*Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IČ 00066001,  
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11*

---

Tyto ZBV budou následně projednány a podrobně posouzeny supervizorem zakázky, následně budou posouzeny vedením KSÚS.

S pozdravem

Ing. Jan Lichneger  
Ředitel KSÚS



## Vyjádření Königfrankstahl

**From:** Gattnar, Jiří >  
**Sent:** Thursday, April 28, 2022 1:28 PM  
**To:** Svoboda, Jaroslav <  
**Subject:** FW: Vyjádření Königfrankstahl - hutních materiálů - II/101 Dolní Břežany - Zbraslav - 19.4.2022  
**Importance:** High

**From:** Milan Moravec <  
**Sent:** Tuesday, April 19, 2022 12:25 PM  
**To:** Gattnar, Jiří <  
**Subject:** Vyjádření Königfrankstahl - hutních materiálů - II/101 Dolní Břežany - Zbraslav - 19.4.2022  
**Importance:** High

[EXTERNÍ EMAIL] Prosím buďte opatrní, než na cokoliv kliknete.

Dobrý den, pane Gattnare,

poptávané Vám bohužel nemůžeme nabídnout.

S přáním pěkného dne

Milan Moravec

**KÖNIGFRANKSTAHL**

KÖNIGFRANKSTAHL, s.r.o.

Vratimovská 624/11 | 718 00 Ostrava - Kunčičky | Česká republika

[www.ocel.cz](http://www.ocel.cz) | [www.thesteel.com](http://www.thesteel.com)

E:

T:

### UPOZORNĚNÍ

Informace obsažené v tomto e-mailu a všech připojených souborech jsou důvěrné, mohou být chráněny zákonem a jsou určeny výlučně příjemci. Nejste-li zamýšleným příjemcem, je zakázáno jakékoliv zveřejňování, zprostředkování nebo jiné použití těchto informací. Obdrželi jste e-mail neoprávněně, informujte o tom prosím odesílatele a vymažte neprodleně všechny kopie tohoto e-mailu i všech jeho příloh.

**From:** Gattnar, Jiří  
**Sent:** Tuesday, April 19, 2022 11:06 AM  
**Subject:** Cenová poptávka hutních materiálů - II/101 Dolní Břežany - Zbraslav - 19.4.2022  
**Importance:** High

General / Obecné

Dobrý den,

chtěli bychom Vás zdvořile požádat o zaslání cenové nabídky na:

**Trubka bezešvá 108/16 jakost S355**

dl. 4,0m – 120 ks – 480m

dl. 4,5m – 368 ks – 1656m

dl. 5,0m – 120 ks – 600 m

**ALTERNATIVA:**

**Tyče profilu HEB 140 jakost S235JR**

dl. 4,0m – 120 ks – 480m

dl. 4,5m – 368 ks – 1656m

dl. 5,0m – 120 ks – 600 m

Místo dodání Dolní Břežany

Termín dodání čím jak nejdříve.

Děkujeme za rychlou zpětnou vazbu a to nejlépe do zítřka 20.4.2022.

S pozdravem

**Jiří Gattnar**

Vedoucí oddělení Nákup / Head of Procurement Department

Skanska a.s.

divize Pozemní stavitelství SCE

závod Pozemní stavitelství

[www.skanska.cz](http://www.skanska.cz)

Nad Tyrkou 101

73961 Třinec

Česká republika / Czech Republic

Mobil



**Stavíme svět,  
ve kterém sami  
chceme žít**

## Vyjádření Unitube

**From:** Gattnar, Jiří <J>  
**Sent:** Thursday, April 28, 2022 1:25 PM  
**To:** Svoboda, Jaroslav ·  
**Subject:** FW: Vyjádření Unitube - hutních materiálů - II/101 Dolní Břežany - Zbraslav - 19.4.2022

General / Obecné

Dobrý den, pane Svobodo,

zasílám vyjádření k poptávce od polské společnosti Unitube.  
S pozdravem

Jiří Gattnar

**From:** Mariusz Kopyra \_\_\_\_\_  
**Sent:** Wednesday, April 20, 2022 8:55 AM  
**To:** Gattnar, Jiří · \_\_\_\_\_  
**Subject:** Vyjádření Unitube - hutních materiálů - II/101 Dolní Břežany - Zbraslav - 19.4.2022

[EXTERNÍ EMAIL] Prosím buďte opatrní, než na cokoliv kliknete.

Dobrý den,  
bohužel nemůžeme učinit nabídku z důvodu nemožnosti přepravy z Bialursi, kde trubku 108,0x16,0  
objednáno.

S pozdravem

**Mariusz Kopyra**  
Sales Director



-----  
Tel.  
Mobile  
Fax.  
e-mail:

## Vyjádření VanLeeuwen

**From:** Gattnar, Jiří  
**Sent:** Thursday, April 28, 2022 1:27 PM  
**To:** Svoboda, Jaroslav  
**Subject:** FW: CN VanLeeuwen - Skanska CZ hutních materiálů - II/101 Dolní Břežany - Zbraslav - 20.4.2022

General / Obecné

A tady ještě vyjádření od společnosti Vanleeuwen

**From:** Palicka, K.  
**Sent:** Wednesday, April 20, 2022 7:48 AM  
**To:** Gattnar, Jiří  
**Cc:** Oplocka, J. <>; Ūrdova, K.  
**Subject:** CN VanLeeuwen - Skanska CZ hutních materiálů - II/101 Dolní Břežany - Zbraslav - 20.4.2022

[EXTERNÍ EMAIL] Prosím buďte opatrní, než na cokoliv kliknete.

Dobrý Den Pane Gattnar

Po prověření skladových možností i alternativ možných náhrad nabízíme níže uvedené trubky

Ocelové trubky bezešvé, EN 10210, S355J2H

108x 16 mm x výrobní délky cca 12,18 m – množství = cca 60,66 m – to je cca 2.201,95 kg

Cena: 59,90 CZK/kg to je 2.174,40 CZK/m FCA náš sklad

Termín dodání od závazné objednávky – v současné době cca 10 pracovních dní

---

---

Ocelové trubky bezešvé, EN 10210, S355J2H

108x 14,2 mm x výrobní délky cca 12 m - množství cca 8 ks = cca 96 m – to je cca 3.153,60 kg

Cena: 58,90 CZK/kg to je 1.934,90 CZK/m FCA náš sklad

Termín dodání od závazné objednávky – v současné době cca 10 pracovních dní

---

---

Ocelové trubky bezešvé, EN 10210, S355J2H

108x 12,5 mm x výrobní délky cca 12 m - 12,17 m - množství cca 24 ks = cca 292 m – to je cca 8.584,80 kg

Cena: 58,90 CZK/kg to je 1.731,70 CZK/m FCA náš sklad

Termín dodání od závazné objednávky – v současné době cca 10 pracovních dní

---

---

Ocelové trubky bezešvé, EN 10210, S355J2H

108x 10 mm x výrobní délky cca 12 m - množství cca 12 ks = cca 144 m – to je cca 3.480,48 kg

Cena: 58,90 CZK/kg to je 1.423,62 CZK/m FCA náš sklad

Termín dodání od závazné objednávky – v současné době cca 10 pracovních dní

Cena dopravy = bude stanovena dle objednaného množství a místa dodání v CZ

Fakturace v CZK/m

Atest 3.1 = 130,- CZK/ks

Platnost nabídky: do 21.4.2022, s výhradou meziprodeje

“Veškeré nabídky podléhají konečnému potvrzení ze strany společnosti Van Leeuwen – ze strany prodávajícího”

Prosím Vás o zpětnou reakci a vaše vyjádření.

K vašim dalším požadavkům nebo případným dotazům jsem Vám plně k dispozici.

S úctou a přátelským pozdravem

S pozdravem

**Bc. Kamil Palička**  
Obchodní zástupce / Sales Representative  
Divize průmysl / Industry division

**VAN LEEUWEN**



Van Leeuwen Pipe and Tube, s.r.o.  
Krátká 753/3b  
682 01 Vyškov  
Česká republika / Czech Republic  
DIČ: / VAT: CZ27406873

M  
F  
E

[www.vanleeuwen.com](http://www.vanleeuwen.com)





**From:** Gattnar, Jiří <[gi.gattnar@skanska.cz](mailto:gi.gattnar@skanska.cz)>  
**Sent:** Tuesday, April 19, 2022 11:06 AM  
**Subject:** Cenová poptávka hutních materiálů - II/101 Dolní Břežany - Zbraslav - 19.4.2022  
**Importance:** High

Dobrý den,

chtěli bychom Vás zdvořile požádat o zaslání cenové nabídky na:

**Trubka bezešvá 108/16 jakost S355**

dl. 4,0m – 120 ks – 480m  
dl. 4,5m – 368 ks – 1656m  
dl. 5,0m – 120 ks – 600 m

**ALTERNATIVA**

**Tyče profilu HEB 140 jakost S235JR**

dl. 4,0m – 120 ks – 480m  
dl. 4,5m – 368 ks – 1656m  
dl. 5,0m – 120 ks – 600 m

Místo dodání Dolní Břežany

Termín dodání čím jak nejdříve.

Děkujeme za rychlou zpětnou vazbu a to nejlépe do zítřka 20.4.2022.

S pozdravem

**Jiří Gattnar**

Vedoucí oddělení Nákup / Head of Procurement Department

Skanska a.s.

divize Pozemní stavitelství SCE

závod Pozemní stavitelství

[www.skanska.cz](http://www.skanska.cz)

Nad Tyrkou 101

73961 Třinec

Česká republika / Czech Republic

Mobil



Firma : J.Holenda s.r.o.

Narysov 70

261 01 Příbram

IČ :28910176

DIČ : CZ28910176

Hýča s.r.o.

Žitná 1656/45

110 00 Praha 1

Na základě Vaší poptávky na trubku 108/16 v množství 2400m Vám sdělujeme ,že v požadovaném termínu nejsme schopni tento material zajistit .

Navrhujeme nahradit tuto trubku profilem HEB 140 .

S pozdravem

V Narysově 14.4.2022

Holenda Jan

GeoTec-GS, a.s.  
Chmelová 2920/6  
106 00 Praha 10

**Krajská správa a údržba silnic  
Středočeského kraje, příspěvková organizace**

Ing. Aleš Čermák MBA  
Zborovská 81/11  
150 00 Praha 5 - Smíchov

Váš dopis značky / ze dne

naše značka  
22/1217/FD

vyřizuje / telefon  
Mgr. Filip Dudík

dne:  
3.8.2022

**Věc: II/101 Dolní Břežany - Zbraslav  
Vyjádření AD č. 2**

**Číslo smlouvy objednatele: 146/00066001/2017**

**Číslo zakázky Zhotovitele: GTC/2017/395**

Vážený pane řediteli,

dne 4.7.2022 obdržel elektronicky AD od zhotovitele výše uvedené stavby návrh ZBV č. 1, který řeší změny v provádění základu z mikropilot rámci SO 251.

V rámci PDPS byly navrženy mikropiloty do vrtu průměru 150mm a vystrojené bezešvými trubkami.

Dne 30. 6. 2022 AD byl TDS informován o záměru zhotovitele nahradit bezešvé trubky mikropilot za válcované profily HEB 140. Změna je vynucena nedostupností původně navrženého výrobku (bezešvých trubek) na trhu, zřejmě zejm. v důsledku válečného konfliktu na Ukrajině s průvodním narušením dodavatelsko-odběratelských vztahů. Změna rovněž obnáší zvětšení průměru vrtů ze 150 na 250 mm.

Z pozice AD sdělujeme, že náhrada bezešvé trubky profilem HEB pro mikropiloty je možná a že z hlediska záměru, sledovaného návrhem v PDPS, se jedná o ekvivalentní řešení.

AD souhlasí s předloženým návrhem ZBV č. 1.

S pozdravem

Mgr. Filip Dudík  
ředitel společnosti

# BUNG

BUNG CZ s. r. o.  
V Olšínách 2300/75  
100 00 Praha 10 – Strašnice  
Mobil:  
E-Mail  
www.bung.cz  
info@bung.cz

Věc: „II/101 Dolní Břežany - Zbraslav – havárie“ – souhlasné vyjádření k ZBV č.1

## ZBV 1 - SO 251.1 - Opěrné zdi

Obsahem stavebního objektu SO 251 je zajištění stability zemního tělesa a z důvodu osazení nezbytného zádržného systému komunikace jsou lokálně v místech souběhu s potokem vybudovány opěrné zdi. Opěrné zdi jsou železobetonové. Mají proměnnou výšku podle geometrie komunikace a jejich založení je lokálně zesíleno mikropilotami, pro jejichž zhotovení projekt předpokládal použití bezešvých trubek průměru 108/16 z oceli S355.

Z důvodu válečného konfliktu na území Ukrajiny a sankcím EU a ČR vůči Rusku a tím způsobenému nedostatku resp. úplné nedostupnosti ocelových profilů do mikropilot (bezešvé trubky průměr 108/16 z oceli S355) jsou výše uvedené ocelové trubky nahrazeny válcovanými profily HEB 140 z oceli S235JR. S touto náhradou ocelové části mikropilot je nutné zvětšení vrtů z průměru D 150 mm na průměr D 250mm (projekčně zpracováno jako aktualizace RDS a odsouhlaseno AD).

Zhotovitelem předložené ocenění položek ZBV č.1 má TDS jako přiměřené a v daném místě obvyklé v hodnotách se sumární cenou položkového rozpočtu 2 206 309,68 Kč bez DPH.

Jedná se o Změnu nepodstatnou, nepředvídanou, která je tak podle § 5, odst. 1 písm. c), resp. podle § 10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29. 05. 2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná o změnu nepředvídanou.

TDS souhlasí předloženým návrhem ZBV č. 1

Toto souhlasné stanovisko nezbavuje zhotovitele povinnosti doložit cenu položek dle zásad pro procesování ZBV.

Bc. Jakub Slánský  
TDS



## Zápis z 3.kontrolního dne stavby II/101 Dolní Břežany-Zbraslav-havárie

**Kontrolní den**  
 číslo 3 konaný dne 07.04.2022

**Účastníci**  
 Viz. prezenční listina

**Program kontrolního dne**

1. Kontrola úkolů a prací
2. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby:
  - a) plnění věcného harmonogramu
  - b) popis provedených prací
  - c) finanční plnění
  - d) fotodokumentace
3. Kontrola kvality
4. Stav BOZP a PO
5. Různé
6. Nové úkoly

**1. Kontrola úkolů a prací**

Úkol číslo	Název	Skutečný stav plnění úkolu	Splněno
0/1	Rozhodnutí o mimořádném postupu	SO 04 Úsek 12A – vydáno dne 01.12.2021 Pro ostatní objekty – vydáno dne 16.03.2022	ANO
0/4	DIR	Bude řešen na základě „Rozhodnutí o mimořádném postupu“ pro SO 04 Úsek 12A. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vydán na dobu 60 dní (havárie)</li> <li>- stavba musí požádat o DIR do konce stavby</li> <li>- V koordinaci s TSK a ŘSD se řeší možnost otevření MUK Písnice</li> <li>- <b>Podána žádost na MD a MÚ Černošice</b></li> </ul>	Trvá
0/5	HMG	Zhotovitel provede aktualizaci HMG a doplní finanční HMG <ul style="list-style-type: none"> <li>- Finanční HMG předložen</li> <li>- Předložena aktualizace HMG ke dni 23.03.2022</li> </ul>	ANO ANO
0/6	RDS	Bude zpracovávána a předkládána postupně před zahájením prací na objektu. <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Odsouhlasen koncept SO 001, SO 201 a SO 251-1</b></li> </ul>	Trvá
0/9	Měření dronem	Měření proběhlo. Provádí se vyhodnocení.	Probíhá
1/11	ZBV SO 04	Na základě MŠ byl konstatován větší rozsah čištění stálího svahu, <b>větší rozsah opláštění z geomřížovin</b> a dále byl redukován rozsah svorníků na 4 ks oproti PD. Stavba předloží návrh ZBV 1	Trvá
2/12	Odkup materiálu	Na základě SOD stavba předloží návrh na odkup vybouraného materiálu: <ul style="list-style-type: none"> <li>- frézované asfalty</li> <li>- svodidla</li> <li>- dřevo</li> </ul>	Trvá

**Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby**

- |                                |   |
|--------------------------------|---|
| a) plnění věcného harmonogramu | Stavba probíhá dle HMG  |
| b) popis provedených prací     | SO 101.1<br><ul style="list-style-type: none"> <li>- vyfrézováno</li> </ul> SO 251.1<br><ul style="list-style-type: none"> <li>- těžba zeminy na základovou spáru</li> </ul> SO 04: |

c) finanční plnění  
d) fotodokumentace

- výkopy pro základy palisád  
- kotvení sítí  
Předložen a odouhlasen soupis prací za březen 2022  
průběžně

### 3. Kontrola kvality

a) zpráva o hodnocení kvality za uplynulé období

b) odsouhlasené materiály a TePř+KZP

TePř 01 Sanace skalního svahu – schválen, bude předložen dodatek  
TePř 02 Bourací práce – demolice mostu – předložen koncept  
TePř 03 Most a OZ, betonáž – předložen koncept  
TePř 04 Komunikace – předložen koncept  
TePř 05 Most, zásypy přechodové oblasti – předložen koncept  
TePř 06 Frézování - schválen  
  
KZP 01 Sanace skalního svahu– schválen  
KZP 03 Most a OZ, betonáž – předložen koncept  
KZP 04 Komunikace – předložen koncept  
KZP 05 Most, zásypy přechodové oblasti – předložen koncept

### 4. Stav BOZP

Viz stavební deník

### 5. Různé

Stavba upozornila na nedostupnost bezešvých trubek pro mikropilotáž na globálním trhu.

### 6. Nové úkoly

Úkol číslo	Název	Obsah úkolu a požadovaný cílový stav	Odpovídá	Termín
3/13	SO 201 – mostní křídlo	Na základě místních poměrů a možnosti ponechání tří vzrostlých stromů TDS požaduje prověřit možnost zkrácení případně vyvěšení křídla	stavba	ANO

### 7. Závěr

Datum konání příštího KD 21.04.2022 od 10.00 hod. **příjezd od Dolních Břežan**

Zapsala

Bc. Jakub Slánský  
TDS

Podpis

### Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby: <b>2017 - 395, II/101 Dolní Břežany - Zbraslav - havárie</b> Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>SO 180 – Přechodné dopravní značení</b>	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: <b>180/1</b>	Číslo ZBV: <b>2</b>
---	---	------------------------

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace  
 Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov  
 IČ: 00066001

Zhotovitel: Skanska, a.s.  
 Křížkova 682/34a, 186 00 Praha 8 - Karlín  
 IČ:26271303

#### Rekapitulace ZBV č. 2 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.3	0,00	1 329 758,64	1 329 758,64

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
<b>2</b>	<b>0,00</b>	<b>1 329 758,64</b>	<b>1 329 758,64</b>

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.  
 Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy  
 a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list	Číslo paré:
------------------	-------------



## Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: <b>2017 - 395, II/101 Dolní Břežany - Zbraslav - havárie</b> Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>SO 180 – Přechodné dopravní značení</b>	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: <p style="text-align: center;"><b>180/1</b></p>	Číslo ZBV: <p style="text-align: center;"><b>2.3</b></p>
---	--	---

Strany smlouvy o dílo objednatel č.:S-2537/00066001/2021 a zhotovitele č.10000156093 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 11.11.2021 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: Skanska, a.s., Křížkova 682/34a, 186 00 Praha 8 - Karlín

Přílohy Změnového listu:	Paré č.	Příjemce
1. Krycí list	1, 2	Objednatel
2. Změnový list	3	Zhotovitel
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	4	Projektant (AD)
4. Rozpis ocenění Změn položek	5	Stavební dozor
5. Přehled zařazení změn do skupin		
6. Přehled dalších dokladů		
Další doklady dle přehledu dokladů	35	počet listů

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny: **Dočasné zprovoznění MÚK Písnice na D0 a uzavírka ulice Komoňanská**

V rámci zadávací dokumentace bylo předmětem tohoto stavebního objektu osazení přechodného dopravního značení pro vyznačení uzavírky silnice II/101 v úseku stavby a návrh náhradní objízdné trasy. Objízdná trasa byla navržena z Dolních Břežan po silnici III/10115 do Zvole, po silnici III/1043 do Vraného nad Vltavou a dále do Zbraslavi.

Z důvodu nesouhlasu oddělení dopravy ÚMČ Praha 16, místostarosta ÚMČ Praha 12, DPP a přílehlých obcí Dolní Břežany a Ohrobec s navrženým řešením (při souběhu dopravních opatření v ul. Komoňanská), při němž by mj. nebylo zajištěno dopravní spojení Zbraslav-Komoňany pro linky MHD, byl na základě požadavku odboru dopravy a po dohodě s ŘSD ČR Praha podle návrhu KSÚS SK dočasně zprovozněn MUK Písnice na D0 (viz doklad č.10 - Vyjádření k uzavírce a doklad č. 11 - Kolaudační rozhodnutí).

Před jeho zprovozněním pro účely objízdné trasy bylo nutné provést opatření na vodorovném dopravním značením (žlutou folii na MUK Písnice), osazení svislého DZ a bet. svodidel na MUK a dalších místech, která jsou součástí objízdných tras prováděné stavby. Předmětem ZBV je i doplnění přechodného dopravního značení, kterým byla vyznačena uzavírka silnice II/101 v úseku stavby a náhradní objízdné trasy, z důvodu neplánované uzavírky ulice Komoňanská (viz doklad č. 13 - Úprava MUK Písnice a doklad č. 14 - Doplnění DIO).

Tato změna je vyjádřena smluvními položkami 2, 3, 4 a zvyšuje smluvní cenu stavby o 1 329 758,64 Kč bez DPH.

Jedná se o Změnu nepodstatnou, nepředvídanou, která je tak podle § 5, odst. 1 písm. c), resp.podle § 10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29. 05. 2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do **Skupiny 3**. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222. odst. 6) se jedná o změnu nepředvídanou.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
<b>0,00</b>	<b>1 329 758,64</b>	<b>1 329 758,64</b>	<b>1 329 758,64</b>

**Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:**

Zhotovitel (stavbyvedoucí): Skanska, a.s.	jméno	Ing. Jaroslav Svoboda	datum	podpis
Projektant (autorský dozor): GeoTec-GS, a.s.	jméno	Mgr. Filip Dudík	datum	podpis
Stavební dozor: BUNG CZ, s.r.o.	jméno	Bc. Jakub Slánský	datum	podpis
Supervize (Regionální dotační kancelář)	jméno	xxx	datum	podpis
Zástupce Objednatel: KSÚS	jméno	Ing. Martin Staněk	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitel sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněně jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel)	jméno	Ing. Jan Fidler, DiS.	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	Jiří Červenka	datum	podpis
				Číslo paré:

**ZÁPIS**

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)  
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 2**

Název Stavby:	2017 - 395, II/101 Dolní Břežany - Zbraslav - havárie
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	180/1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	SO 180 – Přechodné dopravní značení

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
335 034,80

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	335 034,80	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	1 329 758,64	1 329 758,64	396,90%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	0,00	1 664 793,44	1 329 758,64	396,90%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): Ing. Jaroslav Svoboda  
Skanska, a.s. souhlasím

Projektant (autorský dozor): Mgr. Filip Dudík  
GeoTec-GS, a.s. souhlasím

Stavební dozor: Bc. Jakub Slánský  
BUNG CZ, s.r.o. souhlasím

Zástupce Objednatele KSÚS: Ing. Martin Staněk  
souhlasím

Zaměstnanec KSÚS  
odpovědný za cenové  
projednání Změny: Ing. Jaroslava Jurková  
souhlasím

## Rozpis ocenění Změn položek - celkem

Evidenční číslo a název stavby: 2017 - 395 - II/101 Dolní Břežany - Zbraslav - havárie

## ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

Číslo a název SO/PS: SO 180 - Přechodné dopravní značení

SO 180/1

Číslo a název rozpočtu: SO 180 - Přechodné dopravní značení

Skupina změn 3

Pof. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		<b>Nové položky</b>											
2	02720a.N	POMOC.PRÁCE ZŘÍZ.NEBO ZAJIŠŤ.REGULACI A OCHRANU DOPRAVY j.c. podle CN Proznak (doklady č.12, 13, 14) + VR+SR+ZISK=(846367+46012+183571,12)*1,15=1 237 342,64	KPL	0,000	1,000	1,000	1 237 342,64	0,00	0,00	1 237 342,64	1 237 342,64	1 237 342,64	100,00%
3	911FC2.N	SVODIDLO BETON ÚROVEŇ ZADRŽ.H2 VÝŠ.1,2M - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY) j.c. podle OTSKP 2021	M	0,000	64,000	64,000	704,00	0,00	0,00	45 056,00	45 056,00	45 056,00	100,00%
4	911FC3.N	SVODIDLO BETON ÚROVEŇ ZADRŽ.H2 VÝŠ.1,2M - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM j.c. podle OTSKP 2021	M	0,000	64,000	64,000	740,00	0,00	0,00	47 360,00	47 360,00	47 360,00	100,00%
		<b>Celkem</b>							<b>0,00</b>	<b>1 329 758,64</b>		<b>1 329 758,64</b>	

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.  
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing.Jaroslav Svoboda - hlavní stavbyvedoucí

Za Objednatele: Bc. Jakub Slánský - stavební dozor

Datum:

Datum:

Podpis:

Podpis:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: 2017 - 395 - II/101 Dolní Břežany - Zbraslav - havárie a 2019 - 113, II/101 Břežanské údolí, sanace skalních svahů

1	Přijaté smluvní částka bez rezervy a DPH	54 776 890,89
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	58 313 056,88
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	70 558 801,24
3=(3/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	106,46%
4=(26/1)*100	Středování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	Středování změných položek (Skupina 2)	0,00%
40=(19/1)*100	Středování limitů 10 % pro pozastavenou změnu pro Změny záporné dle § 14, odst. (8), zák. č. 134/2016 Sb.	-4,00%

6=32+38	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	3 536 088,32
7=6/100	Středování limitu 10 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	6,46%
8=103	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	16 433 097,17

9=(22A/1)*100	Středování limitu 50 % Skupina 3	2,43%
10=(26A/1)*100	Středování limitu 50 % Skupina 4	12,03%
16A=(32A+38A)	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	7 517 528,96
11=10/5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	27 386 495,28

12=(17/5)*10	Limit	8 218 548,38
13=(24/1)	Středování limitu (15%)	0,00%
14=(185/27)+(28/1)	Hodnota skupiny 5	0,00

SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	- 1 -		- 2 -		- 3 -				- 4 -			- 5 -						
						Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Limit 10 %				
16	17	18	19=23+26+28+30	20=24+27+30+34+37+38	21=19+20	22	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	32=29+31	32A+38B(25)+26	33	34	36=33+34	38A+38B(32)+34	37	38	39=38B(17)+38	
		2017 - 395 - II/101 Dolní Břežany - Zbraslav - havárie a 2019 - 113, II/101	-2 150 730,32	6 726 798,64	3 536 088,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 228 788,64	1 329 758,64	1 329 758,64	-2 150 730,32	6 397 046,00	2 308 206,68	6 687 770,00	0,00	0,00	0,00	
251	1	Opěrná zděň Zámečného mlýnavojlet a přímáru vřtu	-2 180 730,32	4 367 040,00	2 308 206,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 180 730,32	4 367 040,00	2 308 206,68	6 587 770,00	0,00	0,00	0,00	
180	2	Přilohová doplně zvědně Dobrobně zprávozděně MUK Písnice na DO a úpravěho úřadu Komátořanské	0,00	1 329 758,64	1 329 758,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 228 788,64	1 329 758,64	1 329 758,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Poznámka: Formulář má (normalní) charakter a zobrazuje stav k datu přehledu Změnového listu.



## Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	2
Název a evidenční číslo stavby:	<b>2017 - 395, II/101 Dolní Břežany - Zbraslav - havárie</b>
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 180 – Přejídné dopravní značení
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	180/1

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
07 Soupis prací SO po změnách	1	
08 Oznámení Zhotovitele	2	
09 Pokyn Objednatele	2	
10 Vyjádření k uzavírce (Břežanského údolí)	4	
11 Kolaudační rozhodnutí (MÚK Břežany)	4	
12 Cenové nabídky	7	
13 Úprava MÚK Písnice	3	
14 Doplnění DIO	5	
15 Dokumentace betonových svodidel	5	
16 Vyjádření TDI	1	
17 Vyjádření AD	1	
Počet listů celkem	35	

## Rozpis ocenění Změn položek - celkem

## ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

## SO 180

## celkem

Evidenční číslo a název stavby: 2017 - 395 - II/101 Dolní Břežany - Zbraslav - havárie

Číslo a název SO/PS: SO 180 - Přechnodné dopravní značení

Číslo a název rozpočtu: SO 180 - Přechnodné dopravní značení

Pař. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	0	<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>						<b>335 034,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>335 034,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	02720	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY DIO pro realizaci stavby dle PD, rovněž DIO pro realizaci sanace skal I=1,000 [A] zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními	KPL	1,000	1,000	0,000	335 034,80	335 034,80	0,00	0,00	335 034,80	0,00	0,00%
	N	<b>Nové položky</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 237 342,64</b>	<b>1 237 342,64</b>	<b>1 237 342,64</b>	<b>1,00</b>
	0	<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 237 342,64</b>	<b>1 237 342,64</b>	<b>1 237 342,64</b>	<b>1,00</b>
2	02720	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY DIO pro dočasné zprovoznění MÚK Písnice na D0 a neplánovanou uzavírku ulice Komořanská SOD ZBV 2 I=1,000 [A] j.c. podle CN Proznak (doklad č.12 - Cenové nabídky) + VR+SR+ZISK (846367+46012+183571,12)*1,15=1 237 342,64 zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními	KPL	0,000	1,000	1,000	1 237 342,64	0,00	0,00	1 237 342,64	1 237 342,64	1 237 342,64	100,00%
	9	<b>Ostatní konstrukce a práce</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92 416,00</b>	<b>92 416,00</b>	<b>92 416,00</b>	<b>2,00</b>
4	911FC2.N	SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,2M - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DOBÁVKY) Dočasné zprovoznění MÚK Písnice na D0 SOD ZBV 2 Nájezdové rampy MÚK - zpětná montáž: 64=64,000 [A],...podle položky 3 j.c. podle OTSKP 2021 položka zahrnuje: - dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky - jeho montáž a osazení na určeném místě - nutnou opravu poškozených částí - případnou náhradu zničených částí nezahrnuje podkladní vrstvu	M	0,000	64,000	64,000	704,00	0,00	0,00	45 056,00	45 056,00	45 056,00	100,00%
3	911FC3.N	SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,2M - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM Dočasné zprovoznění MÚK Písnice na D0 SOD ZBV 2 Nájezdové rampy MÚK - odstranění bet.svodidel: 64=64,000 [A] viz doklad č. 15 - Dokumentace betonových svodidel j.c. podle OTSKP 2021 položka zahrnuje: - demontáž a odstranění zařízení - jeho odvoz na předepsané místo	M	0,000	64,000	64,000	740,00	0,00	0,00	47 360,00	47 360,00	47 360,00	100,00%
		<b>Celkem</b>						<b>335 034,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1 329 758,64</b>	<b>1 664 793,44</b>	<b>1 329 758,64</b>	<b>3,00</b>



FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY č.2  
„II/101 Dolní Břežany – Zbraslav - havárie“

Určeno: Ing. Jan Lichtneger, ředitel KSÚS Sk, p.o.

Číslo SoD: S-2537/00066001/2021

Termín plnění: 7.3.2022 – 6.12.2022 (9 měsíců)

Celková cena díla: 54 776 990,56 Kč bez DPH

Zhotovitel: Skanska a.s., Křižíkova 682/34a, Praha 8 - Karlín

IČ: 26271303

Oprávněná osoba: Jiří Červenka

Telefonní spojení:

**Popis předmětu informace:** změna během výstavby v rámci dopravně-inženýrského opatření

**Popis problému:** Z důvodu odlehčení objízdných tras prováděné stavby a z důvodu návaznosti na další stavby prováděné v okolí bude po dohodě s ŘSD ČR Praha dočasně zprovozněn MUK Písnice na D0. Před zprovoznění pro účely objízdné trasy je nutné provést opatření na vodorovném dopravním značení žlutou folií na MUK Písnice a osazení svislého DZ na MUK a dalších místech, která jsou součástí objízdných tras prováděné stavby.

**Čeho se zhotovitel domáhá:** Zhotovitel uplatňuje uhrazení vícenákladů na provedení dopravně-inženýrského opatření

Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla: 28.4.2022

Datum, podpis oprávněné osoby

Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele:

V Říčanech

27. 04. 2022

Evidenční číslo:

Číslo jednací:

Vážený pan Jiří Červenka Skanska a.s. Křižíkova 682/34a Praha 8 - Karlín
--

**Věc: II/101 Dolní Břežany – Zbraslav - havárie - Ohlášení změn během výstavby**

Dobrý den,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o. (dále jen KSÚS), jako investor akce „II/101 Dolní Břežany – Zbraslav - havárie“ je seznámena se žádostí o zpracování ZBV jehož předmětem je:

- Po očištění skalního masivu od vegetace bylo zjištěno větší rozvolnění skály než se předpokládalo v původní PD. Aby bylo možné skálu zabezpečit sítěmi (kotvami), musela být tato rozvolněná část skály odstraněna až na soudržnou horninu. Z tohoto důvodu došlo k navýšení objemu odbourané hmoty skalního masivu (zvětralé části). Dále došlo k navýšení plochy opláštění z geomřížovin a redukcí svorníků a vrtů.
- Z důvodu odlehčení objízdných tras prováděné stavby a z důvodu návaznosti na další stavby prováděné v okolí bude po dohodě s ŘSD ČR Praha dočasně zprovozněn MUK Písnice na D0. Před zprovozněním pro účely objízdné trasy je nutné provést opatření na vodorovném dopravním značení žlutou folií na MUK Písnice a osazení svislého DZ na MUK a dalších místech, která jsou součástí objízdných tras prováděné stavby.
- Z důvodu válečného konfliktu na území Ukrajiny a sankcím EU a ČR vůči Rusku a tím způsobenému nedostatku resp. úplné nedostupnosti ocelových profilů do mikropilot (bezešvé trubky průměr 108/16 z oceli S355) jsou výše uvedené ocelové trubky nahrazeny válcovanými profily HEB 140 z oceli S235JR. S touto náhradou ocelové části mikropilot je nutné zvětšení vrtů z průměru D 150 mm na průměr D 250mm (projekčně zpracováno jako aktualizace RDS a odsouhlaseno AD).

KSÚS bere na vědomí, že zhotovitel nemohl v době zadávací lhůty soutěže předvídat výskyt těchto okolností, a proto KSÚS žádá zhotovitele společnost Skanska a.s. o vypracování Změnových listů, a to v souladu se směrnicí KSÚS, která je nedílnou součástí Smlouvy o dílo.

Tyto ZBV budou následně projednány a podrobně posouzeny supervizorem zakázky, následně budou posouzeny vedením KSÚS.

S pozdravem

Ing. Jan Lichtneger  
Ředitel KSÚS



**Obec Ohrovec**, I. Rybníku II ep. 30, 252 45 Ohrovec, IČO: 00241191  
tel./fax: 257 760 338; mobil: 736 621 921; e-mail: [info@ohrovec.cz](mailto:info@ohrovec.cz); [www.ohrovec.cz](http://www.ohrovec.cz)

Proznak Praha s.r.o.  
Pikovická 244-17  
147 00 Praha 4

Vaše značka

Naše značka:

Vyřizuje:

V Ohrobcí dne

Oh/0140/22

Hana Adamkovičová

31.01.2022

Vyjádření k uzavření Břežanského údolí

Na základě Vašeho emailu ve věci DIO II/101 Dolní Břežany sdělujeme, že zvýšeným provozem dojde k značnému zatížení zejména středu obce. Zúžené zatačky a hráz rybníku způsobují problémy s průjezdem, zejména velkým autům a kamionům.

Preferujeme proto po dobu uzavření Břežanského údolí povolení otevření sjezdu na pražský okruh.

S pozdravem

Ing. Otakar Janča  
starosta obce Ohrovec

## Micha Parizek - Proznak

---


**Od:** Martínek Jan  
**Odesláno:** pondělí 31. ledna 2022 11:42  
**Komu:** 'Micha Parizek - Proznak'; 'Štěpán Vacek'; ; 'Dostál Zdeněk 100610'  
**Předmět:** RE: DIO II/101 Dolní Břežany  
**Přílohy:** -WRD0002.jpg

Dobrý den, oddělení dopravy ÚMČ Praha 16, tak jako DP nesouhlasí se zamezením propojení linky MHD Zbraslav – Komořany (Modřany). Z hlediska celkové dopravní obslužnosti dotčených území bude asi nutné uzavírku silnice II/101 do Dolních Břežan realizovat až po skončení stávajících dopravních opatření v ul. Komořanské.  
Jan Martínek  
Ved. oddělení dopravy ÚMČ Praha 16

**From:** Micha Parizek - Proznak  
**Sent:** Monday, January 31, 2022 8:49 AM  
**To:** 'Martínek Jan' 'Štěpán Vacek' < > 'Dostál Zdeněk 100610'  
**Subject:** DIO II/101 Dolní Břežany

Dobrý den,  
chtěl bych Vás tímto požádat o Vaše vyjádření k uzavírce na silnici II/101 do Dolních Břežan. V rámci opravy vozovky a zabezpečení sesouvajícího se skalního svahu bude silnice II/101 uzavřena a bude vyznačena objíždná trasa po silnicích III/1043 a III/10115 přes obce Vrané nad Vltavou, Zvole a Ohrobec.  
Termín realizace je od 1.3.2022 do 30.11.2022.  
V příloze přikládám DIO. Detail 6A bude v termínu od 1.3. do 15.4. a detail 6B bude v termínu od 15.4. do 30.11.  
Děkuji za vyjádření.

Michal Pařízek  
Proznak Praha s.r.o.  
Píkovická 244/17,  
147 00 Praha 4  
Mob.



Tento e-mail byl zkontrolován na viry antivirovým softwarem AVG.  
[www.avg.com](http://www.avg.com)



## Micha Parizek - Proznak

---

**Od:** Kos Vojtěch (Praha 12)  
**Odesláno:** pondělí 31. ledna 2022 10:53  
**Komu:** Michá Parizek - Proznak  
**Kopie:** Řezáč Jan (Praha 12); 'Martínek Jan'; 'Stěpán Vacek';  
'Dostál Zdeněk 100610'; 'Jana Nedbalová'; 'Stěpán Vacek';  
'Dostál Zdeněk 100610'

**Předmět:** RE: DIO II/101 Dolní Břežany

Dobrý den,  
připojuji se s nesouhlasem k DP. A moc prosím, zvažte možnost otevření sjezdů z DO u Písnice (na opravu Barrandovského mostu se otevřou) a za sebe říkám, že by se měla prověřit možnost otevření sjezdu z DO (např. pro auta do 3,5t) u Komořan s využitím technického sjezdu pro ŘSD, napojení na Komořanskou.

Děkuji za pochopení,

**Ing. Vojtěch Kos**  
1. místostarosta MČ Praha 12



**MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12**  
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 12  
Generála Šišky 2375/6, 143 00 Praha 12 - Modřany  
tel.:  
mob  
[kos.vojtech@praha12.cz](mailto:kos.vojtech@praha12.cz), [www.PRAHA12.cz](http://www.PRAHA12.cz)

**From:** Dostál Zdeněk 100610  
**Sent:** Monday, January 31, 2022 10:26 AM  
**To:** Michá Parizek - Proznak  
**Cc:** Řezáč Jan (Praha 12)  
Vegard'  
'Martínek Jan'

'Jana.Nedbalova@praha.eu'  
Kos Vojtěch (Praha 12)  
'; 'Stěpán Vacek'

'Đurica

**Subject:** RE: DIO II/101 Dolní Břežany

Dobrý den,

pokud bude akce probíhat v souběhu s akcí Komořanská, tak s ní nesouhlasíme z důvodu nemožnosti zajištění dopravního spojení Zbraslav - Komořany (Modřany).

Dnes toto spojení pouze ve špičkách pracovního dne zajišťuje linka 165, kdy obousměrně provoz v ul. Komořanské řídí stavba. Mimo špičky, v sobotu i neděli je pro cestující v provozu náhradní linka X165, která projíždí jednosměrně Břežanským údolím a přes Točnou, Cholupice, Modřany a Komořany se vrací na Zbraslav. Vaše uzavírka tuto možnost ruší. Navržená objízdná trasa přes Zvole a Ohrobec je pro X165 nepřijatelná.

V rámci DIO také nemáte dořešen odklon linky 960, která projíždí Břežanským údolím v trvalém stavu.

S pozdravem

**Zdeněk Dostál**  
technický pracovník

## Micha Parizek - Proznak

---

**Od:** Dostál Zdeněk 100610  
**Odesláno:** pondělí 31. ledna 2022 10:26  
**Komu:** Micha Parizek - Proznak  
**Kopie:** Řezáč Jan (Praha 12); ; 'Ďurica Vegard';  
podatelna@ohrobec.cz; Kos Vojtěch (Praha 12); 'Martínek Jan'; 'Štěpán Vacek';

**Předmět:** RE: DIO II/101 Dolní Břežany

Dobrý den,

pokud bude akce probíhat v souběhu s akcí Komořanská, tak s ní nesouhlasíme z důvodu nemožnosti zajištění dopravního spojení Zbraslav - Komořany (Modřany).

Dnes toto spojení pouze ve špičkách pracovního dne zajišťuje linka 165, kdy obousměrně provoz v ul. Komořanské řídí stavba. Mimo špičky, v sobotu i neděli je pro cestující v provozu náhradní linka X165, která projíždí jednosměrně Břežanským údolím a přes Točnou, Cholupice, Modřany a Komořany se vrací na Zbraslav. Vaše uzavírka tuto možnost ruší. Navržená objízdná trasa přes Zvole a Ohrobec je pro X165 nepřijatelná.

V rámci DIO také nemáte dořešen odklon linky 960, která projíždí Břežanským údolím v trvalém stavu.

S pozdravem

**Zdeněk Dostál**  
technický pracovník

**Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost**  
Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9  
100610 - odd. Technologie provozu  
adresa pracoviště:  
Na Bojišti 1452/5, 120 00 Praha 2  
t  
€  
[www.dpp.cz](http://www.dpp.cz)

**From:** Micha Parizek - Proznak  
**Sent:** Monday, January 31, 2022 8:49 AM  
**To:** 'Martínek Jan' <>; 'Štěpán Vacek'

Zdeněk 100610  
**Subject:** DIO II/101 Dolní Břežany

Dobrý den,

chtěl bych Vás tímto požádat o Vaše vyjádření k uzavírce na silnici II/101 do Dolních Břežan. V rámci opravy vozovky a zabezpečení sesouvajícího se skalního svahu bude silnice II/101 uzavřena a bude vyznačena objízdná trasa po silnicích III/1043 a III/10115 přes obce Vrané nad Vltavou, Zvole a Ohrobec.

Termín realizace je od 1.3.2022 do 30.11.2022

V příloze přikládám DIO. Detail 6A bude v termínu od 1.3. do 15.4. a detail 6B bude v termínu od 15.4. do 30.11.

Děkuji za vyjádření.



Datum  
Praha, 8. dubna 2022

Č. j.:/Sp. zn.:/Typ  
MD-4630/2022-910/6

## ROZHODNUTÍ

Ministerstvo dopravy jako speciální stavební úřad ve věcech dálnic ve smyslu ustanovení § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 40 odst. 2 písm. c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů přezkoumal v kolaudačním řízení žádost o vydání kolaudačního souhlasu a v souladu s ustanovením § 122a odst. 4 stavebního zákona a § 18i vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů, vydává

### kolaudační rozhodnutí

pro stavbu „**Dálnice D0, stavba 513 Lahovice - Vestec**“ v rozsahu stavebních objektů:

- SO 111 Křižovatka Břežany, větev sever
- SO 112 Křižovatka Břežany, větev jih

Stavebník: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4, IČ: 65993390

Druh a účel stavby: novostavba, dálnice

Místo stavby: hlavní město Praha, k. ú. Cholupice, p. č. 577/81

Stavební povolení:

- Magistrát hlavního města Prahy, č. j. MHMP-470825/2006/DOP-01/Rá ze dne 12. 12. 2007

Datum a výsledek závěrečné kontrolní prohlídky: Dne 1. 3. 2022 od 9:30. Během závěrečné kontrolní prohlídky nebyly zjištěny stavební nebo technické nedostatky bránící kolaudaci stavby. Odstranění drobných nedostatků bylo provedeno a ověřeno před vydáním kolaudačního rozhodnutí.

Účel užívání stavby: mimoúrovňová křižovatka na dálnici D0 se silnicí III/0031

Speciální stavební úřad v souladu s § 122a odst. 4 stavebního zákona stanoví pro užívání stavby následující podmínky:

Stavebník při užívání stavby zajistí splnění požadavků uvedených v závazném stanovisku Hygienické stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze č. j. HSHMP 10294/2022 ze dne 16. 3. 2022 (citace kurzívou):



- a) *Případné dopravní zprovoznění před splněním podmínky č. 34 stavebního povolení bude posouzeno akustickou studií, ke které se vyjádří HSHMP a Krajská hygienická stanice Středočeského kraje. Ve studii bude vyhodnocen vliv zprovoznění stavby v prostoru městských částí Praha – Písnice, Praha – Cholutice a obce Dolní Břežany.*
- b) *Dopravní zprovoznění stavby bude pouze dočasné po dobu maximálně 9 měsíců a bude sloužit ke zjištění akustické situace vlivem zprovoznění záměru.*
- c) *Trvalé dopravní zprovoznění stavby je možné teprve po předložení protokolů, vypracovaných v souladu s § 32a zákona o ochraně veřejného zdraví, o měření hladin akustického tlaku (hluky) v nejbližších chráněných venkovních prostorách staveb (referenční místa), kterým musí být prokázáno, že jsou dodrženy hygienické limity hladiny akustického tlaku dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů, popřípadě průkaz, že po realizaci předmětné stavby nedošlo ke zhoršení akustických podmínek v dané lokalitě, tzn. provedení validních akustických měření před a po předmětných stavebních úpravách v identických místech měření. Místa měření budou konzultována s pracovníky HSHMP a Krajské hygienické stanice Středočeského kraje.*

Účastníkem řízení podle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu je:

- Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4

### Odůvodnění

Stavebník, Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4, IČ: 65993390, podal dne 4. 2. 2022 žádost o vydání kolaudačního souhlasu na stavbu „Dálnice D0, stavba 513 Lahovice - Vestec“ v rozsahu stavebních objektů SO 111 a SO 112.

Ministerstvo dopravy svým opatřením č. j. MD-4630/2022-910/2 ze dne 14. 2. 2022 oznámilo konání závěrečné kontrolní prohlídky stavby, která se konala dne 1. 3. 2022 od 9:30 v místě stavby. Během závěrečné kontrolní prohlídky nebyly zjištěny závažné stavební nebo technické nedostatky bránící vydání kolaudačního souhlasu. Speciální stavební úřad konstatoval, že před kolaudací stavby musí být zajištěno a doloženo odstranění zjištěných drobných nedostatků.

V průběhu závěrečné kontrolní prohlídky a následného jednání upozornila Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze, že je nezbytné vyčkat na vydání závazného stanoviska tohoto dotčeného orgánu. Dne 16. 3. 2022 bylo Ministerstvu dopravy doručeno závazné stanovisko Hygienické stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze č. j. HSHMP 10294/2022 ze dne 16. 3. 2022, kterým souhlasí se stavbou za předpokladu splnění stanovených podmínek. Z tohoto důvodu rozhodlo Ministerstvo dopravy ve smyslu ustanovení § 122 odst. 5 stavebního zákona svým usnesením č. j. MD-4630/2022-910/5 ze dne 17. 3. 2022 o provedení kolaudačního řízení. Doručením tohoto usnesení stavebníkovi dne 17. 3. 2022 bylo zahájeno kolaudační řízení.

Účastníky kolaudačního řízení jsou podle § 122a odst. 1 stavebního zákona pouze stavebník, vlastník stavby, není-li stavebníkem a vlastník pozemku, na kterém je stavba provedena, není-li stavebníkem a současně může-li být jeho vlastnické právo kolaudačním rozhodnutím přímo dotčeno.

V rámci kolaudačního řízení byly předloženy zejména následující doklady:

- protokoly o převzetí prací ze dne 13. 7. 2010
- dokumentace skutečného provedení stavby
- závazné stanovisko Hygienické stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze č. j. HSHMP 10294/2022 ze dne 16. 3. 2022

Speciální stavební úřad na základě provedené závěrečné kontrolní prohlídky, po vyhodnocení předložených dokladů a zohlednění předložených závazných stanovisek konstatoval, že stavba byla provedena v souladu se stavebním povolením, bez významných odchylek od ověřené projektové dokumentace, byly dodrženy obecné technické požadavky na komunikaci a další předpisy. Dne 8. 4. 2022 stavebník fotodokumentací doložil, že byly odstraněny drobné nedostatky zjištěné během kontrolní prohlídky.

Požadavky č. 2 až 4 závazného stanoviska Hygienické stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze č. j. HSHMP 10294/2022 ze dne 16. 3. 2022 převzal speciální stavební úřad do podmínek tohoto rozhodnutí. Požadavek č. 1, spočívající v dopravním uzavření MUK Břežany do doby zprovoznění obchvatu Písnice, speciální stavební úřad do podmínek rozhodnutí nepřevzal, protože tento požadavek přímo vychází z podmínky č. 34 stavebního povolení, a jedná se tedy o podmínku stanovenou již pravomocným rozhodnutím, pročež ji nelze stanovit opakovaně.

Ministerstvo dopravy **upozorňuje** na nadále platnou podmínku č. 34, bod třetí, stavebního povolení pro předmětnou stavbu, vydaného Magistrátem hlavního města Prahy, č. j. MHMP-470825/2006/DOP-01/Rá ze dne 12. 12. 2007:

*V souladu s podmínkou 21 ÚR bude stavba 513 Vestec - Lahovice věčně, technicky a časově koordinována se stavbami: „Východní obchvat Písnice“, a to tak, že do právní moci rozhodnutí povolujícího užívání stavby východního obchvatu Písnice budou připojovací a odpojovací větve MUK vzájemně propojující silniční okruh a místní komunikaci Písnice - Dolní Břežany dopravním opatřením uzavřeny.*

V průběhu kolaudačního řízení nebyly zjištěny žádné závady, které by bránily užívání předmětné stavby k určenému účelu. Užívání stavby bude za předpokladu splnění stanovené podmínky bezpečné a v souladu s veřejnými zájmy.

#### **Poučení:**

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat rozklad k ministru dopravy prostřednictvím odboru infrastruktury a územního plánu Ministerstva dopravy, nábřeží Ludvíka Svobody 12, 110 15 Praha 1, ve lhůtě do patnácti dnů ode dne doručení.

**Ing. Petr Vůjtěch**

ředitel

Odbor infrastruktury a územního plánu



**Rozdělovník:***účastník řízení:*

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4

*dotčené orgány:*

2. Úřad městské části Praha 12, stavební úřad, Generála Šišky 6, 143 00 Praha 4
3. Úřad městské části Praha 12, odbor životního prostředí, Generála Šišky 6, 143 00 Praha 4
4. Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze, Rytířská 12, 110 01 Praha 1
5. Ministerstvo dopravy, silniční správní úřad, - **zde** -
6. Ministerstvo vnitra, odbor bezpečnostní politiky, Nad štolou 3, 170 34 Praha 7
7. Ministerstvo obrany, Sekce ekonomická a majetková, Tychonova 1, 160 01 Praha 6

*dotčené městské části:*

8. Městská část Praha 12, Generála Šišky 6, 143 00 Praha 4

ZNAČKY PRAHA s. r. o.  
Černý Vůl č. p. 90  
252 62 Statenice  
CZECH REPUBLIC

Skanska CZ a.s.  
Ing. Jiří Červenka

IČ: 49 43 49 51, DIČ: CZ49434951  
tel.: -  
fax: -  
e-ma

[www.znacky-praha.cz](http://www.znacky-praha.cz)

Společnost je registrována v obchodním rejstříku  
Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 494951

Váš dopis zn. / Ze dne:

Naše značka:

Vyřizuje / Telefon:  
A. Seidl

E-mail:

Statenice 29.4.2022

Věc: **Silnice č. II/101 Břežany - Zbraslav**  
**Vyznačení objízdnych tras – cenová nabídka**

Vážený pane,

na základě naší předchozí dohody Vám zasilám cenovou nabídku na realizaci dopravních opatření na výše uvedené stavbě.

### Cenová nabídka

<i>položka</i>	<i>dnů</i>	<i>Množství</i>	<i>M.J.</i>	<i>cena za M.J</i>	<i>Cena bez DPH</i>
montáž dz		92	ks	60,00 Kč	5 520,00 Kč
tabule do 150x100 montáž		9	ks	300,00 Kč	2 700,00 Kč
pronájem dz	214	92	ks	11,00 Kč	216 568,00 Kč
tabule do 150x100 pronájem	214	9	ks	22,00 Kč	42 372,00 Kč
podstavce	214	105	ks	5,00 Kč	112 350,00 Kč
demontáž dz		92	ks	38,00 Kč	3 496,00 Kč
tabule do 150x100 demontáž		9	ks	150,00 Kč	1 350,00 Kč
doprava		440	km	32,00 Kč	14 080,00 Kč
značkovací fólie		3160	bm	130,00 Kč	410 800,00 Kč
výroba inf. tabulí		8	ks	1 550,00 Kč	12 400,00 Kč
Výroba podtabulek		18	ks	395,00 Kč	7 110,00 Kč
VDZ doprava		220	km	30,00 Kč	6 600,00 Kč
uzavírky pro MŮK		4	ks	14 555,00 Kč	58 220,00 Kč
<b>cena celkem</b>					<b>893 566,00 Kč</b>

DPH 21%  
Celkem vč. DPH

187 648,86 Kč

1 081 214,86 Kč

Děkujeme za projevenou důvěru a těšíme se na další spolupráci

S pozdravem

Antonín Seidl

## Nabídka

SKANSKA a s.  
p. Jiří Červenka



Název akce:

DIO - II/101 Dolní Břežany - Zbraslav

II/101 D. Břežany - Zbraslav - SDV na D0

p.č.	položky	Množství	jednotka	Cena za jednotku	Cena bez DPH	cena s DPH
1.	montáž značek	92	ks	65	5980	7235,8
2.	tabule montáž	9	ks	275	2475	2994,75
3.	značek	92	ks	10	196880	238224,8
4.	tabule pronájem	9	ks	20	38520	46609,2
5.	deska pronájem	105	ks	5	112350	135943,5
6.	značek	92	ks	40	3680	4452,8
7.	tabule demontáž	9	ks	150	1350	1633,5
8.	doprava	490	km	35	17150	20751,5
9.	značkovací fólie	3160	bm	132	417120	504715,2
10.	tabulí	8	ks	1550	12400	15004
11.	podtabulek	18	ks	390	7020	8494,2
12.	pro MUK	220	km	35	7700	9317
13.	operativní	4	ks	14555	58220	70446,2
	<b>celková cena</b>				<b>880 845,00</b>	<b>1 065 822,45</b>

Fakturovaná částka bude stanovena dle počtu dnů pronájmu včetně montáže, skutečně použitých DZ a jednotkové ceny.

V Benešově dne 2.5.2022

Quo s.r.o., Středisko dopravního zna  
Jiří Pejša, vedoucí střediska



PROZNAK Praha, s.r.o.

Pikovická 244/17

147 00 Praha 4 - Braník

IČO: 27166392

DIČ: CZ27166392

Městský soud v Praze, spis.zn. C 101345

Nabídka 220149

Zakázka č.:

Odběratel

Skanska a.s. divize Silniční stavitelství  
Křížíkova 682/34a

186 00 Praha 8, Karlín

IČO : 26271303

DIČ: CZ699004845

208421974

Strana: 1

Vystavil: ing. Stanislav Liška

Mail: |

Tel.: :

Fax: :

Datum: 22.04.2022

Příjemce:

Dod. podm.:

Plat. podm.:

II/101 - D. Břežany - Zbraslav - vícepráce OT na MÚK 82, MÚK Písnice a MÚK 10: 1.5. - 30.11.2022

P.č.	Kód	Název produktu	Dnů	Množství	MJ	Cena/MJ	Rabat	Bez DPH	Vč. DPH
1.	1-0101-0010	DZ montáž		92	ks	50		4 600,00	5 566,00
2.	1-0101-0500	DZ tabule do 150x100 montáž		9	ks	300		2 700,00	3 267,00
3.	1-0101-0030	DZ pronájem	214	92	ks	10		196 880,00	238 224,80
4.	1-0101-0502	DZ tabule do 150x100 pronájem	214	9	ks	22		42 372,00	51 270,12
5.	1-0105-0010	podkladní deska pronájem	214	105	ks	4,5		101 115,00	122 349,15
6.	1-0101-0020	DZ demontáž		92	ks	35		3 220,00	3 896,20
7.	1-0101-0501	DZ tabule do 150x100 demontáž		9	ks	150		1 350,00	1 633,50
8.	1-0114-0055	dálniční doprava		440	km	32		14 080,00	17 036,80
9.	1-0108-0203	značkovací fólie s tkanin. podkladem materiál		3160	bm	125		395 000,00	477 950,00
10.	1-0114-0120	výroba inf. tabulí		8	ks	1640		13 120,00	15 875,20
11.	1-0114-0110	Výroba podtabulek		18	ks	395		7 110,00	8 603,10
12.	3-0100-6010	VDZ manipulační přírážka pro MÚK Písnice		220	km	30		6 600,00	7 986,00
13.	1-0114-0150	Výroba ostatní operativní uzavírky pro MUK Písnice		4	ks	14555		58 220,00	70 446,20

Celkem bez DPH: 846 367,00 Kč  
Celkem včetně DPH: 1 024 104,07 Kč





PROZNAK Praha, s.r.o.  
Pikovická 244/17

147 00 Praha 4 - Braník  
IČO: 27166392  
DIČ: CZ27166392  
Městský soud v Praze, spis.zn. C 101345

Nabídka 220149

Zakázka č.:

Odběratel

Skanska a.s. divize Silniční stavitelství  
Křížíkova 682/34a

186 00 Praha 8, Karlín

Vystavil: ing. Stanislav Liška  
Mail:  
Tel.:  
Fax:

IČO : 26271303  
208422056

DIČ: CZ699004845

Strana: 1

Datum: 26.05.2022

Příjemce:

Dod. podm.:

Plat. podm.:

II/101 - D. Břežany-Zbraslav- MÚK Písnice: úprava provizorního dopravního značení: 24.5. - 30.11.2022

P.č.	Kód	Název produktu	Dnů	Množství	MJ	Cena/MJ	Rabat	Bez DPH	Vč. DPH
1.	1-0101-0020	DZ demontáž Z4		11	ks	30		330,00	399,30
2.	1-0101-0010	DZ montáž		9	ks	50		450,00	544,50
3.	1-0110-0101	Klemmfix-podstavec montáž		19	ks	10		190,00	229,90
4.	1-0110-0201	leitboy typ I-montáž		19	ks	15		285,00	344,85
5.	1-0101-0030	DZ pronájem	191	-2	ks	10		-3 820,00	-4 622,20
6.	1-0110-0103	Klemmfix-podstavec pronájem	191	19	ks	4		14 516,00	17 564,36
7.	1-0110-0203	leitboy typ I pronájem	191	19	ks	9		32 661,00	39 519,81
8.	1-0101-0020	DZ demontáž		9	ks	30		270,00	326,70
9.	1-0110-0102	Klemmfix-podstavec demontáž		19	ks	10		190,00	229,90
10.	1-0110-0202	leitboy typ I demontáž		19	ks	10		190,00	229,90
11.	1-0114-0050	Manipulační přírážka		25	km	30		750,00	907,50
								Celkem bez DPH:	46 012,00 Kč
								Celkem včetně DPH:	55 674,52 Kč



PROZNAK Praha, s.r.o.  
Pikovická 244/17

Nabídka 220273

Zakázka č.:

- Odběratel

147 00 Praha 4 - Braník

IČO: 27166392

DIČ: CZ27166392

Městský soud v Praze, spis.zn. C 101345

Skanska a.s. divize Silniční stavitelství  
Křížíkova 682/34a

186 00 Praha 8, Karlín

Vystavil: ing. Stanislav Liška

Mail:

Tel.:

Fax:

IČO : 26271303

208422282

DIČ: CZ699004845

Strana: 1

Datum: 02.08.2022

Příjemce:

Dod. podm.:

Plat. podm.:

II/101 D.Břežany - Zbraslav - vícepráce včetně nové PD: 9.3. - 30.11.2022

P.č.	Kód	Název produktu	Dnů	Množství	MJ	Cena/MJ	Rabat	Bez DPH	Vč. DPH
1.	1-0101-0500	DZ tabule do 150x100 montáž 1.etapa - detail a (tabule) + 7 a 8: 9.3.2022		6	ks	110		660,00	798,60
2.	1-0101-0502	DZ tabule do 150x100 pronájem IP 22	266	6	ks	15	10,0%	21 546,00	26 070,66
3.	1-0105-0010	podkladní deska pronájem	266	12	ks	3,3	10,0%	9 480,24	11 471,09
4.	1-0101-0501	DZ tabule do 150x100 demontáž		6	ks	80		480,00	580,80
5.	1-0114-0050	Manipulační přírážka		32	km	22		704,00	851,84
6.	1-0114-0120	výroba inf. tabulí		6	ks	1290		7 740,00	9 365,40
7.	1-0101-0500	DZ tabule do 150x100 montáž 1.etapa - detail 9 a 10: 14.3,2022		7	ks	110		770,00	931,70
8.	1-0101-0502	DZ tabule do 150x100 pronájem IP 22	261	7	ks	15	10,0%	24 664,50	29 844,04
9.	1-0105-0010	podkladní deska pronájem	261	14	ks	3,3	10,0%	10 852,38	13 131,38
10.	1-0101-0501	DZ tabule do 150x100 demontáž		7	ks	100		700,00	847,00
11.	1-0114-0050	Manipulační přírážka		32	km	22		704,00	851,84
12.	1-0114-0120	výroba inf. tabulí		7	ks	1290		9 030,00	10 926,30
13.	1-0101-0020	DZ demontáž 6.5. - přemístění DZ v ul. Komořanská na zábradlí		2	ks	20		40,00	48,40
14.	1-0101-0501	DZ tabule do 150x100 demontáž		2	ks	80		160,00	193,60
15.	2-9100-0110	montáž DZ-TDZ		2	ks	160		320,00	387,20
16.	2-9100-0510	montáž tabule-TDZ		2	ks	540		1 080,00	1 306,80
17.	2-9020-0112	objímky pozink na sloupek		12	ks	115		1 380,00	1 669,80
18.	1-0114-0050	Manipulační přírážka		15	km	22		330,00	399,30
19.	1-0114-0010	Zpracování projektu - DIO 1.etapa detaily a, 7 a 8; 1.etapa detaily 9 a 10.; úpravy DZ na Komořanské, úprava DZ na mostě Závodu míru a PD k ŠDV na MO Praha		96	hod	550		52 800,00	63 888,00
20.	1-0114-0012	cestovné po Praze - paušál		8	ks	250		2 000,00	2 420,00
21.	1-0114-0016	projednání a vyřízení DIRu		5	ks	8200	7,0%	38 130,00	46 137,30



**PROZNAK Praha, s.r.o.**  
Pikovická 244/17

147 00 Praha 4 - Braník  
IČO: 27166392  
DIČ: CZ27166392  
Městský soud v Praze, spis.zn. C 101345

Vystavil: ing. Stanislav Liška  
Mail:  
Tel.:  
Fax:

Příjemce:

Nabídka 220273

Zakázka č.:

Odběratel

**Skanska a.s. divize Silniční stavitelství**  
Křižíkova 682/34a

186 00 Praha 8, Karlín

IČO : 26271303

DIČ: CZ699004845

208422282


Strana: 2

Datum: 02.08.2022

Dod. podm.:

Plat. podm.:

Celkem bez DPH:	183 571,12 Kč
Celkem včetně DPH:	222 121,05 Kč

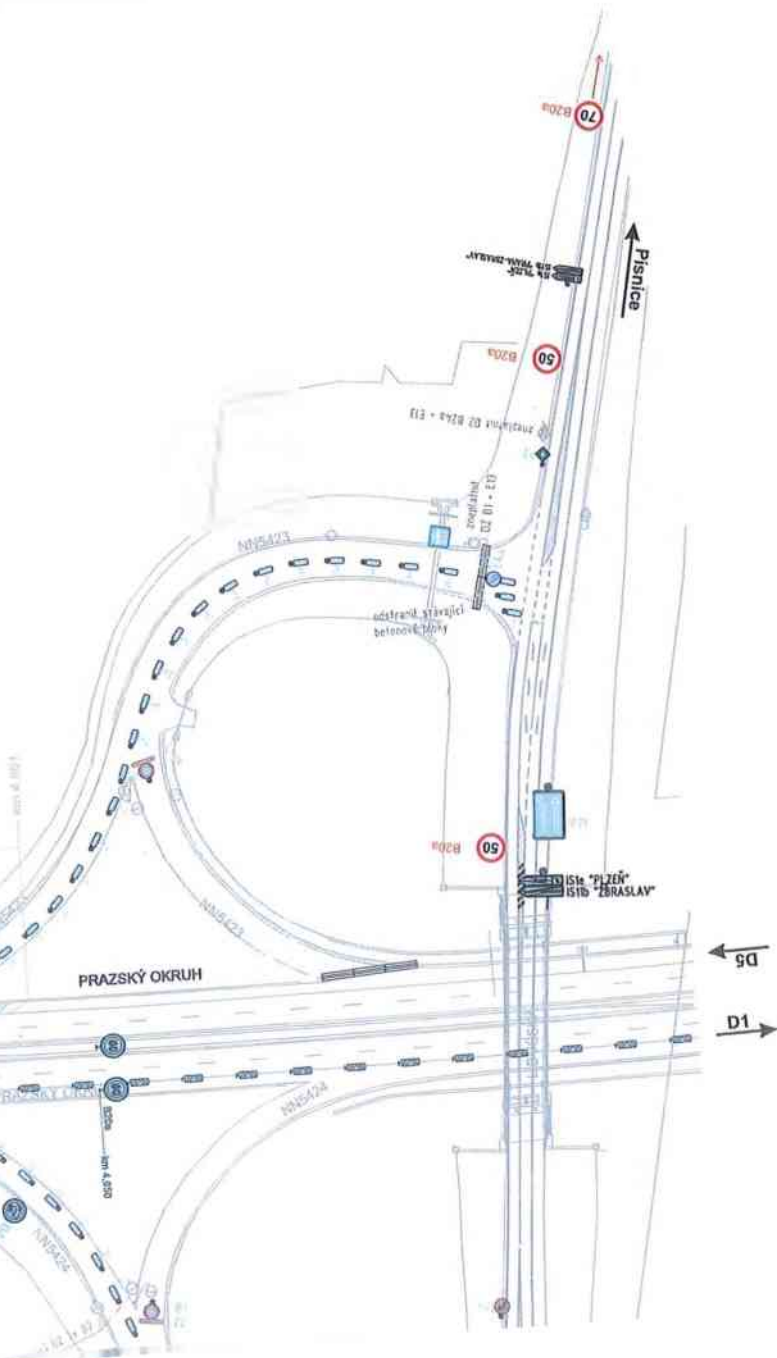

**Legenda:**



stávající trvalé DZ



stávající přechodné DZ




nově přechodné DZ



**ŠDV PRO SOUBĚH AKCÍ**

Příjemce/úřad	Objednatel	Region	Praha	PROZNAK Praha s.r.o. dopravní opatření Pávkova 144/17, Praha 4, 147 00 tel + fax : www.proznak.cz e-mail: projekce:		
Michal Pařezek	Milan Brož	ODVO	Praha	DATUM	STÍPĚV DIR	
INVESTOR	Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2/2, Praha 1				24/05/2022	
ADRESA ÚŘADU	Porr a.s., Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10.				ZAKAZKOV.	190050 / 210050 210566 / 220050
AKCE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Havarijní sprava silnice II/181 Břežanské údolí</li> <li>• Rekonstrukce Barrandovského mostu</li> <li>• Stavba č. 0050 - TV Sívraec, výstavba kamoňkací</li> <li>• Zkapacitnění žlt. trati Smíchov Černošice</li> </ul>				OBJEKT	D0 - MUK Písnice Úprava stávajícího provizorního DZ.
OBJEKT	Dopravní značení a opatření					







**From:** Michal Pařízek - Proznak <  
**Sent:** Tuesday, May 24, 2022 9:08 AM  
**To:** 'Kubín Leoš (MHMP, PKD)' < ; 'DIO' < ; 'Kymr Zdeněk Ing.' <  
'Karla Koupa' <  
**Cc:** 'Krejčí Jan (MHMP, PKD)' < ; 'Krejča Aleš (MHMP, PKD)' <  
'Starosta Libuš' < ; 'Milan Brož' <  
'I Motal' < ; 'Červenka, Jiří' <  
>; Svoboda, Jaroslav <  
**Subject:** RE: úprava na MUK Písnice

[EXTERNÍ EMAIL] Prosím buďte opatrní, než na cokoliv kliknete.

Dobrý den,  
chtěl bych Vám tímto oznámit, že dnes na podnět MHMP, starosty MČ Praha-Libuš a z důvodu zvýšené nehodovosti provedeme úpravu křižovatky ul. Libušská a výjezdové větve z D0 dle přiloženého DIO.

Michal Pařízek  
Proznak Praha s.r.o.  
Pikovická 244/17,  
147 00 Praha 4

**From:** Kubín Leoš (MHMP, PKD) |  
**Sent:** Monday, May 23, 2022 3:25 PM  
**To:** Michal Pařízek - Proznak  
**Cc:** Krejčí Jan (MHMP, PKD); Krejča Aleš (MHMP, PKD); Starosta Libuš  
**Subject:** FW: úprava na MUK Písnice

Dobrý den pane Pařízku,  
v návaznosti na podnět pana starosty Mgr. Koubka (viz. níže), s přihlédnutím k tomu, že PROZNAK provádí značení v rámci BM a v rámci uzavření Břežanského údolí a dalších akcí Vás prosím o úpravu dopravního značení.

Na MÚK Písnice osadit DZ P6, zneplatnit DZ P4 na NN5424 – sjízdná rampa z D0 na ul. Libušská.

A na ul. Libušská osadit vstříčně v obou směrech jízdy DZ B20a 50 km/h a s tím spojené DZ B20b.

Zdejší SSÚ je Vám v případě nejasností a problémů schopen a ochoten pomoci.

Velice Vám děkuji a prosím o informaci, kdy zhruba dojde k osazení předmětných DZ.

Děkuji, Kubín

**Ing. Leoš Kubín**  
specialista silničního správního úřadu

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA  
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY  
Odbor pozemních komunikací a drah  
Oddělení silničního správního úřadu  
Jungmannova 35/29, 11000 Praha 1

[www.praha.eu](http://www.praha.eu)



**Od:** Jiří Koubek <[jkoubek@praha.eu](mailto:jkoubek@praha.eu)>  
**Datum:** 23. května 2022 11:33:59 SEL.Č  
**Komu:** "Krejča Aleš (MHMP, PKD)"  
**Předmět:** úprava na MUK Písnice

Vážený pane řediteli,  
z reakcí řidičů včetně řidiče autobusu mám podnět na zvážení dopravního opatření na sjezdu z D0 na MUK Písnice. Včerejší nehoda (viz foto) ukazuje, že křižovatka je pro některé řidiče nepřehledná.

Návrh: ze sjezdu D0 na křížení ulic s Libušská umístit STOPKU na samotném mostu na Libušské ulici omezit rychlost aut, které jezdí na ose Dolní Břežany - Písnice a opačně ze současných 90 km/hodině na 50 km/hodině.

Odůvodnění: Řidiči jezdí po paměti, mnozí nepředpokládají, že jim do cesty Písnice - DB a opačným směrem může vjet auto z dálnice D0. Dočasné svislé značky, které usměrňují pohyb na MUK v Písnici snižují přehled na mostu křižovatky MUK.

Prosím o zvážení této žádosti

S pozdravem, na viděnou ve středu!

Jiří Koubek, starosta MČ Praha-Libuš

IP22 POZOR  
v KOMORÁNSKÁ  
A BŘEZÁNSKÉ UDOLÍ  
NEPRUJEZDNÉ  
(B2; B1)



Zneplnit



IP22 POZOR  
v KOMORÁNSKÁ  
A BŘEZÁNSKÉ UDOLÍ  
NEPRUJEZDNÉ  
(B2; B1)



VYPRACOVANÍ	SCHVÁLIL:	REGION:	Praha	PROZNAK Praha s.o. dopravní opatření Pikovická 244/17, Praha 4, 147 00 tel + fax : www.proznak.cz e-mail: projekce:
Michal Pařízek	Milan Brož	OBVOD:	Praha	
INVESTOR:	KSÚS Stř. kraje, Zborovská 11, Praha 150 21			DATUM: 07/03/2022 STUPEN: DIR
OBJEDNATEL (M):	Skanska a.s., K Betonárně 303, 15500 Praha 5			
AKCE:	- Rekonstrukce silnice II/101 - - Sanace skalního svahu -			ZAKAZKAČ: 21036566
OBJEKT:	Dopravní značení a opatření			ČÁST: 1. ETAPA Detail 7



VYPRACOVANÍ: Michal Pařízek	SCHÉMA: Milan Brož	REGION: Praha	PROZNAK Praha s.r.o. dopravní opatření Píkovická 244/17, Praha 4, 147 00 tel + fax : www.proznak.cz e-mail: projekce	
INVESTOR: KSÚS Stř. kraje, Zborovská 11, Praha 150 21			DATUM: 07/03/2022	STUPEŇ: DIR
ORGANIZAČNÍ ÚSTŘEDÍ: Skanska a.s., K Betonárně 303, 15500 Praha 5			ZAKÁZKOVÝ ČÍSLO: 210956566	
ÚKOL: - Rekonstrukce silnice II/101 - - Sanace skalního svahu -			ČASŤ: 1. ETAPA Detail 8	
OBLAST: Dopravní značení a opatření				



# KOMOŘANY





VYBRANÝ: Michal Pařízek	SEZNÁMIL: Milan Brož	HOJŠAN: Praha	PROZNAK Praha s.c.o. dopravní opatření Překovická 244/17, Praha 4, 147 00 tel + fax : www.proz e-mail: projekce:	
INVESTOR: KSÚS Stř. kraje, Zborovská 11, Praha 150 21		ORIGIN: Praha		
OBJEDNATEL: DIE: Skanska a.s., K Betonárně 303, 15500 Praha 5	DATA: 07/03/2022		STUPEŇ: DIR	
AKCE: - Rekonstrukce silnice II/101 - - Sanace skalního svahu -		ZAKAZKA CÍ: 210566		
OBJEKT: Dopravní značení a opatření	ČÍSLO: 1. ETAPA Detail 9			

hrazský okruh

izanská





VYPRACOVATEL:	SEKURITA:	MÍSTNOST:	Praha	PROZNAK Praha s.r.o. dopravní opatření Přikovická 3, 110 19 Praha 1, IČ 7 00 tel + fax: www.pri e-mail: projekce:	
Michal Pařízek	Milan Brož	OBJEKT:	Praha		
INVESTOR:	KSÚS Stř. kraje, Zborovská 11, Praha 150 21			DATA:	STUPĚN:
OBJEDNATEL/DÍLCE:	Skanska a.s., K Betonárně 303, 15500 Praha 5			07/03/2022	DIR
AKCE:	- Rekonstrukce silnice II/101 - - Sanace skalního svahu -			ZAKAZKA Č.:	210566
OBJEKT:	Dopravní značení a opatření			CASE:	1. ETAPA Detail 10



mapová značka  
Aupřesňující údaje dopravního značení



IS11b „JESENICE“  
„D. BŘEŽANY“



Zakrytí SDZ IS3b  
„DOLNI BŘEŽANY“



IP22 „POZOR“  
ul. BŘEŽANSKÉ ÚDOLÍ  
NEPRŮJEZDNÁ“  
(B1)



Zakrytí SDZ IS3a  
„DOLNI BŘEŽANY“



YIPRACOVAL:	SCHVÁLIL:	REGION: Praha	PROZNAK Praha s.r.o. dopravní opatření Přátelická 144/17, Praha 4, 147 00 tel + fax www.proz e-mail: projekce	
Michal Pařízek	Milan Brož	OBVOD: Praha		
INVESTOR:	KSÚS Stř. kraje, Zborovská 11, Praha 150 21			
OBJEDNATEL DIO:	Skanska a.s., K Betonárně 303, 15500 Praha 5	DATEM: 02/05/2022	STUPEN:	DIR
ARCE:	- Rekonstrukce silnice II/101 - - Sanace skalního svahu -	ZAKAZKA C.:	210566	
OBJEKT:	Dopravní značení a opatření	ČÁST:	2. ETAPA situace 3/2	


**Legenda:**

- Stávající DZ
- DZ zrekonstruovaného stavu
- Navrhované DZ
- DZ jiné probíhající stavby


PŘEMĚNĚNÍ NA ZÁKAZKU





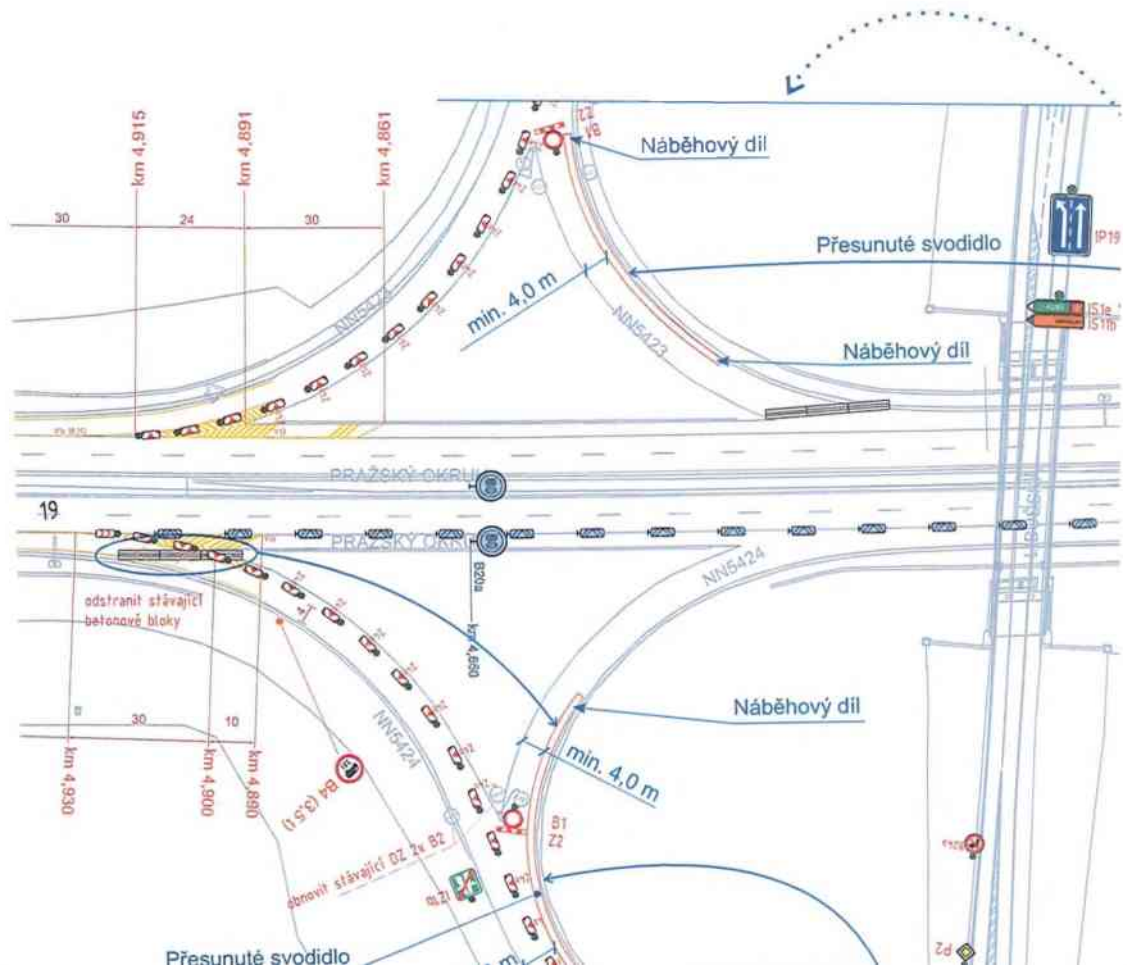

"PLZEŇ"  
"ZBRASLAV"

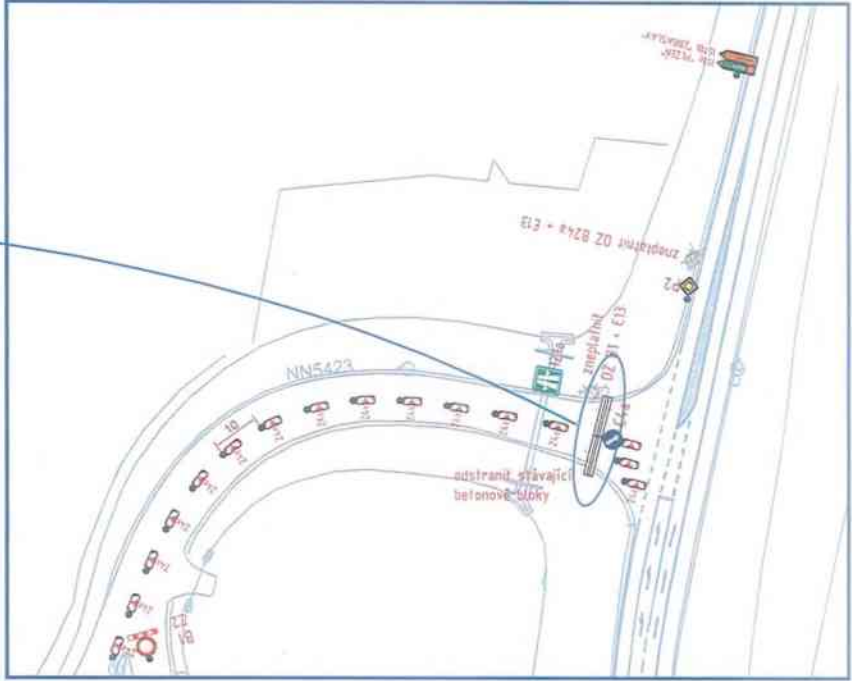

7

Fotodokumentace betonových svodidel







General / Obecně





General / Obecně





BUNG CZ s. r. o.  
V Olšínách 2300/75  
100 00 Praha 10 - Strašnice  
Mobil: +  
E-Mail:  
www.bung.cz  
info@bung.cz

Věc: „II/101 Dolní Břežany - Zbraslav – havárie“ – souhlasné vyjádření k ZBV č.2

#### ZBV 2 - SO 180 - Přejídné dopravní značení

Obsahem stavebního objektu SO 180 je osazení přejídného dopravního značení pro vyznačení uzavírky silnice II/101 v úseku stavby a náhradní objídné trasy. Objídná trasa byla navržena z Dolních Břežan po silnici III/10115 do Zvole, po silnici III/1043 do Vraného nad Vltavou a dále do Zbraslavi.

Na základě požadavku odboru dopravy a nesouhlasných vyjádření starostů dotčených obcí bylo z důvodu odlehčení objídných tras prováděné stavby a z důvodu návaznosti na další stavby prováděné v okolí byl po dohodě s ŘSD ČR Praha dočasně zprovozněn MUK Písnice na D0. Před zprovozněním pro účely objídné trasy bylo nutné provést opatření na vodorovném dopravním značení žlutou folií na MUK Písnice a osazení svislého DZ a bet.svodidel na MUK a dalších místech, která jsou součástí objídných tras prováděné stavby. Dále je předmětem ZBV i doplnění přejídného dopravního značení, kterým byla vyznačena uzavírka silnice II/101 v úseku stavby a náhradní objídné trasy, z důvodu neplánované uzavírky ulice Komořanská.

Zhotovitelem předložené ocenění položek ZBV č.2 má TDS jako přiměřené a v daném místě obvyklé v hodnotách se sumární cenou položkového rozpočtu 1 329 758,64 Kč bez DPH.

Jedná se o Změnu nepodstatnou, nepředvídanou, která je tak podle § 5, odst. 1 písm. c), resp. podle § 10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29. 05. 2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 5. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná o změnu nepředvídanou.

TDS souhlasí předloženým návrhem ZBV č. 2

Toto souhlasné stanovisko nezbavuje zhotovitele povinnosti doložit cenu položek dle zásad pro procesování ZBV.

Bc. Jakub Slánský  
TDS



GeoTec-GS, a.s.  
Chmelová 2920/6  
106 00 Praha 10

**Krajská správa a údržba silnic  
Středočeského kraje, příspěvková organizace**

Ing. Aleš Čermák MBA  
Zborovská 81/11  
150 00 Praha 5 - Smíchov

Váš dopis značky / ze dne

naše značka  
22/1216/FD

vyřizuje / telefon  
Mgr. Filip Dudík /

dne:  
3.8.2022

**Věc: II/101 Dolní Břežany - Zbraslav  
Vyjádření AD č. 1**

**Číslo smlouvy objednatele: 146/00066001/2017**

**Číslo zakázky Zhotovitele: GTC/2017/395**

Vážený pane řediteli,

dne 4.7.2022 obdržel elektronicky AD od zhotovitele výše uvedené stavby návrh ZBV č. 2, které řeší změny přechodného dopravního značení v rámci SO 180.

AD sděluje, že byl návrh SO 180 v rámci projektové přípravy stavby projednán se silničním správním úřadem (stanovisko ze dne 18.2.2020) i Policií ČR (vyjádření ze dne 14.2.2020).

Na základě souběhu realizace stavby se stavbami jiných investorů, stavba obdržela, v rámci projednání nesouhlasná vyjádření starostů dotčených obcí. Po dohodě s odborem dopravy, ŘSD ČR Praha a TSK a.s. bylo rozhodnuto o dočasném zprovoznění MÚK Písnice na dálnici D0

AD souhlasí s předloženým návrhem ZBV č. 2.

S pozdravem

Mgr. Filip Dudík  
ředitel společnosti



## Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby: <b>II/101 Dolní Břežany - Zbraslav - havárie</b> Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>SO 04 – Úsek 12A</b>	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: <b>04/1</b>	Číslo ZBV: <b>3</b>
--	--	------------------------

Objednatel:	Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov IČ: 00066001
-------------	--

Zhotovitel:	Skanska, a.s. Křížikova 682/34a, 186 00 Praha 8 - Karlín IČ:26271303
-------------	--

## Rekapitulace ZBV č. 3 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3.3	-75 229,56	700 481,67	625 252,11

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3.4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
<b>3</b>	<b>-75 229,56</b>	<b>700 481,67</b>	<b>625 252,11</b>

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.  
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy  
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list	Číslo paré:
------------------	-------------

## Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: II/101 Dolní Břežany - Zbraslav - havárie Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 04 – Úsek 12A	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS:  04/1	Číslo ZBV:  3.3
--	---	-----------------------

Strany smlouvy o dílo objednatel č.:S-2537/00066001/2021 a zhotovitele č.10000156093 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 11.11.2021 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: Skanska, a.s., Křížkova 682/34a, 186 00 Praha 8 - Karlín

Přílohy Změnového listu:	Paré č.	Příjemce
1. Krycí list	1	počet listů
2. Změnový list	1	počet listů
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů
4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů
Další doklady dle přehledu dokladů	32	počet listů
	1, 2	Objednatel
	3	Zhotovitel
	4	Projektant (AD)
	5	Stavební dozor

Iniciátor změny: Zhotovitel

**Popis a zdůvodnění Změny: Upřesnění rozsahu očištění a zajištění skalního masivu**

V zadávací dokumentaci je řešeno zajištění skalních svahů (zářezů) na komunikaci II/101, které spočívá v očištění svahů a instalaci typových opatření (bariéry, zábrany a pokrytí skalních svahů ocelovou sítí).

Po očištění skalního masivu od vegetace bylo zjištěno větší rozvolnění skály, než se předpokládalo v zadávací dokumentaci. Aby bylo možné skálu zabezpečit sítěmi (kotvami), musela být tato rozvolněná část skály odstraněna až na soudržnou horninu (viz doklad č.14 - Fotodokumentace).

Na základě místního šetření (doklad č.13 - Zápis AD v SD ze dne 16.3.2022 list č.0638005) byl navýšen rozsah očištění skalního masivu o uvolněné a porušené horniny, čímž došlo k navýšení objemu odbourané hmoty skalního masivu (zvětralé části). Dále došlo k navýšení plochy opláštění z geomřížovin a redukcí svorníků a vrťů. Objemy odtěžených hmot v rámci sanace skalního masivu jsou doloženy záznamem z fotogrametrického měření (viz doklad č. 10 - Výpočet objemu suti).

Změna byla odsouhlasena autorským dozorem (viz doklad č. 12 - Vyjádření AD) a stavebním dozorem (viz doklad č. 11 - Vyjádření TDI).

Tato změna je vyjádřena smluvními položkami 1, 14, 15, 16, 19, 21, 28, 29, 31, 36 a 37 a zvyšuje smluvní cenu stavby o 625 252,11 Kč bez DPH.

Jedná se o Změnu nepodstatnou, nepředvídanou, která je tak podle § 5, odst. 1 písm. c), resp.podle § 10 Směrnice

R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29. 05. 2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do **Skupiny 3**. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná o změnu nepředvídanou.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-75 229,56	700 481,67	625 252,11	775 711,23

**Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:**

Zhotovitel (stavbyvedoucí): Skanska, a.s.	jméno	Ing.Jaroslav Svoboda	datum	podpis
Projektant (autorský dozor): GeoTec-GS, a.s.	jméno	Mgr.Filip Dudík	datum	podpis
Stavební dozor: BUNG CZ, s.r.o.	jméno	Bc.Jakub Slánský	datum	podpis
Supervize (Regionální dotační kancelář)	jméno	xxx	datum	podpis
Zástupce Objednatel: KSÚS	jméno	Ing. Martin Staněk	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitel sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel)	jméno	Ing. Jan Fidler, DiS.	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	Jiří Červenka	datum	podpis

Číslo paré:

**ZÁPIS**

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)  
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 3

Název Stavby:	II/101 Dolní Břežany - Zbraslav - havárie
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	04/1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	SO 04 – Úsek 12A

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
4 315 686,32

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	4 315 686,32	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-75 229,56	700 481,67	700 481,67	16,23%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-75 229,56	4 940 938,43	625 252,11	14,49%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): Ing. Jaroslav Svoboda  
Skanska, a.s. souhlasím

Projektant (autorský dozor): Mgr. Filip Dudík  
GeoTec-GS, a.s. souhlasím

Stavební dozor: Bc. Jakub Slánský  
BUNG CZ, s.r.o. souhlasím

Zástupce Objednatele KSÚS: Ing. Martin Staněk  
souhlasím

Zaměstnanec KSÚS  
odpovědný za cenové  
projednání Změny: Ing. Jaroslava Jurková  
souhlasím

## Rozpis ocenění Změn položek - celkem

Evidenční číslo a název stavby: II/101 Dolní Břežany - Zbraslav - havárie

Číslo a název SO/PS: SO 04 - Úsek 12A

Číslo a název rozpočtu: SO 04 - Úsek 12A

## ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

SO 04/1

Skupina změn 3

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	230,918	583,918	353,000	176,96	40 863,25	0,00	62 466,88	103 330,13	62 466,88	152,87%
14	12283	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ.II	M3	26,000	149,550	123,550	1 474,63	38 340,38	0,00	182 190,54	220 530,92	182 190,54	475,19%
15	12481	DOLAMO VÁNÍ ODKOPÁVEK TŘ.II	M3	8,667	49,850	41,183	3 539,10	30 673,38	0,00	145 750,76	176 424,14	145 750,76	475,17%
16	12841R	DOLAMO VÁNÍ ODKOPÁVEK TŘ.II RUČNĚ HOROLEZECKY	M3	72,000	124,950	52,950	2 359,40	169 876,80	0,00	124 930,23	294 807,03	124 930,23	73,54%
19	261113	VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ NA POVRCHU TŘ I D DO 25MM	M	16,800	24,000	7,200	1 167,90	19 620,72	0,00	8 408,88	28 029,60	8 408,88	42,86%
21	26142R	VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY HOROLEZECKY TŘ.IV D DO 100MM	M	134,000	106,000	-28,000	1 863,93	249 766,62	-52 190,04	0,00	197 576,58	-52 190,04	-20,90%
28	286411R	KOTVY LEPENÉ DL DO 3M ÚNOS DO 50KN	KUS	84,000	120,000	36,000	808,09	67 879,56	0,00	29 091,24	96 970,80	29 091,24	42,86%
29	286521R	KOTVY OCEL INJEKTOVANÉ DÉLKY D 4M ÚNOS DO 50KN	KUS	11,000	4,000	-7,000	3 291,36	36 204,96	-23 039,52	0,00	13 165,44	-23 039,52	-63,64%
31	289972	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOMŘÍŽOVIN	M2	144,000	280,000	136,000	300,82	43 318,08	0,00	40 911,52	84 229,60	40 911,52	94,44%
36	76291	DŘEVĚNÉ OPLOCENÍ Z ŘEZIVA	M2	30,240	60,300	30,060	2 890,27	87 401,76	0,00	86 881,52	174 283,28	86 881,52	99,40%
37	76799	OSTATNÍ KOVOVÉ DOPLŇK KONSTRUKCE	T	1,521	1,685	0,164	121 037,22	184 097,61	0,00	19 850,10	203 947,71	19 850,10	10,78%
<b>Celkem</b>									<b>- 75 229,56</b>	<b>700 481,67</b>	<b>625 252,11</b>	<b>13,83</b>	

Odpovědný zástupce Objednatele | odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek | nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.  
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Jaroslav Svoboda - hlavní stavbyvedoucí

Za Objednatele: Bc. Jakub Slánský - stavební dozor

Datum:

Datum:

Podpis:

Podpis:



PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: II/101 Dolní Břežany - Zbraslav - havárie

1	Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH	54 776 990,58
2=1-19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	58 936 310,99
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	71 315 358,30
3=(2)/1*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	107,60%
4=(25)/1*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28)/1*100	Sledování záporných položek (Skupina 2)	0,00%
4b=(18)/1*100	Sledování limitu 15 % pro hodnotovou změnu pro Změny záporné (dle § 14, odst. (6), písm. e)	-4,14%

6=32+38	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	4 161 320,43
7=(6)/1*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	7,60%
8=10+3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	16 433 097,17

9=(32A)/1*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	3,84%
10=(26A)/1*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	12,03%
10A=(32A)+36A	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	8 693 240,19
11=11*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	27 388 495,28

12=(17/5)*100	Limit	8 216 548,58
13=(20)/(1)	Sledování limitu (15%)	0,00%
14=(4B)/(37)+38	Hodnota skupiny 5	0,00

		- 1 -		- 2 -		- 3 -				- 4 -				- 5 -								
		Vyhrazení změny (Darmenky (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.))		Záporné položky (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)		Změny nepřehledné (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)				Změny neúbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)				Změny do minora (Změny nemající celkovou hodnotu větší než 0,00 % z celkové hodnoty stavby, dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)								
SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Limit 15 %
16	17	18	19=23+24+29+33	20=24+27+30+34+37+39	21=19+35	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	32=29+30	32A=65(20)+30	33	34	36=33+34	36A=65(33)+34	37	38	38A=65(37)+38
		II/101 Dolní Břežany - Zbraslav - havárie	-2 285 958,88	5 427 280,21	4 161 320,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 78 229,58	2 300 240,31	1 955 618,76	2 108 468,87	-2 190 730,32	4 597 040,00	2 204 308,68	6 587 770,32	0,00	0,00	8,86
251	1	Opěrné stěpy/záměna reflektorů a příměří vřtů	-2 190 730,32	4 367 040,00	2 204 308,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 190 730,32	4 597 040,00	2 204 308,68	6 587 770,32	0,00	0,00	0,00
180	2	Přechod oprav zhadon/Dobroslav zprávozáření MJK Písečno na D0 a zprávozáření ústej Komolná	0,00	1 229 758,84	1 229 758,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 329 758,64	1 329 758,64	1 329 758,64	1 329 758,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	3	Úsek I/VA/Ústej/Ústej - zprávozáření v 2010/2011 v ústejního městu	- 78 229,58	700 481,87	826 252,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 78 229,58	700 481,87	826 252,11	775 711,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Poznámka: Formulář má informační charakter a zabraňuje stav k datu odevzdání Změnového listu.



## Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	3
Název a evidenční číslo stavby:	<b>II/101 Dolní Břežany - Zbraslav - havárie</b>
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 04 – Úsek 12A
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	04/1

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
07 Soupis prací SO po změnách	18	
08 Oznámení Zhotovitele	2	
09 Pokyn Objednatele	2	
10 Výpočet objemu odtěžené suti	2	
11 Vyjádření TDI	1	
12 Vyjádření AD	1	
13 Zápis AD v SD ze dne 16.3.2022	1	
14 Fotodokumentace	5	
Počet listů celkem	32	

## Rozpis ocenění Změn položek - celkem

Evidenční číslo a název stavby: II/101 Dolní Břežany - Zbraslav - havárie

## ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

Číslo a název SO/PS: SO 04 - Úsek 12A

SO 04

Číslo a název rozpočtu: SO 04 - Úsek 12A

celkem

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0		Všeobecné konstrukce a práce						200 549,00	0,00	0,00	200 549,00	0,00	0,00
4	02821	PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA POVRCHU	KPL	1,000	1,000	0,000	35 391,00	35 391,00	0,00	0,00	35 391,00	0,00	0,00%
		zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi											
5	02910	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ	KPL	1,000	1,000	0,000	5 898,50	5 898,50	0,00	0,00	5 898,50	0,00	0,00%
		- zaměření skutečného provedení stavby											
		zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi, - pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% odhadované ceny stavby											
6	02911	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	KPL	1,000	1,000	0,000	5 898,50	5 898,50	0,00	0,00	5 898,50	0,00	0,00%
		vytyčení stavby - směrové a výškové vytyčení stavby dle vytyčovacíh souřadnic, včetně vytyčení inženýrských sítí											
		zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi											
7	02944	OSTATNÍ POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ	KPL	1,000	1,000	0,000	82 579,00	82 579,00	0,00	0,00	82 579,00	0,00	0,00%
		dokumentace skutečného provedení stavby - DSPS v počtu 3 paré + 1x CD (uzavřené formáty)											
		zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi											
8	02945	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN	KPL	1,000	1,000	0,000	35 391,00	35 391,00	0,00	0,00	35 391,00	0,00	0,00%
		podklady pro majetkové vypořádání stavby - vypracování geometrického plánu včetně projednání a schválení na příslušném KÚ											
		položka zahrnuje: - přípravu podkladů, vyhotovení žádosti pro vklad na katastrální úřad - polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu - výpočetní a grafické kancelářské práce - úřední ověření výsledného elaborátu - schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí příslušným katastrálním úřadem											
9	02960	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR	KPL	1,000	1,000	0,000	35 391,00	35 391,00	0,00	0,00	35 391,00	0,00	0,00%
		Geotechnický dozor stavby - podrobný IG průzkum v době provádění vrtných a zemních prací - zjištění přesných informací o skladbě a druhu hornin - závěrečná zpráva Zatřídění vybouraných materiálů a zeminy											
		zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovaným dozorem											
0.1		Všeobecné konstrukce a práce - poplatky						44 260,79	0,00	62 466,88	106 727,67	62 466,88	1,53



## Rozpis ocenění Změn položek - celkem

Evidenční číslo a název stavby: II/101 Dolní Břežany - Zbraslav - havárie

## ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

Číslo a název SO/PS: SO 04 - Úsek 12A

## SO 04

Číslo a název rozpočtu: SO 04 - Úsek 12A

## celkem

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).											
13	12273	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I výkop zeminy v patě skalní stěny $0,2*20,0+0,06*50,0=7,000$ [A] m3 položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopky nezapažené i zapážené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za leplivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah: svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, výkopky se položka 0141**	M3	7,000	7,000	0,000	161,62	1 131,34	0,00	0,00	1 131,34	0,00	0,00%
14	12283	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I odstranění skalních bloků odtěžením bagrem, do výšky 8 m nad silnicí stržení volných balvanů	M3	26,000	149,550	123,550	1 474,63	38 340,38	0,00	182 190,54	220 530,92	182 190,54	17%























## Rozpis ocenění Změn položek - celkem

## ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

SO 04

celkem

Evidenční číslo a název stavby: II/101 Dolní Břežany - Zbraslav - havárie

Číslo a název SO/PS: SO 04 - Úsek 12A

Číslo a název rozpočtu: SO 04 - Úsek 12A

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Zahrnuje kompletní dodávku svorníku délky od 1,51m do 2,00m a unosnosti do 100kN včetně příslušenství, podle požadavků a popisu uvedených v dokumentaci pro zadání stavby (kotevní deska, podložky, matice, vrtací korunky a pod.); - součástí je kompletní osazení svorníku, které zahrnuje všechny operace podle technologického předpisu výrobce nutné pro řádné osazení a aktivaci včetně všech pomocných mechanismů, přípravků a hmot (např. injektážní hmoty, injektážního čerpadla a pod.); - součástí ceny je také vrtání svorníku včetně potřebné mechanizace; - průkazné a kontrolní zkoušky svorníků;											
26	284441R	SVORNÍKY LEPENÉ DL DO 2,0M ÚNOS DO 50KN obvodově kotvení síti boční a dolní - svorník s okem, betonářská ocel B500B R25 dl. 2000 mm, pozink - horolezecky viz výkres D.4.5 41,0=41,000 [A] kus	KUS	41,000	41,000	0,000	1 639,78	67 230,98	0,00	0,00	67 230,98	0,00	0,00%
		Zahrnuje kompletní dodávku svorníku délky od 1,51m do 2,00m a unosnosti do 50kN včetně příslušenství, podle požadavků a popisu uvedených v dokumentaci pro zadání stavby (podložky, matice a pod.); - součástí je kompletní osazení svorníku horolezecky, které zahrnuje všechny operace podle technologického předpisu výrobce nutné pro řádné osazení a aktivaci včetně všech pomocných mechanismů, přípravků a hmot (např. lepicí hmoty a pod.); - průkazné a kontrolní zkoušky svorníků; - druh, délku, rozmístění a rozsah zkoušek určuje zadávací dokumentace; - vrty pro svorníky nejsou součástí této položky uvedou se v položce 263 - vrty pro svorníky a kotvy											
27	284551R	SVORNÍKY OCEL INJEKTOVANÉ DL DO 3,0M ÚNOS DO 50KN obvodově kotvení síti horní - svorník s okem, betonářská ocel B500B R25 dl. 3000 mm, pozink - horolezecky 60/2+1=31,000 [A] kus	KUS	31,000	31,000	0,000	2 583,54	80 089,74	0,00	0,00	80 089,74	0,00	0,00%
		Zahrnuje kompletní dodávku svorníku délky od 2,01m do 3,0m a unosnosti do 50kN včetně příslušenství (podložky, matice, injektážního nástavce, injektážní a odvzdušňovací hadice a pod.), podle požadavků a popisu uvedených v dokumentaci pro zadání stavby; - součástí je kompletní osazení svorníku horolezecky, které zahrnuje všechny operace podle technologického předpisu výrobce nutné pro řádné osazení a aktivaci včetně všech pomocných mechanismů, přípravků a hmot (např. injektážní hmoty, injektážního čerpadla a pod.); - průkazné a kontrolní zkoušky svorníků; - druh, délku, rozmístění a rozsah zkoušek určuje zadávací dokumentace; - vrty pro svorníky nejsou součástí této položky uvedou se v položce 263 - vrty pro svorníky a kotvy											
28	286411R	KOTVY LEPENÉ DL DO 3M ÚNOS DO 50KN kotvení sloupek palisády přes naváženou desku na betonový základ - chemická kotva M20 dl. 200 mm	KUS	84,000	120,000	36,000	808,09	67 879,56	0,00	29 091,24	96 970,80	29 091,24	42,31%









## Rozpis ocenění Změn položek - celkem

Evidenční číslo a název stavby: II/101 Dolní Břežany - Zbraslav - havárie

## ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

Číslo a název SO/PS: SO 04 - Úsek 12A

SO 04

Číslo a název rozpočtu: SO 04 - Úsek 12A

celkem

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpusti, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpusti, šachet a pod.											
34	58920	VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM stvěrná spára původního a nového asfaltu 64*2=128,000 [A] m položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu - vyčištění a výplň spar tímto materiálem	M	128,000	128,000	0,000	76,68	9 815,04	0,00	0,00	9 815,04	0,00	0,00%
	7	<b>Přidružená stavební výroba</b>						289 973,31	0,00	106 731,62	396 704,94	106 731,62	1,10
35	711237	IZOLACE ZVLÁŠT KONSTR PROTI VOL STĚK VODĚ Z PE FÓLIÍ nopová folie upevněná hřebíky na rubu palisády	M2	54,000	54,000	0,000	342,11	18 473,94	0,00	0,00	18 473,94	0,00	0,00%
		položka zahrnuje: - dodání předepsaného izolačního materiálu - očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení - zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu - zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod. - zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak - ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace - provedení požadovaných zkoušek - nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilií											
36	76291	DŘEVĚNÉ OPLOČENÍ Z REZIVA výplň palisády, dřevěná kulatina, tlakově impregnovaná, pr. 120 - 140 mm, upraveno na místě, dl. 2,0 m	M2	30,240	60,300	30,060	2 890,27	87 401,76	0,00	86 881,52	174 283,28	86 881,52	99,40%



## Rozpis ocenění Změn položek - celkem

Evidenční číslo a název stavby: II/101 Dolní Břežany - Zbraslav - havárie

Číslo a název SO/PS: SO 04 - Úsek 12A

Číslo a název rozpočtu: SO 04 - Úsek 12A

## ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

SO 04

celkem

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
39	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	128,000	128,000	0,000	53,09	6 795,52	0,00	0,00	6 795,52	0,00	0,00%
		64,0*2,0=128,000 [A] m											
		položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody											
<b>Celkem</b>								<b>4 315 686,32</b>	<b>- 75 229,56</b>	<b>700 481,67</b>	<b>4 940 938,43</b>	<b>625 252,11</b>	<b>13,83</b>

FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY Č.3  
„II/101 Dolní Břežany – Zbraslav - havárie“

Určeno: Ing. Jan Lichtneger, ředitel KSÚS Sk, p.o.

Číslo SoD: S-2537/00066001/2021

Termín plnění: 7.3.2022 – 6.12.2022 (9 měsíců)

Celková cena díla: 54 776 990,56 Kč bez DPH

Zhotovitel: Skanska a.s., Křižíkova 682/34a, Praha 8 - Karlín

IČ: 26271303

Oprávněná osoba: Jiří Červenka

Telefonní spojení: :

**Popis předmětu informace:** změna během výstavby z důvodu upřesnění rozvolnění skalního masivu

**Popis problému:** Po očištění skalního masivu od vegetace bylo zjištěno větší rozvolnění skály než se předpokládalo v původní PD. Aby bylo možné skálu zabezpečit sítěmi (kotvami), musela být tato rozvolněná část skály odstraněna až na soudržnou horninu. Z tohoto důvodu došlo k navýšení objemu odbourané hmoty skalního masivu (zvětralé části). Dále došlo k navýšení plochy opláštění z geomřížovin a redukci svorníků a vrtů.

**Čeho se zhotovitel domáhá:** Zhotovitel uplatňuje navýšení položky:

SO 04 pol.1 014102 Poplatky za skládku

SO 04 pol.14 12283 Odkopávky a prokopávky obecné tř. II  
SO 04 pol.15 12841 Dolamování odkopávek tř. II  
SO 04 pol.16 12841R Dolamování odkopávek tř. II ručně horolezecky  
SO 04 pol.31 289972 Opláštění (zpevnění) z geomřížovin

Ponížené položky:

SO 04 pol.21 26142R Vrtý pro kotvení, injektáž a mikropiloty horolezecky tř. IV D do 100mm  
SO 04 pol.29 286521R Kotvy ocel injektované délky do 4m únos do 50 kN

**Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla: 29.4.2022**

**Datum, podpis oprávněné osoby**

**Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele:**



V Říčanech  
27. 04. 2022  
Evidenční číslo:  
Číslo jednací:

Vážený pan  
Jiří Červenka  
Skanska a.s.  
Křížíkova 682/34a  
Praha 8 - Karlín

**Věc: II/101 Dolní Břežany – Zbraslav - havárie - Ohlášení změn během výstavby**

Dobrý den,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o. (dále jen KSÚS), jako investor akce „II/101 Dolní Břežany – Zbraslav - havárie“ je seznámena se žádostí o zpracování ZBV jehož předmětem je:

- Po očištění skalního masivu od vegetace bylo zjištěno větší rozvolnění skály než se předpokládalo v původní PD. Aby bylo možné skálu zabezpečit sítěmi (kotvami), musela být tato rozvolněná část skály odstraněna až na soudržnou horninu. Z tohoto důvodu došlo k navýšení objemu odbourané hmoty skalního masivu (zvětralé části). Dále došlo k navýšení plochy opláštění z geomřížovin a redukci svorníků a vrtů.
- Z důvodu odlehčení objízdných tras prováděné stavby a z důvodu návaznosti na další stavby prováděné v okolí bude po dohodě s ŘSD ČR Praha dočasně zprovozněny MUK Písnice na D0. Před zprovozněním pro účely objízdné trasy je nutné provést opatření na vodorovném dopravním značení žlutou folií na MUK Písnice a osazení svíslého DZ na MUK a dalších místech, která jsou součástí objízdných tras prováděné stavby.
- Z důvodu válečného konfliktu na území Ukrajiny a sankcím EU a ČR vůči Rusku a tím způsobenému nedostatku resp. úplné nedostupnosti ocelových profilů do mikropilot (bezešvé trubky průměr 108/16 z oceli S355) jsou výše uvedené ocelové trubky nahrazeny válcovanými profily HEB 140 z oceli S235JR. S touto náhradou ocelové části mikropilot je nutné zvětšení vrtů z průměru D 150 mm na průměr D 250mm (projekčně zpracováno jako aktualizace RDS a odsouhlaseno AD).

KSÚS bere na vědomí, že zhotovitel nemohl v době zadávací lhůty soutěže předvídat výskyt těchto okolností, a proto KSÚS žádá zhotovitele společnost Skanska a.s. o vypracování Změnových listů, a to v souladu se směrnicí KSÚS, která je nedílnou součástí Smlouvy o dílo.



*Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IČ 00066001,  
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11*

---

Tyto ZBV budou následně projednány a podrobně posouzeny supervizorem zakázky, následně budou posouzeny vedením KSÚS.

S pozdravem

Ing. Jan Lichneger  
Ředitel KSÚS

VÁŠ DOPIS ZN.: --  
ZE DNE: --  
NAŠE ZN.: O/ /21/V

VYŘIZUJE: Ing. Jakub Šíma  
TEL:  
FAX:  
E-MAIL:

DATUM: 21.03.2022

**Vertico, s.r.o.**  
**Kamil Petříček**

výrobní ředitel

Plynářská 225/11  
Ústí nad Labem  
400 10

## Břežanské údolí, SO 04 – úsek 12A, objem odtěžených hmot

ČÍSLO ZAKÁZKY: 19/057

Vážená pane,

Na Vaší objednávku jsme provedli fotogrametrické měření objemu odtěžených hmot skalního masivu výše uvedeného SO 04. K odtěžení hmot došlo v rámci prací při sanaci skalního masivu. Hmoty byly uloženy na stávající komunikaci II/101 ve dvou skládkách a proto bylo měření i výpočet rozdělen na 2 samostatné části označené A a B.

Fotogrammetrický model byl zhotoven na základě leteckého snímkování a kalibrován na vřícovací body vyznačené na komunikaci ve vzdálenosti 10 m.

Výpočet byl spočten z rozdílů modelů generovaných do trojúhelníkové sítě – hlady a podklad. Stejný postup byl použit u obou lokalit.

Situace obou objektů je patrná z následujících obrázků:



Model oblasti A – modře znázorněna podkladní vrstva

Čistý objem 53,5 m<sup>3</sup> +/-1,07 m<sup>3</sup>



Model oblasti B – oranžově znázorněna podkladní vrstva

Čistý objem 221,0 m<sup>3</sup> +/-4,42 m<sup>3</sup>

Prostým součtem obou částí A a B dostáváme vytěžený objem 274,5 +/-5,49 m<sup>3</sup>.

Výpočtová nejistota byla stanovena jako 2% odchylka použitého kalibračního měřidla a použitého způsobu značení na komunikaci.

S pozdravem

Ing. Jakub Šíma  
Projektant - geotechnik



# BUNG

BUNG CZ s. r. o.  
V Olšínách 2300/75  
100 00 Praha 10 - Strašnice  
Mobil: +420 775 857 707  
E-Mail: miroslav.blazek@bung.cz  
www.bung.cz  
info@bung.cz

Věc: „II/101 Dolní Břežany - Zbraslav – havárie“ – souhlasné vyjádření k ZBV č.3

## ZBV 3 - SO 04 - Úsek 12A

Obsahem stavebního objektu SO 04, označovaného jako 12A, je sanace skalního masivu. Došlo zde ke vzniku skalního řízení, které začalo ohrožovat dopravu, a proto bylo nutné přistoupit bezodkladně k provedení sanačních prací. Předmětem objektu je zajištění skalních svahů (zářezů) na komunikaci II/101, spočívající v očištění svahů a instalaci typových opatření jako jsou bariéry, zábrany a pokrytí skalních svahů ocelovou sítí.

Po očištění skalního masivu od vegetace bylo zjištěno větší rozvolnění skály než se předpokládalo v původní PD. Aby bylo možné skálu zabezpečit sítěmi (kotvami), musela být tato rozvolněná část skály odstraněna až na soudržnou horninu. Z tohoto důvodu došlo k navýšení objemu odbourané hmoty skalního masivu (zvětralé části). Dále došlo k navýšení plochy opláštění z geomřížovin a redukci svorníků a vrtů.

Zhotovitelem předložené ocenění položek ZBV č.3 má TDS jako přiměřené a v daném místě obvyklé v hodnotách se sumární cenou položkového rozpočtu 490 894,45 Kč bez DPH.

Jedná se o Změnu nepodstatnou, nepředvídanou, která je tak podle § 5, odst. 1 písm. c), resp. podle § 10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29. 05. 2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná o změnu nepředvídanou.

TDS souhlasí předloženým návrhem ZBV č. 3

Toto souhlasné stanovisko nezbavuje zhotovitele povinnosti doložit cenu položek dle zásad pro procesování ZBV.

.....  
Bc. Jakub Slánský  
TDS



**GeoTec-GS, a.s.**  
Chmelová 2920/6  
106 00 Praha 10

**Krajská správa a údržba silnic  
Středočeského kraje, příspěvková organizace**

Ing. Aleš Čermák MBA  
Zborovská 81/11  
150 00 Praha 5 - Smíchov

Váš dopis značky / ze dne

naše značka  
22/1287/FD

vyřizuje / telefon  
Mgr. Filip Dudík / 271 750 710

dne:  
10.10.2022

**Věc: II/101 Dolní Břežany - Zbraslav  
Vyjádření AD č. 4**

**Číslo smlouvy objednatele: 146/00066001/2017**

**Číslo zakázky Zhotovitele: GTC/2017/395**

Vážený pane řediteli,

dne 4.7.2022 obdržel elektronicky AD od zhotovitele výše uvedené stavby návrh ZBV č. 3, který řeší změny v rozsahu očištění a zajištění skalního svahu SO 04 úsek 12A.

Po očištění skalního masivu od vegetace bylo zjištěno větší rozvolnění horninového masivu než se předpokládalo v PD. Na základě místního šetření byl navýšen rozsah očištění skalního svahu o uvolněné a porušené horniny, čímž došlo k navýšení objemu odbourané hmoty skalního masivu (zvětralé části). Současně byl upřesněn nezbytný rozsah zajištění očištěného skalního svahu kotvami a geomřížemi.

Z pozice AD sdělujeme, že změna rozsahu prací odpovídá reálnému stavu porušení skalního masivu. AD souhlasí s předloženým návrhem ZBV č. 3.

S pozdravem



Mgr. Filip Dudík  
ředitel společnosti

Denní záznamy stavby:

List č.

0638005

Datum:

FAPIŠ AD:

16.3.2012

Dnes bylo dne proběhla kontrola  
očistiv. Očistiv bylo provedeno řádně  
a lze přistoupit ke čtení. Při  
očistiv došlo ke zřízení objemu hmot  
náci PD. Na čtení bylo způsobeno  
zřídím rozvolnění mapy u  
přidělování PD.

Sancasní bylo upřesněno a odsouhlaseno  
u místní síti a zohledněno barier.

Dále bylo upřesněno čtení stromů.  
Vzhledem k zřídím očistiv došlo k  
redukci počtu stromů na 4 ks.  
Poloha stromů byla určena.

ŽA AD ŠTĀ:

A blue ribbon graphic with a 3D effect, appearing to wrap around the text. The ribbon is a vibrant blue color and has a slight shadow on its left side, giving it a sense of depth. It is positioned horizontally across the middle of the slide.

Fotodokumentace k očištění skalního masivu





Očišťování svahu






Svah po očištění od vegetace



General / Obecné



Částečně očištěný svah

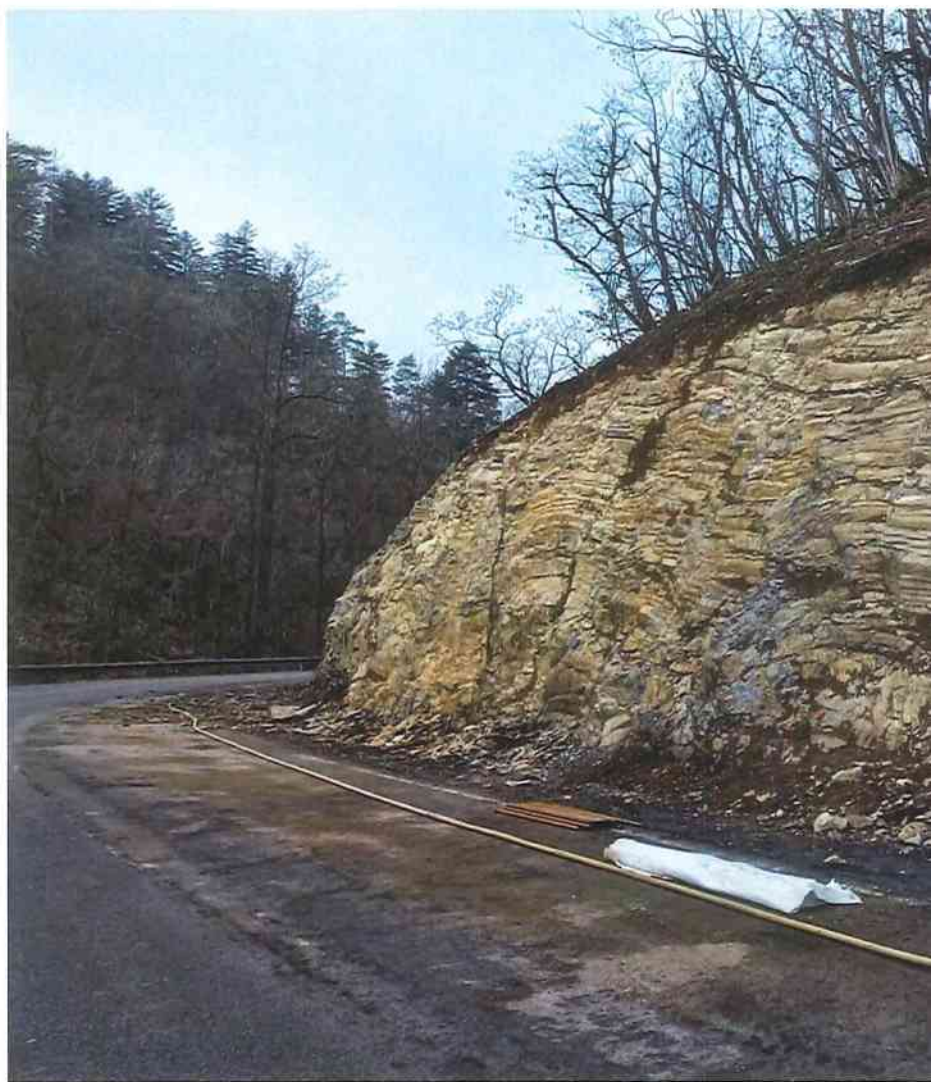

Svah po očištění





## Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby: <b>2017 - 395, II/101 Dolní Břežany - Zbraslav - havárie</b> Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>SO 201 – Most ev.č.101 - 011</b>	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: <b>201/1</b>	Číslo ZBV: <b>4</b>
--	---	------------------------

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace  
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov  
IČ: 00066001

Zhotovitel: Skanska, a.s.  
Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8 - Karlín  
IČ:26271303

## Rekapitulace ZBV č. 4 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4.3	-1 153 447,62	1 018 314,27	-135 133,35

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4.4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4	-1 153 447,62	1 018 314,27	-135 133,35

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.  
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy  
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list	Číslo paré:
------------------	-------------

## Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: 2017 - 395, II/101 Dolní Břežany - Zbraslav - havárie Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 201 – Most ev.č.101 - 011	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS:  201/1	Číslo ZBV:  4.3
--	--	-----------------------

Strany smlouvy o dílo objednatel č.:S-2537/00066001/2021 a zhotovitele č.10000156093 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 11.11.2021 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: Skanska, a.s., Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8 - Karlín

Přílohy Změnového listu:	Paré č.	Příjemce
1. Krycí list	1, 2	Objednatel
2. Změnový list	3	Zhotovitel
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	4	Projektant (AD)
4. Rozpis ocenění Změn položek	5	Stavební dozor
5. Přehled zařazení změn do skupin		
6. Přehled dalších dokladů		
Další doklady dle přehledu dokladů	34	

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny: Úprava tvaru levého křídla na OP1

V zadávací dokumentaci bylo navrženo levé křídlo mostu na samostatném základu s hlubinným založením.

Po provedení přípravných prací (po odstranění náletů a usazenin) byl zjištěn přesný tvar terénu, odlišný od předpokladů zadávací dokumentace. Realizace výkopů dle zadávací dokumentace by při nově zjištěném průběhu terénu vedla k poškození tří vzrostlých stromů nacházejících se v těsné blízkosti předmětného křídla mostu a k zásahu do paty svahu sousedního pozemku (viz doklad č. 08 - Oznámení Zhotovitele).

Na základě výzvy zástupce Objednatatele prověřil Zhotovitel možnost zachování všech tří vzrostlých stromů a paty svahu sousedního pozemku a navrhl konstrukční úpravu levého křídla mostu na stalicky zavěšené tak, aby se minimalizoval rozsah zemních prací (menší stavební jáma) a s tím souvisí i úprava založení na mikropilótech a úprava svodidla (viz doklad č. 10 - Zápis z 3. KD konaného dne 07.04. 2022, bod 6).

Změna byla projekčně zpracována do aktualizace RDS a odsouhlasena AD (viz doklad č. 12 - Vyjádření AD).

Tato změna je vyjádřena smluvními položkami 1, 10, 11, 12, 16-20, 24, 26, 27, 28 a položkami novými 51 a 59.

Výše uvedená změna snižuje smluvní cenu stavby o 135 133,35 Kč bez DPH.

Jedná se o Změnu nepodstatnou, nepředvídanou, která je tak podle § 5, odst. 1 písm. c), resp.podle § 10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29. 05. 2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná o změnu nepředvídanou.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-1 153 447,62	1 018 314,27	-135 133,35	2 171 761,89

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí): Skanska, a.s.	jméno	Ing. Jaroslav Svoboda	datum	podpis
Projektant (autorský dozor): GeoTec-GS, a.s.	jméno	Mgr. Filip Dudík	datum	podpis
Stavební dozor: BUNG CZ, s.r.o.	jméno	Bc. Jakub Slánský	datum	podpis
Supervize (Regionální dolační kancelář)	jméno	xxx	datum	podpis
Zástupce Objednatel: KSÚS	jméno	Ing. Martin Staněk	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitel sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel)	jméno	Ing. Jan Fidler, DiS.	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	Jiří Červenka	datum	podpis

Číslo paré:



**ZÁPIS**

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)  
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 4

Název Stavby:	2017 - 395, II/101 Dolní Břežany - Zbraslav - havárie
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	201/1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	SO 201 – Most ev.č.101 - 011

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
7 146 274,47

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	7 146 274,47	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-1 153 447,62	1 018 314,27	1 018 314,27	14,25%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-1 153 447,62	7 011 141,12	-135 133,35	-1,89%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): Ing. Jaroslav Svoboda  
Skanska, a.s. souhlasím

Projektant (autorský dozor): Mgr. Filip Dudík  
GeoTec-GS, a.s. souhlasím

Stavební dozor: Bc. Jakub Slánský  
BUNG CZ, s.r.o. souhlasím

Zástupce Objednatele KSÚS: Ing. Martin Staněk  
souhlasím

Zaměstnanec KSÚS  
odpovědný za cenové  
projednání Změny: Ing. Jaroslava Jurková  
souhlasím

## Rozpis ocenění Změn položek - celkem

## ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

## SO 201/1

## Skupina změn 3

Evidenční číslo a název stavby: 2017 - 395 - II/101 Dolní Břežany - Zbraslav - havárie

Číslo a název SO/PS: SO 201 – Most ev.č.101 - 011

Číslo a název rozpočtu: SO 201 – Most ev.č.101 - 011

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	015111	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -	T	3 157,310	2 295,310	-862,000	129,77	409 724,12	-111 861,74	0,00	297 862,38	-111 861,74	-27,30%
10	131738	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	1 420,000	989,000	-431,000	412,90	586 318,00	-177 959,90	0,00	408 358,10	-177 959,90	-30,35%
11	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	1 533,336	1 102,336	-431,000	11,80	18 093,36	-5 085,80	0,00	13 007,56	-5 085,80	-28,11%
12	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	1 210,800	779,800	-431,000	171,06	207 119,45	-73 726,86	0,00	133 392,59	-73 726,86	-35,60%
16	227831	MIKROPILOTY KOMPLET D DO 150MM NA POVRCHU	M	504,000	459,000	-45,000	2 833,64	1 428 154,56	-127 513,80	0,00	1 300 640,76	-127 513,80	-8,93%
17	26174	VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVR TŘ I A II D DO 200MM	M	336,000	0,000	-336,000	981,51	329 787,36	-329 787,36	0,00	0,00	-329 787,36	-100,00%
18	26184	VRT PRO KOTV, INJEK, MIKROPIL NA POVR TŘ III A IV D DO 200MM	M	168,000	0,000	-168,000	981,51	164 893,68	-164 893,68	0,00	0,00	-164 893,68	-100,00%
19	272325	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37	M3	63,000	56,900	-6,100	5 579,98	351 538,74	-34 037,88	0,00	317 500,86	-34 037,88	-9,68%
20	272365	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B	T	10,080	8,578	-1,502	35 107,87	353 887,33	-52 732,02	0,00	301 155,31	-52 732,02	-14,90%
24	317365	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B	T	2,199	1,840	-0,359	35 107,87	77 202,21	-12 603,73	0,00	64 598,48	-12 603,73	-16,33%
26	327365	VÝZTUŽ ZDI OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, B500B	T	2,880	2,475	-0,405	35 107,87	101 110,67	-14 218,69	0,00	86 891,98	-14 218,69	-14,06%
27	389325	MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37	M3	80,000	77,300	-2,700	9 432,88	754 630,40	-25 468,78	0,00	729 161,62	-25 468,78	-3,38%
28	389365	VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B	T	12,800	12,129	-0,671	35 107,87	449 380,74	-23 557,38	0,00	425 823,36	-23 557,38	-5,24%
		<b>Nové položky</b>											
51	26175.N	VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVR TŘ I A II D DO 300MM <i>JC dle OTSKP 2021</i>	M	0,000	459,000	459,000	1 970,00	0,00	0,00	904 230,00	904 230,00	904 230,00	100,00%
59	911383.N	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM <i>JC dle SoD, pol. č. 8 v SO 001</i>	M	0,000	276,300	276,300	412,90	0,00	0,00	114 084,27	114 084,27	114 084,27	100,00%
		<b>Celkem</b>							<b>- 1 153 447,62</b>	<b>1 018 314,27</b>	<b>5 096 707,27</b>	<b>- 135 133,35</b>	<b>- 1,89</b>

Odpovědný zástupce Objednatel i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu. Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Jaroslav Svoboda - hlavní stavbyvedoucí

Za Objednatel: Bc. Jakub Slánský - stavební dozor

Datum:

Datum:

Podpis:

Podpis:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: 2017 - 395 - II/101 Dolní Břežany - Zbraslav - havárie a 2019 - 113, II/101 Břežanské údolí, sanace skalních svahů

1	Přijaté smluvní částka bez rezervy a DPH	54 776 990,56
2=1+18+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	56 803 177,84
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	71 151 844,94
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	107,35%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(26/1)*100	Sledování záporných změn (Skupina 2)	0,00%
40=(19/1)*100	Sledování limitu 18 % pro pozastavenou částku pro Změny záporné (18, odst. (6), příloha 5)	-4,24%

6=(21+22)	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	4 026 187,08
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	7,33%
8=1*10,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	16 433 087,17

9=(23+11)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	7,81%
10=(25+11)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	12,03%
10A=(30A+30B)	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	10 658 002,08
11=1*10,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	27 338 495,28

12=(11/9)*18	Limit	8 218 848,58
13=(20/1)*100	Sledování limitu (18%)	0,00%
14=(A85(7)+(28))	Hodnota skupiny 5	0,00

		- 1 -					- 2 -					- 3 -					- 4 -					- 5 -							
		Vyhrazené změny (Dotazník (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.))					Záporné položky (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)					Změny rozdělovací (dle §222 odst. (8) zákona č. 134/2016 Sb.)					Změny rozptylné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)					Změny daňového Změny namítnuté celkovou převahou veřejná zájmy (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)							
SG	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (žadovat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (žadovat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadovat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadovat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (žadovat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (žadovat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadovat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (žadovat se znaménkem minus)	Změny kladné	Limit 18 %
15	17	18	19=21+20+29+33+37+38	20=24+27+30+34+37+38	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	33=29+30	33A+A85(7B)+30	30	31	30+33+34	35A+A85(3A)+34	27	28	29+28+37+38							
		2017 - 395 - II/101 Dolní Břežany - Zbraslav - havárie a 2019 - 113, II/101	- 3 419 487,56	7 448 894,98	4 026 187,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1 228 877,18	3 048 854,98	1 819 977,80	4 377 051,76	- 2 186 738,32	4 337 040,00	2 204 305,68	6 587 776,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
261	1	Úhrada zámluvní částky z rozpočtu MKP	- 2 186 738,32	4 337 040,00	2 204 305,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 2 186 738,32	4 337 040,00	2 204 305,68	6 587 776,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
180	2	Převod stavby z rozpočtu MKP na rozpočet MKP Písnice na DC a úhrada účtu Skopovské	0,00	1 328 758,84	1 328 758,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 328 758,84	1 328 758,84	1 328 758,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	3	Úhrada 17A dle zápisu o údržbě a zájmové skalních svahů	- 75 225,56	700 481,67	625 256,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 75 225,56	700 481,67	625 256,11	775 711,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
201	3	Mobilizace na stavbu včetně částky na DPH	- 1 153 447,82	1 618 314,27	464 866,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1 153 447,82	1 618 314,27	464 866,45	588 466,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

## Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	4
Název a evidenční číslo stavby:	<b>2017 - 395 - II/101 Dolní Břežany - Zbraslav - havárie</b>
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 201 – Most ev.č.101 - 011
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	201/1

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
07 Soupis prací SO po změnách	27	
08 Oznámení Zhotovitele	2	
09 Pokyn Objednatele	1	
10 Zápis ze 3.KD stavby dne 7.4.2022	2	
11 Vyjádření TDI	1	
12 Vyjádření AD	1	
Počet listů celkem	34	









Rozpis ocenění Změn položek - celkem

ZMĚNA SOUPLISU PRACÍ (SO/PS)

SO 201

celkem

Evidenční číslo a název stavby: 2017 - 395 - II/101 Dolní Břežany - Zbraslav - havárie

Číslo a název SO/PS: SO 201 – Most ev.č.101 - 011

Číslo a název rozpočtu: SO 201 – Most ev.č.101 - 011

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepkavost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plachy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku,												
9	12960	ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ	M3	44,000	44,000	0,000	471,88	20 762,72	0,00	0,00	20 762,72	0,00	0,00%	
		4,0=4,000 [A] ..... šířka koryta 55,0=55,000 [B] ..... délka čišťného úseku 0,2=0,200 [C] ..... mocnost náplavu Celkem: A*B*C=44,000 [D]												
		Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)												
10	131738	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽÍ NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO ŽOKM	M3	1 420,000	989,000	-431,000	412,90	586 318,00	-177 959,90	0,00	408 358,10	-177 959,90		

## Rozpis ocenění Změn položek - celkem

Evidenční číslo a název stavby: 2017 - 395 - II/101 Dolní Břežany - Zbraslav - havárie

## ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

SO 201

celkem

Číslo a název SO/PS: SO 201 – Most ev.č.101 - 011

Číslo a název rozpočtu: SO 201 – Most ev.č.101 - 011

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		<p>SOD 1420,0=-1 420,000 [A] ..... objem výkopu podle 3D modelu</p> <p>ZBV ZBV 4 odpočet -1420,0=-1 420,000 [A] ..... objem výkopu podle 3D modelu přípočet 989,0=989,000 [B]</p> <p><i>Celkem: A+B=- 431 000 [C]</i></p>											
		<p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem</li> <li>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené</li> <li>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li> <li>- ztižení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění</li> <li>- ztižení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.</li> <li>- příplatek za lepivost</li> <li>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)</li> <li>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)</li> <li>- potřebné snížení hladiny podzemní vody</li> <li>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů</li> <li>- vytahování a nošení výkopku</li> <li>- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni</li> <li>znehodnocené klimatickými vlivy</li> <li>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek</li> <li>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)</li> <li>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti</li> <li>- třídění výkopku</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li> <li>- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</li> </ul>											
11	17120	ULOŽENÍ ŠYPANINY DO NÁSYPU A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	1 533,336	1 102,336	-431,000	11,80	18 093,36	-5 085,80	0,00	13 007,56	-5 085,80	-28,13















## Rozpis ocenění Změn položek - celkem

Evidenční číslo a název stavby: 2017 - 395 - II/101 Dolní Břežany - Zbraslav - havárie								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: SO 201 – Most ev.č.101 - 011								SO 201					
Číslo a název rozpočtu: SO 201 – Most ev.č.101 - 011								celkem					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j., v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevnických prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vadivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74), - povrchovou antikorozi úpravy výztuže, - separaci výztuže, - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,											
21	28999	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE těsnící fólie 8,5*2*3,6=61,200 [A] ..... most 1,5*3,6=5,400 [B] ..... zeď Celkem: A+B=66,600 [C] Položka zahrnuje: - dodávku předepsané fólie - úpravu, očištění a ochranu podkladu - přichycení k podkladu, případně zatížení - úpravy spojů a zajištění okrajů - úpravy pro odvodnění - nutné přesahy - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu	M2	66,600	66,600	0,000	132,13	8 799,86	0,00	0,00	8 799,86	0,00	0,00%
		<b>3 Svislé konstrukce</b>						1 633 363,68	-75 848,58	0,00	1 557 515,10	-75 848,58	-0,39
22	31717	KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY včetně vrtání a vlepení 14+17=31,000 [A] ..... most 7+7=14,000 [B] ..... zdi Celkem: A+B=45,000 [C] Položka zahrnuje dodávku (výrobu) kotevnického prvku předepsaného tvaru a jeho osazení do předepsané polohy včetně nezbytných prací (vrty, zálivky apod.)	KG	45,000	45,000	0,000	244,20	10 989,00	0,00	0,00	10 989,00	0,00	0,00%
23	317325	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 beton C30/37 XF4/XD3/XC4 včetně letopočtu výstavby	M3	13,746	13,746	0,000	7 159,60	98 415,86	0,00	0,00	98 415,86	0,00	0,00%



## Rozpis ocenění Změn položek - celkem

Evidenční číslo a název stavby: 2017 - 395 - II/101 Dolní Břežany - Zbraslav - havárie

## ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

Číslo a název SO/PS: SO 201 – Most ev.č.101 - 011

## SO 201

Číslo a název rozpočtu: SO 201 – Most ev.č.101 - 011

## celkem

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		$0,29*17,7+0,29*(14,7+7,5+7,5)=13,746$ [A] položka zahrnuje: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, náلتků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zemínou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy zbitá												
24	317365	VÝSTUŽ ŽELEZA OCELI 10S05, B500B odhad 160,0 [kg/m3] SOD $13,746=13,746$ [A] ..... objem žb konstrukce (viz pol.č. 317325) $0,160=0,160$ [B] ..... odhad. mn. oceli na 1 m3 objemu konstrukce Celkem: $A*B=2,199$ [C]  ZBV ZBV 4 odpočet $-2,199=-2,199$ [A] přípočet $0,28+0,28+0,7+0,58=1,840$ [B]  Celkem: $A+B=-0,359$ [C]	T	2,199	1,840	-0,359	35 107,87	77 202,21	-12 603,73	0,00	64 598,48	-12 603,73		



## Rozpis ocenění Změn položek - celkem

Evidenční číslo a název stavby: 2017 - 395 - II/101 Dolní Břežany - Zbraslav - havárie

## ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

Číslo a název SO/PS: SO 201 – Most ev.č.101 - 011

## SO 201

Číslo a název rozpočtu: SO 201 – Most ev.č.101 - 011

## celkem

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,</li> <li>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,</li> <li>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,</li> <li>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vloček, opracování, očištění a ošetření,</li> <li>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odkružovacích prostředků,</li> <li>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,</li> <li>- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,</li> <li>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich,</li> <li>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,</li> <li>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povláků a nátěrů, případně vyspravení,</li> <li>- zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,</li> <li>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,</li> <li>- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,</li> <li>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,</li> <li>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zemínou nebo kamenivem,</li> <li>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,</li> </ul>											
26	327365	<p><b>VÝZTUŽ ZDI OPĚRNÝCH, ŽÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10S05, B500B</b></p> <p>ocel B500B; odhad 160 [kg/m<sup>3</sup>]</p> <p>SOD</p> <p>18,0*0,160=2,880 [A]</p> <p>objem žb konstrukce viz pol.č. 327325</p> <p>ZBV ZBV 4</p> <p>odpočet -2,88=-2,880 [A]</p> <p>přípočet 18/(18+18)*4,95=2,475 [B]</p> <p><i>Celkem: A+B=0,405 [C]</i></p>	T	2,880	2,475	-0,405	35 107,87	101 110,67	-14 218,69	0,00	86 891,98	-14 218,69	

## Rozpis ocenění Změn položek - celkem

## ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

## SO 201

## celkem

Evidenční číslo a název stavby: 2017 - 395 - II/101 Dolní Břežany - Zbraslav - havárie

Číslo a název SO/PS: SO 201 – Most ev.č.101 - 011

Číslo a název rozpočtu: SO 201 – Most ev.č.101 - 011

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimořádných a vnitřních dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřicích skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74), - povrchovou antikorozi úpravu výztuže, - separaci výztuže, - osazení měřicích zařízení a úpravy pro ně.											
27	389325	<b>MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/B7</b> beton C 30/37 XF4/XD3/XC4 SOD most - 3D model: 80,0=80,000 [A]  ZBV ZBV 4 odpočet most - 3D model: -80,0=-80,000 [A] přípočet 77,3=77,300 [B] Celkem: A+B=-2 700 [C]	M3	80,000	77,300	-2,700	9 432,88	754 630,40	-25 468,78	0,00	729 161,62	-25 468,78	













## Rozpis ocenění Změn položek - celkem

## ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

## SO 201

## celkem

Evidenční číslo a název stavby: 2017 - 395 - II/101 Dolní Břežany - Zbraslav - havárie

Číslo a název SO/PS: SO 201 – Most ev.č.101 - 011

Číslo a název rozpočtu: SO 201 – Most ev.č.101 - 011

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,</li> <li>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,</li> <li>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,</li> <li>- zřízení pracovních a dilatačních spár, včetně potřebných úprav, výplně, vloček, opracování, očištění a ošetření,</li> <li>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odkružovacích prostředků,</li> <li>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,</li> <li>- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,</li> <li>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich,</li> <li>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,</li> <li>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,</li> <li>- zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,</li> <li>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,</li> <li>- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,</li> <li>- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,</li> <li>- opatření povrchů betonu izolací proti zemi vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zemínou nebo kamenivem,</li> <li>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,</li> </ul>											
32	45157	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	25,650	25,650	0,000	707,82	18 155,58	0,00	0,00	18 155,58	0,00	0,00%
		<p>3,6*7,5*0,15*2*2=16,200 [A] ..... ochrana těsnicí vrstvy  1/2*(1,65+1,3)*5*4*0,1=2,950 [B] .... zakončení římsy  (4,0*11+12,0+9,0)*0,1=6,500 [C] ..... dlažba - koryto  Celkem: A+B+C=25,650 [D]</p>											
		položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál											
33	45852	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	65,076	65,076	0,000	707,82	46 062,09	0,00	0,00	46 062,09	0,00	0,00%





## Rozpis ocenění Změn položek - celkem

## ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

Evidenční číslo a název stavby: 2017 - 395 - II/101 Dolní Břežany - Zbraslav - havárie

Číslo a název SO/PS: SO 201 – Most ev.č.101 - 011

Číslo a název rozpočtu: SO 201 – Most ev.č.101 - 011

SO 201

celkem

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí šachet a pod.											
38	574D46	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 50MM	M2	44,250	44,250	0,000	332,68	14 721,09	0,00	0,00	14 721,09	0,00	0,00%
		<i>7,5*5,9=44,250 [A] ..... nová vozovka</i>											
		- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí šachet a pod.											
39	575F53	LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 40MM MODIFIK	M2	44,250	44,250	0,000	888,31	39 307,72	0,00	0,00	39 307,72	0,00	0,00%
		<i>7,5*5,9=44,250 [A] ..... nová vozovka</i>											
		- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí šachet a pod.											
40	576412	POŠYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 3KG/M2	M2	44,250	44,250	0,000	11,80	522,15	0,00	0,00	522,15	0,00	0,00%
		posyp MA drtí fr. 4/8											
		<i>7,5*5,9=44,250 [A] ..... nová vozovka</i>											
		- dodání obalovaného kameniva předepsané kvality a zrnitosti - posyp předepsaným množstvím											
		<b>6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů</b>						<b>16 079,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 079,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
41	62745	SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU	M2	11,600	11,600	0,000	766,81	8 895,00	0,00	0,00	8 895,00	0,00	0,00%





## Rozpis ocenění Změn položek - celkem

## ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

Evidenční číslo a název stavby: 2017 - 395 - II/101 Dolní Břežany - Zbraslav - havárie

Číslo a název SO/PS: SO 201 – Most ev.č.101 - 011

Číslo a název rozpočtu: SO 201 – Most ev.č.101 - 011

SO 201

celkem

Pař. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		- položka zahrnuje kompletní povlaky (l různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.											
	8	<b>Potrubí</b>						9 673,56	0,00	0,00	9 673,56	0,00	0,00
49	89914	ŠACHTOVÉ BETONOVÉ SKRUŽE SAMOSTATNÉ včetně zemních prací	KUS	4,000	4,000	0,000	2 418,39	9 673,56	0,00	0,00	9 673,56	0,00	0,00%
		odvodňující jímka DN800, výšky 1000 mm, ve výkopu 4[ks]=4,000 [A]											
		- Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení.											
	9	<b>Ostatní konstrukce a práce</b>						486 482,71	0,00	0,00	486 482,71	0,00	0,00
50	9117C1	SVOD OCELI ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ se svíslou výplní 17,7+29,7=47,400 [A]	M	47,400	47,400	0,000	9 071,89	430 007,59	0,00	0,00	430 007,59	0,00	0,00%
		položka zahrnuje: - kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích a diltačních prvků - montáž a osazení svodidla, kotvení, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrtý a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak, případně nivelační hmoty pod kotevní desky - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr - ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření											
		<del>zahřívající odrazky nebo retroreflexní fólie</del>											
52	91238	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU 2+2=4,000 [A]	KUS	4,000	4,000	0,000	304,36	1 217,44	0,00	0,00	1 217,44	0,00	0,00%
		položka zahrnuje: - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie											
53	91345	NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ viz PD příloha č.11 "Detaily", detail č.12/1 a 12/2 2*2=4,000 [A] ..... římsy	KUS	8,000	8,000	0,000	646,48	5 171,84	0,00	0,00	5 171,84	0,00	0,00%
		2*2=4,000 [E] ..... spodní stavba											
		<b>Celkem:</b> A+E=8,000 [E]											
		položka zahrnuje: - dodání a osazení nivelační značky včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu											
54	91355	EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU kompletní včetně připevnění	KUS	2,000	2,000	0,000	1 274,08	2 548,16	0,00	0,00	2 548,16	0,00	0,00%







## Rozpis ocenění Změn položek - celkem

## ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

## SO 201

## celkem

Evidenční číslo a název stavby: 2017 - 395 - II/101 Dolní Břežany - Zbraslav - havárie

Číslo a název SO/PS: SO 201 – Most ev.č.101 - 011

Číslo a název rozpočtu: SO 201 – Most ev.č.101 - 011

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	9	Ostatní konstrukce a práce						0,00	0,00	114 084,27	114 084,27	114 084,27	1,00
59	9113B3.N	SVOD DLO OCEĽ SILNIC JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	0,000	276,300	276,300	412,90	0,00	0,00	114 084,27	114 084,27	114 084,27	100,00
		Případný zisk z recyklace náleží objednateli. JOC dle SO 001											
		ZBV 4 JC dle SoD, pol. č. 8 v SO 001 309,1-32,8=276,300 (A)											
		položka zahrnuje: - demontáž a odstranění zařízení - jeho odvoz na předepsané místo											
		<b>Celkem</b>						<b>7 146 274,47</b>	<b>- 1 153 447,62</b>	<b>1 018 314,27</b>	<b>7 011 141,12</b>	<b>- 135 133,35</b>	<b>0,06</b>

**FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY č.4  
„II/101 Dolní Břežany – Zbraslav - havárie“**

Určeno: Ing. Aleš Čermák, Ph.D., MBA, ředitel KSÚS Sk, p.o.

Číslo SoD: S-2537/00066001/2021

Termín plnění: 7.3.2022 – 6.12.2022 (9 měsíců)

Celková cena díla: 54 776 990,56 Kč bez DPH

Zhotovitel: Skanska a.s., Křížíkova 682/34a, Praha 8 - Karlín

IČ: 26271303

Oprávněná osoba: Jiří Červenka

Telefonní spojení:

**Popis předmětu informace:** změna během výstavby z důvodu zachování 3 ks vzrostlých stromů podél mostního křídla

**Popis problému:** Z důvodu blízkosti vzrostlých stromů a paty svahu vedlejšího pozemku je nutné upravit levé křídlo mostu na straně „Dolní Břežany“ tak, aby se minimalizoval rozsah zemních prací (menší stavební jáma). S tím souvisí i úprava založení na mikropilotách.

Již dříve bylo zasláno „Ohlášení změny stavby č.1 – Úprava mikropilot“ (změna bezešvých trubek za HEB profily, včetně zvětšení průměru vrtu). Projekčně bude zpracováno jako aktualizace RDS a odsouhlaseno AD.

**Čeho se zhotovitel domáhá:** Zhotovitel uplatňuje změny položek spojené s úpravou mostního křídla, výkopů a založení na mikropilotách.

Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla: 4.7.2022

Datum, podpis oprávněné osoby

Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele:

V Říčanech  
29. 06. 2022  
Evidenční číslo:  
Číslo jednací:

Vážený pan  
Jiří Červenka  
Skanska a.s.  
Křížíkova 682/34a  
Praha 8 - Karlín

**Věc: II/101 Dolní Břežany – Zbraslav - havárie - Ohlášení změn během výstavby**

Dobrý den,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o. (dále jen KSÚS), jako investor akce „II/101 Dolní Břežany – Zbraslav - havárie“ je seznámena se žádostí o zpracování ZBV jehož předmětem je:

- Z důvodu blízkosti vzrostlých stromů a paty svahu vedlejšího pozemku je nutné upravit levé křídlo mostu na straně „Dolní Břežany“ tak, aby se minimalizoval rozsah zemních prací (menší stavební jáma). S tím souvisí i úprava založení na mikropilotách.  
Již dříve bylo zasláno „Ohlášení změny stavby č.1 – Úprava mikropilot“ (změna bezešvých trubek za HEB profily, včetně zvětšení průměru vrtu).

KSÚS bere na vědomí, že zhotovitel nemohl v době zadávací lhůty soutěže předvídat výskyt těchto okolností, a proto KSÚS žádá zhotovitele společnost Skanska a.s. o vypracování Změnových listů, a to v souladu se směrnicí KSÚS, která je nedílnou součástí Smlouvy o dílo. Tyto ZBV budou následně projednány a podrobně posouzeny supervizorem zakázky, následně budou posouzeny vedením KSÚS.

S pozdravem

Ing. Jan Fidler  
Statutární zástupce ředitele KSÚS

## Zápis z 3.kontrolního dne stavby II/101 Dolní Břežany-Zbraslav-havárie

**Kontrolní den**  
 číslo 3 konaný dne 07.04.2022

**Účastníci**  
 Viz. prezenční listina

**Program kontrolního dne**

1. Kontrola úkolů a prací
2. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby:
  - a) plnění věcného harmonogramu
  - b) popis provedených prací
  - c) finanční plnění
  - d) fotodokumentace
3. Kontrola kvality
4. Stav BOZP a PO
5. Různé
6. Nové úkoly

**1. Kontrola úkolů a prací**

Úkol číslo	Název	Skutečný stav plnění úkolu	Splněno
0/1	Rozhodnutí o mimořádném postupu	SO 04 Úsek 12A – vydáno dne 01.12.2021 Pro ostatní objekty – vydáno dne 16.03.2022	ANO
0/4	DIR	Bude řešen na základě „Rozhodnutí o mimořádném postupu“ pro SO 04 Úsek 12A. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vydán na dobu 60 dní (havárie)</li> <li>- stavba musí požádat o DIR do konce stavby</li> <li>- V koordinaci s TSK a ŘSD se řeší možnost otevření MUK Písnice</li> <li>- <b>Podána žádost na MD a MÚ Černošice</b></li> </ul>	Trvá
0/5	HMG	Zhotovitel provede aktualizaci HMG a doplní finanční HMG <ul style="list-style-type: none"> <li>- Finanční HMG předložen</li> <li>- Předložena aktualizace HMG ke dni 23.03.2022</li> </ul>	ANO ANO
0/6	RDS	Bude zpracovávána a předkládána postupně před zahájením prací na objektu. <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Odsouhlasen koncept SO 001, SO 201 a SO 251-1</b></li> </ul>	Trvá
0/9	Měření dronem	Měření proběhlo. Provádí se vyhodnocení.	Probíhá
1/11	ZBV SO 04	Na základě MŠ byl konstatován větší rozsah čištění stálního svahu, <b>větší rozsah opláštění z geomřížovin</b> a dále byl redukován rozsah svorníků na 4 ks oproti PD. Stavba předloží návrh ZBV 1	Trvá
2/12	Odkup materiálu	Na základě SOD stavba předloží návrh na odkup vybouraného materiálu: <ul style="list-style-type: none"> <li>- frézované asfalty</li> <li>- svodidla</li> <li>- dřevo</li> </ul>	Trvá

**Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby**

- |                                |   |
|--------------------------------|---|
| a) plnění věcného harmonogramu | Stavba probíhá dle HMG  |
| b) popis provedených prací     | SO 101.1 <ul style="list-style-type: none"> <li>- vyfrézováno</li> </ul> SO 251.1 <ul style="list-style-type: none"> <li>- těžba zeminy na základovou spáru</li> </ul> SO 04: |



- c) finanční plnění
- d) fotodokumentace

- výkopy pro základy palisád
- kotvení sítí

Předložen a odouhlasen soupis prací za březen 2022 průběžně

### 3. Kontrola kvality

a) zpráva o hodnocení kvality za uplynulé období

b) odsouhlasené materiály a TePř+KZP

TePř 01 Sanace skalního svahu – schválen, bude předložen dodatek  
TePř 02 Bourací práce – demolice mostu – předložen koncept  
TePř 03 Most a OZ, betonáž – předložen koncept  
TePř 04 Komunikace – předložen koncept  
TePř 05 Most, zásypy přechodové oblasti – předložen koncept  
TePř 06 Frézování - schválen

KZP 01 Sanace skalního svahu– schválen  
KZP 03 Most a OZ, betonáž – předložen koncept  
KZP 04 Komunikace – předložen koncept  
KZP 05 Most, zásypy přechodové oblasti – předložen koncept

### 4. Stav BOZP

Viz stavební deník

### 5. Různé

Stavba upozornila na nedostupnost bezešvých trubek pro mikropilotáž na globálním trhu.

### 6. Nové úkoly

Úkol číslo	Název	Obsah úkolu a požadovaný cílový stav	Odpovídá	Termín
3/13	SO 201 – mostní křídlo	Na základě místních poměrů a možnosti ponechání tří vzrostlých stromů TDS požaduje prověřit možnost zkrácení případně vyvážení křídla	stavba	ANO

### 7. Závěr

Datum konání příštího KD 21.04.2022 od 10.00 hod. **příjezd od Dolních Břežan**

Zapsala

Bc. Jakub Slánský  
TDS

Podpis

# BUNG

BUNG CZ s. r. o.  
V Olšínách 2300/75  
100 00 Praha 10 - Strašnice  
Mobil:  
E-Mail  
www.bung.cz  
info@bung.cz

Věc: „II/101 Dolní Břežany - Zbraslav – havárie“ – souhlasné vyjádření k ZBV č.4

## ZBV 4 - SO 201 - Most ev.č.101 - 011

Obsahem stavebního objektu SO 201 je výstavbu nového mostu. Nový most tvoří monolitický železobetonový otevřený rám s rovnoběžnými zavěšenými křídly a základovými pasy. Základová jáma bude provedena svahovaná. Založení je hlubinné na mikropilotách vetknutých do skalního podkladu. Mikropiloty jsou vetknuty do základového bloku. Stěny rámu mají konstantní tl. 0.5 m, výšku ~3 m. Do rámu jsou vetknuta rovnoběžná křídla tl. 0.5 m. Nosnou konstrukci tvoří železobetonová deska konstantní tloušťky 0.35 m s protispádem pod nižší římsou. Příčný sklon je jednostranný, proměnný v rámci mostu je 0.9–1.43 %. Nulový příčný sklon je až za mostem za křídly. Podélný sklon je v rámci mostu konstantní 0.83 %. Světlost mostu je kolmo 4.0 m, šikmo 4.692 m. Římsy jsou železobetonové monolitické šířky 0.8 m. Zádržný systém tvoří odrazný obrubník a zábradelní svodidlo se svislou výplní. Šířka mezi římsami je 7.5 m. Koryto pod mostem je opatřeno kamennou dlažbou. Na nátokové straně (vpravo) bude stávající kamenné opevnění levého břehu přespárováno, náporová strana OP1 vpravo + opěrná zeď navazující na pravé křídlo OP1 budou ochráněny těžkým kamenným záhozem. Na pravé křídlo před mostem navazuje železobetonová opěrná úhlová zeď.

Předmětem této změny je úprava levého křídla mostu na straně Dolní Břežany tak, aby mohly být zachovány 3 vzrostlé stromy v její těsné blízkosti a pata svahu vedlejšího pozemku. Z tohoto důvodu bylo konstrukčně upraveno levé křídlo mostu tak, aby se minimalizoval rozsah zemních prací (menší stavební jáma) a s tím souvisí i úprava založení na mikropilotách a úprava svodidla. Projekčně bylo zpracováno jako aktualizace RDS a odsouhlaseno AD.

Zhotovitelem předložené ocenění položek ZBV č.4 má TDS jako přiměřené a v daném místě obvyklé v hodnotách se sumární cenou položkového rozpočtu -135 133,35 Kč bez DPH.

Jedná se o Změnu nepodstatnou, nepředvídanou, která je tak podle § 5, odst. 1 písm. c), resp. podle § 10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29. 05. 2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná o změnu nepředvídanou.

TDS souhlasí předloženým návrhem ZBV č. 4

Toto souhlasné stanovisko nezavazuje zhotovitele povinnosti doložit cenu položek dle zásad pro procesování ZBV.

.....  
Bc. Jakub Slánský  
TDS

Sídlo společnosti:  
100 00 Praha 10 – Strašnice, V Olšínách 2300/75  
Jednatel:  
Peter Píltner  
Miroslav Blažek

Obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze  
odkíl C, vložka 113589  
IČ: 274 54 576, DIČ: CZ 274 54 576  
Certifikace dle ISO 9001:2015

Bankovní spojení Raiffeisenbank, a.s.: č.ú.:  
IBAN

**GeoTec-GS, a.s.**  
Chmelová 2920/6  
106 00 Praha 10

**Krajská správa a údržba silnic  
Středočeského kraje, příspěvková organizace**  
Ing. Aleš Čermák MBA  
Zborovská 81/11  
150 00 Praha 5 - Smíchov

Váš dopis značky / ze dne

naše značka  
22/1275/FD

vyřizuje / telefon  
Mgr. Filip Dudík

dne:  
19.9.2022

**Věc: II/101 Dolní Břežany - Zbraslav  
Vyjádření AD č. 3**

**Číslo smlouvy objednatele: 146/00066001/2017**

**Číslo zakázky Zhotovitele: GTC/2017/395**

Vážený pane řediteli,

Dne 1. 9. 2022 jsme byli zástupcem zhotovitele, Ing. Svobodou, informováni o záměru zhotovitele provést levé křídlo na opěře 1 SO 201 jako zavěšené, tj. nikoli spočívající na samostatném základě s vlastním hlubinným založením. Rovněž jsme byli obeznámeni se změnou RDS, která upravený návrh projekčně zpracovává.

Úprava technického řešení reaguje na zjištění po provedení přípravných prací: po odstranění náletů a usazenin byl zjištěn přesný tvar terénu, odlišný od předpokladů přípravné dokumentace. Zároveň byl formulován požadavek na zachování všech tří vzrostlých stromů, nacházející se vlevo od předmětného křídla, k jejichž nevratnému poškození by došlo realizací výkopů v kontextu detailně zaměřeného (očištěného) terénu.

Z pozice AD sdělujeme, že náhrada samostatně založeného křídla zavěšeným křídlem na opěře 1 vlevo je možná, vhodná, z hlediska záměru, sledovaného návrhem v PDPS, se jedná o plnohodnotné řešení, a AD požaduje respektovat nově navržené řešení podle (změny) RDS.

AD souhlasí s předloženým návrhem ZBV č. 4.

S pozdravem

Mgr. Filip Dudík  
ředitel společnosti
