

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

III/25934 Dolní Vidim, most ev.č. 25934-3 přes strouhu v obci Dolní Vidim

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

Číslo ZBV:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Most ev. č. 25934-3

201 / 1

1

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smichov
IČ: 00066001

Zhotovitel: 3K značky, s.r.o.
Jiráskova 1519/8, Říčany 251 01
IČ: 250 56 271

Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.3	-290 678,68	0,00	-290 678,68

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1	-290 678,68	0,00	-290 678,68

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré:

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby:

III/25934 Dolní Vidim, most ev.č. 25934-3 přes strouhu v obci Dolní Vidim

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Most ev. č. 25934-3

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

201 / 1

Číslo ZBV:

1

Strany smlouvy o dílo č. 1535/00066001/2018 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 4.6.2018 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: 3K značky s.r.o., Jiráskova 1519/8, Říčany 251 01

Přílohy Změnového listu:

1. Krycí list	1	počet listů
2. Změnový list	1	počet listů
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů
4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů
7. Další doklady	6	počet listů

Paré č.

Příjemce

1. 2	Objednatel
3	Zhotovitel
4	TDI
5	Projektant

Iniciátor změny: zhotovitel (3K značky s.r.o., Jiráskova 1519/8, Říčany 251 01)

Popis a zdůvodnění Změny:

Během výstavby proběhlo jednání výrobního výboru stavby - dokument je přiložen, kde bylo konstatováno, že nebude realizována provizorní přeložka vodovodu. Při stavební činnosti nedochází přímo ke kontaktu s potrubím vodovodu a nebude hrozit při zemních pracích pohyb zeminy, která by mohla poškodit vodovodní řad. Z tohoto důvodu se nerealizovaly štětové stěny. Nebylo třeba čerpat vodu. Na základě vyjádření památkového ústavu se nerealizovala svislá výplň zábradlí.

Závěr:

Jedná se o Změnu nepodstatnou, nepředvídanou, která je tak podle § 5, odst. 1, písm.c) Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29.5.2017) upřesňující provádění změn závazku dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. se jedná o nepodstatnou změnu závazku a dle § 222 odst. 6 se jedná o změnu nepředvídanou.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-290 678,68	0,00	-290 678,68	290 678,68

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:Zhotovitel (stavbyvedoucí):
3K značky, s.r.o.

jméno

Pavel Svoboda

datum

podpis

Projektant (autorský dozor):
Pontex s.r.o.

jméno

Ing. Jan Komanec

datum

podpis

Technický dozor investora:
3L studio s.r.o.

jméno

Mgr. Tomáš Dunda

datum

podpis

Zástupce objednatele:
KSUS SK, p.o.

jméno

Miroslav Týnek

datum

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba
Objednatele)

jméno

Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA

datum

podpis

Zhotovitel (jednatel spol.)

jméno

Lubomír Lágner

datum

podpis

Číslo paré:

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 1**

Název Stavby: III/25934 Dolní Vidim, most ev.č. 25934-3 přes strouhu v obci Dolní Vidim			
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	201 / 1		
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Most ev. č. 25934-3			

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
2 057 953,23

Poznámka

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	2 057 953,23	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-290 678,68	0,00	0,00	0,00%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-290 678,68	1 767 274,55	-290 678,68	-14,12%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

3K značky, s.r.o. Pavel Svoboda souhlasím

Projektant (autor. dozor):

Pontex s.r.o. Ing. Jan Komanec souhlasím

Stavební dozor:

3L studio s.r.o. Mgr. Tomáš Dunda souhlasím

Zástupce objednatele:

KSÚS SK Miroslav Týnek souhlasím

Zaměstnanec objednatele

odpovědného za cenové

projednání změny: Petr Heinrich souhlasím

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 1													
Evidenční číslo a název stavby: "Most na místní komunikaci v obci Nouzov" Číslo a název SO/PS: SO 201 - Most ev. Č. 25934-3								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								č.1					
								Skupina Změn: 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	11511	ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN	HOD	642,000	0,000	- 642,00	76,00	48 792,00	- 48 792,00	0,00	0,00	- 48 792,00	- 100,00
18	23217A	ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ DOČASNÉ (PLOCHA) zemina, kamenivo	M2	74,042	0,000	- 74,04	2 100,00	155 488,20	- 155 488,20	0,00	0,00	- 155 488,20	- 100,00
19	23717A	ODSTRANĚNÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ V PLOŠE prostý beton	M2	74,042	0,000	- 74,04	710,00	52 569,82	- 52 569,82	0,00	0,00	- 52 569,82	- 100,00
48	9111B1	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	15,882	0,000	- 15,88	2 130,00	33 828,66	- 33 828,66	0,00	0,00	- 33 828,66	- 100,00
		Celkem						290 678,68	-290 678,68	0,00	0,00	-290 678,68	0,00

1	Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	3 531 730,99
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby) bez DPH	3 241 052,31
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	3 921 673,30
3=(2/1)*100	Procento změny přijaté smluvní částky	91,77%
4=(24/1)*100	Středování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(27/1)*100	Středování záporných položek (Skupina 2)	0,00%
40=(19/1)*100	Středování limitů 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 4, odst. (5), písm. b)	-8,23%

6=30+34	Suma Změn záporných a Změn kladných Skupiny 3 a Skupiny 4	- 290 678,68	bez ABS
7=(61)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	-8,23%	
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	1 059 519,30	

$9 = (31/1) \cdot 100$ $10 = (35/1) \cdot 100$ $11 = 1 \cdot 10,5$	Sledování limitu 50 % Skupina 3	8,23%	ABS	
	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,00%		ABS
	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	1 765 865,50		

12=(36+37)/1*100	Sledování limitů 15 %	0,00%
13=36+37	Sledování limitů 149 224 000 Kč	0,00
14=149224000-13	Zbývá do limitů	149 224 000,00

Skupiny změn

Skupiny změn				
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)	Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)	Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)	Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)	Změny de minimis Změny neměnnici celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)

[illegible]

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	1	
Název a evidenční číslo stavby:	III/25934 Dolní Vidim, most ev.č. 25934-3 přes strouhu v obci Dolní Vidim	
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Most ev. č. 25934-3	
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	201 / 1	

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
Změnový soupis prací SO 201 po ZBV I	2	
Vyjádření národního památkového ústavu	2	
Žádost KSÚS o změnu rozsahu díla	2	
Počet listů celkem	6	0

ZMĚNOVÝ SOUPIS PRACÍ PO ZBV

Stavba:

Most Vidím

Objekt:

SO 201 Most ev. č. 25934-3

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							1 767 274,55
1	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU - ZEMINA, KÁMEN A - místo uložení (skládky) zajistí zhotovitel, - nebo dle požadavku investora	T	324,382	400,00	129 752,80
2	K	02940	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ Projekt sledování a údržby mostu	KPL	1,000	50 000,00	50 000,00
3	K	029412	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO	KUS	1,000	15 000,00	15 000,00
4	K	02950	OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, Výpočet zatížitelnosti	KPL	1,000	45 000,00	45 000,00
5	K	02953	OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ 1. HMP	KUS	1,000	25 000,00	25 000,00
6	K	11511	ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN Pro betonovací potrubí, - dle potřeby pouze v případě nutnosti a jinými náklady čerpání potrubí do vzdálenosti přesahující 100 m. Kámen železný	HOD	0,000	76,00	0,00
7	K	11524	PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 400 NEBO ŽLABY Odlehčovací potrubí pro čerpání vody	M	21,200	654,00	13 864,80
8	K	12110	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY Včetně skvozu a úklidu na skvozu (mimojezdni) pro dle potřeby, - tl. do 200 mm	M3	26,068	48,00	1 251,26
9	K	12931	ČISTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M Obnova příkopu	M	15,000	85,00	1 275,00
10	K	12960	ČISTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD Stavování nárysu - tl. do 200 mm, - na vzdálenosti x x 1,2 m, - na výšku x x 1,5 m	M3	4,500	2 070,00	9 315,00
11	K	13183	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR II Stavební jáma	M3	276,973	343,00	95 001,74
12	K	13283	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. II Pro betonové prahy	M3	5,623	877,00	4 931,37
13	K	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY - doprava a uložení na skládku	M3	202,739	16,00	3 243,82
14	K	17411	ZASYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZJUTNĚNÍM Zasyp stavební jámy do přeexpanzního stavu, - z odvození zeminy na mezideponii	M3	193,739	104,00	20 148,86
15	K	17481	ZASYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ - natěsnit zasyp po vrstvách max. 300 mm tloušťky propustku, - zasyp ze náloží	M3	77,611	593,00	46 023,32
16	K	18233	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,20M Včetně přivezení z mezideponie	M2	175,340	31,00	5 435,54
17	K	18242	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI Zatrávnění	M2	175,340	17,00	2 980,78
18	K	23217A	ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ Štětovnicové pažení jámy, - uvedena pouze viditelná plocha	M2	0,000	2 100,00	0,00
19	K	23717A	ODSTRANĚNÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH Štětovnicové pažení jámy, - uvedena pouze viditelná plocha	M2	0,000	710,00	0,00
20	K	272325	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) Zaklady koryt C30/37-XF3, X01, X02, - vlc. deštěním, vlc. vyplně a tesněn prac. a dílat. srovn. a dalších specifikačních náležitostí - včetně odstavování zářezů	M3	4,245	3 790,00	16 088,55
21	K	272365	VYVŮŽKA ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B Uvažováno 120 kg/m3, - zaručené svařitelné	T	0,509	24 800,00	12 623,20
22	K	317325	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) C30/37-XF3, X02, X01, - včetně deštěním, vyplně a tesněn prac. a srovn. včetně dalších zářezů, - kabelem do mostního osování betonářské vyvážky	M3	4,195	9 260,00	38 845,70
23	K	317365	VYVŮŽKA ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B Odhad 150 kg/m3	T	0,629	25 200,00	15 850,80
24	K	333325	MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO Křídla C30/37-XF3, X01, X02, - vlc. deštěním, vlc. vyplně a tesněn prac. a dílat. srovn. a dalších specifikačních náležitostí - včetně odstavování zářezů	M3	6,422	5 110,00	32 816,42
25	K	333365	VYVŮŽKA MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, Uvažováno 150 kg/m3, - zaručené svařitelné	T	0,963	24 800,00	23 882,40
26	K	389325	MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE Konstrukce rámcové konstrukce C30/37-XF3, X01, X02, - vlc. deštěním, vlc. vyplně a tesněn prac. a dílat. srovn. a dalších specifikačních náležitostí - včetně	M3	41,388	6 750,00	279 369,00
27	K	389365	VYVŮŽKA MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI Uvažováno 180 kg/m3, - zaručené svařitelné	T	7,450	24 200,00	180 290,00
28	K	451312	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTĚHO Betonové sedlo pod troubu propustku C25/30-XF3	M3	7,782	2 310,00	17 976,42
29	K	451314	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTĚHO Betonové sedlo pod troubu propustku C25/30-XF3	M3	0,848	2 690,00	2 281,12
30	K	45152	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA Štěrka tl. 50-0-32 tl. 150 mm	M3	6,114	770,00	4 707,78
31	K	451522	VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX Válcovaná štěrka tl. 0-32 mm, tl. 150 mm	M3	4,192	814,00	3 412,29
32	K	46251	ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE Těžký kamenný zához (200 kg/ks) včetně prosypání štěrkem	M3	4,271	944,00	4 031,82
33	K	46451	POHOZ DNA A SVAHŮ Z LOMOVÉHO KAMENE zpevnění plochy na rovnou stranu mostu kamenný vrstvou 100 mm zátlačování do zhušťovacího a zpevněního kamenného vodoteče - srovn.	M3	0,450	992,00	446,40
34	K	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC - Kamenná dlažba ve vrstvě tl. 200 mm do betonové lože C20/25-X03 tl. 150 mm do betonové dlažby C20/25-X03 tl. 200 mm do betonové dlažby	M3	6,566	4 540,00	29 809,64
35	K	467314	ŠTUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTĚHO Křídla betonové prahy, - včetně deštěním, vyplně a tesněn prac. a penetračním nátěrem, ALP a dvojitým postřikem nátěrem ze studené ALN	M3	5,623	5 010,00	28 171,23
36	K	56143	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL. DO 150MM Směs zpevněná cementem SC C/8/10 tl. 150 mm	M2	40,755	252,00	10 270,26
37	K	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 Postřik infiltrační PI EK 1,0 kg/m2	M2	77,935	17,00	1 324,90
38	K	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO Postřik spojovací PS-EP 0,35 kg/m2 a C 60 B3 0,3 kg/m2	M2	185,890	12,00	2 230,68

39	K	574B34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY	M2	107,935	224,00	24 181,92
40	K	574D56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK	M2	77,935	301,00	23 458,44
41	K	574F88	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY	M2	77,935	417,00	32 498,90
42	K	575F53	LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE)	M2	30,020	515,00	15 460,30
43	K	57793B	VÝSPRAVA VÝTLUKU SMĚSI ACO MODIFIK TL DO	M2	250,000	1 070,00	267 500,00
44	K	711112	IZOLACE BEŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMŇI	M2	35,295	206,00	7 270,77
45	K	711412	IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI	M2	39,389	495,00	19 497,56
46	K	711502	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI	M2	14,507	214,00	3 104,50
47	K	78382	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B)	M2	5,333	311,00	1 658,56
48	K	9111B1	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ -	M	0,000	2 130,00	0,00
49	K	91345	NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ	KUS	2,000	686,00	1 372,00
50	K	91355	EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU	KUS	2,000	1 020,00	2 040,00
51	K	917424	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH	M	3,000	1 480,00	4 440,00
52	K	91744	CHODNÍK OBRUBY Z KAMEN ŘEZANÝCH STUPŇŮ	M	30,948	2 800,00	86 654,40
53	K	918146	ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO	KUS	2,000	11 500,00	23 000,00
54	K	918346	PROPUSTY Z TRUB DN 400MM	M	6,390	2 270,00	14 505,30
55	K	936385	ŽELEZOBETONOVÉ MONOLITICKÉ SLOUPKY	M3	1,188	40 000,00	47 520,00
56	K	936504	MADLA ATYPICKÉHO ZÁBRADLÍ	KG	204,590	100,00	20 459,00


Cena bez DPH **1 767 274,55 Kč**

DPH 21% **371 127,66 Kč**


Cena vč. DPH **2 138 402,21 Kč**

KONCEPCE ZÁBRADLÍ

POHLED 1:50

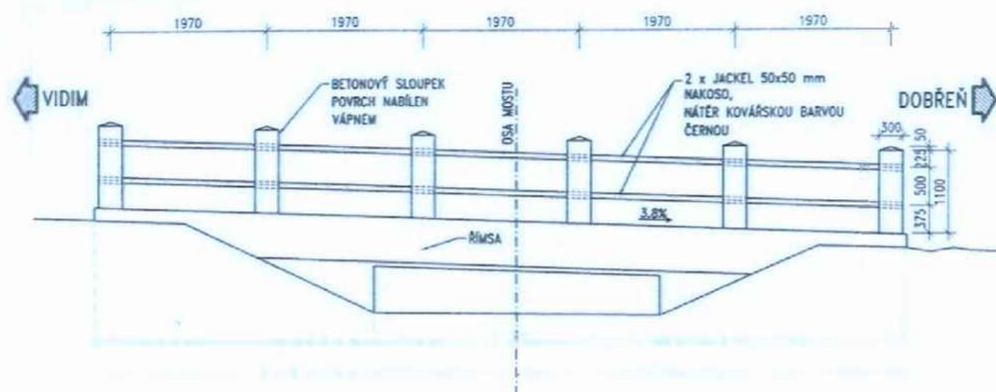

PŘÍČNÝ ŘEZ 1:50



CDSDUCHASE NE' REŠENÍ ZÁBRADLÍ
NAVRH RESPEKTUJE VYHODNĚNÍ
NŘ ÚOP STŘEDNÍCH ŮECH V PRAZE
CJ. NŘ-321/46408/2017 ZE DNE 28.6.2017,
KTERÉ MLO PODKLADĚM PRO PŘÍSLUŠNÉ
ZÁVAZNÉ STANOVISKO ORGÁNU PATA'TROVÉ
PEČE

c			
b			
a			
č.	text změny – odůvodnění	datum	podpis

Souřadnicový systém: S-JTSK
Výškový systém: Bpv


Číslo zakázky:	17 013 01	HP
Schválil:	Ing. Václav KOTZDAL	Zodp. projektant: Ing. Jan KOMANEČ
	241096748, jan@pontex.cz	
Tech. kontrola:	Ing. Václav Kvasnicka	Vypracoval: Ing. Erika MENŠICHOVÁ
	608302647, eva@pontex.cz	




Objednatel:	SK znošky s.r.o.	Objekt:	Vidim	Kraj:	Středočeský
Adresa:	Most ev. č. 25934-3 přes strouhu v obci Dolní Vidim	Datum:	07/2018	Stupeň:	RDS
Objekt:	SO 201 – MOST	Stranová:	Č. přílohy		
Předmět:	KONCEPCE ZÁBRADLÍ				

KONCEPCE ZÁBRADLÍ

POHLED 1:50

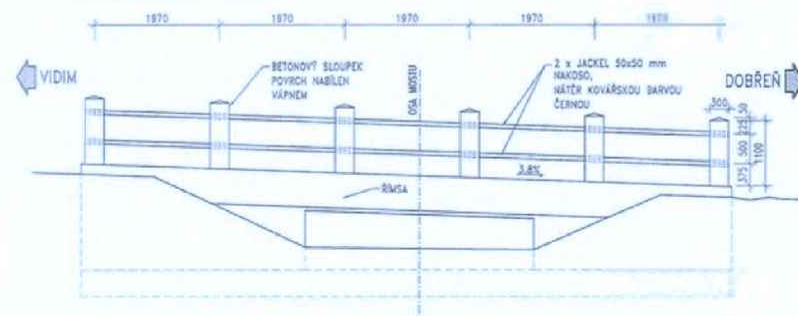

PŘÍČNÝ ŘEZ 1:50



17.9.2018
 17.9.2018/12.12.2018
 17.9.2018/12.12.2018

1			
2			
3			
4	text změny – odůvodnění	datum	podpis

Souřadnicový systém: S-JTSK
 Výškový systém: Bp

Číslo zakázky:	17 013 01	
Stavba:	Ing. Václav MYŠKAL	Zona projektant: Ing. Jan KOMÁNEC
Tech. kontrola:	Ing. Václav MYŠKAL	Výpracoval: Ing. Ervín KREJČÍK
	62833647, email@pntex.cz	



Stavba:	SE změny s.r.o. - člen	Výška:	1700	Stupeň:	Staven
Adresa:	Měst. sv. č. 25934-3 přes strouhu v obci Dolní Vidim	Datum:	07/2018	Stupeň:	RDS
Objekt:	SO 201 – MOST	Stupeň:	Staven	Stupeň:	Staven
Projekt:	KONCEPCE ZÁBRADLÍ	Stupeň:	Staven	Stupeň:	Staven

III/25934 Dolní Vidim, most ev.č. 25934-3 přes strouhu v obci Dolní Vidim

S odvoláním na článek 6 Práva a povinnosti objednatel Smlouvy o dílo 1535/00066001/2018 ze dne 4.6. 2018, odst 6.6:

Objednatel může požadovat změnu rozsahu Díla či schválit změnu rozsahu Díla navrženou Zhotovitelem, a to při respektování povinností Objednatel dle Zákona o ZVZ a interních předpisů Objednatel, zejména pak Směrnice ředitele Objednatel ke změnám staveb (dále je „Směrnice“), která tvoří přílohu č. 4 této Smlouvy. Zhotovitel bere obsah Směrnice na vědomí a zavazuje se, že při administraci změn nebude postupovat v rozporu se Směrnicí a že nebude na Objednateli uplatňovat nároky ze změn před schválením těchto změn postupem, který Směrnice stanoví. Zhotovitel je v případě takového rozhodnutí Objednatel o změně rozsahu Díla povinen Objednateli vyhovět a (i) snížit rozsah Díla nebo (ii) bez zbytečného odkladu podat nabídku na zvýšení rozsahu Díla o plnění stejného charakteru jako Dílo sjednané ve Smlouvě s tím, že:

- a) při snížení rozsahu se Cena Díla odpovídajícím způsobem sníží,
- b) při zvýšení rozsahu bude Cena Díla v nabídce Zhotovitel stanovena na základě cen uvedených v Nabídce v Oceněném soupisu prací. V případě , že není možné Cenu Díla stanovit tímto způsobem, bude Cena Díla stanovena na základě expertních cen uvedených např. v Oborovém třídílníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací (OTSKP-SPK) platných pro dané období nebo v cenách nižších. V případě, že není možné Cenu Díla stanovit ani tímto způsobem, bude Cena Díla stanovena ve výši ceny obvyklé v místě a čase, zjištěné na podkladě průzkumu trhu provedeného Zhotovitelem formou získání alespoň tří nezávislých nabídek jiných zhotovitelů. Doklady o provedeném průzkumu trhu a jeho výsledcích je Zhotovitel povinen předat Objednateli.
- c) Změny budou administrovány postupem stanoveným ve Směrnicí, přičemž snížení či zvýšení rozsahu bude upraveno písemným dodatkem Smlouvy, kterým může být i Změnový list změny stavby podepsaný ze strany osob oprávněných jednat za Objednatel a Zhotovitel
- d) Případná změna termínů plnění bude vždy sjednána formou písemného dodatku k této Smlouvě (tj. nikoli formou Změnového listu), a to i v případě, pokud by souvisela se změnami sjednanými Změnovým listem. Změna termínů je možná pouze v případě, že taková změna nemá charakter podstatné změny závazku ve smyslu § 222 Zákona o ZVZ,
- e) Zhotovitel se zavazuje vyhotovovat Změnové listy a jejich přílohy a předkládat je Objednateli výlučně ve formátu, který stanoví Směrnice

žádáme o změnu rozsahu díla v souladu s návrhem, který spočívá v tom, že :

1. Nebudou realizovány štětové stěny z důvodu dostatečné soudržnosti podkladních vrstev. Stěny výkopu budou vysvahovány v poměru 1 : 1.
2. Nebylo třeba čerpat vodu a to z toho důvodu, že v průběhu výkopových ani následných prací nebyly zjištěny žádné průsaky podpovrchové ani nátokové povrchové vody.
3. Bude vypuštěna svislá výplň zábradlí a to na základě požadavků zástupce NPU .



Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

4. Nebude realizována přeložka vodovodu. Bylo zjištěno, že při stavební činnosti nedochází přímo ke kontaktu s potrubím vodovodu a nebude hrozit při zemních pracích pohyb zeminy, která by mohla poškodit vodovodní řad.

Miroslav Týnek
Mostní technik MH

V Mělníku dne 16.3. 2019
