

## Krycí list ZBV

Název Stavby dle SoD: III/2802 Březno rekonstrukce silnice – chodník na Novou Telib Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO.110.2 - Komunikace	Číslo SO/PS / / pořadí Změny SO/PS:  SO.110.2 / 1	Číslo ZBV:  6
---	--	---------------------

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace  
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov  
IČ: 00066001

Městys Březno  
Březno 13, 294 06  
IČ: 00237574

Zhotovitel: H-INTES s.r.o.  
Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav  
IČ: 25636332

## Rekapitulace ZBV č. 6 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
6.1	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
6.2	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
6.3	-154 281,73	300 701,56	146 419,83

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
6.4	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
6.5	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ SUMA	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
<b>6</b>	<b>-154 281,73</b>	<b>300 701,56</b>	<b>146 419,83</b>

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.  
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Změnové listy (02)  
a pro Rozpis ocenění změn položek (04).

## Změnový list

<b>Název Stavby dle SoD:</b> III/2802 Březno rekonstrukce silnice – chodník na Novou Telib <b>Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):</b> SO.110.2 - Komunikace	Číslo SO/PS / / pořadí Změny SO/PS:  SO.110.2 / 1	Číslo ZBV / Skupina změny:  6 / 3																								
Strany smlouvy o dílo S-775/00066001/2023; (RM 3/21/1/2023 ze dne 10.2.2023) na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 24.3.2023 (dále jen Smlouva): Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov Zhotovitel: H-INTES s.r.o., Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav																										
<b>Přílohy Změnového listu:</b>  <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 30%;">1. Krycí list</td><td style="width: 10%; text-align: center;">1</td><td style="width: 60%;">počet listů</td></tr> <tr><td>2. Změnový list</td><td style="text-align: center;">2</td><td>počet listů</td></tr> <tr><td>3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací</td><td style="text-align: center;">1</td><td>počet listů</td></tr> <tr><td>4. Rozpis ocenění Změn položek</td><td style="text-align: center;">1</td><td>počet listů</td></tr> <tr><td>5. Přehled zařazení změn do Skupin</td><td style="text-align: center;">1</td><td>počet listů</td></tr> <tr><td>6. Přehled dokladů</td><td style="text-align: center;">1</td><td>počet listů</td></tr> <tr><td>7. Soupis prací SO po všech změnách</td><td style="text-align: center;">7</td><td>počet listů</td></tr> <tr><td>Další doklady dle přehledu dokladů</td><td style="text-align: center;">15</td><td>počet listů</td></tr> </table>	1. Krycí list	1	počet listů	2. Změnový list	2	počet listů	3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů	4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů	5. Přehled zařazení změn do Skupin	1	počet listů	6. Přehled dokladů	1	počet listů	7. Soupis prací SO po všech změnách	7	počet listů	Další doklady dle přehledu dokladů	15	počet listů	<b>Příjemce</b>  Objednatel Zhotovitel Projektant (AD) Stavební dozor	
1. Krycí list	1	počet listů																								
2. Změnový list	2	počet listů																								
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů																								
4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů																								
5. Přehled zařazení změn do Skupin	1	počet listů																								
6. Přehled dokladů	1	počet listů																								
7. Soupis prací SO po všech změnách	7	počet listů																								
Další doklady dle přehledu dokladů	15	počet listů																								
Iniciátor Změny: Zhotovitel H-INTES s.r.o. Předmět Změny: Oplocení podél III/2802																										
Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.) Po projednání s dotčenými vlastníky, dopracování RDS a na základě požadavku investora Městyse Březno byla dohodnuta s objednatelem záměna plotových výplní z dřevěných plaňkových na imitaci kovaného ocelového oplocení. Změnou výplní dojde i k drobné úpravě stavební části plotu z betonových štípaných tvarovek <u>6_Fotodokumentace</u> . ZBV je zpracováno dle upřesněné projektové dokumentace RDS. viz <u>příloha 5_23019_Projektová dokumentace_14_8_2023-D7d</u>  Jedná se o Změny nepředvídané, které jsou podle § 5, odst. 1, písm. c) Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 01.01.2022) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazených do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná o změnu nepředvídanou.																										

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
<b>-154 281,73</b>	<b>300 701,56</b>	<b>146 419,83</b>	<b>454 983,29</b>

Technická pomoc Objednatele      jméno      Daniel Löffler      podpis

**Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:**

Zhotovitel (stavbyvedoucí):      jméno      Martin Čerych      podpis

Projektant (autorský dozor):      jméno      Ing. Jan Havelka      podpis

Stavební dozor:      jméno      Ing. Petr Fleischner      podpis

Stavební dozor:      jméno      Martin Vácha      podpis

Supervize (Regionální dotační kancelář)      jméno      podpis

Zástupce Objednatele odpovědný za cenové projednání Změny:      jméno      Ing. Jaroslava Jurková      podpis

Zástupce Objednatele č. 1:      jméno      Ing. Alena Švideková      podpis

Zástupce Objednatele č. 2:      jméno      Zbyněk Valenta      podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 **Obchodních podmínek**. **Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo**. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněně jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

**Objednatel č. 1** (Oprávněná osoba):      jméno      Ing. Jan Fidler, DiS.      podpis

**Objednatel č. 2** (Oprávněná osoba):      jméno      Barbora Adamcová      podpis

**Zhotovitel:**      jméno      Ing. Heřmanová Lucie      podpis

**ZÁPIS****o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)  
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 6**

<b>Název Stavby:</b>	III/2802 Březno rekonstrukce silnice – chodník na Novou Telib
<b>Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:</b>	SO.110.2 / 1
<b>Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):</b>	SO.110.2 - Komunikace

Údaje v Kč bez DPH

<b>Cena SO/PS dle Smlouvy</b>
1 - zadat
<b>1 545 221,60</b>

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

**Cena SO/PS v předchozích ZBV:**

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	<b>1 545 221,60</b>	<b>0,00</b>

**Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:**

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-154 281,73	300 701,56	<b>300 701,56</b>	<b>19,46%</b>

**Cena SO/PS po této ZBV:**

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	<b>-154 281,73</b>	<b>1 691 641,43</b>	<b>146 419,83</b>	<b>9,48%</b>

**Rozpis položek a cen Změny**

Název stavby dle SoD: III/2802 Březno rekonstrukce silnice – chodník na Novou Telib								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: SO.110.2 - Komunikace								SO.110.2 / 1					
Číslo a název rozpočtu: 23019_ZL_SO110.2_00_Komunikace vč. oplod								Skupina změn 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		<b>Položky z SoD</b>											
20	131213711	Hloubení zapažených jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	42,140	40,668	-1,472	385,00	16 223,90	-566,72	0,00	15 657,18	-566,72	-3,49%
21	711161115	Isolace proti zemní vlhkosti popovou fólií vodorovná, nopek v 20,0 mm, tl do 1,0 mm	m2	195,750	204,650	8,900	98,00	19 183,50	0,00	872,20	20 055,70	872,20	4,55%
22	275313711	Základové patky z betonu tř. C 20/25	m3	1,500	3,480	1,980	4 032,00	6 048,00	0,00	7 983,36	14 031,36	7 983,36	132,00%
41	274313811	Základové pásy z betonu tř. C 25/30	m3	40,640	37,188	-3,452	3 894,00	158 252,16	-13 442,09	0,00	144 810,07	-13 442,09	-8,49%
42	311113212	Nosná zeď tl 200 mm ze štípaných tvárníc ztraceného bednění přírodních včetně výplně z betonu	m2	56,550	107,570	51,020	2 041,00	115 418,55	0,00	104 131,82	219 550,37	104 131,82	90,22%
43	317171R01	Kotvení monolitického betonu - tvárnice ztraceného bednění - chemickou kotvou betonářskou výztuží D14 mm do vývrtu	kus	157,000	704,000	547,000	98,00	15 386,00	0,00	53 606,00	68 992,00	53 606,00	348,41%
47	338171111	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2,00 m se zalitím MC	kus	62,000	0,000	-62,000	308,00	19 096,00	-19 096,00	0,00	0,00	-19 096,00	-100,00%
48	55342152	<i>plotový sloupek pro svařované panely profilovaný oválný 50x70mm dl 2,0-2,5m povrchová úprava Pz a komaxit</i>	kus	62,000	0,000	-62,000	674,00	41 788,00	-41 788,00	0,00	0,00	-41 788,00	-100,00%
44	338171113	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2,00 m se zabetonováním	kus	9,000	24,000	15,000	684,00	6 156,00	0,00	10 260,00	16 416,00	10 260,00	166,67%
45	55342261	<i>sloupek plotový koncový Pz a komaxitový 2150/48x1,5mm</i>	kus	5,000	12,000	7,000	398,00	1 990,00	0,00	2 786,00	4 776,00	2 786,00	140,00%
46	55342274	<i>vzpěra plotová 38x1,5mm včetně krytky s uchem 2500mm</i>	kus	4,000	12,000	8,000	341,00	1 364,00	0,00	2 728,00	4 092,00	2 728,00	200,00%
53	348101110	Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na sloupky zděné nebo betonové pl do 2 m2	kus	2,000	3,000	1,000	1 210,00	2 420,00	0,00	1 210,00	3 630,00	1 210,00	50,00%
51	348171120	Montáž rámového oplocení v přes 1 do 1,5 m	m	30,000	48,000	18,000	385,00	11 550,00	0,00	6 930,00	18 480,00	6 930,00	60,00%
52	55342310	<i>pole plotové kovové 1200x2000mm</i>	kus	25,000	24,000	-1,000	967,00	24 175,00	-967,00	0,00	23 208,00	-967,00	-4,00%
38	348272R02	Odstranění a opětovné osazení plotové stříšky pro zeď tl 195 mm z tvarovek hladkých nebo štípaných přírodních	m	28,750	0,000	-28,750	498,00	14 317,50	-14 317,50	0,00	0,00	-14 317,50	-100,00%
49	348501211	Osazení oplocení z dřevěných prken výšky do 2 m	m	51,000	38,000	-13,000	504,00	25 704,00	-6 552,00	0,00	19 152,00	-6 552,00	-25,49%
50	55342352	<i>pole plotové z dřevěných planěk rovných tl 20mm</i>	m2	51,000	38,000	-13,000	941,00	47 991,00	-12 233,00	0,00	35 758,00	-12 233,00	-25,49%
26	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	42,880	37,440	-5,440	1 445,00	61 961,60	-7 860,80	0,00	54 100,80	-7 860,80	-12,69%
28	962032314	Bourání pilířů cihelných z dutých nebo plných cihel pálených i nepálených na jakoukoli maltu	m3	2,750	0,550	-2,200	1 020,00	2 805,00	-2 244,00	0,00	561,00	-2 244,00	-80,00%
29	962042321	Bourání zdva nadzákladového z betonu prostého přes 1 m3	m3	11,240	9,880	-1,360	1 640,00	18 433,60	-2 230,40	0,00	16 203,20	-2 230,40	-12,10%
37	966003814	Rozebrání oplocení s příčnický a betonovými sloupky z prken a latí	m	5,440	0,000	-5,440	275,00	1 496,00	-1 496,00	0,00	0,00	-1 496,00	-100,00%
30	966003R03	Rozebrání a znovuosazení oplocení s příčnický a betonovými sloupky z prken a latí	m	23,250	0,000	-23,250	1 085,00	25 226,25	-25 226,25	0,00	0,00	-25 226,25	-100,00%

60	997221579R	Vodorovná doprava vybouraných hmot do suti (směsný stavební odpad)	t	234,702	215,072	-19,630	194,00	45 532,19	-3 808,22	0,00	41 723,97	-3 808,22	-8,36%
62	997221655R	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) vybouraných hmot do suti (směsný stavební odpad)	t	234,702	215,072	-19,630	125,00	29 337,75	-2 453,75	0,00	26 884,00	-2 453,75	-8,36%
63	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	218,131	241,692	23,561	35,00	7 634,59	0,00	824,64	8 459,23	824,64	10,80%
<b>Nové položky</b>													
58	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	0,000	0,310	0,310	62 200,00	0,00	0,00	19 282,00	19 282,00	19 282,00	100,00%
57	348272523	Plotová stříška pro zeď tl 195 mm z tvarovek hladkých nebo štípaných barevných	m	0,000	126,945	126,945	701,00	0,00	0,00	88 988,45	88 988,45	88 988,45	100,00%
64	3399411R1	Sloupek 70x70x2150 mm univerzální k bráně, brance	kus	0,000	1,000	1,000	1 099,09	0,00	0,00	1 099,09	1 099,09	1 099,09	100,00%
<b>Celkem</b>								<b>719 490,59</b>	<b>- 154 281,73</b>	<b>300 701,56</b>	<b>865 910,42</b>	<b>146 419,83</b>	

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu. Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: jméno, (stavbyvedoucí)

Za Objednatele: jméno, (TDS/TDI)

Podpis:

Podpis:

**PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN**

Název a evidenční číslo Stavby: **III/2802 Březno rekonstrukce silnice – chodník na Novou Telib**

1	Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	10 865 893,91
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	14 021 674,85
	<b>Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH</b>	<b>16 966 226,57</b>
3=(2/1)*100	Procento změny Přijáté smluvní částky	129,04%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	3 155 780,94
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	29,04%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	3 259 768,17

9=(32A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	11,35%
10=(36A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	20,54%
10A=32A+36A	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	3 464 344,40
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	5 432 946,96

12=(1)*0,15	Limit	1 629 884,09
13=(38/1)	Sledování limitu v %	0,00%
14=ABS(37)+(38)	Hodnota skupiny 5	0,00

SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (žadavat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	- 1 - Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)			- 2 - Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)			- 3 - Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)				- 4 - Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)				- 5 - Změny da minimálně Změny neměnicí celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)		
						Změny záporné (žadavat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadavat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadavat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (žadavat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (žadavat se znaménkem minus)	Změny kladné	limit 15 %
16	17	18	19=23+26+29+33	20=24+27+30+34+37+39	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	32=29+30	32A=ABS(29)+30	33	34	36=33+34	36A=ABS(33)+34	37	38	39=ABS(37)+38
		III/2802 Březno rekonstrukce silnice – chodník na Novou Telib	- 154 281,73	3 310 962,67	3 155 780,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 154 281,73	1 078 886,52	924 404,79	1 232 968,25	0,00	2 231 376,15	2 231 376,15	2 231 376,15	0,00	0,00	0,00
301	1	Dešťové kanalizace	0,00	644 984,96	644 984,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644 984,96	644 984,96	644 984,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Von k 301	2	Vedlejší a ostatní náklady k Dešťové kanalizaci	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 KSÚS	3	SO.110.KSÚS - Komunikace	0,00	2 137 026,15	2 137 026,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 137 026,15	2 137 026,15	2 137 026,15	0,00	0,00	0,00
Von k 110 KSÚS	4	Von.2.KSÚS - Vedlejší a ostatní náklady - Vedlejší a ostatní náklady ke změně rozsahu Plněno konstrukčního souvrství	0,00	94 350,00	94 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 350,00	94 350,00	94 350,00	0,00	0,00	0,00
Von k 110 KSÚS	5	Von.2.KSÚS - Vedlejší a ostatní náklady - Vedlejší a ostatní náklady DIO	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Von k 110 KSÚS	6	SO.110.2 - Komunikace - Oplocení podél III/2802	- 154 281,73	300 701,56	146 419,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 154 281,73	300 701,56	146 419,83	454 983,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Poznámka:** Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

## Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	6
Název stavby:	III/2802 Březno rekonstrukce silnice – chodník na Novou Telib
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO.110.2 - Komunikace
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	SO.110.2 / 1

Doklad	počet listů
07 Soupis prací SO po změnách	7
08 Oznámení o ZBV 1-5	2
09 Vyjádření AD 26.7.2023	1
10 Vyjádření TDS - Březno	1
11 Zápis z KD č.6	3
12 SD741067	1
13 Projektová dokumentace_14_8_2023-D7d	1
14 Fotodokumentace	1
15 Pokyn objednatele Zbv VI	1
16 Kalkulace nové položky	1
17 CN ke kalkulaci	3
Počet listů celkem	22







42	311113212	Nosná zeď tl 200 mm ze štípaných tvárnic ztraceného bednění přírodních včetně výplně z betonu Z SoD: 56,550 m2 ZBV č.IV: 51,020 m2 Celkem: 107,57 m2	m2	56,550	107,570	51,020	2 041,00	115 418,55	0,00	104 131,82	219 550,37	104 131,82	90,22%
43	317171R01	Kotvení monolitického betonu - tvárnic ztraceného bednění - chemickou kotvou betonářskou výztuží D14 mm do vývrtu Z SoD: 157,0 kus ZBV č.IV: 574,0 kus Celkem: 704,0 kus	kus	157,000	704,000	547,000	98,00	15 386,00	0,00	53 606,00	68 992,00	53 606,00	348,41%
44	338171113	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2,00 m se zabetonováním Z SoD: 9,0 kus ZBV č.IV: 15,0 kus Celkem: 24,0 kus	kus	9,000	24,000	15,000	684,00	6 156,00	0,00	10 260,00	16 416,00	10 260,00	166,67%
45	55342261	sloupek plotový koncový Pz a komaxitový 2150/48x1,5mm Z SoD: 5,0 kus ZBV č.IV: 7,0 kus Celkem: 12,0 kus	kus	5,000	12,000	7,000	398,00	1 990,00	0,00	2 786,00	4 776,00	2 786,00	140,00%
46	55342274	vzpěra plotová 38x1,5mm včetně krytky s uchem 2500mm Z SoD: 4,0 kus ZBV č.IV: 8,0 kus Celkem: 12,0 kus	kus	4,000	12,000	8,000	341,00	1 364,00	0,00	2 728,00	4 092,00	2 728,00	200,00%
47	338171111	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2,00 m se zalitím MC Z SoD: 62,0 kus ZBV č.IV: -62,0 kus Celkem: 0,00 kus	kus	62,000	0,000	-62,000	308,00	19 096,00	-19 096,00	0,00	0,00	-19 096,00	-100,00%
48	55342152	plotový sloupek pro svařované panely profilovaný oválný 50x70mm dl 2,0-2,5m povrchová úprava Pz a komaxit Z SoD: 62,0 kus ZBV č.IV: -62,0 kus Celkem: 0,00 kus	kus	62,000	0,000	-62,000	674,00	41 788,00	-41 788,00	0,00	0,00	-41 788,00	-100,00%
49	348501211	Osazení oplocení z dřevěných prken výšky do 2 m Z SoD: 51,0 m ZBV č.IV: -13,0 m Celkem: 38,0 m	m	51,000	38,000	-13,000	504,00	25 704,00	-6 552,00	0,00	19 152,00	-6 552,00	-25,49%
50	55342352	pole plotové z dřevěných planěk rovných tl 20mm Z SoD: 51,0 m2 ZBV č.IV: -13,0 m2 Celkem: 38,0 m2	m2	51,000	38,000	-13,000	941,00	47 991,00	-12 233,00	0,00	35 758,00	-12 233,00	-25,49%
51	348171120	Montáž rámového oplocení v přes 1 do 1,5 m Z SoD: 30,0 m ZBV č.IV: 18,0 m Celkem: 48,0 m	m	30,000	48,000	18,000	385,00	11 550,00	0,00	6 930,00	18 480,00	6 930,00	60,00%
52	55342310	pole plotové kovové 1200x2000mm Z SoD: 25,0 kus ZBV č.IV: -1,0 kus Celkem: 24,0 kus	kus	25,000	24,000	-1,000	967,00	24 175,00	-967,00	0,00	23 208,00	-967,00	-4,00%
53	348101110	Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na sloupky zděné nebo betonové pl do 2 m2 Z SoD: 2,0 kus ZBV č.IV: 1,0 kus Celkem: 3,0 kus	kus	2,000	3,000	1,000	1 210,00	2 420,00	0,00	1 210,00	3 630,00	1 210,00	50,00%
54	55342320	branka vchodová kovová 1200x940 mm	kus	2,000	2,000	0,000	5 598,00	11 196,00	0,00	0,00	11 196,00	0,00	0,00%
55	348101130	Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na sloupky zděné nebo betonové pl přes 4 do 6 m2	kus	3,000	3,000	0,000	2 120,00	6 360,00	0,00	0,00	6 360,00	0,00	0,00%
56	55342340	brána kovová dvoukřídlová 1200x3916mm	kus	3,000	3,000	0,000	9 465,00	28 395,00	0,00	0,00	28 395,00	0,00	0,00%
	5	Komunikace											
	R50	Podkladní vrstvy											
57	564851011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	148,470	148,470	0,000	188,00	27 912,36	0,00	0,00	27 912,36	0,00	0,00%

58	<b>564861011</b>	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	360,750	360,750	0,000	224,00	80 808,00	0,00	0,00	80 808,00	0,00	0,00%
59	<b>564871011</b>	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 250 mm	m2	135,975	135,975	0,000	316,00	42 968,10	0,00	0,00	42 968,10	0,00	0,00%
	<b>R51</b>	Komunikace pro automobilovou dopravu - asfalt											
60	<b>577134121</b>	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	33,000	33,000	0,000	306,00	10 098,00	0,00	0,00	10 098,00	0,00	0,00%
61	<b>573231106</b>	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	m2	66,000	66,000	0,000	17,00	1 122,00	0,00	0,00	1 122,00	0,00	0,00%
62	<b>577155122</b>	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	33,000	33,000	0,000	421,00	13 893,00	0,00	0,00	13 893,00	0,00	0,00%

63	<b>565135101</b>	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 1,5 m	m2	33,000	33,000	0,000	408,00	13 464,00	0,00	0,00	13 464,00	0,00	0,00%
64	<b>573111112</b>	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	33,000	33,000	0,000	19,00	627,00	0,00	0,00	627,00	0,00	0,00%
	<b>R55</b>	Pojžděná komunikace - zámková dlažba											
65	<b>596212213</b>	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	129,500	129,500	0,000	285,00	36 907,50	0,00	0,00	36 907,50	0,00	0,00%
66	<b>59245013</b>	dlažba zámková tvaru I 200x165x80mm přírodní	m2	132,090	132,090	0,000	438,00	57 855,42	0,00	0,00	57 855,42	0,00	0,00%
	<b>R56</b>	Komunikace pro pěší ze zámkové dlažby											
67	<b>596211110</b>	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	23,000	23,000	0,000	265,00	6 095,00	0,00	0,00	6 095,00	0,00	0,00%
68	<b>59245015</b>	dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm přírodní	m2	23,460	23,460	0,000	308,00	7 225,68	0,00	0,00	7 225,68	0,00	0,00%
	<b>9</b>	Ostatní konstrukce a práce-bourání											
	<b>R90</b>	Společné práce pro bourání a konstrukce											
69	<b>919735111</b>	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 50 mm	m	9,000	9,000	0,000	74,00	666,00	0,00	0,00	666,00	0,00	0,00%
70	<b>919735112</b>	Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	9,000	9,000	0,000	96,00	864,00	0,00	0,00	864,00	0,00	0,00%
71	<b>919732211</b>	Stýčná spára napojení nového živичného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s proezáním	m	9,000	9,000	0,000	74,00	666,00	0,00	0,00	666,00	0,00	0,00%
72	<b>938909311</b>	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živичného	m2	1577,210	1 577,210	0,000	2,00	3 154,42	0,00	0,00	3 154,42	0,00	0,00%
	<b>R95</b>	Osazení obrub a linek											
73	<b>916131213</b>	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	42,000	42,000	0,000	297,00	12 474,00	0,00	0,00	12 474,00	0,00	0,00%
74	<b>59217031</b>	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	41,004	41,004	0,000	156,00	6 396,62	0,00	0,00	6 396,62	0,00	0,00%
75	<b>59217035</b>	obrubník betonový obloukový vnější 780x150x250mm	m	1,800	1,800	0,000	351,00	631,80	0,00	0,00	631,80	0,00	0,00%
76	<b>916231213</b>	Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	111,000	111,000	0,000	274,00	30 414,00	0,00	0,00	30 414,00	0,00	0,00%
77	<b>59217019</b>	obrubník betonový chodnikový 1000x100x200mm	m	113,220	113,220	0,000	125,00	14 152,50	0,00	0,00	14 152,50	0,00	0,00%
78	<b>916331112</b>	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	34,000	34,000	0,000	188,00	6 392,00	0,00	0,00	6 392,00	0,00	0,00%
79	<b>59217001</b>	obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm	m	34,000	34,000	0,000	81,00	2 754,00	0,00	0,00	2 754,00	0,00	0,00%
	<b>R96</b>	Bourání konstrukcí vozovek											
80	<b>113154232</b>	Frézování živичného krytu tl 40 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 500 do 1000 m2 bez překážek v trase	m2	36,000	36,000	0,000	69,00	2 484,00	0,00	0,00	2 484,00	0,00	0,00%
81	<b>113154233</b>	Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 500 do 1000 m2 bez překážek v trase	m2	36,000	36,000	0,000	78,00	2 808,00	0,00	0,00	2 808,00	0,00	0,00%
82	<b>113154234</b>	Frézování živичného krytu tl 100 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 500 do 1000 m2 bez překážek v trase	m2	36,000	36,000	0,000	112,00	4 032,00	0,00	0,00	4 032,00	0,00	0,00%
83	<b>113107223</b>	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	36,000	36,000	0,000	117,00	4 212,00	0,00	0,00	4 212,00	0,00	0,00%
84	<b>113106132</b>	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší strojně pl do 50 m2	m2	23,000	23,000	0,000	82,00	1 886,00	0,00	0,00	1 886,00	0,00	0,00%
85	<b>113106191</b>	Rozebrání vozovek ze silničních dílců se spárami zalitými živicí strojně pl do 50 m2	m2	3,000	3,000	0,000	204,00	612,00	0,00	0,00	612,00	0,00	0,00%
86	<b>113107331</b>	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm strojně pl do 50 m2	m2	6,000	6,000	0,000	222,00	1 332,00	0,00	0,00	1 332,00	0,00	0,00%
87	<b>113107322</b>	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl do 50 m2	m2	141,000	141,000	0,000	78,00	10 998,00	0,00	0,00	10 998,00	0,00	0,00%
	<b>R97</b>	Ostatní bourací práce											
88	<b>767996801</b>	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hm jednotlivých dílů do 50 kg	kg	150,000	150,000	0,000	45,00	6 750,00	0,00	0,00	6 750,00	0,00	0,00%
	<b>R99</b>	Svislé dopravní značení											
89	<b>914511111</b>	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	3,000	3,000	0,000	684,00	2 052,00	0,00	0,00	2 052,00	0,00	0,00%
90	<b>404452250</b>	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	3,000	3,000	0,000	624,00	1 872,00	0,00	0,00	1 872,00	0,00	0,00%
91	<b>914111111</b>	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	4,000	4,000	0,000	185,00	740,00	0,00	0,00	740,00	0,00	0,00%
92	<b>40445645</b>	informativní značky jiné IJ4b 500mm	kus	2,000	2,000	0,000	1 097,00	2 194,00	0,00	0,00	2 194,00	0,00	0,00%
93	<b>40445647</b>	dodatkové tabulky E1, E2a,b , E6, E9, E10 E12c, E17 500x500mm	kus	1,000	1,000	0,000	744,00	744,00	0,00	0,00	744,00	0,00	0,00%

94	<b>40445625</b>	informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm	kus	1,000	1,000	0,000	987,00	987,00	0,00	0,00	987,00	0,00	0,00%
	<b>99</b>	Přesuny hmot a sutí											
95	<b>997221571R</b>	Vodorovná doprava vybouraných hmot - odpadu asfaltového s nebo bez obsahu nebezpečných látek	t	15,732	15,732	0,000	194,00	3 052,01	0,00	0,00	3 052,01	0,00	0,00%
96	<b>997221579R</b>	Vodorovná doprava vybouraných hmot do sutí (směsný stavební odpad)	t	234,702	215,072	-19,630	194,00	45 532,19	-3 808,22	0,00	41 723,97	-3 808,22	-8,36%
		<b>Z SoD:</b> 234,702 t <b>ZBV č.IV:</b> -19,63 t Celkem: 215,072 t											
97	<b>997221875</b>	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	15,732	15,732	0,000	185,00	2 910,42	0,00	0,00	2 910,42	0,00	0,00%
98	<b>997221655R</b>	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) vybouraných hmot do sutí (směsný stavební odpad)	t	234,702	215,072	-19,630	125,00	29 337,75	-2 453,75	0,00	26 884,00	-2 453,75	-8,36%
		<b>Z SoD:</b> 234,702 t <b>ZBV č.IV:</b> -19,63 t Celkem: 215,072 t											
99	<b>998223011</b>	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	218,131	241,692	23,561	35,00	7 634,59	0,00	824,64	8 459,23	824,64	10,80%
		<b>Z SoD:</b> 218,131 t <b>ZBV č.IV:</b> 23,561 t Celkem: 241,692 t											
		<b>Nové položky</b>											
58	<b>279361821</b>	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	0,000	0,310	0,310	62 200,00	0,00	0,00	19 282,00	19 282,00	19 282,00	100,00%
		<b>Z SoD:</b> 0,0 t <b>ZBV č.IV:</b> 0,310 t Celkem: 0,310 t											
57	<b>348272523</b>	Plotová stříška pro zeď tl 195 mm z tvarovek hladkých nebo štípaných barevných	m	0,000	126,945	126,945	701,00	0,00	0,00	88 988,45	88 988,45	88 988,45	100,00%
		<b>Z SoD:</b> 0,0 m <b>ZBV č.IV:</b> 126,945 m Celkem: 126,945 m											
64	<b>3399411R1</b>	Sloupek 70x70x2150 mm univerzální k bráně, brance	kus	0,000	1,000	1,000	1 099,09	0,00	0,00	1 099,09	1 099,09	1 099,09	100,00%
		<b>Z SoD:</b> 0,0 kus <b>ZBV č.IV:</b> 1 kus Celkem: 1 kus											
		<b>Celkem</b>					<b>1 545 221,60</b>	<b>- 154 281,73</b>	<b>300 701,56</b>	<b>1 691 641,43</b>	<b>146 419,83</b>		

číslo dokumentu: 2110

oddělení: obchodní  
kontaktní osoba: Aleš Neudert  
telefon: +420 326 716 040  
vyřizuje: Ing. Martina Dučková  
telefon: +420 602 457 031  
e-mail: m.duckova@h-intes.cz  
pracoviště: Sabina Hoiřáková

Ing. Alena Švideková  
Oddělení investic - projektový manažer  
Krajská správa a údržba silnic  
Středočeského kraje, p. o.  
Zborovská 11, Praha 5  
Oblastní pracoviště: Žižkova 1, Říčany

V Mladé Boleslavi dne 26.7.2023

## **Oznámení o změnách**

**Akce: III/2802 Březno rekonstrukce silnice – chodník ve směru na Novou Telib**

Vážená paní inženýrko,

v souladu se Směrnicí R-Sm-36 upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2013 o zadávání veřejných zakázek Vám na základě dosud zjištěných skutečností v průběhu realizace akce „III/2802 Březno rekonstrukce silnice – chodník ve směru na Novou Telib“ oznamujeme, že dosud došlo k několika změnám, které ovlivní technické provádění stavby. Jednotlivé změny a okolnosti jejich vzniku byly průběžně konzultovány a řešeny na kontrolních dnech.

### **I. Změna:**

#### **Dešťová kanalizace**

##### **Technické řešení:**

Na základě informací investora Městys Březno byly provedeny průzkumné práce na stávající dešťové kanalizaci, která zatrubňovala stávající silniční příkop, přičemž byla zjištěna nedostačující dimenze potrubí a technicky nevyhovující stav. Původní kanalizace byla vybudována z bezhrdlových betonových trub různého stáří a charakteru s rozsedlými spoji a dílčími úseky se zborceným potrubím.

Z tohoto důvodu byla na KD dohodnuta výměna stávajícího potrubí za nové tak, aby vyhovovalo pro odvedení dešťových vod dle potřeb předmětné stavby. Pro tuto výměnu potrubí byl zpracován nový stavební objekt SO.310 – dešťová kanalizace.

### **II. Změna:**

#### **Vrstvy podloží vozovky**

##### **Technické řešení:**

V rámci stavby jsme provedli projektem předepsané příčné překopy pro pokládku vedení veřejného osvětlení. V těchto rýhách byl odhalen příčný řez konstrukčního souvrství vozovky. V tomto souvrství byla zjištěna následující skladba, která byla shodná v obou překopech:

ACO 11	40 mm
ACL 16	30 – 50 mm (značně degradován s drobným charakterem)
PM	100 mm (hrubozrnné nesourodé HDK frakce 16 – 100)

Projektem předepsaná výměna asfaltových vrstev po frézování vozovky v celkové tloušťce 100 mm, s ohledem na tloušťku stávajících asfaltových vrstev cca 70 mm, je technicky nerealizovatelná.

Projektant prověřil možnost zvýšení nivelety s konstatováním, že tato možnost je nereálná, a to z důvodu návaznosti na okolní zpevněné plochy a zástavbu. V rámci KD bylo rozhodnuto o změně souvrství z pouhé výměny asfaltových vrstev dle KS I v PD na plné konstrukční souvrství dle KS II v PD. Návrh nového KS reflektuje již v projektu navrženou konstrukční skladbu s potřebnou třídou zatížení.

Tato změna bude mít dopad na termín dokončení díla.

**III. Změna:**

DIO - vynucené přerušení a následné prodloužení uzavírky

**Technické řešení:**

Na žádost Správy železnic bylo v rámci KD projednáno umožnění průjezdu přes staveniště, a to pro umožnění opravy železničního přejezdu v obci Kolomuty s investorem SŽ. Stávající plná uzavěra vozovky bude v období 28.7. - 1. 8. zrušena a nahrazena kyvadlovou dopravou jedním jízdním pruhem řízeným provizorním SSZ. Náklady na úpravu DIO jde k tíži SŽ a jejich dodavatelů. S ohledem na přiložený harmonogram postupu prací jsme nuceni práce pozastavit tak, abychom umožnili průjezd vozidel alespoň v minimálním komfortu. Z tohoto důvodu nejsme schopni pokračovat v odtěžování konstrukčních vrstev stávající vozovky dle původní PD a harmonogramu.

Tato změna bude mít dopad na termín dokončení díla.

**IV. Změna:**

Oplocení podél III/2802

**Technické řešení:**

Po projednání s dotčenými vlastníky, dopracování RDS a na základě požadavku investora Městyse Březno byla dohodnuta záměna plotových výplní z dřevěných plaňkových na imitaci kovaného ocelového oplocení. Změnou výplní došlo i k drobné úpravě stavební části plotu z betonových štípaných tvarovek. Zbv bude zpracováno dle upřesněné projektové dokumentace RDS.

**V. Změna:**

Žádost o změnu termínu

Na základě výše uvedených změn a předběžných dohod z kontrolního dne, žádáme o prodloužení termínu do 30. 9. 2023.

Podrobné členění, oceněný soupis prací a příslušné formuláře k „Zbv“ zašleme v dalším kroku.

S pozdravem

.....  
ING. LUCIE HEŘMANOVÁ  
JEDNATELKA H-INTES S.R.O.



oddělení: projekční  
vedoucí oddělení: Ing. Jan Adamů  
telefon: +420 326 700 667  
e-mail: j.adamu@crproject.cz  
vyřizuje: Ing. Jan Havelka  
telefon: +420 326 700 664  
e-mail: [j.havelka@crproject.cz](mailto:j.havelka@crproject.cz)  
č.j. 2016-039/po/ha/01  
datum: 26.07.2023

adresát:  
Barbora Adamcová  
starostka Městysse Březno  
Úřad městysse Březno  
adresa:  
Březno 13  
294 06 Březno

## Věc: Vyjádření autorského dozoru ke změnám č. 1-4 stavby „Chodník ve směru na Novou Telib“

Na základě požadavku TDI zasílám níže uvedené vyjádření AD k ZBV č.1-4 předmětné stavby. Dne 19.7.2023 předložil zhotovitel stavby oznámení o níže uvedených změnách.

### Změna č.1 - Dešťová kanalizace

— Na základě informací investora Městysse Březno o možném využití stávající funkční dešťové kanalizace s ní bylo v PD uvažováno pro odvodnění nově budovaného chodníku a rekonstruované komunikace pro automobilovou dopravu. Při stavebních pracích však byl zjištěn její nevyhovující stav.

Byla navržena výměna potrubí za nové ve dvou úsecích. Stoka A v dl. 46,78m vč. dvou revizních šachet a stoka B dl. 66,39m vč. tří revizních šachet. Trasy kopírují směrové vedení původní dešťové kanalizace. Nová kanalizace byla zahlobena z důvodu požadovaného krytí a křížení s vodovodními přípojkami.

Návrh byl odsouhlasen zástupci investorů a vypracována PD pro samostatný stavební objekt SO.310 dešťová kanalizace.

### Změna č.2 - Vrstvy podloží vozovky

Při provedení příčných překopů vozovky pro veřejné osvětlení byla zjištěna nedostatečná mocnost vrstev konstrukčního souvrství, která znemožňuje původně plánované odfrézování a opětovné položení svrchních asfaltových vrstev. Po projednání na KD byla odsouhlasena realizace plného konstrukčního souvrství v celém dotčeném úseku silnice III/2802 v dl. 195m namísto původních 72,5m.

### Změna č.3 - DIO vynucené přerušení a následné prodloužení uzavírky

Na žádost Správy železnic bylo v rámci KD projednáno umožnění průjezdu přes staveniště pro umožnění opravy železničního přejezdu v obci Kolomuty s investorem SŽ. Stávající plná uzavěra vozovky bude v období 28.7. - 1. 8. zrušena a nahrazena kyvadlovou dopravou jedním jízdním pruhem řízeným provizorním SSZ. S ohledem na harmonogram postupu prací bude nucen zhotovitel práce pozastavit tak, aby umožnil průjezd vozidel alespoň v minimálním komfortu.

### Změna č.4 - Oplocení podél III/2802

Na základě připomínek dotčených vlastníků byla po dohodě s investorem Městyssem Březno navržena záměna plotových výplní z dřevěných plačkových na imitaci kovaného ocelového oplocení. Změnou výplní došlo i k drobné úpravě stavební části plotu z betonových štípaných tvarovek.

K výše uvedeným změnám a předloženému *Oznámení zhotovitele* nemám připomínky a za AD souhlasím.

S pozdravem

Ing. Jan Havelka  
projektant stavby

**Barbora Adamcová**

Starostka Městysse Březno, Úřad Městysse Březno, Březno 13, 294 06 Březno

**Věc: Vyjádření Technického dozoru stavby ke změnám č.1-4 stavby „III/2802 Březno re-konstrukce silnice-chodník ve směru na Novou Telib,,**

Vyjádření se vztahuje ke změnám díla oznámených GD dne 19.7.2023

**Změna č.1 – Dešťová kanalizace (dále DK)**

V PD bylo uvažováno s využitím stávající, plně funkční DK při projektování prací dle předmětu díla. Při provádění se zjistilo, že stav DK neodpovídá výškově navržené PD. Byla tedy navržena nová varianta – ve dvou úsecích DK. Trasa zůstala stejná, výškově dle nového požadavku, z důvodu kolize s vodovodními přípojkami a řádného krytí DK se DK položila při zachování min. spádu 2cm/m pod úroveň původní DK. Technické řešení: Stoka A v délce 46,78m včetně 2ks revizních šachet, Stoka B v délce 66,39m včetně 3ks revizních šachet.

Návrh byl odsouhlasen zástupci investorů, po stránce technické TDS a AD vypracoval PD pro samotný stavební objekt SO.310 DK.

**Změna č.2 – Vrstvy podloží vozovky (dále VPV)**

Při provádění prací dle PD, při překopech komunikace po šířce pro ukládku kabeláže VO GD zjistil, že podloží vozovky, mimo úzký pás po pokládce nové tlakové splaškové kanalizace (dále TSK), neodpovídá ČSN a vozovka není provedena správně v požadovaných vrstvách. Zcela chybí spodní podloží. V rámci KD se řešily varianty nápravy. TDS zcela nesouhlasil s navýšením výšky komunikace vzhledem ke stávající zástavbě. Všichni zúčastnění se shodli na nové pokládce všech vrstev komunikace. Sondy, které byly provedeny v rámci vypracování PD bohužel byly pouze v místě nové TSK. Plné konstrukční souvrství bude realizováno v celém úseku dle PD silnice III/2802 v délce 195m namísto původních 72,5m.

**Změna č.3 – DIO vynucené přerušení a následné prodloužení uzavírky**

V termínu od pátku 28.7.2023 do úterý 1.8.2023 včetně, bude dle požadavku Správy železnic (dále SŽ) umožněn průjezd přes staveniště III/2808 Březno – ve směru na Novou Telib. Důvodem je oprava železničního přejezdu v obci Domousnice investorem SŽ. Stávající plná uzavěra vozovky bude v uvedeném termínu nahrazena uzavěrou částečnou. Bude zprovozněn 1 jízdní pruh a doprava bude pomocí provizorního zařízení SSZ probíhat kyvadlově. Po tuto dobu dojde k omezení prací na stavbě.

**Změna č.4 – Oplocení podél komunikace III/2808 – levá strana**

Investor – Městys Březno požádal o záměnu plotových výplní z dřevěných plaňkových na imitaci kovaného ocelového oplocení, z důvodu delší životnosti a bezúdržbovosti. Změnou výplní došlo i k drobné úpravě stavební část, základu plotu a posunu pilířků z betonových tvarovek.

S oznámením GD H-INTES s.r.o. souhlasím a k uvedeným změnám č.1-4 nemám připomínek a souhlasím.

S pozdravem za TDS Ing. Petr Fleischner

Zápis z kontrolního dne III/2802 Březno rekonstrukce silnice – chodník ve směru na Novou Telib

**„III/2802 Březno rekonstrukce silnice – chodník ve směru na Novou Telib“**

BUNG CZ s.r.o.	Zápis z KD <b>č. 6</b>
Datum: <b>20.07.2023</b>	Místo konání: Městys Březno

**Účast a kontakty:**

Jméno	společnost	funkce	e-mail	telefon	Přítomen	Zaslat
Barbora Adamcová	Městys Březno	Starostka	brezno@seznam.cz	326 399 180	x	x
Zbyněk Valenta	Městys Březno	Místostarosta	brezno@seznam.cz	326 399 180		x
Alena Švideková	KSÚS	Referent	alena.svidekova@ksus.cz	601 092 960	x	x
Marek Hanuš	KSÚS	Vedoucí odboru	<a href="mailto:marek.hanus@ksus.cz">marek.hanus@ksus.cz</a>			x
Ing. Petr Fleischner	BUNG CZ s.r.o.	TDS	petr.fleischner@bung.cz	771 137 357	x	x
Martin Vácha	BUNG CZ s.r.o.	KOO BOZP	martin.vacha@bung.cz	776 368 653		x
Ing. Jan Havelka	CR PROJEKT s.r.o.	AD	<a href="mailto:j.havelka@crprojekt.cz">j.havelka@crprojekt.cz</a>	602 189 269	x	x
Martin Čerych	H.INTES s.r.o.	stavbyvedoucí	m.cerych@h-intes.cz	724 123 227		x
Aleš Neudert	H-INTES s.r.o.	O+V ředitel	a.neudert@h-intes.cz	724 351 006	x	x
Tomáš Hrdina	H-INTES s.r.o.	stavbyvedoucí	t.hrdina@h-intes.cz	724 045 100	x	x

**Aktuálně prováděné práce**

**Pokračování v provádění základů plotů, pokládka silničních obrubníků, pokládka zámkové dlažby, vytyčení polohy IS před následnými pracemi**

**Plnění harmonogramu**

Dne **28.05.2023** bylo předáno staveniště mezi stavebníkem a dodavatelem, tj. v termínu dle SOD. Termín dokončení dle SOD je dle aktualizovaného HMG **30.09.2023**.

Zápis z kontrolního dne III/2802 Březno rekonstrukce silnice – chodník ve směru na Novou Telib

Bod číslo	Popis	Zodp.	Termín
2/6	TDS upozorňuje, že výstavba kanalizace, která nebyla v předané a odsouhlasené projektové dokumentaci, bude součástí ZL č1. a bude zpracovávána dle nařízení KSÚS Středočeského kraje <b>13.07.2023 – zůstává – GD doplní ohlášení na KSÚS Splněno. Nutno ještě napsat vyjádření (KSÚS, AD a TDS)</b>	GD	Do 21.07.2023
3/1	Vzhledem k opravě a zavření železničních přejezdů na objízdných trasách bylo dohodnuto, že v termínu od 28.07. – 01.08.2023 bude přes staveniště dovolený průjezd. Doprava dle dohody bude řízena semaforem, schváleno Policií ČR. <b>Zhotovitel stavby upozorňuje, že prověří, zda toto omezení nebude mít vliv na termín ukončení stavby. Nejpozději na KD č.6 předloží aktualizovaný HGM stavby, který zohlední tuto skutečnost. 13.07.2023 – zůstává předložení HMG Splněno.</b>	GD	do 20.07.2023
3/2	Zhotovitel stavby na základě aktualizovaného HMG stavby posoudí, zda bude muset požádat o prodloužení DIO <b>29.06.2023 – bylo dojednáno, že ZS požádá o prodloužení DIO Splněno</b>	GD	do 22.06.2023
4/1	Zhotovitel stavby zašle na KSÚS a Městys Březno žádost o povolení prodloužení termínu ukončení stavby	GD	do 20.07.2023
4/2	Zhotovitel stavby upozorňuje, že dešťová kanalizace musela být, vzhledem k místním podmínkám, vedena ve větších hloubkách. Jedná se o stoku „B“ <b>– provedeno - vypouští se</b>	GD	
5/1	Práce v týdnu od 06.07.2023 do 13.07.2023: dokončení dešťové kanalizace, VO provedeno z 80% – položení kabeláže + stožáry, dokončení obrubníků levá strana (od 0 do 0,08 km), výkopy základů pro č.p. 116, demontáž původního oplocení před MŠ.	GD	
5/2	Dohodnuta úprava základové spáry před č.p.116 – viz vysvětleno na místě	GD	
5/3	Vícepráce – vrstvy podloží vozovky – AD poslal slepý rozpočet, GD dodá vyplněný rozpočet dnes (13.07.2023). Bude řešit ZL č.2. GD zašle ohlášení na KSÚS. 2x splněno (rozpočet + podané ohlášení na KSÚS. Opět nutné napsat vyjádření (KSÚS, AD, TDS).	GD	Do 21.07.2023
6/1	Je nutno reagovat na oznámení KSÚS o ZL (AD a TDS), (KSÚS a Městys Březno)	AD + TDS	Do 21.07.2023
6/2	Při provádění zemních prací pro oplocení před MŠ byla zjištěna kolize silových vedení kabelů ČEZ a navržených základů oplocení. Navíc kabely výškově zasahují nad chodník. V řešení ČEZ (p. Skořepa). Proběhla schůzka na stavbě za účasti zástupce GD, obce a ČEZ. Jedná se o reklamaci. Není problém v nárůstu ceny, ale v termínu odstranění závady.	GD + Městys Březno	
6/4	Zástupci obce Březno upozorňují na strop v nárůstu ceny max do 30% dle VŘ. Celková cena je cca 10,865 mil bez DPH. Je možný nárůst o cca 3,259 mil. Součet vícenákladů je vypočítán s přihlédnutím k dalším pracím na částku 3,100 mil (2,3 mil – sovrství komunikace, 0,7 mil DK, 0,1 mil oplocení). Všechny ceny bez DPH.	GD	K 20.07.2023
6/5	Staveniště bude zprůjezdněno z 1/2 komunikace (jednosměrně de řízení semaforem) od 28/7 do 1/8 2023 (Pá – Út). Značení a semafor zajistí dodavatel investora SŽ firma JAZNAK.	GD	28.7.2023 – 1.08.2023
6/6	GD pošle do 21/7 upravenou částku za navýšení DK – dle skutečného provedení. Částka nepřesáhne 0,7 mil bez DPH.	GD	Do 21.07.2023

Zápis z kontrolního dne III/2802 Březno rekonstrukce silnice – chodník ve směru na Novou Telib

---

Pokud do 3 dnů od obdržení tohoto zápisu nevznesou žádný z účastníků námitku, má se za to, že s ním souhlasí.

**Po odsouhlasení se zápis stává součástí stavebního deníku!**

**Příští KD č. 7 se bude konat ve čtvrtek dne 27. 07. 2023 od 08:00 hod na stavbě.**

Zapsal: Ing. Petr Fleischner

Dne: 20.07.2023

Přítomni: dle prezenční listiny

III/280 z Břevno rekondice silnice, chodník

23019

Denní záznamy stavby:

List č.

741067

Datum:

BOZP: kontrolou stavby nebyly zjištěny závady

31.7.2023

Počasí: +12°C +23°C

Pondělí

Pracovní doba: 6<sup>30</sup>-14

Zaměstnanci: BMA, ISM, IR, ITHP

Cinnost: 1) montáž základů pro žstaz  
2) montáž bednění  
3) instalace žh pro základy oplaceni

Technika: JCB 4cx, Seunik

BOZP: kontrolou stavby nebyly zjištěny závady

1.8.2023

Počasí: t10°C +22°C

Úterý

Pracovní doba: 6<sup>30</sup>-14

Zaměstnanci: FMA, ISM, IR, ITHP

Cinnost: 1) montáž bednění oplaceni  
2) montáž armatury oplaceni  
3) od opraceni armatury na chem. kotan  
4) Odloz pro komunikaci - parst. stahni

Technika: JCB 4cx, Seunik, New mix

BOZP: kontrolou stavby nebyly zjištěny závady

2.8.2023

Počasí: +12°C +23°C

Středa


Pracovní doba: 6<sup>30</sup>-14

Zaměstnanci: FMA, ISM, IR, ITHP

Cinnost: 1) betonz. základů oplaceni  
2) Odstranění bednění  
3) montáž žstaz pro armaturu  
4) chemické kotan armatury

Technika: JCB 4cx, Seunik,

Zapís: Odstavení DIO (samafoni), příjezd  
stavbou uzavřen.

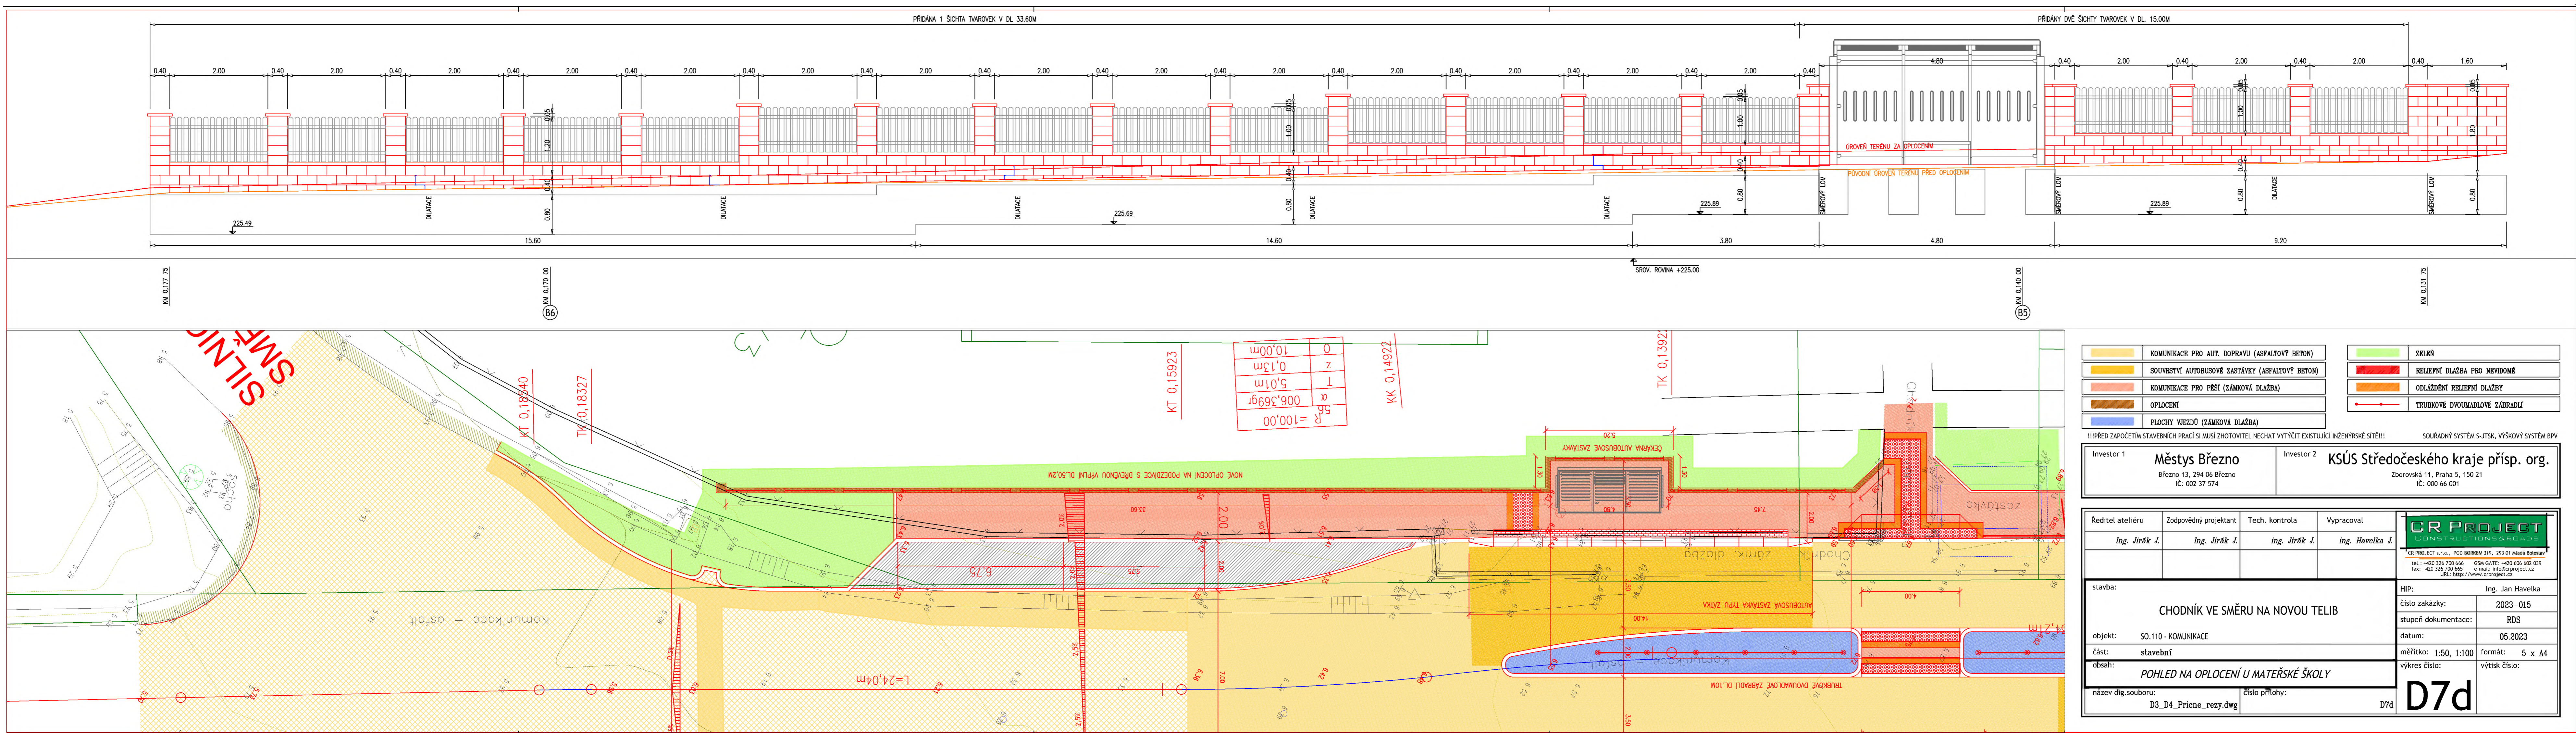





## Martina Bucková, H-Intes

---

**Od:** Martin Čerych, H-Intes  
**Odesláno:** pondělí 27. listopadu 2023 13:58  
**Komu:** Martina Bucková, H-Intes  
**Předmět:** FW: ZBV Březno  
**Přílohy:** Oznámení o změnách - změna VI.pdf; Vyjádření\_TDS\_1\_9\_2023.pdf; Vyjádření\_AD\_13\_9\_2023.pdf; Vyjádření - Městys Březno\_2.pdf; KSÚS - Souhlas se zpracováním ZBV\_2\_podepsané.pdf

S pozdravem

### Martin Čerych

Hlavní stavbyvedoucí

autorizovaný technik v oboru dopravní stavby  
specializace nekelejeová doprava

H-INTES s.r.o., Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav  
Tel.: +420 326 716 040, M: +420 724 123 227, GSM: +420 724 123 228  
e-mail: [m.cerych@h-intes.cz](mailto:m.cerych@h-intes.cz), URL: <http://www.h-intes.cz>



*Upozornění: Společnost H-INTES s.r.o. upozorňuje příjemce této elektronické zprávy, že poptává-li tímto emailem odesílatel po adresátovi plnění, jedná se o nezávaznou poptávku a toto jednání nelze považovat za příslib uzavření smlouvy, neuvede-li odesílatel tohoto emailu výslovně jinak. Společnost H-INTES s.r.o. upozorňuje, že uzavření smlouvy, stejně jako závazné přijetí návrhu na uzavření, změnu nebo zrušení smlouvy, podléhá vícestupňovému schvalování, a proto si odesílatel vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu či ukončit jednání o smlouvě či návrhu v jakékoliv fázi jednání. Přijetí návrhu na uzavření smlouvy (nabídky) s dodatkem nebo odchylkou se v souladu s ust. § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku vylučuje.*

---

**From:** Svidekova Alena <[alena.svidekova@ksus.cz](mailto:alena.svidekova@ksus.cz)>

**Sent:** Tuesday, September 19, 2023 6:55 AM

**To:** Martin Čerych, H-Intes <[m.cerych@h-intes.cz](mailto:m.cerych@h-intes.cz)>; Aleš Neudert, H-Intes <[a.neudert@h-intes.cz](mailto:a.neudert@h-intes.cz)>

**Cc:** Hanuš Marek <[marek.hanus@ksus.cz](mailto:marek.hanus@ksus.cz)>; Vácha Martin <[martin.vacha@valbek.eu](mailto:martin.vacha@valbek.eu)>; Jan Havelka, CR Project <[j.havelka@crproject.cz](mailto:j.havelka@crproject.cz)>; brezno@seznam.cz; Lucie Heřmanová, H-Intes <[l.hermanova@h-intes.cz](mailto:l.hermanova@h-intes.cz)>; Jan Fidler <[jan.fidler@ksus.cz](mailto:jan.fidler@ksus.cz)>

**Subject:** ZBV Březno

Dobrý den,

tímto Vás na základě Oznámení o změnách – změna VI., žádáme o zpracování ZBV. Vyjádření TDS, AD a souhlasy se zpracováním ZBV zasílám v příloze.

Děkuji.

S přáním hezkého dne,

*Ing. Alena Švideková*

*Oddělení investic - projektový manažer*

*Krajská správa a údržba silnic*

*Středočeského kraje, p. o.*

*se sídlem: Zborovská 11, Praha 5*

*Oblastní pracoviště: Žižkova 1, Říčany*

*tel.: 601 092 960*

*e-mail: [alena.svidekova@ksus.cz](mailto:alena.svidekova@ksus.cz)*

## Rozbor ceny položky 3399411R1

Sloupek 70x70x2150 mm univerzální k bráně, brance

TOV 000

TOV 000

MJ kus

1	Přímý materiál	999,17
2	Mzdy	0,00
3	Odvody 34 % z mezd	0,00
4	Stroje	0,00
5	Ostatní přímé náklady	0,00
6	<b>Přímé zpracovací náklady [2] až [5]</b>	<b>0,00</b>
7	Nekalkulované náklady	0,00
<b>Přímé + nekalkulované náklady [1] + [6] + [7]</b>		<b>999,17</b>
8	režie výrobní % z [1] + [6]	0,00
9	režie správní 5,0 % z [1] + [6]	49,96
<b>Nepřímé náklady [8] + [9]</b>		<b>49,96</b>
<b>Náklady celkem + nekalkulované [1] + [6] + [7] + [8] + [9]</b>		<b>1 049,13</b>
10	Zisk 5,0 % z [1] + [6]	49,96
<b>Celkem [1] + [6] až [10]</b>		<b>1 099,09</b>
<b>Jednotková cena</b>		<b>1 099,09</b>

Hmotnost	0,000000
Normohodiny	0,0

P.Č.	T	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	Celkem
	H		Sloupek 70x70x2150 mm univerzální k bráně, brance dle cenový nabídky dodavatele České Ploty, s.r.o.	kus	1,00000	999,17	999,17
	H						0,00
	H						0,00
							<b>999,17</b>
	M			Nh			0,00
	M						0,00
	M						0,00
							<b>0,00</b>
	S			Sh			0,00
	S						0,00
	S						0,00
							<b>0,00</b>
	O						0,00
	O						0,00
	O						0,00
							<b>0,00</b>

# Sloupek brány 7x7

Kód: 8045078

**Sloupek brány 7x7**  
**1399,00 Kč / ks**

**1399,00 Kč / ks**



Zavolej a objednej

**+420 222 250 166**

[dodání i platba - více informací zde](#)

[Odstoupení od smlouvy a výjimky](#)

## Popis produktu

Značka

**BAUMAX**

Druh sortimentu:

**Plotové  
sloupky**

Kód:

**8045078**

Dostupnost:

**zboží je dostupné**

Předpokládaná lhůta dodání:

**cca 5 pracovních dnů**

**(Klikni a vyzvedni - cca 48 hodin)**

Sloupek s otvory se závity pro montáž dvoukřídlých bran a branek. Pozink, Barva RAL9005. Rozměry: 7x7x215cm

Sloup je kompatibilní se systémy: Brema, Tola 2, Rita 2

**ČESKÉ PLOTY, s.r.o.**

Do Višňovky 10  
25101 Herink

**Pobočka:**

IČ : 24317217

Tel.: +420774600934

DIČ : CZ24317217 E-mail: info@ceskeploty.cz

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Praze , oddíl C, vložka 196058.



**ČESKÉ PLOTY**

**NABÍDKA**

**NVHM2302298**

**H-INTES s.r.o.**

Pod Borkem 319  
29301 Mladá Boleslav  
Česká republika

IČ : 25636332

DIČ : CZ25636332

**Datum vystavení:** 19.06.2023

**Datum platnosti od:** 19.06.2023

**Datum platnosti do:** 24.06.2023

**Datum vyřízení:**

Popis	Katalog	Počet MJ	Cena za MJ	Sazba	Základ	Celkem s DPH
<b>KP - Sloupek 70x70x2150 mm univerzální k bráně, brance ZN+RAL 7016</b>	CP005845	2,00 ks	999,17	21%	1 998,33	2 417,98 Kč
<b>KP - Spojka "T" pro plotové pole ALICE, PORTLAND, TOLA, ARIZONA, IMPERIAL, bez šroubů, ZN+RAL 7016 - bal</b>	CP005030	50,00 ks				
<b>Šroub TEX samovrtný pozinkovaný 6,3 x 25 šestihranná hlava</b>	CP005724	200,00 ks				
<b>KP - Šroub M8x30</b>	CP003042	100,00 ks				

Vystavil: Petr Setnička, tel.: 777 051 029

[ceskeploty.cz](http://ceskeploty.cz)

Vytiskl(a): Petr Setnička, tel.: 777 051 029



## Nabídka kovaného oplocení - pí. Linková

platnost nabídky od 6.6.2023 do 6.6.2023

Položka	MJ	množství	cena za jednotku	cena celkem
Segmet STYLE Wp	ks	25	6 544,00 Kč	163 600,00 Kč
Vzor:		AW.10.22		
Šířka:		2000 mm		
Výška:		900 mm		
Barva:		RAL 7016 MAT		
Segmet STYLE Wp	ks	1	5 235,20 Kč	5 235,20 Kč
Vzor:		AW.10.22		
Šířka:		1600 mm		
Výška:		900 mm		
Barva:		RAL 7016 MAT		

Položka	MJ	množství	cena za jednotku	cena celkem
Montážní sada	ks	102	80,00 Kč	8 160,00 Kč
Typ:		UB2		
Montážní sada	ks	2	72,00 Kč	144,00 Kč
Typ:		UM2		

Položka	MJ	množství	cena za jednotku	cena celkem
Dvoukřídlová brána STYLE Wp	ks	1	36 064,00 Kč	36 064,00 Kč
Vzor:		AW.10.22		
Šířka:		3520 mm		
Výška:		1300 mm		
Zavěšení:		TYPE B		
Barva:		RAL 7016 MAT		
Dvoukřídlová brána STYLE Wp	ks	2	39 477,20 Kč	78 954,40 Kč
Vzor:		AW.10.22		
Šířka:		4020 mm		
Výška:		1300 mm		
Zavěšení:		TYPE B		
Barva:		RAL 7016 MAT		

Položka	MJ	množství	cena za jednotku	cena celkem
Branka STYLE Wp	ks	2	13 266,40 Kč	26 532,80 Kč
Vzor:		AW.10.22		
Šířka:		930 mm		
Výška:		1300 mm		
Zavěšení:		A		
Barva:		RAL 7016 MAT		

Položka	MJ	množství	cena za jednotku	cena celkem
Sloupek na patku BST-4 F2-D4	ks	1	4 120,00 Kč	4 120,00 Kč
Rozměr:		80 x 80 x 3 mm		
Výška:		2000 mm		
Barva:		RAL 7016 MAT		

Materiál celkem				322 810,40 Kč
Cena materiálu po slevě 20%				258 248,32 Kč
<b>Kompletní cena nového oplocení</b>				<b>258 248,32 Kč</b>

Všechny uvedené ceny jsou bez DPH.  
Doprava materiálu na místo určení zdarma.

vyřizuje - Ondřej Gejdoš 602 375 272  
E-mail: [ondrejgeidos@pilecky.cz](mailto:ondrejgeidos@pilecky.cz)
