

II/101 Jirny, most ev .č. 101-076
přes Jirenský potok za obcí Jirny

Středočeský kraj, Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 , tel.: +420 257 280 111, email: podatelna@kr-s.cz, datová schránka: keebyyf

Investor:







Středočeský kraj
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5

Výškový systém:

Bpv

Souřadnicový systém:

S-JTSK

Číslo zakázky:	22 171 00	HIP:		 Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4-Braník +420 244 462 219 pontex@pontex.cz
Schválil:	Ing. Petr SOUČEK	Zodp. projektant:	Ing. Daniel ŠINDLER, Ph.D.	
			724007830, dsn@pontex.cz	
Tech. kontrola:	Ing. Martin KUDRNÁČ	Vypracoval:	Ing. Martin ŠTAFEN	
	602256144, mku@pontex.cz		776500066, mst@pontex.cz	
				

Objednatel:	Středočeský kraj	Obec:	Jirny	Kraj:	Středočeský
Akce:	II/101 Jirny, most ev. č. 101-076 přes Jirenský potok za obcí Jirny			Datum	Stupeň
Část:	E DOKLADOVÁ DOKUMENTACE			12/2023	PDPS
Objekt:				Souprava	Č. přílohy
Příloha:	ZÁZNAMY Z JEDNÁNÍ				E.5

Zápis z jednání

Dne: 13.09.2022

Vyřizuje: Ladislav Bambušek

tel. 608 92 92 97

e-mail: bambusek@pontex.cz

Akce: Oprava mostu ev.č.101-076 přes Jirenský potok na silnici II/101 v obci Jirny

Dne 13.09. se uskutečnila schůzka ohledně řešení projektové dokumentace na opravu mostu ev.č.101-076 v obci Jirny.

Schůzky se zúčastnili:

- **Za projektanta firmu Pontex s.r.o. :**
hlavní projektant Ing. Daniel Šindler a projektant Ladislav Bambušek - dsn@pontex.cz,
bambusek@pontex.cz
- **Za obec Jirny:**
starosta Stanislav Skořepa a místostarostka Bc. Šárka Hanušová – starosta@jirny.cz
- **Za KUS Středočeského kraje:**
projektový manažer Jan Zákostelský Dis., pí. Marta Poláková- jan.zakostelsky@ksus.cz,
marta.polakova@ksus.cz
- **Za Policii ČR Praha Východ: npor. Mgr. Lucie Hanousková –** pov.di.ding@pcr.cz

Zúčastnění projednali opravu mostu přes Jirenský potok a to tak, aby byly minimalizované dopady jak na provoz v obci během výstavby, tak aby vlastní užívání nového mostu nepřineslo obci dodatečné zatížení dopravou.

Na místě byla domluvena tato opatření:

- 1) Projektant zajistí projednání požadavků Povodí Labe s.p. ohledně průtokového profilu, a tyto zapracuje do projektu rekonstrukce mostu. bude navrhována pouze nezbytně nutná úpravy nivelety převáděné komunikace.
- 2) Bylo dohodnuto, že během výstavby bude doprava převedena na provizorní most, jehož součástí bude i lávka pro pěší. Mostní provizorium bude umístěno v místě stávající lávky. Ta bude tedy po dobu rekonstrukce snesena a po rekonstrukci osazena zpět a celý chodník včetně lávky bude uveden do původního stavu.
V rámci celé rekonstrukce mostu bude vždy zachován průchod pro pěší.
- 3) Součástí rekonstrukce mostu bude též přeložka plynu společnosti GasNet a vodovodu společnosti VaK Zápy, případně dalších dotčených IS.
- 4) Dopravní značení, které dnes zamezuje vjezdu do obce Jirny z obou stran, zůstane i po rekonstrukci mostu v současném stavu. Na komunikaci tedy bude i nadále zamezen vjezd vozidlům **nad 6 tun**. Bude provedena kontrola umístění dopravních značek na obou příjezdech do obce a v případě jejich poškození se značení opraví.
- 5) Obec předběžně souhlasí s kácením dřevin, které budou zasahovat do prostoru provizorního přemostění. Pokud bude požadována náhradní výsadba, investor ji zajistí.

Zapsal dne 13.9.2022 Ladislav Bambušek

Záznam z jednání

Akce: **Oprava mostu ev.č.101-076 přes Jirenský potok na silnici II/101 v obci Jirny**
Objekt: -
Datum: 25.10.2022
Místo: místo stavby
Přítomni: viz prezenční listina, jako nedílná součást záznamu

Jednání bylo svoláno za účelem projednání omezení vjezdů na soukromé pozemky s ohledem na technické řešení rekonstrukce mostu. Na jednání bylo dohodnuto:


- Po dobu rekonstrukce mostu bude v ulici Luční u domu č.p. 388 zřízeno provizorní parkovací stání na zatravněné ploše mezi silnicí a oplocením pro možnost parkování vozidel obyvatel domu (viz příloha záznamu). Po dokončení stavby bude plocha uvedena do původního stavu.
- V rámci rekonstrukce dojde k přeložce sloupu NN v blízkosti mostu a bude zajištěna přeložka soukromých přípojek NN, které vedou z dotčeného sloupu.
- V rámci rekonstrukce bude provedena přeložka vedení STL plynovodu. Majitele RD souhlasí s krátkodobou odstávkou plynovodu (cca 2 dny) potřebné pro propojení přeložky v době mimo topnou sezonu.
- Projektant prověří možnost zřízení provizorní oplocené plochy s dočasnou uzamykatelnou stavbou, která bude sloužit jako sklad materiálu a parkoviště stavebních strojů, který dnes využívá majitel domu č.p. 388 na svém pozemku. Z důvodu provedení rekonstrukce mostu bude, především v době zhotovení spodní stavby mostu, vjezd na tento pozemek výrazně omezen. Bude prověřena možnost zřízení této plochy v okolí stavby tak, aby vzdálenost od RD byla přijatelná. V případě, že uvedené provizorní prostory budou zajištěny, je možné v rámci stavby uvažovat s úplným přerušením připojení domu o silnice II/101 podél potoku, a to po dobu přibližně dvou měsíců, tedy po dobu na zhotovení nové spodní stavby mostu. V případě, že provizorní prostory nebudou zajištěny, požaduje majitel domu č.p. 388 trvalé zachování uvedeného příjezdu.
- Bude zachován systém odvodnění před RD č.p. 193, zpevněná plocha před RD bude vyasfaltována.

Zapsal

Ing. Martin Štaffen
projektant

Rozdělovník:

- Běloch Miloslav – mbeloch@email.cz
- Skalický Igor – jask@centrum.cz
- Pontex s.r.o. – sindler@pontex.cz, staffen@pontex.cz

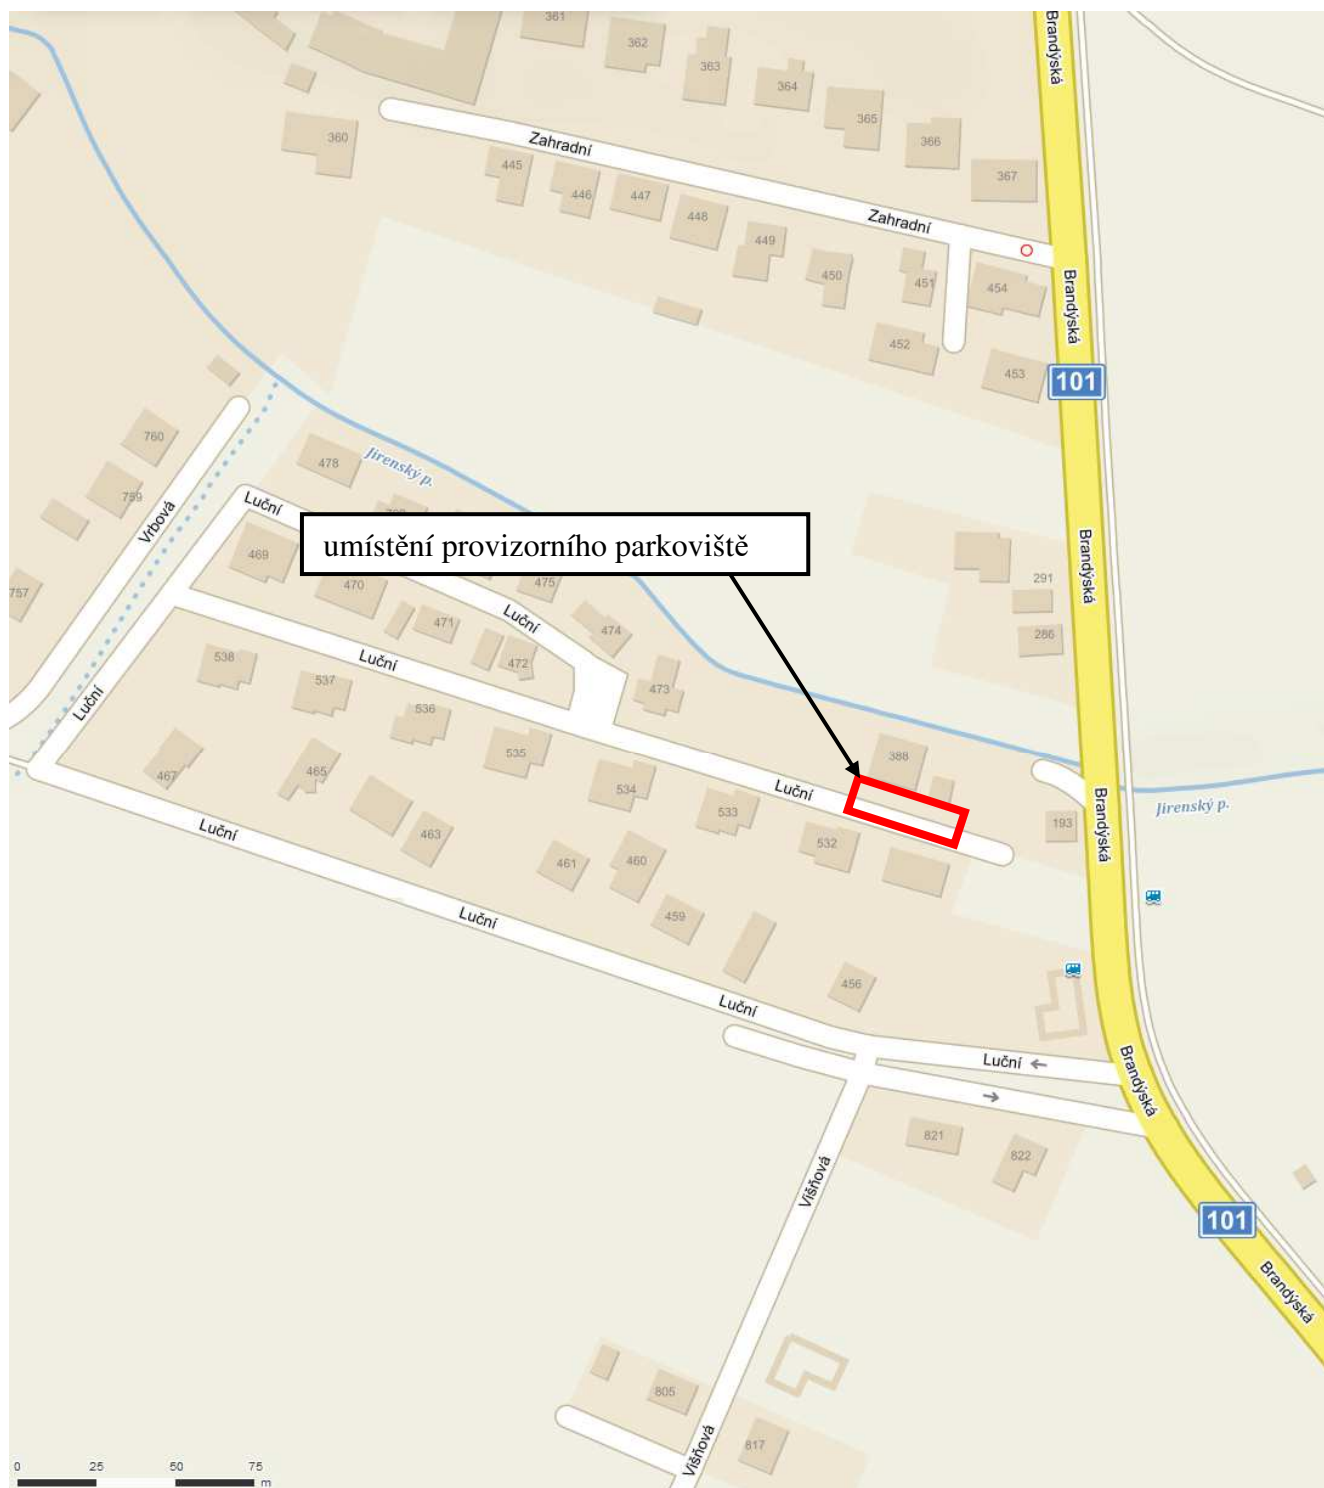

Název akce: II/101 Jirny, most ev.č. 101-076 přes Jirenský potok za obcí Jirny

[illegible]

tel.: +420-244 462 219
tel.: +420-602 214 618
tel.: +420-244 462 277
e-mail: pontex@pontex.cz
