HARMONOGRAM: II/608 Nové Ouholice - Nová Ves, rekonstrukce

ID	SO	Název úkolu	Doba trvání
1		Zahájení stavby	0 týdny
2		Příprava stavby/zhotovitele	4 týdny
3	**100**	**Objekty řady 100**	**68 týdny**
4	**101**	**Silnice II/608 - úsek ZÚ - km 1,175**	**32 týdny**
5		Frézování vozovkových vrstev	1 týden
6		vše ostatní	22 týdny
7	**101**	**Silnice II/608 - úsek km 1,175 - KÚ**	**36 týdny**
8		Frézování vozovkových vrstev	1 týden
9		vše ostatní	22 týdny
10	102	Komunikace ŘSD (po podélných polovinách)	6 týdny
11	103	Místní komunikace - úsek ZÚ - km 1,175	6 týdny
12	103	Místní komunikace - úsek km 1,175 - KÚ	6 týdny
13	111	Chodníky - nové - úsek ZÚ - km 1,175	10 týdny
14	111	Chodníky - nové - úsek km 1,175 - KÚ	10 týdny
15	112	Chodníky - oprava - úsek ZÚ - km 1,175	4 týdny
16	112	Chodníky - oprava - úsek km 1,175 - KÚ	4 týdny
17	**180**	**Dopravně inženýrská opatření**	**68 týdny**
18		Etapa 1 - úsek ZÚ - km 1,175	32 týdny
19		Etapa 2 - úsek km 1,175 - KÚ	36 týdny
20	190	Trvalé dopravní značení - úsek ZÚ - km 1,175	3 týdny
21	190	Trvalé dopravní značení - úsek km 1,175 - KÚ	3 týdny
22		**Objekty řady 200**	**32 týdny**
23	201	Most ev. č. 608-011 přes strouhu v obci Nové Ouholice	32 týdny
24	202	Most ev. č. 608-014 přes Bakovský potok v obci Nové Ouholice	32 týdny
25	251	Opěrná zeď v km 0,500	12 týdny
26	252	Opěrná zeď v km 0,750	12 týdny
27		**Objekty řady 300**	**60 týdny**
28	301	Odvodnění silnice II/608 Nové Ouholice	13 týdny
29	302	Odvodnění silnice II/608 Nová Ves	13 týdny
30	321	Úprava koryta u SO 201	4 týdny
31	322	Úprava koryta u SO 202	4 týdny
32	341	Přeložky a úpravy vodovodů Nové Ouholice	8 týdny
33	342	Přeložky a úpravy vodovodů Nová Ves	8 týdny
34	343	Úprava vodovodu u SO 251 a 252	2 týdny
35		**Objekty řady 400**	**68 týdny**
36	405	Přeložka kabelu VO 1kV v km 0,258 – 0,278	3 týdny
37	406	Přeložka kabelu VO 1kV v km 0,436 – 0,459	3 týdny
38	431	Veřejné osvětlení - úsek ZÚ - km 1,4	8 týdny
39	431	Veřejné osvětlení - úsek km 1,4 - km 1,5	3 týdny
40	461	Ochrany a přeložky kabelů CETIN	68 týdny
41		**Objekty řady 500**	**45 týdny**
42	501	Přeložky STL plynovodů a přípojek - úsek km 0,55 - km 0,7	6 týdny
43	501	Přeložky STL plynovodů a přípojek - úsek km 1,4 - km 1,85	13 týdny
44		**Objekty řady 700**	**4 týdny**
45	701	Náhradní oplocení	4 týdny
46		**Objetky řady 800**	**33.8 týdny**
47	801	Vegetační úpravy - kraj	4 týdny
48	802	Vegetační úpravy - obec	4 týdny
49		**Související stavby**	**30 týdny**
50		Splašková kanalizace - úsek km 1,4 - km 2,1	13 týdny
51		Mostek na chodníku přes Bakovský potok	20 týdny
52		Chodník podél II/608 (km 0,7 - km 1,4)	10 týdny
53		Chodník podél I/16H	10 týdny
54		Zprovoznění etapy 1 - úsek ZÚ - km 1,175	0 týdny
55		Zprovoznění etapy 2 - úsek km 1,175 - KÚ	0 týdny

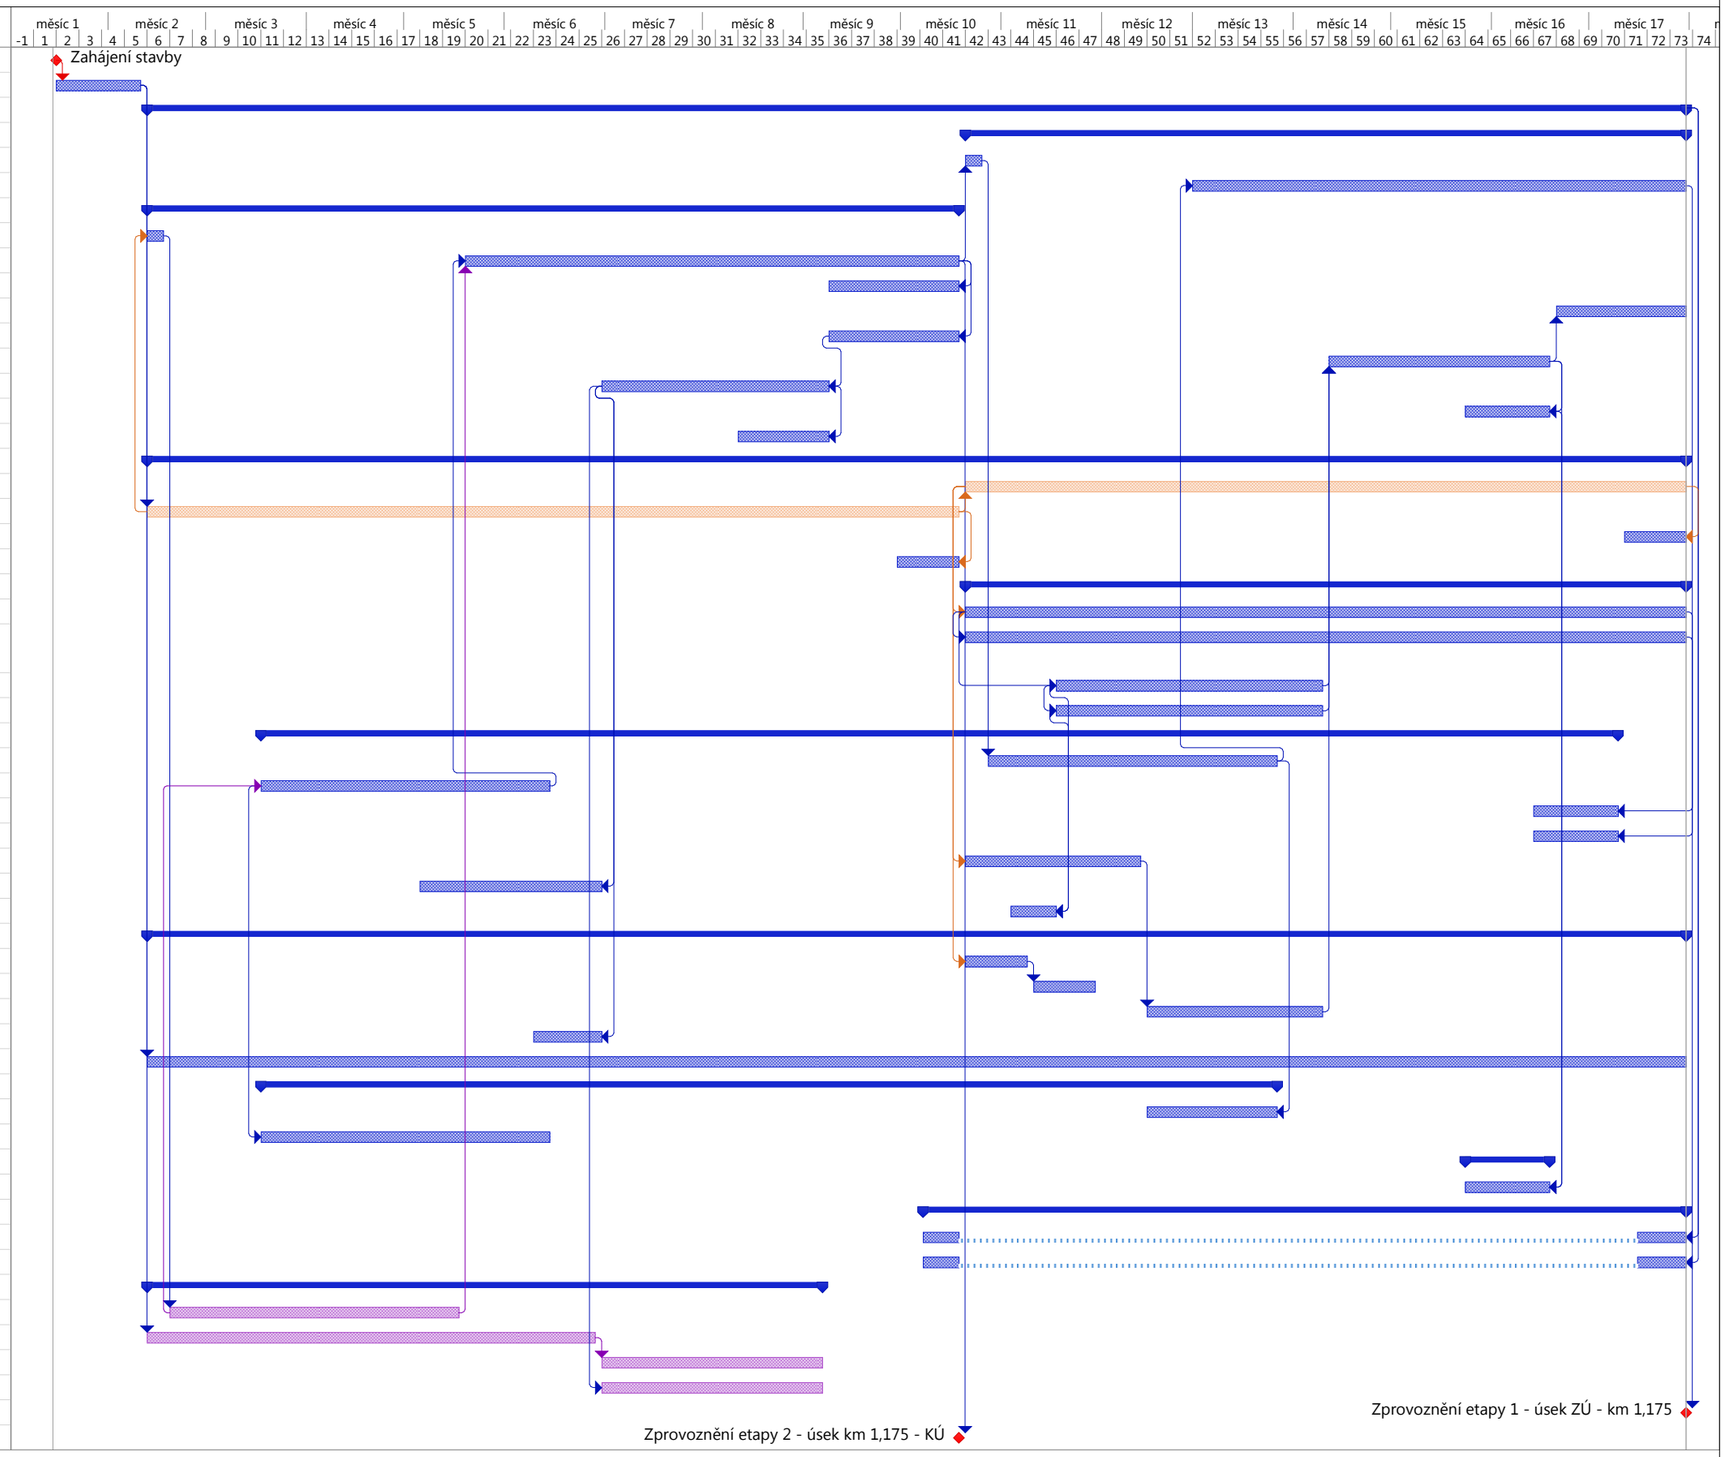

Souhrnný | Činnost | Související stavba | Přerušení | Milník
