

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též „**občanský zákoník**“) mezi:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, Praha 5, Smíchov PSČ: 150 00
IČO: 00066001
DIČ: CZ00066001
zastoupená: Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem
a dále zastoupená Ing. Janem Fidlerem, DiS, statutárním zástupcem
ředitele, na základě plné moci ze dne 28. 06. 2022
č. smlouvy: S-2494/00066001/2021
dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

HELPING VÝŠKOVÉ PRÁCE s.r.o.

se sídlem: Moskevská 532/60, 101 00 Praha 10 - Vršovice
IČO: 277 00 810
DIČ: CZ26177005
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 203037,
zastoupená: Jaromírem Peškem, jednatelem společnosti
č. smlouvy: Zak143
dále jen „**Zhotovitel**“ na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „**smluvní strany**“)

Preambule:

Smluvní strany tímto prohlašují, že dne 18. 10. 2021 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na veřejné zakázce s názvem: „**II/277 Mohelnice nad Jizerou/Podhora – sanace nestabilní skalní stěny, fáze I. očištění skalního masivu**“ (dále jen „**Smlouva o dílo**“). Na základě dohody smluvních stran a ve vazbě na čl. 14. odst. 14.13. Smlouvy o dílo, uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jen „**Dodatek č. 1**“).

I. Předmět Dodatku č. 1

1. S ohledem na vznik objektivně nepředvídaných okolností v průběhu realizace prací na díle, které nemohl zhotovitel před zahájením prací předpokládat, a které zapříčinily změnu rozsahu prací v podobě méněprací a víceprací, upravuje se po dohodě smluvních stran předmět Smlouvy o dílo. Změna rozsahu prací v podobě méněprací a víceprací obsahují Objednatel schválené změnové listy, které jsou přílohou tohoto Dodatku č. 1. Na základě změny předmětu díla se mění i celková cena za dílo uvedená v odst. 8.1. Smlouvy o dílo, který nově zní:

- 8.1. Smluvní strany se dohodly, že celková Cena Díla je stanovena jako neměnná a konečná a činí:

Původní Cena Díla bez DPH	1.119.296,70 Kč
Nová Cena díla dle Dodatku č. 1 bez DPH	1.448.279,45 Kč
DPH 21%	304.138,68 Kč
DPH 15 %	0,- Kč
Cena Díla včetně DPH	1.752.418,13 Kč

Daň z přidané hodnoty (dále též „DPH“) bude na základě výslovné dohody smluvních stran připočtena ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že veškerá množství uvedená v soupise prací k Dílu a jeho jednotlivým částem jsou pouze odhadovaná, a jejich změna neznamena změnu Ceny Díla.

Přílohou tohoto Dodatku č. 1 jsou Objednatelem odsouhlaseny Změnové listy 1.

II. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 bude uveřejněn dle § 219 zákona o ZVZ na profilu Objednatele.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tento Dodatek č. 1 uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy o dílo. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, která nejsou tímto Dodatkem č. 1 výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze smluvních stran obdrží její elektronický originál.
5. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento Dodatek č. 1 uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto Dodatku č. 1 za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku č. 1 rozhodující.

V Praze dne:
Zhotovitel:

V Říčanech dne:
Objednatel:

.....
HELPING VÝŠKOVÉ PRÁCE s.r.o.
Jaromír Peška, jednatel společnosti

.....
**Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, p.o.**

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby: II/277 Mohelnice nad Jizerou/Podhora - sanace nestabilní skalní stěny, fáze I. očištění skalního masívu	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS:	Číslo ZBV: 1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Skalní stěna podél silnice č. II/277 u obce Mohelnice n. Jizerou		

Objednatel: **Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**
 Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov
 IČ: 00066001

Zhotovitel: **HELPING VÝŠKOVÉ PRÁCE s.r.o.**
 Moskevská 532/60, 101 00 Praha 10 - Vršovice
 IČ: 27700810

Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.3	0,00	174 250,75	174 250,75

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.4	0,00	154 732,00	154 732,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1	0,00	328 982,75	328 982,75

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
 Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
 a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré:

3

Změnový list																																									
Název a evidenční číslo Stavby: II/277 Mohelnice nad Jizerou/ Podhora - sanace nestabilní skalní stěny, fáze I. očištění skalního masívu Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Skalní stěna podél silnice č. II/277 u obce Mohelnice n. Jizerou		Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	Číslo ZBV: 1.3																																						
Strany smlouvy o dílo objednatel č.: S-2494/00066001/2021 a zhotovitel č.: Zak143 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 18.10.2021 (dále jen Smlouva): Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov Zhotovitel: HELPING VÝŠKOVÉ PRÁCE s.r.o., Moskevská 532/60, 101 00 Praha 10 - Vršovice																																									
Přílohy Změnového listu: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;">1. Krycí list</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">1</td> <td style="width: 10%;">počet listů</td> <td style="width: 40%;"></td> </tr> <tr> <td>2. Změnový list</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td>počet listů</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>počet listů</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4. Rozpis ocenění Změn položek ZBV 1</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td>počet listů</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5. Přehled zařazení změn do skupin</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>počet listů</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6. Přehled dalších dokladů</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>počet listů</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Další doklady dle přehledu dokladů</td> <td style="text-align: center;">39</td> <td>počet listů</td> <td></td> </tr> </table>		1. Krycí list	1	počet listů		2. Změnový list	2	počet listů		3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů		4. Rozpis ocenění Změn položek ZBV 1	2	počet listů		5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů		6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů		Další doklady dle přehledu dokladů	39	počet listů		<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 30%;">Paré č.</th> <th style="width: 70%;">Příjemce</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1, 2</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4</td> <td>Projektant (AD)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">5</td> <td>Stavební dozor</td> </tr> </table>		Paré č.	Příjemce	1, 2	Objednatel	3	Zhotovitel	4	Projektant (AD)	5	Stavební dozor
1. Krycí list	1	počet listů																																							
2. Změnový list	2	počet listů																																							
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů																																							
4. Rozpis ocenění Změn položek ZBV 1	2	počet listů																																							
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů																																							
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů																																							
Další doklady dle přehledu dokladů	39	počet listů																																							
Paré č.	Příjemce																																								
1, 2	Objednatel																																								
3	Zhotovitel																																								
4	Projektant (AD)																																								
5	Stavební dozor																																								
Iniciátor změny: Investor Popis a zdůvodnění Změny:																																									
Díličí změna 1: Změna rozsahu odstranění vegetace Tato změna vznikla na základě skutečně provedených prací. Zadávací výkaz výměr počítal s průměrnou výškou skalního masívu 7 m. V průběhu realizace stavby došlo po odstranění vegetace k zaměření skutečné výšky skalního masívu a bylo zjištěno, že průměrná výška skalního svahu a přilehlého svahu nad horní hranou skalní stěny je 10,66 m. Zhotovitel provedl nezbytné nutný zásah do vegetace, aby bylo možno pokračovat v následných pracích, zejména v kácení stromů a čištění skalního masívu. Výpočet ploch je uveden v měřicích protokolech (viz doklad č. 09, položka č. 9). Díličí změna 1 je vyjádřena smluvními položkami č. 1 a 9. Navyšuje smluvní cenu stavby o 13 528,96 Kč.																																									
Díličí změna 2: Změna hloubky očištění skalního masívu Změna vznikla na základě skutečně provedených prací. Zadávací výkaz výměr počítal s průměrnou hloubkou očištění skalního masívu 10 cm. Na začátku úseku (prvních 25 m) a na konci úseku (posledních 20 m) bylo během očištění silně zvětřalého povrchu skalního svahu dosaženo průměrné hloubky 40 cm, resp. 20 cm. Rovněž byl v daných partiích obnoven akumulační prostor pod patou svahu (místy přes 1 m hloubky). Z tohoto důvodu bylo navyšeno množství očištěné a odvezené horniny o 52,575 m³. Potvrzení o předání odpadů je přiloženo jako doklad č. 13. Výpočet ploch je uveden v měřicích protokolech (viz doklad č. 09, položka č. 10). Díličí změna 2 je vyjádřena smluvními položkami č. 10, 14, 15, 19, 20, 21. Navyšuje smluvní cenu stavby o 160 721,79 Kč. Výše uvedené skutečnosti byly projednány se zástupcem objednatel (viz doklad č. 08 - Zápis ve SD ze dne 3.11. a 19.11.2021). Změna nebude mít vliv na termín dokončení stavby. Výše popsané změny byly nepředvídatelné, zjištěné po odstranění vegetace. Změny jsou podle § 5, odst. 1, písmeno c) resp. § 10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29.5.2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazených do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemějí celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 100, odst. 6 je změnou nepředvídanou.																																									
Údaje v Kč bez DPH: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">Cena navrhovaných Změn záporných</th> <th style="width: 25%;">Cena navrhovaných Změn kladných</th> <th style="width: 25%;">Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem</th> <th style="width: 25%;">Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">174 250,75</td> <td style="text-align: center;">174 250,75</td> <td style="text-align: center;">174 250,75</td> </tr> </tbody> </table>				Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	0,00	174 250,75	174 250,75	174 250,75																														
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných																																						
0,00	174 250,75	174 250,75	174 250,75																																						
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:																																									
Zhotovitel (stavbyvedoucí):	jméno	Radek Hrubý	datum																																						
Projektant (autorský dozor):	jméno	xxx	datum																																						
Stavební dozor:	jméno	Tomáš Pecka	datum																																						
Supervize (Regionální dotační kancelář):	jméno	xxx	datum																																						
Zástupce Objednatel: KSÚS	jméno	Ing. Jan Lichtneger	datum																																						
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny a dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitel sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.																																									
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel):	jméno	Ing. Jan Lichtneger	datum																																						
Zhotovitel	jméno	Jaromír Peška	datum																																						
			Číslo paré: 3																																						

 Krajská správa a údržba silnic
 Středočeského kraje,
 příspěvková organizace
 Zborovská 11
 IČO: 020066001
 150 21 Praha 5
 (55)

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: II/277 Mohelnice nad Jizerou/ Podhora - sanace nestabilní skalní stěny, fáze I. očištění skalního masívu		Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS:	Číslo ZBV: 1.4																					
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Skalní stěna podél silnice č. II/277 u obce Mohelnice n. Jizerou																								
Strany smlouvy o dílo objednatel č.: S-2494/00066001/2021 a zhotovitel č: Zak143 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 18.10.2021 (dále jen Smlouva): Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov Zhotovitel: HELPING VÝŠKOVÉ PRÁCE s.r.o., Moskevská 532/60, 101 00 Praha 10 - Vršovice																								
Přílohy Změnového listu:		<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="text-align: left; width: 10%;">Paré č.</th> <th style="text-align: left; width: 90%;">Příjemce</th> </tr> <tr> <td>1, 2</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Projektant (AD)</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Stavební dozor</td> </tr> </table>		Paré č.	Příjemce	1, 2	Objednatel	3	Zhotovitel	4	Projektant (AD)	5	Stavební dozor											
Paré č.	Příjemce																							
1, 2	Objednatel																							
3	Zhotovitel																							
4	Projektant (AD)																							
5	Stavební dozor																							
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">1. Krycí list</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">1</td> <td style="width: 60%;">počet listů</td> </tr> <tr> <td>2. Změnový list</td> <td style="text-align: center;">4</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>4. Rozpis ocenění Změn položek ZBV 1</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>5. Přehled zařazení změn do skupin</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>6. Přehled dalších dokladů</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>Další doklady dle přehledu dokladů</td> <td style="text-align: center;">39</td> <td>počet listů</td> </tr> </table>		1. Krycí list	1	počet listů	2. Změnový list	4	počet listů	3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů	4. Rozpis ocenění Změn položek ZBV 1	2	počet listů	5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů	6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů	Další doklady dle přehledu dokladů	39	počet listů		
1. Krycí list	1	počet listů																						
2. Změnový list	4	počet listů																						
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů																						
4. Rozpis ocenění Změn položek ZBV 1	2	počet listů																						
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů																						
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů																						
Další doklady dle přehledu dokladů	39	počet listů																						
Iniciátor změny: Investor																								
Popis a zdůvodnění Změny: Změna množství a způsobu kácení stromů Změna vznikla na základě místního šetření za účasti objednatele. Zadávací soupis prací požadoval směrové kácení stromů v celkovém počtu 45 ks. Zhotovitel po odstranění náletové vegetace svolal místní šetření za účasti zástupce objednatele. Po prohlídce staveniště byly na základě požadavku objednatele vytipovány stromy, které by vlivem svého stavu (suché a nakloněné stromy) mohly ohrožovat následující průběh realizačních prací, narušovat skalní masív svým kořenovým systémem a ohrožovat bezpečnost provozu na přilehlé komunikaci II. třídy. Zhotovitel na základě těchto skutečností konstatoval, že dané stromy je nutné rozebrat pomocí horolezecké techniky a že rozsah se navýšil oproti výkazů výměr o 27 ks (viz doklad č. 08 - Zápis ve SD ze dne 1.11.2021). Tato změna je vyjádřena položkami smluvními č. 6, 8 a položkami novými č. 25, 26. Změna zvyšuje smluvní cenu stavby o 154 732,00 Kč. Změna nebude mít vliv na termín dokončení stavby. Výše popsané změny byly nezbytné, zjištěné po odstranění náletové vegetace. Změny jsou podle § 5, odst. 1, písmeno d) resp. § 11 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29.5.2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazeny do Skupiny 4 . Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 5 je změnou nezbytnou.																								
Údaje v Kč bez DPH:																								
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných																					
0,00	154 732,00	154 732,00	154 732,00																					
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:																								
Zhotovitel (stavbyvedoucí):	jméno	Rašek Hrubý	datum																					
Projektant (autorský dozor):	jméno	xxx	datum																					
Stavební dozor:	jméno	Tomáš Pecka	datum																					
Supervize (Regionální dotační kancelář):	jméno	xxx	datum																					
Zástupce Objednatel: KSUS	jméno	Ing. Jan Lichtneger	datum																					
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, ze v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitele své podpisy.																								
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel):	jméno	Ing. Jan Lichtneger	datum																					
Zhotovitel	jméno	Jaromír Peška	datum																					
			Číslo par																					

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 1**

Název Stavby:	II/277 Mohelnice nad Jizerou/Podhora - sanace nestabilní skalní stěny, fáze I. očištění skalního masívu
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	Skalní stěna podél silnice č. II/277 u obce Mohelnice n. Jizerou

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
1 119 296,70

Poznámka. Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	1 119 296,70	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	328 982,75	328 982,75	29,39%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	0,00	1 448 279,45	328 982,75	29,39%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): souhlasím Radek Hrubý

Stavební dozor: souhlasím Tomáš Pecka

Zástupce Objednatele KSÚS souhlasím Lenka Chmelová

Zaměstnanec KSÚS
odpovědný za cenové
projednání Změny: souhlasím Ing. Jaroslava Jurkov

Rozpis ocenění Změn položek - celkem													
Evidenční číslo a název stavby: II/277 Mohelnice nad Jizerou/Podhora - sanace Číslo a název SO/PS: nestabilní skalní stěny, fáze I. očištění skalního masívu Skalní stěna podél silnice č. II/277 u obce Mohelnice n. Jizerou Číslo a název rozpočtu:									ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)				
									Skupina změn 3				
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	111251111	Očzení chráněných větví Ø do 100 mm s odvozem do 20 km	M1	5,378	5,271	1,067	2025,000	8 698,70	0,00	5 575,08	10 673,78	1 975,08	78,28%
9	155211112	Odstranění vegetace ze skalních ploch horolezeckou technikou včetně stažení k zemi	M2	220,500	151,375	130,875	73,000	16 096,50	0,00	9 583,88	25 650,38	9 553,88	98,35%
10	155211122	Očištění skalních ploch ručními nástroji (motykami, páčidly) horolezeckou technikou	M3	220,500	273,075	52,575	2215,000	488 407,50	0,00	116 453,61	604 861,13	116 453,63	71,88%
14	162751137	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	M3	292,500	345,075	52,575	148,000	43 290,00	0,00	7 781,10	51 071,10	7 781,10	57,97%
15	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	M3	4387,500	5176,125	788,625	5,000	21 937,50	0,00	3 943,13	25 880,63	3 943,13	17,87%
19	167151112	Nakládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 přes 100 m3	M3	220,500	273,075	52,575	30,000	6 615,00	0,00	1 577,25	8 192,25	1 577,25	21,88%
20	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skladkovně) zeminy a kamení: kód odpadu 17 05 04	T	585,000	690,150	105,150	290,000	169 650,00	0,00	30 493,50	200 143,50	30 493,50	57,97%
21	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	M3	292,500	345,075	52,575	9,000	2 632,50	0,00	473,18	3 105,68	473,18	17,97%
		Celkem							0,00	174 250,75		174 250,75	

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
 Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Jaromír Peška

Datum:

Podpis:

Za Objednatele: Tomáš Pecka

Datum:

Podpis:

Rozpis ocenění Změn položek - celkem

Evidenční číslo a II/277 Mohelnice nad Jizerou/Podhora - sanace název stavby: nestabilní skalní stěny, fáze I. očištění skalního masívu Číslo a název SO/PS: Skalní stěna podél silnice č. II/277 u obce Mohelnice n. Jizerou Číslo a název rozpočtu:								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								Skupina změn 4					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem
		Položky z rozpočtu											
6	162201412	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene do 500 mm	M	20,000	47,000	27,000	436,000	8 720,00	0,00	11 772,00	20 492,00	11 772,00	125,00%
8	162301952	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene do 500 mm ZKD 10 km	M	200,000	470,000	270,000	5,000	1 000,00	0,00	1 350,00	2 350,00	1 350,00	135,00%
		Nové položky											
	112151353	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D do 0,4 m	KS	0,000	23,000	23,000	4550,000	0,00	0,00	104 650,00	104 650,00	104 650,00	100,00%
26	112151354	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D do 0,5 m	KS	0,000	4,000	4,000	9240,000	0,00	0,00	36 960,00	36 960,00	36 960,00	100,00%
		Celkem							0,00	154 732,00		154 732,00	

Odpovědný zástupce Objednatelů i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vnařujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Jaromír Peška

Datum:

Podpis:

Za Objednatelů: Tomáš Pecka

Datum:

Podpis:

C
5
01

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby:

II/277 Mohelnice nad Jizerou/ Podhora - sanace nestabilní skální stěny, těže L ocelového skálního masivu

1	Přijaté smluvní částka bez rezervy a DPH	1 119 296,75
7=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	1 448 219,45
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	1 752 418,13
3=(21/100)	Procento změny Přijaté smluvní částky	129,31%
4=(25/100)	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(26/100)	Sledování záporných položek (Skupina 2)	0,00%
40=(9/100)	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 16, odst. 3b, písm. b)	0,99%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	328 982,75
7=(6/100)	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	25,39%
8=100/3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	336 789,01

9=(32A/100)	Sledování limitu 50 % Skupina 3	16,51%
10=(36/100)	Sledování limitu 50 % Skupina 4	13,81%
10A=(100+136A)	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	328 982,75
11=(100/5)	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	516 848,35

12=(1/100)	Limit	167 894,61
13=(100/11)	Sledování limitu (15%)	0,00%
14=(ABS(17)+(36))	Hodnota skupiny 5	0,00

SO	ZB č.	Název SO/PS, předmět Změny	Změny záporné (žadatel se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZB	- 1 -			- 2 -			- 3 -				- 4 -				- 5 -		
						Vyhrazené změny (Domény) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)			Změna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny neplávidané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)				Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)				Změny do minimální celkové povahy veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)		
						Změny záporné (žadatel se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadatel se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadatel se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (žadatel se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (žadatel se znaménkem minus)	Změny kladné	Limit 15 %
16	17	18	19=23+26+28+33	20=14+16+10+4+37+39	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	31=29+30	32A=ABS(28)+30	33	34	35=33+34	36A=ABS(33)+34	37	38	39=ABS(37)+36
		II/277 Mořnice nad Jizerou/ Podhora - sanace nestabilní skální stěny, těže L ocelového skálního masivu	0,00	328 982,75	328 982,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 250,75	168 260,75	164 250,75	0,00	154 732,00	154 732,00	154 732,00	0,00	0,00	0,00
	1	Skální stěna podél silnice II/277 u obce Mohelnice n. Jizerou	0,00	328 982,75	328 982,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 250,75	168 260,75	164 250,75	0,00	154 732,00	154 732,00	154 732,00	0,00	0,00	0,00
	2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Poznámka: Formulář má informativní charakter a poskytl je stav k datu předání Změnového listu.

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	1
Název a evidenční číslo stavby:	II/277 Mohelnice nad Jizerou/Podhora - sanace nestabilní skalní stěny, fáze I. očištění skalního masívu
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Skalní stěna podél silnice č. II/277 u obce Mohelnice n. Jizerou
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
07 Soupis prací SO po změnách	2	
08 Zápisy ve SD	4	
09 Měřicí protokoly	26	
10 Závěrečná zpráva geotechnika	3	
11 Vyjádření TDI	2	
12 Pokyn objednatele	1	
13 Protokol o předání odpadu	1	
14 Fotodokumentace	-	na CD u objednatele
Počet listů celkem	39	

Rozpis ocenění Změn položek - celkem													
Evidenční číslo a název stavby: II/277 Mohelnice nad Jizerou/Podhora - sanace nestabilní skalní stěny, fáze I. očištění skalního masívu Číslo a název SO/PS: Skalní stěna podél silnice č. II/277 u obce Mohelnice n. Jizerou Číslo a název rozpočtu:								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								celkem					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 viz doklad č. 09 (Měřicí protokoly) - položka č. 20 a doklad č. 13	M3	585,000	690,150	105,150	290,00	169 650,00	0,00	30 493,50	200 143,50	30 493,50	17,97%
21	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky viz doklad č. 09 (Měřicí protokoly) - položka č. 21	M3	292,500	345,075	52,575	8,00	2 340,50	0,00	423,18	3 105,68	423,18	17,97%
22	030001000	Zařízení staveniště	SOUBOR	1,000	1,000	0,000	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00%
23	041002000	Dozory - geotechnik	HOD	40,000	40,000	0,000	250,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
24	065002000	Mimostaveništní doprava	SOUBOR	1,000	1,000	0,000	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00%
		Nové položky - JC dle ÚRS 2021/1						0,00	0,00	141 610,00	141 610,00	141 610,00	100,00%
25	112151353	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D do 0,4 m viz doklad č. 09 (Měřicí protokoly) - položka č. 25	KS	0,000	23,000	23,000	4550,000	0,00	0,00	104 650,00	104 650,00	104 650,00	100,00%
26	112151354	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D do 0,5 m viz doklad č. 09 (Měřicí protokoly) - položka č. 26	KS	0,000	4,000	4,000	9240,000	0,00	0,00	36 960,00	36 960,00	36 960,00	100,00%
Celkem								1 119 296,70	0,00	328 982,75	1 448 279,45	328 982,75	29,39%

Datum	Denní záznamy stavby
1.11.21	ZÁPIS ZHOTOVITELE:
	KĚMELI POUŽITÍ ZA ÚČASTI ZÁSTUPCE OBJEDNATELE
	P. PECKY BYLY URČENY STROMY K POKÁČENÍ (27 ks)
	NAD PÁTEK VV - TÍM STROMY JSOU SUCHÉ,
	NEBO NAKLONĚNÉ A OHROŽUJÍ PRŮBĚH PRÁCI.
	STROMY BUDOU KÁČENÍ ZA POŽITÍ HORIZONTÁLNÍ
	TECHNIKY. PŘÍKLADY BUDOU VYKÁČENY V RÁMCI Z.L.
	PŘI ODSTRANĚNÍ NEBEZPEČNOSTI (KĚMELI)
	TAKO J. DÍLOM POUŽITÍM POUŽITÍM POUŽITÍM POUŽITÍM
	PŘI ODSTRANĚNÍ NEBEZPEČNOSTI (KĚMELI)
	PŘI ODSTRANĚNÍ NEBEZPEČNOSTI (KĚMELI)
	PŘI ODSTRANĚNÍ NEBEZPEČNOSTI (KĚMELI)
	PŘI ODSTRANĚNÍ NEBEZPEČNOSTI (KĚMELI)
	PŘI ODSTRANĚNÍ NEBEZPEČNOSTI (KĚMELI)
	PŘI ODSTRANĚNÍ NEBEZPEČNOSTI (KĚMELI)
	PŘI ODSTRANĚNÍ NEBEZPEČNOSTI (KĚMELI)
	PŘI ODSTRANĚNÍ NEBEZPEČNOSTI (KĚMELI)
	PŘI ODSTRANĚNÍ NEBEZPEČNOSTI (KĚMELI)
	PŘI ODSTRANĚNÍ NEBEZPEČNOSTI (KĚMELI)
	PŘI ODSTRANĚNÍ NEBEZPEČNOSTI (KĚMELI)
	PŘI ODSTRANĚNÍ NEBEZPEČNOSTI (KĚMELI)
	PŘI ODSTRANĚNÍ NEBEZPEČNOSTI (KĚMELI)
	PŘI ODSTRANĚNÍ NEBEZPEČNOSTI (KĚMELI)
	PŘI ODSTRANĚNÍ NEBEZPEČNOSTI (KĚMELI)
	PŘI ODSTRANĚNÍ NEBEZPEČNOSTI (KĚMELI)
	PŘI ODSTRANĚNÍ NEBEZPEČNOSTI (KĚMELI)
	PŘI ODSTRANĚNÍ NEBEZPEČNOSTI (KĚMELI)
	PŘI ODSTRANĚNÍ NEBEZPEČNOSTI (KĚMELI)
	PŘI ODSTRANĚNÍ NEBEZPEČNOSTI (KĚMELI)
	PŘI ODSTRANĚNÍ NEBEZPEČNOSTI (KĚMELI)

0842929

List č.

Datum	Denní záznamy stavby
3.11.21	ČASŤ SKALY. HOTOVIL PRÁCE DŮVEDNOU FOTODOKUMENTAČÍ TĚMTO MÍST PŘED, V PRŮBĚHU A PO DOKONČENÍ ODSTRANĚNÍ KAMENÍ. TOTO JE NUTNÉ PRO DOKONČENÍ PŘÍPRAVY VÝKONKOVÝCH, VHLUBENÍ A VĚŠANÍ OBRŮ, ODTEKOVÉHO NABÍJÁNÍ.
	ODSTRANĚNÍ VÝKONKOVÝCH HOTOVIL NA DŮVEDNÉ VYHODNĚNÍ PROSTORU STAVBY DOKONČENÍ VYKONKOVÝCH, VHLUBENÍ A VĚŠANÍ
4.11.21	POČASI: 4-9°C, ZATAŽENO - DEŠT PRAC. DOBA: 7-10" MECHANIZACE: AUTO + VLEK PRACOVNÍCI: POLEDNÍK VACLAV + 10 DĚL. PRÁCE: LIKVIDACE DŘEVNÍ HÍTOVY + JEJÍ ODVOZ
5.11.21	POČASI: 4-11°C, OBLAČNO - DEŠT PRAC. DOBA: 3-15" PRACOVNÍCI: POLEDNÍK VACLAV + 11 DĚL. MECHANIZACE: RUCNÍ NÁŘADÍ, HOTOVIL PILY PRÁCE: ČISTĚNÍ SKALNÍ STĚNY POUŽÍVÁNÍM TECHNIKY A RUCNÍHO NÁŘADÍ KAMENÍ STĚNY POUŽÍVÁNÍM HORIZONTÁLNÍ TECHNIKY

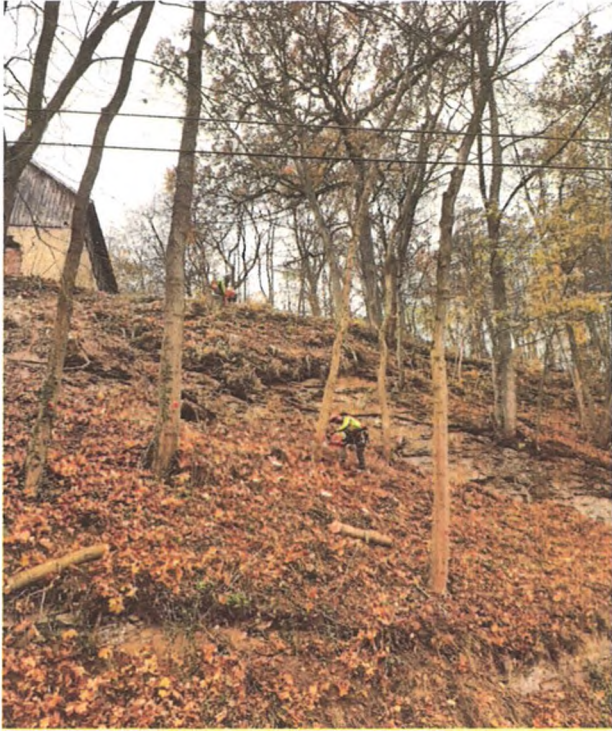
0842933

LHC

Datum	Denní záznamy stavby
16.11. OT	POČASÍ: 4-9°C, PROŽASNO PRAC. DOBA: 7-17 ³⁰
	PRACOVNÍCI: POLEDNÍK VACLAV + MATEJ MECH: NAKL. AUTO, TRAKTOR BAGR, 10T. PILA, ŽUČKA NAŘADÍ
	PRÁCE: ODVOZ NATIŽENÉ HOŘELINY NA SKLADU OCISTA SKALNHO SVANU POMOCI HOR. TECH A SOUTVŮ
	SEŘÍZÁVÁNÍ PÁŘEŽŮ
16.11.	ZÁPIS ZHOTOVITELÉ: CELKEM BYLO PRO NAD BAITEC ROZPOČET PRÁCE
	27 KS STŘOITU PRŮTOCI HOŘELIČECKÉ TECHNIKY. Z TONU 4 KS Ø DO 600 mm A 23 KS DO 500 mm BUDE ČEČENO V BAITCI ZÁH.
	SOUTVŮ. JEDINE MOTORIZOVANÉ O PŘÍKOPKÁCH PRŮ
17.11.21	POČASÍ: 3-8°C ST PRAC. DOBA: 7-17
	PRACOVNÍCI: POLEDNÍK VACLAV + MATEJ MECH: TRAKTOR BAGR, NAKL. AUTO, RUC. NAŘ.
	PRÁCE: OCISTA PATY SKALNHO MASIVU ODVOZ NATIŽENÉ ŽELEZINY NA SKLADU UKLID KOMUNIKACE

Datum	Denní záznamy stavby
15.11.21	POČASÍ: 3-8°C ZATAŽENÍ
ČT	PRAC. DOBA: 4-17"
	PRACOVNÍCI: POLEDNÍK VACLAV + MĚL.
	MECHANIZACE: TRAKTOR ZABR., NÁKL. AUTO, RUC.
	NÁŘADÍ
	PRÁCE: OČISTA A ÚKLID KOMUNIKACE
	OČISTA PATY SKALY A KRAJNICE
	OPUŠTĚNÍ HORIZONTU NA SKALCE
16.11.21	POČASÍ: 4-8°C, ZATAŽENÍ
PA	PRAC. DOBA: 5-17"
	PRACOVNÍCI: POLEDNÍK VACLAV + 5 DĚL.
	MECHANIZACE: TRAKTOR ZABR., NÁKL. AUTO
	RUCÍ NÁŘADÍ
	PRÁCE: ODVOZ NATĚČENÉ KORNINY
	ÚKLID KOMUNIKACE
	ÚPRAVA KRAJNICE VOZOVKY
17.11.21	ZÁPIS ZHOTOVITELI:
	VCHLEZENÍ K STAVAJÍCÍMU STAVU KRAJNICE PARTII
	(ZÁČATEK A KONEC ÚSEKU), KTERÉ BYLY SILNĚ
	ZVĚTŘALIZ A BYLO ZDE VELKÉ MNOŽSTVÍ ZEMIN
	V PATE SVAHU DOŠLO K NAVYČENÍ KUBATUŘI ODVOZU
	ZEMIN O CCA 50 m ³
	SOJEDINĚNÍ S NÁVŠTIVOU. MONTÁŽE
	MONTÁŽE K PRAKOVNÍM PRÁ

ZÁZNAM O SKUTEČNÉ VÝMĚŘE PROVEDENÝCH PRACÍ					List číslo :	1	24						
Název stavby : II/277 Mohelnice nad Jizerou/ Podhora - sanace nestabilní skalní stěny, fáze I. očištění skalního masivu													
PROTOKOL číslo : listopad 2021													
PS / SO č. :		Název PS / SO : Skalní stěna podél silnice č.II/277 u obce Mohelnice n.Jizerou											
Fakturace													
pol. č.	kód položky	Název položky :	Množství dle SOD	M. J.	předchozí období	fakturace	zůstatek						
1	111251111	Drcení ořezaných větví D do 100 mm s odvozem do 20 km	3,308	m3	0	3,308	0,000						
přehled čerpání													
období					množství		m3						
							m3						
Výpočet: pol. 9 351,375 m2					celkem za předchozí období 0,000 m3								
		<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>m2</td> <td>m2/m3</td> <td>celkem m3</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">351,375</td> <td style="text-align: center;">0,015</td> <td style="text-align: center;">5,271</td> </tr> </table>	m2	m2/m3	celkem m3	351,375	0,015	5,271					
m2	m2/m3	celkem m3											
351,375	0,015	5,271											
		5,271 m3											
		Celkem	5,271 m3										
		Fakturace do výše rozpočtu:	3,308 m3										
		NNZ (bude řešeno změnovým listem)	1,963 m3										
													
Zpracoval za zhotovitele : HELPING VÝŠKOVÉ PRÁCE s.r.o. Radek Hrubý				Schválil za zhotovitele : HELPING VÝŠKOVÉ PRÁCE s.r.o. Radek Hrubý									
Schválil za objednatele : Krajská správa a údržba silnic Středočeského ústředí příspěvková organizace Tomáš Pecka				Na základě výběrového PS/SO za SUPERVIZI:									
V Mohelnici nad Jizerou					dne: 30.11.2021								

ZÁZNAM O SKUTEČNÉ VÝMĚŘE PROVEDENÝCH PRACÍ					List číslo :		2/24	
Název stavby : II/277 Mohelnice nad Jizerou/Podhora - sanace nestabilní skalní stěny, fáze I. očištění skalního masivu								
PROTOKOL číslo : listopad 2021								
PS / SO č. :			Název PS / SO :			Skalní stěna podél silnice č.II/277 u obce Mohelnice n.Jizerou		
Fakturace								
pol. č.	kód položky	Název položky :	Množství dle SOD	M.J.	předchozí období	fakturace	zůstatek	
2	112151112	Směrové kácení stromů s rozfázáním a odvětvěním D kmene do 300 mm	25,000	kus	0	25,000	0,000	
přehled čerpání								
období						množství		kus
								kus
Výpočet: 25,000 ks Fakturace do výše rozpočtu: 25,000 kus celkem za předchozí období 0,000 kus								
								
Zpracoval za zhotovitele : HELPING VÝŠKOVÉ PRÁCE s.r.o. Radek Hrubý			Schválil za zhotovitele : HELPING VÝŠKOVÉ PRÁCE s.r.o. Radek Hrubý					
Schválil za objednatele : Krajská správa a údržba silnic Středočeské územní organizace Tomáš Pecka			Na základě výběrového PS/SO za SUPERVIZI: ✓					
V Mohelnici nad Jizerou					dne: 30.11.2021			

ZÁZNAM O SKUTEČNÉ VÝMĚŘE PROVEDENÝCH PRACÍ						List číslo :	3	24
Název stavby : II/277 Mohelnice nad Jizerou/ Podhora - sanace nestabilní skalní stěny, fáze I. očištění skalního masívu								
PROTOKOL číslo : listopad 2021								
PS / SO č. :			Název PS / SO : Skalní stěna podél silnice č.II/277 u obce Mohelnice n.Jizerou					
Fakturace								
pol. č.	kód položky	Název položky :	Množství dle SOD	M.J.	předchozí období	fakturace	zůstatek	
3	112151114	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene do 500 mm	14,000	kus	0	14,000	0,000	
přehled čerpání								
období					množství		kus	
							kus	
Vypočet:			14,000 ks					
Fakturace do výše rozpočtu:			14,000 kus					
					celkem za předchozí období 0,000 kus			
								
Zpracoval za zhotovitele :			Schválil za zhotovitele :					
HELPING VÝŠKOVÉ PRÁCE s.r.o. Radek Hrubý			HELPING VÝŠKOVÉ PRÁCE s.r.o. Radek Hrubý					
Schválil za objednatele :			Na základě výběrového PS/SO za SUPERVIZI:					
Krajská správa a údržba silnic Středočeské příspěvková organizace Tomáš Pecka								
V Mohelnici nad Jizerou					dne: 30.11.2021			

ZÁZNAM O SKUTEČNÉ VÝMĚŘE PROVEDENÝCH PRACÍ					List číslo :		4 24	
Název stavby : II/277 Mohelnice nad Jizerou/ Podhora - sanace nestabilní skalní stěny, fáze I. očištění skalního masivu								
PROTOKOL číslo : listopad 2021								
PS / SO č. :			Název PS / SO :			Skalní stěna podél silnice č. II/277 u obce Mohelnice n. Jizerou		
Fakturace								
pol. č.	kód položky	Název položky :	Množství dle SOD	M. J.	předchozí období	fakturace	zůstatek	
4	112151115	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním Ø kmene do 600 mm	6,000	kus	0	6,000	0,000	
přehled čerpání								
období					množství		kus	
							kus	
Výpočet:			6,000 ks	celkem za předchozí období 0,000 kus				
Fakturace do výše rozpočtu:			6,000 kus					
								
Zpracoval za zhotovitele :			Schválil za zhotovitele :					
HELPING VÝŠKOVÉ PRÁCE s.r.o. Radek Hrubý			HELPING VÝŠKOVÉ PRÁCE s.r.o. Radek Hrubý					
Schválil za objednatele :			Na základě výběrového PS/SO za SUPERVIZI:					
Krajská správa a údržba silnic Středočeského příspěvková organizace Tomáš Pecka								
V Mohelnici nad Jizerou					dne: 30.11.2021			

ZÁZNAM O SKUTEČNÉ VÝMĚŘE PROVEDENÝCH PRACÍ					List číslo :		5/24	
Název stavby : II/277 Mohelnice nad Jizerou/ Podhora - sanace nestabilní skalní stěny, fáze I. očištění skalního masívu								
PROTOKOL číslo : listopad 2021								
PS / SO č. :			Název PS / SO : Skalní stěna podél silnice č. II/277 u obce Mohelnice n. Jizerou					
Fakturace								
pol. č.	kód položky	Název položky :	Množství dle SOD	M. J.	předchozí období	fakturace	zůstatek	
5	162201411	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene do 300 mm	25,000	kus	0	25,000	0,000	
přehled čerpání								
období					množství		kus	
							kus	
Výpočet:			pol. 2	25,000 ks	celkem za předchozí období		0,000	kus
Fakturace do výše rozpočtu:			25,000 kus					
								
Zpracoval za zhotovitele :			Schválil za zhotovitele :			HELPING VÝŠKOVÉ PRÁCE s.r.o. Radek Hrubý		
Schválil za objednatele :			Na základě výběrového PS/SO za SUPERVIZI:			Krajská správa a údržba silnic Středočeského příspěvková organizace Tomáš Pecka		
V Mohelnici nad Jizerou					dne: 30.11.2021			

ZÁZNAM O SKUTEČNÉ VÝMĚŘE PROVEDENÝCH PRACÍ						List číslo :	6	24
Název stavby : II/277 Mohelnice nad Jizerou/Podhora - sanace nestabilní skalní stěny,fáze I.očištění skalního masívu								
PROTOKOL číslo : listopad 2021								
PS / SO č. :			Název PS / SO :			Skalní stěna podél silnice č.II/277 u obce Mohelnice n.Jizerou		
Fakturace								
pol. č.	kód položky	Název položky :	Množství dle SOD	M.J.	předchozí období	fakturace	zůstatek	
6	16Z201412	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene do 500 mm	20,000	kus	0	20,000	0,000	
přehled čerpání								
období					množství		kus	
							kus	
Výpočet:					celkem za předchozí období		0,000 kus	
		pol. 3	14,000 ks					
		pol. 4	6,000 ks					
		pol.25	23 ks					
		pol.26	4 ks					
			47,000 ks					
		Fakturace do výše rozpočtu:	20,000 kus					
		NNZ (bude řešeno změnovým listem)	27,000 kus					
								
Zpracoval za zhotovitele :			Schválil za zhotovitele :					
HELPING VÝŠKOVÉ PRÁCE s.r.o. Radek Hrubý			HELPING VÝŠKOVÉ PRÁCE s.r.o. Radek Hrubý					
Schválil za objednatele :			Na základě výběrového PS/SO za SUPERVIZI:					
Krajská správa a údržba silnic Středočeského k příspěvková organizace Tomáš Pecka								
V Mohelnici nad Jizerou						dne: 30.11.2021		

[illegible]

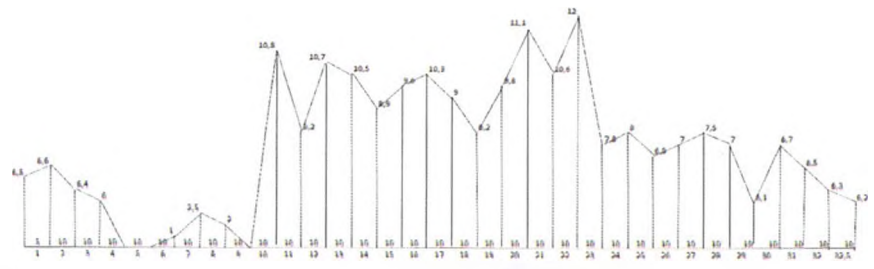
ZÁZNAM O SKUTEČNÉ VÝMĚŘE PROVEDENÝCH PRACÍ						List číslo :	8	24						
Název stavby : II/277 Mohelnice nad Jizerou/Podhora - sanace nestabilní skalní stěny, fáze I. očištění skalního masívu														
PROTOKOL číslo : listopad 2021														
PS / SO č. :			Název PS / SO :			Skalní stěna podél silnice č. II/277 u obce Mohelnice n. Jizerou								
Fakturace														
pol. č.	kód položky	Název položky :	Množství dle SOD	M.J.	předchozí období	faktura	zůstatek							
8	162301952	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene do 500 mm ZKD 10 km	200,000	kus	0	200,000	0,000							
přehled čerpání														
období					množství		kus							
							kus							
Výpočet: <table border="1" style="margin-top: 10px;"> <tr> <td>ks</td> <td>ks/km</td> <td>celkem ks</td> </tr> <tr> <td>47,000</td> <td>10,000</td> <td>470,000</td> </tr> </table> 470,000 ks Fakturace do výše rozpočtu: 200,000 kus NNZ (bude řešeno změnovým listem) 270,000 kus celkem za předchozí období 0,000 kus									ks	ks/km	celkem ks	47,000	10,000	470,000
ks	ks/km	celkem ks												
47,000	10,000	470,000												
Zpracoval za zhotovitele : HELPING VÝŠKOVÉ PRÁCE s.r.o. Radek Hrubý			Schválil za zhotovitele : HELPING VÝŠKOVÉ PRÁCE s. Radek Hrubý											
Schválil za objednatele : Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace Tomáš Pecka			Na základě výběrového PS/SO za SUPERVIZI:											
V Mohelnici nad Jizerou						dne: 30.11.2021								

ZÁZNAM O SKUTEČNÉ VÝMĚŘE PROVEDENÝCH PRACÍ						List číslo :	9	24
Název stavby : II/277 Mohelnice nad Jizerou/ Podhora - sanace nestabilní skalní stěny, fáze I. očištění skalního masivu								
PROTOKOL číslo : listopad 2021								
PS / SO č. :			Název PS / SO : Skalní stěna podél silnice č.II/277 u obce Mohelnice n.Jizerou					
Fakturace								
pol. č.	kód položky	Název položky :	Množství dle SOD	M.J	předchozí období	fakturace	zůstatek	
9	156211112	Odstranění vegetace ze skalních ploch horolezeckou technikou včetně stažení k zemi	220,500	m2	0	220,500	0,000	
přehled čerpání								
období					množství		m2	
							m2	
Výpočet:			celkem za předchozí období 0,000 m2					
	Levá	Pravá	délka	m2	koef.	celkem m2		
1	7,100	7,000	5,000	35,250	10%	3,525		
2	7,000	6,800	10,000	69,000	10%	6,900		
3	6,800	6,300	10,000	65,500	10%	6,550		
4	6,300	13,000	10,000	96,500	10%	9,650		
5	13,000	10,000	10,000	115,000	10%	11,500		
6	10,000	11,700	10,000	108,500	10%	10,850		
7	11,700	16,900	10,000	143,000	10%	14,300		
8	16,900	15,000	10,000	159,500	10%	15,950		
9	15,000	13,500	10,000	142,500	10%	14,250		
10	13,500	11,500	10,000	125,000	10%	12,500		
11	11,500	11,800	10,000	116,500	10%	11,650		
12	11,800	12,700	10,000	122,500	10%	12,250		
13	12,700	12,100	10,000	124,000	10%	12,400		
14	12,100	13,300	10,000	127,000	10%	12,700		
15	13,300	10,600	10,000	119,500	10%	11,950		
16	10,600	11,800	10,000	112,000	10%	11,200		
17	11,800	10,000	10,000	109,000	10%	10,900		
18	10,000	9,200	10,000	96,000	10%	9,600		
19	9,200	11,800	10,000	105,000	10%	10,500		
20	11,800	12,100	10,000	119,500	10%	11,950		
21	12,100	14,000	10,000	130,500	10%	13,050		
22	14,000	15,000	10,000	145,000	10%	14,500		
23	15,000	9,500	10,000	122,500	10%	12,250		
24	9,500	10,000	10,000	97,500	10%	9,750		
25	10,000	10,100	10,000	100,500	10%	10,050		
26	10,100	9,000	10,000	95,500	10%	9,550		
27	9,000	9,500	10,000	92,500	10%	9,250		
28	9,500	9,000	10,000	92,500	10%	9,250		
29	9,000	8,200	10,000	86,000	10%	8,600		
30	8,200	9,100	10,000	86,500	10%	8,650		
31	9,100	8,600	10,000	88,500	10%	8,850		
32	8,600	8,200	10,000	84,000	10%	8,400		
33	8,200	8,100	10,000	81,500	10%	8,150		
				3 513,750	351,375 m2			
Celkem				351,375 m2				
Fakturace do výše rozpočtu:				220,500 m2				
NNZ (bude řešeno změnovým listem)				130,875 m2				

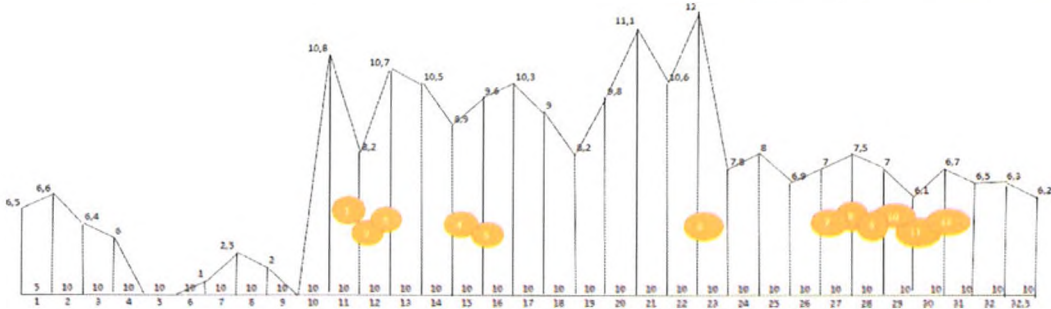
Zpracoval za zhotovitele : HELPING VÝŠKOVÉ PRÁCE s.r.o. Radek Hrubý	Schválil za zhotovitele : HELPING VÝŠKOVÉ PRÁCE s.r.o. Radek Hrubý
Schválil za objednatele : Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje příspěvková organizace Tomáš Pecka	Na základě výběrového PS/SO za SUPERVIZI:

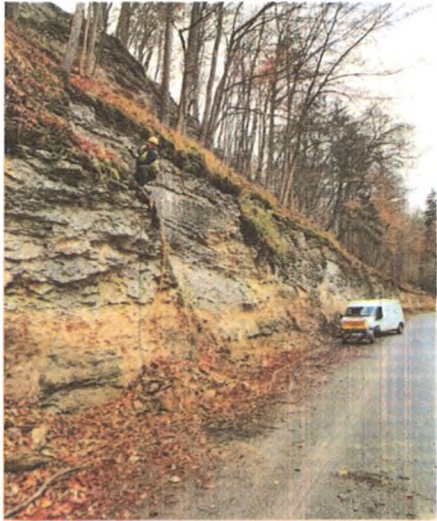
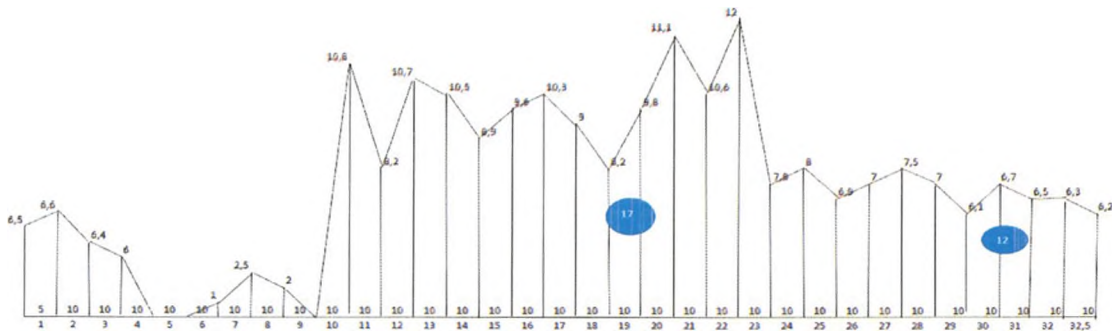
V Mohelnici nad Jizerou

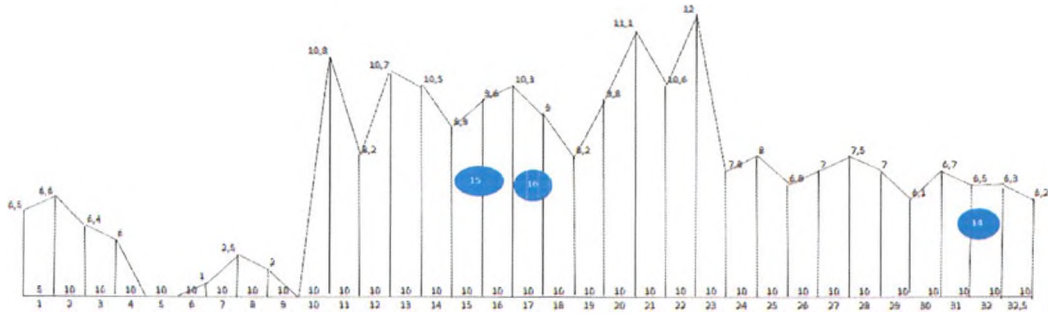
 dne: **30.11.2021**

ZÁZNAM O SKUTEČNÉ VÝMĚŘE PROVEDENÝCH PRACÍ						List číslo :	10	24
Název stavby :						II/277 Mohelnice nad Jizerou/ Podhora - sanace nestabilní skalní stěny, fáze I. očištění skalního masivu		
PROTOKOL číslo :						listopad 2021		
PS / SO č. :		Název PS / SO :				Skalní stěna podél silnice č. II/277 u obce Mohelnice n. Jizerou		
Fakturace								
pol. č.	kód položky	Název položky :	Množství dle SOD	M.J.	předchozí období	fakturace	zůstatek	
10	155211122	Očištění skalních ploch ručními nástroji (motykami, páčidly) horolezeckou technikou	220,500	m3	0	220,500	0,000	
přehled čerpání								
období						množství		m3
						m3		
celkem za předchozí období						0,000		m3
Výpočet:								
	Levá	Pravá	délka	m2	koef. zásahu	celkem m2	koef. hloubka	celkem m3
1	6,500	6,600	5,000	32,750	100%	32,750	0,400	13,100
2	6,600	6,400	10,000	65,000	100%	65,000	0,400	26,000
3	6,400	6,000	10,000	62,000	100%	62,000	0,400	24,800
4	6,000	0,000	10,000	30,000	100%	30,000	0,350	10,500
5	0,000	0,000	10,000	0,000	90%	0,000	0,100	0,000
6	0,000	1,000	10,000	5,000	90%	4,500	0,100	0,450
7	1,000	2,500	10,000	17,500	90%	15,750	0,100	1,575
8	2,500	2,000	10,000	22,500	90%	20,250	0,100	2,025
9	2,000		10,000	10,000	90%	9,000	0,100	0,900
10	0,000	10,800	10,000	54,000	90%	48,600	0,100	4,860
11	10,800	8,200	10,000	95,000	90%	85,500	0,100	8,550
12	8,200	10,700	10,000	94,500	90%	85,050	0,100	8,505
13	10,700	10,500	10,000	106,000	90%	95,400	0,100	9,540
14	10,500	8,900	10,000	97,000	90%	87,300	0,100	8,730
15	8,900	9,600	10,000	92,500	90%	83,250	0,100	8,325
16	9,600	10,300	10,000	99,500	90%	89,550	0,100	8,955
17	10,300	9,000	10,000	96,500	90%	86,850	0,100	8,685
18	9,000	8,200	10,000	85,000	90%	77,400	0,100	7,740
19	8,200	9,800	10,000	90,000	90%	81,000	0,100	8,100
20	9,800	11,100	10,000	104,500	90%	94,050	0,100	9,405
21	11,100	10,600	10,000	108,500	90%	97,650	0,100	9,765
22	10,600	12,000	10,000	113,000	90%	101,700	0,100	10,170
23	12,000	7,800	10,000	99,000	90%	89,100	0,100	8,910
24	7,800	8,000	10,000	79,000	90%	71,100	0,100	7,110
25	8,000	6,900	10,000	74,500	90%	67,050	0,100	6,705
26	6,900	7,000	10,000	69,500	90%	62,550	0,100	6,255
27	7,000	7,500	10,000	72,500	90%	65,250	0,100	6,525
28	7,500	7,000	10,000	72,500	90%	65,250	0,100	6,525
29	7,000	6,100	10,000	65,500	90%	58,950	0,100	5,895
30	6,100	6,700	10,000	64,000	90%	57,600	0,100	5,760
31	6,700	6,500	10,000	66,000	90%	59,400	0,100	5,940
32	6,500	6,300	10,000	64,000	90%	57,600	0,200	11,520
33	6,300	6,200	10,000	62,500	90%	56,250	0,200	11,250
				2 270,750	2 062,650		273,075 m3	
Celkem				273,075 m3				
Fakturace do výše rozpočtu:				220,500 m3				
NNZ (bude řešeno změnovým listem)				52,575 m3				
								
Zpracoval za zhotovitele				Schválil za zhotovitele				
HELPING VÝŠKOVÉ PRÁCE s.r.o. Radek Hrubý				HELPING VÝŠKOVÉ PRÁCE s.r.o. Radek Hrubý				
Schválil za objednatele				Na základě výběrového PS/SO za SUPERVIZI				
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace Tomáš Pecka								
V Mohelnici nad Jizerou						dne: 30.11.2021		



ZÁZNAM O SKUTEČNÉ VÝMĚŘE PROVEDENÝCH PRACÍ						List číslo :	11	24																																																																	
Název stavby : II/277 Mohelnice nad Jizerou/ Podhora - sanace nestabilní skalní stěny, fáze I. očištění skalního masivu																																																																									
PROTOKOL číslo : listopad 2021																																																																									
PS / SO č. : Název PS / SO : Skalní stěna podél silnice č.II/277 u obce Mohelnice n.Jizerou																																																																									
Fakturace																																																																									
pol. č.	kód položky	Název položky :	Množství dle SOD	M.J.	předchozí období	fakturace	zůstatek																																																																		
11	155211311	Odtážení nestabilních hornin ze skalních stěn horolezeckou technikou sbíječkou	30,000	m3	0	30,000	0,000																																																																		
přehled čerpání období množství m3 m3																																																																									
Výpočet: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th></th> <th>délka</th> <th>šířka</th> <th>výška</th> <th>celkem m3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>2,000</td><td>1,400</td><td>0,990</td><td>2,772</td></tr> <tr><td>2</td><td>1,800</td><td>1,600</td><td>0,600</td><td>1,728</td></tr> <tr><td>3</td><td>2,000</td><td>1,600</td><td>0,500</td><td>1,600</td></tr> <tr><td>4</td><td>1,100</td><td>0,900</td><td>0,400</td><td>0,396</td></tr> <tr><td>5</td><td>2,200</td><td>1,100</td><td>1,000</td><td>2,420</td></tr> <tr><td>6</td><td>5,000</td><td>3,000</td><td>0,300</td><td>4,500</td></tr> <tr><td>7</td><td>1,500</td><td>0,900</td><td>0,300</td><td>0,405</td></tr> <tr><td>8</td><td>1,500</td><td>2,000</td><td>0,700</td><td>2,100</td></tr> <tr><td>9</td><td>2,700</td><td>3,000</td><td>0,500</td><td>4,050</td></tr> <tr><td>10</td><td>1,900</td><td>2,000</td><td>0,300</td><td>1,140</td></tr> <tr><td>11</td><td>3,500</td><td>2,100</td><td>0,400</td><td>2,940</td></tr> <tr><td>12</td><td>2,500</td><td>1,600</td><td>1,490</td><td>5,960</td></tr> </tbody> </table> Celkem 30,011 m3 Fakturace do výše rozpočtu: 30,000 m3 Nebudeme nárokovat 0,011 m3 celkem za předchozí období 0,000 m3 										délka	šířka	výška	celkem m3	1	2,000	1,400	0,990	2,772	2	1,800	1,600	0,600	1,728	3	2,000	1,600	0,500	1,600	4	1,100	0,900	0,400	0,396	5	2,200	1,100	1,000	2,420	6	5,000	3,000	0,300	4,500	7	1,500	0,900	0,300	0,405	8	1,500	2,000	0,700	2,100	9	2,700	3,000	0,500	4,050	10	1,900	2,000	0,300	1,140	11	3,500	2,100	0,400	2,940	12	2,500	1,600	1,490	5,960
	délka	šířka	výška	celkem m3																																																																					
1	2,000	1,400	0,990	2,772																																																																					
2	1,800	1,600	0,600	1,728																																																																					
3	2,000	1,600	0,500	1,600																																																																					
4	1,100	0,900	0,400	0,396																																																																					
5	2,200	1,100	1,000	2,420																																																																					
6	5,000	3,000	0,300	4,500																																																																					
7	1,500	0,900	0,300	0,405																																																																					
8	1,500	2,000	0,700	2,100																																																																					
9	2,700	3,000	0,500	4,050																																																																					
10	1,900	2,000	0,300	1,140																																																																					
11	3,500	2,100	0,400	2,940																																																																					
12	2,500	1,600	1,490	5,960																																																																					
																																																																									
Zpracoval za zhotovitele : HELPING VÝŠKOVÉ PRÁCE s.r.o. Radek Hrubý			Schválil za zhotovitele : HELPING VÝŠKOVÉ PRÁCE s.r.o. Radek Hrubý																																																																						
Schválil za objednatele : Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace Tomáš Pecka			Na základě výběrového PS/SO za SUPERVIZI:																																																																						
V Mohelnici nad Jizerou						dne: 30.11.2021																																																																			

ZÁZNAM O SKUTEČNÉ VÝMĚŘE PROVEDENÝCH PRACÍ						List číslo :	12	24
Název stavby :						II/277 Mohelnice nad Jizerou/ Podhora - sanace nestabilní skalní stěny, fáze I. očištění skalního masívu		
PROTOKOL číslo :						listopad 2021		
PS / SO č. :						Název PS / SO : Skalní stěna podél silnice č. II/277 u obce Mohelnice n. Jizerou		
Fakturace								
pol. č.	kód položky	Název položky :	Množství dle SOD	M.J.	předchozí období	fakturace	zůstatek	
12	155211312	Odtěžení nestabilních hornin ze skalních stěn horolezeckou technikou tlakovými poduškami	24,000	m3	0	24,000	0,000	
přehled čerpání								
období						množství		m3
								m3
Výpočet:			celkem za předchozí období			0,000		m3
	délka	šířka	výška	celkem m3				
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12	4,000	2,000	1,500	12,000				
13								
14								
15								
16								
17	4,000	3,000	1,000	12,000				
				24,000 m3				
Fakturace do výše rozpočtu:				24,000 m3				
								
								
Zpracoval za zhotovitele : HELPING VÝŠKOVÉ PRÁCE s.r.o. Radek Hrubý				Schválil za zhotovitele : HELPING VÝŠKOVÉ PRÁCE s.r.o. Radek Hrubý				
Schválil za objednatele : Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace Tomáš Pecka				Na základě výběrového PS/SO za SUPERVIZI:				
V Mohelnici nad Jizerou						dne: 30.11.2021		

ZÁZNAM O SKUTEČNÉ VÝMĚŘE PROVEDENÝCH PRACÍ						List číslo :	13	24																																																																																									
Název stavby : II/277 Mohelnice nad Jizerou/ Podhora - sanace nestabilní skalní stěny, fáze I. očištění skalního masivu																																																																																																	
PROTOKOL číslo : listopad 2021																																																																																																	
PS / SO č. :			Název PS / SO :			Skalní stěna podél silnice č. II/277 u obce Mohelnice n. Jizerou																																																																																											
Fakturace																																																																																																	
pol. č.	kód položky	Název položky :	Množství dle SOD	M. J.	předchozí období	faktura	zůstatek																																																																																										
13	155211313	Odtěžení nestabilních hornin ze skalních stěn horizontální technikou hydraulickými klíny	18,000	m3	0	18,000	0,000																																																																																										
přehled čerpání																																																																																																	
období						množství		m3																																																																																									
								m3																																																																																									
Výpočet: <table border="1" style="margin-top: 10px; width: 100%;"> <thead> <tr> <th></th> <th>délka</th> <th>šířka</th> <th>výška</th> <th>celkem m3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>6</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>7</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>8</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>9</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>10</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>11</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>12</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>13</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>14</td><td>1,890</td><td>2,500</td><td>0,890</td><td>4,205</td></tr> <tr><td>15</td><td>3,500</td><td>2,000</td><td>1,500</td><td>10,500</td></tr> <tr><td>16</td><td>2,400</td><td>1,600</td><td>0,860</td><td>3,302</td></tr> <tr><td>17</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>				délka	šířka	výška	celkem m3	1					2					3					4					5					6					7					8					9					10					11					12					13					14	1,890	2,500	0,890	4,205	15	3,500	2,000	1,500	10,500	16	2,400	1,600	0,860	3,302	17					celkem za předchozí období 0,000 m3				
	délka	šířka	výška	celkem m3																																																																																													
1																																																																																																	
2																																																																																																	
3																																																																																																	
4																																																																																																	
5																																																																																																	
6																																																																																																	
7																																																																																																	
8																																																																																																	
9																																																																																																	
10																																																																																																	
11																																																																																																	
12																																																																																																	
13																																																																																																	
14	1,890	2,500	0,890	4,205																																																																																													
15	3,500	2,000	1,500	10,500																																																																																													
16	2,400	1,600	0,860	3,302																																																																																													
17																																																																																																	
Celkem 18,008 m3 Fakturace do výše rozpočtu: 18,000 m3 Nebudeme nárokovat 0,008 m3																																																																																																	
																																																																																																	
Zpracoval za zhotovitele : HELPING VÝŠKOVÉ PRÁCE s.r.o. Radek Hrubý			Schválil za zhotovitele : HELPING VÝŠKOVÉ PRÁCE s.r.o. Radek Hrubý																																																																																														
Schválil za objednatele : Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje příspěvková organizace Tomáš Pecka			Na základě výběrového PS/SO za SUPERVIZI:																																																																																														
V Mohelnici nad Jizerou						dne: 30.11.2021																																																																																											

ZÁZNAM O SKUTEČNÉ VÝMĚŘE PROVEDENÝCH PRACÍ						List číslo :	14	24
Název stavby : III/277 Mohelnice nad Jizerou/Podhora - sanace nestabilní skalní stěny, fáze I. očistění skalního masivu								
PROTOKOL číslo : listopad 2021								
PS / SO č. :			Název PS / SO :			Skalní stěna podél silnice č.III/277 u obce Mohelnice n.Jizerou		
Fakturační údaje								
pol. č.	kód položky	Název položky :	Množství dle SOD	M.J.	předchozí období	fakturační	zůstatek	
14	162751137	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/španiny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	292,500	m3	0	292,500	0,000	
přehled čerpání								
období						množství		m3
								m3
Výpočet: pol. 10 273,075 pol. 11 30,000 pol. 12 24,000 pol. 13 18,000 celkem 345,075 m3				celkem za předchozí období 0,000 m3				
Celkem 345,075 m3 Fakturační do výše rozpočtu: 292,500 m3 NNZ (bude řešeno změnovým listem) 52,575 m3								
Zpracoval za zhotovitele : HELPING VÝŠKOVÉ PRÁCE s.r.o. Radek Hrubý			Schválil za zhotovitele : HELPING VÝŠKOVÉ PRÁCE s.r.o. Radek Hrubý					
Schválil za objednatele : Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace Tomáš Pecka			Na základě výběrového PS/SO za SUPERVIZI:					
V Mohelnici nad Jizerou dne: 30.11.2021								

ZÁZNAM O SKUTEČNÉ VÝMĚŘE PROVEDENÝCH PRACÍ						List číslo :	15	24						
Název stavby : II/277 Mohelnice nad Jizerou/ Podhora - sanace nestabilní skalní stěny, fáze I. očištění skalního masívu														
PROTOKOL číslo : listopad 2021														
PS / SO č. :			Název PS / SO :			Skalní stěna podél silnice č.II/277 u obce Mohelnice n.Jizerou								
Fakturace														
pol. č.	kód položky	Název položky :	Množství dle SOD	M. J.	předchozí období	fakturace	zůstatek							
15	162751139	Připlatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	4387,500	m3	0	4 387,500	0,000							
přehled čerpání														
období						množství		m3						
								m3						
Výpočet:			celkem za předchozí období			0,000	m3							
pol. 14 345,075 m3														
<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="text-align: center;">m3</td> <td style="text-align: center;">m3/km</td> <td style="text-align: center;">celkem m3</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">345,075</td> <td style="text-align: center;">15,000</td> <td style="text-align: center;">5176,125</td> </tr> </table>			m3	m3/km	celkem m3	345,075	15,000	5176,125						
m3	m3/km	celkem m3												
345,075	15,000	5176,125												
			5 176,125 m3											
Celkem			5 176,125 m3											
Fakturace do výše rozpočtu:			4 387,500 m3											
NNZ (bude řešeno změnovým listem)			788,625 m3											
Zpracoval za zhotovitele : HELPING VÝŠKOVÉ PRÁCE s.r.o. Radek Hrubý			Schválil za zhotovitele : HELPING VÝŠKOVÉ PRÁCE s.r.o. Radek Hrubý											
Schválil za objednatele : Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace Tomáš Pecka			Na základě výběrového PS/SO za SUPERVIZI:											
V Mohelnici nad Jizerou						dne: 30.11.2021								

ZÁZNAM O SKUTEČNÉ VÝMĚŘE PROVEDENÝCH PRACÍ						List číslo :	16	24																																				
Název stavby : II/277 Mohelnice nad Jizerou/ Podhora - sanace nestabilní skalní stěny, fáze I. očištění skalního masívu																																												
PROTOKOL číslo : listopad 2021																																												
PS / SO č. :			Název PS / SO : Skalní stěna podél silnice č.II/277 u obce Mohelnice n.Jizerou																																									
Fakturace																																												
pol. č.	kód položky	Název položky :	Množství dle SOD	M.J.	předchozí období	fakturace	zůstatek																																					
16	162751157	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7	72,000	m3	0	72,000	0,000																																					
přehled čerpání																																												
období						množství		m3																																				
						m3																																						
celkem za předchozí období					0,000	m3																																						
Výpočet: <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 15%;">pol. 11</td> <td style="width: 15%;">30,000</td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> </tr> <tr> <td>pol. 12</td> <td>24,000</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>pol. 13</td> <td>18,000</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>72,000</td> <td>m3</td> <td colspan="6"></td> </tr> </table>									pol. 11	30,000								pol. 12	24,000								pol. 13	18,000									72,000	m3						
pol. 11	30,000																																											
pol. 12	24,000																																											
pol. 13	18,000																																											
	72,000	m3																																										
Fakturace do výše rozpočtu: <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;">72,000</td> <td style="width: 15%;">m3</td> <td colspan="6"></td> </tr> </table>										72,000	m3																																	
	72,000	m3																																										
																																												
Zpracoval za zhotovitele : HELPING VÝŠKOVÉ PRÁCE s.r.o. Radek Hrubý			Schválil za zhotovitele : HELPING VÝŠKOVÉ PRÁCE s.r.o. Radek Hrubý																																									
Schválil za objednatele : Krajská správa a údržba silnic Středočesl příspěvková organizace Tomáš Pecka			Na základě výběrového PS/SO za SUPERVIZI:																																									
V Mohelnici nad Jizerou					dne: 30.11.2021																																							

ZÁZNAM O SKUTEČNÉ VÝMĚŘE PROVEDENÝCH PRACÍ						List číslo :	17 / 24						
Název stavby :		II/277 Mohelnice nad Jizerou/Podhora - sanace nestabilní skalní stěny,fáze I.očištění skalního masivu											
PROTOKOL číslo :		listopad 2021											
PS / SO č. :		Název PS / SO :		Skalní stěna podél silnice č.II/277 u obce Mohelnice n.Jizerou									
Fakturace													
pol. č.	kód položky	Název položky :	Množství dle SOD	M.J.	předchozí období	fakturační	zůstatek						
17	162751159	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7 ZKD 1000 m přes 10000 m	1080,000	m3	0	1 080,000	0,000						
přehled čerpání													
období					množství		m3						
							m3						
celkem za předchozí období					0,000		m3						
Výpočet:		pol. 16 72,000 m3											
		<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>m3</td> <td>m3/km</td> <td>celkem m3</td> </tr> <tr> <td>72,000</td> <td>15,000</td> <td>1080,000</td> </tr> </table>	m3	m3/km	celkem m3	72,000	15,000	1080,000					
m3	m3/km	celkem m3											
72,000	15,000	1080,000											
		1 080,000 m3											
Fakturační do výše rozpočtu:		1080,000 m3											
Zpracoval za zhotovitele : HELPING VÝŠKOVÉ PRÁCE s.r.o. Radek Hrubý			Schválil za zhotovitele : HELPING VÝŠKOVÉ PRÁCE s.r.o. Radek Hrubý										
Schválil za objednatele : Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace Tomáš Pecka			Na základě výběrového PS/SO za SUPERVIZI:										
V Mohelnici nad Jizerou													
						dne:	30.11.2021						

ZÁZNAM O SKUTEČNÉ VÝMĚŘE PROVEDENÝCH PRACÍ					List číslo :		18 / 24	
Název stavby : III/277 Mohelnice nad Jizerou/Podhora - sanace nestabilní skalní stěny, fáze I. očištění skalního masivu								
PROTOKOL číslo : listopad 2021								
PS / SO č. :			Název PS / SO : Skalní stěna podél silnice č.III/277 u obce Mohelnice n.Jizerou					
Fakturace								
pol. č.	kód položky	Název položky :	Množství dle SOD	M.J.	předchozí období	fakturace	zůstatek	
18	167151103	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7 do 100 m3	72,000	m3	0	72,000	0,000	
přehled čerpání								
období					množství		m3	
							m3	
Výpočet:					celkem za předchozí období 0,000 m3			
	pol. 11	30,000						
	pol. 12	24,000						
	pol. 13	18,000						
		72,000 m3						
	Fakturace do výše rozpočtu:	72,000 m3						
Zpracoval za zhotovitele :			Schválil za zhotovitele :					
HELPING VÝŠKOVÉ PRÁCE s.r.o. Radek Hrubý			HELPING VÝŠKOVÉ PRÁCE s.r.o. Radek Hrubý					
Schválil za objednatele :			Na základě výběrového PS/SO za SUPERVIZI:					
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje Příspěvková organizace Tomáš Pecka								
V Mohelnici nad Jizerou					dne: 30.11.2021			

ZÁZNAM O SKUTEČNÉ VÝMĚŘE PROVEDENÝCH PRACÍ						List číslo :	19	24
Název stavby : III/277 Mohelnice nad Jizerou/ Podhora - sanace nestabilní skalní stěny, fáze I. očištění skalního masívu								
PROTOKOL číslo : listopad 2021								
PS / SO č. :			Název PS / SO : Skalní stěna podél silnice č.III/277 u obce Mohelnice n.Jizerou					
Fakturace								
pol. č.	kód položky	Název položky :	Množství dle SOD	M.J.	předchozí období	fakturace	zůstatek	
19	167151112	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 přes 100 m3	220,500	m3	0	220,500	0,000	
přehled čerpání								
období					množství		m3	
							m3	
Výpočet: pol. 10 273,075 m3 celkem za předchozí období 0,000 m3 Celkem 273,075 m3 Fakturace do výše rozpočtu: 220,500 m3 NNZ (bude řešeno změnovým listem) 52,575 m3								
								
Zpracoval za zhotovitele : HELPING VÝŠKOVÉ PRÁCE s.r.o. Radek Hrubý			Schválil za zhotovitele : HELPING VÝŠKOVÉ PRÁCE s.r.o. Radek Hrubý					
Schválil za objednatele : Krajská správa a údržba silnic Středočeského území příspěvková organizace Tomáš Pecka			Na základě výběrového PS/SO za SUPERVIZI: 					
V Mohelnici nad Jizerou					dne: 30.11.2021			

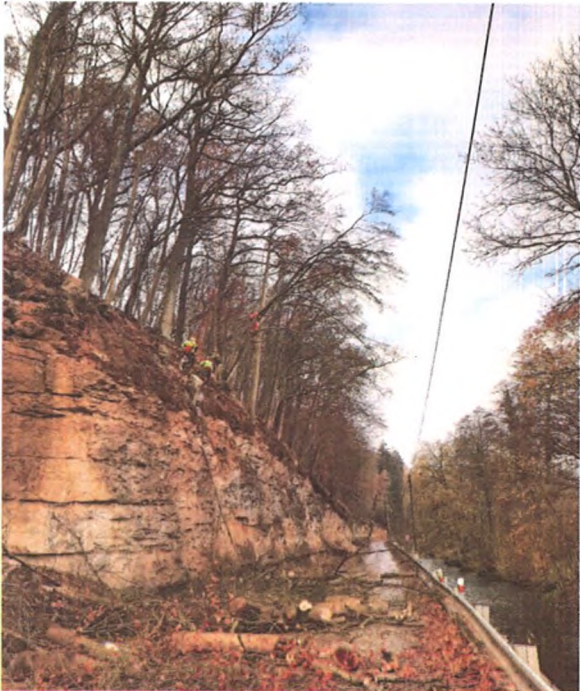
ZÁZNAM O SKUTEČNÉ VÝMĚŘE PROVEDENÝCH PRACÍ						List číslo	20	24						
Název stavby : II/277 Mohelnice nad Jizerou/ Podhora - sanace nestabilní skalní stěny, fáze I. očištění skalního masívu														
PROTOKOL číslo : listopad 2021														
PS / SO č. :			Název PS / SO :			Skalní stěna podél silnice č.II/277 u obce Mohelnice n.Jizerou								
Faktura														
pol. č.	kód položky	Název položky :	Množství dle SOD	M.J.	předchozí období	faktura	zůstatek							
20	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	585,000	t	0	585,000	0,000							
přehled čerpání														
období					množství		t							
							t							
Výpočet:					celkem za předchozí období		0,000 t							
pol. 14 345,075 m3														
					<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="text-align: center;">m3</td> <td style="text-align: center;">m3/t</td> <td style="text-align: center;">celkem t</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">345,075</td> <td style="text-align: center;">2,000</td> <td style="text-align: center;">690,150</td> </tr> </table>		m3	m3/t	celkem t	345,075	2,000	690,150		
m3	m3/t	celkem t												
345,075	2,000	690,150												
					690,150 t									
Celkem					690,150 t									
Faktura do výše rozpočtu:					585,000 t									
NNZ (bude řešeno změnovým listem)					105,150 t									
Zpracoval za zhotovitele :			Schválil za zhotovitele :											
HELPING VÝŠKOVÉ PRÁCE s.r.o. Radek Hrubý			HELPING VÝŠKOVÉ PRÁCE s.r.o. Radek Hrubý											
Schválil za objednatele :			Na základě výběrového PS/SO za SUPERVIZI:											
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje příspěvková organizace Tomáš Pecka														
V Mohelnici nad Jizerou					dne: 30.11.2021									

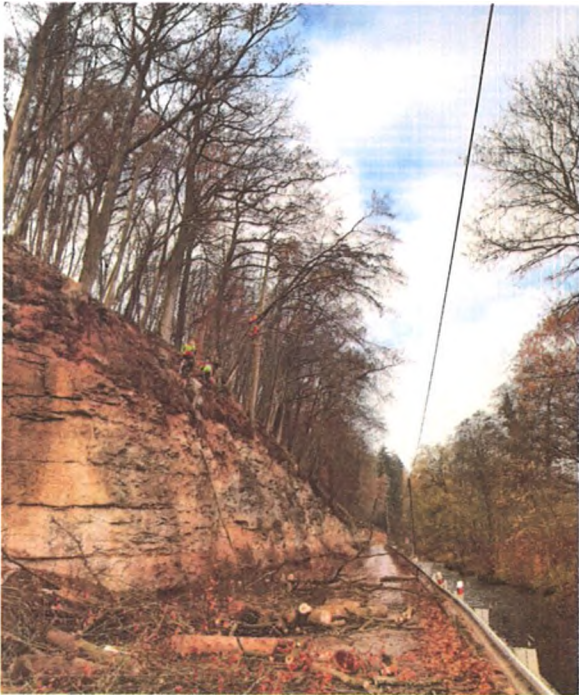
ZÁZNAM O SKUTEČNÉ VÝMĚŘE PROVEDENÝCH PRACÍ						List číslo :	21	24
Název stavby : II/277 Mohelnice nad Jizerou/ Podhora - sanace nestabilní skalní stěny, fáze I. očištění skalního masívu								
PROTOKOL číslo : listopad 2021								
PS / SO č. :			Název PS / SO :			Skalní stěna podél silnice č.II/277 u obce Mohelnice n.Jizerou		
Faktura								
pol. č.	kód položky	Název položky :	Množství dle SOD	M.J.	předchozí období	faktura	zůstatek	
21	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	292,500	m3	0	292,500	0,000	
přehled čerpání								
období					množství		m3	
							m3	
Výpočet: pol. 18 72,000 pol. 19 273,075 345,075 m3 celkem za předchozí období 0,000 m3								
Celkem			345,075 m3					
Faktura do výše rozpočtu:			292,500 m3					
NNZ (bude řešeno změnovým listem)			52,575 m3					
								
Zpracoval za zhotovitele :			Schválil za zhotovitele :					
HELPING VÝŠKOVÉ PRÁCE s.r.o. Radek Hrubý			HELPING VÝŠKOVÉ PRÁCE s.r.o. Radek Hrubý					
Schválil za objednatele :			Na základě výběrového PS/SO za SUPERVIZI:					
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace Tomáš Pecka								
V Mohelnici nad Jizerou					dne: 30.11.2021			

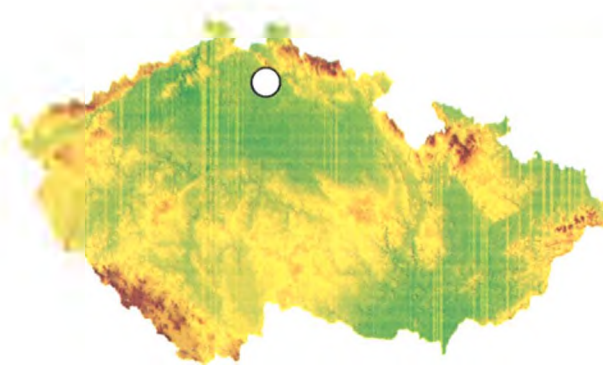
ZÁZNAM O SKUTEČNÉ VÝMĚŘE PROVEDENÝCH PRACÍ						List číslo :	22	24
Název stavby : II/277 Mohelnice nad Jizerou/Podhora - sanace nestabilní skalní stěny,fáze I.očištění skalního masívu								
PROTOKOL číslo : listopad 2021								
PS / SO č. :			Název PS / SO :			Skalní stěna podél silnice č.II/277 u obce Mohelnice n.Jizerou		
Fakturace								
pol. č.	kód položky	Název položky :	Množství dle SOD	M.J.	předchozí období	fakturace	zůstatek	
22	030001000	Zařízení staveníště	1,000	soubor	0	1,000	0,000	
přehled čerpání								
období					množství		soubor	
							soubor	
Výpočet:			1,000 soubor	celkem za předchozí období		0,000	soubor	
Fakturace do výše rozpočtu:			1,000 soubor					
Zpracoval za zhotovitele : HELPING VÝŠKOVÉ PRÁCE s.r.o. Radek Hrubý Schválil za zhotovitele : HELPING VÝŠKOVÉ PRÁCE s.r.o. Radek Hrubý								
Schválil za objednatele : Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace Tomáš Pecka Na základě výběrového PS/SO za SUPERVIZI:								
V Mohelnici nad Jizerou						dne: 30.11.2021		

ZÁZNAM O SKUTEČNÉ VÝMĚŘE PROVEDENÝCH PRACÍ						List číslo :	23	24
Název stavby : II/277 Mohelnice nad Jizerou/Podhora - sanace nestabilní skalní stěny, fáze I. očištění skalního masivu								
PROTOKOL číslo : listopad 2021								
PS / SO č. :			Název PS / SO :			Skalní stěna podél silnice č.II/277 u obce Mohelnice n.Jizerou		
Fakturace								
pol. č.	kód položky	Název položky :	Množství dle SOD	M.J.	předchozí období	fakturace	zůstatek	
23	041002000	Dozory - geotechnik	40,000	hod	0	40,000	0,000	
přehled čerpání								
období					množství		hod	
							hod	
Výpočet:			40,000	hod	celkem za předchozí období		0,000	hod
Fakturace do výše rozpočtu:			40,000	hod				
Zpracoval za zhotovitele : HELPING VÝŠKOVÉ PRÁCE s.r.o. Radek Hrubý Schválil za objednatele : Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace Tomáš Pecka Schválil za zhotovitele : HELPING VÝŠKOVÉ PRÁCE s.r.o. Radek Hrubý Na základě výběrového PS/SO za SUPERVIZI:								
V Mohelnici nad Jizerou					dne: 30.11.2021			

ZÁZNAM O SKUTEČNÉ VÝMĚŘE PROVEDENÝCH PRACÍ						List číslo :	24	24
Název stavby : II/277 Mohelnice nad Jizerou/ Podhora - sanace nestabilní skalní stěny, fáze I. očištění skalního masívu								
PROTOKOL číslo : listopad 2021								
PS / SO č. :			Název PS / SO :			Skalní stěna podél silnice č. II/277 u obce Mohelnice n. Jizerou		
Fakturace								
pol. č.	kód položky	Název položky :	Množství dle SOD	M. J.	předchozí období	fakturace	zůstatek	
24	065002000	Mimostaveništní doprava	1,000	soubor	0	1,000	0,000	
přehled čerpání								
období					množství		soubor	
							soubor	
Výpočet:			1,000 soubor	celkem za předchozí období		0,000	soubor	
Fakturace do výše rozpočtu:			1,000 soubor					
Zpracoval za zhotovitele : HELPING VÝŠKOVÉ PRÁCE s.r.o. Radek Hrubý Schválil za zhotovitele : HELPING VÝŠKOVÉ PRÁCE s.r.o. Radek Hrubý Schválil za objednatele : Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace Tomáš Pecka Na základě výběrového PS/SO za SUPERVIZI:								
V Mohelnici nad Jizerou						dne:	30.11.2021	

ZÁZNAM O SKUTEČNÉ VÝMĚŘE PROVEDENÝCH PRACÍ						List číslo :		25	26
Název stavby : II/277 Mohelnice nad Jizerou/ Podhora - sanace nestabilní skalní stěny, fáze I. očištění skalního masivu									
PROTOKOL číslo : listopad 2021									
PS / SO č. :				Název PS / SO : Skalní stěna podél silnice č.II/277 u obce Mohelnice n.Jizerou					
Fakturace									
pol. č.	kód položky	Název položky :	Množství dle SOD	M.J.	předchozí období	faktura	zůstatek		
25	112151353	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D do 0,4 m	23,000	kus	0	23,000	0,000		
přehled čerpání období množství kus kus									
Výpočet: NNZ (bude řešeno změnovým listem) 23,000 kus 23,000 kus celkem za předchozí období 0,000 kus									
 									
Zpracoval za zhotovitele : HELPING VÝŠKOVÉ PRÁCE s.r.o. Radek Hrubý					Schválil za zhotovitele : HELPING VÝŠKOVÉ PRÁCE s.r.o. Radek Hrubý				
Schválil za objednatele : Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace Tomáš Pecka					Na základě výběrového PS/SO za SUPERVIZI:				
V Mohelnici nad Jizerou						dne: 30.11.2021			

ZÁZNAM O SKUTEČNÉ VÝMĚŘE PROVEDENÝCH PRACÍ						List číslo :		26	26
Název stavby : II/277 Mohelnice nad Jizerou/Podhora - sanace nestabilní skalní stěny, fáze I. očištění skalního masivu									
PROTOKOL číslo : listopad 2021									
PS / SO č. :				Název PS / SO :		Skalní stěna podél silnice č. II/277 u obce Mohelnice n. Jizerou			
Fakturace									
pol. č.	kód položky	Název položky :	Množství dle SOD	M. J.	předchozí období	faktura	zůstatek		
26	112151354	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D do 0,5 m	4,000	kus	0	4,000	0,000		
přehled čerpání období množství kus kus									
Výpočet: NNZ (bude řešeno změnovým listem) 4,000 kus 4,000 kus celkem za předchozí období 0,000 kus									
 									
Zpracoval za zhotovitele : HELPING VÝŠKOVÉ PRÁCE s.r.o. Radek Hrubý				Schválil za zhotovitele : HELPING VÝŠKOVÉ PRÁCE s.r.o. Radek Hrubý					
Schválil za objednatele : Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace Tomáš Pecka				Na základě výběrového PS/SO za SUPERVIZI:					
V Mohelnici nad Jizerou						dne: 30.11.2021			



Neveklovice

Jivina

Mohelnice
nad Jizerou

Podjeřba
289
Horní
Mohelnice

Mohelnice nad Jizerou

Posouzení očisty líce skalního svahu nad komunikací II/277

zpracoval: Ing. Alexandr Kačora



Praha, listopad 2021

1. Úvod

Dne 15.11.2021 proběhla kontrola provedených prací na očištění svahu nad komunikací II/277, která vede z Mnichova Hradiště do Českého Dubu. Konkrétně se jednalo o skalní svah na pozemcích parc. č. 334/1 a 334/2 v k.ú. obce Mohelnice nad Jizerou v okrese Mladá Boleslav.

Jedná se o úsek svahu v délce cca 330 m s výškou svahu 5-9 m. Svah představuje odřez situovaný na pravém břehu řeky Mohelky se SV expozicí ve sklonu 70-90°. Odřez byl realizován v sedimentárních horninách svrchnokřídového stáří (stupeň tuton). Z petrografického hlediska se jedná o vápnito-jílovité jemno až středně zrnité pískovce.

2. Výsledky terénní prohlídky

Posouzení kvality očisty líce svahu bylo nutné provést bez předchozí znalosti zadání. Z čistě praktického hlediska byly práce prováděny standardním způsobem tj. za pomoci využití lezecké techniky a ručního náradí, a to převšim za užití gracek, špic a pákových páčidel (pajcrů). lokálně bylo využito pneumatického náradí v podobě vzduchových sbíjecích kladiv.

Z geotechnického hlediska bylo očištění svahu provedeno v dostatečné standardní kvalitě. S ohledem na nízkou geotechnickou kvalitu horniny odkryté odřezem v kombinaci s prostorovou orientací tří základních ploch nespojitosti (vrstevnatost, puklinový systém P_1 a P_2) je však potřeba konstatovat, že v daném případě je **nutné a nezbytné trvalé zajištění** bezpečnosti provozu na pozemní komunikaci.

Spodní partii svahu cca do výšky 1,5 m lze považovat za stabilní. To je dáno hrubě lavičovitým zvrstvením, které je téměř monolitní. I přesto je ale nutné v budoucnu provést zajištění i této partie. Důvodem je, že při ztrátě stability paty svahu by mohlo dojít k pyramidovému efektu zřícení výše situovaných partií svahu po ztrátě stability svého pevného podloží. Dalším důvodem jsou lokální místa vedená v převisu, která mohou mít za následek skalní řícení formou pohybu po vertikální smykové ploše příp. formou překlopení.

Ve směru do nadloží výrazně klesá mocnost vrstev. Celková četnost obou puklinových systémů je velmi velká. Hornina se sama o sobě vyznačuje nízkou objemovou hmotností, malou pevností, vysokou mírou nasákavosti. Tyto parametry způsobují nízkou odolnost vůči projevům mechanického zvětrávání především mrazovým účinkům v lici mělce saturované vody. Nezanedbatelné riziko představuje velmi fragmentovaný a rozpukaný stav horniny v místě horní hrany spolu se zbytky stromů v podobě pařezů a kořenových systémů. Tato partie je v důsledku otevřených puklin značně zahliněna, což vytváří velmi negativní podmínky pro vyšší míru rozpukání masivu. Tyto partie podléhají nejvíce mrazovému rozpínání zmrzlé vody v hlinité výplni puklin a dále představují živnou půdu pro rozrušování horniny klínovým efektem vzrostlé vegetace.

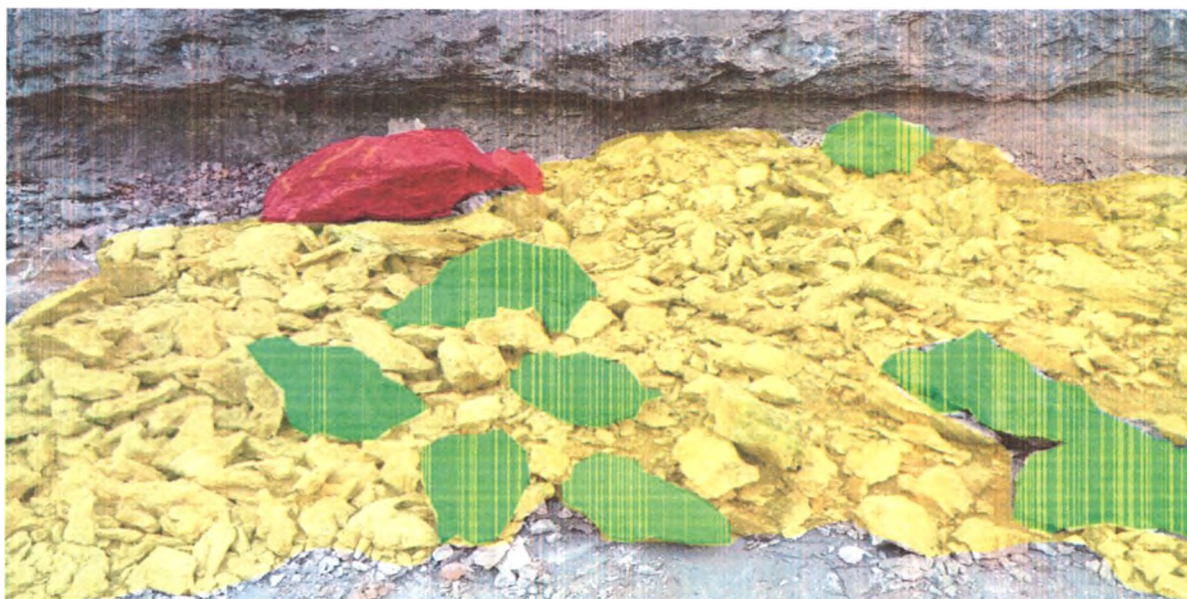
3. Doporučení

Pro zajištění provozu v popisovaném exponovaném úseku doporučujeme provést pokládku silničních ŽB svodidel výšky 1,2 m ve vzdálenost cca 1,5 – 2,5 m od paty svahu s ponecháním volného pruhu šířky 4,5 m. Pro koordinaci pohybu vozidel v tomto úseku doporučujeme vybudovat výhybnu cca v ½ úseku příp. řídit dopravu kyvadlově pomocí přenosné soustavy světelné signalizace.

V okamžiku příznivých klimatických podmínek doporučujeme zajistit skalní svah celoplošně kotvenou ocelovou sítí v kombinaci s 3D protierozním UV stabilním geosyntetikem, doplněnou o místa s lokálním kotvením nestabilních partií nejčastěji v podobě sloupů omezených vertikálním na sebe navzájem kolmým systémem puklin P_1 a P_2 . V případě pařezů na počátečních cca 25 m úseku je nutné jejich odstranění s částí horní hrany svahu. S ohledem na skutečnost, že tento krok bude představovat zásah do přilehlého pozemku parc. č. 29/2, bude nutné v rámci předprojektové přípravy konzultovat tuto záležitost s majitelem (-i) předmětného pozemku.

V Praze, dne 19/11/2021

:pracovali: A. Kačora a M. Jech



pozn.: charakter opadu koresponduje s mírou pravděpodobnosti a rizikem vzniku skalního řícení. Odhadem v 90 % se riziko týká menších plochých fragmentů a mrazových odprasků (žlutá barva). V 9 % případů bude docházet k pádu bloků vel. 30-50 cm (zeleně). 1 % riziko představují horninové bloky od ½ m³ výše (červeně).

Rozpis ocenění Změn položek - celkem													
Evidenční číslo a název stavby: nestabilní skalní stěny, fáze I. očištění skalního masívu Číslo a název SO/PS: Skalní stěna podél silnice č. II/277 u obce Mohelnice n. Jizerou Číslo a název rozpočtu:								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								Skupina změn 3					
Pol. č. pol.	Kod položky	Název položky	m	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	111251111	Drcení přezaných větví D do 100 mm s odvozem do 20 km	M3	3,328	5,271	1,963	2079,000	6 698,70	0,00	3 975,08	10 673,78	3 975,08	59,34%
9	155211112	Odstranění vegetace ze skalních ploch hrozezeckou technikou včetně stažení k zemi	M3	220,500	351,375	130,875	73,000	16 096,50	0,00	9 553,88	25 650,38	9 553,88	59,35%
10	155211122	Očištění skalních ploch ručními nástroji (motykami, páčidly) hrozezeckou technikou	M3	220,500	378,075	157,575	2215,000	488 407,50	0,00	116 453,63	504 861,13	116 453,63	23,84%
14	162751187	Vodorovné přemístění do 10000 m vykopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	M3	292,500	345,075	52,575	148,000	43 290,00	0,00	7 781,10	51 071,10	7 781,10	17,97%
15	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění vykopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	M3	4387,500	5176,125	788,625	5,000	21 937,50	0,00	9 948,13	31 885,63	3 943,13	12,08%
19	167151112	Nakládání vykopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 přes 100 m3	M3	220,500	273,075	52,575	30,000	6 615,00	0,00	1 577,25	8 192,25	1 577,25	23,84%
20	171101111	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04		580,000	660,150	100,150	290,000	169 650,00	0,00	30 493,50	200 143,50	30 493,50	17,97%
21	171251201	Uložení sypání na skládky nebo meziskládky	M3	292,500	345,075	52,575	9,000	2 632,50	0,00	473,18	3 105,68	473,18	17,97%
Celkem									0,00	174 250,75		174 250,75	

Odpovědný zástupce Objednatel i odpovědný zástupce Zhotovitel odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Jaromír Peška

Datum:

Podpis:

Za Objednatel: Tomáš Pec

Datum:

Podpis:

Rozpis ocenění Změn položek - celkem

Evidenční číslo a název stavby: Číslo a název SO/PS: Číslo a název rozpočtu:								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								Skupina změn 4					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Položky z rozpočtu											
6	162201412	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene do 500 mm	M	20,000	47,000	27,000	436,000	8 720,00	0,00	11 772,00	20 492,00	11 772,00	135,00%
8	162301952	Přidání k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene do 500 mm ZKD 10 km	M	200,000	470,000	270,000	5,000	1 000,00	0,00	1 350,00	2 350,00	1 350,00	135,00%
		Nové položky											
25	112151353	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D do 0,4 m	KS	0,000	23,000	23,000	4550,000	0,00	0,00	104 650,00	104 650,00	104 650,00	100,00%
26	112151354	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D do 0,5 m	KS	0,000	4,000	4,000	9 140,000	0,00	0,00	36 960,00	36 960,00	36 960,00	100,00%
		Celkem							0,00	154 732,00		154 732,00	

Odpovědný zástupce Objednatel: I odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují stavbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, výpočtových předkládaných měření.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Jaromír Peška

Datum:

Podpis:

Za Objednatel: Tomáš Pecka

Datum:

Podpis:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

HELPING VÝŠKOVÉ PRÁCE s.r.o.
Moskevská 532/60
101 00 Praha 10 - Vršovice

Vás dopis značky / ze dne

Naše značka
/21/KSUS/MHT/Pec

Vyřizuje/telefon
Pecka/

Praha
5.11.2021

Věc : „II/277 Mohelnice nad Jizerou/Podhora – sanace nestabilní skalní stěny, fáze I. očištění skalního masivu“ – Pokyn (ZBV č. 1)

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje jako správce a zároveň zástupce Středočeského kraje jako vlastníka nemovitostí, tj. předmětné komunikace č. II/277. Vám tímto v souladu s článkem 6.8. smlouvy o dílo č. S-2494/00066001/2021 vydává **Pokyn** k zajištění technického řešení a pokračování ve výše zmíněné akci při zpracování změn během výstavby na stavebním objektu:

II/277 Mohelnice nad Jizerou/Podhora – sanace nestabilní skalní stěny, fáze I. očištění skalního masivu

Na základě Oznámení zhotovitele o vhodnosti změny :

Z důvodu požadavku investora na zajištění větší bezpečnosti skalního masivu nad silnicí II/277 u obce Mohelnice n. Jizerou, dojde k navýšení:

- Kácení rizikových dřevin (stromů)
- Odstranění náletové vegetace
- Očištění skalních ploch

Vydáváme tímto pokyn k provedení těchto úprav a ke zpracování ZBV

Rozsah změn během výstavby bude stanoven na základě skutečného zaměření stavby nebo správcem schválené realizační dokumentace.

Cenově musí změnu posoudit příslušné majetkové oddělení objednatele.

S pozdravem

Lenka Čhmelová
Vedoucí oblasti Mnichovo Hradiště

PROTOKOL O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ ODPADŮ

mezi předávajícím : HELPING VÝŠKOVÉ PRÁCE s.r.o.
Karlov 72, 591 01 Žďár nad Sázavou

a přebírajícím : REMEX CZ a.s.
K váze 1111/66, 140 00 Praha - Slivenec

za období : 6. - 19.11. 2021

**z akce : "II/277 Mohelnice nad Jizerou/Podhora – sanace nestabilní skalní
stěny, fáze I. očištění skalního masivu".**

kód	odpad	množství
170504-O	kamenná suť	692,000 tun

REMEX CZ a.s., recyklační deponie Čachovice

V Čachovicích

za předávajícího : Radek Hrubý
ke dni 19.11.2021

za přebírajícího : David Cozl
ke dni 19.11.2021

Přebírající prohlašuje, že je k nakládání s odpadem oprávněn a bude s ním
dále nakládat ve shodě s požadavky zákona 541/2020 Sb. v platném znění a
navazujících předpisů

Remex

SKLÁDKOVÝ LÍSTEK č.

ze dne 6.11.21

za příjem níže uvedeného odpadu:

Název odpadu	Kód	Hmotnost (t)
Výkopová zemina – odkop	17 05 04	30t
Kamenná suť	17 05 04	
Beton z demolic objektu	17 01 01	
Stavební a demoliční suť	17 01 02-3	
Asfaltový beton bez dehtu	17 03 02	
Štěrka/podsítné	17 05 08	

Předávající prohlašuje, že tato dodávka odpadu se shoduje s názvem a složením s první dodávkou odpadu, ke které byl vyhotoven základní popis odpadu.

SO/PS 11/277 Mohelnice - Podhorna

ZÁKAZNÍK

SPZ 6

Předal:

P

REMEX CZ a.s. K. Voje 1111/56, 154 00 Praha 5 - Slivenec, Tel: +420 602 234 500
IČ: 026201088 DIČ: CZ6201088 ČSÚB Praha a.s. 32523252/0300 info@remex.cz www.remex.cz

Remex

SKLÁDKOVÝ LÍSTEK č.

ze dne 6.11.21

za příjem níže uvedeného odpadu:

Název odpadu	Kód	Hmotnost (t)
Výkopová zemina – odkop	17 05 04	30t
Kamenná suť	17 05 04	
Beton z demolic objektu	17 01 01	
Stavební a demoliční suť	17 01 02-3	
Asfaltový beton bez dehtu	17 03 02	
Štěrka/podsítné	17 05 08	

Předávající prohlašuje, že tato dodávka odpadu se shoduje s názvem a složením s první dodávkou odpadu, ke které byl vyhotoven základní popis odpadu.

SO/PS 11/277 Mohelnice - Podhorna

ZÁKAZNÍK

SF

Předal:

Přev:

REMEX CZ a.s. K. Voje 1111/56, 154 00 Praha 5 - Slivenec, Tel: +420 602 234 500
IČ: 026201088 DIČ: CZ6201088 ČSÚB Praha a.s. 32523252/0300 info@remex.cz www.remex.cz

Remex

SKLÁDKOVÝ LÍSTEK č.

ze dne 6.11.21

za příjem níže uvedeného odpadu:

Název odpadu	Kód	Hmotnost (t)
vykopová zemina – odkop	17 05 04	30t
Kamenná suť	17 05 04	
Beton z demolic objektu	17 01 01	
Stavební a demoliční suť	17 01 02-3	
Asfaltový beton bez dehtu	17 03 02	
Štěrka/podsítné	17 05 08	

Předávající prohlašuje, že tato dodávka odpadu se shoduje s názvem a složením s první dodávkou odpadu, ke které byl vyhotoven základní popis odpadu.

SO/PS 11/277 Mohelnice - Podhorna

ZÁKAZNÍK

SF

Předal:

Přev
K

REMEX CZ a.s. K. Voje 1111/56, 154 00 Praha 5 - Slivenec, Tel: +420 602 234 500
IČ: 026201088 DIČ: CZ6201088 ČSÚB Praha a.s. 32523252/0300 info@remex.cz www.remex.cz

Remex

SKLÁDKOVÝ LÍSTEK č.

ze dne 6.11.21

za příjem níže uvedeného odpadu:

Název odpadu	Kód	Hmotnost (t)
Výkopová zemina – odkop	17 05 04	30t
Kamenná suť	17 05 04	
Beton z demolic objektu	17 01 01	
Stavební a demoliční suť	17 01 02-3	
Asfaltový beton bez dehtu	17 03 02	
Štěrka/podsítné	17 05 08	

Předávající prohlašuje, že tato dodávka odpadu se shoduje s názvem a složením s první dodávkou odpadu, ke které byl vyhotoven základní popis odpadu.

SO/PS 11/277 Mohelnice - Podhorna

ZÁKAZNÍK

SF

Předal:

Přev
K

REMEX CZ a.s. K. Voje 1111/56, 154 00 Praha 5 - Slivenec, Tel: +420 602 234 500
IČ: 026201088 DIČ: CZ6201088 ČSÚB Praha a.s. 32523252/0300 info@remex.cz www.remex.cz

Remex

SKLÁDKOVÝ LÍSTEK č.

ze dne

15.11.21

za příjem níže uvedeného odpadu.

Název odpadu	Kód	Hmotnost (t)
Výkopová zemina – odkop	17 05 04	30 t
Kamenná suť	17 05 04	
Beton z demolic objektu	17 01 01	
Stavební a demoliční suť	17 01 02-3	
Asfaltový beton bez dehtu	17 03 02	
Štěrka/podsítné	17 05 08	

Předávající prohlašuje, že tato dodávka odpadu se shoduje původem a složením s první dodávkou odpadu, ke které byl vyhotoven základní popis odpadu.

SO/PS

11/277 Mohelnice - Podhorá

ZÁKAZNÍK

Předal:

REMEX CZ a.s.

IČ: 253 881 17, IČ DPH: CZ0101088, ČSOB Praha-Slavenec, s.r.o. Česká republika, info@remex.cz, www.remex.cz

Remex

SKLÁDKOVÝ LÍSTEK č.

ze dne

15.11.21

za příjem níže uvedeného odpadu.

Název odpadu	Kód	Hmotnost (t)
Výkopová zemina – odkop	17 05 04	30 t
Kamenná suť	17 05 04	
Beton z demolic objektu	17 01 01	
Stavební a demoliční suť	17 01 02-3	
Asfaltový beton bez dehtu	17 03 02	
Štěrka/podsítné	17 05 08	

Předávající prohlašuje, že tato dodávka odpadu se shoduje původem a složením s první dodávkou odpadu, ke které byl vyhotoven základní popis odpadu.

SO/PS

11/277 Mohelnice - Podhorá

ZÁKAZNÍK

Předal:

REMEX CZ a.s.

IČ: 253 881 17, IČ DPH: CZ0101088, ČSOB Praha-Slavenec, s.r.o. Česká republika, info@remex.cz, www.remex.cz

Remex

SKLÁDKOVÝ LÍSTEK č.

ze dne

15.11.21

za příjem níže uvedeného odpadu.

Název odpadu	Kód	Hmotnost (t)
Výkopová zemina – odkop	17 05 04	30 t
Kamenná suť	17 05 04	
Beton z demolic objektu	17 01 01	
Stavební a demoliční suť	17 01 02-3	
Asfaltový beton bez dehtu	17 03 02	
Štěrka/podsítné	17 05 08	

Předávající prohlašuje, že tato dodávka odpadu se shoduje původem a složením s první dodávkou odpadu, ke které byl vyhotoven základní popis odpadu.

SO/PS

11/277 Mohelnice - Podhorá

ZÁKAZNÍK

Předal:

F

18

REMEX CZ a.s., K Václavské 1121/65, 154 00 Praha 5 - Slavenec, Tel: +420 602 234 500

www.remex.cz

Remex

SKLÁDKOVÝ LÍSTEK č.

ze dne

15.11.21

za příjem níže uvedeného odpadu.

Název odpadu	Kód	Hmotnost (t)
Výkopová zemina – odkop	17 05 04	30 t
Kamenná suť	17 05 04	
Beton z demolic objektu	17 01 01	
Stavební a demoliční suť	17 01 02-3	
Asfaltový beton bez dehtu	17 03 02	
Štěrka/podsítné	17 05 08	

Předávající prohlašuje, že tato dodávka odpadu se shoduje původem a složením s první dodávkou odpadu, ke které byl vyhotoven základní popis odpadu.

SO/PS

11/277 Mohelnice - Podhorá

ZÁKAZNÍK

Předal:

REMEX CZ a.s.

IČ: 253 881 17, IČ DPH: CZ0101088, ČSOB Praha-Slavenec, s.r.o. Česká republika, info@remex.cz, www.remex.cz

ze dne

ze dne 15.11.21

Název odpadu	Kód	Hmotnost (t)
Výkopová zemina – odkop	17 05 04	
Kamenná suť	17 05 04	307
Beton z demolice objektu	17 01 01	
Stavební a demoliční suť	17 01 02-3	
Asfaltový beton bez dehtu	17 03 02	
Štěrka/podsítné	17 05 08	

Predavajki, proglašuje, da tako dodavka odpadu se shoduje s uvodom v složeni in s prvni dodajkou odpadu, ku ktero

2,PS

ZAKAZNÍK

Preda!

REMAX CZ a.s. - are 111/86 154 00 Praha 5 -
1092 CZE 0201086 ČSOB Praha

2000

25 (100) 15.77 4

Název odpadu	Kód	Hmotnost (t)
Výkopová zemina – odkop	17 05 04	
Kamenná sut	17 05 04	304
Beton z demolic objektu	17 01 01	
Stavební a demoliční sut	17 01 02-3	
Asfaltový beton bez dehtu	17 03 02	
Štěrka/podsítné	17 05 06	

Platba za služby poskytnuté za účelom dodania odpadov je zahrnutá v cene odpadov, ktorú vypláca klient. Platba za služby poskytnuté za účelom dodania odpadov je zahrnutá v cene odpadov, ktorú vypláca klient.

SO/PS

ZÁKAZNÍK

Předal:

REMEX CZ a.s. I. Vaze 131/66 154 0011 and 5 - Slava, 154 0011 Praha 5, Czech Republic
K 60301048 IČ 020201068 4506 Psychiatice, K 6530252/0300 info@remex.cz www.remex.cz

Remex

SKLÁDKOVÝ LÍSTEK č.

ze dne

16.11.21

za příjem níže uvedeného odpadu:

Název odpadu	Kód	Hmotnost (t)
Výkopová zemina – odkop	17 05 04	
Kamenná suť	17 05 04	30t
Beton z demolice objektu	17 01 01	
Stavební a demoliční suť	17 01 02-3	
Asfaltový beton bez dehtu	17 03 02	
Štěrka/podbitné	17 05 08	

Předávající prohlašuje, že tato dodávka odpadu se shoduje původem a složením s první dodávkou odpadu, ke které byl vyhotoven základní popis odpadu.

SO/PS

11/227 Mohelnice - Podhoraz

ZÁKAZNÍK

Předal:

REMEX CZ a.s. • Vozce III/1765 • 174 00 Praha 5 - Smíchov
IČ: 60301086 DIČ: CZ60201086 ČSOB Prácheňsko

Remex

SKLÁDKOVÝ LÍSTEK č.

ze dne

16.11.21

za příjem níže uvedeného odpadu:

Název odpadu	Kód	Hmotnost (t)
Výkopová zemina – odkop	17 05 04	
Kamenná suť	17 05 04	30t
Beton z demolice objektu	17 01 01	
Stavební a demoliční suť	17 01 02-3	
Asfaltový beton bez dehtu	17 03 02	
Štěrka/podbitné	17 05 08	

Předávající prohlašuje, že tato dodávka odpadu se shoduje původem a složením s první dodávkou odpadu, ke které byl vyhotoven základní popis odpadu.

SO/PS

11/227 Mohelnice - Podhoraz

ZÁKAZNÍK

Předal:

REMEX CZ a.s. • Vozce III/1765 • 174 00 Praha 5 - Smíchov
IČ: 60301086 DIČ: CZ60201086 ČSOB Prácheňsko

Remex

SKLÁDKOVÝ LÍSTEK č.

ze dne

16.11.21

za příjem níže uvedeného odpadu:

Název odpadu	Kód	Hmotnost (t)
Výkopová zemina – odkop	17 05 04	
Kamenná suť	17 05 04	30t
Beton z demolice objektu	17 01 01	
Stavební a demoliční suť	17 01 02-3	
Asfaltový beton bez dehtu	17 03 02	
Štěrka/podbitné	17 05 08	

Předávající prohlašuje, že tato dodávka odpadu se shoduje původem a složením s první dodávkou odpadu, ke které byl vyhotoven základní popis odpadu.

SO/PS

11/227 Mohelnice - Podhoraz

ZÁKAZNÍK

Předal:

REMEX CZ a.s. • Vozce III/1765 • 174 00 Praha 5 - Smíchov
IČ: 60301086 DIČ: CZ60201086 ČSOB Prácheňsko • t: 32523252/0300 • info@remex.cz • www.remex.cz

Remex

SKLÁDKOVÝ LÍSTEK č.

ze dne

16.11.21

za příjem níže uvedeného odpadu:

Název odpadu	Kód	Hmotnost (t)
Výkopová zemina – odkop	17 05 04	
Kamenná suť	17 05 04	30t
Beton z demolice objektu	17 01 01	
Stavební a demoliční suť	17 01 02-3	
Asfaltový beton bez dehtu	17 03 02	
Štěrka/podbitné	17 05 08	

Předávající prohlašuje, že tato dodávka odpadu se shoduje původem a složením s první dodávkou odpadu, ke které byl vyhotoven základní popis odpadu.

SO/PS

11/227 Mohelnice - Podhoraz

ZÁKAZNÍK

SP

Předal:

Převz.

REMEX CZ a.s. • Vozce III/1765 • 174 00 Praha 5 - Smíchov
IČ: 60301086 DIČ: CZ60201086 ČSOB Prácheňsko • t: 32523252/0300 • info@remex.cz • www.remex.cz

SKLÁDKOVÝ LISTEK č.

z dne

16.11.21

za příjem níže uvedeného odpadu:

Název odpadu	Kód	Hmotnost (t)
Vykopová zemina – odkop	17 05 04	30t
Kamenná suť	17 05 04	
Ľáton z demolice objektu	17 01 01	
Stavební a demoliční suť	17 01 02-3	
Asfaltový beton bez dehtu	17 03 02	
Štěrka/podsítné	17 05 08	

Předávající prohlašuje, že tato dodávka odpadu se shoduje s původem a složením s první dodávkou odpadu, ke které byl vyhotoven základní popis odpadu.

SO:PS

11/227 Mohelnice - Pex-Mex

ZAKAZNIK

Předal:

REMEX CZ s.r.o. • Vozovna 111160 • 1400 Praha 5 •

Remex

SKLÁDKOVÝ LÍSTEK č.

ze dne

17.11.21

za příjem níže uvedeného odpadu:

Název odpadu	Kód	Hmotnost (t)
Výkopová zemina – odkop	17 05 04	30t
Kamenná suť	17 05 04	
Beton z demolice objektu	17 01 01	
Stavební a demoliční suť	17 01 02-3	
Asfaltový beton bez dehtu	17 03 02	
Štěrka/podsítné	17 05 08	

Předávající prohlašuje, že tato dodávka odpadu se shoduje původem a složením s první dodávkou odpadu, ke které byl vyhotoven základní popis odpadu.

SO/PS

11/227 Mohelnice - Podhory

ZÁKAZNÍK

Předal:

REMEX CZ a.s.
IČ: 60201088, DIČ: CZ60201088, ČSOB Praha

Remex

SKLÁDKOVÝ LÍSTEK č.

ze dne

17.11.21

za příjem níže uvedeného odpadu:

Název odpadu	Kód	Hmotnost (t)
Výkopová zemina – odkop	17 05 04	30t
Kamenná suť	17 05 04	
Beton z demolice objektu	17 01 01	
Stavební a demoliční suť	17 01 02-3	
Asfaltový beton bez dehtu	17 03 02	
Štěrka/podsítné	17 05 08	

Předávající prohlašuje, že tato dodávka odpadu se shoduje původem a složením s první dodávkou odpadu, ke které byl vyhotoven základní popis odpadu.

SO/PS

11/227 Mohelnice - Podhory

ZÁKAZNÍK

Předal:

REMEX CZ a.s.

Remex

SKLÁDKOVÝ LÍSTEK č.

ze dne

17.11.21

za příjem níže uvedeného odpadu:

Název odpadu	Kód	Hmotnost (t)
Výkopová zemina – odkop	17 05 04	30t
Kamenná suť	17 05 04	
Beton z demolice objektu	17 01 01	
Stavební a demoliční suť	17 01 02-3	
Asfaltový beton bez dehtu	17 03 02	
Štěrka/podsítné	17 05 08	

Předávající prohlašuje, že tato dodávka odpadu se shoduje původem a složením s první dodávkou odpadu, ke které byl vyhotoven základní popis odpadu.

SO/PS

11/227 Mohelnice - Podhory

ZÁKAZNÍK

Předal:

REMEX CZ a.s.
IČ: 60201088, DIČ: CZ60201088, ČSOB Praha

www.remex.cz

Remex

SKLÁDKOVÝ LÍSTEK č.

ze dne

17.11.21

za příjem níže uvedeného odpadu:

Název odpadu	Kód	Hmotnost (t)
Výkopová zemina – odkop	17 05 04	30t
Kamenná suť	17 05 04	
Beton z demolice objektu	17 01 01	
Stavební a demoliční suť	17 01 02-3	
Asfaltový beton bez dehtu	17 03 02	
Štěrka/podsítné	17 05 08	

Předávající prohlašuje, že tato dodávka odpadu se shoduje původem a složením s první dodávkou odpadu, ke které byl vyhotoven základní popis odpadu.

SO/PS

11/227 Mohelnice - Podhory

ZÁKAZNÍK

Předal:

REMEX CZ a.s.
IČ: 60201088, DIČ: CZ60201088, ČSOB Praha
www.remex.cz

Remex

SKLÁDKOVÝ LÍSTEK č.

ze dne

18.11.21

za příjem níže uvedeného odpadu:

Název odpadu	Kód	Hmotnost (t)
Vykopová zemina – odkop	17 05 04	30t
Kamenná suť	17 05 04	
Beton z demolic objektu	17 01 01	
Stavební a demoliční suť	17 01 02-3	
Asfaltový beton bez dehtu	17 03 02	
Štěrka/podsítné	17 05 08	

Předávající prohlašuje, že tato dodávka odpadu se shoduje s předem a složením s první dodávkou odpadu, ke které byl vyhotoven základní popis odpadu.

SO/PS

11/277 Mohelnice - Podhorá

ZÁKAZNÍK

Předal:

REMEX CZ a.s. Křížová 1111/154 010 Praha 5 - Smíchov IČ: 254 60 101

www.remex.cz

Remex

SKLÁDKOVÝ LÍSTEK č.

ze dne

18.11.21

za příjem níže uvedeného odpadu:

Název odpadu	Kód	Hmotnost (t)
Vykopová zemina – odkop	17 05 04	30t
Kamenná suť	17 05 04	
Beton z demolic objektu	17 01 01	
Stavební a demoliční suť	17 01 02-3	
Asfaltový beton bez dehtu	17 03 02	
Štěrka/podsítné	17 05 08	

Předávající prohlašuje, že tato dodávka odpadu se shoduje s předem a složením s první dodávkou odpadu, ke které byl vyhotoven základní popis odpadu.

SO/PS

11/277 Mohelnice - Podhorá

ZÁKAZNÍK

Předal:

REMEX CZ a.s.

Remex

SKLÁDKOVÝ LÍSTEK č.

ze dne

18.11.21

za příjem níže uvedeného odpadu:

Název odpadu	Kód	Hmotnost (t)
Vykopová zemina – odkop	17 05 04	31t
Kamenná suť	17 05 04	
Beton z demolic objektu	17 01 01	
Stavební a demoliční suť	17 01 02-3	
Asfaltový beton bez dehtu	17 03 02	
Štěrka/podsítné	17 05 08	

Předávající prohlašuje, že tato dodávka odpadu se shoduje s předem a složením s první dodávkou odpadu, ke které byl vyhotoven základní popis odpadu.

SO/PS

11/277 Mohelnice - Podhorá

ZÁKAZNÍK

Předal:

REMEX CZ a.s. Křížová 1111/154 010 Praha 5 - Smíchov IČ: 254 60 101

www.remex.cz

SKLÁDKOVÝ LÍSTEK č.

dne

19 11

za příjem níže uvedeného odpadu:

Název odpadu	Kód	Hmotnost (t)
Vykopová zemina – odtkop	17 05 04	
Kamenná suť	17 05 04	31 t
Beton z demolice objektu	17 01 01	
Stavební a demoliční suť	17 01 02-3	
Asfaltový beton bez dehtu	17 03 02	
Štěrka/podsítně	17 05 08	

Předávatel prohlašuje, že tato dodávka odpadu je v souladu s platnými předpisy a s podmínkami dodavatele.

SO/PS

11/177 Mělník - Podh.

ZÁKAZNÍK

Předal:

REMEX CZ s.r.o.
