

Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo uzavřené ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též „**občanský zákoník**“) mezi:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, Praha 5, Smíchov PSČ: 150 00

IČO: 00066001

DIČ: CZ00066001

zastoupená: Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem
a dále zastoupená Ing. Janem Fidlerem, DiS, statutárním zástupcem ředitele, na
základě plné moci ze dne 28.06.2022

č. smlouvy: S-383/00066001/2021

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

COLAS CZ, a.s.

se sídlem: Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 - Vysočany

IČO: 261 77 005

DIČ: CZ26177005

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556

zastoupená: Ing. Pavlem Kellerem, ředitelem oblasti Sever a zplnomocněným zástupcem
společnosti

č. smlouvy: 201213087

dále jen „**Zhotovitel**“ na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „**smluvní strany**“)

Preamble:

Smluvní strany tímto prohlašují, že dne 13. 04. 2021 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na veřejné zakázce s názvem: „**III/2451-Stará Boleslav**“ (dále jen „**Smlouva o dílo**“). Na základě dohody smluvních stran a ve vazbě na čl. 14. odst. 13. Smlouvy o dílo, uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo (dále jen „**Dodatek č. 3**“).

I. Předmět Dodatku č. 3

1. S ohledem na vznik objektivně nepředvídaných okolností v průběhu realizace prací na díle, které nemohl zhotovitel před zahájením prací předpokládat, a které zapříčinily změnu rozsahu prací v podobě méněprací a víceprací, upravuje se po dohodě smluvních stran předmět Smlouvy o dílo. Změna rozsahu prací v podobě méněprací a víceprací obsahují Objednatel schválené změnové listy, které jsou přílohou tohoto Dodatku č. 3. Na základě změny předmětu díla se mění i celková cena za dílo uvedená v čl. 8. odst. 8.1. Smlouvy o dílo, který nově zní:

- 8.1. Smluvní strany se dohodly, že celková cena Díla je stanovena jako neměnná a konečná a činí:

Původní Cena Díla bez DPH	12.360.707,31 Kč
Nová Cena díla dle Dodatku č. 3 bez DPH	13.835.858,94 Kč
DPH 21%	2.905.530,38 Kč
DPH 15 %	0,- Kč
Cena Díla včetně DPH	16.741.389,32 Kč

Daň z přidané hodnoty (dále též „DPH“) bude na základě výslovné dohody smluvních stran připočtena ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že veškerá množství uvedená v soupise prací k Dílu a jeho jednotlivým částem jsou pouze odhadovaná, a jejich změna neznamena změnu ceny Díla.

Přílohou tohoto Dodatku č. 3 jsou Objednatelem odsouhlaseny Změnové listy 1 - 3.

II. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 3 bude uveřejněn dle § 219 zákona o ZVZ na profilu Objednatele.
2. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tento Dodatek č. 3 uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento Dodatek č. 3 je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy o dílo. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, která nejsou tímto Dodatkem č. 3 výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
4. Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze smluvních stran obdrží její elektronický originál.
5. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento Dodatek č. 3 uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto Dodatku č. 3 za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku č. 3 rozhodující.

V Říčanech dne _____

V Praze dne _____

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace

COLAS CZ, a.s.
Ing. Pavel Keller
ředitel oblasti Sever
a zplnomocněný zástupce společnosti

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby: III/2451 - Stará Boleslav Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101 - Komunikace	Číslo SO/PS / Číslo Změny SO/PS: 101/1	Číslo ZBV: 1
Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov IČ: 00066001		
Zhotovitel: Colas CZ, a.s. Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 IČ: 26177005		

Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

Část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.1	0,00	0,00	0,00
Část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.2	0,00	0,00	0,00
Část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.3	0,00	2 232 500,29	2 232 500,29
Část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.4	0,00	0,00	0,00
Část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.5	0,00	0,00	0,00
Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1	0,00	2 232 500,29	2 232 500,29

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré:

1

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby M2451 - Stará Boleslav Název smluvního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 181 - Komunikace	Číslo SO/PS / Číslo Změny SO/PS: 101/1	Číslo ŽBV: 1.3
--	--	-----------------------

Strany smlouvy o dílo objednatel č.: S-383/00086001/2021 a zhotovitel č.: 201213087 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 1.3.2021 (dále jen Smlouva).

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 06 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s., Rubelka 215/1, 190 06 Praha 9, Vysočany

Přehled Změnového listu:			Par. č.	Příjemce
1. Krycí list	1	počet listů	1, 2	Objednatel
2. Změnový list	1	počet listů	3	Zhotovitel
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů	4	Stavební dozor
4. Rozpis ocenění Změn položek ŽBV 1	1	počet listů		
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů		
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů		
Další doklady dle přehledu dokladů:	28	počet listů		

Instalátor změn: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny: Doplnění provizorních autobusových zastávek

Předpokládá zadávací dokumentace vychází z rozdělení stavby na 4 etapy (úseky) a z úplného přerušení provozu pražské integrované dopravy v obou směrech po dobu výstavby.

K zajištění bezproblémové dostupnosti a plynulosti autobusových linek během výstavby počítával Regionální organizátor pražské integrované dopravy (ROPID) zachování provozu autobusové hromadné dopravy (viz doklad č. 14 - Vyjádření ROPID).

Z tohoto důvodu došlo k úpravě návrhu DIO (viz doklad č. 09 - Přechodná dopravní značení), který byl odsouhlasen odpovědným zástupcem PČR. S ohledem na tuto změnu došlo k úpravě etapizace výstavby, byly zkráceny jednotlivé úseky stavby a došlo tak k navýšení počtu etap výstavby na 5. V nové etapě č. 5 byly na základě DIO vytvořeny provizorní autobusové zastávky a nástupiště pro zajištění plynulého a bezpečného přechodu k obsluhování autobusových linek. Souhlas objednatel s úpravou etapizace je přiložen jako doklad č. 10.

Rozřazování stavby na menší celky mělo za následek prodloužení doby výstavby o 14 dní, a čímž je spojen vznik dočasných nákladů na pracovníky a mechanizaci (frýzy a náklady na pokládku asfaltového betonu). Každá další etapa vyžadovala další nájezd a denní nájem frýzy + dopravy zajišťující odvoz materiálů. U třídníkové čety bylo u každé etapy nutno započítat 2 dny na pokládku asfaltového betonu navíc (spodní a obrusná vrstva) frýzy + dopravy zajišťující odvoz materiálů. Rozbor nákladů za den na výše uvedené úseky je vyčíslen v dokladu č. 08 (Stanovení nových jednotkových cen).

Požadavkem objednatel byla i oprava výtluků na okružní trase (viz doklad č. 13 - Pokyn objednatel). Celkem se jednalo o 48m² v tl. 0,05 m a št asfaltového betonu.

Jelikož se o Změnu nepředstavuje, nepředstavuje, která je tak podle § 5, odst. 1 písm. c), resp. podle § 10 Smlouvy R-SM-06 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 28. 05. 2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 232, odst. 6) se jedná o změnu nepředvidanou.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných sečtem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
0,00	2 232 500,29	2 232 500,29	2 232 500,29

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (zastupující): COLAS CZ, a.s.	jméno:	Petr Žaloudík	datum:	06.12.2021	podpis:
Stavební dozor: KSÚS SK	jméno:	Tomáš Pecka	datum:		podpis:
Zástupce Objednatel: KSÚS SK vedoucí TSÚ oblastí MÚH	jméno:	Lenka Chmelová	datum:		podpis:

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zd. oceněny v dokumentaci Mě Změny. Smlouva strany shodně prohlásily, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje důležitý Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitel sjednaná ve Smlouvě nedotčena. Na účel této přílohy příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatel)	jméno:	Ing. Jan Lichnerger	datum:		podpis:
Zhotovitel	jméno:	Pavel Lhýnská	datum:	06.12.2021	podpis:
					Číslo stran

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 1

Název Stavby:	III/2451 - Stará Boleslav
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	101/1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	SO 101 - Komunikace

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
12 360 707,31

Poznámka:

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	12 360 707,31	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	2 232 500,29	2 232 500,29	18,06%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	0,00	14 593 207,60	2 232 500,29	18,06%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):
COLAS CZ, a.s.

souhlasím

Petr Žaloudek

6.12.2011

Stavební dozor:
KSUS SK - sítiní technik

souhlasím

Tomáš Pecka

2

Zástupce Objednatel:
vedoucí TSÚ oblasti M.H.

souhlasím

Lenka Chmelová

Zaměstnanec KSUS SK
odpovědný za cenové
projednání Změny:

souhlasím

Ing. Jaroslava Jurková

Rozpis ocenění Změn položek - celkem

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

SO 101/1

Skupina změn 3

Por. č. pol.	Kód položky	Název položky	M.j.	Množství ve Směrově	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Směrově v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Nové položky													
5	02710	DOPRAVNÍ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ (ODHAD)	kg	1,000	0,000	0,000	102 655,00	102 655,00	0,00	128 932,15	128 932,15	128 932,15	125,34%
38	372242111	Provozovní vypravení nesprávných výfuků sčítavými betonem ACO (AB)	t	0,000	6,000	6,000	4 150,00	0,00	0,00	24 900,00	24 900,00	24 900,00	100,00%
39	R1	Uřízení provozních BLS zařízení a dřevěnými nástupišti - materiál, montáž, demontáž, doprava	KOMP	0,000	2,000	2,000	28 195,27	0,00	0,00	56 390,54	56 390,54	56 390,54	100,00%
40	R2	Náklady pro likvidaci stavby (mechanizace+doprava+pracovníci+THP)	den	0,000	14,000	14,000	89 013,75	0,00	0,00	1 246 213,80	1 246 213,80	1 246 213,80	100,00%
41	R3	Náklady pokladu soř. směr.	den	0,000	4,000	4,000	120 673,00	0,00	0,00	482 692,00	482 692,00	482 692,00	100,00%
42	R4	Náklady na fréz. (průběhem+doprava+pracovníci)	den	0,000	2,000	2,000	141 678,90	0,00	0,00	283 357,80	283 357,80	283 357,80	100,00%
Celkem									0,00	2 332 900,29		2 332 900,29	

Odpovědný zástupce Objednatel: i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Petr Žalouděk, (stavbyvedoucí)

Datum:

Podpis:

Za Objednatel: Tomáš Pačka, (TDP, technik KSÚS)

Datum:

Podpis:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: III/2451 - Stará Boleslav

1-Přijetí smlouvy částka bez rezervy a DPH	12 360 707,31
3+1+10+20-Aktuální smlouva částka (cena stavby)	14 593 207,60
Aktuální smlouva částka (cena stavby) včetně DPH	17 857 781,20
3-(21)*100-Procento změny Přijetí vstupní částky	118,00%
4-(25)*100-Sledovací vyřazených změn (Skupina 1)	0,00%
5-(26)*100-Sledovací změny potřeby (Skupina 2)	0,00%
40-(10)*100-Sledování limitu 10 % pro pokračování stavby při změně skupiny 3 a 4, limit 10,00 %	0,00%

8+12+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	2 232 500,29
7+20+1+36	Sledovací limitu 30 % - absolutní Skupiny 3 a Skupiny 4	38,88%
6+1+36	Zákonný limit 30 % pro Skupiny 3 a Skupiny 4	2 758 212,18

9+33A+17+100	Sledovací limitu 30 % Skupiny 3	10,00%
10+33B+17+100	Sledovací limitu 30 % Skupiny 4	0,00%
10A+33A+36	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupiny 3 a Skupiny 4	2 232 500,29
11+17+0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupiny 3 a Skupiny 4	8 180 353,60

12+17+0,5	Limit	1 854 108,10
12+17+0,5	Sledovací limitu (10%)	0,00%
14+ABS(37)+36	Hodnota skupiny 3	0,00

40=(101)*100		Výsledná změna 15 % při aplikaci zákona č. 134/2016 Sb. (př. 14) zákona č. 134/2016 Sb.)		3,68%	

Poznámka: Formální název informací skupin a zobrazení stavby dle předložené Změnové listy.

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	I
Název a evidenční číslo stavby:	III/2451 - Stará Boleslav
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 101 - Komunikace
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	101/1

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
07 Soupis prací SO po změnách	2	
08 Stanovení nových JC	11	
09 DIO - Přechodné dopravní značení	2	
10 Souhlas objednatele s etapizací	3	
11 Stanovení přechodné úpravy	3	
12 Zápis ve SD ze dne 7.6.2021	1	
13 Pokyn objednatele	2	
14 Vyjádření ROPID	1	
15 Vyjádření DI Policie ČR	2	
16 Fotodokumentace	1	
Počet listů celkem	28	

Rozpis ocenění Změn položek - celkem

Evidenční číslo a název stavby: III/2451 Stará Boleslav-Nový Vestec								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: SO 101 - Komunikace								SO 101/1					
Číslo a název rozpočtu: SO 101.1 - Komunikace								celkem					
Por. č. poř.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
35	931312	TEŠNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZALIVKOU PRŮŤ DO 200MMQ	m	3150,000	0,000	0,000	21,00	97 650,00	0,00	0,00	97 650,00	0,00	0,00%
36	935AA	ŽABY Z DILČO Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍRKY DO 150MM VČETNĚ MRŽI (odhad)	m	4,000	0,000	0,000	4 512,00	17 512,00	0,00	0,00	17 512,00	0,00	0,00%
37	93818	OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVK (ZAMĚTENÍ)	m ²	18622,000	0,000	0,000	4,00	74 488,00	0,00	0,00	74 488,00	0,00	0,00%
		Nové položky - K dle ÚRS 2021/5						0,00	0,00	24 900,00	24 900,00	24 900,00	100,00%
38	57243111	Provozovní výpravení (neopravených) výtlaků asfaltovým směsí AC/D (A8)	m	0,000	0,000	0,000	4150,00	0,00	0,00	24 900,00	24 900,00	24 900,00	100,00%
		Výpravení výtlaků na výtlaky nové pro dopravu na základě ZD – požadavků koordinátora ŘPQD, práce A8 M.L.R. 0,25 m, výtl. směsí AC/D + 2,3 x 48*0,00*2,3 + 9 x 34) 289,5						0,00	0,00	0,00			
								0,00	0,00	0,00			
								0,00	0,00	0,00			
		Nové položky - K - položky						0,00	0,00	2 068 668,14	2 068 668,14	2 068 668,14	100,00%
39	82	Zřízení pracovních BÚS zastávek s dřevěným nástupem - materiál, montáž, demontáž, doprava	KOMPL.	0,000	2,000	2,000	28 199,27	0,00	0,00	56 398,54	56 398,54	56 398,54	100,00%
		Číslo 2 ke dřevěným nástupům pro pracovní zastávky dle požadavků ŘPQD a ÚRS, jednotlivá cena se skládá ze třídy dřevěného a dřevěného materiálu (materiál, práce) Podrobný rozbor JC viz detail Z.08 - Přehled nových položek (Individuální kalkulace zpracovává)											
40	82	Náklady pro dokončení stavby (mechanizace+doprava+pracovníci+TRH)	den	0,000	14,000	14,000	89015,70	0,00	0,00	1 246 219,80	1 246 219,80	1 246 219,80	100,00%
		Číslo 1 náklady na stavbu s úkolem nové pracovní zastávky, jednotlivá cena se skládá ze třídy dřevěného a dřevěného materiálu (materiál, práce) Podrobný rozbor JC viz detail Z.08 - Přehled nových položek (Individuální kalkulace zpracovává)											
41	82	Náklady poskladu asf. směsí	den	0,000	4,000	4,000	110673,00	0,00	0,00	482 692,00	482 692,00	482 692,00	100,00%
		Číslo 1 náklady na stavbu s úkolem nové pracovní zastávky, jednotlivá cena se skládá ze třídy dřevěného a dřevěného materiálu (materiál, práce) Podrobný rozbor JC viz detail Z.08 - Přehled nových položek (Individuální kalkulace zpracovává)											
42	84	Náklady na hráz (opravení)+doprava+pracovníci	den	0,000	2,000	2,000	141678,90	0,00	0,00	283 357,80	283 357,80	283 357,80	100,00%
		Číslo 1 náklady na stavbu s úkolem nové pracovní zastávky, jednotlivá cena se skládá ze třídy dřevěného a dřevěného materiálu (materiál, práce) Podrobný rozbor JC viz detail Z.08 - Přehled nových položek (Individuální kalkulace zpracovává)											
		Celkem						12 866 787,51	0,00	2 232 590,79	14 599 307,60	2 232 590,79	100,00%

Vypracoval: Puffino Libor schválil: Petr Hodek

Vypracováno pro:



DOPRAVNÍ ZNAČENÍ MĚLNÍK s.r.o.
Truhlářská 208, 276 01 Mělník
IČO - 2664987, DIČ - CZ2664987
tel. 315 628 904, fax. 315 628 934
tel. 603 481 442, tel. 603 481 526
info@dmelnik.cz, www.dmelnik.cz

COLAS CZ, a.s.
Rubeška 215/1
190 00 Praha 9

Nabídka č.: 071/2021

datum: 31.12.2021

počet listů: 1

AKCE : DIO - STARÁ BOLESLAV - SILNICE III/2451 ULICE OKRUŽNÍ A VEŠTECKÁ
DATUM : 05 / 2021

1. ETAPA - 4 TYDNY - CELKEM 28 KALENDÁRNÍCH DNO

Materiál pro přechodné dopravní značení	Typ	Díl	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
DŽ vč. sloupku, podstavce a přichytek	IP10a	28	16	12,00	5 376,00
DŽ vč. sloupku, podstavce a přichytek	IP10b	28	9	12,00	3 024,00
DŽ vč. sloupku, podstavce a přichytek	B28	35	2	12,00	840,00
Dodatková tabulka	E13	35	2	9,00	630,00
DŽ vč. sloupku, podstavce a přichytek	A9	28	3	12,00	1 008,00
DŽ vč. sloupku, podstavce a přichytek	C3b	28	2	12,00	672,00
DŽ vč. sloupku, podstavce a přichytek	B24a	28	1	12,00	336,00
DŽ vč. sloupku, podstavce a přichytek	B24b	28	1	12,00	336,00
DŽ vč. sloupku, podstavce a přichytek	IP22	28	4	25,00	2 800,00
DŽ vč. sloupku, podstavce a přichytek	IS11b	28	15	12,00	5 040,00
DŽ vč. sloupku, podstavce a přichytek	B1	28	17	12,00	5 712,00
Lamelová zábrana	Z2	28	14	20,00	7 840,00
Dodatková tabulka	E13	28	5	9,00	1 260,00
Dodatková tabulka	E3a	28	3	9,00	756,00
Signalizační světlík	sig. světlík SRS 3 (vysílač)	28	2	45,00	2 520,00
Akumulátor	baterie 200Ah + skúbečna	28	2	35,00	1 960,00
Service - baterie		28	2	50,00	2 800,00

Pronájem

42 910,00

Práce	mj	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
montáž	ks	24	240,00	5 760,00
demontáž	ks	18	240,00	4 320,00
zakrytí stávajících DŽ	ks	4	150,00	600,00
fole - přelep na DŽ E13 / IS11b / E3a	ks	25	150,00	3 750,00
fole - přelep na DŽ IP22	ks	4	250,00	1 000,00
doprava	mj	1	1 900,00	1 900,00

Práce celkem

17 330,00

CELKEM - 1. ETAPA -

60 240,00

2. ETAPA - 2 TYDNY - CELKEM 14 KALENDÁRNÍCH DNŮ

Materiál pro přechodné dopravní značení	Typ	Dní	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
DŽ vč. sloupku, podstavce a přichytek	IP10a	14	1	12,00	168,00
DŽ vč. sloupku, podstavce a přichytek	A15	14	4	12,00	672,00
DŽ vč. sloupku, podstavce a přichytek	A10	14	4	12,00	672,00
Dodatková tabulka	E7b	14	4	9,00	504,00
Dodatková tabulka	E13	14	1	9,00	126,00
DŽ vč. sloupku, podstavce a přichytek	A22	14	1	12,00	168,00
DŽ vč. sloupku, podstavce a přichytek	C4b	14	1	12,00	168,00
DŽ vč. sloupku, podstavce a přichytek	B1	14	1	12,00	168,00
Lamelová zábrana	Z2	14	1	20,00	280,00
Mobilní semaforová souprava		14	1	350,00	4 900,00
Směrovací deska oboustranná	Z4	14	60	12,00	10 080,00
Signalizační světlo	sig. světla S15 3 (výstražné)	14	1	45,00	630,00
Akumulátor	baterie 200Ah + akubedna	14	1	35,00	490,00
Servis - baterie		14	1	50,00	700,00

Pronájem**15 726,00**

Práce	mj.	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
montáž	ks	16	240,00	3 840,00
demontáž	ks	12	240,00	2 880,00
folie - přelep na DŽ E13 / IS11b / E3a	ks	1	150,00	150,00
doprava	mj.	1	1 900,00	1 900,00

Práce celkem**8 770,00****CELKEM - 2. ETAPA -****28 496,00****3. ETAPA - 2 TYDNY - CELKEM 14 KALENDÁRNÍCH DNŮ**

Materiál pro přechodné dopravní značení	Typ	Dní	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
DŽ vč. sloupku, podstavce a přichytek	IP10a	14	1	12,00	168,00
DŽ vč. sloupku, podstavce a přichytek	A15	14	4	12,00	672,00
DŽ vč. sloupku, podstavce a přichytek	A10	14	4	12,00	672,00
Dodatková tabulka	E7b	14	4	9,00	504,00
Dodatková tabulka	E13	14	1	9,00	126,00
DŽ vč. sloupku, podstavce a přichytek	A22	14	1	12,00	168,00
DŽ vč. sloupku, podstavce a přichytek	C4b	14	1	12,00	168,00
DŽ vč. sloupku, podstavce a přichytek	B1	14	1	12,00	168,00
Lamelová zábrana	Z2	14	1	20,00	280,00
Mobilní semaforová souprava		14	1	350,00	4 900,00
Směrovací deska oboustranná	Z4	14	60	12,00	10 080,00
Signalizační světlo	sig. světla S15 3 (výstražné)	14	1	45,00	630,00
Akumulátor	baterie 200Ah + akubedna	14	1	35,00	490,00
Servis - baterie		14	1	50,00	700,00

Pronájem**15 726,00**

Práce	mj.	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
montáž	ks	16	240,00	3 840,00
demontáž	ks	12	240,00	2 880,00
folie - přelep na DŽ E13 / IS11b / E3a	ks	1	150,00	150,00
doprava	mj.	1	1 900,00	1 900,00

Práce celkem**8 770,00****CELKEM - 3. ETAPA -****28 496,00**

4. ETAPA - 3 TÝDNY - CELKEM 21 KALENDRÁRNÍCH DNŮ

Materiál pro přechodné dopravní značení	Typ	Dni	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
DŽ vč. sloupku, podstavce a přichytek	IP10a	21	16	12,00	4 032,00
DŽ vč. sloupku, podstavce a přichytek	IP10b	21	8	12,00	2 016,00
DŽ vč. sloupku, podstavce a přichytek	IS11c	21	1	12,00	252,00
DŽ vč. sloupku, podstavce a přichytek	C2f	21	1	12,00	252,00
Dodatková tabulka	E13	21	1	9,00	189,00
DŽ vč. sloupku, podstavce a přichytek	A9	21	3	12,00	756,00
DŽ vč. sloupku, podstavce a přichytek	C3b	21	2	12,00	504,00
DŽ vč. sloupku, podstavce a přichytek	B24a	21	2	12,00	504,00
DŽ vč. sloupku, podstavce a přichytek	B24b	21	2	12,00	504,00
DŽ vč. sloupku, podstavce a přichytek	IP22	21	4	25,00	2 100,00
DŽ vč. sloupku, podstavce a přichytek	IS11b	21	13	12,00	3 276,00
DŽ vč. sloupku, podstavce a přichytek	B1	21	9	12,00	2 268,00
Lamejová zábrana	Z2	21	7	20,00	2 940,00
Dodatková tabulka	E13	21	5	9,00	945,00
Dodatková tabulka	E3a	21	2	9,00	378,00
Signalizační světlo	sig. světla SHS 3 (výstražné)	21	4	45,00	3 780,00
Akumulátor	baterie 200Ah + akubedna	21	4	35,00	2 940,00
Servis - baterie		21	4	50,00	4 200,00

Pronájem**31 836,00**

Práce	mj.	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
montáž	ks	22	240,00	5 280,00
demontáž	ks	18	240,00	4 320,00
zakrytí stávajících DŽ	ks	4	150,00	600,00
folie - přelep na DŽ E13 / IS11b / E3a	ks	21	150,00	3 150,00
folie - přelep na DŽ IP22	ks	4	250,00	1 000,00
doprava	mj.	1	1 900,00	1 900,00

Práce celkem**16 250,00****CELKEM - 4. ETAPA -****48 086,00**

5. ETAPA - 2 TÝDNY - CELKEM 14 KALENDRÁRNÍCH DNŮ

Materiál pro přechodné dopravní značení	Typ	Dni	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
DŽ vč. sloupku, podstavce a přichytek	A9	14	8	12,00	1 008,00
DŽ vč. sloupku, podstavce a přichytek	IP10a	14	1	12,00	168,00
DŽ vč. sloupku, podstavce a přichytek	B28	21	8	12,00	1 512,00
Dodateková tabulka	E13	21	8	9,00	1 134,00
DŽ vč. sloupku, podstavce a přichytek	A15	14	3	12,00	504,00
DŽ vč. sloupku, podstavce a přichytek	A10	14	3	12,00	504,00
Dodateková tabulka	E13	14	3	9,00	378,00
DŽ vč. sloupku, podstavce a přichytek	A22	14	2	12,00	336,00
DŽ vč. sloupku, podstavce a přichytek	C4b	14	1	12,00	168,00
DŽ vč. sloupku, podstavce a přichytek	IJ4c	14	2	12,00	336,00
DŽ vč. sloupku, podstavce a přichytek	P4	14	1	12,00	168,00
DŽ vč. sloupku, podstavce a přichytek	B1	14	3	12,00	504,00
Lamelová zábrana	Z2	14	3	20,00	840,00
Třícestná mobilní semaforová souprava		14	1	650,00	9 100,00
Směrovací deska oboustranná	Z4	14	40	12,00	6 720,00
Signalizační světlo	sig. světla SHS 3 (výstražné)	14	1	45,00	630,00
Akumulátor	baterie 200Ah + skříněk	14	1	35,00	490,00
Servis - baterie		14	1	50,00	700,00

Pronájem**25 300,00**

Práce	mj.	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
montáž	ks	18	240,00	4 320,00
demontáž	ks	12	240,00	2 880,00
folie - přelep na DŽ E13 / 4S11b / E3a	ks	9	150,00	1 350,00
doprava	mj.	1	1 900,00	1 900,00

Práce celkem**10 450,00****CELKEM - 5 ETAPA -****35 650,00**

6.ETAPA - 1 TÝDEN - CELKEM 7 KALENDÁRNÍCH DNŮ

Material pro přechodné dopravní značení	Typ	Dní	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
DŽ vč. sloupku, podstavce a přichytek	A9	7	6	12,00	504,00
DŽ vč. sloupku, podstavce a přichytek	IP10a	14	1	12,00	168,00
DŽ vč. sloupku, podstavce a přichytek	B28	14	6	12,00	1 008,00
Dodatková tabulka	E13	14	6	9,00	756,00
DŽ vč. sloupku, podstavce a přichytek	A15	7	2	12,00	168,00
DŽ vč. sloupku, podstavce a přichytek	A10	7	2	12,00	168,00
Dodatková tabulka	E13	7	5	9,00	315,00
DŽ vč. sloupku, podstavce a přichytek	A22	7	1	12,00	84,00
DŽ vč. sloupku, podstavce a přichytek	C4b	7	1	12,00	84,00
DŽ vč. sloupku, podstavce a přichytek	LJ4c	7	2	12,00	168,00
DŽ vč. sloupku, podstavce a přichytek	P4	7	1	12,00	84,00
DŽ vč. sloupku, podstavce a přichytek	B1	7	7	12,00	568,00
Lamelová zábrana	Z2	7	7	20,00	980,00
Mobilitní semaforová souprava		7	1	350,00	2 450,00
Směrovací deska oboustranná	Z4	7	40	12,00	3 360,00
Signalizační světlo	sig.světla SHS 3 (výstražné)	7	3	45,00	945,00
Akumulátor	baterie 200Ah + akubedna	7	3	35,00	735,00
Servis - baterie		7	3	50,00	1 050,00

Pronájem**13 615,00**

Práce	mj.	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
montáž	ks	18	240,00	4 320,00
démontáž	ks	12	240,00	2 880,00
folie - přelep na DŽ E13 / IS11b / E3a	ks	1	150,00	150,00
doprava	mj.	1	1 900,00	1 900,00

Práce celkem**9 250,00****CELKEM - 6.ETAPA -****22 865,00****REKAPITULACE**

CELKEM - 1.ETAPA -	86 242,00
CELKEM - 2.ETAPA -	28 486,00
CELKEM - 3.ETAPA -	26 496,00
CELKEM - 4.ETAPA -	48 086,00
CELKEM - 5.ETAPA -	35 630,00
CELKEM - 6.ETAPA -	22 865,00
PŘÍPRAVA A ZPRACOVÁNÍ GRAFICKÉHO NÁVRHU DIO	2 730,00
VYŘÍZENÍ DIO + DIB	3 500,00
CELKEM	238 085,00

VŠECHNY UVEDENÉ CENY JSOU BEZ DPH!

Pozn. - Instalace bude provedena podle skutečné doby pronájmu a skutečně použitého materiálu.

Rozbor ceny

Položka	R1	Zřízení provizorních BUS zastávek s dřevěnými nástupišti - materiál, montáž, demontáž, doprava
TOV	01	verze 1 MJ/ks

H	Přímý materiál		16561,50
NC	z toho nákupní cena		16238,50
D	z toho doprava		323,00
M	Mzdové náklady		7959,60
P	z toho přímé mzdy		5940,00
O	odvody 34,0 % z mezd		2019,60
S	stroje		0,00
T	Ostatní přímé náklady		0,00
SUB	Pododávky		0,00
PZN	Přímé zpracovací náklady $[M] + [S] + [T]$		7 959,60
	Přímé náklady $[H] + [SUB] + [PZN] + [NK]$		24 521,10
R1	Režie 1 5,00 % z $[NC] + [D] + [P] + [O] + [S] + [T]$		1226,06
R2	Režie 2 5,00 % z $[NC] + [D] + [P] + [O] + [S] + [T]$		1226,06
R3	Režie 3 0,00 % z []		0,00
	Neprímé náklady $[R1] + [R2] + [R3]$		2 452,11
	Náklady celkem $[H] + [SUB] + [PZN] + [R1] + [R2] + [R3] + [NK]$		26 973,21
Z	Zisk 5,00 % z $[NC] + [D] + [P] + [O] + [S] + [T]$		1226,06
R4	Režie 4 0,00 % z []		0,00
NK	Nekalkulované náklady		0,00
	Celkem $[H] + [SUB] + [PZN] + [NK]$		28 199,27
	Jednotková cena		28 199,27
	Hodnota		0,69500
	Normohodiny		40,000

P.Č.	T	Kód položky		MJ	Množství	Jednotková cena	Celkem
1	M	60512135	hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 do dle 6m	m3	0,40000	8 970,00	3 588,000
2	M	60510100	řezivo smrkové sošené tl 30mm	m3	1,35000	9 810,00	12 973,500
			Materiály				
4	P	713000-S2-T2	Řemeslník	hh	40,00000	146,50	5 940,000
			Mezdy				

DUDA, Vít (SGCZE)

Od:
Odesláno: čtvrtek 12. srpna 2021 21:03
Komu: DUDA, Vít (SGCZE)
Předmět: Re: Poptávka výroby dřevěných nástupišť - Stará Boleslav

Message sent from internet with bonzabusch@seznam.cz email address.

Security warning: Do not click on the links or attachments contained in this message unless you are sure of the sender's address.

Dobrý den, dle dohody posílám cenovou kalkulaci na 2 ks provizorních zastávek.
Při dnešních cenách dřeva, kdy na celou zakázku bude třeba 4,5m³ řeziva je celková cena za dřevo 39000Kč + spojovací materiál cca 3000Kč + náklady na dopravu a manipulaci 4000Kč + náklady na provoz dílny 3000Kč + výroba 3x osoba x 30 hodin = 36000Kč.
Celková cena za obě zastávky je 85.000Kč

Jak nevím jestli o to budete mít zájem.
Pokud ano volejte. Požadovaný termín jsme schopni dodržet.

S pozdravem Jan Busch Truhlářství
Tel.

----- Původní zpráva -----

Od: DUDA, Vít (SGCZE)
Datum: 10.08.2021 11:39:18
Předmět: Poptávka výroby dřevěných nástupišť - Stará Boleslav

Dobrý den,

na akci Stará Boleslav – oprava silnice Vestecká u Vás poptávám dodání 2 ks dřevěných autobusových nástupišť délky 18m + nájezdová rampa délky 2 m, šířky 2 m. Výška nástupiště je 16 cm. Jedná se o provizorní řešení nástupiště během výstavby a zajištění bezbariérového přístupu po dobu cca 2 měsíců. V případě, že o akci nemáte zájem, prosím o informaci.

Termín dodání výrobku: 7-10 dní od objednání.

Děkuji za CN do konce týdne.

DUDA, Vít (SGCZE)

Od: truhlarstvi@stamfest.cz
Odesláno: středa 11. srpna 2021 16:16
Komu: DUDA, Vít (SGCZE)
Předmět: RE: Poptávka výroby dřevěných nástupišť - Stará Boleslav

Message sent from Internet with truhlarstvi@stamfest.cz email address

Security warning: Do not click on the links or attachments contained in this message unless you are sure of the sender's address.

Dobrý den, pane Dudo,

zakázku bychom byli schopni realizovat až během října.

Pěkný den
Kateřina Tintěrová

Truhlářství Štamfest

<http://stamfest.cz>

From: DUDA, Vít (SGCZE)
Sent: Tuesday, August 10, 2021 11:39 AM
Subject: Poptávka výroby dřevěných nástupišť - Stará Boleslav

Dobrý den,
na akci Stará Boleslav – oprava silnice Vestecká u Vás poptávám dodání 2 ks dřevěných autobusových nástupišť délky 18m + nájezdová rampa délky 2 m, šířky 2 m. Výška nástupiště je 16 cm. Jedná se o provizorní řešení nástupiště během výstavby a zajištění bezbariérového přístupu po dobu cca 2 měsíců. V případě, že o akci nemáte zájem, prosím o informaci.
Termín dodání výrobku: 7-10 dní od objednání.

Děkuji za CN do konce týdne.
S pozdravem a přáním pěkného dne.



Ing. Vít Duda
Výrobní příprava staveb

COLAS CZ
Divize silničních staveb, region Praha
Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9
Adresa provozu Lom a obalovna Čenkov
K lomu bez č.p., 25070 Odolena Voda
> www.colas.cz

Tento e-mail včetně jeho příloh je určen výhradně pro potřeby jeho adresáta a může obsahovat důvěrné informace. Neoprávněné šíření, úpravy nebo zpřístupnění jeho obsahu je zakázáno. Pokud Vám byl doručen omylem, prosím informujte o tom e-mailem odesílatele a tuto zprávu vymažte ze systému.

Odesílatel neodpovídá za chyby či ztráty obsahu této zprávy vzniklé v důsledku komunikace prostřednictvím e-mailu.

Rozbor ceny

Položka	R2	Náklady pro dokončení stavby (mechanizace, doprava, pracovníci, THP)	
TOV	01	verze 1	MJ/dm

H	Přímý materiál		0,00
NC	z toho nákupní cena		0,00
D	z toho doprava		0,00
M	Mzdové náklady		20426,96
P	z toho přímé mzdy		15244,00
O	odvody 34,0 % z mezd		6182,96
S	Stroje		56978,00
T	Ostatní přímé náklady		0,00
SUB	Pododávky		0,00

PZN Přímé zpracovací náklady $[M] + [S] + [T]$ 77 404,96

Přímé náklady $[H] + [SUB] + [PZN] + [NK]$ 77 404,96

R1	Výrobní režie 5,00 % z $[NC] + [D] + [P] + [O] + [S] + [T]$		3870,25
R2	Správní režie 5,00 % z $[NC] + [D] + [P] + [O] + [S] + [T]$		3870,25
R3	Režie 3 0,00 % z $[\]$		0,00

Nepřímé náklady $[R1] + [R2] + [R3]$ 7 740,50

Náklady celkem $[H] + [SUB] + [PZN] + [R1] + [R2] + [R3] + [NK]$ 85 145,46

Z	Zisk 5,00 % z $[NC] + [D] + [P] + [O] + [S] + [T]$		3870,25
R4	Režie 4 0,00 % z $[\]$		0,00
NK	Nekalkulované náklady		0,00

Celkem $[H] + [SUB] + [PZN] + [R1] + [R2] + [R3] + [Z] + [R4] + [NK]$ 89 015,70

Jednotková cena 89 015,70

Hmotnost 0,00000

Normohodiny 70,000

P.Č.	T.	Kód položky		MJ	Množství	Jednotková cena	Celkem
1	P	310000-55-T4	Technik	Nh	10,00000	347,80	3 478,000
2	P	712000-55-T2	Dělník	Nh	50,00000	190,20	9 510,000
3	P	712000-55-T3	Dělník	Nh	10,00000	225,60	2 256,000
Mzdy							
5	S	101010011300	Kotlové rypačko výkon 99 kW objem lopaty 1,00 m³	Sh	10,00000	1 660,00	16 600,000
6	S	106020011100	Válec vibrační motorový s běhounem Nádým life zářku 1,7 m hmotnost 10,38 t	Sh	8,00000	910,00	7 280,000
7	S	110010001000	Nakladač lopatový 112 kW objem lopaty 1,4 m³	Sh	10,00000	905,00	9 050,000
8	S	301030051200A	Nákladní automobil sklápěč 302 kW nosnost 25 t	Sh	20,00000	1 200,00	24 000,000
Stroje							

Rozbor ceny

Položka R3	Náklady na polštářku astatových směsí	
TOV 01	verze 1	MJ den

H	Přímý materiál		0,00
NC	z toho nákupní cena		0,00
D	z toho doprava		0,00
M	Mzdové náklady		16289,04
P	z toho přímé náklady		12156,00
O	odvody 34,0 % z mezd		4133,04
S	Stroje		88644,00
T	Ostatní přímé náklady		0,00
SUB	Poddotávky		0,00
PZN	Přímé zpracovací náklady	$[M] + [S] + [T]$	104 933,04
	Přímé náklady	$[H] + [SUB] + [PZN] + [NK]$	104 933,04
R1	Společné režie	$5,00 \% z [NC] + [D] + [P] + [O] + [S] + [T]$	5248,65
R2	Výrobní režie	$5,00 \% z [NC] + [D] + [P] + [O] + [S] + [T]$	5248,65
R3	Režie 3	$0,00 \% z []$	0,00
	Nepřímé náklady	$[R1] + [R2] + [R3]$	10 497,30
	Náklady celkem	$[H] + [SUB] + [PZN] + [R1] + [R2] + [R3] + [NK]$	115 426,34
Z	Zisk	$5,00 \% z [NC] + [D] + [P] + [O] + [S] + [T]$	5248,65
R4	Režie 4	$0,00 \% z []$	0,00
NK	Nekalkulované náklady		0,00
	Celkem	$[H] + [SUB] + [PZN] + [R4]$	120 673,00
	Jednotková cena		120 673,00

Hmotnost	0,00000
Normohodiny	60,000

P.Č.	T	Kód položky		MJ	Množství	Jednotková cena	Celkem
1	P	712000-53-73	Dělník	Nh	60,00000	202,60	12 156,000
			Mady				
3	S	106020013100	Válec vibrační statický s běhounem hladkým šlfe záběru 1,6 m hmotnost 10 t	Sh	24,00000	600,00	14 544,000
4	S	113030011500	Fašer živých směsí šlfe záběru 3 - 7,5 m	Sh	10,00000	1 650,00	16 500,000
5	S	301030001200A	Nákladní automobil sklápěč 300 kW nosnost 25 t	Sh	48,00000	1 200,00	57 600,000
			Stroje				


Rozbor ceny

Položka	R4	Náklady na řízení (pronájem + doprava+pracovníci)		
TOV	01	verze 1	MJ	den

H	Přímý materiál				0,00
NC	z toho nákupní cena				0,00
D	z toho doprava				0,00
M	Mzdové náklady				16289,04
P	z toho přímé mzdy				12156,00
O	odvody	34,0 % z mezd			4133,04
S	Stroje				106910,00
T	Ostatní přímé náklady				0,00
SUB	Poddodávky				0,00
PZN	Přímé zpracovací náklady	[M] + [S] + [T]			123 199,04
	Přímé náklady	[H] + [SUB] + [PZN] + [NK]			123 199,04
R1	Výrobní režie	5,00 % z [NC]+[D]+[P]+[O]+[S]+[T]			6159,95
R2	Správní režie	5,00 % z [NC]+[D]+[P]+[O]+[S]+[T]			6159,95
R3	Režie 3	0,00 % z []			0,00
	Nepřímé náklady	[R1] + [R2] + [R3]			12 319,90
	Náklady celkem	[H] + [SUB] + [PZN] + [R1] + [R2] + [R3] + [NK]			135 518,94
Z	Zisk	5,00 % z [NC]+[D]+[P]+[O]+[S]+[T]			6159,95
R4	Režie 4	0,00 % z []			0,00
NK	Nekalkulované náklady				0,00
	Celkem	[H] + [SUB] + [PZN] + [R4]			141 678,90
	Jednotková cena				141 678,90
	Hmotnost				0,00000
	Normohodiny				60,000

P.Č.	T	Kód položky		MJ	Množství	Jednotková cena	Celkem
1	P	712000-53-T3	Dělník	Nh	80,00000	202,60	12 156,000
			Mzdy				
3	S	113010011300	Žvičná fríza výkon 297 kW šířka záběru 2010 mm tl.vrstvy 300 mm	Sh	10,00000	5 320,00	53 200,000
4	S	301030051200A	Nákladní automobil sklápěč 302 kW nosnost 25 t	Sh	40,00000	1 200,00	48 000,000
5	S	304040011100	Zametací vůz s vysavačem výkon 1600 m3/h	Sh	10,00000	571,00	5 710,000
			Stroje				

SITUACE - 6. ETAPA

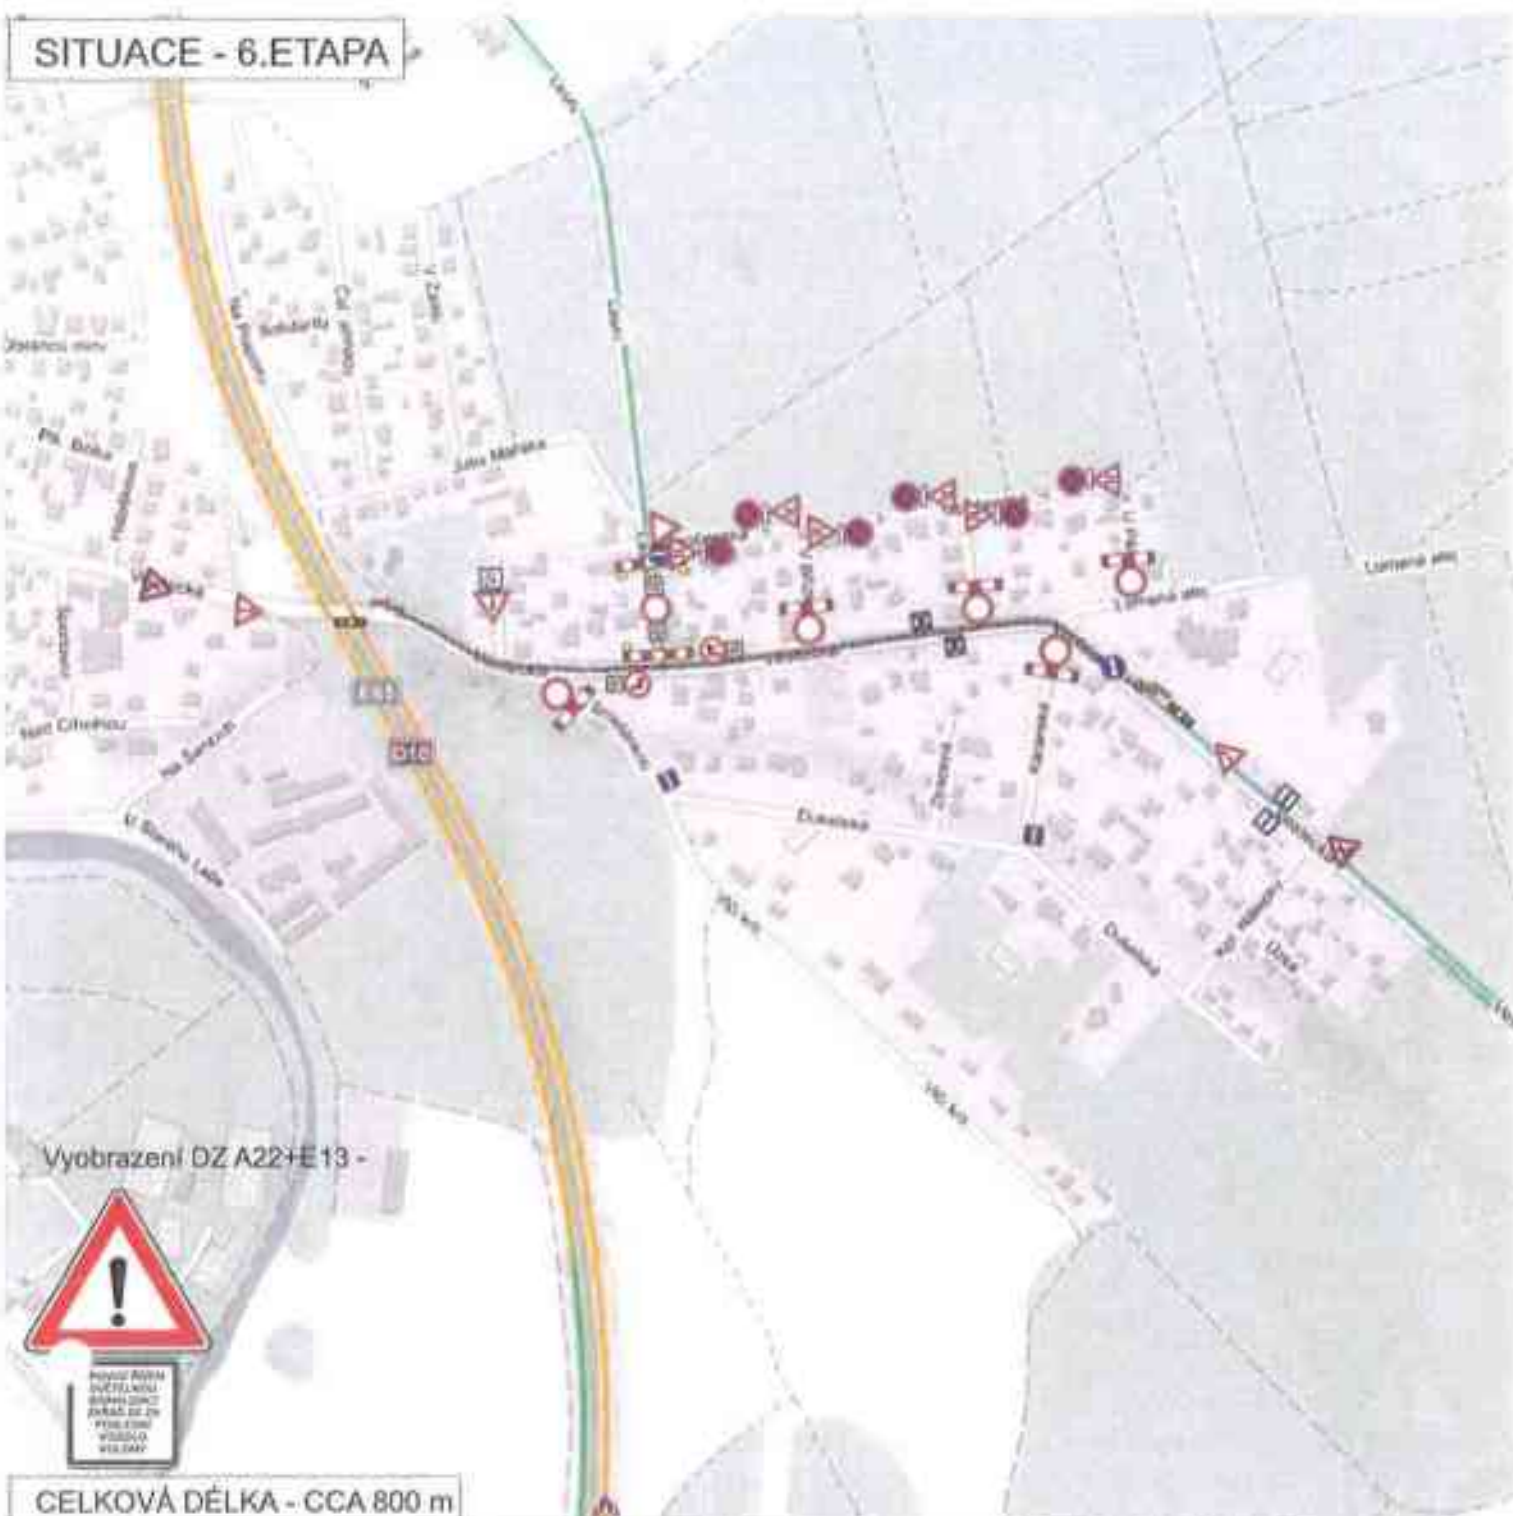

Vyobrazení DZ A22+E13 -



CELKOVÁ DĚLKA - CCA 800 m

TRVALÉ SVISLÉ DZ, KTERÉ BUDE V ROZPORU S PŘECHODNOU ÚPRAVOU BUDE DOČASNĚ ZAKRYTO
DZ B28+E13 (DATUM) BUDOU UMÍSTĚNY MIN. 7 KALENDÁRNÍCH DNŮ PŘED ZAČÁTKEM STAVBY

STARÁ BOLESLAV - SILNICE III/2451 ULICE OKRUŽNÍ A VESTECKÁ

ZHOTOVITEL: COLAS CZ, a.s.
Rupelka 215/1, 190 00 Praha 9
IČO: 30234443
web: colas.cz - Petr Žaloudka - starývozdci@colas.cz

NÁZEV STAVBY:
REKONSTRUKCE POVRCHU KOMUNIKACE

PROJEKT: PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - SITUACE

Datum vydání stavby: 2021

Datum schválení stavby: 2021

POLICIE ČR, dopravní inspektorát Vlastník komunikace:


Datum vyhotovení projektu: 04 / 2021

NAVŘÍHOVAL:
DOPRAVNÍ ZNAČENÍ MĚLNÍK s.r.o.



DOPRAVNÍ ZNAČENÍ MĚLNÍK s.r.o.
Trčárská 908
Mělník 27501
tel: 323 64 100, 323 64 101
fax: 323 64 102
e-mail: info@dmz.cz
www.dz.cz

SITUACE - 6. ETAPA

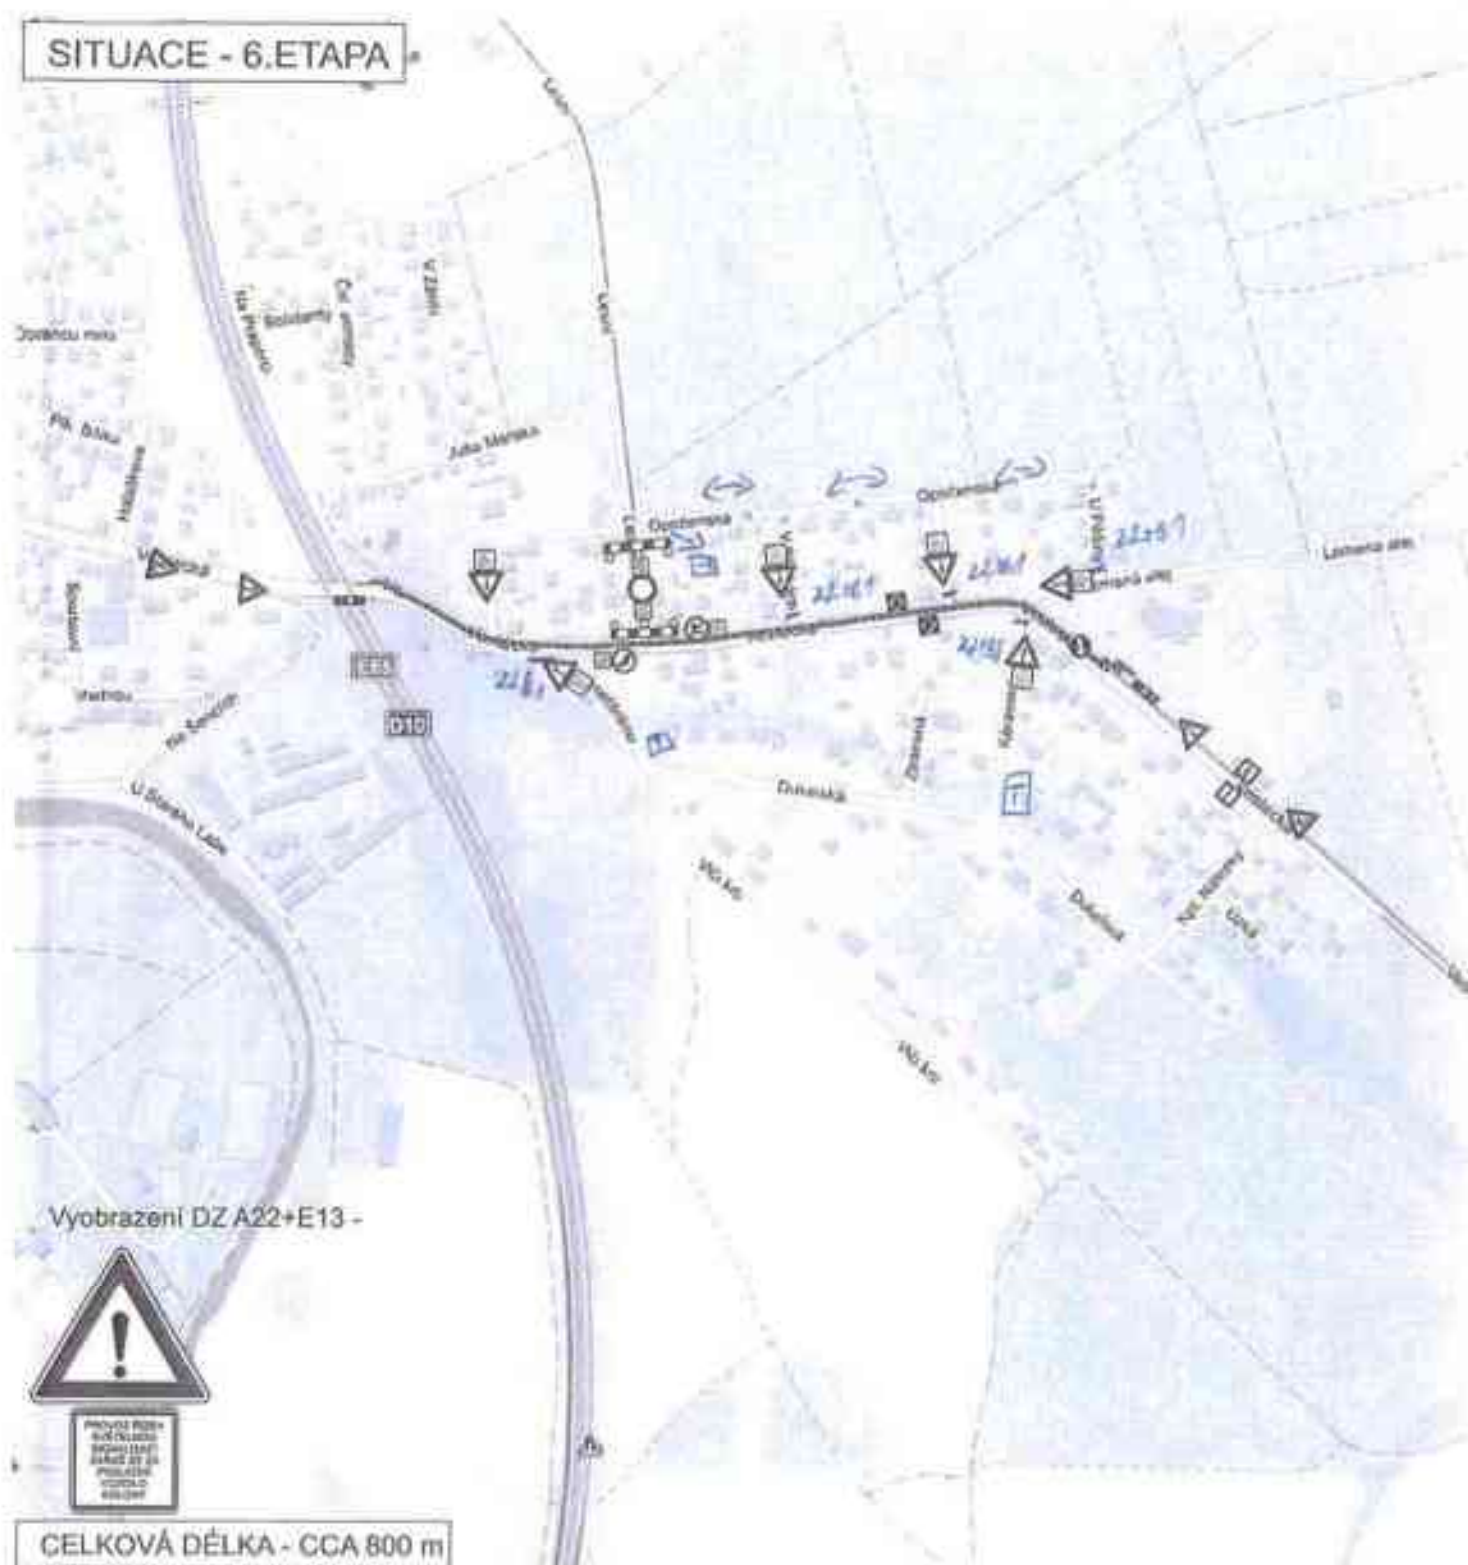

STARÁ BOLESLAV - SILNICE III/2451 ULICE OKRUŽNÍ A VESTECKÁ

ZHOTOVITEL: COLAS CZ a.s.
Růžkova 210/1, 130 00 Praha 8
IČO - 10334843
odpovědný - Petr Zákostel - starobylveducelitel 730 780 100

NÁZEV STAVBY:
REKONSTRUKCE POVRCHU KOMUNIKACE

PROJEKT: PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - SITUACE

Plánová poloha stavby: 2021

Stavba akce/části stavby: 2021

POLICIE ČR, dopravní inspektorát Vlastník komunikace:

Stavba vypracování projektu: 04 / 2021



POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE
STŘEDOČESKÉHO KRAJE

NAVRHOVAL:
DOPRAVNÍ ZNAČENÍ MĚLNÍK s.r.o.

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ MĚLNÍK s.r.o.
Trutavská 108
146 00 Praha 4
IČO: 250 000 000
Fiktivní adresa
e-mail: info@dmelnik.cz
www.dmelnik.cz

30. 4. 2021 por. J.

**COLAS CZ a.s.
Rubeška 215/1
190 00, Praha 9**

Kód akce/ značkovací číslo

Název projektu

3035/21/KSUS/MHT/PEC

Vytváječ/telefon

Pecka/ 736623713

Datum

3.5.2021

Vyjádření k žádosti ke stanovení přechodné úpravy silničního provozu, o vyjádření ke zvláštnímu užívání a k částečné a úplné uzavírcce komunikace při akci :
„ III/2451 Stará Boleslav“

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje **souhlasí** s částečnou a úplnou uzavírkou, s přechodnou úpravou provozu v termínu **od 7.6.2021 do 31.7.2021 (6 etap)** a s návrhem DIO (z důvodu zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu při výše uvedené stavbě) a s vedením objízdných tras pro výše uvedenou akci.

Dotčené silnice: Stará Boleslav – silnice III/2451 ulice Okružní a Vestecká

Termíny uzavírek:

I.etapa: termín 7.6 – 4.7.2021 – úplná uzavírka

II.etapa: termín 7.6 – 20.6.2021 – částečná uzavírka

III.etapa: termín 21.6 – 4.7.2021 – částečná uzavírka

IV.etapa: termín 5.7 – 25.7.2021 – úplná uzavírka

V.etapa: termín 5.7 – 18.7.2021 – částečná uzavírka

VI.etapa: termín 26.7 – 31.7.2021 – částečná uzavírka

Objízdná trasa:

I.etapa – po silnici II/610 ulice Boleslavská a místní komunikaci ul. Lesní – obousměrně

IV.etapa - po silnici II/610 ulice Boleslavská a místní komunikaci ul. Lesní – obousměrně



*Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11*

Dopravní značení bude schválené Policií ČR, přechodnou úpravu provozu na silnici Vám stanoví odbor dopravy MěÚ Brandýs nad Labem – Stará Boleslav.

Investor akce: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Zhotovitel: COLAS CZ a.s., Rubežka 215/1, 190 00 Praha 9

Odpovědná osoba: Petr Žaloudek, tel.: 733780105

S pozdravem

Lenka Chmelová
vedoucí TSÚ - oblast Mnichovo Hradiště



Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Masarykovo náměstí 1/6
250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav



Odbor dopravy

Váš dopis č.:

Ze dne:

Naše č. j.: MÚBNLSB-OD-49331/2021-MASPE COLAS CZ, a.s. IČ 26177005

Naše sp. zn.: OD-13950/2021-MASPE Rubeška č. p. 215/1

190 00 PRAHA 9

Vyřizuje: Petra Mašková

Tel.:

E-mail:

Datum: 24.05.2021

Veřejná vyhláška

Opatření obecné povahy

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, odbor dopravy, pracoviště Stará Boleslav, jako příslušný orgán státní správy ve věcech provozu na pozemních komunikacích podle ust. § 124 odst. 6) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“) pro stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

na základě žádosti podané dne 10.05.2021 společnost COLAS CZ, a.s., IČ: 10234843 se sídlem Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 (dále jen „žadatel“), podle ust. § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) rozhodl podle ust. § 77 zákona o silničním provozu

o stanovení přechodné úpravy silničního provozu na

silnici č. III/2451 ul. Okružní a ul. Vestecká a okolní místní komunikace, viz DIO vše v k.ú. Stará Boleslav, v rámci akce „Stará Boleslav – silnice III/2451 ul. Okružní a Vestecká“,

spočívající v umístění dopravního značení a zařízení v rozsahu dle předloženého a odsouhlaseného DIO Policií ČR Krajské ředitelství SK, DI úo Praha-venkov-východ č.j. KRPS-98140-1/ČJ-2021-011506 ze dne 30.04.2021, které je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy.

Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:

- Termín přechodné úpravy provozu: od 07.06. – 31.07.2021 (dle etap)
- Dopravní značení bude umístěno a instalováno dle schváleného DIO Policií ČR Krajské ředitelství SK, DI úo Praha-venkov-východ.

- Dopravní značení bude provedeno v souladu se zásadami pro dopravní značení na pozemních komunikacích TP 66, Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích, vydané Centrem dopravního výzkumu v Brně.
- Dopravní značení musí provedením odpovídat vyhlášce č. 294/2015 Sb., a zákonu o silničním provozu.
- Dopravní značení, které je v rozporu s touto přechodnou úpravou silničního provozu bude zakryto.
- Dopravní značení musí být upevněno na kovových sloupcích nebo případně na sloupech veřejného osvětlení. Musí být provedeno dle příslušné ČSN EN 12899-1 a musí být z retroreflexního materiálu. Dopravní značení včetně nosičů a spojovacích součástí musí být schváleno Ministerstvem dopravy ČR.
- Dopravní značení bude rozmístěno odbornou firmou, která má platná oprávnění k výkonu této činnosti a to do zahájení stavebních prací.
- Osoby, které se budou pohybovat na komunikacích, jsou povinny nosit výstražné oblečení.
- Na místě stavebních prací bude dostatečný počet poučených osob schopných v případě potřeby, řídit silniční provoz.

Odůvodnění

Na základě žádosti podané dne 10.05.2021 žadatelem o stanovení přechodné úpravy silničního provozu, viz DIO z důvodu uzavření silnice č. III/2451 v k.ú. Stará Boleslav a k.ú. Nový Vestec, bylo podle ust. § 171 správního řádu zahájeno řízení, na základě kterého se vydává opatření obecné povahy.

K žádosti o stanovení přechodné úpravy silničního provozu bylo předloženo DIO, které bylo projednáno s Policií ČR Krajské ředitelství SK, DI úo Praha-venkov-východ, jako dotčeným orgánem dle ust. § 77 odst. 2 písm. b) zákona o silničním provozu.

V souladu s ust. § 173 odst. 1 správního řádu a podle ust. § 77 odst. 4) a 5) zákona o silničním provozu se proto stanovuje přechodná úprava silničního provozu, z důvodu provádění stavebních prací, dle předloženého a odsouhlaseného DIO, které je nedílnou součástí tohoto opatření.

Poučení

Proti stanovení přechodné úpravy provozu formou opatření obecné povahy nelze dle ust. § 173 odst. 2) správního řádu podat opravný prostředek.

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení této veřejné vyhlášky.

Podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES Vám oznamujeme, že na základě plnění úkolů, které nám ukládají právní předpisy, shromažďujeme a dále zpracováváme Vaše osobní údaje za účelem výkonu agendy silničního správního úřadu a speciálního stavebního úřadu. Blíže informace naleznete na stránkách <http://www.brandysko.cz/>.

[otisk úředního razítka]

Petra Mašková, v.r.
referent odboru dopravy

Příloha: situace (originál k nahlédnutí na MěÚ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Odbor dopravy, pracoviště Stará Boleslav, Mariánské náměstí 28, kancelář č. 111)

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno na úřední desce MěÚ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, OÚ Nový Vestec a OÚ Káraný po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Vývěsní lhůta začíná den následující po dni vyvěšení. Sejmutí vyhlášky je možno následující pracovní den po posledním (patnáctém) dni vývěsní lhůty.

Pisemnost /nebo oznámení/ se zveřejňuje též způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Právní účinky doručení má výhradně doručení veřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední desky MěÚ Brandýs n.L. – St. Boleslav.

Obdrželi:

- COLAS CZ, a.s.; IDDS: 4indfqd
- Středočeský kraj
 - o v zastoupení Krajská správa a údržba silnic Středočeský kraj; IDDS: a6ejgm
- Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav; IDDS: c5hb7xy
- Obec Nový Vestec; IDDS: 3xgb792
- Obec Káraný; IDDS: jkeas36

Dotčené orgány:

- Policie ČR DI Praha venkov-VÝCHOD; IDDS: 2dtai5u

K vyvěšení na úřední desce:

- MěÚ Brandýs n.L. – St. Boleslav
- Obec Nový Vestec
- Obec Káraný

Datum:

Zápis zhotovitele

4.6.2021

Dnešního dne proběhlo předání staveniště mezi investorem a samostatný zápis

Pondělí

Dnešního dne proběhlo shodnutí předání BOP pro stavbu a seznámení s úzkými viz samostatný protokol

Dle požadavků investora budou nové betonové sil. obrazy osazeny:

- 1) do stejné výšky jako stávající
- 2) v místech kde stávající obrazy nejsou budou v max. míře osazeny do stejné výšky a obrysem vstupu, aby bylo umožněno zavážení vody z komunity do příslušné zeleně podél komunikace z tohoto důvodu je nutné výtěr kabele IS

T. Pecka

Dle požadavků Ředitel a PCR stavba rozdělenská opatření zadání dle 6 etap viz schválené DÚ

Pozadí: Polojasno - 11°C - 20°C

Přes den: 6⁰⁰ - 17⁰⁰ přibližně 11⁰⁰ - 12⁰⁰

Pracovníci: 1 THP Zábudka

2 stávající

6 dělníků viz školní BOP

Subdodavatelé: DZ Melník, Dřev, Nohy, Aton, Dř. doprava, Skel

Stroje: Auto a HR, traktor, kotlík, nakladač, 1x Ghol, 1x Bhol

Plán: - Montáž Dív. etapa 1 + 2

- Montáž zařízení staveniště

- Obrazení povrchových povrchových znaků

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

COLAS a.s.
Rubeška 215/1
190 00 Praha 9

Váš dopis značky: / ze dne:

Naše značka:
/21/KSUS/MHT/Pec

Vytiskuje/telefon:
Pecka/736623713

Praha

Věc : „III/2451 – Stará Boleslav“ – Pokyn (ZBV č. 1)

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje jako správce a zároveň zástupce Středočeského kraje jako vlastníka nemovitostí, tj. předmětné komunikace č. III/2451, Vám tímto v souladu s článkem 6.8. smlouvy o dílo č. S-383/00066001/2021 vydává **Pokyn** k zajištění technického řešení a pokračování ve výše zmíněné akci při zpracování změn během výstavby na stavebním objektu:

III/2451 – Stará Boleslav

Na základě Oznámení zhotovitele o vhodnosti změny :

- navýšení počtu etap na 6, (zvýšení nákladů na dodatečné nájezdy techniky (např. fréza, finišer a náklady na pracovníky) – návaznost na navýšení počtu etap (rozřazování stavby na menší celky)
- zřízení 2 provizorních BUS zastávek
- oprava výtluků v rámci objíždné trasy autobusů

vydáváme tímto pokyn k provedení těchto úprav a ke zpracování ZBV

Rozsah změn během výstavby bude stanoven na základě skutečného zaměření stavby nebo správcem schválené realizační dokumentace.

Cenově musí změnu posoudit příslušné majetkové oddělení objednatele.

S pozdravem

 Lenka Chmelová
Vedoucí oddělení Mníchovo Hradiště

Naše značka: 478/21/KB
Vyřizuje: Bakeš / tel.
Datum: 3. května 2021

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ MĚLNÍK s.r.o.


Libor Petřina
Truhlářská 998
276 01 Mělník

Vyjádření ke stanovení přechodné úpravy silničního provozu a vyjádření k úplné uzavírci pro akci „Rekonstrukce povrchu komunikace silnice č. III/2451 – ul. Okružní a Vestecká ve Staré Boleslavi“

ROPID souhlasí s realizací na základě předložené dokumentace a provedeního místního šetření za následujících podmínek:

- Uvedeným úsekem silnice III/2451 ve Staré Boleslavi je vedena autobusová linka PID 666.
- Linka bude při úplné uzavírci (1. a 4. etapa) odkloněna obousměrně po trase Boleslavská (II/610) – MK 5. května – MK Lesní – Vestecká (III/2451).
- Po dobu trvání uzavírky budou bez náhrady zrušeny ve Staré Boleslavi zastávky „Škola“ a „Sokolovská“. Náhradou bude zřízena zastávka „Sídliště“ v pravidelné zastávce v ulici Boleslavská (II/610).
- V 5. a 6. etapě bude přemístěna zastávka Vosí hnízdo mimo úsek řízený SSZ k vybudovaným provizorním nástupišťům dle předloženého návrhu DIO.
- Požadujeme v maximální míře zkrátit dobu provozu trojcestného SSZ v 5. etapě.
- Požadujeme zajistit dostatečný prostor pro odbočení autobusu v křižovatce Vestecká x Lesní při souběhu 4. a 5. etapy.
- Termíny jednotlivých etap bereme na vědomí.
- V případě změny termínu jednotlivých etap nebo rozsahu uzavírky je nutné neprodleně informovat ROPID.
- Požadujeme doručit DIR nejméně 7 dnů před konáním této akce.

S pozdravem


Ing. Jiří Vyčítal

vedoucí odboru příměstské dopravy



Převzaté z přílohy

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE

Územní odbor Praha venkov - VÝCHOD
Dopravní inspektorát

Č. j. KRPS-98140-1/ČJ-2021-011506

Praha 30. dubna 2021

Počet stran: 2

Přílohy: 1/9

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ MĚLNÍK s.r.o.
Truhlářská 998
276 01 Mělník

Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, rekonstrukce ul. Okružní a ul. Vestecká - stanovisko.

Dopravní inspektorát Praha venkov - VÝCHOD, Policie České republiky vydává na základě ustanovení § 25 odst. 1) zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění později vydaných předpisů, souhlasné stanovisko se zvláštním užíváním silnice č. III/2451 ul. Okružní a ul. Vestecká v k.ú. Stará Boleslav, podle § 25 odst. 6) písm. c) zák. č. 13/1997 Sb., z důvodu rekonstrukce komunikace.

Rovněž vydává vyjádření na základě ustanovení § 77 odst. 2 písm. b) a odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a na základě ustanovení § 24 odst. 2 písm. d) zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění později vydaných předpisů a **souhlasí s** umístěním přechodného dopravního značení a dopravního zařízení na silnici č. III/2451 ul. Okružní a ul. Vestecká v k.ú. Stará Boleslav a na objízdné trase sil. č. II/610 ul. Boleslavská, místní komunikaci ul. 5. května, ul. Lesní, a přilehlých místních komunikacích v k.ú. Stará Boleslav z důvodu rekonstrukce silnice č. III/2451 za dodržení následujících podmínek:

- dopravní značky musí být rozměrem a barevným provedením v souladu s vyhl. č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,
- otevřené výkopy musí být řádně označeny, zajištěny proti pádu chodců a za snížené viditelnosti osvětleny,
- dopravní značení, které je v rozporu s přechodnou úpravou provozu bude zakryto,
- dopravní značení musí být osazeno podle zásad pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích - TP 66 (II. vydání),

Mladoboleslavská 38
190 17 Praha 9, VinohTel.:
E-ma
ID D:

www.mvcr.cz

- v etapě č. 2 doporučujeme uzavřít ul. Kpt. Nálepky - aby vozidla nevjížděla do prostoru mezi SSZ,
- v etapě č. 5 doporučujeme zvážit zobousměrnění ul. Opočenská, aby nemusela vozidla vjíždět mezi do úseku řízeného SSZ a z ul. U Pěšiny udělat slepou pozemní komunikaci,
- v etapě č. 6 ponechat zobousměrnění ul. Opočenská (aby si tudy řidiči nezkracovali cestu) - ul. Lesní bude zavřená a ul. Opočenská je obytnou zónou, kde nadbytečná průjezdní doprava není žádoucí, zneprůjezdnit ul. Nad Smetankou a ul. Káranská,
- po ukončení akce musí být povrch uveden do řádného stavu a dopravní značky užití na akci ihned odstraněny.

Návrh užití a umístění dopravních značek (viz Příloha 1. etapa, 1. etapa širší vztahy, 2. etapa, 3. etapa, 4. etapa, 4. etapa širší vztahy, 5. etapa, 6. etapa a 6. etapa širší vztahy) je v souladu se zásadami pro dopravní značení na pozemních komunikacích

Vyřizuje:

por. Mgr. Lucie Hanousková
tlf.

npor. Bc. Josef Vrtiška
vedoucí oddělení

SUBSTITUČNÍ PLNÁ MOC

Ing. Pavel Keller

Ředitel oblasti Sever

Datum narození:

bytem I

v souladu s plnou mocí ze dne 15.12.2020, která mu byla udělena zmocnitelem společnosti COLAS CZ, a.s., IČO: 261 770 05, se sídlem Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556 (dále jen „Společnost“) tímto dále zmocňuje

Pavla Lněničku

Manažera regionu Praha

Datum narození:

bytem

(dále jen „Zmocněnec“)

k zastupování Společnosti dle bodu g) přiložené plné moci k ukončení stavební akce a k projednání změn během výstavby na akci III/2451 Stará Boleslav.

Tato plná moc je platná do 30.6.2022

V Praze, dne 15.11.2021

Ing. Pavel Keller

Zmocnění v celém rozsahu přijímám.

Pavel Lněnička

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby: III/2451 - Stará Boleslav Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101 - Komunikace	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 101/2	Číslo ZBV: 2
---	--	---------------------

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001

Zhotovitel: Colas CZ, a.s.
Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9
IČ: 26177005

Rekapitulace ZBV č. 2 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

Část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.1	0,00	0,00	0,00
Část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.2	0,00	0,00	0,00
Část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.3	-798 475,48	494 443,88	-304 031,60
Část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.4	0,00	297 402,42	297 402,42
Část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.5	0,00	0,00	0,00
Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2	-798 475,48	791 846,30	-6 629,18

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré:

1

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: 88/2431 - Stará Bulestava Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101 - Komunikace	Číslo SO/PS / Číslo Změny SO/PS: 101/2	Číslo ZBV: 2.3
---	--	-------------------

Strany smlouvy o dílo objednatel č. 5-383/0006655/0021 a zhotovitel č. 201213087 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 1.3.2021 (dále jen Smlouva).

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 160 00 Praha 6, Smíchov

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s., Rubčůvka 215/1, 190 00 Praha 9, Vysočany

Přílohy Změnového listu:	Paré č.	Příjemce
1. Krycí list	1, 2	Objednatel
2. Změnový list	3	Zhotovitel
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	4	Stavební dozor
4. Rozpis ocenění Změn položek ZBV 2		
5. Přehled zářezů změn do skupin		
6. Přehled dalších dokladů		
Další doklady dle přehledu dokladů	42	počet listů

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Díličí změna 1: Změna rozsahu a konstrukce sanací podkladních vrstev

Zadávací dokumentace předpokládala odhrazování 2 vrstev asfaltového betonu tvořící kryt vozovky a likvidaci sanací zbývajících nemovitostí podkladu vrstvou ACP 16+ nebo 16S v tl. 60 mm.

Po odhrazování asfaltového krytu a odstranění stávající podkladní vrstvy až na úroveň, na kterou má být pokládána vrstva ACP 16+ nebo 16S, byl stále zjištěn nevhodný stav podkladních vrstev - nebyla zde zjištěna řádná soudržná vrstva asfaltového betonu.

Z tohoto důvodu nebyla prováděna ani sanace vrstvou ACP 16+ a na základě dohody s objednatelům byla změněna technologie provádění sanací (viz doklad č. 09 - zápis ve SD ze dne 9.8.2021, list č. 03, 08, 09, 13 a 14). Sanace byly prováděny do hloubky 0,3 m ze vrstvou ze SD č. 15B mm a v kritických místech (lokální oblasti s větším namáháním) byla sanace provedena vrstvou ze SD č. 15B mm + vrstvou SD C 8/10 tl. 150 mm.

Díličí změna 1 je vyjádřena položkou č. 15, 16, 16, 26 a 45 a zvyšuje smluvní cenu stavby o 182 651,37 Kč.

Díličí změna 2: Likvidace nebezpečných odpadů

V rámci zpracování projektové dokumentace bylo uvažováno s výskytem asfaltových směsí obsahující dehet a s jejich následnou likvidací.

Během realizace stavby byly provedeny ekologické zkoušky asfaltové vrstvy určené k odhrazování a přítomnost dehtu nebyla zjištěna (viz doklad č. 11 - Protokoly o zkoušce asfaltu - P2021_3705 a P2021_3706).

Z tohoto důvodu nebyla nutná provádění likvidaci nebezpečného odpadu obsahující dehet.

Díličí změna 2 je vyjádřena položkou č. 3 (byla zcela odečtena) a snižuje smluvní cenu stavby o 98 478,40 Kč.

Díličí změna 3: Snižování hloubky frézování v estřavilánu

Předpokladem zadávací dokumentace bylo frézování na celém prováděném úseku v tl. 12 cm.

Při podřízení navržené hloubky frézování 12 cm v estřavilánové části docházelo k narušení podkladní vrstvy komunikace - odstranění nestmelených vrstev tl. 63 mm (Dmae cca 63 mm).

Po dohodě s objednatelům bylo v tomto úseku odsouhlaseno snížení hloubky frézování na 6-7 cm, aby nedošlo k zeslabení stávající podkladní konstrukce (viz doklad č. 09 - Zápis ve SD ze dne 8.8.2021, list č. 02).

Díličí změna 3 je vyjádřena položkou č. 12 a snižuje smluvní cenu stavby o 221 747,08 Kč.

Díličí změna 4: Úprava odvodnění za mostem

Zadávací dokumentace napředpokládala stavební úpravu pro zaplnění odvodnění komunikace v části za dleňovým mostem, což se při realizaci a po konzultaci s TDI ukázalo jako potenciální problém.

Proto musely být za dleňovým mostem vybourány stávající obruby a z důvodu zaplnění funkčního odvodnění byl vyprofilován terén tak, aby voda z vozovky mohla volně odtékat a zasáhnout. Vzhledem ke změně výšky nivelety vozovky došlo k osazení obruby do nové výšky, a proto musel být částečně vybourán i stávající spád z AB krytu v tl. 10 cm a o ploše 10,38 m². Na takto připravený povrch byla provedena nová vrstva asfaltového betonu, která zajišťuje plynulé naplnění stávajícího stavu na nový obrubník.

Výměna upravované plochy vychází ze skutečného zaměření skutečného stavu - viz doklad č. 10 (Situace prováděných prací) a geodetické zaměření skutečného provedení stavby (viz doklad č. 16).

Díličí změna 4 je vyjádřena položkou č. 10, 11, 22, 46, 47, 48, 49, 50 a zvyšuje smluvní cenu stavby o 95 724,51 Kč.

Díličí změna 5: Ošetření stýčkových spár asfaltového betonu

Původní předpoklad dle zadávací dokumentace byl frézování drážek v asfaltové vozovce šíř. 3100 mm a stěsnění stýčkových spár závlivou v tl. 3150 mm.

Ve skutečnosti bylo provedeno 3150 m zářevy jako pracovní spára + 250 m zářevy + křivočárkových napojených bočních ulic. Celkem tedy 3400 m oproti předpokládaným 3100 m - viz doklad č. 10 (Situace prováděných prací) a geodetické zaměření skutečného provedení stavby (viz doklad č. 16).
Ošetření spar je nutné pro zajištění životnosti díla.

Díčí změna 5 je vyjádřena položkou č. 13 a smluje smluvní cenu o 44 200 Kč.

Díčí změna 6: Neprovádění infiltrčního postřiku

V zadávací PD bylo uvažováno s aplikací infiltrčního postřiku v rámci celého rozsahu opravovaných asfaltových ploch.

Po odřezování stávajících asfaltových vrstev bylo zjištěno, že ty aplikace infiltrčního postřiku na stávající vrstvu ze ŠD byla neúčinná (viz doklad č. 98 - Zápisy ve ŠD, list 17).

Díčí změna 6 je vyjádřena položkou č. 20 a smluje smluvní cenu o 98 410 Kč.

Díčí změna 7: Odpočet silničních obrub

V zadávací dokumentaci bylo uvažováno s osazením či výměnou obrub v délce 1950 m.

Dle geodetického zaměření skutečného provedení a dokladu č. 10 - Příloha č. 1 - Přehledná mapoprováděných prací bylo provedeno 1510,9 m.

Díčí změna 7 je vyjádřena položkou č. 33 a smluje smluvní cenu o 127 540 Kč.

Pozn.: Doklad č. 10 (Situace prováděných prací) bude ve finální verzi, která bude předána objednateli, podepsán stavebněředitelům a odpovědným zástupcem TDI, resp. technikem KSÚS. Z důvodu velkého formátu přílohy je verze pro odsouhlasení TA složena nepodepsaná.

Jedná se o Změnu nepodstatnou, nepředvídanou, která je tak podle § 5, odst. 1 písm. c), resp. podle § 10 Směrnice R-5M-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 09. 05. 2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje změnu podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná o změnu nepředvídanou.

Údaje v Kč bez DPH.

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-798 475,48	791 846,30	-6 629,18	1 590 321,78

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

ZBVZ:

Zhotovitel (stavební firma): Colas CZ, a.s.	jmeno:	Petr Žakoudík	datum:	6.12.2021	podpis:
Stavební dozor: KSÚS SK	jmeno:	Tomáš Pecka	datum:		podpis:
Zástupce Objednatel: KSÚS SK vedoucí TSD úseku M.H.	jmeno:	Larika Chmelová	datum:		podpis:

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SOUPŠ, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokládány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlásily, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou doplněním dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práce a povinnosti Objednatel a Zhotovitel sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojili příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel)	jmeno:	Ing. Jan Lichneger	datum:		podpis:
Zhotovitel	jmeno:	Pavel Lelánka	datum:	06.12.2021	podpis:
					Oslovení

1

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: III/2451 - Stará Boleslav Název stavebního objektu/provozního směru (SO/PS): SO 161 - Komunikace	Číslo SO/PS / / Číslo Změny SO/PS: 101/2	Číslo ZBV: 2.4																													
Strany smlouvy a sml. objednatel: č. S-383/0006001/2021 a protokol č. 201213067 na realizaci uveřejněné Stavby uzavřené dne 1.3.2021 (dále jen Smlouva) Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 61/11, 160 00 Praha 6, Smíchov Zhotovitel: COLAS CZ, a.s., Rubelka 216/1, 180 00 Praha 8, Vysočany																															
Přehled Změnového listu: <table><tr><td>1. Kvalitativní</td><td>1</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>2. Změnový list</td><td>2</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>3. Zápis o přijetí/odmítnutí ocenění součástí prací</td><td>1</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>4. Rozpis ocenění Změn položek ZBV 2</td><td>1</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>5. Přehled zařízení změno do skupin</td><td>1</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>6. Přehled dalších dokladů</td><td>1</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>Další doklady dle přehledu dokladů</td><td>42</td><td>počet listů</td></tr></table>	1. Kvalitativní	1	počet listů	2. Změnový list	2	počet listů	3. Zápis o přijetí/odmítnutí ocenění součástí prací	1	počet listů	4. Rozpis ocenění Změn položek ZBV 2	1	počet listů	5. Přehled zařízení změno do skupin	1	počet listů	6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů	Další doklady dle přehledu dokladů	42	počet listů	<table><tr><td>Paré č.</td><td>Příjemce</td></tr><tr><td>1, 2</td><td>Objednatel</td></tr><tr><td>3</td><td>Zhotovitel</td></tr><tr><td>4</td><td>Stavební dozor</td></tr></table>	Paré č.	Příjemce	1, 2	Objednatel	3	Zhotovitel	4	Stavební dozor	
1. Kvalitativní	1	počet listů																													
2. Změnový list	2	počet listů																													
3. Zápis o přijetí/odmítnutí ocenění součástí prací	1	počet listů																													
4. Rozpis ocenění Změn položek ZBV 2	1	počet listů																													
5. Přehled zařízení změno do skupin	1	počet listů																													
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů																													
Další doklady dle přehledu dokladů	42	počet listů																													
Paré č.	Příjemce																														
1, 2	Objednatel																														
3	Zhotovitel																														
4	Stavební dozor																														
Incident změny: Zhotovitel																															
Popis a zdůvodnění Změny:																															
Dílčí změna 1: Úprava povrchů za obrubami Při provádění přehledu dle zadávací dokumentace byly vybourány a osazeny nové obruby bez dalších navazujících úkonů. Při provádění však bylo zjištěno, že obrubníky budou osazeny v jiné výšce a z tohoto důvodu jsou nutné přehledové úpravy v rámci postranních zelených pásů (viz doklad č.10 - Situace prováděných prací, doklad č.14 - Fotodokumentace a doklad č.09 - Zápis ve SO, list č.1 a list č. 8). V místě vjezdů muselo dojít k částečnému rozebrání konstrukce, očistění dlažby a nové pokládce dlažby pro zajištění plynulého napojení nových a stávajících ploch. Vzhledem ke skutečnosti, že nebyla zpracována projektová dokumentace a v prázdném rozpočtu se nenachází položky na tyto práce, které však bylo nutné pro dokončení díla zrealizovat, jedná se o dodatečné stavební práce nezbytné k dokončení díla. Dílčí změna 1 je vyjádřena položkou č. 51,52,53,54,55 - a zvyšuje smluvní cenu stavby o 212 279,32 Kč.																															
Dílčí změna 2: Vytýčení kabelů IS V zadávací dokumentaci nebylo uvažováno s vytýčením inženýrských sítí. Při provádění hrubování a kopání ryh pro silniční obruby, popř. při bourání stávajících otvůr bylo nutné položit inženýrských sítí vytýčit (viz doklad č.09 - Zápis ve SO, list č.1). Vlastní vytýčení bylo objeveno od správců příslušných inženýrských sítí na základě objednávek (viz doklad č. 08 - CN Vytýčení IS). Při vytýčení bylo zjištěno, že mnoho povrchových značek bylo přesahováno a nedlo je pouze vrtání nožičkou načet. Dílčí změna 2 je vyjádřena položkou č. 43 - a zvyšuje smluvní cenu stavby o 25 208,25 Kč.																															
Dílčí změna 3: Čištění uličních vpustí V průběhu dělního procesu byly identifikovány 2 nefunkční uliční vpusti (viz doklad č. 14 - Fotodokumentace). Aby bylo zajištěno řádné odvodnění komunikace v této části, bylo nutné tyto uliční vpusti vyčistit. Na základě požadavku TDI (viz doklad č. 09 - Zápis ve SO, list č.7), bylo objednáno takové čištění od správce kanalizace, společnosti Stavokompas s cenovou nabídkou (viz doklad č. 08 - CN Čištění UV). Dílčí změna 3 je vyjádřena položkou č. 44 - a zvyšuje smluvní cenu stavby o 8 602,65 Kč.																															
Dílčí změna 4: Rektifikace uličních značek Dle zadávací dokumentace byly uvažovány s určitým počtem rektifikace uličních vpustí, poklopů kanalizace a žoupat. Po odřezování asfaltových vrstev však bylo zřejmé, že se počet povrchových značek v rozpočtu neshoduje se skutečností. Pro řádné dokončení díla bylo nutné rektifikovat veškeré povrchové značky. Skutečný počet upravených značek vychází z dokladu č.10 (situace provedení prací) a z geodetického zaměření skutečného provedení (viz doklad č. 18). Dílčí změna 4 je vyjádřena položkou č. 28,29 a 30 a zvyšuje smluvní cenu stavby o 51 252 Kč.																															
Jedná se o Změnu nepodstatnou, která je podle § 5, odst.1 písm. d), resp. podle § 11 Změnice R-DM-30 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29.05.2017) uplatňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek zařazena do skupiny 4 jako nezbytná. Zároveň se jedná o práce, které nemají závažnou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vaně podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 1) se jedná o změnu nezbytnou.																															

Údaje v Kč bez DPH

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navržených Změn záporných a Změn kladných dohem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-798 475,48	494 443,88	-304 031,60	1 292 919,36

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

ZB92:

Zhotovitel (ředitel/vedoucí): Odeš GZ, a.s. jméno Petr Zábudský datum 6.12.2021 podpis

Stavatel dozor: KBOŠ SK jméno Tomáš Pecka datum podpis

Zástupce Objednatel: KBOŠ SK jméno Lenka Chmelná datum podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO-PS, který je součástí uvedených Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou poměrně popsány, zdůvodněny, odůvodněny a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle č. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitel sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojili příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel) jméno Ing. Jan Lichtner datum podpis

Zhotovitel jméno Pavel Lněnička datum 06.12.2021 podpis

Číslo listu

1

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 2

Název Stavby:	III/2451 - Stará Boleslav
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	101/2
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	SO 101 - Komunikace

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
12 360 707,31

Poznámka:

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	2 232 500,29	14 593 207,60	2 232 500,29

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-798 475,48	791 846,30	3 024 346,59	24,47%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-798 475,48	14 586 578,42	2 225 871,11	18,01%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):
COLAS CZ, a.s.

souhlasím

Petr Žaloudek

G. H. 2. 21

Stavební dozor:
KSUS SK - silniční technik

souhlasím

Tomáš Pecka

Zástupce Objednatel:
vedoucí TSU oblasti M.H.

souhlasím

Lenka Chmelová

Zaměstnanec KSUS SK
odpovědný za cenové
projednání Změny:

souhlasím

Ing. Jaroslava Jurková

Rozpis ocenění Změn položek - celkem													
Evidenční číslo a název stavby: III/2451 - Stará Boleslav								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: SO 101 - Komunikace								SO 101/2.3					
Číslo a název rozpočtu: SO 101.2 - Komunikace ZBV2								Skupina změn 3					
Por. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve špičce	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve špičce v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	01575_R	POPLATKY ZA UVEDENÍ ODPAKŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 03 01* ASFALTOVÉ SMĚSI OBSAHUJÍCÍ DEHET - ZAS - T3	t	80,720	0,000	-80,720	1 220,00	98 478,40	-98 478,40	0,00	0,00	-98 478,40	-100,00%
10	113524	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - BEZ DOPRAVY	m	685,000	715,800	30,800	39,00	26 723,00	0,00	1 201,20	27 924,20	1 201,20	4,50%
11	113528	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - DOPRAVA	94m	2630,400	2748,672	118,272	4,00	10 521,60	0,00	473,09	10 994,69	473,09	4,50%
12	113728	FRÉZOVÁNÍ VOZOVÝCH ASFALTOVÝCH ODVOZŮ DO 20KM	m3	2179,820	1771,446	-408,374	543,00	1 183 642,36	-221 747,08	0,00	961 895,28	-221 747,08	-18,73%
13	113762	FRÉZOVÁNÍ DRAŽKY PRŮŘEZU DO 200MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	m	5100,000	3400,000	-1700,000	26,00	132 600,00	-44 200,00	0,00	88 400,00	-44 200,00	-33,33%
15	132738	HLAUBENÍ KYH SÍŘ DO 2M PAŽ (NEPAŽ TR. L. ODVOZ DO 20KM	m3	263,850	523,537	259,687	329,00	86 806,65	0,00	85 437,02	172 243,67	85 437,02	88,42%
16	18310	ÚPRAVA PLÁNE SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	m2	1080,000	2138,350	1158,350	17,00	17 000,00	0,00	20 371,95	37 371,95	20 371,95	119,84%
18	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRAKORTU TL DO 150MM	m2	1000,000	1437,250	437,250	148,00	148 000,00	0,00	214 150,25	362 150,25	214 150,25	143,73%
20	572131	INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,5M2/M2	m2	18621,600	12051,600	-7570,000	13,00	255 080,80	-98 430,00	0,00	156 650,80	-98 430,00	-38,58%
22	574445	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 15 TL 50MM	m2	18621,600	18642,360	20,760	183,00	3 407 752,80	0,00	3 799,08	3 411 551,88	3 799,08	0,11%
26	574646	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 15+ 19S TL 50MM	m2	1000,000	0,000	-1000,000	208,00	208 000,00	-208 000,00	0,00	0,00	-208 000,00	-100,00%
23	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	m	1950,000	1510,500	-439,500	400,00	780 000,00	-127 640,00	0,00	652 360,00	-127 640,00	-16,36%
25	931312	TĚSNĚNÍ DILTAČ SPAR KSF ZALIVKOU PRŮŘ DO 100MM2	m	3150,000	3400,000	250,000	31,00	97 650,00	0,00	7 750,00	105 400,00	7 750,00	7,54%
Nové položky - JE dle ÚRS 2021/II													
45	567127114	Podklad ze směsi smíšené cementem ŠC C 8/10 (KSC II) š 130 mm	m2	0,000	223,950	223,950	317,00	0,00	0,00	70 982,15	70 982,15	70 982,15	100,00%
46	113170342	Odstranění podkladu šikmého tl 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	0,000	10,380	10,380	70,30	0,00	0,00	729,71	729,71	729,71	100,00%
47	997013645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dlehu kód odpadu 17 03 01	t	0,000	23,874	23,874	2 310,00	0,00	0,00	55 148,94	55 148,94	55 148,94	100,00%
48	997221571	Vodorovná doprava vybočených hmot do 1 km	t	0,000	23,874	23,874	651,00	0,00	0,00	15 541,97	15 541,97	15 541,97	100,00%
49	997221579	Příplatek ZKO 1 km u vodorovné dopravy vybočených hmot	t	0,000	358,110	358,110	17,30	0,00	0,00	6 195,30	6 195,30	6 195,30	100,00%
50	997221832	Nakládání vybočených hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	0,000	23,874	23,874	530,00	0,00	0,00	12 653,22	12 653,22	12 653,22	100,00%
Celkem													
									- 798 475,48	484 443,88		- 304 031,60	

Odpovědný zástupce Objednatel i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měnících položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Petr Žalouděk, (stavbyvedoucí)

Za Objednatel: Tomáš Pecka, (TDI, technik KSÚS)

Datum: 6.12.2021

Datum:

Podpis:

Podpis:

Rozpis ocenění Změn položek - celkem

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

SO 101/2.4

Skupina změn 4

Evidenční číslo a název stavby: III/2451 - Stará Boleslav													
Číslo a název SO/PS: SO 101 - Komunikace													
Číslo a název rozpočtu: SO 101.2 - Komunikace ZBV2													
Por. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílů	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem a %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
28	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA PODLOH	kus	30,000	41,000	11,000	3 106,00	96 180,00	0,00	35 266,00	131 446,00	35 266,00	36,67%
29	89922	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MRŮ	kus	11,000	17,000	6,000	2 510,00	27 610,00	0,00	2 510,00	30 120,00	2 510,00	9,09%
30	89923	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	kus	46,000	58,000	12,000	1 123,00	51 658,00	0,00	13 476,00	65 134,00	13 476,00	26,08%
		Nové položky											
43	85	Vyrojení II JC vz doklad č. 08 - Cement nábitky	kpl	0,000	1,000	1,000	25 268,25	0,00	0,00	25 268,25	25 268,25	25 268,25	100,00%
44	86	Čistění 2 ks přípojek U JC vz doklad č. 08 - Cement nábitky	kpl	0,000	1,000	1,000	8 602,65	0,00	0,00	8 602,65	8 602,65	8 602,65	100,00%
51	181351108	Rozprostření omasy II vrstvy do 200 mm tl. přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 stropně JC dle ÚRS 2021/II	m2	0,000	473,700	473,700	55,00	0,00	0,00	26 053,50	26 053,50	26 053,50	100,00%
52	181311108	Rozprostření omasy II vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně JC dle ÚRS 2021/II	m2	0,000	473,700	473,700	209,00	0,00	0,00	99 003,30	99 003,30	99 003,30	100,00%
53	113106123	Rekonstrukce dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně JC dle ÚRS 2021/II	m2	0,000	174,000	174,000	79,88	0,00	0,00	13 900,86	13 900,86	13 900,86	100,00%
54	979054451	Odběr výkonečných zámkových dlaždic s původním spárováním z kamenné třídně JC dle ÚRS 2021/II	m2	0,000	174,000	174,000	64,62	0,00	0,00	11 242,14	11 242,14	11 242,14	100,00%
55	396211210	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A tl do 50 m2 JC dle ÚRS 2021/II	m2	0,000	174,000	174,000	356,78	0,00	0,00	62 079,72	62 079,72	62 079,72	100,00%
										0,00			
		Celkem:							0,00	297 402,42		297 402,42	

Odpovědný zástupce Objednatel i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjedlujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Petr Žalouděk, (stavbyvedoucí)

Datum: 6.12. 2021

Podpis:

Za Objednatel: Tomáš Pecka, (TDI, technik KSÚS)

Datum:

Podpis:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: III/2451 - Stará Boleslav

1	Přijaté smlouvi částka bez rezervy a DPH	12 360 707,31
211+19+20	Aktuální smlouvi částka (cena stavby)	14 585 578,42
	Aktuální smlouvi částka (cena stavby) včetně DPH	17 649 759,89
3-(2/1)*100	Procenta změny Přijaté smlouvi částky	118,01%
4-(20/1)*100	Střední výkresových změn (Skupina 1)	0,30%
5-(20/1)*100	Střední změny podlaží (Skupina 2)	0,50%
40-(10/1)*100	Střední limit 10 % pro posuzování změny pro Změny skupiny 3 a 4 celkem (10 prvků by)	-0,30%

8-(2+34)	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	2 225 871,11
10-(1+10)	Střední limit 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	18,34%
9+1+0,3	Základní limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	3 788 212,18

9-(20/1)*100	Střední limit 50 % Skupina 3	28,52%
20-(20/1)*100	Střední limit 50 % Skupina 4	2,41%
100-(34+34)	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	3 822 822,27
11+1+0,3	Základní limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	6 189 333,60

10+1/10,10	Limit	1 854 100,10
11-(30/1)	Střední limit (10%)	0,00%
14+(400/3)+(30)	Hodnota skupiny 3	0,00

SO	ZBV č.	Název SO/PS i předmět Změny	Změny skupiny (začíná se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	- 1 -			- 2 -			- 3 -				- 4 -				- 5 -		
						Výpočet změny Změny skupiny (dle §102 zákona č. 134/2016 Sb.)			Změna podlaží (dle §102 odst. 1) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nadpodlaží (dle §102 odst. 3) zákona č. 134/2016 Sb.)				Změny podlaží (dle §102 odst. 1) zákona č. 134/2016 Sb.)				Změny do hodnoty Změny absolutní celkové podlaží včetně záporných (dle §102 odst. 4) zákona č. 134/2016 Sb.)		
						Změny skupiny (začíná se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn skupinových a Změn kladných	Změny skupiny (začíná se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn skupinových a Změn kladných	Změny skupiny (začíná se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn skupinových a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny skupiny (začíná se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn skupinových a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny skupiny (začíná se znaménkem minus)	Změny kladné	Limit 10 %
18	17	18	18+23+26+29+30	20+24+27+30+36+37+38	31+19+22	23	34	23+23+24	25	27	20+20+21	26	30	23+29+30	25+28+29+30+31	23	34	20+20+24	24+28+29+30+31	27	30	20+28+31+36
		III/2451 - Stará Boleslav	- 768 475,48	3 424 348,36	2 225 871,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 768 475,48	- 2 720 844,57	1 499 468,86	1 555 416,20	0,00	287 402,42	287 402,42	287 402,42	0,00	0,00	0,00
101	1	Výkresový výpočet a skupiny a podlaží ve projektu ve stavu	0,00	2 232 885,16	2 232 885,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 232 885,16	2 232 885,16	2 232 885,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	2	Stavba, stavební úpravy, změny úpravy, přístavky, práce	- 768 475,48	761 880,30	- 6 605,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 768 475,48	484 943,50	- 284 531,98	1 760 514,36	0,00	287 402,42	287 402,42	287 402,42	0,00	0,00	0,00
	3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Poznámka: Formulář má informativní charakter a obsahuje stav k datu schválení Změnového listu.

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	2
Název a evidenční číslo stavby:	III/2451 - Stará Boleslav
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 101 - Komunikace
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	101/2

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
07 Soupis prací SO po změnách	7	
08 Cenové nabídky - vytyčení IS a čištění UV	10	
09 Zápisy ve stavebním deníku	12	
10 Situace prováděných prací	1	
11 Protoly o zkoušce asfaltu	2	
12 Doklad o likvidaci odpadu	2	
13 Pokyn objednatele	2	
14 Fotodokumentace ZBV 2	6	
15 Geodetické zaměření skutečného provedení	-	V tištěné podobě u objednatele.
Počet listů celkem	42	

Rozpis ocenění Změn položek - celkem													
Evidenční číslo a název stavby: III/2451 Stará Boleslav-Nový Vestec								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: SO 101 - Komunikace								SO 101/1					
Číslo a název rozpočtu: SO 101.1 - Komunikace								celkem					
Por. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Směrově	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Směrově v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v
12	113728	FRÉZOVÁNÍ VOZOVKY ASFALTOVÝCH ODVOZ DO 200MM	m3	1779,820	-1771,448	-408,374	545,00	1 583 642,26	-221 747,08	0,00	961 895,18	-221 747,08	-18,73%
		průř. 113728 - odpčet m3 za frézování, v množství frézování 7732,370 m3 = 827,805 m3, v množství frézování v tl. 0,07 m 12031,000 m3 = 843,87 m3. Celkem vyfrézováno 1771,440 m3. Rozdíl frézování = 2179m3 - 1771,448 = -408,374 m3 = [A]. Vyvážení přebytek z geodetického zaměření skut. provedení, viz doklad č. 50 - Sčítací prováděcích prací - 28v 2											
13	113762	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY HRDŘEZU DO 200MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	m	5100,000	-3400,000	-1700,000	36,00	133 800,00	-44 200,00	0,00	88 600,00	-44 200,00	-33,73%
		průř. 113762 - provedeno frézování drážky v délce 3150 m - šířkou (sazba: 250 m frézování drážky provedeno v nápojem bočních ulic 3150 m = 250 m = 3400) m 3400 - 1100 = -1700 m = [A] 28v 2											
14	12522	ČISTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL DO 100MM	m2	4012,500	4012,500	0,000	48,00	192 600,00	0,00	0,00	192 600,00	0,00	0,00%
15	132738	HLoubENÍ KVN SVĚ DO 2M, PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 200MM	m3	243,850	-523,537	-259,687	329,00	86 808,65	0,00	85 437,02	172 248,67	85 437,02	98,42%
		průř. 132738 - hloubení pro provedení sanací podkladních vrstev, rozsoh a profila viz doklad č. 50. Situace prováděcích prací. Výměra sanací se 50 = 234,811 m2, náklady pro sanaci v 30 C = 33,983 m3. celkem výkop pro sanaci: 234,811+33,983 = 268,794 m3 = [A]. Odpčet výkopu za neprováděné ústřední v tl. 425,1 m - 120 m (viz průř. 33) = 319,5, 319,5*0,3*0,3 = 28,717 m3 = [B]. Celkem odkop = [A]-[B] = 268,794-28,717 = 239,687 m3 = [C] 28v 2											
16	18110	ÚPRAVA PLÁNEŠE ZHUZNĚNÍM V HORNÍM TŘ. I	m2	1000,000	2198,350	1198,350	17,00	17 000,00	0,00	20 371,95	37 371,95	20 371,95	119,84%
		průř. 18110 - úprava pláňe při sanaci podkladních vrstev, rozsoh a profila viz doklad č. 50. Situace prováděcích prací. Výměra hutnění 2H při sanaci = 57,8+83,2+7,5+25+2,3+4,3+66,15+80+93,0+14,4+23,4+104+40+136,5+125+90+85 = 1198,35 m2 = [A] 28v 2											
17	56331	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL DO 30MM	m2	7364,000	7364,000	0,000	43,00	315 380,00	0,00	0,00	315 380,00	0,00	0,00%
18	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL DO 150MM	m2	1000,000	1437,250	1437,250	148,00	148 000,00	0,00	214 150,25	363 150,25	214 150,25	143,73%
		průř. 56333 - vozovkové vrstvy se 50 při sanaci, rozsoh a profila viz doklad č. 50. Situace prováděcích prací. Výměra sanace se 50 = 57,8+83,2+7,5+30+5+4,3+66,15+180+181,2+28,3+86,3+128+40+136,5+125+90+85 = 1437,250 m2 = [A] 28v 2											
19	56960	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU	m3	401,250	401,250	0,000	666,00	267 232,50	0,00	0,00	267 232,50	0,00	0,00%
20	572131	INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,5KG/M2	m2	19421,600	12052,600	-7570,000	13,00	250 080,80	-98 410,00	0,00	150 670,80	-98 410,00	-38,58%

Rozpis ocenění Změn položek - celkem													
Evidenční číslo a název stavby: III/2451 Stará Boleslav-Nový Vestec								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: SO 101 - Komunikace								SO 101/1					
Číslo a název rozpočtu: SO 101.1 - Komunikace								celkem					
Por. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
33	917124	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBENÍ ŠÍŘE 150MM	m	1950,000	1510,900	-219,100	400,00	780 000,00	-127 640,00	0,00	652 360,00	-127 640,00	-16,36%
		pol. 917124 - v rozpočtu uvažováno z 1970 m, dle geometrického završení provedeno 1110,9 m; 1110,9 - 1950 = -429,1 m + 120 m (předpoklad pro dokončení v úseku z provedlou kanalizací) = -429,1 + 120 = -309,1 (AI 28v 2)											
34	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTÍ VOZOVÉ TL DO 50MM	m	115,000	125,000	0,000	24,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
35	921112	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASFALTOVÝM PRŮB DO 200MM2	m	3150,000	3400,000	250,000	31,00	97 650,00	0,00	7 750,00	105 400,00	7 750,00	7,98%
		pol. 921112 - provedeno těsnění spar v délce 1150 m - pracovní spára, 250 m těsnění spar provedeno v napojení bočních ulic, 3150 m + 250 m + 3400 m; 3150 + 3400 + - 250 m = (AI 28v 2)											
36	9354A	ŽLÁRY Z DILCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 150MM VČETNĚ MRŽI (odhad)	m	4,000	0,000	0,000	4 278,00	17 512,00	0,00	0,00	17 512,00	0,00	0,00%
37	93812	OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVÉ ZAMETENÍM	m2	18622,000	18622,000	0,000	4,00	74 488,00	0,00	0,00	74 488,00	0,00	0,00%
		Nové položky - IC dle ÚRS 2021/II						0,00	0,00	398 440,81	398 440,81	398 440,81	100,00%
38	512243111	Provizorní vypravení neupravených výtluků asfaltovým betonem ACO (AB)	t	0,000	6,000	6,000	4150,000	0,00	0,00	24 900,00	24 900,00	24 900,00	100,00%
		Vypravení výtluků na objízdné trase pro dopravu na okružní DÚO - polohou koordinátou a 91190, plocha 48 m2, tl. 0,05 m, obj. betonové 249 600 + 2,5 + 48*0,05*2,5 = 6 m (AI 28v 1)											
45	567122114	Podklad ze směsi omešle cementu SC C 8/10 (KSC II) tl. 150 mm	m2	0,000	223,950	223,950	117,00	0,00	0,00	70 992,15	70 992,15	70 992,15	100,00%
		pol. 567122114 - provedení vrstvy z SC C v místě zatv. podkladních vrstev, rozloha a plocha vlt. 10804 ± 30 šroubov provedených prací. Výsledek správy z SC C = 97,5+85,2+7,5+5+8,3+68,15 = 223,95 m2 (AI 28v 2)											
46	113170342	Odvážení podkladu řízného tl. 100 mm strojně pl. do 50 m2	m2	0,000	10,380	10,380	70,30	0,00	0,00	729,71	729,71	729,71	100,00%
		pol. 113170342 - souhrn asfaltového betonu ve vjezdu ze mostem tl. plocha 10,38m2 (AI), vlt. odhad z 30 šroubov provedených prací											
47	997013645	Poplata za státní na ploše (okružní) odstavu asfaltového betonu pod odstavu 17 03 02	t	0,000	23,874	23,874	2 310,00	0,00	0,00	55 148,94	55 148,94	55 148,94	100,00%
		Pol. 997013645 - likvidace ze vybudovaného asfaltového betonu ve vjezdu ze mostem o ploše 10,38m2, vlt. odhad z 30 šroubov provedených prací. Měř na frekvenci za odř. kromy je 2,31m2. Výpočet: 10,38*2,3 = 23,874 (AI 28v 2)											
48	997121571	Vodárenská doprava vybudovaných hmot do 5 km	t	0,000	23,874	23,874	651,00	0,00	0,00	15 541,97	15 541,97	15 541,97	100,00%

Rozpis ocenění změn položek - celkem

Evidenční číslo a název stavby: III/2451 Stará Boleslav-Nový Vestec

Číslo a název SO/PS: SO 101 - Komunikace

Číslo a název rozpočtu: SO 101.1 - Komunikace

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

SO 101/1

celkem

Por. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Pol. 57654451 - ochranné nověstrané dráhy ve vjezdových křižích plynulému napojení na novou souboru se změnou křižovizny - jedna se o práci, která byla prováděna v rámci státních vjezdů se nově osazenou souborou o přílohu = 174 m2 = [A], výměra byla převzata z geometrického záznamu souboru, třída opravy byla třída s křižoviznou. Rozměr 0,8 m, viz doklad č. 10. Smlouva prováděných prací 2012											
55	556311210	Kladení zámkové dráhy komunikace pro pěší šíř 60 mm, skupiny A a B do 50 m2	m2	0,008	174,000	174,000	356,78	0,00	0,00	62 079,72	62 079,72	62 079,72	100,00%
		Pol. 556311210 - kladení demontované dráhy na vjezdu z kamenné třísy ve vjezdových křižích plynulému napojení na novou souboru se změnou křižovizny - jedna se o práci, která byla prováděna v rámci státních vjezdů se nově osazenou souborou o přílohu = 174 m2 = [A], výměra byla převzata z geometrického záznamu souboru, třída opravy byla třída s křižoviznou. Rozměr 0,8 m, viz doklad č. 10. Smlouva prováděných prací 2012											
		Nové položky - R - položky						0,00	0,00	2 102 539,04	2 102 539,04	2 102 539,04	100,00%
39	R1	Řízení projektových BUS zastávek z dřevěným nástupišti - materiál, montáž, demontáž, doprava	KOMPL	0,000	2,000	2,000	28 189,27	0,00	0,00	56 378,54	56 378,54	56 378,54	100,00%
		Zařízení 2 ks dřevěných nástupišť pro projektování zastávek dle požadavků ŘGPO a ostatní. Jednotková cena se vztahuje na každý kus dřevěného nástupišť a dřevěného materiálu (dřevěný, lepený). IC viz doklad č. 10 a 2012.											
40	R2	Náklady pro dokončení stavby (mechanizace+doprava+pracovníci+TMF)	den	0,000	34,000	34,000	89015,70	0,00	0,00	1 246 219,80	1 246 219,80	1 246 219,80	100,00%
		Doplňkové náklady na stavbu z důvodu nové etapizace stavby. Jednotková cena se vztahuje na každý den práce s náklady a prací mechanizace (skupina vjezdů), včetně nákladů, dopravy, nákladů a nákladních automobilů. IC viz doklad č. 10 a 2012.											
41	R3	Náklady položky seř. umění	den	0,000	4,000	4,000	120671,00	0,00	0,00	482 692,00	482 692,00	482 692,00	100,00%
		Doplňkové náklady na stavbu z důvodu nové etapizace stavby. Jednotková cena se vztahuje na každý den práce s náklady a prací seř. umění (skupina vjezdů), včetně nákladů, dopravy, nákladů a nákladních automobilů. IC viz doklad č. 10 a 2012.											
42	R4	Náklady na fréz. (pronájem+doprava+pracovníci)	den	0,000	2,000	2,000	347678,90	0,00	0,00	283 357,80	283 357,80	283 357,80	100,00%
		Doplňkové náklady na stavbu z důvodu nové etapizace stavby. Jednotková cena se vztahuje na každý den práce s náklady a prací fréz. (pronájem+doprava+pracovníci). IC viz doklad č. 10 a 2012.											
43	R5	Výhledy IS	kg	0,000	1,000	1,000	25268,25	0,00	0,00	25 268,25	25 268,25	25 268,25	100,00%

DODAVATEL IČ 47052945 DIČ CZ47052945

Ev.číslo 01-1-0000471

STAVOKOMPLET spol.s r.o.

Zápy 251
250 61 Zápy
Česká republika

Peněžní ústav

Číslo účtu

IBAN

SWIFT kód KOMBCZPP

PŘÍJEMCE

COLAS CZ, a.s.

Rubeška 215/1
190 00 Praha - Vysočany
Česká republika

Odběratelská cenová skupina

Konst.symb.

Var.sym. 11000047

Objednávka 6474/500

ODBĚRATEL IČ 26177005 DIČ CZ26177005

COLAS CZ, a.s.

Rubeška 215/1

190 00 Praha - Vys
Česká republika

Den splatnosti

Datum DPH

Den vystavení

Forma úhrady

Kód operace A - tuzemsko

Povaha transakce

Dodací podmínky

Druh dopravy vlastní

Číslo položky	Název	Množství	MJ	Cena za mj	DPH	Celkem s DPH
Alternativní číslo						

Na základě Vaší obj.č. 1212142005 Vám fakturujeme za vytýčení sítí VaK, Ul. Okružní a Vestecká, Stará Boleslav

s555	Trasování /vytýčení/ 2x pracovník	17,00	hod	850,00	21%	17 484,50
s562	Doprava- Opel	22,0	km	25,00	21%	665,50

REKAPITULACE DPH	21%
Základ	15 000,00
Daň	3 150,00
CELKEM	18 150,00

(zaokrouhleno) 0,00

CELKEM**CZK 18 150,00**

Odběratel souhlasí, že celý předmět dodávky je výhradním vlastnictvím dodavatele až do úplného zaplacení faktury.

V případě prodlení s úhradou faktury budeme účtovat smluvní poplatek ve výši 0,05% z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení.

Razítko a podpis dodavatele
Vystavil(a) Michaela Cincibusová

Razítko a podpis odběratele

Stavokomplet spol. s r.o. Telefon 326906887-8 Fax 326905093

OR: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 14934, dne 25.11.1992

DODACÍ LIST

Číslo: 01-1-0000110

DODAVATEL IČ 47052945 DIČ CZ47052945 STAVOKOMPLET spol.s r.o. Zápy 251 250 61 Zápy Česká republika	Den plnění Den vystavení 14.06.2021 Doklad 6474/5981 Kontaktní osoba Telefon
PŘÍJEMCE COLAS CZ, a.s. Rubeška 215/1 190 00 Praha - Vysočany Česká republika	ODBĚRATEL IČ 26177005 DIČ CZ26177005 COLAS CZ, a.s. Rubeška 215/1 190 00 Praha - Vysočany Česká republika

Vytýčení sítě VaK, Ul. Okružní a Vestecká, Stará Boleslav. (Název zak.: III/2451 - Stará Boleslav)

Text	Množství	cena	Celkem Kč
Trasování /vytýčení/ 2x pracovník	17,00hod	850,00	14 450,00
Doprava- Opel	22,00 km	25,00	550,00
			<u>15 000,00</u>

Razítko a podpis dodavatele
Vystavil(a) Daniel Harčarik

Razítko a podpis odběratele



21120351

FAKTURA

daňový doklad 7921601590 / versymbol 7921601590
List 1 / 1

DODAVATEL

Telco Pro Services, a.s.

Duhová 1531/3, 140 00 Praha, CZECH REPUBLIC

IČ: 29148278 | DIČ: CZ29148278

Bankovní spojení: 107-0148140257/0100

Forma úhrady: Vlastní podnět

Zapadlá v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,
vložka 18830

COLAS CZ, a.s.

Rubeška 215/1

190 00 Praha

ODBĚRATEL

COLAS CZ, a.s.

Rubeška 215/1

190 00 Praha

IČ: 26177005 | DIČ: CZ26177005

ORIGINAL

VARIABILNÍ SYMBOL	7921601590
ZÁKAZNICKÉ ČÍSLO	60614832
ČÍSLO OBJEDNÁVKY	OBJ2112142 č. 1212142
DATUM SPLATNOSTI	30. 6. 2021
DATUM VYSTAVENÍ	28. 6. 2021
DATUM ZDANITELNÉHO PLNĚNÍ	21. 6. 2021

Fakturuje se Vám ze období 00.00.0000 - 21.06.2021

REKAPITULACE (celkem za fakturační období)

	Sazba DPH	Základ DPH (Kč)	DPH (Kč)	Celkem (Kč)
Celkem sazba DPH	21 %	1 200,00	252,00	1 452,00
Morizování	%			1 452,00
CELKEM K ÚHRADĚ				1 452,00

Částku vyúčtování ve výši 1 452,00 Kč uhradíte prosím do 30.06.2021 ve prospěch účtu číslo: 107-148140257, kód banky 0100, variabilní symbol platby 7921601590. Doporučujeme provést platbu alespoň 3 pracovní dny před dnem splatnosti.

DETAILNÍ PŘEHLED FAKTUROVANÝCH ÚDAJŮ

	Předmět fakturace	Množství	Jednotka	Cena/jedn.	Sazba DPH (%)	Základ DPH (Kč)
6000008540	vytýčení	1,000	JV	1 200,00	21	1 200,00
Celkem						1 200,00

Fakturace za vytýčení kabelů dle objednávky č. OBJ2112142 č. 1212142004.

Vystavil: Telco Pro Services, a.s.

Zákaznická linka: 841 842 843, e-mail: servicedesk@cez.cz

112 142 / 20213087

Otočte prosím



Provozovatel:
ČEZ ICT Services, a. s.
Duhová 3/1531
140 53 Praha 4

ZÁPIS O VYTÝČENÍ KOMUNIKAČNÍHO VEDENÍ

Kabel: PE DUKOV - STARÝ ZOL. Datum vytýčení: 21.5.2021
Místo a úsek vytýčení: NOVÝ VESTEC

☒ pomocí hledače kabelů a situačního plánu ☒ dle dostupných podkladů z GIS

Vytýčení bylo provedeno na základě „Sdělení o existenci sítí společnosti ČEZ ICT Services, a. s.“
ze dne: pod č.:

Vytýčení bylo provedeno kabelovým hledačem na místech požadovaných pracovníky Objednatel. Zástupce Provozovatele kabelu nezpovídá za stav označení vytýčeného kabelu či za případné zničení označení nebo přemístění kolíků.
Při práci v blízkosti kabelu je nutné dodržovat platné právní předpisy, normy ČSN 33 4050, ČSN 73 3050, ČSN 73 6005 a podmínky stanovené naší organizací.
Vytýčený kabel je chráněn ochranným pásmem 1,5 m na každou stranu od svislé osy kabelu dle ve smyslu § 104 zákona č. 127/2005 Sb. a § 19, čl. 7 a 8 zákona č. 222/94.

Zejména je nutné:

- Objednatel prokazatelně seznámí s polohou vedení pracovníky, kteří přijdou s vedením do styku a upozorní na možnou odchylku uložení vedení.
- Veškeré zemní práce (výkopy) v ochranném pásmu kabelu provádět pouze ručně.
- Kabel po jeho odkrytí chránit proti poškození a prověšení.
- Zákaz manipulování s prvky kabelové sítě (spořka, uzemňovací soustava, atd.)
- Před záhozem kabelu lze řádně zapískovat a přizvat zástupce Provozovatele ke kontrole neporušenosti kabelu.
- Nad kabelovou trasou dodržovat zákaz přejíždění vozidly dokud nebude provedena ochrana proti mechanickému poškození kabelu.
- Nad kabelovou trasou dodržovat zákaz budování skládek nebo zařízení, která by znemožňovala přístup ke kabelu.
- Bez souhlasu zástupce Provozovatele nesnižovat ani nenavýšovat vrstvu zeminy nad kabelem.
- Poškození kabelu bude provádějící firmě vyúčtováno včetně vzniklých nákladů

Objednatel byl seznámen s podmínkami pro provádění výkopových prací a vytýčenou trasu kabelu převzal.

Údaje o provedeném vytýčení:

Práce na vytýčení hod

Délka výjezdu na vytýčení km
Pozn. Cena za vytýčení dle ceníku služeb ČEZ ICT Services, a. s.

Objednatel:

Provozovatel:

Organizace: COLAS CZ

Telco Pro Services

Adresa: BARBKA 45/1A PRAHA 9

ALAN VOLŠICKÝ

Tel/fax.: TEL: 0000000000

Razítko, podpis:

Zástupce Provozovatele na základě plné moci

ČEZ ICT Services, a. s.

Duhová 1531/3, 140 53 Praha 4 | tel.: 841 842 843, fax: 211 046 250
e-mail: servicesdesk@cez.cz, www.cez.cz | IČ: 26470411, DIČ: CZ26470411
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7309

Daňový doklad / Faktura

00016/17.06.21

21120447

Číslo dokladu

2219503960

Dodavatel:
Vegacom a.s.
 Novodvorská 1010/14
 142 01 Praha 4
ORIGINAL
 Městský soud v Praze oddíl B, vložka 6070
 IČ: 25768660
 DIČ: CZ25768660
 Tel:
 Fax:
 Banka Komandní banka, a.s.
 Číslo účtu: 1548390267/0100
 IBAN: CZ5301000000001548390267, SWIFT: KOMBCZPPXXX
 Prodávce: Marcela Ploková / 3300
 Tel: Fax:
 E-mail:
 Dodací adresa:
COLAS CZ, a.s.
 Rubeška 215/1
 19000 Praha
 Hlavní město Praha
 CZ

Odběratel:

(26177005-000)

COLAS CZ, a.s.
 Rubeška 215/1
 19000 Praha

IČ: 26177005
 DIČ: CZ26177005

Dodací a platební podmínky

Datum vystavení 17.06.2021
 Datum zdanitelného plnění 02.06.2021
 Datum splatnosti 17.07.2021
 Způsob platby Převodní příkaz
 Platební podmínka 30 dní

Zboží	Popis	Množství MJ	Kusová cena	DPH %	Sleva %	Celkem bez DPH
-------	-------	-------------	-------------	-------	---------	----------------

číslo zakázky zhotovitele: 21301301
 objednávka č. e-mail ze dne 14.5.2021

Na základě zakázového listu ze dne
 2.6.2021 vám fakturujeme částku
 za provedené vytyčení podzemního
 vedení Cefin
 -zájmové území: Stará Boleslav, Vestec

vytyčení síť	1	JV	7 858,00	21	7 856,00	7 856,00
						7 856,00
						1 649,76
						9 505,76

DPH %	Základ DPH	Částka DPH (CZK)	Částka CZK vč. DPH
21	7 856,00	1 649,76	9 505,76
	7 856,00	1 649,76	9 505,76

K úhradě CZK	9 505,76
--------------	----------

Vystavil: Marcela Ploková
 Tel: 266005163
 E-mail: ploková@vegacom.cz

Strana 1

12142/2022047

Novotný Milan

Od: DUDA, Vít (SGCZE)
Odesláno: pátek 14. května 2021 8:04
Komu: Novotný Milan
Kopie: ŽALOUDEK, Petr (SGCZE)
Předmět: Žádost o vytýčení trasy kabelu cetin - Stará Boleslav - Vestec
Přílohy: Situace výkres (638645-21).pdf; Vyjádření o existenci SEK (638645-21).pdf

Dobrý den,
prosím o vytýčení kabelu CETIN na akci: oprava komunikace III/2451. Vytýčit bychom to potřebovali prosím v termínu od 24.5. do 28.5.2021. Stavbu má na starosti p. Žaloudek (733 780 105). Jedná se o dlouhý úsek, nám stačí pouze střeť v komunikaci a cca 1-2 m od kraje vozovky (pro uložení obrub).
Prosím o CN.
Děkuji.

S pozdravem a přáním pěkného dne

Ing. Vít Duda
připravil staveb

COLAS

COLAS CZ

Ing. Vít Duda
výrobní příprava staveb
Kčm. 1111
E-mail:

COLAS CZ, a.s.
Rubežka 215/1, 190 00 PRAHA 9
adresa provozu: Lom a obalovna Čenkov, 250 70 Odolena Voda
www.colas.cz



From: Novotný Milan +
Sent: Wednesday, April 14, 2021 10:22 AM
To: DUDA, Vít (SGCZE)
Subject: RE: Žádost o vytýčení trasy kabelu cetin - Velký Borek - Měšnická Vrutice

ZAKÁZKOVÝ LIST

Dodavatel: Vegacon s.r.o. Novodvorská 1010/14 142 01 Praha 4		Oděmatele: COLAS CZ s.a. Dodací Adresa: Bankovní spojení: 74000016100 281770005 C225177005	
ICO: 25788810	Evidenční číslo:	203	ICODIC: 281770005 C225177005
IC: CZ - 25788810			Číslo objednávky
			Číslo fakt. předce
			Číslo jednací: 63554501
Název zakázky: Základní území St. Bolešev Vazec		Vytvoření podzemního vedení Otín	
CEHNKOVÉ POLOŽKY			
Číslo položky	Popis	MNOŽ	Cena bez DPH
	dopravné osobní vozidlo	12	84 1 000,00
	dopravní doprava osobní	750	1 750,00
	výběr materiálu	800	7 560,00
Výkon celkem Kč:			
Číslo položky	Popis	MNOŽ	Cena bez DPH
	směšovací barva	248	3 498,00
	barva vlnová	16	
Skutečná celková částka:			
Cena DPH	Výsledná cena bez DPH	DPH 21%	Výsledná cena včetně DPH
21%	1 000,00	211,00	1 211,00
21%	750,00	157,50	907,50
21%	5600	1176	6776
21%	498	104,52	602,52
21%			
Celková částka k úhradě		7856	9505,52
Podpis představeného: <i>L. B. 2021</i> Novotný Milan			
Datum a podpis: 25.05.2021		Převzatí zápisu: při jeho oprávněném zástupci	
Převzatí:		Souhlasím s vší cenou za provedení výkonu	
Datum a podpis:		Úhrada bude provedena:	
Zařídění:		a) úhradou faktury vystavené na základě Základního listu	
Datum a podpis:		b) v hotovosti v den provedení výkonu	
Datum a podpis:		<i>26.05.2021</i>	
Datum a podpis:		Datum: 25.05.2021	
Datum a podpis:		Jméno: n. Zelený	

ZÁPIS č. 5/2021

O VYTÝČENÍ PODZEMNÍCH VEDENÍ KOMUNIKAČNÍ SÍTĚ

ve vlastnictví společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

Dne 25.5.2021 bylo vytyčeno podzemní vedení komunikační sítě (dále jen PVKS)

v katastru obce St. Boleslav Veselá, okres Praha.

Přesně určené rozsahy vytyčení: (pokud nelze uvést zde, uvede se na druhé straně nebo v příloze) Počet příloh 76

Vytýčení tras dle výkresu - podle výtisků plánů

se vyznačí kabelem - kabelem sítě

Vytýčení bylo provedeno pomocí kabelového hledače a položených plánů na základě objednávky č.

ze dne 14.5.2021 žadatele COLAS CZ a.s., Ruželka 215/1 Praha9 Vysočany 190 00

pro akci 638645/21 a to ve všech místech požadovaných při vytyčení žadatelem nebo jeho oprávněným zástupcem, který si vytyčenou trasu na terénu vyznačí a za způsob a kvalitu tohoto vyznačení odpovídá. Zhotovitel, neodpovídá za případné přemístění vytyčovacího prvků a upozorňuje, že při práci v blízkosti PVKS je nutno dodržovat platné právní předpisy, zejména zákon č. 127/2005 Sb., o elektromagnetické kompatibilitě a o změně dalších souvisejících zákonů, Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o těžkých minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení a podmínky provozovatele sítě uvedené ve Vyhlášení o existenci PVKS.

č. 638645/21 ze dne 27.4.2021

Při pracích v blízkosti tras podzemních vedení komunikační sítě je zejména nutno:

- před zahájením prací je žadatel povinen zajistit prokazatelné seznámení pracovníků provádějící zemní práce s polohou PVKS na staveništi a s podmínkami práce v těsné blízkosti PVKS,
- zemní práce provádět podle podmínek uvedených ve Vyhlášení o existenci PVKS,
- zástupci provozovatele PVKS neprodělně oznámit případné polohování kabelů; v případě jeho nedosažitelnosti, oznámit polohování odlišovně poruch čísel: 800 184 084
- pomocné zařízení (pásky, kontrolní měřicí objekty, označnický, nadložní lana, uzemňovací soustavy spod.), které jsou součástí kabelové trasy, nesmí být bez vědomí provozovatele PVKS dočasně ani přemístěno.
- před zahájením pozvat zástupce provozovatele PVKS ke kontrole, tel.č. zástupce provozovatele sítě:

Další podmínky a informace: Milan Novotný

Zástupce dodavatele: Milan Novotný tel.:

Žadatel, nebo jeho oprávněný zástupce prohlašuje, že vytyčení bylo provedeno podle jeho požadavků a to na všech místech, kde podle projektové dokumentace může dojít k ohrožení PVKS.

V St. Boleslavě dne 25.5.2021

Vytýčení převzal a na terénu vyznačil:
(žadatel nebo jeho zástupce)

Za COLAS CZ a.s.
(úplná firma nebo název)

Jméno: p.žalo

Podpis:

Vytýčení provedl: Vagacom a.s.

Za dodavatele:

Jméno: Novotný

Podpis:

DODAVATEL IČ 47052945 DIČ CZ47052945

Ev. číslo 01-1-0000542

STAVOKOMPLET spol.s r.o.

Konst.symb.

Zakázka 01-0-0000580

Zápy 251

Var.sym. 110000542

250 81 Zápy

Objednávka 7067/97M

Česká republika

ODBĚRATEL IČ 2517005 DIČ CZ2517005

Peněžní ústav Komerční banka, a.s.

COLAS CZ, a.s.

Číslo účtu

Rubeška 215/1

IBAN

190 00 Praha - Vysočany

SWIFT kód KOMBCZPP

Česká republika

PŘÍJEMCE

Den splatnosti

23.07.2021

COLAS CZ, a.s.

Datum DPH

30.06.2021

Rubeška 215/1

Den vystavení

08.07.2021

190 00 Praha - Vysočany

Forma úhrady

Př. k úhr.

Česká republika

Kód operace

A - tuzemsko

Odběratelská cenová skupina

Povaha transakce

Dodací podmínky

Druh dopravy

vlastní

Číslo položky

Název

Alternativní číslo

Množství

MJ

Sleva na položce

Cena za mj

DPH

Celkem s DPH

Fakturuje Vám za práce kanalizačním vozem die ZL 7087/97M -

1

8 193,00

10%

9 012,30

REKAPITULACE DPH

10%

Základ

8 193,00

Daň

819,30

CELKEM

9 012,30

(zaokrouhleno)

0,00

CELKEM

CZK

9 012,30

Odběratel souhlasí, že celý předmět dodávky je výhradním vlastnictvím dodavatele až do úplného zaplacení faktury.

V případě prodlení s úhradou faktury budeme účtovat smluvní poplatek ve výši 0,05% z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení.

Složte na: vkladku / účtovku / účtenku

11 142 / 201213087

Razítko a podpis dodavatele

Vystavil(a) Michaela Cincibusová

Razítko a podpis odběratele

Stavokomplet spol. s r.o. Telefon 326906087-6 Fax 326906093

OR: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 14934, dne 25.11.1992

Odvoz a likvidace odpadů

Zakázkový list:

č.: 7087

ze dne: 25. 6. 2021

typ: 09/07

Dodavatel:

STAVOKOMPLET

Stavokomplet spol. s r.o.

o.z. Vodovody a kanalizace

š.p. 251

250 61 Zápy

Tel.: 326905698

IČO: 47052945, DIČ: 657-47052945

Odběratel:

Jméno: COLAS CZ a.s

Ulice: RUBŠHA 295/11

Město: PRAHA 9 19000

IČO:

DIČ:

Popis zakázky:

Práce kanalizačním vozem



MAN



TATRA

Předběžná cena: Kč

.....
podpis odběratele

Jízdné

z: BOL

do: BOL

a zpět

Příjezd na místo:

hod.

min.

Odjezd:

hod.

min.

Výpis prací:

Jednotka

počet jedn.

Sazba

Celkem Kč

Jízdní výkon

MAN

km

20

42

840

TATRA

km

/

/

/

Vývoz a likvidace

m³

/

/

/

Výkon na místě

MAN

1/4 hod

12

540

7080

např. oplach, ředění apod.

TATRA

1/4 hod

/

/

/

Voda k čištění

m³

7

39

273

Cena celkem bez DPH

8193,-

Zakázka převzata dne:

25. 6. 2021

Podpis dodavatele:

Podpis odběratele: (razítko):

Pozn.

(530) [signature]

Datum

Zápis Zhotovitele
Dnešního dne proběhlo předání stavební
muri investorem a ^{projektantem} ~~stavebnímu úřadu~~ viz
samostatný zápis

Dnešního dne proběhlo ^{schůzka} ~~schůzka~~ předání
BOP pro stavbu a seznámení s úkoly
viz samostatný protokol

Dle požadavku investora budou nové
betonové sil. objekty osazeny:

- 1) do stejné výšky jako stávající
- 2) v místech kde stávající objekty nejsou
budou v max. míře osazeny do stejné
výšky s obnovením vstupu, aby bylo
umožněno zanesení vody z komunikace
do příslušné zeleně podle komunikace
z tohoto důvodu je nutné vyčistit
kterékoliv IS.

T. Pecka

Dle požadavku Ředitel a PČR
stavba uzdelena oproti zadání dle
6 etap viz schválené DVO

Počasí: Polojasno - 11°C - 20°C

Průběh: 6⁰⁰ - 19³⁰ přestávka 11⁰⁰ - 12⁰⁰

Pracovníci: 1 THP Zábudka

2 strojníci

6 dělníci viz školní BOP

Subdodavatelé: DZ Meluz, Deko, Natika
Atos, DB doprava, Skel

Stroje: Auto a HP, fučka bagr, kotby, nákladník,
1x 6kol, 1x 8kol

Plán: - Montáž DVO etap 1 + 2
- Montáž zařízení stavební
- Obnovení přechytávacích proužků znaků

Datum

Počasí: Počasí + 12° + 24°C	9.6.2021
Pracovní doba: 6 ³⁰ - 17 ⁰⁰ přestávka 11 ⁰⁰ - 12 ⁰⁰	Středa
Pracovníci: 1 THP Zelená	
3 střižníci	
6 dělníků viz sholení Bozp	
Subdodavatelé: Efer, Deke, Wotylka, Aton	
Skotl, kapela	
Stroj: 2x lis, 2x kopie, 1x kolový kyp	
1x traktorový, 1x kolový vedlejší	
5x náves, 2. škol, 1x 6 kol	
Práce: - přemístění, sdov. odstraňování kyp	
1. etapa slon, 0,5 - 1,0	
- čistění kypů a od návesu	
2. etapa 1,8 - 3,1 km	
- kontrola zaberacího stavení	
a Div	
Zip: Zhotovitel	
Na základě vizuální prohlídky	
vyfotografování a vyčištění povrchu	
kommunikace 2. etapa slon 1,8 - 3,1 vlevo	
bylo se záměrem investice odstraňování	
povrchu slonů povrchu dle zúčastněných	
odkopem v tl. 150 mm a doplnění mt	
so 0-32 zymem ve vnitřní a vnější	
oblastech komunikace. Povrch v těchto	
místech povrchu a vlny bylo	
schledeno jako neúčinné	
T. Pecka	
Počasí: Jaro + 11° + 26°C	10.6.2021
Pracovní doba: 6 ³⁰ - 18 ⁰⁰ přestávka 11 ⁰⁰ - 12 ⁰⁰	Čtvrtek
Pracovníci: 1 THP Zelená	
4 střižníci	
6 dělníků	
Subdodavatelé: Deke, Wotylka, Aton, Skotl	
Efer, kapela	

Zápis Zhotovitele

bezohledem k budoucí mívalé komunikaci
a k nutnosti výměny nevhodných
obrub ve stávajících výjezdech je nutné
v těchto výjezdech rozebrat a následně
opětovně položit zpevnění povrchy
z žulových a velkoformátových dlažeb

V místech kde se bude zadržovat
voda z komunikace v místech kde
je snížení obrub je nutné upravit
(snížit) terén aby bylo možné
zadržování vody a bylo zabráněno
odtoku vody do výjezdů a stávků.

SD Souhrst S ÚTĚRŮSumace 2. etapu stavení 1,45 - 5,1 km úkro

1,45 - 1,87 km	120m x 2,7m v tl. 15m	324 m ²
1,87 - 2,44 km	40m x 1m v tl. 15m	40 m ²
2,44 - 2,925 km	125 x 1 v tl. 2 v 15m	250 m ²
2,925 - 2,955 km	30 x 1 v tl. 15m	30 m ²
2,955 - 3,05 km	85 x 1 v tl. 15m	85 m ²
		729 m²

Počasí: Jasně +16°C + 30°C

Pracovní doba: 6³⁰ - 14³⁰ přestávka 11⁰⁰ - 12⁰⁰

Pracovníci: 1 THP Zlouchez

5 stěpničků

14 dělníků

Subdodavatelé: Bitumex, FCL, Dehs,
Nohyba, Atoz, Skerl

Stroje: Samozběh, Distributor, kolový kypce
převodový kypce, trubkový kypce, 2x kolový
míchadec, vib. váleček, 2x 6 kol
1x B kol, 2x 6 kolový.

Staví Beleska

Datum

Býtin Zhotovitel

24.6.2021

Čtvrť

Úroveň 3. etapy vlnění u Lesůchle
st. č. 145 - 257 km 65 x 2,1 x H 2,15m
245 m²

Dnešního dne bylo provedeno dle dohody
čistění v m. vlnění korních mostů
při Dto. Čistění vlnění se nepodařilo
zpracovat jsou tedy netroubní.
Vlnění z korních mostů u těchto
místech dle dohody se zastavuje
incentem zúčastněných přes svícenou
obdobu dle přísl. zeleně

Dnešního dne bylo i stavkomplet
správně sítí VAK upraveno na propuly
komunikace u chodníků v místě nach
jejich sítí 1. etapy chodník
4. etapy komunikace
finan. Stavkomplet bude bylo propuly
účet dle sítí koprů po dohodě
se stavbou.

Vzhledem k většímu objemu prací
v 1. etape započneme s obnovením
židli Zhotovitel incentive o prodloužení
termínu realizace dle.
Některé budou dokončeny etapy intervencí
důl. Některé budou provedeny
extenzivně etapy 5. et. dle upravené
HMC.

~~BYDE DESENO DODATKEM SODS~~ T. Peck

Zájem zastupce inženýra o koprů 9
výštiněho pohládka komunikace 3. etapy
145 - 3,1 km v tance puvu u o pavlově
zahřít pedlačka koprů usfulkoví vstavy
dle SP v 1. etape 2. ke dni 25.6.2021

SOULHARME S TOLATKOU

Stavba Bolcalev

Datum

Zápis zhotovitele
 Zaslán zastupce investora o kvalitě
 podkladu komunikace 1. etapa z
 nat. SD 0-32 a o povolení
 zahájit podkladní asfaltové ložné vrstvy
 z nat. ACL 16 dle SP bez infiltrace
 poštů ka dni 30.6.2021

SOUPRAHA STAVEBNÍ. SP JE
 VYPOČTENÁ VYHODNĚNÍ K NĚKOLIKOSTI
 PŘEDVÍM

Počasí: Jasně +16°C +26°C
 Prac. doby: 6⁰⁰-18⁰⁰ přestávka 11⁰⁰-12⁰⁰
 Pracovníci: 2 THP Zelená, Fajt
 6 stavitelů
 10 dělníků viz školní Borš
 Lubodružství: Čekne, Transporter, Skel
 Dales, Naty, An, Alos

Stavby: finišer, 3x více válek, 3x kolon
 následní, křepice, kolon, bary
 tenzorový, 2x náves 1x Bkyl

Práce: - podkladní asfaltové ložné vrstvy
 z nat. ACL 16 dle SP 1. etapa
 st 0,3 - 1,04 km
 - provedení technické závlahy
 st. 1,75 - 3,1 km
 - 1. etapa oprava výjezdů
 poštů 20 a velkoformát
 dl.
 - kontrola zabezpečení stavení
 a Dio

Zápis zhotovitele

V etapě 2.4. je dle SP nutné
 zdemontovat převedení převedení. Polozka
 označená jako odhad 1 kpl. Práce je
 možné objednat pouze u správy a každá
 cena prací je několika mrob
 Bude useno jako výjezd

~~Práce~~ v stavbě

Počasí : Jaro - 16°C - 26°C

30.4.2021

Poc. doba : 6³⁰ - 18⁰⁰ přestávka 11⁰⁰ - 12⁰⁰

Pátek

Personál : 1 THP Zelená

2 stagiři

1 dělník

Subdodavatelé : Ktor, Motyka

Stroj : traktor, kotlík, lampa, samice

Práce : - sanace obíje komínů

- odstranění namočených (nesoudržných)
asf. vrstev na podkladě komínů- doplnění namočené podkladní vrstvy
z velkých zrn kamením dle 0-4
se zhrubněním- kontrola zabezpečení stavení
a Dia

Zpráva zhotovitele

Sanace etapu 5 most - 1.8 upraveno

Sanace koryty 20 m 2 vrstvy 30 0-32


145 - 160 šířka 1.5 $15\text{ m}^2 \times 2$ 30 m^2

Zatěhla BUS

50 x 1.0 = $40\text{ m}^2 \times 2$ 80 m^2

Obložka

39 x 2.4 výjezd 43.6×2 87.2 m^2 10 x 1.2 výjezd 23.9×2 47.8 m^2 18 x 1.8 přechod 44.4×2 88.8 m^2 Σ 442.8 m^2 Celková výměra sanace 442.8 m^2 v tl. 15 cm

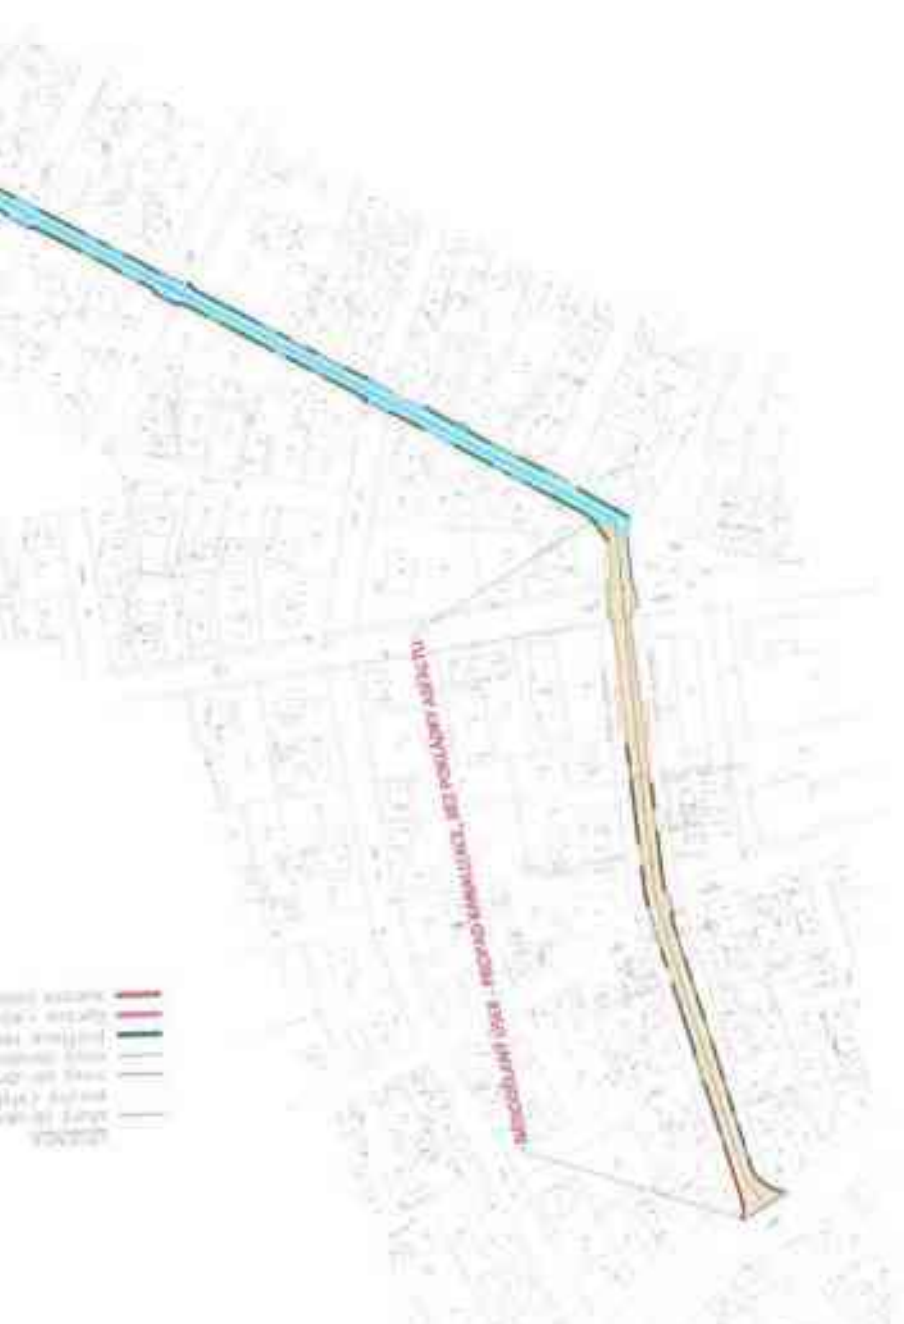

Scuhus 2



L 1553

Ekologická laboratoř PEAL s.r.o.
 Ú Vodojemu 914/15, 142 00 Praha 4
 tel: 608 074 344, 241 728 264, e-mail: info@peallab.cz
 Zkušební laboratoř č. 1553 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

Adresa: COLAS CZ, a.s.
 Rubeska 215/1
 190 00 Praha 9

Vzorek číslo: 2527/2021

Protokol o odběru č. 3705/2021

Místo odběru: III/2451 - Stará Boleslav - Nový Vestec

Odběr provedl: Šefr Martin, Ing. / PEAL

Přijem provedl: Matišová Renata

Klasifikace vzorku: pevný odpad

Legislativa / Hodnocení pevný odpad na povrch terénu - příloha č.10, tab. 10.1, vyhl. 294/2005 Sb. v platném znění (Pozn. 2)

SOP odběru vzorku: SOP VZ-ODP-01

Datum odběru: 24.5.2021

Datum příjmu: 25.5.2021 7:50

Datum zahájení rozborů: 25.5.2021 7:50

Datum ukončení rozborů: 23.6.2021

Protokol o zkoušce č. 3705/2021

chemické, fyzikální a jiné zkoušky

Název ukazatele	Jednotka	Výsledek	Výpis a označení limitní hodnoty Pozn.2)	Nejistota	Zpracováno dle SOP Pozn.1)
arsen	mg/kg suš.	5,2	max. 10 (LH)	30%	SOP AAS-kyveta-S
BTEX	mg/kg suš.	<0,20	max. 0,4 (LH)		SOP TOL-02
NEL (jako suma C10-C40)	mg/kg suš.	<30	max. 300 (LH)		SOP C1040-ZEM
EOX	mg/kg suš.	<1,0	max. 1 (LH)		SOP EOX-ZEM
chrom (AAS kyveta)	mg/kg suš.	24	max. 200 (LH)	30%	SOP AAS-kyveta-S
kadmium (AAS plamen)	mg/kg suš.	<0,40	max. 1 (LH)		SOP AAS-plamen-S
nikl (AAS plamen)	mg/kg suš.	20	max. 80 (LH)	27%	SOP AAS-plamen-S
olovo (AAS plamen)	mg/kg suš.	62	max. 100 (LH)	28%	SOP AAS-plamen-S
PAU (suma 12)	mg/kg suš.	1,59	max. 6 (LH)	30%	suhodávka S
PCB (suma kongenerů)	mg/kg suš.	0,0087	max. 0,2 (LH)	35%	SOP PCB-S
rtuť	mg/kg suš.	<0,10	max. 0,8 (LH)		SOP Hg-01
sušina	% hm.	93,9	x	2,0%	SOP SUŠINA-01
vanad	mg/kg suš.	32	max. 180 (LH)	25%	SOP AAS-kyveta-S

Legenda:

LH - Limitní hodnota

Zkoušky označeny (S) jsou srovnávací

Místo provedení zkoušek: Ekologická laboratoř PEAL s.r.o., Ú Vodojemu 914/15, 142 00 Praha 4

Místo provedení srovnávací: A.S. Czech Republic, s.r.o., Na Hradě 236/9, 190 00 Praha 9-Vyšehrad

Tento protokol není b) bez písemného souhlasu laboratoře reprodukován jinak než celý a výsledky se vztahují pouze ke zkušebnímu pobytu

Výsledky označeny hvězdičkou (*) představují limitní hodnoty uvedené v odkazu "Legislativa/Hodnocení" s) Pozn. 2) Při vyhodnocení byla zohledněna uvedená nejistota metody stanovení

Uvedená nejistota je rozšířená nejistota metody stanovení, která byla vypočtena za použití koeficienta rozšíření k=2, což odpovídá hladině spolehlivosti přibližně 95%.
 Hladina nejistoty vztahovaná není do uvedené nejistoty zahrnuta

Pozn. 1) Technické normy, ze kterých vychází přílohy SOP, jsou uvedeny v Příloze k Ověření o akreditaci, která je umístěna na webových stránkách www.cia.cz (akreditovaná subjekty zkušební laboratoře)

Pozn. 2) Výsledky jsou hodnoceny ve vztahu k platné legislativě a uvedeným limitním hodnotám. Pokud nejsou limitní hodnoty uvedeny, vyznačí se nejistota hodnoty

Tovary zkoušky (označeny „ov“) jsou prováděny v souladu s normou odběru

Údaje dle daní národních: místo odběru, datum a čas odběru (při v případě odběru zveřejní národním)



V Praze, 24.6.2021

Ing. Ivan Černý
 vedoucí laboratoře
 Protokol schválil



L 1553

Ekologická laboratoř PEAL s.r.o.

Ú Vodojemu 914/15, 142 00 Praha 4

tel: 608 074 344, 241 728 264, e-mail: info@peallab.cz

Zkušební laboratoř č. 1553 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

Adresa: COLAS CZ, a.s.
Rubeška 215/1
190 00 Praha 9**Vzorek číslo: 2528/2021****Protokol o odběru č. 3706/2021**

Místo odběru: III/2451 - Stará Boleslav - Nový Věsteč

Odběr provedl: Šefr Martin, Ing. / PEAL

Přijem provedl: Mattisová Renata

Klasifikace vzorku: pevný odpad

Legislativa / Hladnocení pevný odpad na povrch terénu - příloha č.10, tab. 10.2, vyhl. č. 294/2005 Sb. v platném znění (Pozn. 2)

Datum zahájení rozborů: 22.6.2021

SOP odběru vzorku: SOP VZ-ODP-01

Datum odběru: 24.5.2021

Datum příjmu: 25.5.2021 7:50

Datum ukončení rozborů: 25.5.2021 7:50

Protokol o zkoušce č. 3706/2021**chemické, fyzikální a jiné zkoušky**

Název ukazatele	Jednotka	Výsledek	Výpis a označení limitní hodnoty ^{Pozn.1)}	Nejistota	Zpracováno dle SOP ^{Pozn.1)}
sušina	% hm.	93,9	x	2,0%	SOP SUŠINA-01

mikrobiologické a biologické zkoušky

Název ukazatele	Jednotka	Výsledek	Výpis a označení limitní hodnoty ^{Pozn.1)}	Nejistota	Zpracováno dle SOP ^{Pozn.1)}
ekotoxikologické testy (subdod.)		vyhovuje	x		subdodávka S

Legenda:

> Zkoušky označeny (S) jsou subdodávky

> Místo provedení zkoušek: Ekologická laboratoř PEAL, s.r.o., Ú Vodojemu 914/15, 142 00 Praha 4

> Místo provedení subdodávek: ALS Czech Republic, s.r.o., Na Hradě 236/9, 190 00 Praha 9-Vyšehrad

> Tento protokol nemá být bez písemného souhlasu laboratoře reprodukován jinak než celý s výsledky se vztahují pouze ke konkrétním položkám

> Výsledky označeny hvězdičkou (*) představují limitní hodnoty uvedené v odkazu "Legislativa a Hladnocení" viz Pozn. 2) Při vyhodnocení se tyto hodnoty uvádějí nejistota metody zanedbává

> Uvedená nejistota je rozšířená nejistota metody stanovení, která byla vypočtena na posuzování konformity vzorkem k¹/Z, což odpovídá střední spolehlivosti přibližně 95%
Hodnota nejistoty vyznačená není do uvedené nejistoty zahrnuta

> Pozn. 1) Technické normy, ze kterých vychází přílohy SOP, jsou uvedeny v Příloze k Ověřování a akreditaci, která je umístěna na webových stránkách www.als.cz (akreditované subjekty/zkušební laboratoře)

> Pozn. 2) Výsledky jsou hodnoceny ve vztahu k platné legislativě a uvedeným limitním hodnotám. Pokud nejsou limitní hodnoty uvedeny, výsledky nejsou hodnoceny

> Tyto zkoušky (označeny "jiné") jsou prováděny zkušebním na místě odběru

> Údaje slouží zákazníkovi: místo odběru, datum a čas odběru (přes a případně odběr vzorku zákazníkovi)

Poznámka: Vzorek je totožný se vzorkem 2527

Ve vzorku byly prováděny ekotoxikologické testy s vyhovujícím výsledkem (protokol o zkoušce ALS PR2148516).

V Praze, 24.6.2021

Ing. Ivan Černý
vedoucí laboratoře
Protokol schválil

Výběr z archivu

04.02.2021 11:00

Dne: 03.09.2021 11:55

Podmínka: platné záhlaví, období od 01.06.2021 0:00 do 31.08.2021 23:59, odběratel - název: COLAS CZ, s.s., platba fakturou, Služba: Odvoz

Datum:	Vůz:	Zboží	odběratel - název	MČ hlášení - název	Stavba - název	V. list	Netto [t]	Z. v. [t]
31.08.21 13:36	7H41893	17 01 07	COLAS CZ, s.s.	Vinof (V)	TV Vinof - 201211774	242484	11,82	24,90
23.08.21 16:07	8AD5996	17 03 02	COLAS CZ, s.s.	Poleřady		242175	3,88	10,30
13.08.21 16:52	3AE8343	17 03 02	COLAS CZ, s.s.	Stará Boleslav	Veselcká 201213067	240885	12,74	26,22
13.08.21 9:57	7H41893	17 01 01	COLAS CZ, s.s.	Vinof (V)	TV Vinof - 201211774	240890	3,22	10,38
13.08.21 8:13	7H41893	17 01 01	COLAS CZ, s.s.	Vinof (V)	TV Vinof - 201211774	240842	8,29	21,44
12.08.21 13:26	7H57586	17 03 02	COLAS CZ, s.s.	Stará Boleslav	Veselcká 201213067	240745	11,70	24,76
11.08.21 16:48	3AK7583	17 03 02	COLAS CZ, s.s.	Brandýs nad Labem (Bn)	Stará Boleslav (Brandýs)	240508	8,76	23,48
09.08.21 13:57	3AE8343	17 03 02	COLAS CZ, s.s.	Stará Boleslav	Veselcká 201213067	240055	14,30	27,78
07.08.21 14:28	3L35942	17 03 02	COLAS CZ, s.s.	Stará Boleslav (Brandýs)		238891	5,34	12,80
03.08.21 14:02	3AK7583	17 03 02	COLAS CZ, s.s.	Brandýs nad Labem (Bn)	Stará Boleslav (Brandýs)	238514	2,94	17,66
Počet vozů		10	Celkem netto:				83,18	

140302 (ZIVICIE PRŮJEDNÁ) 3,98 tun 211 211169 PŘEČAS
4 PŘAHL

140302 55,78 tun 207213067 ST. BOLESLAV

140101 11,50 tun
140107 11,92 tun } 207211774 TV VINOF

Bilance podle položky: odběratel - název

D&Z spol. s r.o.

Období: Od: 01.08.2021 0:00
Do: 31.08.2021 23:59

Podmínka: Období od 01.08.2021 0:00 do 31.08.2021 23:59, odběratel - název=COLAS CZ, s.s., platba=faktura

odběratel - název	Zboží	Cena bez DPH	Netto [t]	Počet vozů
COLAS CZ, s.s.				
17 01 01	Beton (prostý) v kusovosti DO 50 cm čistý	2 357,50 Kč	11,50	2
17 01 07	Štěr stavební čistá - směs cihel, betonu, keramických výrobků	3 933,50 Kč	11,82	1
17 03 02	Asfalt (živé kry) bez dehtu	26 774,40 Kč	55,70	6
17 03 02 (2)	Asfalt - živice hřezovaná	1 094,50 Kč	3,88	1
4-3	Recyklat betonový (Betonové drt) 0/63 CErt063	29 482,20 Kč	268,02	20
		63 642,20 Kč	351,20	30
		Celkem:	351,20	30

Bilance podle položky: odběratel - název

D&Z spol. s r.o.

Období: Od: 01.08.2021 0:00
Do: 31.08.2021 23:59

Podmínka: Období od 01.08.2021 0:00 do 31.08.2021 23:59, odběratel - název=COLAS CZ, s.s., platba=faktura, Sklad=Odstavy

odběratel - název	Zboží	Cena bez DPH	Netto [t]	Počet vozů
COLAS CZ, s.s.				
17 01 01	Beton (prostý) v kusovosti DO 50 cm čistý	2 357,50 Kč	11,50	2
17 01 07	Štěr stavební čistá - směs cihel, betonu, keramických výrobků	3 933,50 Kč	11,82	1
17 03 02	Asfalt (živé kry) bez dehtu	26 774,40 Kč	55,75	6
17 03 02 (2)	Asfalt - živice hřezovaná	1 094,50 Kč	3,88	1
		34 160,00 Kč	83,18	10
		Celkem:	83,18	10

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

COLAS a.s.
Rubeška 215/1
190 00 Praha 9

Váš dopis značky / ze dne:

Naše značka
721/KSUS/MHT/Pec

Vyřizuje/telefon:
Peckař

Praha

Věc: „III/2451 – Stará Boleslav“ – Pokyn (ZBV č. 2)

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje jako správce a zároveň zástupce Středočeského kraje jako vlastníka nemovitostí, tj. předmětné komunikace č. III/2451, Vám tímto v souladu s článkem 6.8. smlouvy o dílo č. S-383/00066001/2021 vydává **Pokyn** k zajištění technického řešení a pokračování ve výše zmíněné akci při zpracování změn během výstavby na stavebním objektu:

III/2451 – Stará Boleslav

Na základě Oznámení zhotovitele o vhodnosti změny :

1.) při osazení obrub do úrovně asfaltového povrchu komunikace pro završkování vody z komunikace do zelených ploch

- zemní práce a modelací terénu v rámci postranního zeleného pásu
- výškovou úpravu přilehlých zpevněných sjezdů (rozebrání, očištění a novou pokládku dlažby)

2.) změna technologie sanace podkladních vrstev – vrstva ACP16+ nebyla vůbec prováděna, materiál byl nahrazen vrstvou ze ŠD a SC C.

3.) během stavby nebyl na základě provedeného rozboru prokázán nebezpečný odpad a z tohoto důvodu bude tato položka odečtena

4.) změna postupu při frézování: z původně navržené tl. 12 cm v extravilánu, bylo frézováno pouze 6 cm, aby nedošlo k oslabení stávající nestmelené konstrukce

5.) provedení styčných (pracovních) spár: změna v rozsahu prováděných prací – dle zaměření skutečného stavu

6.) vytyčení inženýrských sítí při osazení silničních obrub, z důvodu zabránění jejich případnému poškození

7.) nefunkčnost 2 UV v blízkosti dálničního mostu - pro zajištění jejich funkčnosti bylo nutné provést jejich strojní vyčištění

vydáváme tímto pokyn k provedení těchto úprav a ke zpracování ZBV

Rozsah změn během výstavby bude stanoven na základě skutečného zaměření stavby nebo správcem schválené realizační dokumentace.

Cenově musí změnu posoudit příslušné majetkové oddělení objednatele.

S pozdravem

Lenka Chmelová
Vedoucí oblasti Mnichovo Hradiště

Foto sanovaných míst ze šterkodrti



Foto sanovaných míst z kameniva zpevněného cementem



Foto úprav za mostem kvůli odvodnění + úprava přilehlého vjezdu



Foto terénních úprav za novými obrubami a úprava vjezdů





Foto povrchových znaků (vytýčených nebo skrytých)



SUBSTITUČNÍ PLNÁ MOC

Ing. Pavel Keller

Ředitel oblasti Sever

Datum narození:

bytem

v souladu s plnou mocí ze dne 15.12.2020, která mu byla udělena zmocnitelem společnosti COLAS CZ, a.s., IČO: 261 770 05, se sídlem Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556 (dále jen „Společnost“) tímto dále zmocňuje

Pavla Lněničku

Manažera regionu Praha

Datum narození:

bytem

(dále jen „Zmocněnec“)

k zastupování Společnosti dle bodu g) přiložené plné moci k ukončení stavební akce a k projednání změn během výstavby na akci III/2451 Stará Boleslav.

Tato plná moc je platná do 30.6.2022

V Praze, dne 15.11.2021

Ing. Pavel Keller

Zmocnění v celém rozsahu přijímám.

Pavel Lněnička

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby: III/2451 - Stará Boleslav Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101 - Komunikace	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 101/3	Číslo ZBV: 3
---	---	----------------------------

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov
IČ: 00066001

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.
Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9
IČ: 26177005

Rekapitulace ZBV č. 3 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3.1	0,00	0,00	0,00
3.2	0,00	0,00	0,00
3.3	-862 979,83	112 260,35	-750 719,48
3.4	0,00	0,00	0,00
3.5	0,00	0,00	0,00
Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3	-862 979,83	112 260,35	-750 719,48

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré:

1

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: III/2451 - Stará Bolešlav Název stavebního objektu/provozního souboje (SO/PS): Komunikace		Číslo SO/PS / Úloha Změny SO/PS: 101/3	Číslo ZBV: 3.3		
Stavby smlouvy o dílo objednatel č.: 5-383/00099001/2021 a zhotovitel č.: 201213897 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 1.3.2021 (máje jen Smlouva). Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov Zhotovitel: COLAS CZ, a.s., Rubešská 215/1, 190 00 Praha 9					
Přehled Změnového listu		Part. č. 1, 2 3 4	Příjemce: Objednatel Zhotovitel Stavební dozor		
1. Krycí list 2. Změnový list 3. Zápis o projednání ocenění soupravy prací 4. Rozpis ocenění Změn položek ZBV 3 5. Přehled zařízení změn do skupin 6. Přehled statků dokladů Další doklady dle přílohy dokladů		1 počet listů 2 počet listů 1 počet listů 1 počet listů 1 počet listů 1 počet listů 11 počet listů			
Iniciátor změny: Zhotovitel Popis a zdůvodnění Změny:					
Zdůvodnění ZBV3: Změny pro dokončení díla Díliční změna č.1 - propad kanalizace na části úseku a přerušení stavby Během stavební činnosti došlo k náhlému propadu kanalizace bez cizího zavření v ulici Okružní a stavební činnost tak musela být přerušena. Po porušení kanalizace správcem byl úsek kanalizace označen za havarijní a z tohoto důvodu byla nutná její celková oprava. Na základě tohoto zjištění bylo rozhodnuto o přerušení prací a uvolnění prostoru pro spád. Stavokomplekt, který zajišťuje celkovou opravu kanalizace. Vzhledem k výše uvedené skutečnosti vyvstaly další vícenásledky na stavbu. Oprava kanalizace probíhala v zimním období a tak dokončení obnovy komunikací připadalo nejdříve na jaro roku 2022. Z tohoto důvodu došlo ke zrušení zařízení staveníště a odvozu mechanizace. Dále bylo nutné odvézt nadporučovaný materiál ze SO, který se měl v této části aplikovat. Po předložení CN na jaro tohoto roku na celkovou opravu komunikace vč. podkladních vrstev bylo rozhodnuto, že v rámci této veřejné zakázky není možné dílo naší společností dokončit a bude nutné vyplatit nové VR. Tato změna se týká položek 56, 57, 58 a 59 a zvyšuje cenu díla o 141 182,64 Kč.					
Díliční změna č.2 - ponížení rozsahu opravovaného asfaltu Původní předpoklad dle zadávací dokumentace bylo, že se bude rekonstruovat 18021,6 m ² asfaltového povrchu. Z geodetického zaměření skutečného provedení však vyplynulo, že skutečný rozsah opravovaných ploch byl 17 328,5m ² . Touto změnou došlo k ponížení položek č. 21, č. 22 a č. 25, popř. již byly poníženy v rámci ZBV 2. Tato změna snižuje cenu stavby o 535 188 Kč.					
Díliční změna č.3 - montáž a demontáž LED světel do vozovky a přechodu pro chodce V zadávací dokumentaci bylo uvažováno s demontáží a opětovnou montáží LED světel ze vozovce u stávajícího přechodu pro chodce. Odhad ceny na tyto práce byl stanoven na 29 770 Kč. Před realizací těchto prací byla oslovena správcevozká firma, která vyhotovila CN, dle které byla upravena cena dle skutečnosti. Přerušením stavby však nedošlo k finálnímu nainstalaci LED diod a proto bude fakturována pouze demontáž. Tato díliční změna mění položku č. 23 a snižuje smluvní rozpočet o 1 797,4 Kč.					
Díliční změna č.4 - změna rozsahu vodorovného DZ V zadávací dokumentaci se předpokládalo provedení stření dílčí čáry v celém úseku opravované komunikace. Z nedostatečných síťových poměrů netze ve všech místech střední dílčí čáry provést a z tohoto důvodu byla nepřiměřená délka odečtena. Dále nebylo prováděno vzhledem k přerušení díla i vodorovné dopravní značení a plastu a to v celém rozsahu. Tato díliční změna mění položky č. 21 a 32 a snižuje smluvní rozpočet o 308 482,42 Kč.					
Díliční změna č.6 - oprava polymerbetonového žlabu V zadávací dokumentaci se předpokládalo provedení opravy polymer betonového žlabu. Z důvodu přerušení a předčasného ukončení stavby se již oprava nebude realizovat. Tato díliční změna mění položku č. 36 a snižuje smluvní rozpočet o 17 512 Kč.					
Jedná se o Změnu nepodstatnou, která je podle § 5, odst. 1 písm. c), resp. podle § 10 Smluvní R-5m-35 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29. 06. 2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek zařízení do skupiny 3 jako změna z nepředvídaných důvodů. Zároveň se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a to z důvodu nepředvídaných fyzických podmínek vzniklých na stavbě v Údaje v Kč bez DPH:					
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných		
-862 979,83	112 260,35	-750 719,48	975 240,18		
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:					
Zhotovitel (stavitel/vedoucí): COLAS CZ, a.s.	Jméno	Petr Žaloudík	datum	2.6.2022	podpis
Stavební dozor: KSUS SK	Jméno	Tomáš Pačka	datum		podpis
Zastupce Objednatel: KSUS SK vlastní TSQ oblasť M.H.	Jméno	Lenka Chmrdlová	datum		podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zavedeny, upraveny a oceněny v dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje doplněk Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitel sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojí příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.					
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel)	Jméno	Hlg. Jan Lichneger	datum	16. 06. 2022	podpis
Zhotovitel	Jméno	Pavel Lhémčka	datum		podpis
					Číslo pa

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 3

Název Stavby: III/2451 - Stará Boleslav
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 101/3
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Komunikace

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
12 360 707,31

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	-798 475,48	2 726 944,17	14 288 176,00	1 928 468,69

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-862 979,83	112 260,35	2 839 204,52	22,97%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-1 661 455,31	13 538 456,52	1 177 749,21	9,53%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):
COLAS CZ, a.s.

souhlasím

Petr Žaloudek

2.6.2022

Stavební dozor:
KSUS SK - silniční technik

souhlasím

Tomáš Pecka

Zástupce Objednatel:
vedoucí TSU oblasti M.H.

souhlasím

Lenka Chmelová

Zaměstnanec KSUS SK
odpovědný za cenové
projednání Změny:

souhlasím

Ing. Jaroslava Jurková

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV 3.3													ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)			
Evidenční číslo a název stavby: III/2451 - Stará Boleslav													č. 1			
Číslo a název SO/PS: SO 101 - Komunikace													Skupina Změn: 3			
Číslo a název rozpočtu: SO 101 - Komunikace																
Por. č. pol.	Název položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny odporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
Položky dle SO																
21	572234	SPLOVNÍ POŠTŘÍ Z MODIFIK. EMULZE DO 1,0KG/M2	m2	18621,600	17328,500	-1293,100	9,00	167 594,40	-11 637,90	0,00	155 956,50	-11 637,90	-6,94%			
22	574445	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUBNÉ VRSTVY AČL 18 TL 50MM	m2	18621,600	17328,500	-1293,100	183,00	3 407 752,80	-236 637,30	0,00	3 171 115,50	-236 637,30	-6,94%			
25	574085	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY AČL 16 TL 70MM	m2	11805,800	10513,500	-1292,400	222,00	2 620 908,80	-286 912,80	0,00	2 333 996,00	-286 912,80	-10,95%			
27	742334	VEDENÍ VENKOVNÍ VL. PŘÍSVĚTLENÍ PŘECHODU (odhad)	kp	1,000	0,940	-0,060	29 770,00	29 770,00	-1 797,80	0,00	27 972,20	-1 797,80	-6,04%			
31	815111	VODODROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	m2	1174,500	988,325	-186,175	81,00	106 878,50	-16 031,93	0,00	90 846,58	-16 031,93	-15,00%			
32	815211	VODODROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PĚŠTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	m2	1174,500	0,000	-1174,500	349,00	292 450,50	-292 450,50	0,00	0,00	-292 450,50	-100,00%			
38	82544	ŽLABY Z DILCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 150MM VČETNĚ MŘÍŽ (odhad)	m	4,000	0,000	-4,000	4 378,00	17 512,00	-17 512,00	0,00	0,00	-17 512,00	-100,00%			
Nové položky - OTSKP 2021-I																
56	12573A	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SĚLADEK TB. I - BEZ DOPRAVY	m3	0,000	122,720	122,720	84,00	0,00	0,00	10 308,48	10 308,48	10 308,48	100,00%			
57	12573B	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SĚLADEK TB. I - DOPRAVA	m3m	0,000	4540,640	4540,640	16,30	0,00	0,00	73 558,37	73 558,37	73 558,37	100,00%			
58	00530	STAVEBNÍ STROJE MOBILNĚ NA ZEMNÍ PRÁCE	kp	0,000	1,000	1,000	9 706,00	0,00	0,00	9 706,00	9 706,00	9 706,00	100,00%			
59	02940	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	kp	0,000	1,000	1,000	18 687,50	0,00	0,00	18 687,50	18 687,50	18 687,50	100,00%			

Odpovědný zástupce Obce/zastupce Zřizovatele odsouhlasí skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřující předkládanou změnu.

Podřízují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změn.

Za Zhonivitefe: Petr Šimodek, [stavbyvedouci]

Date: 2.6.2022

Podpis:

Za Objednatele: Tímár Péter, (TOL, technik KISÚS)

Returns

Padova

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: III/2451 - Stará Boleslav

1	Přijaté smlouvi částka bez rezervy a DPH	12 360 707,31
2=1+19+20	Aktuální smlouvi částka (jmena stavby)	13 535 555,94
	Aktuální smlouvi částka (jmena stavby) včetně DPH	16 741 589,32
3=(21)/100	Procento změny Přijaté smlouvi částky	111,93%
4=(3)/100	Středování vybraných změn (Skupina 1)	0,00%
5=(3)/100	Středování zůstatky počet (Skupina 2)	0,00%
40=(18)/100	Středování limitu 30 % pro souhrnnou změnu pro Změny záporné vše 9 (14, 16, 17, 18, 19, 20)	-13,94%

8=(32)/100	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	1 177 749,21
9=(8)/100	Středování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	0,00%
9=1/30	Základní limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	3 703 212,18

8=(33A)/100	Středování limitu 50 % Skupiny 3	36,41%
10=(33A)/100	Středování limitu 50 % Skupiny 4	0,00%
100=(32A)/30	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	4 603 658,83
11=1/50	Základní limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	8 185 353,68

12=(17)/100	Středování limitu 15 %	1 854 106,19
13=(33B)/100	Středování limitu 140 448 000	0,00%
14=(33B)/100		140 448 000,00

SO	ZBV L	Název SO/PS / představitel Změny	Změny záporné (začíná se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	- 1 - Výhodné změny (Změny) vše 500 až 999 (1) (skupina 1, 13A/2018 SK)			- 2 - Základní změny (Změny) vše 500 až 999 (1) (skupina 1, 13A/2018 SK)			- 3 - Změny nepřehledné (Změny) vše 500 až 999 (1) (skupina 1, 13A/2018 SK)				- 4 - Změny nepřehledné (Změny) vše 500 až 999 (1) (skupina 1, 13A/2018 SK)				- 5 - Změny nepřehledné (Změny) vše 500 až 999 (1) (skupina 1, 13A/2018 SK)		
						Změny záporné (začíná se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (začíná se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (začíná se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (začíná se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (začíná se znaménkem minus)	Změny kladné	Limit 15 %
16	17	18	19=24+25+26+27	20=24+27+30+34+37+38	21=19+20	22	23	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	32=29+30	33A=ABS(29)+32	31	34	36=33+34	38A=ABS(31)+36	37	38	39=ABS(37)+38
		0,00	- 1 681 405,19	3 134 846,84	1 453 151,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1 681 405,19	3 134 846,84	1 453 151,65	4 603 658,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	1	Provedení / vyzkoušení úpravy a stavby a provedení stavby	0,00	2 132 900,29	2 132 900,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 132 900,29	2 132 900,29	2 132 900,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	2	Provedení / stavby, včetně výhledy, terénu, letadla, přístřeší, jedny	- 798 475,46	701 849,30	- 96 626,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 798 475,46	701 849,30	-86 626,16	1 282 918,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	3	Provedení / stavby pro dopravu a dle	- 482 579,03	112 280,33	- 370 298,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 482 579,03	112 280,33	-370 298,70	370 298,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Poznámka: Formát na výpočetní charakter a obsah stav k datu předání Změny do SO.

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	2
Název a evidenční číslo stavby:	III/2451 - Stará Boleslav
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Komunikace
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	101/3

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
07 Soupis prací SO po změnách	8	
08 CN - Gornex - demontáž LED diod	1	
09 Pokyn objednatele	2	
10 Geodetické zaměření skutečného provedení	-	V tištěné podobě u objednatele.
Počet listů celkem	11	

Rozpis ocenění Změn položek - celkem													
Evidenční číslo a název stavby: III/2451 Stará Boleslav-Nový Vestec Číslo a název SO/PS: SO 101 - Komunikace Číslo a název rozpočtu: SO 101.3 - Komunikace								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								SO 101/3					
								celkem					
Poř. č. položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílů	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
12	113728 PRÉŽOVÁNÍ VOZOVKY ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM	m3	2179,820	1771,446	-408,374	543,00	1 183 942,26	-221 747,08	0,00	962 195,18	-221 747,08	-38,78%	
	pozn. 113728 - odpočet m3 za frézování, v množství frézování 7732,3*0,25 = 925,875 m3, v zateřování frézování v dl. 3,07 m, 12071*0,07=845,57 m3. Celkem výřezovano 1771,446 m3. Rozdíl frézování = 2179m3 - 1771,446 = -408,374 m3 = [A] výměry přirozaty z geometrických vodorovných úst. provedení, ve stálosti 2,50:31hodně provedených prací - ZPV 2												
13	113761 PRÉŽOVÁNÍ DRAŽBY PRŮŘEZU DO 200MM V ASFALTOVÉ VOZOVCE	m	5100,000	3400,000	-1700,000	26,00	132 600,00	-44 200,00	0,00	88 400,00	-44 200,00	-33,33%	
	pozn. 113761 - provedeno frézování dražby v délce 3150 m - přirozaty úspora, 316 m. frézování dražby provedeno v napojení křižovatky, 3150 m = 250 m = 3400 m, 3400 - 1100 = -1700 m = [A] ZPV 2												
14	11822 ČISTĚNÍ KRAJNIC OD NÁHOSU TL DO 100MM	m2	4012,500	4012,500	0,000	48,00	192 600,00	0,00	0,00	192 600,00	0,00	0,00%	
15	132738 HLUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I ODVOZ DO 20KM	m3	263,850	523,537	259,687	329,00	86 806,85	0,00	85 437,02	172 243,87	85 437,02	98,42%	
	pozn. 132738 - Hloubení pro provedení sanací jednotlivých vrstev, rozsah a poloha viz. detail č.10. Situace prováděných prací, výkopy pro sanaci ze 50 = 254,833 m3, výkopy pro sanaci z 50 C = 31,398 m3, celkem výkopy pro sanaci 254,833+31,398 = 286,231 m3 = [A] Celkový výkop ze nejméně 60 cm v dl. 410,1 m = 128 m (viz pozn. 35) = 329,1, 329,1*0,3*0,3 = 28,759 m3 = [B] Celkem odkop = [A]+[B] = 286,231+28,759 = 259,687 m3 = [C] ZPV 2												
16	18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNĚ TR. I	m2	1000,000	2198,350	1198,350	17,00	17 000,00	0,00	20 371,95	37 371,95	20 371,95	119,84%	
	pozn. 18110 - úprava pláň při sanaci jednotlivých vrstev, rozsah a poloha viz. detail č.10. Situace prováděných prací, Výměra hutnění ZP při sanaci = 87,6+83,2+7,5+21+2,3+4,3+46,15+90+31,6+34,4+23,4+324+40+138,5+125+30+8,6 = 1198,35 m2 = [A] ZPV 2												
17	56331 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKOPRSTI TL DO 50MM	m2	7364,000	7364,000	0,000	49,00	331 380,00	0,00	0,00	331 380,00	0,00	0,00%	
18	56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKOPRSTI TL DO 150MM	m2	1000,000	2437,250	1437,250	149,00	149 000,00	0,00	214 150,25	363 150,25	214 150,25	143,73%	
	pozn. 56333 - vozovkové vrstvy ze 50 při sanaci, rozsah a poloha viz. detail č.10. Situace prováděných prací, Výměra sanace ze 50 = 87,6+83,2+7,5+30+4,3+66,15+180+147,2+38,8+46,8+134+40+138,5+125+30+8,6 = 1437,250 m2 = [A] ZPV 2												
19	50960 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU	m3	401,250	401,250	0,000	66,00	267 232,50	0,00	0,00	267 232,50	0,00	0,00%	
20	572131 INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,5KG/M2	m2	19621,600	12051,600	-7570,000	13,00	255 080,80	-98 410,00	0,00	156 670,80	-98 410,00	-38,58%	

Rozpis ocenění Změn položek - celkem													
Evidenční číslo a název stavby: III/2451 Stará Boleslav-Nový Vestec								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: SO 101 - Komunikace								SO 101/3					
Číslo a název rozpočtu: SO 101.3 - Komunikace								celkem					
Posl. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílů	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
28	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLADPŮ	kus	35,000	41,000	11,000	3 205,00	96 185,00	0,00	96 266,00	131 446,00	35 266,00	36,67%
		pol. 89921 - výšková úprava pokladpů, napočítáno dle geometrického zaměření, viz: doklad č.10; Situace prováděných prací. Celkem provedeno 41 ks = [A] 28v 2											
29	89922	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MRŽÍ	kus	11,000	12,000	1,000	2 510,00	27 610,00	0,00	2 510,00	30 120,00	2 510,00	9,09%
		pol. 89922 - navýšení počtu skutečně rekonstruovaných mrží UV, napočítáno dle geometrického zaměření, viz: doklad č.10; Situace prováděných prací. Celkem provedeno 12 ks = [A] 28v 2											
30	89923	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA BRÝČEK HRNČŮ	kus	46,000	58,000	12,000	1 123,00	51 658,00	0,00	13 476,00	65 134,00	13 476,00	26,09%
		pol. 89923 - navýšení počtu skutečně rekonstruovaných brýček; Situace a typy prací, napočítáno dle geometrického zaměření, viz: doklad č.10; Situace prováděných prací. Celkem provedeno 58 ks = [A] 28v 2											
31	915211	VOZOVKOVÉ DORFAVNÍ ZNAČENÍ BARIÉROU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	m2	1174,500	898,325	-276,175	31,00	204 279,50	-10 031,93	0,00	90 647,58	-10 031,93	-15,00%
		pol. 915211 - odpóčet za neprovádění Voz. barierou na nadukončeníem úseku - 176,175 m2 [A] 28v 3											
32	915211	VOZOVKOVÉ DORFAVNÍ ZNAČENÍ PLATYEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	m2	1174,500	0,000	-1174,500	249,00	292 450,50	-292 450,50	0,00	0,00	-292 450,50	-100,00%
		pol. 915211 - odpóčet za neprovádění Voz. platem na celém úseku - -1174,5 m2 [A] 28v 3											
33	917224	SLUNČNÍ A CHODÁKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠR 150MM	m	1550,000	1510,900	-319,100	400,00	780 000,00	-127 640,00	0,00	652 360,00	-127 640,00	-16,36%
		pol. 917224 - s rozpočtu uvažováno z 1050 m, dle geometrického zaměření provedeno 1510,9 m; 1510,9 - 1050 = -439,1 m = 120 m předpoklad pro dokončení v úseku s propadlou kanalicí - -439,1+320 = -119,1 [A] 28v 2											
34	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	m	125,000	125,000	0,000	24,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
35	931312	TĚSNĚNÍ DLATAC VPAK AM ZÁLVKOU PRŮR DO 200MM2	m	3150,000	3400,000	250,000	31,00	97 650,00	0,00	7 750,00	105 400,00	7 750,00	7,94%
		pol. 931312 - průměrná těsnění spár v šířce 3150 m - provedení práce 250 m těsnění spár provedeno v napájení betonů 340, 3350 m + 250 m = 3400 m; 3150 - 3400 = -250 m = [A] 28v 2											
36	93544	DLAŽE Z OÚCO Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 1500MM VČETNĚ MRŽÍ	m	4,000	0,000	-4,000	4 378,00	17 512,00	-17 512,00	0,00	0,00	-17 512,00	-100,00%
		pol. 93544 - Odpóčet za neprováděnou výměnu šikových dlažeb											
37	93818	OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETEREM	m2	18622,000	18622,000	0,000	4,00	74 488,00	0,00	0,00	74 488,00	0,00	0,00%
		Nové položky - /C dle ÚRS 2021/II						0,00	0,00	398 440,81	398 440,81	398 440,81	100,00%

Rozpis ocenění Změn položek - celkem													
Evidenční číslo a název stavby: III/2451 Stará Boleslav-Nový Vestec								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: SO 101 - komunikace								SO 101/3					
Číslo a název rozpočtu: SO 101.3 - komunikace								celkem					
Por. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
38	572243111	Prostřední vypravení neupravených výtluků asfaltovým betonem ACO (A8)	t	0,000	6,000	6,000	4150,000	0,00	0,00	24 900,00	24 900,00	24 900,00	100,00%
		Vypravení výtluků na objemové frace pro dopravu na celkové DČ - geometrická kombinace ROPIC, plocha 48 m ² , tl. 8,00 m, obj. množství 1 m ³ ACO = 2,3 + 48*0,08*2,5 = 4 t (A) 28V 2.											
45	587122134	Podklad ze směsi stlačené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m ²	0,000	223,950	223,950	317,00	0,00	0,00	70 992,15	70 992,15	70 992,15	100,00%
		pol. 587122134 - provedení vrstvy SC C + mixt (směs podkladních směr., rozptýl a jemná vr. dle tab. 1.10. Situace prováděných prací. Vyměra směr. z SC C = 57,8+83,2+1,5+4+4,9+66,15 = 223,95 m ² (A) 28V 2.											
46	113170342	Odstavení podkladu živičného tl 100 mm strojní pí do 50 m ²	m ²	0,000	10,380	10,380	70,38	0,00	0,00	729,71	729,71	729,71	100,00%
		pol. 113170342 - odstranění asfaltového betonu ve výtluku za mostem o ploše = 10,38 m ² (A), viz. doklad 1.10. Situace prováděných prací.											
47	997013645	Poplatek za uložení na skládce (akumulace) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17.03.02	t	0,000	23,874	23,874	2 310,00	0,00	0,00	55 148,94	55 148,94	55 148,94	100,00%
		Pol. 997013645 - Nakládání za vyburání asfaltového betonu ve výtluku za mostem o ploše = 10,38 m ² , viz. doklad 1.10. Situace prováděných prací. Měrná hmotnost za ukl. betonu je 2,3 t/m ³ . Výpočet: 10,38*2,3 = 23,874 t (A) 28V 2.											
48	997221571	Vodorovná doprava vyburaných hmot do 1 km	t	0,000	23,874	23,874	651,00	0,00	0,00	15 541,97	15 541,97	15 541,97	100,00%
		Pol. 997221571 - Doprava vyburaného asfaltového betonu ve výtluku za mostem o ploše = 10,38 m ² , viz. doklad 1.10. Situace prováděných prací. Měrná hmotnost za ukl. betonu je 2,3 t/m ³ . Výpočet: 10,38*2,3 = 23,874 t (A) 28V 2.											
49	997221579	Přítatek ZND 1 km u vodorovné dopravy vyburaných hmot	t	0,000	358,110	358,110	17,30	0,00	0,00	6 195,30	6 195,30	6 195,30	100,00%
		Pol. 997221579 - Přítatek k dopravě vyburaného asfaltového betonu ve výtluku za mostem o ploše = 10,38 m ² , viz. doklad 1.10. Situace prováděných prací. Měrná hmotnost za ukl. betonu je 2,3 t/m ³ . Výpočet: 10,38*2,3*15 = 358,110 t (A) 28V 2.											
50	997221612	Nakládání vyburaných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	0,000	23,874	23,874	130,00	0,00	0,00	3 103,22	3 103,22	3 103,22	100,00%
		Pol. 997221612 - Nakládání vyburaného asfaltového betonu ve výtluku za mostem o ploše = 10,38 m ² , viz. doklad 1.10. Situace prováděných prací. Měrná hmotnost za ukl. betonu je 2,3 t/m ³ . Výpočet: 10,38*2,3 = 23,874 t (A) 28V 2.											
51	181251107	Rozprostření směsi tl vrstvy do 200 mm pí přes 100 do 500 m ² v rovině nebo ve svahu do 1:5 stráně	m ²	0,000	473,700	473,700	55,00	0,00	0,00	26 053,50	26 053,50	26 053,50	100,00%

Rozpis ocenění Změn položek - celkem													
Evidenční číslo a název stavby: III/2451 Stará Boleslav-Nový Vestec								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: SO 101 - Komunikace								SO 101/3					
Číslo a název rozpočtu: SO 101.3 - Komunikace								celkem					
Por. č. poř.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílů	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Pol. 181351103 - rozproštění ornice rozsohy (30% z celkové výměry) - jedná se o práce, které byly prováděny v rámci celkové práce na nové osazení odvodňovacího systému v ploše = 437m ² + [A], výměra byla převzata z geodetického zaměření úhrub. Sřka terénní úpravy byla brána v konstantě hodnotě 0,7 m, viz doklad č.10; Situace prováděných prací: ZOV 2											
52	181351103	Rozproštění ornice tl. entry do 200 mm v rozsoh nebo ve vřahu do 2/5 ručně	m ²	0,000	473,700	473,700	209,00	0,00	0,00	99 003,30	99 003,30	99 003,30	100,00%
		Pol. 181351103 - rozproštění ornice ručně (30% z celkové výměry) - jedná se o práce, které byly prováděny v rámci celkové práce na nové osazení odvodňovacího systému v ploše = 437m ² + [A], výměra byla převzata z geodetického zaměření úhrub. Sřka terénní úpravy byla brána v konstantě hodnotě 0,7 m, viz doklad č.10; Situace prováděných prací: ZOV 2											
53	132106123	Rozesráání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m ²	0,000	174,000	174,000	79,89	0,00	0,00	11 900,86	11 900,86	11 900,86	100,00%
		Pol. 181351103 - rozproštění ornice ručně (30% z celkové výměry) - jedná se o práce, které byly prováděny v rámci celkové práce na nové osazení odvodňovacího systému v ploše = 437m ² + [A], výměra byla převzata z geodetického zaměření úhrub. Sřka terénní úpravy byla brána v konstantě hodnotě 0,7 m, viz doklad č.10; Situace prováděných prací: ZOV 2											
54	979034451	Odtěžení vybouraných zámkových dlaždic z původním spárováním z kamenná tělesného	m ²	0,000	174,000	174,000	64,61	0,00	0,00	11 242,14	11 242,14	11 242,14	100,00%
		Pol. 979034451 - odtěžení kamenné dlažby ve výhledech kvůli přírodnému napájení na novou odvodňovací soustavu - jedná se o práce, které byly prováděny v rámci celkové práce na nové osazení odvodňovacího systému v ploše = 174 m ² + [A], výměra byla převzata z geodetického zaměření úhrub. Sřka úpravy byla brána v konstantě hodnotě 0,8 m, viz doklad č.10; Situace prováděných prací: ZOV 2											
55	396211210	Ukládání zámkové dlažby komunikací pro pěší tl. 80 mm skupiny A pl. do 50 m ²	m ²	0,000	174,000	174,000	356,78	0,00	0,00	62 079,72	62 079,72	62 079,72	100,00%
		Pol. 396211210 - ukládání demontážní dlažby na vřahu z kamenné drti ve výhledech kvůli přírodnému napájení na novou odvodňovací soustavu - jedná se o práce, které byly prováděny v rámci celkové práce na nové osazení odvodňovacího systému v ploše = 174 m ² + [A], výměra byla převzata z geodetického zaměření úhrub. Sřka úpravy byla brána v konstantě hodnotě 0,8 m, viz doklad č.10; Situace prováděných prací: ZOV 2											
		Nové položky - JC dle OTSKP 2021-1						0,00	0,00	112 260,35	112 260,35	112 260,35	100,00%

[illegible]

Rozpis ocenění Změn položek - celkem													
Evidenční číslo a název stavby: III/2451 Stará Boleslav-Nový Vestec								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: SO 101 - Komunikace								SO 101/3					
Číslo a název rozpočtu: SO 101.3 - Komunikace								celkem					
Pol. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve šroubku	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve šroubku v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Nové položky - R - položky						0,00	0,00	2 103 538,04	2 103 538,04	2 103 538,04	100,00%
39	K1	Zřízení provizorních BUS zastávek s dřevěnými nástupišti - materiál, montáž, demontáž, doprava	KOMPL	0,000	2,000	2,000	18 398,27	0,00	0,00	36 398,54	36 398,54	36 398,54	100,00%
		Zvýšení ceny za škodu ze strany řidičů a dřevěného materiálu, (např. beton, stavební materiál) - Kč za škodu 1. díl v 2011.											
40	K2	Náklady pro dokončení stavby (mechanizace+doprava+pracovníci+THP)	den	0,000	14,000	14,000	89015,70	0,00	0,00	1 246 219,80	1 246 219,80	1 246 219,80	100,00%
		Zvýšení nákladů na stavbu v důvodu nutné doplnění stavby, zejména cena za práci je nyní 180 Kč, z toho je práce mechanizace (např. ruční, vibrační váleček, lopatky, nakladač a nakladač automobilů, Kč za škodu 1. díl v 2011).											
41	K3	Náklady pokládky asf. směsi	den	0,000	4,000	4,000	120673,00	0,00	0,00	482 692,00	482 692,00	482 692,00	100,00%
		Zvýšení nákladů na stavbu v důvodu nutné doplnění stavby, zejména cena za škodu je nyní 180 Kč, z toho je práce mechanizace (např. ruční, vibrační váleček, lopatky, nakladač a nakladač automobilů, Kč za škodu 1. díl v 2011).											
42	K4	Náklady na frézování (pronájem+doprava+pracovníci)	den	0,000	2,000	2,000	141678,90	0,00	0,00	283 357,80	283 357,80	283 357,80	100,00%
		Zvýšení nákladů na stavbu v důvodu nutné doplnění stavby, zejména cena za škodu je nyní 180 Kč, z toho je práce mechanizace (např. ruční, vibrační váleček, lopatky, nakladač a nakladač automobilů, Kč za škodu 1. díl v 2011).											
43	K5	Vytvoření IS	kpl	0,000	1,000	1,000	25268,25	0,00	0,00	25 268,25	25 268,25	25 268,25	100,00%
		Pol. K5 - náklady spojené s vytvořením IS, cena stanovena jako součet faktur od všech oprávců IS: Vypracování 1856 Kč, Stavokomplex 15 000 Kč, firma PRG a.s. 1200 Kč (viz doklad č. 08 - ČK za Vytvoření IS) (1856 + 15000 + 1200) + 5% přírůstek slev = 25268,25 Kč (+ A) 2011											
44	K6	Čistění 2 ks příkopů UV	kpl	0,000	1,000	1,000	8602,65	0,00	0,00	8 602,65	8 602,65	8 602,65	100,00%
		Pol. K6 - Čistění 2 ulv. se motorem, potrubími THP, cena dle faktury od společnosti Stavokomplex viz doklad č. 08 - ČK za Vyčistění UV) 8205 Kč +5% přírůstek slev = 8602,65 Kč (viz 2011)											
		Celkem						12 910 707,31	- 1 661 455,33	2 136 606,94	13 835 858,94	1 475 151,64	100,00%

Dodavatel:



Gornex s.r.o.
 Vinohradská 2165/48
 120 00 Praha 2

IČ: 27881598
 DIČ: CZ27881598
 Mobil:
 E-mail:
 www.gornex.cz

Odběratel:

IČ:

26177005

DIČ:

CZ26177005

COLAS CZ, a.s.
 Rubeška 215/1
 190 00 Praha

Tel:

Nabídka č.: 22NA00030
 Datum zápisu: 03.03.2022
 Platno do: 15.07.2021

Konečný příjemce:

Cenová nabídka - demontáž LED přechodu pro chodce - Stará Boleslav

Označení dodávky	Množství	Jedn.	Sleva	Cena	%DPH	DPH	Kč Celkem
0121 - Demontáž LED světla	8 ks	2 450,00		19 600,00	21%	4 116,00	23 716,00
0121 - Demontáž rozvaděče LED světel	1 ks	1 000,00		1 000,00	21%	210,00	1 210,00
0121 - Ford Transit + nákladní vlek doprava	98 km	22,00		2 156,00	21%	452,78	2 608,78
0121 - Ford Transit doprava	98 km	16,00		1 568,00	21%	329,28	1 897,28
Součet položek				24 324,00		5 108,04	29 432,04
CELKEM K ÚHRADĚ							29 432,04

Vystavit:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

COLAS a.s.
Rubeška 215/1
190 00 Praha 9

Váš dopis značka / ze dne

Nade značka
/21/KSÚS/MHT/Pec

Vyřizuje/telefon
Pecka

Praha

Věc : „III/2451 – Stará Boleslav“ – Pokyn (ZBV č. 3)

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje jako správce a zároveň zástupce Středočeského kraje jako vlastníka nemovitosti, tj. předmětné komunikace č. III/2451, Vám tímto v souladu s článkem 6.8. smlouvy o dílo č. S-383/00066001/2021 vydává **Pokyn** k zajištění technického řešení a pokračování ve výše zmíněné akci při zpracování změn během výstavby na stavebním objektu:

III/2451 – Stará Boleslav

Na základě Oznámení zhotovitele o vhodnosti změny :

Z důvodu havárie kanalizace ve vlastnictví a správě Brandýsa nad Labem-Staré Boleslavi došlo v ulici Okružní (úsek ZÚ – cca 0,3km) k dočasnému přerušení a následně k ukončení prací.

- zrušení zařízení staveniště
- odvoz již nadeponovaného materiálu
- změna rozsahu pokládky asfaltových vrstev vč. asf.postřiků
- změna rozsahu prováděného VDZ
- odpočet úpravy žlabů z dílců z polymerbetonu
- skutečné náklady na demontáž LED světel v přechodu pro chodce ve vozovce (CN správce systému)

vydáváme tímto pokyn k provedení těchto úprav a ke zpracování ZBV

Rozsah změn během výstavby bude stanoven na základě skutečného zaměření stavby nebo správcem schválené realizační dokumentace.

Cenově musí změnu posoudit příslušné majetkové oddělení objednatele.

S pozdravem

Lěňka Chmelová
Vedoucí oblasti Mnichovo Hradiště
