



Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též „občanský zákoník“) mezi:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, Praha 5, Smíchov PSČ: 150 00
IČO: 00066001
DIČ: CZ00066001
zastoupená: Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem
nebo dále zastoupená Ing. Janem Fidlerem, DiS, statutárním
zástupcem ředitele, na základě plné moci ze dne 28. 06. 2022
č. smlouvy: S-3799/00066001/2020
(dále jen „KSÚS“)

a

Obec Borek

se sídlem: Borek 61, 277 14 Borek
zastoupená: Vratislavem Rykem, starostou
IČ: 00236713
DIČ: CZ00236713
(dále jen „Obec Borek“)

KSÚS a Obec Borek společně dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

M-SILNICE a.s.

Sídlo: Husova 1697, 530 03 Pardubice
zastoupená: Ing. Zdeňkem Babkou, místopředsedou představenstva
Mgr. Michalem Kropáčem, předsedou představenstva



IČ: 42196868

DIČ: CZ42196868

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: 1080015329/0800

Registrace: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka č. 430

dále jen „Zhotovitel“

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též jen „smluvní strany“, případně „smluvní strana“, je-li odkazováno na kterékoliv z nich)

Preambule:

Smluvní strany tímto prohlašují, že dne 29. 01. 2021 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na veřejné zakázce s názvem: „**II/331 Brandýs nad Labem – I/9, rekonstrukce – VII. etapa**“ (dále jen „**Smlouva o dílo**“). Na základě dohody smluvních stran a ve vazbě na čl. 15. Závěrečná ustanovení odst. 15.15. Smlouvy o dílo, uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jen „**Dodatek č. 1**“).

Článek I.

Předmět Dodatku č. 1

1. S ohledem na vznik objektivně nepředvídaných okolností v průběhu realizace prací na díle, které nemohl zhotovitel před zahájením prací předpokládat, a které zapříčinily změnu rozsahu prací v podobě méněprací a víceprací, upravuje se po dohodě smluvních stran předmět Smlouvy o dílo. Změna rozsahu prací v podobě méněprací a víceprací obsahují Objednatелеm schválené změnové listy, které jsou přílohou tohoto Dodatku č. 1. Na základě změny předmětu díla se mění i celková cena za dílo uvedená v čl. 8. odst. 8.1. Smlouvy o dílo, který nově zní:

- 8.1. Smluvní strany se dohodly, že celková Cena Díla je stanovena jako neměnná a konečná a činí:

Původní Cena Díla bez DPH	66.596.000,00 Kč
Nová Cena díla dle Dodatku č. 1 bez DPH	71.905.043,77 Kč
DPH 21%	15.100.059,19 Kč



Cena Díla včetně DPH	87.005.102,96 Kč
----------------------	------------------

Za objekty financované KSÚS:

SO		Cena Díla bez DPH	DPH	Cena Díla s DPH
SO 000	Vedlejší a ostatní náklady	2 784 892,00 Kč	584 827,32 Kč	3 369 719,32 Kč
SO 107	Silnice II/331, úsek km 13,9-17,52	30 491 579,72 Kč	6 403 231,74 Kč	36 894 811,46 Kč
SO 108	Silnice II/331, úsek km 17,52 – KÚ	26 940 533,33 Kč	5 657 512,00 Kč	32 598 045,33 Kč
SO 117	Obnova odvodnění km 13,9-17,74	7 704 829,00 Kč	1 618 014,09 Kč	9 322 843,09 Kč
SO 127a	Autobusové zastávky – kraj	620 882,76 Kč	130 385,38 Kč	751 268,14 Kč
SO 187	Přechodné dopravní značení	835 478,00 Kč	175 450,38 Kč	1 010 928,38 Kč
SO 197a	Trvalé dopravní značení	872 124,69 Kč	183 146,18 Kč	1 055 270,87 Kč
SO 204	Borek, přestavba mostu ev.č. 331-006 na propustek	885 559,96 Kč	185 967,59 Kč	1 071 527,55 Kč
celkem		71 135 879,46 Kč	14 938 534,69 Kč	86 074 414,15 Kč

Za objekty financované obcí Borek:

SO		Cena Díla bez DPH	DPH	Cena Díla s DPH
SO 127b	Autobusové zastávky - obec	315 343,64 Kč	66 222,16 Kč	381 565,80 Kč
SO 197b	Trvalé dopravní značení	5 846,00 Kč	1 227,66 Kč	7 073,66 Kč
SO 401b	Veřejné osvětlení - obec	447 974,67 Kč	94 074,68 Kč	542 049,35 Kč
celkem		769 164,31 Kč	161 524,51 Kč	930 688,82 Kč

Daň z přidané hodnoty (dále též „DPH“) bude na základě výslovné dohody smluvních stran připočtena ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že veškerá množství uvedená v soupise prací k Dílu a jeho jednotlivým částem jsou pouze odhadovaná, a jejich změna neznamená změnu Ceny Díla.



Přílohou tohoto Dodatku č. 1 jsou Objednatelům odsouhlasené Změnové listy 1-5.

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 bude uveřejněn dle § 219 zákona o ZVZ na profilu KSÚS.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv, které provede KSÚS. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že KSÚS tento Dodatek č. 1 uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy o dílo. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, která nejsou tímto Dodatkem č. 1 výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze smluvních stran obdrží její elektronický originál.
5. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento Dodatek č. 1 uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto Dodatku č. 1 za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku č. 1 rozhodující.

V Říčanech dne

V Praze dne

**Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace**

M – SILNICE a.s.
Ing. Zdeněk Babka, místopředseda
představenstva

Obec Borek
Vratislav Ryk, starosta obce

M – SILNICE a.s.
Mgr. Michal Kropáč, předsedou
představenstva

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby: II/331 Brandýs nad Labem - I/9, rekonstrukce - VII. etapa Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 187 Přechodné dopravní značení	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 187/1	Číslo ZBV: 1
---	---	------------------------

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov
IČ: 00066001

Obec Borek
Borek 61, 277 14 Borek
IČ: 00236713

Zhotovitel: M - SILNICE a. s.
Husova 1657, 530 03 Pardubice
IČ:42196868

Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.3	-33 921,00	349 663,00	315 742,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1	-33 921,00	349 663,00	315 742,00

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list	Číslo paré:
------------------	-------------

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: II/331 Brandýs nad Labem - I/9, rekonstrukce - VII. etapa Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 187 Přečhodné dopravní značení	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 187/1	Číslo ZBV: 1.3
---	---	--------------------------

Strany smlouvy o dílo objednatel č.: S-3799/00066001/2020 a zhotovitel č.: 25-SOD-2021-002 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 29.01.2021 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov
Obec Borek, Borek 61, 277 14 Borek

Zhotovitel: M - SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice, IČO: 421 96 868

Přílohy Změnového listu:	Paré č.	Příjemce
1. Krycí list	1, 2	Objednatel
2. Změnový list	3, 4	Zhotovitel
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	5	Projektant (AD)
4. Rozpis ocenění Změn položek ZBV 2	6	Stavební dozor
5. Přehled zařazení změn do skupin	7	Supervize
6. Přehled dalších dokladů		
Další doklady dle přehledu dokladů	18	počet listů

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Díličí změna 1: Změna přechodného DZ

V projektové dokumentaci PDPS byl zpracován projekt přechodného dopravního značení, kdy ve fázi přípravy stavby došlo k zjištění, že projekt nemůže být použit pro provedení DIO, jelikož navržená objízdná trasa pro nákladní automobily byla vedena přes město Kostelec nad Labem, kde nemůže být převáděná nákladní doprava nad 22 t. Došlo k vypracování nového projektu DIO pro celou stavbu, který vychází z TP 66 a vznikl na základě místního šetření a požadavků dotčených orgánů.

Byla stanovena nová objízdná trasa pro nákladní automobily, která je delší než původně zamýšlená trasa a osazena větším počtem dopravních značek IP 22. Dále původní projekt dopodrobna neřešil osazení dopravního značení v křižovatkách a přilehlých ulicích v jednotlivých etapách v úseku uzavírký. Zejména se jedná o doplnění dopravního značení v intravilánu ve stavebním objektu SO 108.

Jedná se o Změnu nepodstatnou, nepředvídanou, která je tak podle § 5, odst. 1, písm.c), resp. § 10, Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29.5.2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná o změnu nepředvídanou.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-33 921,00	349 663,00	315 742,00	383 584,00

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí): M - SILNICE a. s.	jméno	Ing. Tomáš Kučera	datum	podpis
Projektant (autorský dozor): Pontex, spol. s r.o.	jméno	Ing. Pavel Hrdina	datum	podpis
Stavební dozor: SGS Czech Republic s. r. o.	jméno	Jakub Kaprel	datum	podpis
Supervize (Regionální dotační kancelář)	jméno	Ing. Václav Chytil	datum	podpis
Zástupce Objednatel: KSÚS SK	jméno	Marek Hanuš	datum	podpis
Zástupce Objednatel: Obec Borek	jméno	Vratislav Ryk	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitel sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel)	jméno	Ing. Jan Fidler	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	Mgr. Michal Kropáč M - SILNICE a.s. Ing. Zdeněk Babka M - SILNICE a.s.	datum	podpis
				Číslo paré

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 1**

Název Stavby:	II/331 Brandýs nad Labem - I/9, rekonstrukce - VII. etapa
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	187/1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	SO 187 Přechodné dopravní značení

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
519 736,00

Poznámka:

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	519 736,00	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-33 921,00	349 663,00	349 663,00	67,28%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-33 921,00	835 478,00	315 742,00	60,75%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

M - SILNICE a. s.

souhlasím

Ing. Tomáš Kučera

Projektant (autorský dozor):

Pontex spol. s r.o.

souhlasím

Ing. Pavel Hrdina

Stavební dozor:

SGS Czech Republic s. r. o.

souhlasím

Jakub Kaprel

Zástupce Objednatele:

KSÚS SK

souhlasím

Marek Hanuš

Zástupce Objednatele:

Obec Borek

souhlasím

Vratislav Ryk

Supervize

regionální dotační kancelář

souhlasím

Ing. Václav Chytil

Zaměstnanec KSÚS SK

odpovědný za cenové

projednání Změny:

souhlasím

Ing. Jaroslava Jurka

Rozpis ocenění Změn položek - celkem													
Evidenční číslo a název stavby:			II/331 Brandýs nad Labem - I/9, rekonstrukce - VII. etapa					ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS:			SO 187 Přechodné dopravní značení					SO 187					
Číslo a název rozpočtu:			SO 187 Přechodné dopravní značení					Skupina změn 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	91400	DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK	KUS	12,000	1,000	-11,000	51,000	612,00	-561,00	0,00	51,00	-561,00	-91,67
2	914122	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	184,000	212,000	28,000	10,000	1 840,00	0,00	280,00	2 120,00	280,00	15,22
3	914123	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	184,000	212,000	28,000	10,000	1 840,00	0,00	280,00	2 120,00	280,00	15,22
4	914129	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ	KSDEN	25333,000	26069,000	736,000	10,000	253 330,00	0,00	7 360,00	260 690,00	7 360,00	2,91
5	914222	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	16,000	5,000	-11,000	16,000	256,00	-176,00	0,00	80,00	-176,00	-68,75
6	914223	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	16,000	5,000	-11,000	16,000	256,00	-176,00	0,00	80,00	-176,00	-68,75
7	914229	DOPRAV ZNAČKY ZVĚŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ	KSDEN	2632,000	569,000	-2063,000	16,000	42 112,00	-33 008,00	0,00	9 104,00	-33 008,00	-78,38
8	914462	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	36,000	78,000	42,000	16,000	576,00	0,00	672,00	1 248,00	672,00	116,67
9	914463	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	36,000	78,000	42,000	16,000	576,00	0,00	672,00	1 248,00	672,00	116,67
10	914469	DOPRAV ZNAČ 100X150CM HLINÍK FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ	KSDEN	5922,000	12688,000	6766,000	16,000	94 752,00	0,00	108 256,00	203 008,00	108 256,00	114,25
11	916122	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	10,000	15,000	5,000	1527,000	15 270,00	0,00	7 635,00	22 905,00	7 635,00	50,00
12	916123	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ	KUS	10,000	15,000	5,000	152,000	1 520,00	0,00	760,00	2 280,00	760,00	50,00
13	916129	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ	KSDEN	658,000	861,000	203,000	152,000	100 016,00	0,00	30 856,00	130 872,00	30 856,00	30,85
14	916312	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	10,000	23,000	13,000	10,000	100,00	0,00	130,00	230,00	130,00	130,00
15	916313	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	10,000	23,000	13,000	10,000	100,00	0,00	130,00	230,00	130,00	130,00
16	916319	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ	KSDEN	658,000	2313,000	1655,000	10,000	6 580,00	0,00	16 550,00	23 130,00	16 550,00	251,52
		Nové položky											100,00
17	916352	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FOLI TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	0,000	41,000	41,000	189,000	0,00	0,00	7 749,00	7 749,00	7 749,00	100,00
18	916353	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FOLI TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	0,000	41,000	41,000	129,000	0,00	0,00	5 289,00	5 289,00	5 289,00	100,00
19	916359	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FOLI TŘ 1 - NÁJEMNÉ	KSDEN	0,000	1458,000	1458,000	14,000	0,00	0,00	20 412,00	20 412,00	20 412,00	100,00
20	916112	DOPRAVNÍ SVĚTLO SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	0,000	9,000	9,000	810,000	0,00	0,00	7 290,00	7 290,00	7 290,00	100,00
21	916113	DOPRAVNÍ SVĚTLO SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ	KUS	0,000	9,000	9,000	374,000	0,00	0,00	3 366,00	3 366,00	3 366,00	100,00
22	916119	DOPRAVNÍ SVĚTLO SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ	KSDEN	0,000	1404,000	1404,000	94,000	0,00	0,00	131 976,00	131 976,00	131 976,00	100,00
		Celkem							- 33 921,00	349 663,00		315 742,00	

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.

Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitel: Ing. Tomáš Kučera

Za Objednatele: Jakub Kaprel

Datum:

Datum:

Podpis:

Podpis:

C

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: II/331 Brandýs nad Labem - I/9, rekonstrukce - VII. etapa

1	Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	66 596 000,20
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	66 911 742,20
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	80 963 208,06
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	100,47%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%
40=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, odst. (6), písm. b)	-0,05%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	315 742,00
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	0,47%
6=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	19 978 800,06

9=(32A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	0,58%
10=(36A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,00%
10A=32A+36A	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	383 584,00
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	33 298 000,10

12=(1)*0,15	Limit	9 989 400,03
13=(39)/(1)	Sledování limitu (15%)	0,00%
14=(ABS(37)+(38))	Hodnota skupiny 5	0,00

40=(19/1)*100		Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, odst. (6), písm. b)		-0,05%	

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	1
Název a evidenční číslo stavby:	II/331 Brandýs nad Labem - I/9, rekonstrukce - VII. etapa
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 187 Přechodné dopravní značení
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	187/1

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
07 Rozpis ocenění SO celkem	1	
08 Oznámení o zjištění nové skutečnosti	1	
09 Pokyn Objednatele k realizaci navržených změn	1	
10 Návrh dopravně inženýrského opatření	10	
11 Stanovení přechodné úpravy provozu na PK	4	
12 Doplnění DZ Kostelec nad Labem	1	
Počet listů celkem	18	

Rozpis ocenění Změn položek - celkem Evidenční číslo a název stavby: II/331 Brandýs nad Labem - I/9, rekonstrukce - VII. etapa SO 187 Přechodné dopravní značení SO 187 Přechodné dopravní značení													
ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) SO 187 celkem													
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	9	Ostatní konstrukce a práce						519 736,00	- 33 921,00	349 663,00	835 478,00	315 742,00	60,75%
1	91400	DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK	KUS	12	1	-11	51	612,00	-561,00	0,00	51,00	-561,00	-91,67
2	914122	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM 41*2+34+22+21+15+25+4+9	KUS	184	212	28	10	1 840,00	0,00	280,00	2 120,00	280,00	15,22
3	914123	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ 41*2+34+22+21+15+25+4+9	KUS	184	212	28	10	1 840,00	0,00	280,00	2 120,00	280,00	15,22
4	914129	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ 41*329+34*156+22*30+21*31+15*42+25*70+4*156+9*329	KSDEN	25333	26069	736	10	253 330,00	0,00	7 360,00	260 690,00	7 360,00	2,91
5	914222	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM 1*2+1+2	KUS	16	5	-11	16	256,00	-176,00	0,00	80,00	-176,00	-68,75
6	914223	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ 1*2+1+2	KUS	16	5	-11	16	256,00	-176,00	0,00	80,00	-176,00	-68,75
7	914229	DOPRAV ZNAČKY ZVĚTŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ 1*329+1*156+2*42	KSDEN	2632	569	-2063	16	42 112,00	-33 008,00	0,00	9 104,00	-33 008,00	-78,38
8	914462	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM 38*2+1+1	KUS	36	78	42	16	576,00	0,00	672,00	1 248,00	672,00	116,67
9	914463	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ 38*2+1+1	KUS	36	78	42	16	576,00	0,00	672,00	1 248,00	672,00	116,67
10	914469	DOPRAV ZNAČ 100X150CM HLINÍK FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ 1*329+1*156+2*42	KSDEN	5922	12688	6766	16	94 752,00	0,00	108 256,00	203 008,00	108 256,00	114,25
11	916122	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM 2+4+3+3+3	KUS	10	15	5	1527	15 270,00	0,00	7 635,00	22 905,00	7 635,00	50,00
12	916123	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ 2+4+3+3+3	KUS	10	15	5	152	1 520,00	0,00	760,00	2 280,00	760,00	50,00
13	916129	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ 2*156+4*30+3*31+3*42+3*70	KSDEN	658	861	203	152	100 016,00	0,00	30 856,00	130 872,00	30 856,00	30,85
14	916312	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM 11+3+1+3+5	KUS	10	23	13	10	100,00	0,00	130,00	230,00	130,00	130,00
15	916313	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ 11+3+1+3+5	KUS	10	23	13	10	100,00	0,00	130,00	230,00	130,00	130,00
16	916319	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ 11*156+3*30+1*31+3*42+5*70	KSDEN	658	2313	1655	10	6 580,00	0,00	16 550,00	23 130,00	16 550,00	251,52
		Nové položky (dle ceníku OTSKP 2020)											
17	916352	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FOLI TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM 13+20+4+4	KUS	0,000	41,000	41,000	189,000	0,00	0,00	7 749,00	7 749,00	7 749,00	100,00
18	916353	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FOLI TŘ 1 - DEMONTÁŽ 13+20+4+4	KUS	0,000	41,000	41,000	129,000	0,00	0,00	5 289,00	5 289,00	5 289,00	100,00
19	916359	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FOLI TŘ 1 - NÁJEMNÉ 13*30+20*31+4*42+4*70	KSDEN	0,000	1458,000	1458,000	14,000	0,00	0,00	20 412,00	20 412,00	20 412,00	100,00
20	916112	DOPRAVNÍ SVĚTLO SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM 9	KUS	0,000	9,000	9,000	810,000	0,00	0,00	7 290,00	7 290,00	7 290,00	100,00
21	916113	DOPRAVNÍ SVĚTLO SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ 9	KUS	0,000	9,000	9,000	374,000	0,00	0,00	3 366,00	3 366,00	3 366,00	100,00
22	916119	DOPRAVNÍ SVĚTLO SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ 9*156	KSDEN	0,000	1404,000	1404,000	94,000	0,00	0,00	131 976,00	131 976,00	131 976,00	100,00
		Celkem						519 736,00	- 33 921,00	349 663,00	835 478,00	315 742,00	60,75%

KSÚS Středočeského kraje
Marek Hanuš
Oprávněný zástupce obědnavatele

Zborovská 11
150 21 Praha 5

Váš dopis zn./ze dne

Naše značka
25-SOD-2021-002vyřizuje / tel.
Josef Mikel/702262621V Praze dne
6. 4. 2021**Věc: Oznámení o zjištění skutečnosti****Název stavby: II/331 Brandýs nad Labem – I/9, rekonstrukce – VII. etapa**

Vážený pane Hanuš,

dne 22. 03. 2021 bylo vydáno Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/16, I/9 uzavírka II/331 Stará Boleslav – oprava komunikace, 29. 03. 2021-24. 07. 2022, které bylo vydáno na základě ověřeného projektu přechodného dopravního značení, který byl upraven oproti projektu přechodového značení uvedeného v zadávací dokumentaci PDPS.

Nový projekt DIO upravuje objízdnou trasu pro nákladní automobily, která původně byla vedena přes město Kostelec nad Labem, kde přes most č. 244-006 (přes Mlýnský potok) nemůže být převáděna nákladní doprava nad 22 t. Vlivem změny objízdné trasy došlo k jejímu prodloužení, s čímž je spojeno navýšení počtu osazených dopravních značek. Dále v původním projektu nebyly dopodrobna řešeny křižovatky, které se nachází v blízkém okolí rekonstruované komunikace. Došlo k doplnění dopravního značení na přilehlých křižovatkách dle jednotlivých etap, pro zajištění vyšší bezpečnosti a přehlednosti dopravní situace. Projekt DIO byl zpracován na základě vyhlášky č. 294/2015 Sb., zákonu silničního provozu, TP 66 - Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích a požadavků dotčených orgánů.

Zhotovitel tuto odchylku nemohl předvídat. Zhotovitel při zpracování cenové nabídky, respektive pro potřeby stanovení přijaté smluvní částky, vycházel z rozsahu prací definovaných zadávací dokumentací stavby.

Žádám o pokyn k vypracování ZBV.

S pozdravem

Josef Mikel
zást

V Říčanech 03. 05. 2021

Evidenční číslo: 24624/2021-KSÚS

Číslo jednací: 160/21/KSUS/OI/KRK

Vážený pan
Josef Mikel
M-SILNICE a.s.
Husova 1697,
530 03 Pardubice

Věc: II/331 Brandýs nad Labem- I/9, rekonstrukce – VII. etapa

Vážený pane vedoucí,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o. (dále jen KSÚS), jako investor akce „**II/331 Brandýs nad Labem- I/9, rekonstrukce – VII. etapa**“ je seznámena se žádostí o zpracování ZBV na Vámi uvedené okolnosti, které se v projektové dokumentaci ve stupni PDPS nedali předpokládat (viz příloha č. 1 a 2- Oznámení o zjištění zkušenosti od společnosti M-SILNICE a.s.).

KSÚS bere na vědomí, že zhotovitel nemohl v době zadávací lhůty soutěže předvídat výskyt těchto okolností, a proto KSÚS žádá zhotovitele společnost M-SILNICE a.s. o vypracování Změnových listů, a to v souladu se směrnicí KSÚS, která je nedílnou součástí Smlouvy o dílo. Tyto ZBV budou následně projednány a podrobně posouzeny supervizorem zakázky, následně budou posouzeny vedením KSÚS.

S pozdravem

Ing. Jan I
Ředite

pr

Přílohy:

1. Oznámení o zjištěné zkušenosti ze dne 06. 04. 2021 č. 1
2. Oznámení o zjištěné zkušenosti ze dne 06. 04. 2021 č. 2

Stará Boleslav - oprava komunikace II/331

NÁVRH

dopravně inženýrského opatření (DIO)

SEDOZ
DOPRAVNÍ ZNAČENÍ


Při umístění dopravního značení musí
být dodrženy podmínky dané
v TP66 - OZNAČENÍ PRACOVNÍCH MÍST
NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH III.VYDÁNÍ,
zák.č.361/2000 Sb. v platném znění
a zák.č. 13/1997 Sb. v platném znění.

Zpracoval: SEDOZ Datum: 10.10.2014 Strana: 1	Vypracoval: SEDOZ Datum: 10.10.2014 Strana: 1	Kvalifikace: SEDOZ Datum: 10.10.2014 Strana: 1
SEDOZ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ		
Název: Stará Boleslav - oprava komunikace II/331		
Návrh: DIO - Letápa		

Bude zajištěn bezpečný přístup do nemovitostí dotčených stavbou

Otevřené výkopy budou zajištěny proti pádu chodců a ze snížené viditelnosti budou osvětleny


Při umístění dopravního značení musí být dodrženy podmínky dané v TP66 - OZNAČENÍ PRACOVNÍCH MÍST NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH III.VYDÁNÍ, zák.č.361/2000 Sb. v platném znění a zák.č. 13/1997 Sb. v platném znění.

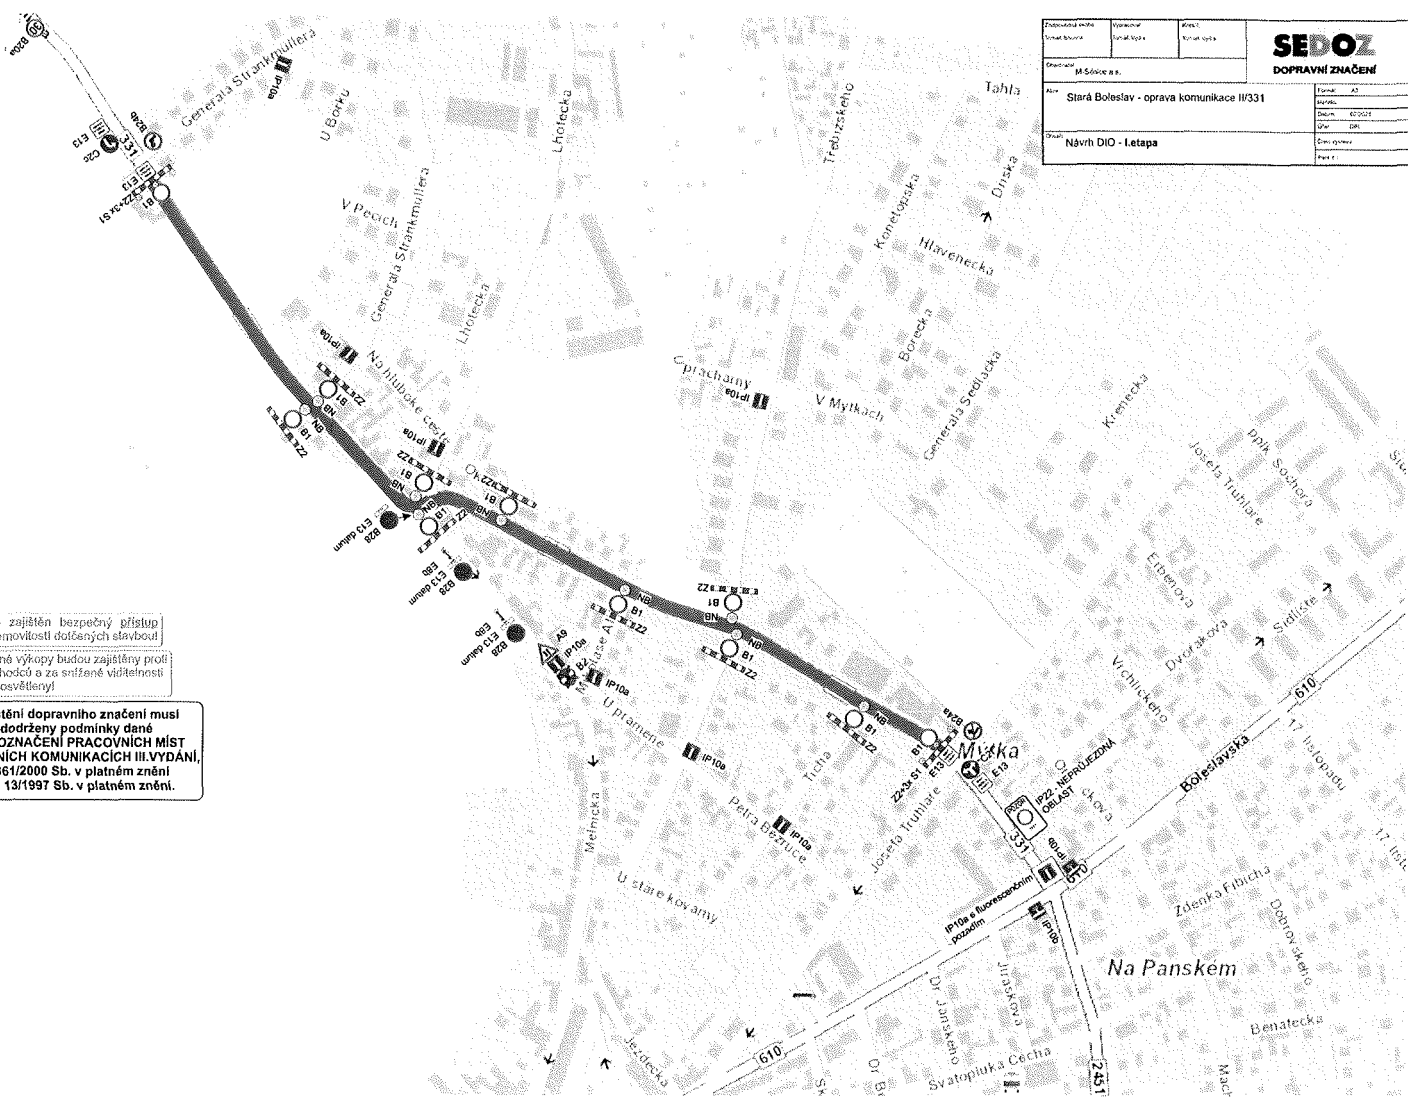




Při umístění dopravního značení musí být dodrženy podmínky dané v TP66 - OZNAČENÍ PRACOVNÍCH MÍST NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH III. VYDÁNÍ, zák.č.381/2000 Sb. v platném znění a zák.č. 13/1997 Sb. v platném znění.

Zadavatelé práce Funkce funkce	organizace funkce funkce	Funkce funkce funkce	SEDOZ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
Chopitelka M. Sílčová s.r.o.			
Stará Boleslav - oprava komunikace II/331			Kategorie A3 Město Datum 07-2-14 Místní část Číslo směru Průjezd
Návrh DIO - Votava			

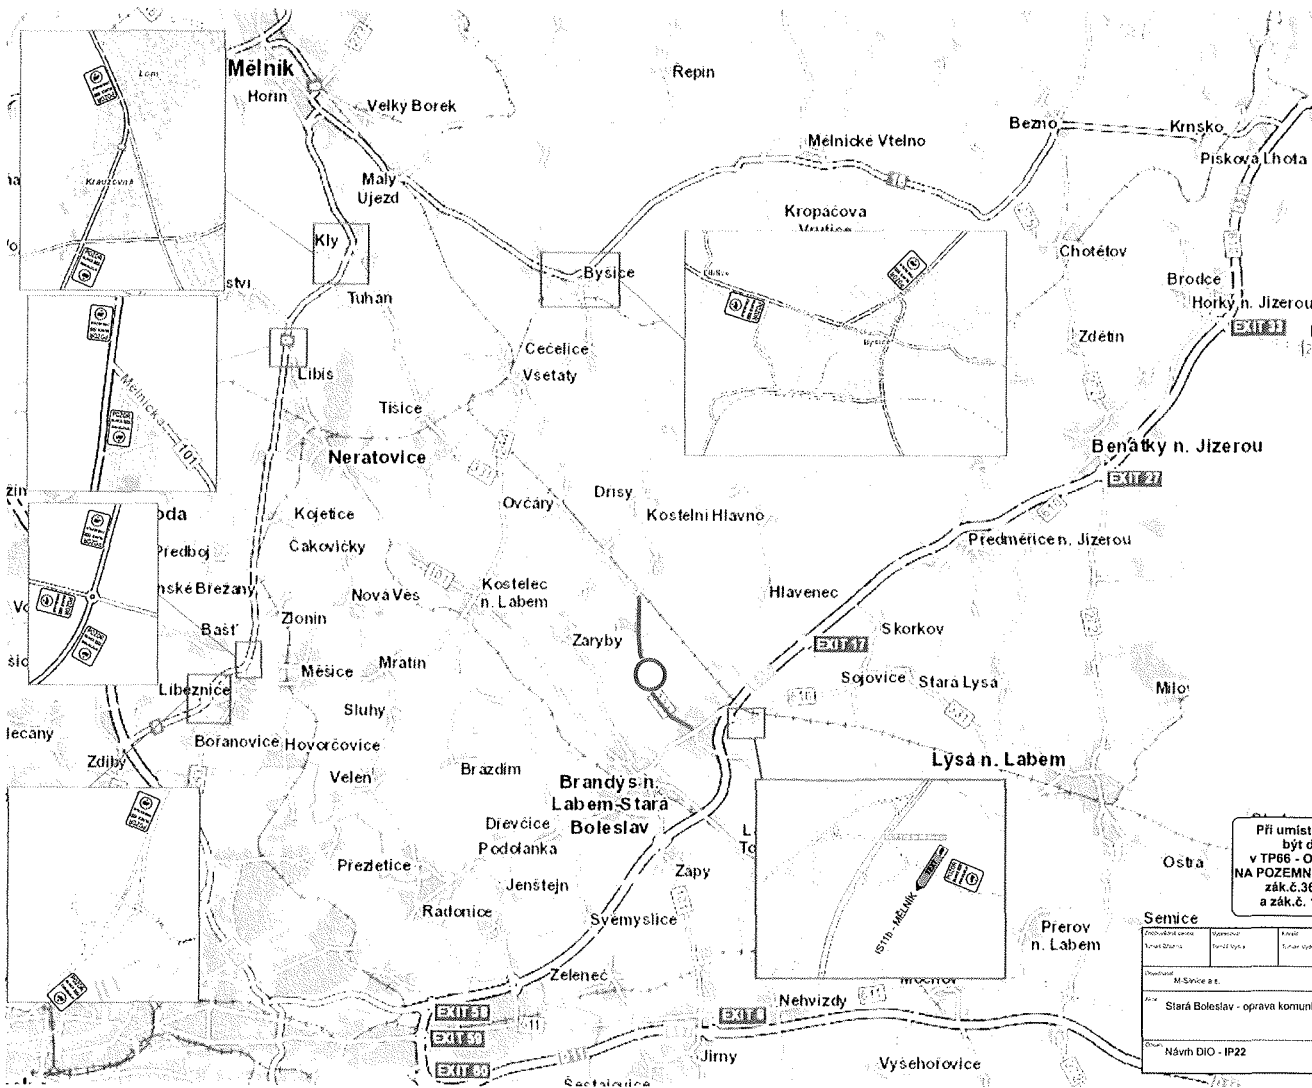


Při umístění dopravního značení musí být dodrženy podmínky dané v TP66 - OZNAČENÍ PRACOVNÍCH MÍST NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH ILUVYDÁNÍ, zák.č. 361/2000 Sb. v platném znění a zák.č. 13/1997 Sb. v platném znění.

Semice		Kvalita		SEDOZ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
Provozovatel	Uzemní úřad	Typ územní úřadu	Typ územní úřadu	
Stará Boleslav - oprava komunikace II/331				
Návrh DIO - IP22				

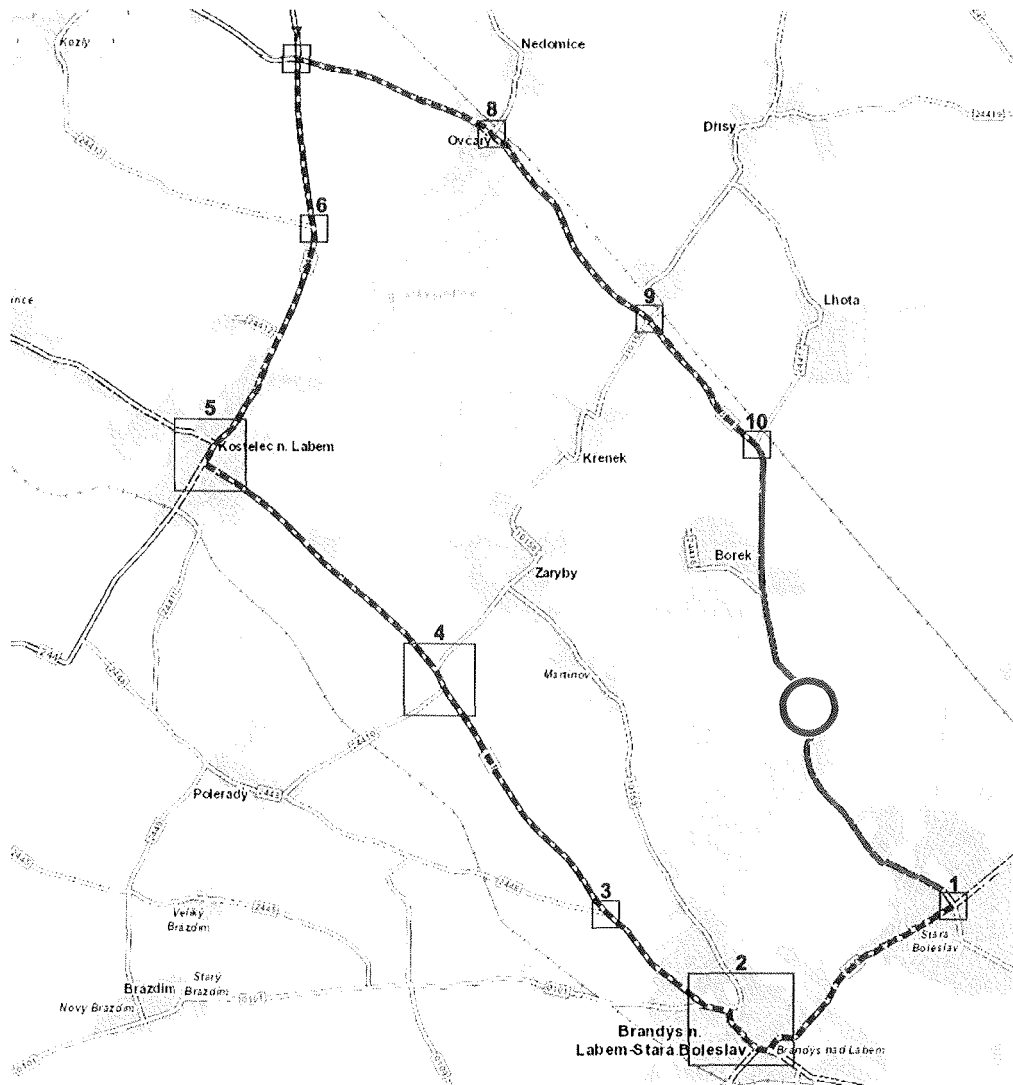


Při umístění dopravního značení musí být dodrženy podmínky dané v TP66 - OZNAČENÍ PRACOVNÍCH MÍST NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH II/VDÁNÍ, zák.č.361/2000 Sb. v platném znění a zák.č. 13/1997 Sb. v platném znění.

Provozovatel úseku	Úprava	Klasifikace	SEDOZ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
Stavba	Typ stavby	Typ stavby	
Dopravce: M.Švec a s.			Průběh: AS Datum: 02.2015 Graf: K.M.
Název: Stará Boleslav - oprava komunikace II/331			Průběh: AS Datum: 02.2015 Graf: K.M.
Název: Návrh DIO - OBJÍZDNÁ TRASA PRO OA			Průběh: AS Datum: 02.2015 Graf: K.M.


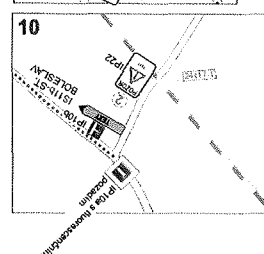


Technická služba Tisková služba	Komunikace Tisková služba	Právní Tisková služba	 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
M. Sívce a.s.			
Místní Stará Boleslav - oprava komunikace II/331			Řada: A3 Řádek: 1 Datum: 21. 04. 2018 Druh: 016 Číslo účteny:
Druh: Návh DIO - OBJÍZDNÁ TRASA PRO OA			Posl. číslo:

ČÁST 2.

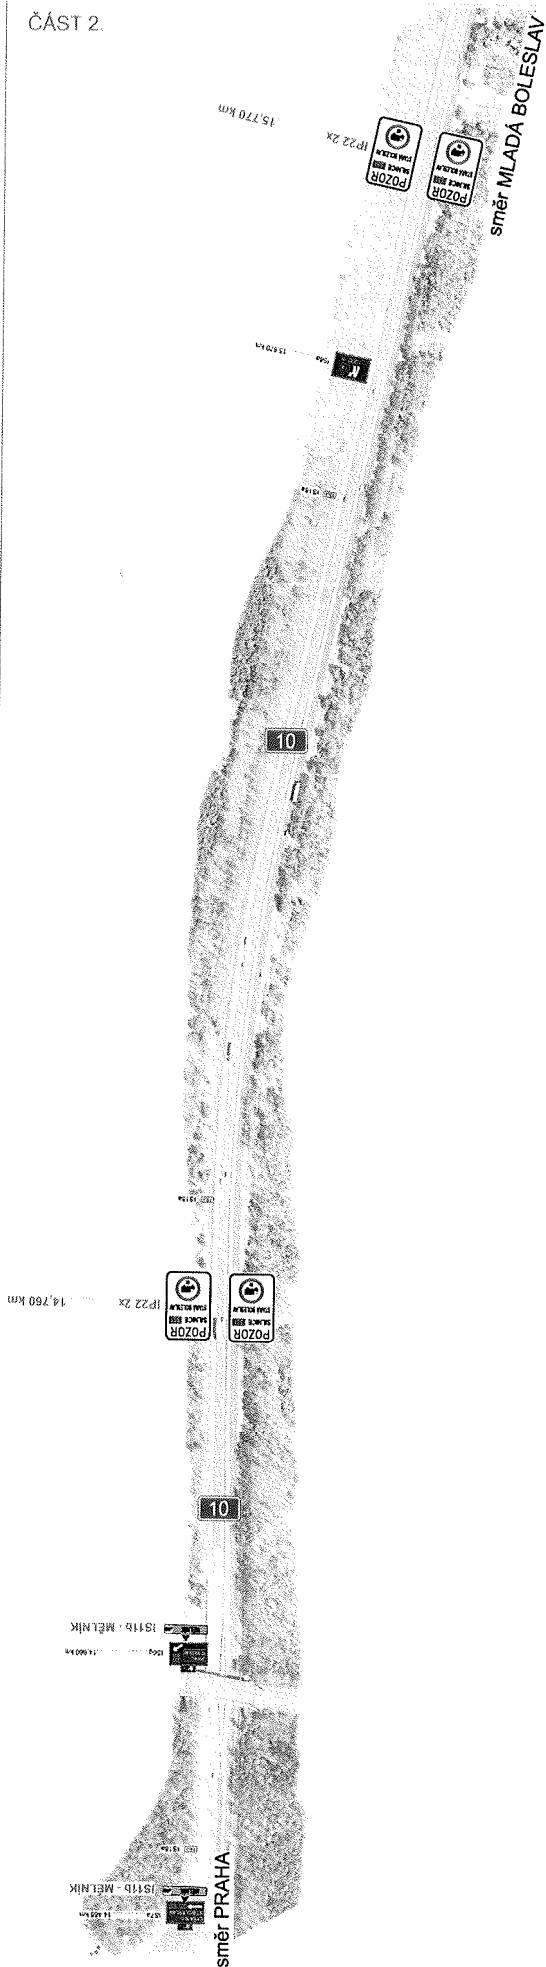

ČÁST 1.

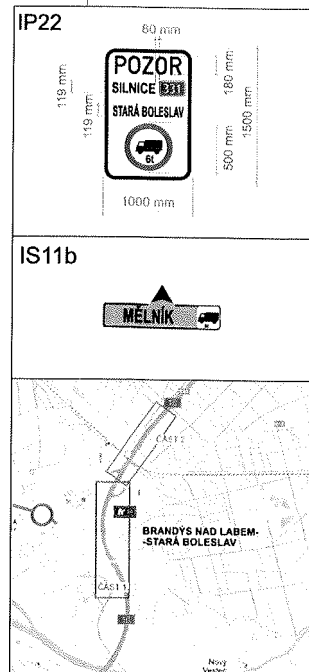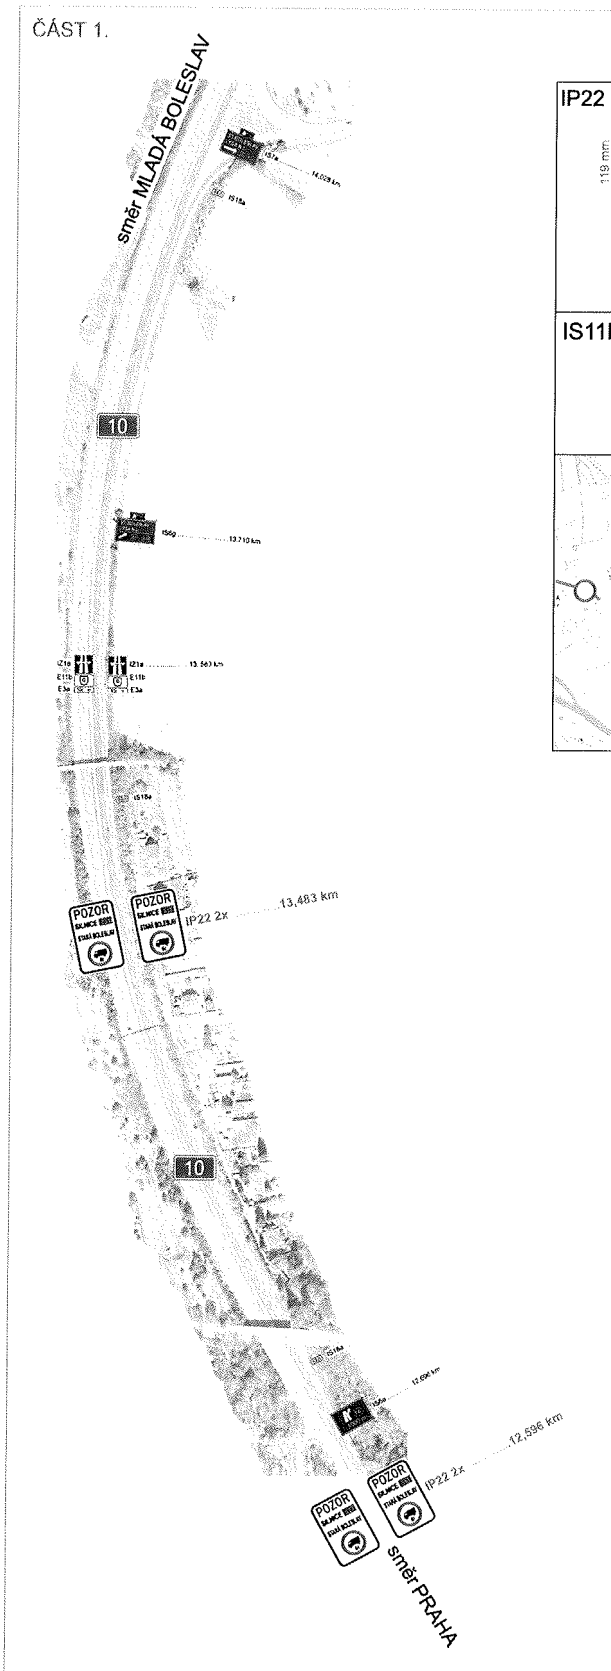

Při umístění dopravního značení musí být dodrženy podmínky dané v TP66 - OZNAČENÍ PRACOVNÍCH MÍST NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH (EVYDÁNÍ, zák.č. 361/2000 Sb. v platném znění a zák.č. 131/1997 Sb. v platném znění).

SEDOZ	
DOPRAVNÍ ZNAČENÍ	
Stará Boleslav - oprava komunikace #331	
Návrh DIO	



Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Masarykovo náměstí 1/6
250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav



Odbor dopravy

Váš dopis č.:

Ze dne:

Naše č.j.: MÚBNLSB-OD-35728/2021-MASPE

Naše sp. zn.: OD-4583/2021-MASPE

Vyřizuje: Petra Mašková

Tel.:

E-mail:

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

IČ 00240079

Masarykovo Náměstí č. p. 1/2

250 01 BRANDÝS NAD LABEM-STARÁ BOLESLAV

1

Datum: 09.04.2021

Veřejná vyhláška

Opatření obecné povahy

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Městský úřad Brandýs nad Labem–Stará Boleslav, odbor dopravy, jako příslušný orgán státní správy ve věcech provozu na pozemních komunikacích podle ust. § 124 odst. 6) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“) pro stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích na základě žádosti **města Brandýs nad Labem-Stará Boleslav**, IČ: 00240079 se sídlem Masarykovo nám. 1,2, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav (dále jen „žadatel“) podané dne 09.04.2021, podle ust. § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) **rozhodl** podle ust. § 77 zákona o silničním provozu

o stanovení přechodné úpravy silničního provozu

na silnici č. II/331 ul. Mělnická a na místní komunikaci ul. Na Hluboké cestě vše v k.ú. Stará Boleslav, spočívající v umístění dopravního značení a zařízení v rozsahu dle předloženého a odsouhlaseného Policie ČR Krajské ředitelství SK, DI Praha-venkov-východ, které je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy.

Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:

- Termín přechodné úpravy provozu: **12. 04. 2021 – 31. 08. 2021 (po dobu uzavírky silnice č. II/331 v I.etapě)**
- Dopravní značení bude umístěno a instalováno dle schváleného DIO Policie ČR Krajské ředitelství SK, DI Praha-venkov-východ.
- Dopravní značení bude provedeno v souladu se zásadami pro dopravní značení na pozemních komunikacích TP 66, Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích, vydané Centrem dopravního výzkumu v Brně.

- Dopravní značení musí provedením odpovídat vyhlášce č. 294/2015 Sb., a zákonu o silničním provozu.
- **Dopravní značení, které je v rozporu s touto přechodnou úpravou silničního provozu bude zakryto.**
- Dopravní značení musí být upevněno na kovových sloupcích nebo případně na sloupech veřejného osvětlení. Musí být provedeno dle příslušné ČSN EN 12899-1 a musí být z retroreflexního materiálu. Dopravní značení včetně nosičů a spojovacích součástí musí být schváleno Ministerstvem dopravy ČR.
- **Dopravní značení bude rozmístěno odbornou firmou, která má platná oprávnění k výkonu této činnosti a to do zahájení stavebních prací.**
- Osoby, které se budou pohybovat na komunikacích, jsou povinny nosit výstražné oblečení.
- Na místě stavebních prací bude dostatečný počet poučených osob schopných v případě potřeby, řídit silniční provoz.

Odůvodnění

Na základě žádosti podané dne 09.04.2021 žadatelem o stanovení přechodné úpravy silničního provozu na silnici č. III/331 ul. Mělnická a na místní komunikaci ul. Na Hluboké cestě vše v k.ú. Stará Boleslav, z důvodu příjezdu k nemovitostem rezidentů a obyvatel určených ulic (viz. DIO), bylo podle ust. § 171 správního řádu zahájeno řízení, na základě kterého se vydává opatření obecné povahy.

K žádosti o stanovení přechodné úpravy silničního provozu bylo předloženo DIO, které bylo projednáno s Policií ČR Krajské ředitelství SK, DI úo Praha-venkov-východ, jako dotčeným orgánem dle ust. § 77 odst. 2 písm. b) zákona o silničním provozu.

V souladu s ust. § 173 odst. 1 správního řádu a podle ust. § 77 odst. 4) a 5) zákona o silničním provozu se proto stanovuje přechodná úprava silničního provozu, dle předloženého a odsouhlaseného DIO, které je nedílnou součástí tohoto opatření.

Poučení

Proti stanovení přechodné úpravy provozu formou opatření obecné povahy nelze dle ust. § 173 odst. 2) správního řádu podat opravný prostředek.

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení této veřejné vyhlášky.

Podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES Vám oznamujeme, že na základě plnění úkolů, které nám ukládají právní předpisy, shromažďujeme a dále zpracováváme Vaše osobní údaje za účelem výkonu agendy silničního správního úřadu a speciálního stavebního úřadu. Bližší informace naleznete na stránkách <http://www.brandysko.cz/>.

[otisk dředitního razítka]

Petra Mařková v. r.
Referent odboru dopravy

Přiloha – situace, originál DIO k nahlédnutí na MěÚ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav,
Odbor dopravy, pracoviřtř Stará Boleslav, Mariánské náměstí 28, kancelář č. 111)

Toto opatřeni obecně povahy musí být vyvěřeno na úřední desce MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav po dobu 15 dnů.

Vyvěřeno dne: Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěřeni a sejmutí oznámeni.

Vývěřní lhůta začíná den následující po dni vyvěřeni. Sejmutí vyhlášky je možno následující
pracovní den po posledním (patnáctém) dni vývěřní lhůty.

Písemnost /nebo oznámeni/ se zveřřňuje též způsobem umožňujícím dálkový přístup.

**Právní účinky doručeni má výhradně doručeni veřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední
desky MěÚ Brandýs n.L. – St. Boleslav.**

Obdrží:

- MěÚ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, OISMM; IDDS: c5hb7xy
- Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje; IDDS: a6ejgmx

Dotčené orgány státní správy:

- Policie ČR, KŘ SK DI úo Praha-venkov-východ; IDDS: 2dtai5u

Na vědomí:

- M-Silnice a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice; IDDS: jwq7ju

K vyvěřeni na úřední desce:

- MěÚ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

B 1 zákaz vjezdu všem vozidlům

E 13 Dodatková tabulka TEXT


MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHU,
REZIDENTY A
OBYVATELE ULIC
GEN. LIŠKY, JOSEFA MARUNY,
VILÉMA ČERNÍKA, JOSEFA OLEXY,
BŘÍ KOHOUTŮ, GEN. SELNERA

Rezidentní oblast

MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHU,
REZIDENTY A
OBYVATELE ULIC
GEN. LIŠKY, JOSEFA MARUNY,
VILÉMA ČERNÍKA, JOSEFA OLEXY,
BŘÍ KOHOUTŮ, GEN. SELNERA

BRAN

Schéma řešení dopravní obslužnosti ulic uzavřených v souvislosti s rekonstrukcí sil. II/331

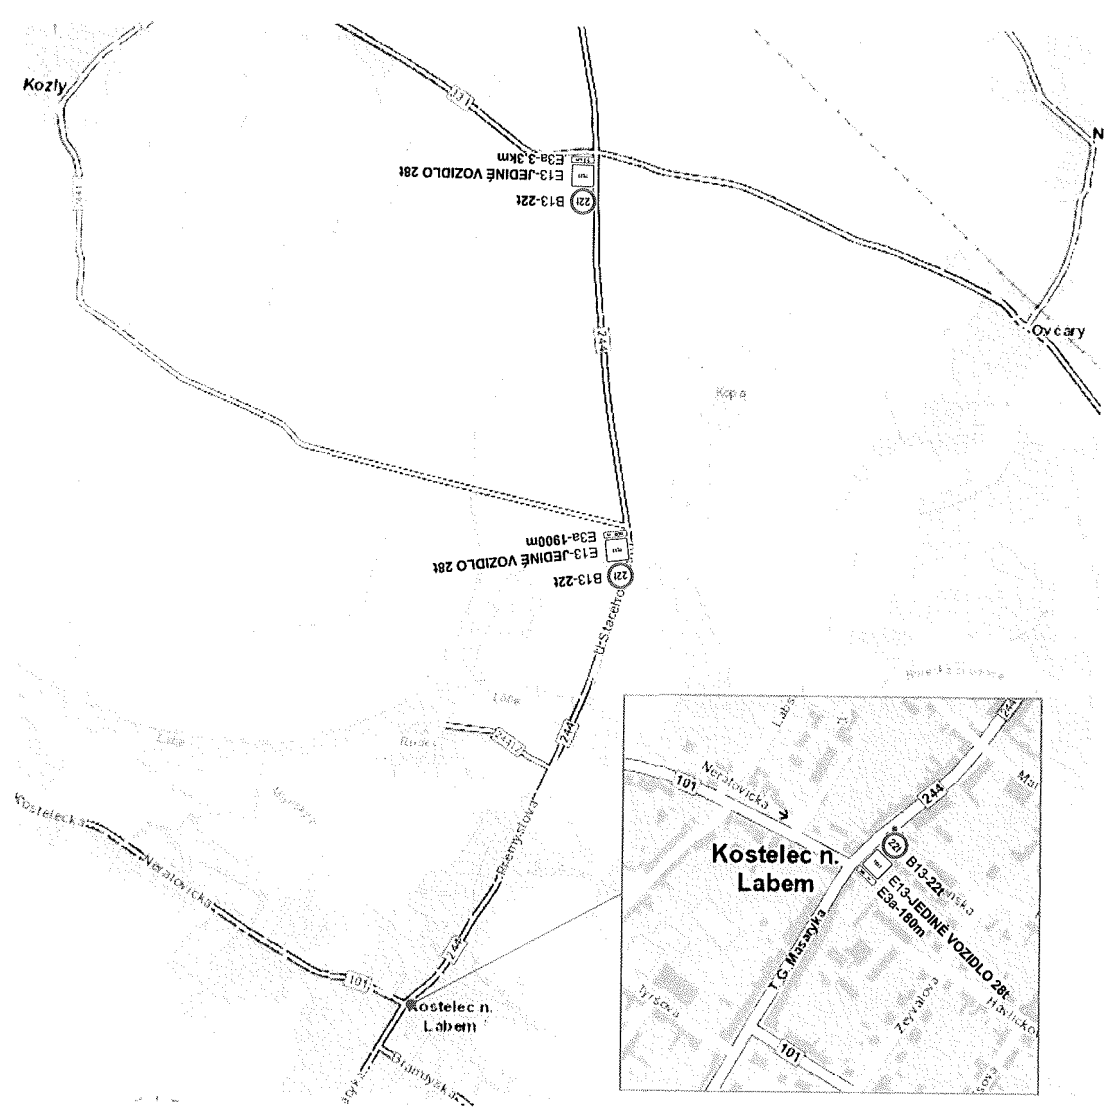

Středočeský kraj

v zastoupení

**Krajské správy a údržby silnic
Středočeského kraje, p. o.**

Ing. Aleš Čermák

Zborovská 11

Praha, 150 00

Čj : PX 2022

V Praze : 29. června 2022

Vyřizuje: Ing. Petr Kunc

tel.: '

e-ma

Akce: II/331 Brandýs nad Labem – I/9, rekonstrukce

Věc: Vyjádření AD č. 10

Vážený pane řediteli,

AD obdržel dne 7. 6. 2022 návrh ZBV č. 1 bez dokladové části a byl požádán ve smyslu TKP kap. 1 příloha č. 5 čl. 4 písm. d) o posouzení technické správnosti a ekonomické přijatelnosti změny. ZBV č. 10 řeší změnu přechodného dopravního značení v rámci SO 187.

V rámci projektové přípravy byl SO 187 projednán s dotčenými orgány pro rozhodnutí o uzavírce stanovení přechodné úpravy provozu a SO 187 byl jimi schválen.

Změna SO 187 vychází z rozhodnutí o stanovení přechodné úpravy, jenž je doloženo k ZBV č. 1.

AD s předmětem ZBV č. 1 souhlasí.

S pozdravem za Pontex spol. s r.o.

Ing. Pavel Hrdina



Vyřizuje: Jakub Kaprel,TDI

Datum :24.8.2021

Krajská správa a údržba silnic

Marek Hanuš

Středočeského kraje, příspěvková organizace

Zborovská 11, 150 21

Praha 5

Věc: vyjádření TDI k dokumentaci ZBV č.1 – přechodné dopravní značení

Stavba: II/331 Brandýs nad Labem – I/9, rekonstrukce

V rámci výkonu TDI na výše uvedené stavbě jsme obdrželi návrh dokumentace ZBV č. 1 – SO 187 Přechodné dopravní značení.

V PDPS byl zpracován projekt přechodného dopravního značení, který uvažoval vedení objízdné trasy pro nákladní dopravu nad 22 t přes město Kostelec nad Labem. Ve fázi přípravy stavby došlo k zjištění, že návrh DIO tak jak uvažovalo PDPS nemůže být použit, jelikož navržená objízdná trasa pro nákladní automobily vedena přes město Kostelec nad Labem, kde nemůže být převáděná nákladní doprava nad 22 t. Dále došlo k doplnění DZ v přilehlých ulicích stavby pro zajištění bezpečnosti a vyšší přehlednosti dopravní situace.

V rámci přípravy stavby (vyřízení DIR) došlo k vypracování nového projektu DIO pro celou stavbu, který vychází z TP 66 a vznikl na základě místního šetření a požadavků dotčených orgánů.

V ZBV došlo tedy k úpravě množství stávajících položek a také došlo k doplnění nových položek v souladu s projednaným a vydaným DIR.

TDI provedl kontrolu jednotkových cen, množství a posoudil ZBV z technického hlediska.

Z ekonomického i technického hlediska nemám k předložené dokumentaci ZBV připomínky.

TDI : Jakub Kaprel

.....

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

II/331 Brandýs nad Labem - I/9, rekonstrukce - VII. etapa

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Silnice II/331, úsek km 17,52-KÚ**108/1**

Číslo ZBV:

2

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov
IČ: 00066001

Obec Borek
Borek 61, 277 14 Borek
IČ: 00236713

Zhotovitel: M - SILNICE a. s.
Husova 1697, 530 03 Pardubice
IČ:42196868

Rekapitulace ZBV č. 2 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.3	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.4	0,00	204 852,59	204 852,59

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2	0,00	204 852,59	204 852,59

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré:

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: II/331 Brandýs nad Labem - I/9, rekonstrukce - VII. etapa Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Silnice II/331, úsek km 17,52-KÚ	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 108/1	Číslo ZBV: 2.4
--	---	--------------------------

Strany smlouvy o dílo objednatel č.: S-3799/00066001/2020 a zhotovitel č.: 25-SOD-2021-002 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 29.01.2021 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov
Obec Borek, Borek 61, 277 14 Borek

Zhotovitel: M - SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice, IČO: 42196868

Přílohy Změnového listu:			Paré č.	Příjemce
1. Krycí list	1	počet listů	1, 2	Objednatel
2. Změnový list	2	počet listů	3,4	Zhotovitel
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů	5	Projektant (AD)
4. Rozpis ocenění Změn položek ZBV 2	3	počet listů	6	Stavební dozor
5. Přehled zařízení změn do skupin	1	počet listů	7	Supervize
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů		
Další doklady dle přehledu dokladů	14	počet listů		

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Dílicí změna 1: Výšková úprava ostrůvku

V projektové dokumentaci PDPS byl zpracován středový ostrůvek v ulici Okružní jako související investice. Ostrůvek byl vybudován na podzim v roce 2020 ještě před zahájením stavby II/331 Brandýs nad Labem - I/9, rekonstrukce - VII. etapa. Vlivem navýšení nivelety v projektu nebylo možné, dle geodetického zaměření, zachovat stávající středový ostrůvek v dané výškové úrovni a bylo nezbytné středový ostrůvek demontovat a následně jej v průběhu stavby obnovit v odpovídajícím výškovém uspořádání.

Jedná se o Změnu nepodstatnou, která je podle § 5, odst.1 písm.d), resp.podle § 11 Směrnice R-Sm-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29. 05. 2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek zařazena do skupiny 4 jako změna nezbytná k dokončení. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 5) se jedná o změnu nezbytnou u níž není změna v osobě dodavatele možná z ekonomických anebo technických důvodů, kdy změna v osobě dodavatele by způsobila zadavateli značné obtíže (narušení postupů výstavby, nedodržení technických a technologických postupů, nebo rozdělení odpovědnosti za vady) nebo výrazné zvýšení nákladů a hodnota těchto dodatečných stavebních prací nepřekračuje 50 % původní hodnoty závazku.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
0,00	204 852,59	204 852,59	204 852,59

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí): M - SILNICE a. s.	jméno	Ing. Tomáš Kučera	datum	podpis
Projektant (autorský dozor): Pontex, spol. s.r.o.	jméno	Ing. Pavel Hrdina	datum	podpis
Stavební dozor: SGS Czech Republic s. r. o.	jméno	Jakub Kaprel	datum	podpis
Supervize (Regionální dotační kancelář)	jméno	Ing. Václav Chytil	datum	podpis
Zástupce Objednatel: KSÚS SK	jméno	Bc. Marek Hanuš	datum	podpis
Zástupce Objednatel: Obec Borek	jméno	Vratislav Ryk	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitel sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel)	jméno	Ing. Jan Fidler	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	Mgr. Michal Kropáč M - SILNICE a.s. Ing. Zdeněk Babka M - SILNICE a.s.	datum	podpis
				Číslo par

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 2**

Název Stavby: II/331 Brandýs nad Labem - I/9, rekonstrukce - VII. etapa
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 108/1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Silnice II/331, úsek km 17,52-KÚ

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
22 266 556,92

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	22 266 556,92	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	204 852,59	204 852,59	0,92%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	0,00	22 471 409,51	204 852,59	0,92%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

M - SILNICE a. s.

souhlasím

Ing. Tomáš Kučera

Projektant (autorský dozor):

Pontex spol. s r.o.

souhlasím

Ing. Pavel Hrdina

Stavební dozor:

SGS Czech Republic s. r. o.

souhlasím

Jakub Kaprel

Zástupce Objednatele:

KSÚS SK

souhlasím

Bc. Marek Hanuš

Zástupce Objednatele:

Obec Borek

souhlasím

Vratislav Ryk

Supervize

regionální dotační kancelář

souhlasím

Ing. Václav Chytil

Zaměstnanec KSÚS SK

odpovědný za cenové

projednání Změny:

souhlasím

Ing. Jaroslava Jurkov

Rozpis ocenění Změn položek k - pro ZBV číslo 2.4

Evidenční číslo a název stavby: II/331 Brandýs nad Labem - I/9,
rekonstrukce - VII. etapa

Číslo a název SO/PS: SO 108 Silnice II/331, úsek km 17,52-KÚ

Číslo a název rozpočtu: SO 108 Silnice II/331, úsek km 17,52-KÚ

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

1

Skupina Změn: 4

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
001	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	14 993,024	15 005,584	12,560	116,000	1 739 190,780	-	1 456,960	1 740 647,740	1 456,960	0,084
002	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	2 451,070	2 467,060	15,990	116,000	284 324,120	-	1 854,840	286 178,960	1 854,840	0,652
		NOVÉ POLOŽKY											
066	02911R	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	KPL	0,000	1,000	1,000	58650,000	0,000	0,000	58650,000	58650,000	58650,000	100,000
067	02940R	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	KPL	0,000	1,000	1,000	32200,000	0,000	0,000	32200,000	32200,000	32200,000	100,000
068	113174	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 5KM	M3	0,000	1,264	1,264	408,000	0,000	0,000	515,710	515,710	515,710	100,000
069	113184	ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ DO 5KM	M3	0,000	0,868	0,868	981,000	0,000	0,000	851,510	851,510	851,510	100,000
070	113324	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 5KM	M3	0,000	7,995	7,995	321,000	0,000	0,000	2566,400	2566,400	2566,400	100,000
071	113763	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	0,000	25,500	25,500	99,000	0,000	0,000	2524,500	2524,500	2524,500	100,000
072	56145	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL. DO 250MM	M2	0,000	28,230	28,230	509,000	0,000	0,000	14369,070	14369,070	14369,070	100,000
073	58221	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA	M2	0,000	15,800	15,800	1090,000	0,000	0,000	17222,000	17222,000	17222,000	100,000
074	582612	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2		6,100	6,100	578,000	0,000	0,000	3525,800	3525,800	3525,800	100,000
075	582618	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	0,000	4,750	4,750	1070,000	0,000	0,000	5082,500	5082,500	5082,500	100,000
076	914811	STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z4 OCEĽ DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	0,000	2,000	2,000	1710,000	0,000	0,000	3420,000	3420,000	3420,000	100,000
077	914813	STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z4 OCEĽ DEMONTÁŽ	KUS	0,000	2,000	2,000	183,000	0,000	0,000	366,000	366,000	366,000	100,000
078	914923	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEĽ TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ	KUS	0,000	2,000	2,000	183,000	0,000	0,000	366,000	366,000	366,000	100,000
079	914931	SLOUPKY A STOJKY DZ Z HLINÍK TRUBEK ZABETON DOD A MONTÁŽ	KUS	0,000	2,000	2,000	2140,000	0,000	0,000	4280,000	4280,000	4280,000	100,000
080	914131	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCEĽOVÉ FÓĽIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	2,000	4,000	2,000	1365,000	2730,000	0,000	2730,000	5460,000	2730,000	100,000
081	914133	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCEĽOVÉ FÓĽIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ	KUS	50,000	52,000	2,000	253,000	12650,000	0,000	506,000	13156,000	506,000	4,000
082	91782	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ KAMENNÝCH	M	0,000	31,000	31,000	433,000	0,000	0,000	13423,000	13423,000	13423,000	100,000
083	93135	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR PRYŽ PÁSKOU NEBO KRUH PROFILEM	M	0,000	25,500	25,500	46,000	0,000	0,000	1173,000	1173,000	1173,000	100,000
084	931323	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 300MM2	M	0,000	25,500	25,500	141,000	0,000	0,000	3595,500	3595,500	3595,500	100,000
085	96615	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTĚHO BETONU	M3	0,000	1,850	1,850	3470,000	0,000	0,000	6419,500	6419,500	6419,500	100,000
086	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	2507,692	2568,502	60,810	76,000	0,000	0,000	4621,560	4621,560	4621,560	100,000
087	915211	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	70,317	131,127	60,810	354,000	0,000	0,000	21526,740	21526,740	21526,740	100,000
088	915221	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	0,000	4,400	4,400	365,000	0,000	0,000	1606,000	1606,000	1606,000	100,000
		Celkem							0,00	204 852,59		204 852,59	

Odpovědný zástupce Objednatel i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovite Ing. Tomáš Kučera

Za Objednatel: Jakub Kaprel

Datum:

Datum:

Podpis:

Podpis:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: II/331 Brandýs nad Labem - I/9, rekonstrukce - VII. etapa

1	Přijaté smluvní částka bez rezervy a DPH	66 596 000,20
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	67 116 594,79
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	81 211 079,70
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	100,78%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%
40=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, odst. (6), písm. b)	-0,05%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	520 594,59
7=(8/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	0,78%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	19 978 800,06

9=(32A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	0,58%
10=(36A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,31%
10A=32A+36A	Suma absolutních hodnot pro Skupinu 3 a Skupinu 4	588 436,59
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	33 298 000,10

12=(37/1)*100	Sledování limitu 15%	0,00
13=37	Sledování limitu 140 448 000	0,00%
14=140448000-37		140 448 000,00

		- 1 -		- 2 -		- 3 -		- 4 -		- 5 -											
		Vyhrazené změny (Doměrky)		Záměna položek (Započítávání)		Nepředvidanost		Nezbytnost		Změny de minimis											
SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny de minimis (15% nebo 140 448 000 Kč)	limit 15 %
16	17	18	19=23+26+29+33	20=24+27+30+34+37+39	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	32=29+30	32A=ABS(29)+30	33	34	36=33+34	36A=ABS(33)+34	37	38=(37/1)*100
		0,00	- 33 921,00	554 515,59	520 594,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 33 921,00	349 663,00	315 742,00	383 584,00	0,00	204 852,59	204 852,59	204 852,59	0,00	0,00
187	1	Přechodné dopravní značení/Změna přechodného DZ	- 33 921,00	349 663,00	315 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 33 921,00	349 663,00	315 742,00	383 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	2	Sáňce II/331, úsek km 17,52 - KÚ/Výšková úprava ostrůvku	0,00	204 852,59	204 852,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 852,59	204 852,59	204 852,59	0,00	0,00

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: II/331 Brandýs nad Labem - I/9, rekonstrukce - VII. etapa

1	Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	66 596 000,20
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	67 116 594,79
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	81 211 079,70
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	100,78%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%
40=(19/1)*100	Sledování limitů 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, odst. (5), písm. b)	-0,05%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	520 594,59
7=(6/1)*100	Sledování limitů 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	0,78%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	19 978 800,06

9=(32A/1)*100	Sledování limitů 50 % Skupina 3	0,58%
10=(36A/1)*100	Sledování limitů 50 % Skupina 4	0,31%
10A=32A+36A	Suma absolutních hodnot pro Skupinu 3 a Skupinu 4	588 436,59
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	33 298 000,10

12=(37/1)*100	Sledování limitů 15%	0,00
13=37	Sledování limitů 140 448 000	0,00%
14=140448000-37		140 448 000,00

40=(19/1)*100																					
Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, odst. (5), písm. b)						-0,05%															
						- 1 -			- 2 -			- 3 -				- 4 -				- 5 -	
						Vyhrazené změny (Doměrky)			Záměna položek (Započítávání)			Nepředvidanost				Nezbytnost				Změny de minimis	
SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny de minimis (15% nebo 140 448 000 Kč)	Limit 15 %
16	17	18	19=23+26+29+33	20=24+27+30+34+37+39	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	32=29+30	32A=ABS(29)+30	33	34	36=33+34	36A=ABS(33)+34	37	38=(37/1)*100
		0,00	- 33 921,00	554 515,59	520 594,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 33 921,00	349 663,00	315 742,00	383 584,00	0,00	204 852,59	204 852,59	204 852,59	0,00	0,00
187	1	Přechodné dopravní značení/Změna přechodného DZ	- 33 921,00	349 663,00	315 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 33 921,00	349 663,00	315 742,00	383 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	2	Silnice II/331, úsek km 17,52 - KÚ/Výšková úprava ostrůvku	0,00	204 852,59	204 852,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 852,59	204 852,59	204 852,59	0,00	0,00

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	2
Název a evidenční číslo stavby:	II/331 Brandýs nad Labem - I/9, rekonstrukce - VII. etapa
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Silnice II/331, úsek km 17,52-KÚ
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	108/1

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
07 Rozpis ocenění SO celkem	3	
08 Oznámení o zjištění skutečnosti	1	
09 Pokyn Objednatele k realizaci navržených změn	1	
10 Přehled cenových nabídek	7	
11 Vyjádření TDI	2	
Počet listů celkem	14	

10.85=10.850 [A] 15.8*1.1=17.380 [B] Celkem: A+B=28.230 [C] expertní cena dle 2021_OTSKP													
073	58221	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA	M2	0,000	15,800	15,800	1090,000	0,000	0,000	17222,000	17222,000	17222,000	100,000
Vč. lože tl. 40 mm, L DDK 2/5 dle ČSN 73 6131. 15.8=15.800 [A] expertní cena dle 2021_OTSKP													
074	582612	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2		6,100	6,100	578,000	0,000	0,000	3525,800	3525,800	3525,800	100,000
Vč. lože tl. 40 mm, L DDK 2/5 dle ČSN 73 6131. 6.1=6.100 [A] expertní cena dle 2021_OTSKP													
075	58261B	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	0,000	4,750	4,750	1070,000	0,000	0,000	5082,500	5082,500	5082,500	100,000
Vč. lože tl. 40 mm, L DDK 2/5 dle ČSN 73 6131. 4.75=4.750 [A] expertní cena dle 2021_OTSKP													
076	914811	STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z4 OCEL DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	0,000	2,000	2,000	1710,000	0,000	0,000	3420,000	3420,000	3420,000	100,000
2=2.000 [A]													
077	914813	STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z4 OCEL DEMONTÁŽ	KUS	0,000	2,000	2,000	183,000	0,000	0,000	366,000	366,000	366,000	100,000
Včetně uložení na skládku a příp. skládkovného. 2=2.000 [A] expertní cena dle 2021_OTSKP													
078	914923	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ	KUS	0,000	2,000	2,000	183,000	0,000	0,000	366,000	366,000	366,000	100,000
Včetně uložení na skládku a skládkovného. C4a+Z4: 2=2.000 [A] expertní cena dle 2021_OTSKP													
079	914931	SLOUPKY A STOJKY DZ Z HLINÍK TRUBEK ZABETON DOD A MONTÁŽ	KUS	0,000	2,000	2,000	2140,000	0,000	0,000	4280,000	4280,000	4280,000	100,000
C4a+Z4: 2=2.000 [A] expertní cena dle 2021_OTSKP													
080	914131	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	2,000	4,000	2,000	1365,000	2730,000	0,000	2730,000	5460,000	2730,000	100,000
C4a: 2=2.000 [A] SO197: 2 [B] Celkem: A+B=4 [C] cena dle SOD, SO 197													
081	914133	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ	KUS	50,000	52,000	2,000	253,000	12650,000	0,000	506,000	13156,000	506,000	4,000
C4a: 2=2.000 SO197: 50 [B] Celkem: A+B=52 [C] cena dle SOD, SO 197													
082	91782	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ KAMENNÝCH	M	0,000	31,000	31,000	433,000	0,000	0,000	13423,000	13423,000	13423,000	100,000
Včetně betonového lože C20/25nXF3 tl. min. 150 mm. 31=31.000 [A] expertní cena dle 2021_OTSKP													
083	93135	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR PRYŽ PÁSKOU NEBO KRUH PROFILEM	M	0,000	25,500	25,500	46,000	0,000	0,000	1173,000	1173,000	1173,000	100,000
Výplň spár pro proříznutí dle položky 113763 modifikovanou asfaltovou zálivkou typu N2 dle ČSN EN 14 188-1 a dle VL 2 212.05 08.07 a dle PD. Rozměr dle VL min. 20x12 mm. 25.5=25.500 [A] expertní cena dle 2021_OTSKP													
084	931323	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 300MM2	M	0,000	25,500	25,500	141,000	0,000	0,000	3595,500	3595,500	3595,500	100,000
Výplň spár pro proříznutí dle položky 113763 modifikovanou asfaltovou zálivkou typu N2 dle ČSN EN 14 188-1 a dle VL 2 212.05 08.07 a dle PD. Rozměr dle VL min. 20x12 mm. 25.5=25.500 [A] expertní cena dle 2021_OTSKP													
085	96615	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTĚHO BETONU	M3	0,000	1,850	1,850	3470,000	0,000	0,000	6419,500	6419,500	6419,500	100,000
Bourání betonového lože obrubníků. Plocha lože - cca 0,05 m2/délky. 113534: 31*0.05=1.550 [A] 914931: 2*0.5*0.5*0.6=0.300 [B] Celkem: A+B=1.850 [C] expertní cena dle 2021_OTSKP													
086	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	2507,692	2568,502	60,810	76,000	0,000	0,000	4621,560	4621,560	4621,560	100,000

Přechod pro chodce š. 4,0 m, d. 8,0 m

Dopravní stíny

8*4*0,5=16[A]

6,875+4+8,75+25,185=44,81 [B]

SO197: 2507,692 [C]

Celkem: A+B=2568,502 [C] cena dle SOD, SO 197

087	915211	VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLÁŠTĚM HLADKÉ - DODAVKA A POKLÁDKA	M2	70,317	131,127	60,810	354,000	0,000	0,000	21526,740	21526,740	21526,740	100,000
-----	--------	---	----	--------	---------	--------	---------	-------	-------	-----------	-----------	-----------	---------

Přechod pro chodce š. 4,0 m, d. 8,0 m

Dopravní stíny

8*4*0,5=16[A]

6,875+4+8,75+25,185=44,81 [B]

SO197:70,317

Celkem: A+B+C=131,127 [C] cena dle SOD, SO 197

088	915221	VODOR DOPRAV ZNAČ PLÁŠTĚM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	0,000	4,400	4,400	365,000	0,000	0,000	1606,000	1606,000	1606,000	100,000
-----	--------	---	----	-------	-------	-------	---------	-------	-------	----------	----------	----------	---------

Vodící linie na přechodu pro chodce š. 0,55 m

8*0,55=4,4 m2 expertní cena dle 2021_OTSKP

		Celkem					2 038 894,90	0,00	204 852,59	2 243 747,49	204 852,59	10,05%
--	--	--------	--	--	--	--	--------------	------	------------	--------------	------------	--------

KSÚS Středočeského kraje
Marek Hanuš
Oprávněný zástupce objednatele

Zborovska 11
150 21 Praha 5

Váš dopis zn./ze dne

Naše značka
25-SOD-2021-002vyřizuje / tel.
Josef Mikel/702262621V Praze dne
6. 4. 2021**Věc: Oznámení o zjištění skutečnosti****Název stavby: II/331 Brandýs nad Labem – I/9, rekonstrukce – VII.etapa**

Vážený pane Hanuš,

Dne 7. 4. 2021 vám bylo oznámeno na místním setření zástupci města Brandýs, že požadují v rámci naší stavby, obnovení stávajícího středového ostrůvku v km 18,22. Tento středový ostrůvek město vybudovalo na pozdzim v roce 2020 před zahájením stavby rekonstrukce silnice II/331.

Dle geodetického zaměření zhotovitelem stavby a kontrolou projektantem RDS není možné stávající středový ostrůvek zachovat ve stávajícím výškovém uspořádání, tato skutečnost nebyla zhotoviteli předem známa.

Zhotovitel žádá objednatele o vydání pokynu na realizaci demontáže a obnovení středového ostrůvku dle místního setření, příp. ať navrhne řešení sám. Tímto dojde k navýšení SOD o vícepráce.

Žádám o pokyn nejpozději do 14.4.2021.

S pozdravem

Josef Mikel
zás

V Říčanech 03. 05. 2021

Evidenční číslo: 24624/2021-KSÚS

Číslo jednací: 160/21/KSUS/OI/KRK

Vážený pan
Josef Mikel
M-SILNICE a.s.
Husova 1697,
530 03 Pardubice

Věc: II/331 Brandýs nad Labem- I/9, rekonstrukce – VII. etapa

Vážený pane vedoucí,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o. (dále jen KSÚS), jako investor akce „**II/331 Brandýs nad Labem- I/9, rekonstrukce – VII. etapa**“ je seznámena se žádostí o zpracování ZBV na Vámi uvedené okolnosti, které se v projektové dokumentaci ve stupni PDPS nedali předpokládat (viz příloha č. 1 a 2- Oznámení o zjištění zkušenosti od společnosti M-SILNICE a.s.).

KSÚS bere na vědomí, že zhotovitel nemohl v době zadávací lhůty soutěže předvídat výskyt těchto okolností, a proto KSÚS žádá zhotovitele společnost M-SILNICE a.s. o vypracování Změnových listů, a to v souladu se směrnicí KSÚS, která je nedílnou součástí Smlouvy o dílo. Tyto ZBV budou následně projednány a podrobně posouzeny supervizorem zakázky, následně budou posouzeny vedením KSÚS.

S pozdravem

Ing. J. J.
Řed

Přílohy:

1. Oznámení o zjištěné zkušenosti ze dne 06. 04. 2021 č. 1
2. Oznámení o zjištěné zkušenosti ze dne 06. 04. 2021 č. 2

10. Přehled cenových nabídek

Poř. Č. pol.	kód položky	Název položky	č. nab./s tr.	Firma	Cena celkem	Cena vč. DPH
066	02911R	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETIVKÉ ZAMĚŘENÍ	2/7	PRAGEMA s. r. o.	51 000,00 Kč	61 710,00 Kč
			3/7	FOXGEO s. r. o.	60 800,00 Kč	73 568,00 Kč
			4/7	Delta G s. r. o.	62 000,00 Kč	75 020,00 Kč
067	02940R	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	5/7	M - PROJEKCE s. r. o.	28 000,00 Kč	33 880,00 Kč
			6/7	Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb a. s.	35 500,00 Kč	42 955,00 Kč
			7/7	BORA projekt s. r. o.	37 000,00 Kč	44 770,00 Kč



**Nabídka geodetických prací
Ostrůvek v km 18,2:**

kancelář: Na Pankráci 58/1062
140 00 Praha 4

tel./fax:

e-mail:

www: www.pragama.cz

Položka	MJ	počet MJ	cena/MJ	cena celkem
Práce před zahájením stavby				
Změření podkladů pro projekt	1 kpl	1	15 000 Kč	15 000 Kč
Práce v průběhu stavby				
Vytyčovací práce				
vytyčení obrub, osy vozovky a dalších stavebních objektů v intravilánu	1 kpl	1	25 000 Kč	25 000 Kč
Práce po dokončení stavby				
Zaměření a zpracování geodetické dokumentace skutečného provedení stavby	1 kpl	1	11 000 Kč	11 000 Kč
Cena celkem bez DPH:				51 000 Kč

Vyhotovil: Ing. Lukáš Weiss



FOXGeo s.r.o.
Za Trati 928/6
196 00 Praha 9 - Čakovice
tel. :
e-m:
IČ: 05090709, DIC: CZ05090709

Cenová nabídka geodetických prací

1) **Zákazník :** M-Silnice a.s.
Husova 1697
530 03 Pardubice

2) **Stavba :**

„II/331 Brandýs n. Labem - I/9, rekonstrukce“

3) **Specifikace cenové nabídky :**

Ostrůvek v km 18,2:

- zaměření podkladů pro projekt – KPL = 16.000,-Kč
- vytyčovací práce – KPL = 28.800,-Kč
- geodetické zaměření skutečného provedení stavby – KPL = 16.000,-Kč

4) **Celková cena :**

- **Celková cena za geodetické práce = 60.800,-Kč bez DPH**

Poznámka : Výsledná cena zahrnuje činnost UOZI – Z po celou dobu stavby.

Cenovou nabídku vy

Geodetické práce - nabídka

Objednatel: M-Silnice a.s.
Husova 1697
530 03 Pardubice

Zhotovitel: Delta G s.r.o.
Tiskařská 257/10
108 00 Praha 10

Název zakázky: **II/331 Brandýs n. Labem - I/9, rekonstrukce**

Předmět nabídky jsou tyto práce:

Ostrůvek v km 18,2:

- zaměření podkladů pro projekt
- vytyčovací práce
- geodetické zaměření skutečného provedení stavby

Nabízená cena: **62 000 Kč** bez 21% DPH.

Nabídku vypracoval: Ing. Petr Váša
jednatel Delta G s.r.o.

Havlátová Eliška

Od: Mikel Josef
Odesláno: pátek 16. dubna 2021 9:34
Komu: Havlátová Eliška
Předmět: FW: Brandys

Příznak pro zpracování: Zpracovat
Stav příznaku: Opatřeno příznakem

From: Břichnáč Václav <
Sent: Friday, April 16, 2021 9:16 AM
To: Mikel Josef
Subject: RE: Brandys


Dobrý den,

naše nabídka:

Výšková úprava ostrůvku v km 18,22 28 000,- Kč bez DPH

S pozdravem,

Ing. Václav Břichnáč
Vedoucí pracoviště Praha
mobil: +
vaclav.brichnac@m-projekce.cz
www.m-projekce.cz



M – PROJEKCE s.r.o.	Pracoviště Praha
Resslova 956	Freyova 82/27
500 02 Hradec Králové	190 00 Praha 9

Společnost M-PROJEKCE s.r.o. poskytuje v souladu s požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) veškeré informace o zpracování Vašich osobních údajů na svých webových stránkách www.m-projekce.cz

Havlátová Eliška

Od: Mikel Josef
Odesláno: pátek 16. dubna 2021 9:35
Komu: Havlátová Eliška
Předmět: Fwd: II/331 Brandýs n. Labem – rekonstrukce _ nabídka projekčních prací

Příznak pro zpracování: Zpracovat
Stav příznaku: Opatřeno příznakem

M-Silnice a.s.

Začátek přeposílané zprávy:

Od: Ivan Šír
Datum: 16. dubna 2021 7:21:34 SEČ
Komu: Mikel Josef
Předmět: FW: II/331 Brandýs n. Labem – rekonstrukce _ nabídka projekčních prací

Dobrý den,

na základě dohody Vám nabízíme zpracování RDS v této finanční výši:

Výšková úprava ostrůvku v km 18,22

35 500,- Kč bez DPH

Termín: srpen 2021

Děkuji

S pozdravem Ivan Šír

Ing. Ivan Šír

tel: + , e-mail: web: www.sirivan.cz

Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb a.s.

Haškova 1714/3, 500 02 Hradec Králové

IČ: 287 86 793, DIČ: CZ28786793, bankovní spojení: ČSOB Hradec Králové, číslo účtu

Společnost je držitelem certifikátů dle norem: ČSN EN ISO 14001:2005, ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN OHSAS 18001:2008, ČSN ISO 10006:2004, ČSN ISO/IEC 27001:2006

Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb CZ s.r.o.

Haškova 1714/3, 500 02 Hradec Králové

IČ: 259 62 914, DIČ: CZ25962914, bankovní spojení: ČSOB Hradec Králové, číslo účtu

Nedílnou součástí této zprávy je právní doložka, jejíž plné znění naleznete na adrese <http://www.sirivan.cz/dolozka>

Dobrý den,

na základě Vaší poptávky Vám v rámci akce „II/331 Brandýs n. Labem – rekonstrukce“ nabízíme zpracování:

Výšková úprava ostrůvku v km 18,22

37 000,- Kč bez DPH

Termín: dle dohody

S pozdravem

ing.
jedr.

<



Ing.

Doručovací adresa: **BORA projekt s.r.o.**
Veletržní 47
170 00 Praha 7

IČ: 072 44 878

Obchodní rejstřík: vedený Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 297495

Vyřizuje: Jakub Kaprel, TDI

Datum : 24.8.2021

Krajská správa a údržba silnic

Marek Hanuš

Středočeského kraje, příspěvková organizace

Zborovská 11, 150 21

Praha 5

Věc: vyjádření TDI k dokumentaci ZBV č.2 – dělicí dopravní ostrůvek

Stavba: II/331 Brandýs nad Labem – I/9, rekonstrukce

V rámci výkonu TDI na výše uvedené stavbě jsme obdrželi návrh dokumentace ZBV č. 2 – SO 108 Obnova dělicího dopravního ostrůvku v km 18,225.

Předmětná dokumentace ZBV řeší náklady spojené s obnovou dopravního ostrůvku v km 18,225.

Před zahájením stavby (na podzim roku 2020) město vybudovalo ve výše uvedeném staničení dopravní ostrůvek s přechodem pro chodce. V PDPS bylo uvažováno zachování tohoto dopravního ostrůvku, avšak při realizaci bylo zjištěno, že osazený dopravní ostrůvek je osazen ve výšce, která nekoresponduje s niveletou navrženou v PDPS.

Dopravní ostrůvek tedy musel být kompletně rozebrán a přeskládán do nové polohy a výškově přizpůsoben, tak aby korespondoval s navrženou niveletou v PDPS/RDS.

Při provádění prací byla průběžně prováděna kontrola TDI a množství bylo zaznamenáno do listu výkazu výměr.

V ZBV č. 2 jsou předmětné práce řešeny následujícími položkami:

- 1) Kód pol. 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU – navýšeno množství stávající položky, množství odpovídá skutečnosti
- 2) Kód pol. 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU – navýšeno množství stávající položky, množství odpovídá skutečnosti
- 3) Kód pol. 02911R OSTATNÍ POŽADAVKY – GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ – nová položka
- 4) Kód pol. 02940R OSTATNÍ POŽADAVKY – VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE – nová položka
- 5) Kód pol. 113174 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ DO 5KM– nová položka, JC převzata z OTSKP 2021, množství odpovídá skutečnosti
- 6) Kód pol. 113324 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 5KM– nová položka, JC převzata z OTSKP 2021, množství odpovídá skutečnosti
- 7) Kód pol. 113763 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE– nová položka, JC převzata z OTSKP 2021, množství odpovídá skutečnosti
- 8) Kód pol. 56145 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL. DO 250MM– nová položka, JC převzata z OTSKP 2021, množství odpovídá skutečnosti
- 9) Kód pol. 58221 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA– nová položka, JC převzata z OTSKP 2021, množství odpovídá skutečnosti
- 10) Kód pol. 58261B KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM– nová položka, JC převzata z OTSKP 2021, množství odpovídá skutečnosti
- 11) Kód pol. 914811 STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z4 OCEL DODÁVKA A MONTÁŽ– nová položka, JC převzata z OTSKP 2021, množství odpovídá skutečnosti

- 12) Kód pol. 914813 STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z4 OCEL DEMONTÁŽ– nová položka, JC převzata z OTSKP 2021, množství odpovídá skutečnosti
- 13) Kód pol. 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ– nová položka, JC převzata z OTSKP 2021, množství odpovídá skutečnosti
- 14) Kód pol.914931 SLOUPKY A STOJKY DZ Z HLINÍK TRUBEK ZABETON DOD A MONTÁŽ nová položka, JC převzata z OTSKP 2021, množství odpovídá skutečnosti
- 15) Kód pol. 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ – nová položka, JC převzata z OTSKP 2021, množství odpovídá skutečnosti
- 16) Kód pol. 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 – DEMONTÁŽ – nová položka, JC převzata z OTSKP 2021, množství odpovídá skutečnosti
- 17) Kód pol.91782 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ KAMENNÝCH – nová položka, JC převzata z OTSKP 2021, množství odpovídá skutečnosti
- 18) Kód pol.93135 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR PRYŽ PÁSKOU NEBO KRUH PROFILEM– nová položka, JC převzata z OTSKP 2021, množství odpovídá skutečnosti
- 19) Kód pol.931323 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 300MM2– nová položka, JC převzata z OTSKP 2021, množství odpovídá skutečnosti
- 20) Kód pol.96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU– nová položka, JC převzata z OTSKP 2021, množství odpovídá skutečnosti
- 21) Kód pol. 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA – nová položka, JC převzata z OTSKP 2021, množství odpovídá skutečnosti
- 22) Kód pol.915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA – nová položka, JC převzata z OTSKP 2021, množství odpovídá skutečnosti
- 23) Kód pol.915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA– nová položka, JC převzata z OTSKP 2021, množství odpovídá skutečnosti

**TDI provedl kontrolu jednotkových cen, množství a posoudil ZBV z technického hlediska.
Z ekonomického i technického hlediska nemám k předložené dokumentaci ZBV připomínek.
Na základě výše uvedeného souhlasím s předloženou dokumentací ZBV č. 2.**

TDI : Jakub Kaprel

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

II/331 Brandýs nad Labem - I/9, rekonstrukce - VII. etapa

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

Číslo ZBV:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Silnice II/331, úsek km 17,52 - KÚ**108/2****3**

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov
IČ: 00066001

Obec Borek
Borek 61, 277 14 Borek
IČ: 00236713

Zhotovitel: M - SILNICE a. s.
Husova 1697, 530 03 Pardubice
IČ:42196868

Rekapitulace ZBV č. 3 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3.3	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3.4	0,00	921 763,21	921 763,21

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3	0,00	921 763,21	921 763,21

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré:

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby:

II/331 Brandýs nad Labem - I/9, rekonstrukce - VII. etapa

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Silnice II/331, úsek km 17,52 - KÚ

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

108/2

Číslo ZBV:

3.4

Strany smlouvy o dílo objednatel č.: S-3799/00066001/2020 a zhotovitel č.: 25-SOD-2021-002 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 29.01.2021 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov

Obec Borek, Borek 61, 277 14 Borek

Zhotovitel: M - SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice, IČO: 421 96 868

Přílohy Změnového listu:

1. Krycí list	1	počet listů
2. Změnový list	1	počet listů
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů
4. Rozpis ocenění Změn položek ZBV	1	počet listů
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů
Další doklady dle přehledu dokladů	15	počet listů

Paré č.

Příjemce

1, 2	Objednatel
3, 4	Zhotovitel
5	Projektant (AD)
6	Stavební dozor
7	Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Díličí změna 1: Hloubení a zpětný zásyp jam, oprava kanalizace

V projektové dokumentaci PDPS byly naprojektovány nové uliční vpusti v jiném místě, než jsou stávající uliční vpusti. Stávající uliční vpusti měly být zaslepeny přímo pod uliční vpustí, nicméně provozovatel - firma STAVOKOMPLET nesouhlasí s navržených technickým řešením. Je požadováno zaslepení přípojek na kanalizačním řádu, pokud se hlavní stoka nachází v hloubce do 3,5 m. V místech, kde je stoka hlouběji než 3,5 m, je požadováno zaslepení pomocí kanalizačního robotu. Z uvedeného důvodu bylo nezbytné realizovat řešení dle požadavků předmětného provozovatele.

Jedná se o Změnu nepodstatnou, která je podle § 5, odst.1 písm.d), resp.podle § 11 Směrnice R-Sm-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29. 05. 2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek zařazena do skupiny 4 jako změna nezbytná k dokončení. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 5) se jedná o změnu nezbytnou u níž není změna v osobě dodavatele možná z ekonomických anebo technických důvodů, kdy změna v osobě dodavatele by způsobila zadavateli značné obtíže (narušení postupů výstavby, nedodržení technických a technologických postupů, nebo rozdělení odpovědnosti za vady) nebo

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
0,00	921 763,21	921 763,21	921 763,21

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí): M - SILNICE a. s.	Jméno	Ing. Tomáš Kučera	datum	podpis
Projektant (autorský dozor): Pontex, spol. s.r.o.	Jméno	Ing. Pavel Hrdina	datum	podpis
Stavební dozor: SGS Czech Republic s. r. o.	Jméno	Jakub Kaprel	datum	podpis
Supervize (Regionální dotační kancelář)	Jméno	Ing. Václav Chytil	datum	podpis
Zástupce Objednatel: KSÚS SK	Jméno	Bc. Marek Hanuš	datum	podpis
Zástupce Objednatel: Obec Borek	Jméno	Vratislav Ryk	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitelé sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitelé své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel)	Jméno	Ing. Jan Fidler	datum	podpis
Zhotovitel	Jméno	Mgr. Michal Kropáč M - SILNICE a.s. Ing. Zdeněk Babka M - SILNICE a.s.	datum	podpis
				Číslo par

projednání Změny:

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo 3.4													
Evidenční číslo a název stavby: II/331 Brandýs nad Labem - I/9, rekonstrukce - VII. Etapa Číslo a název SO/PS: SO 108 Silnice II/331, úsek km 17,52 - KÚ Číslo a název rozpočtu: SO 108 Silnice II/331, úsek km 17,52 - KÚ								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								č. 2					
								Skupina Změn 4					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
001	14102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	m3	14 993,024	15 638,833	645,809	116,00	1 739 190,78	0,00	74 913,84	1 814 104,62	74 913,84	4,31
025	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	m3	4 635,259	5 281,068	645,809	11,00	50 987,85	0,00	7 103,90	58 091,75	7 103,90	13,93
028	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	m3	150,750	473,655	322,905	577,00	86 982,75	0,00	186 316,19	273 298,94	186 316,19	214,20
052	87433	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM	m	112,720	309,000	196,280	360,00	40 579,20	0,00	70 660,80	111 240,00	70 660,80	174,13
NOVÉ POLOŽKY													
089	131738	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	m3	4,88	332,39	327,507	354,00	1 726,81	0,00	115 937,48	117 664,29	115 937,48	6713,97
090	12970R	BEZVÝKOPOVÁ OPRAVA KANALIZACE	kpl	0,00	1,00	1,000	53 015,00	0,00	0,00	53 015,00	53 015,00	53 015,00	100,00
091	12971R	TLAKOVÉ ČIŠTĚNÍ KANALIZACE	kpl	0,00	2,00	2,000	206 908,00	0,00	0,00	413 816,00	413 816,00	413 816,00	100,00
		Celkem							0,00	921 763,21		921 763,21	

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Tomáš Kučera

Datum:

Podpis:

Za Objednatele: Jakub Kaprel

Datum:

Podpis:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: II/331 Brandýs nad Labem - I/9, rekonstrukce - VII. etapa

1	Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	66 596 000,20
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	68 038 358,00
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	82 326 413,18
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	102,17%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%
40=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, odst. (5), písm. b)	-0,05%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	1 442 357,80
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	2,17%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	19 978 800,06

9=(32A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	0,58%
10=(36A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	1,69%
10A=32A+36A	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	1 510 199,80
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	33 298 000,10

12=(37/1)*100	Sledování limitu 15%	0,00
13=37	Sledování limitu 140 448 000	0,00%
14=140448000-37		140 448 000,00

40=(19/1)*100		Sledování limitů 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, odst. (5), písm. b)				-0,05%															
						- 1 -			- 2 -			- 3 -				- 4 -				- 5 -	
						Vyhrazené změny (Doměrky)			Záměna položek (Započítávání)			Nepředvídanost				Nezbytnost				Změny de minimis	
SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny de minimis (15% nebo 140 448 000 Kč)	limit 15 %
16	17	18	19=23+26+29+33	20=24+27+30+34+37+39	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	32=29+30	32A=ABS(29)+30	33	34	36=33+34	36A=ABS(33)+34	37	38=(37/1)*100
		0,00	- 33 921,00	1 476 278,80	1 442 357,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 33 921,00	349 663,00	315 742,00	383 584,00	0,00	1 126 615,80	1 126 615,80	1 126 615,80	0,00	0,00
187	1	Přechodné dopravní značení/Změna přechodného DZ	- 33 921,00	349 663,00	315 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 33 921,00	349 663,00	315 742,00	383 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	2	Silnice II/331, úsek km 17,52 - KÚ/Výšková úprava ostrůvku	0,00	204 852,59	204 852,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 852,59	204 852,59	204 852,59	0,00	0,00
108	3	Silnice II/331, úsek km 17,52 - KÚ/Hloubení a zpětný zásyp jam, oprava kanalizace	0,00	921 763,21	921 763,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921 763,21	921 763,21	921 763,21	0,00	0,00

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	3
Název a evidenční číslo stavby:	II/331 Brandýs nad Labem - I/9, rekonstrukce - VII. etapa
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Silnice II/331, úsek km 17,52 - KÚ
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	108/2

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
07 Rozpis ocenění SO celkem	1	
08 Oznámení o zjištění nové skutečnosti změn	1	
10 Přehled cenových nabídek	7	
11 Vyjádření TDI	1	
12 Geodetické zaměření přípojek	3	
13 Vyjádření STAVOKOMPLET	1	
Počet listů celkem	15	

Rozpis ocenění Změn položek - celkem													
Evidenční číslo a název stavby:								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS:								č. 2					
Číslo a název rozpočtu:								celkem					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
001	14102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	m3	14 993,02	15 638,83	645,809	116,000	1 739 190,78	0,00	74 913,84	1 814 104,62	74 913,84	4,31
		zásyp hydrantů a šoupat: 22,95*2=45,90 Zásyp vodovodních přípojek: 56,769*2=113,539 Zásyp po zaslepení kanalizační přípojek na hl. řadu: 70,0*2=140,0 Zásyp rýh pro kanalizační přípojky: 173,185*2=346,3704											
025	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	m3	4 635,26	5 281,07	645,809	11,000	50 987,85	0,00	7 103,90	58 091,75	7 103,90	13,93
		položka 14102, 645,809 m3											
028	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	m3	150,75	473,66	322,905	577,000	86 982,75	0,00	186 316,19	273 298,94	186 316,19	214,20
		zásyp hydrantů a šoupat: 3*(1,5*1,5*0,6)+14*(1,5*1,5*0,6)=22,95 Zásyp vodovodních přípojek: 1,5*0,6*(10,75+10,73+10,27+2,79+10,28+2,35+10,91+6,26)- 3,14*0,15^2/4*(10,75+10,73+10,27+2,79+10,28+2,35+10,91+6,26)=56,770 Zásyp po zaslepení kanalizační přípojek na hl. řadu: 5*(2,0*2,0*3,5)=70,0 Zásyp rýh pro kanalizační přípojky: 1,5*0,6*196,28-3,14*0,15^2/4*196,28=173,185											
052	87433	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM	m	112,72	309,00	196,280	360,000	40 579,20	0,00	70 660,80	111 240,00	70 660,80	174,13
		196,28 m určeno dle geodetického zaměření (viz. 011 Geodetické zaměření přípojek)											
NOVÉ POLOŽKY													
089	131738	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	m3	4,878	332,385	327,507	354,00	1 726,81	0,00	115 937,48	117 664,29	115 937,48	6713,97
		hloubení rýh pro hydranty a šoupata: 3*(1,5*1,5*0,6)+14*(1,5*1,5*0,6)=22,95 Hloubení rýh pro přípojky: 1,5*0,6*(10,75+10,73+10,27+2,79+10,28+2,35+10,91+6,26)=57,906 Hloubení jam pro zaslepení kanalizačních přípojek na hl. řadu: 5*(2,0*2,0*3,5)=70,0 Hloubení rýh pro kanalizační přípojky: 1,5*0,6*196,28=176,652; cena dle SOD, SO 204											
090	12970R	BEZVÝKOPOVÁ OPRAVA KANALIZACE	kpl	0,00	1,00	1,00	53 015,00	0,00	0,00	53 015,00	53 015,00	53 015,00	100,00
		j. c. stanovena dle CN nabídky výhradního dodavatele pro firmu Stavokomplet (Příloha 10. Přehled cenových nabídek +15 % (poplatky správní, poplatky výrobní, zisk))											
091	12971R	TLAKOVÉ ČIŠTĚNÍ KANALIZACE	kpl	0,00	2,00	2,00	206 908,00	0,00	0,00	413 816,00	413 816,00	413 816,00	100,00
		j. c. stanovena dle nejnižší cenové nabídky (Příloha 10. Přehled cenových nabídek +15 % (poplatky správní, poplatky výrobní, zisk))											
Celkem								1 919 467,39	0,00	921 763,21	2 841 230,60	921 763,21	48,02%



KSÚS Středočeského kraje

Marek Hanuš

Oprávněný zástupce objednatele

Zborovská 11

Váš dopis zn./ze dne

Naše značka

25-SOD-2021-002

Vyřizuje/tel.

Josef Mikel/702262621

V Praze dne

18. 5. 2021

Věc: Oznámení o zjištění skutečnosti

Název stavby: II/331 Brandýs nad Labem – I/9, rekonstrukce – VII.etapa

Vážený pane Hanuš,

Na základě vámi zaslaného stanoviska od provozovatele kanalizace firmy STAVOKOMPLET spol. s r. o. ze dne 11. 5. 2021, není možné zaslepovat nevyužité stávající přípojky přímo u vybourané uliční vpusti, ale je nutné provést zaslepení přímo na hlavním kanalizačním řádu, který je v hloubkách od 2–4.5 m. Zároveň dojde k navýšení délky nových uličních přípojek do hlavní kanalizace, kde je nutné využít už zhotovené odbočky z hlavního řádu.

Zhotovitel žádá objednatele o vydání pokynu na realizaci zaslepení nevyužitých stávajících odboček, příp. ať navrhne řešení sám. Tímto dojde k navýšení SOD o vícepráce.

Žádám o pokyn nejpozději do 25.5.2021.

S pozdravem

Josef Mikel
Zástupce zhotovitele

V Říčanech

21. 06. 2021

Vážený pan
Josef Mikel
M-SILNICE a.s.
Husova 1697,
530 03 Pardubice

Věc: II/331 Brandýs nad Labem- I/9, rekonstrukce – VII. etapa

Vážený pane vedoucí,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o. (dále jen KSÚS), jako investor akce „**II/331 Brandýs nad Labem- I/9, rekonstrukce – VII. etapa**“ je seznámena se žádostí o zpracování ZBV na Vámi uvedené okolnosti, kterými jsou nutnost zaslepení stávajících, demontovaných přípojek přímo na hlavním kanalizačním řádu a dále o navýšení délky nových uličních přípojek. Tyto změny vznikly na základě požadavků správce kanalizace a v projektové dokumentaci ve stupni PDPS se s nimi předpokládalo.

KSÚS bere na vědomí, že zhotovitel nemohl v době zadávací lhůty soutěže předvídat výskyt těchto okolností, a proto KSÚS žádá zhotovitele společnost M-SILNICE a.s. o vypracování Změnových listů, a to v souladu se směrnicí KSÚS, která je nedílnou součástí Smlouvy o dílo. Tyto ZBV budou následně projednány a podrobně posouzeny supervizorem zakázky, následně budou posouzeny vedením KSÚS.

S pozdravem

Ing. Jan Lichneger
Ředitel KSÚS

Vyřizuje: Jakub Kaprel, TDI

Datum: 20.12.2021

Krajská správa a údržba silnic

Marek Hanuš

Středočeského kraje, příspěvková organizace

Zborovská 11, 150 21

Praha 5

Věc: vyjádření TDI k dokumentaci ZBV č.3 – hloubení a zpětný zásyp, oprava kanalizace SO 108

Stavba: II/331 Brandýs nad Labem – I/9, rekonstrukce

V projektové dokumentaci PDPS byly naprojektovány nové uliční vpusti v jiném místě, než jsou stávající uliční vpusti. Stávající uliční vpusti měly být zaslepeny přímo pod uliční vpustí, nicméně provozovatel – firma STAVOKOMPLET nesouhlasí s navržených technickým řešením. Je požadováno zaslepení přípojek na kanalizačním řádu, pokud se hlavní stoka nachází v hloubce do 3,5 m. V místech, kde je stoka hlouběji než 3,5 m, je požadováno zaslepení pomocí kanalizačního robotu. Při provádění prací byla prováděna průběžná kontrola TDI a množství bylo zaznamenáno do listu výkazu výměr.

V ZBV č. 3 jsou předmětné práce řešeny následujícími položkami:

Původní položky:

- 1) Kód pol. 14102 POPLATKY ZA SKLÁDKU 2000M2 – navýšeno množství stávající položky, množství odpovídá skutečnosti
- 2) Kód pol. 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ 2000M2 – navýšeno množství stávající položky, množství odpovídá skutečnosti
- 3) Kód pol. 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ 2000M2 – navýšeno množství stávající položky, množství odpovídá skutečnosti
- 4) Kód pol. 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM 2000M2 – navýšeno množství stávající položky, množství odpovídá skutečnosti

Nové položky:

- 5) Kód pol. 131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM – nová položka, JC převzata z OTSKP 2021, množství odpovídá skutečnosti
- 6) Kód pol. 12970R BEZVÝKOPOVÁ OPRAVA KANALIZACE – nová položka, množství odpovídá skutečnosti
- 7) Kód pol. 12971R TLAKOVÉ ČIŠTĚNÍ KANALIZACE – nová položka, množství odpovídá skutečnosti

TDI provedl kontrolu jednotkových cen, množství a posoudil ZBV z technického hlediska. Z ekonomického i technického hlediska nemám k předložené dokumentaci ZBV připomínky. Na základě výše uvedeného souhlasím s předloženou dokumentací ZBV č. 3.

TDI : Jakub Kaprel

.....

10. Přehled cenových nabídek

Poř. č. pol.	kód položky	Název položky	č. nab./s tr.	Firma	Cena celkem	Cena vč. DPH
090	12970R	BEZVÝKOPOVÁ OPRAVA KANALIZACE	2/7	Kanalizace Charvát, s. r. o.	46 100,00 Kč	55 781,00 Kč
091	12971R	TLAKOVÉ ČIŠTĚNÍ KANALIZACE	3/7	FEKO-LT s. r. o.	179 920,00 Kč	217 703,20 Kč
			5/7	PATOK a. s.	195 000,00 Kč	235 950,00 Kč
			7/7	Kanalizace Charvát, s. r. o.	209 650,00 Kč	253 676,50 Kč

Dodavatel:

**Kanalizace Charvát, s.r.o.
Lískovická 1290/8
193 00 Praha 913**

IČ: 08814694

DIČ: CZ08814694

Telefon

E-mail:

www.kanalizace-charvat.cz

Odběratel:

IČ:

42196868

DIČ:

CZ42196868

**M - SILNICE a.s.
Husova 1697
530 03 Pardubice**

Tel.: 607058683

Nabídka č.: 21NA00146

Datum zápisu: 17.05.2021

Platno do:

Konečný příjemce:

BEZVÝKOPOVÁ OPRAVA KANALIZACE

Místo akce: II/331 - Brandýs nad Labem - rekonstrukce

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Zaslepení KRV DN 400/700	5 x	8 500,00		42 500,00 21%	0,00	42 500,00
Kamerová prohlídka kanalizace	1 x	3 000,00		3 000,00 21%	0,00	3 000,00
Přistavení vozidla	1 x	600,00		600,00 21%	0,00	600,00
Součet položek				46 100,00	0,00	46 100,00
CELKEM K ÚHRADĚ						46 100,00


Ceny jsou uvedeny bez DPH!**Poznámka:****Potrubí bude třeba před započítím prací pročistit!****Bude potřebovat přesné staničení odboček, které se mají zaslepit!!****Výhody bezvýkopové opravy:**

- žádný zásah v bytech
- značná redukce času opravy - práce budou provedeny v krátkém čase
- minimální obtěžování obyvatel a narušení dopravy
- menší pravděpodobnost poškození jiného potrubí nebo podzemních kabelů
- menší narušení životního prostředí (kořenů, stromů, vodních toků)

Na provedené práce poskytujeme záruku 5let! Výrobce udává prodloužení životnosti potrubí 50-80let!

Děkujeme za posouzení cenové nabídky a v případě jakýchkoliv nejasností nás prosím kontaktujte. Těšíme se na spolupráci s Vámi.

Vystavil:



FEKO-LT s.r.o.
Prokopova 148/15
Praha 3 130 00

IČ: 29268966
DIČ:CZ 29268966
tel

ZÁKAZNÍK : M-SILNICE a.s., pí.Havlátová Eliška,
tel.:

PRÁCE : Tlakové čištění části stávající kanalizace na akci
„II/331 Brandýs nad Labem – I/9, rekonstrukce – VII.
etapa“, v délce ca 800m, v dimenzi DN300-800. Zanesení do
15% profilu. Vytyčení funkčních přípojek. Závěrečný
monitoring kanalizace po sanaci a zaslepení přípojek.

CENOVÁ NABÍDKA:

Tlakové čištění a monitoring kanalizace před zaslepením přípojek:

Čištění kanalizace recyklačním vozem – hl.řad	70,- / m (odhad 800m)
Nájezd vozu-přistavení.....	48,- / km (odhad 120km)
Likvidace odpadu z čištění kanalizace, odpadní voda..	990,- / t (dle skutečnosti)
Monitoring kanalizace – hl.řad	50,- / m (odhad 800m)
Nájezd vozu-přistavení	30,- / km (odhad 120km)
Vyhotovení videozáznamu na DVD, protokoly.....	1000,- / páre

Vytyčení funkčních kanalizačních přípojek:

Monitoring kanalizace, trasování pomocí barviva,
Doprava, pracovník navíc 40.200,- / ks

Proplach a monitoring kanalizace po zaslepení přípojek:

Čištění kanalizace recyklačním vozem – hl.řad	70,- / m (odhad 200m)
Nájezd vozu-přistavení.....	48,- / km (odhad 120km)
Likvidace odpadu z čištění kanalizace, odpadní voda..	990,- / t (dle skutečnosti)
Monitoring kanalizace – hl.řad	50,- / m (odhad 200m)
Nájezd vozu-přistavení	30,- / km (odhad 120km)

Cena celkem bez DPH 179.920,- (bez odpadu)

Konečná částka bude vypočtena dle skutečně provedených prací. Uvedené ceny bez příslušné sazby DPH.

**Jan Vích
Obchodní oddělení
FEKO LT s.r.o.**

V Praze dne 15.7.2021

Dodavatel:

Technicko - ekologické služby

PATOK a.s.

U Porcelánky 2903

44001 Louny

Česká republika

IČ: 27356248

DIČ: CZ27356248

Dodavatel je registrován pod spisovou značkou v oddíle B,
vložce 1925 ze dne 01.05.2008 u kr. soudu v Ústí/L.

Nabídka vydaná č. NV /2021

Předmět poptávky: Cenová nabídka na tlakové čištění a monitoring
stávající kanalizace Brandýs nad Labem

Odběratel:**M - SILNICE a.s.**

Trabantská 290/31

190 15 Praha 9 - Satalice

IČ: 42196868

DIČ: CZ42196868

Kontaktní osoba: Eliška Havlátová

Kontaktní tel.:

Datum vystavení: 09.07.2021

Platnost do: 09.09.2021

Vážení obchodní přátelé,
na základě Vaší poptávky Vám předkládám kalkulaci nabídky na provedení díla/služeb:

Cenová nabídka na tlakové čištění a monitoring stávající kanalizace Brandýs nad Labem

čištění a monitoring kanalizace cca 800 m.

Fakturace bude provedena, dle skutečně realizovaných výkonů.

Ceníková položka	Specifikace	Množ.	Jedn.	Jedn.cena CZK bez DPH	Celk.cena CZK bez DPH	Sazba DPH
Kombi vůz s recyklací - výkony stroje		3,00	den	40 000,00	120 000,00	21,00 %
Video inspekce - výkony stroje		3,00	den	25 000,00	75 000,00	21,00 %

	Částky jsou uvedené v CZK		
	Bez DPH	DPH	Celkem
Základní sazba 21%	195 000,00	40 950,00	235 950,00
Základní sazba 15%	0,00	0,00	0,00
Základní sazba 10%	0,00	0,00	0,00
Základní sazba 0%	0,00	0,00	0,00
Nabídková cena celkem	195 000,00	40 950,00	235 950,00

Telefon dispečink: 415696143

Fax: 415696479

WWW: <http://www.patok.cz>

Dodavatel: PATOK a.s.

Nabídka vydaná č. NV /2021

Odběratel: M - SILNICE a.s.

Předmět poptávky: Cenová nabídka na tlakové čištění a monitoring stávající kanalizace Brandýs nad Labem

Na tuto nabídku se vztahují všeobecné obchodní podmínky PATOK a.s., viz <https://www.patok.cz/vop/>.

V souladu s legislativou o ochraně životního prostředí, zejména se zákonem č. 541/2020 Sb. v platném znění, Vás tímto žádáme o předání základních popisů všech nám dodávaných odpadů.

Kalkulace nabídky je provedena na základě Vámi dodaných vstupních informací o zakázce - parametrizace.

Nedílnou součástí nabídky je parametrizace zakázky.

Vyúčtování díla bude provedeno dle skutečně dodaného množství jednotek

Děkujeme za poptávku a těšíme se na příští spolupráci.

Nabídku zpracoval:

Jan Krejčík

GSM:

E-Mail:

S cenovou nabídkou souhlasí

.....
Jméno a podpis zodp. zástupce odběratele

Dodavatel:

Kanalizace Charvát, s.r.o.
Lískovická 1290/8
193 00 Praha 913

IČ: 08814694

DIČ: C

Telefon

E-mail

www.kanalizace-charvat.cz

Odběratel:

IČ:

42196868

DIČ:

CZ42196868

M - SILNICE a.s.
Husova 1697
530 03 Pardubice

Tel.: 607058683

Nabídka č.: 21NA00357

Datum zápisu: 08.07.2021

Platno do:

Konečný příjemce:

ČIŠTĚNÍ KANALIZACE TLAKOVOU VODOU A PRÁCE S TÍM SOUVISEJÍCÍ

Místo akce: II/331 Brandýs nad Labem - I/9, rekonstrukce - VII.etapa

Délka cca 800m, DN 300 - 800

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Tlakové čištění a monitoring kanalizace před zaslepením přípojek:						
Čištění kanalizace recyklačním vozem (hlavní řád) cca	800 m	120,00		96 000,00 21%	0,00	96 000,00
Přistavení vozidla + -	75 km	42,00		3 150,00 21%	0,00	3 150,00
Likvidace odpadu + -	1 t	1 200,00		1 200,00 21%	0,00	1 200,00
Kamerová prohlídka kanalizace (hlavní řád) cca	800 m	35,00		28 000,00 21%	0,00	28 000,00
Přistavení kamerového vozidla	75 km	27,00		2 025,00 21%	0,00	2 025,00
Záznam z kamerové prohlídky na DVD vč. protokolu	1 x	1 000,00		1 000,00 21%	0,00	1 000,00
Vytyčení funkčních kanalizačních přípojek:						
Kamerová prohlídka kanalizace, trasování pomocí barviva vč. přistavení vozidla a ostatních, pomocných prací	1 x	40 900,00		40 900,00 21%	0,00	40 900,00
Proplach a kamerová prohlídka kanalizace po zaslepení přípojek:						
Čištění kanalizace recyklačním vozem (hlavní řád)	200 m	120,00		24 000,00 21%	0,00	24 000,00
Přistavení vozidla	75 km	42,00		3 150,00 21%	0,00	3 150,00
Likvidace odpadu z čištění kanalizace +-	1 t	1 200,00		1 200,00 21%	0,00	1 200,00
Kamerová prohlídka kanalizace (hlavní řád) + -	200 m	35,00		7 000,00 21%	0,00	7 000,00
Přistavení kamerového vozidla	75 km	27,00		2 025,00 21%	0,00	2 025,00
Součet položek				209 650,00	0,00	209 650,00
CELKEM K ÚHRADĚ						209 650,00

Ceny jsou uvedeny bez DPH!

Poznámka:

Konečná částka bude vypočtena dle skutečně provedených prací!

Děkujeme za posouzení cenové nabídky a v případě jakýchkoliv nejasností nás prosím kontaktujte. Těšíme se na spolupráci s Vámi.

Vystavil:

Vyřizuje: Jakub Kaprel, TDI

Datum: 20.12.2021

Krajská správa a údržba silnic

Marek Hanuš

Středočeského kraje, příspěvková organizace

Zborovská 11, 150 21

Praha 5

Věc: vyjádření TDI k dokumentaci ZBV č.3 – hloubení a zpětný zásyp, oprava kanalizace SO 108

Stavba: II/331 Brandýs nad Labem – I/9, rekonstrukce

V projektové dokumentaci PDPS byly naprojektovány nové uliční vpusti v jiném místě, než jsou stávající uliční vpusti. Stávající uliční vpusti měly být zaslepeny přímo pod uliční vpustí, nicméně provozovatel – firma STAVOKOMPLET nesouhlasí s navrženým technickým řešením. Je požadováno zaslepení přípojek na kanalizačním řádu, pokud se hlavní stoka nachází v hloubce do 3,5 m. V místech, kde je stoka hlouběji než 3,5 m, je požadováno zaslepení pomocí kanalizačního robotu. Při provádění prací byla prováděna průběžná kontrola TDI a množství bylo zaznamenáno do listu výkazu výměr.

V ZBV č. 3 jsou předmětné práce řešeny následujícími položkami:

Původní položky:

- 1) Kód pol. 14102 POPLATKY ZA SKLÁDKU 2000M2 – navýšeno množství stávající položky, množství odpovídá skutečnosti
- 2) Kód pol. 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ 2000M2 – navýšeno množství stávající položky, množství odpovídá skutečnosti
- 3) Kód pol. 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ 2000M2 – navýšeno množství stávající položky, množství odpovídá skutečnosti
- 4) Kód pol. 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM 2000M2 – navýšeno množství stávající položky, množství odpovídá skutečnosti

Nové položky:

- 5) Kód pol. 131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM – nová položka, JC převzata z OTSKP 2021, množství odpovídá skutečnosti
- 6) Kód pol. 12970R BEZVÝKOPOVÁ OPRAVA KANALIZACE – nová položka, množství odpovídá skutečnosti
- 7) Kód pol. 12971R TLAKOVÉ ČIŠTĚNÍ KANALIZACE – nová položka, množství odpovídá skutečnosti

Z technického hlediska nemám k předložené dokumentaci ZBV č.3 připomínek.

Na základě výše uvedeného souhlasím s předloženou dokumentací ZBV č. 3.

TDI : Jakub Kaprel

.....

délka přípojky kanalizace: 14,4m

délka přípojky kanalizace: 0,7m

délka přípojky kanalizace: 1,0m

délka přípojky kanalizace: 1,4m

délka přípojky kanalizace: 0,8m

délka přípojky kanalizace: 24,2m

délka přípojky ka-

délka přípojky kanalizace: 9,3m

délka přípojky kanalizace: 11,8m

délka přípojky kanalizace: 8,4m

délka přípojky kanalizace: 8,4m

dé

slizace: 22,5m
délka přípojky kanalizace: 5,1m

a přípojek kanalizace: 18,2m
délka přípojky kanalizace: 12,5m
délka přípojky kanalizace: 20,3m

délka přípojky kanalizace: 18,2m

délka přípojky kanalizace: 9,1m

délka přípojek kanalizace: 61,1m

délka přípojky kanalizace: 3,4m

délka přípojek kanalizace: 4,9m

délka přípojky kanalizace: 3,6m

délka přípojek kanalizace: 49,6m

STAVOKOMPLET



Krajská správa a údržba silnic Stř. kraje, p. o.
Marek Hanuš
Zborovská 81/11
150 00 Praha 5 – Smíchov

Naše značka

Vyřizuje/linka

Zápy dne 10. května 2021

Věc: Stavba :II/331 Brandýs nas Labem – I/9, rekonstrukce – VII.Etapa

Vážení,

jako provozovatel a následný majetkový správce nesouhlasíme s technickým řešením uvažovaným v PD. V PD jsou nové UV, které nahrazují stávající UV v jiné poloze. PD předpokládala výkop starých (původních) UV a zaslepení potrubí hned na konci přípojky (pod původní UV). S tímto technickým řešením nesouhlasíme.

Tam kde se hlavní stoka nachází ve hloubce do 3,5m od komunikace požadujeme, aby zhotovitel provedl odkop a zaslepil přípojku na hlavní stoce kanalizace. V místech kde se hlavní stoka nachází ve větší hloubce, bude pro zaslepení použit speciální robot, který přípojku zaslepi na hlavním řadu zevnitř stoky.

S pozdravem

Ing. Martin Aleš
vedoucí o. z. VODOVODY A KANALIZACE
STAVOKOMPLET spol. s r. o.

Adresa:

STAVOKOMPLET spol. s r.o.

č. p 251

250 61 Zápy

STAVOKOMPLET spol. s r.o. je zapsán v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 14934

telefon: 226905698 226906087-R

fax:

e-m

IČ: 470 52 945

DIČ: CZ 470 52 945

Bank. spojení

KB - Praha - NONET

č.ú.139 04 201/0100

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

II/331 Brandýs nad Labem - I/9, rekonstrukce - VII. etapa

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Silnice II/331, úsek km 17,52 - KÚ

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

108/3

Číslo ZBV:

4

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
 Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov
 IČ: 00066001

Obec Borek
 Borek 61, 277 14 Borek
 IČ: 00236713

Zhotovitel: M - SILNICE a. s.
 Husova 1697, 530 03 Pardubice
 IČ:42196868

Rekapitulace ZBV č. 4 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4.3	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4.4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4.5	0,00	3 547 360,61	3 547 360,61

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4	0,00	3 547 360,61	3 547 360,61

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
 Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
 a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré:

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby:

II/331 Brandýs nad Labem - I/9, rekonstrukce - VII. etapa

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Silnice II/331, úsek km 17,52 - KÚ

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

108/3

Číslo ZBV:

4.5

Strany smlouvy o dílo objednatel č.: S-3799/00066001/2020 a zhotovitel č.: 25-SOD-2021-002 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 29.01.2021 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov

Obec Borek, Borek 61, 277 14 Borek

Zhotovitel: M - SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice, IČO: 42196868

Přílohy Změnového listu:

1. Krycí list	1	počet listů
2. Změnový list	1	počet listů
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů
4. Rozpis ocenění Změn položek ZBV	1	počet listů
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů
Další doklady dle přehledu dokladů	20	počet listů

Paré č.

Příjemce

1, 2	Objednatel
3, 4	Zhotovitel
5	Projektant (AD)
6	Stavební dozor
7	Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Díličí změna 1: Prodloužení rekonstrukce ulice Okružní

V projektové dokumentaci PDPS byla řešena rekonstrukce komunikace II/331 až ke křižovatce ulic Okružní a ulice Josefa Truhláře. Na základě žádosti objednatele bylo, nad rámec položek ve smlouvě, navrženo prodloužení rekonstrukce až ke křižovatce ulice Okružní a ulice Mladoboleslavská včetně přilehlé křižovatky. Bylo navrženo ofrčování živičných vrstev v tl. 110 mm, provedení vyrovnávky z ACP, pokládka asfaltového souvrství ACL a SMA, předláždění betonové přídlažby pro lepší odvodnění komunikace a ostatních prací souvisejících s celkovou opravou.

Jedná se o Změnu nepodstatnou, která je podle § 5, odst.1 písm. e), resp.podle § 12 Směrnice R-Sm-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29. 05. 2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek zařazena do skupiny 5 jako změna de minimis.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 4) se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, její hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15 % původní hodnoty závazku.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
0,00	3 547 360,61	3 547 360,61	3 547 360,61

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí): M - SILNICE a. s.	Jméno	Ing. Tomáš Kučera	datum	podpis
Projektant (autorský dozor): Pontex, spol. s r.o.	Jméno	Ing. Pavel Hrdina	datum	podpis
Stavební dozor: SGS Czech Republic s. r. o.	Jméno	Jakub Kaprel	datum	podpis
Supervize (Regionální dotační kancelář)	Jméno	Ing. Václav Chytil	datum	podpis
Zástupce Objednatel: KSÚS SK	Jméno	Bc. Marek Hanuš	datum 11.3.22	podpis
Zástupce Objednatel: Obec Borek	Jméno	Vratislav Ryk	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, ujednány a uceleny v dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel)	Jméno	Ing. Jan Fidler	datum	podpis
Zhotovitel	Jméno	Mgr. Michal Kropáč M - SILNICE a.s. Ing. Zdeněk Babka M - SILNICE a.s.	datum	podpis

Číslo paré

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 4**

Název Stavby: II/331 Brandýs nad Labem - I/9, rekonstrukce - VII. etapa
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 108/3
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Silnice II/331, úsek km 17,52 - KÚ

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
22 266 556,92

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	1 126 615,80	23 393 172,72	1 126 615,80

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	3 547 360,61	4 673 976,41	20,99%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	0,00	26 940 533,33	4 673 976,41	20,99%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

M - SILNICE a. s. souhlasím Ing. Tomáš Kučera

Projektant (autorský dozor):

Pontex spol. s.r.o. souhlasím Ing. Pavel Hrdina

Stavební dozor:

SGS Czech Republic s. r. o. souhlasím Jakub Kaprel

Zástupce Objednatele:

KSÚS SK souhlasím Bc. Marek Hanuš

Zástupce Objednatele:

Obec Borek souhlasím Vratislav Ryk

Supervize

regionální dotační kancelář souhlasím Ing. Václav Chytil

Zaměstnanec KSÚS SK

odpovědný za cenové souhlasím Ing. Jaroslava Jurková
projednání Změny:

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo 4.5

Evidenční číslo a název stavby: II/331 Brandýs nad Labem - I/9,
rekonstrukce - VII. Etapa

Číslo a název SO/PS: SO 108 Silnice II/331, úsek km 17,52 - KÚ

Číslo a název rozpočtu: SO 108 Silnice II/331, úsek km 17,52 - KÚ

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

č. 3

Skupina Změn: 5

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
005	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	39,223	723,331	684,108	607,000	23 808,360	0,000	415 253,560	439 061,920	415 253,560	1 744,150
001	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	14 993,024	15 017,044	24,020	116,000	1 739 190,780	0,000	2 786,320	1 741 977,100	2 786,320	0,160
002	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	3 186,879	3 190,930	4,051	116,000	369 677,960	0,000	469,920	370 147,880	469,920	0,127
041	56933	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	m2	296,000	322,645	26,645	186,000	55 056,000	0,000	4 955,970	60 011,970	4 955,970	9,002
054	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	20,000	32,000	12,000	2 529,000	50 580,000	0,000	30 348,000	80 928,000	30 348,000	60,000
055	89923	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS	23,000	48,000	25,000	1 517,000	34 891,000	0,000	37 925,000	72 816,000	37 925,000	108,696
058	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	m	138,060	142,060	4,000	413,000	57 018,780	0,000	1 652,000	58 670,780	1 652,000	2,897
059	91743	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH KRAJNÍKŮ	m	1 081,280	1 134,280	53,000	903,000	976 395,840	0,000	47 859,000	1 024 254,840	47 859,000	4,902
060	919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	m	197,840	388,678	190,838	30,000	5 935,200	0,000	5 725,140	11 660,340	5 725,140	96,461
062	931324	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASFALTIKOVOU MODIFIK PRŮŘ DO 400MM2	m	1 747,140	1 937,978	190,838	35,000	61 149,900	0,000	6 679,330	67 829,230	6 679,330	10,923
NOVÉ POLOŽKY													
092	113728	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM	m3	1 485,454	1 755,614	270,160	507,000	753 125,180	0,000	136 971,120	890 096,300	136 971,120	18,187
093	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	m2	2 568,502	2 665,587	97,085	76,000	195 206,150	0,000	7 378,460	202 584,610	7 378,460	3,780
094	915211	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	m2	131,127	156,807	25,680	354,000	46 418,960	0,000	9 090,720	55 509,680	9 090,720	19,584
095	915231	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - DOD A POKLÁDKA	m2	2 401,875	2 498,960	97,085	233,000	559 636,880	0,000	22 620,810	582 257,690	22 620,810	4,042
096	02520.R	ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU	kpl	0,000	1,000	1,000	46 000,000	0,000	0,000	46 000,000	46 000,000	46 000,000	100,000
097	02720R	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	kpl	0,000	1,000	1,000	80 500,000	0,000	0,000	80 500,000	80 500,000	80 500,000	100,000
098	029113R	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY	kpl	0,000	1,000	1,000	69 000,000	0,000	0,000	69 000,000	69 000,000	69 000,000	100,000
099	9990204.R	POMOC PRÁCE ZŘÍŽ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	kpl	0,000	1,000	1,000	136 562,500	0,000	0,000	136 562,500	136 562,500	136 562,500	100,000
100	113534	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ DO 5KM	m	0,000	53,000	53,000	237,000	0,000	0,000	12 561,000	12 561,000	12 561,000	100,000
101	113728.R	RUČNÍ DOBOURÁNÍ A DOČISTĚNÍ PO FRÉZE (3 % z frézované plochy)	m3	0,000	8,134	8,134	5 750,000	0,000	0,000	46 770,500	46 770,500	46 770,500	100,000
102	12373	ODKOP PRO ŠPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I	m3	0,000	12,010	12,010	91,000	0,000	0,000	1 092,910	1 092,910	1 092,910	100,000
103	56366	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 300MM	m2	0,000	30,000	30,000	260,000	0,000	0,000	7 800,000	7 800,000	7 800,000	100,000
104	572224	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2	m2	0,000	5 423,000	5 423,000	23,000	0,000	0,000	124 729,000	124 729,000	124 729,000	100,000
105	57475	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY	m2	0,000	517,650	517,650	129,000	0,000	0,000	66 776,850	66 776,850	66 776,850	100,000
106	574D68	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S TL. 70MM	m2	0,000	2 465,000	2 465,000	387,000	0,000	0,000	953 955,000	953 955,000	953 955,000	100,000
107	574J54	ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+, 11S TL. 40MM	m2	0,000	2 465,000	2 465,000	272,000	0,000	0,000	670 480,000	670 480,000	670 480,000	100,000
108	57621	POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2	m2	0,000	2 465,000	2 465,000	5,100	0,000	0,000	12 571,500	12 571,500	12 571,500	100,000
109	57793E	VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ ACP TL. DO 100MM	m2	0,000	493,000	493,000	1 100,000	0,000	0,000	542 300,000	542 300,000	542 300,000	100,000
110	91723	OBRUBY Z BETON KRAJNÍKŮ	m	0,000	42,000	42,000	260,000	0,000	0,000	10 920,000	10 920,000	10 920,000	100,000
111	935843	PŘEDLÁŽDĚNÍ ŽLABŮ A RIGOLŮ DLÁŽDĚNÝCH Z BETON DLÁŽDIC	m2	0,000	60,000	60,000	363,000	0,000	0,000	21 780,000	21 780,000	21 780,000	100,000
112	93818	OČISTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM	m2	0,000	5 423,000	5 423,000	2,000	0,000	0,000	10 846,000	10 846,000	10 846,000	100,000
113	93832	OČISTĚNÍ DLÁŽEB OD VEGETACE	m2	0,000	60,000	60,000	50,000	0,000	0,000	3 000,000	3 000,000	3 000,000	100,000
		Celkem							0,00	3 547 360,61		3 547 360,61	

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.

Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitel: Ing. Tomáš Kučera

Za Objednatele: Jakub Kaprel

Datum:

Datum:

Podpis:

Podpis:

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	4
Název a evidenční číslo stavby:	II/331 Brandýs nad Labem - I/9, rekonstrukce - VII. etapa
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Silnice II/331, úsek km 17,52 - KÚ
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	108/3

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
07 Rozpis ocenění SO celkem	2	
08 Pokyn objednatele	1	
09 Vyjádření TDI	1	
10 Přehled cenových nabídek	16	
Počet listů celkem	20	

Rozpis ocenění Změn položek - celkem													
Evidenční číslo a název stavby:								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS:								č. 3					
Číslo a název rozpočtu:								celkem					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
005	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	39,223	723,331	684,108	607,000	23 808,360	0,000	415 253,560	439 061,920	415 253,560	1 744,150
		<i>Živice: (2465,00*0,11*2,65)-(26,645*0,15*2,65)-(30,00*0,30*2,65)=684,108</i>											
001	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	14 993,024	15 017,044	24,020	116,000	1 739 190,780	0,000	2 786,320	1 741 977,100	2 786,320	0,160
		<i>Zemina, kamenivo, kameny: 14 993,024 T SOD; 645,809 T ZBV 3 12,01*2=24,04</i>											
002	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	3 186,879	3 190,930	4,051	116,000	369 677,960	0,000	469,920	370 147,880	469,920	0,127
		<i>Prostý beton: 2541,070 T SOD; 645,809 T ZBV3 (168*0,023)+(4*0,0467)=4,051</i>											
002	56933	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	m2	296,000	322,645	26,645	186,000	55 056,000	0,000	4 955,970	60 011,970	4 955,970	9,002
		<i>0,50*53,29=26,645</i>											
001	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	20,000	32,000	12,000	2 529,000	50 580,000	0,000	30 348,000	80 928,000	30 348,000	60,000
		<i>9x UV, 3x Poklop</i>											
003	89923	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS	23,000	48,000	25,000	1 517,000	34 891,000	0,000	37 925,000	72 816,000	37 925,000	108,696
		<i>23</i>											
058	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	m	138,060	142,060	4,000	413,000	57 018,780	0,000	1 652,000	58 670,780	1 652,000	2,897
		<i>4;</i>											
059	91743	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH KRAJNÍKŮ	m	1 081,280	1 134,280	53,000	903,000	976 395,840	0,000	47 859,000	1 024 254,840	47 859,000	4,902
		<i>53</i>											
060	919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	m	197,840	388,678	190,838	30,000	5 935,200	0,000	5 725,140	11 660,340	5 725,140	96,461
		<i>53,85+9,9+9,87+73+19,048+17,22+7,95=190,838</i>											
062	931324	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 400MM2	m	1 747,140	1 937,978	190,838	35,000	61 149,900	0,000	6 679,330	67 829,230	6 679,330	10,923
		<i>53,85+9,9+9,87+73+19,048+17,22+7,95=190,838</i>											
NOVÉ POLOŽKY													
092	113728	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM	m3	1 485,454	1 755,614	270,160	507,000	753 125,180	0,000	136 971,120	890 096,300	136 971,120	18,187
		<i>2465,00*0,11=270,16 cena dle SOD, SO 107</i>											
093	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	m2	2 507,692	2 604,777	97,085	76,000	190 584,590	0,000	7 378,460	197 963,050	7 378,460	3,871
		<i>2507,692 SOD; 60,81 ZBV 2 143,625*0,25+148,39*0,25+10,135*3*0,25+65,92*0,25=97,085; cena dle SOD, SO 197</i>											
094	915211	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	m2	70,317	95,997	25,680	354,000	24 892,220	0,000	9 090,720	33 982,940	9 090,720	36,520
		<i>70,317 SOD; 60,81 ZBV 2 12,84*0,5*4=25,68; cena dle SOD, SO 197</i>											
095	915231	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - DOD A POKLÁDKA	m2	2 401,875	2 498,960	97,085	233,000	559 636,880	0,000	22 620,810	582 257,690	22 620,810	4,042
		<i>143,625*0,25+148,39*0,25+10,135*3*0,25+65,92*0,25=97,085; cena dle SOD, SO 197</i>											
096	02520.R	ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU	kpl	0,000	1,000	1,000	46 000,000	0,000	0,000	46 000,000	46 000,000	46 000,000	100,000
		<i>1; cena stanovena dle nejnižší cenové nabídky (Příloha 10. Přehled cenových nabídek +15 % (poplatky správní, poplatky výrobní, zisk))</i>											
096	02720R	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	kpl	0,000	1,000	1,000	80 500,000	0,000	0,000	80 500,000	80 500,000	80 500,000	100,000
		<i>1; cena stanovena dle nejnižší cenové nabídky (Příloha 10. Přehled cenových nabídek +15 % (poplatky správní, poplatky výrobní, zisk))</i>											
097	029113R	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY	kpl	0,000	1,000	1,000	69 000,000	0,000	0,000	69 000,000	69 000,000	69 000,000	100,000

		1; cena stanovena dle nejnižší cenové nabídky (Příloha 10. Přehled cenových nabídek +15 % (poplatky správní, poplatky výrobní, zisk))											
098	9990204.R	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚ REGULAČI A OCHRANU DOPRAVY	kpl	0,000	1,000	1,000	136 562,500	0,000	0,000	136 562,500	136 562,500	136 562,500	100,000
		1; cena stanovena dle nejnižší cenové nabídky (Příloha 10. Přehled cenových nabídek +15 % (poplatky správní, poplatky výrobní, zisk))											
099	113534	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ DO 5KM	m	0,000	53,000	53,000	237,000	0,000	0,000	12 561,000	12 561,000	12 561,000	100,000
		1; expertní cena dle 2021 OTSKP											
100	113728.R	RUČNÍ DOBOURÁNÍ A DOČIŠTĚNÍ PO FRÉZE (3 % z frézované plochy)	m3	0,000	8,134	8,134	5 750,000	0,000	0,000	46 770,500	46 770,500	46 770,500	100,000
		2465,00*0,03*0,11=8,134; cena stanovena dle nejnižší cenové nabídky (Příloha 10. Přehled cenových nabídek +15 % (poplatky správní, poplatky výrobní, zisk))											
101	12373	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I	m3	0,000	12,010	12,010	91,000	0,000	0,000	1 092,910	1 092,910	1 092,910	100,000
		60,05*0,2=12,01; expertní cena dle 2021 OTSKP											
102	56366	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 300MM	m2	0,000	30,000	30,000	260,000	0,000	0,000	7 800,000	7 800,000	7 800,000	100,000
		30; expertní cena dle 2021 OTSKP											
103	572224	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2	m2	0,000	5 423,000	5 423,000	23,000	0,000	0,000	124 729,000	124 729,000	124 729,000	100,000
		2*2465,00+493,00=5423,00; expertní cena dle 2021 OTSKP											
104	57475	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY	m2	0,000	517,650	517,650	129,000	0,000	0,000	66 776,850	66 776,850	66 776,850	100,000
		2465*0,2*1,05=517,65; expertní cena dle 2021 OTSKP											
105	574068	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S TL. 70MM	m2	0,000	2 465,000	2 465,000	387,000	0,000	0,000	953 955,000	953 955,000	953 955,000	100,000
		2465; expertní cena dle 2021 OTSKP											
106	574J54	ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+, 11S TL. 40MM	m2	0,000	2 465,000	2 465,000	272,000	0,000	0,000	670 480,000	670 480,000	670 480,000	100,000
		2465; expertní cena dle 2021 OTSKP											
107	57621	POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2	m2	0,000	2 465,000	2 465,000	5,100	0,000	0,000	12 571,500	12 571,500	12 571,500	100,000
		2465; expertní cena dle 2021 OTSKP											
108	57793E	VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSI ACP TL. DO 100MM	m2	0,000	493,000	493,000	1 100,000	0,000	0,000	542 300,000	542 300,000	542 300,000	100,000
		0,2*2465=493; expertní cena dle 2021 OTSKP											
109	91723	OBRUBY Z BETON KRAJNÍKŮ	m	0,000	42,000	42,000	260,000	0,000	0,000	10 920,000	10 920,000	10 920,000	100,000
		42; expertní cena dle 2021 OTSKP											
110	935843	PŘEDLÁŽDĚNÍ ŽLABŮ A RIGOLŮ DLÁŽDĚNÝCH Z BETON DLAŽDIC	m2	0,000	60,000	60,000	363,000	0,000	0,000	21 780,000	21 780,000	21 780,000	100,000
		120*0,5=60; expertní cena dle 2021 OTSKP											
111	93818	OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM	m2	0,000	5 423,000	5 423,000	2,000	0,000	0,000	10 846,000	10 846,000	10 846,000	100,000
		2*2465,00=5423; expertní cena dle 2021 OTSKP											
112	93832	OČIŠTĚNÍ DLAŽEB OD VEGETACE	m2	0,000	60,000	60,000	50,000	0,000	0,000	3 000,000	3 000,000	3 000,000	100,000
		120*0,5=60; expertní cena dle 2021 OTSKP											
		Celkem					4 901 942,69	0,00	3 547 360,61	8 449 303,30	3 547 360,61	72,37%	

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: II/331 Brandýs nad

1	Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH	66 596 000,20
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	71 585 718,61
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	86 618 719,52
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	107,49%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%
40=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, odst. (5), písm. b)	-0,05%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	1 442 357,80
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	2,17%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	19 978 800,06

9=(32A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	0,58%
10=(36A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	1,69%
10A=32A+36A	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	1 510 199,80
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	33 298 000,10

12=(37/1)*100	Sledování limitu 15%	5,33
13=37	Sledování limitu 140 448 000	3 547 360,61
14=140448000-37		136 900 639,39

40=(19/1)*100		Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, odst. (5), písm. b)				-0,05%																	
								- 1 -			- 2 -			- 3 -				- 4 -				- 5 -	
								Vyhrazené změny (Doměrky)			Záměna položek (Započítávání)			Nepředvídanost				Nezbytnost				Změny de minimis	
SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny de minimis (15% nebo 140 448 000 Kč)	limit 15 %		
16	17	18	19=23+26+29+33	20=24+27+30+34+37+39	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	32=29+30	32A=ABS(29)+30	33	34	36=33+34	36A=ABS(33)+34	37	38=(37/1)*100		
		0,00	- 33 921,00	5 023 639,41	4 989 718,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 33 921,00	349 663,00	315 742,00	383 584,00	0,00	1 126 615,80	1 126 615,80	1 126 615,80	3 547 360,61	5,33		
187	1	Přechodné dopravní značení/Změna přechodného DZ	- 33 921,00	349 663,00	315 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 33 921,00	349 663,00	315 742,00	383 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
108	2	Silnice II/331, úsek km 17,52 - KÚ/Výšková úprava ostrůvku	0,00	204 852,59	204 852,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 852,59	204 852,59	204 852,59	0,00	0,00		
108	3	Silnice II/331, úsek km 17,52 - KÚ/Hloubení a zpětný zásyp jam, oprava kanalizace	0,00	921 763,21	921 763,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921 763,21	921 763,21	921 763,21	0,00	0,00		
108	4	Silnice II/331, úsek km 17,52 - KÚ/Prodloužení rekonstrukce ulice Okružní	0,00	3 547 360,61	3 547 360,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 547 360,61	5,33		

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

V Říčanech

10. 12. 2021

Vážený pan
Josef Mikel
M-SILNICE a.s.
Husova 1697,
530 03 Pardubice

Věc: II/331 Brandýs nad Labem- I/9, rekonstrukce – VII. etapa

Vážený pane vedoucí,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o. (dále jen KSÚS), jako investor akce „**II/331 Brandýs nad Labem- I/9, rekonstrukce – VII. etapa**“ tímto žádá zhotovitele, kterou je společnost M-SILNICE a.s. o zpracování ZBV na navýšení opravy objízdných tras. Důvodem k tomuto navýšení je nutnost opravy ulice Okružní od křížení s ulicí Josefa Truhláře po křižovatku s komunikací II/610 včetně. Důvodem opravy této komunikace je její nevyhovující stav, který je způsoben navýšeným průjezdem nákladní a osobní dopravy.


KSÚS bere na vědomí, že zhotovitel nemohl v době zadávací lhůty soutěže předvídat výskyt těchto okolností, a proto KSÚS žádá zhotovitele společnost M-SILNICE a.s. o vypracování Změnových listů, a to v souladu se směrnicí KSÚS, která je nedílnou součástí Smlouvy o dílo. Tyto ZBV budou následně projednány a podrobně posouzeny supervizorem zakázky, následně budou posouzeny vedením KSÚS.

S pozdravem

Ing. Jan Lichtneger
Ředitel KSÚS



Vyřizuje: Jakub Kaprel,TDI
Datum:20.12.2021



Krajská správa a údržba silnic
Marek Hanuš
Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 11, 150 21
Praha 5

Věc: vyjádření TDI k dokumentaci ZBV č.4 – prodloužení rekonstrukce ulice Okružní
Stavba: II/331 Brandýs nad Labem – I/9, rekonstrukce

V projektové dokumentaci PDPS byla řešena rekonstrukce komunikace II/331 až ke křižovatce ulic Okružní a ulice Josefa Truhláře. Na základě žádosti objednatele bylo, nad rámec položek ve smlouvě, navrženo prodloužení rekonstrukce až ke křižovatce ulice Okružní a ulice Boleslavská včetně přilehlé křižovatky. Bylo navrženo ofrézování živich vrstev v tl. 110 mm, provedení vyrovnávky z ACP, pokládka asfaltového souvrství ACL a SMA, předlážďení betonové předlažby pro lepší odvodnění komunikace a ostatních prací souvisejících s celkovou opravou. Při provádění prací byla prováděna průběžná kontrola TDI a množství bylo zaznamenáno do listu výkazu výměr/popřípadě doloženo geodetickým protokolem.

V ZBV č. 4 jsou předmětné práce řešeny následujícími položkami:

Původní položky:

- 1) Kód pol. 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU – navýšeno množství stávající položky, množství odpovídá skutečnosti
- 2) Kód pol. 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU – navýšeno množství stávající položky, množství odpovídá skutečnosti
- 3) Kód pol. 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU – navýšeno množství stávající položky, množství odpovídá skutečnosti
- 4) Kód pol. 56933 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM – navýšeno množství stávající položky, množství odpovídá skutečnosti
- 5) Kód pol. 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ – navýšeno množství stávající položky, množství odpovídá skutečnosti
- 6) Kód pol. 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ – navýšeno množství stávající položky, množství odpovídá skutečnosti
- 7) Kód pol. 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM – navýšeno množství stávající položky, množství odpovídá skutečnosti
- 8) Kód pol. 91743 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH KRAJNÍKŮ – navýšeno množství stávající položky, množství odpovídá skutečnosti
- 9) Kód pol. 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM – navýšeno množství stávající položky, množství odpovídá skutečnosti
- 10) Kód pol. 931324 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 400MM² – navýšeno množství stávající položky, množství odpovídá skutečnosti

Vyřizuje: Jakub Kaprel, TDI

Datum: 20.12.2021

Krajská správa a údržba silnic

Marek Hanuš

Středočeského kraje, příspěvková organizace

Zborovská 11, 150 21

Praha 5

Věc: vyjádření TDI k dokumentaci ZBV č.4 – prodloužení rekonstrukce ulice Okružní

Stavba: II/331 Brandýs nad Labem – I/9, rekonstrukce

V projektové dokumentaci PDPS byla řešena rekonstrukce komunikace II/331 až ke křižovatce ulic Okružní a ulice Josefa Truhláře. Na základě žádosti objednatele bylo, nad rámec položek ve smlouvě, navrženo prodloužení rekonstrukce až ke křižovatce ulice Okružní a ulice Boleslavská včetně přilehlé křižovatky. Bylo navrženo ofrézování živichých vrstev v tl. 110 mm, provedení vyrovnávky z ACP, pokládka asfaltového souvrství ACL a SMA, předláždění betonové předlažby pro lepší odvodnění komunikace a ostatních prací souvisejících s celkovou opravou.

Při provádění prací byla prováděna průběžná kontrola TDI a množství bylo zaznamenáno do listu výkazu výměr/popřípadě doloženo geodetickým protokolem.

V ZBV č. 4 jsou předmětné práce řešeny následujícími položkami:

Původní položky:

- 1) Kód pol. 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU – navýšeno množství stávající položky, množství odpovídá skutečnosti
- 2) Kód pol. 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU – navýšeno množství stávající položky, množství odpovídá skutečnosti
- 3) Kód pol. 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU – navýšeno množství stávající položky, množství odpovídá skutečnosti
- 4) Kód pol. 56933 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM – navýšeno množství stávající položky, množství odpovídá skutečnosti
- 5) Kód pol. 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ – navýšeno množství stávající položky, množství odpovídá skutečnosti
- 6) Kód pol. 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ – navýšeno množství stávající položky, množství odpovídá skutečnosti
- 7) Kód pol. 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM – navýšeno množství stávající položky, množství odpovídá skutečnosti
- 8) Kód pol. 91743 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH KRAJNÍKŮ – navýšeno množství stávající položky, množství odpovídá skutečnosti
- 9) Kód pol. 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM – navýšeno množství stávající položky, množství odpovídá skutečnosti
- 10) Kód pol. 931324 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 400MM² – navýšeno množství stávající položky, množství odpovídá skutečnosti



Nové položky:

- 11) Kód pol. 113728 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM – nová položka, JC převzata z OTSKP 2021, množství odpovídá skutečnosti
- 12) Kód pol. 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ – DODÁVKA A POKLÁDKA – nová položka, JC převzata z OTSKP 2021, množství odpovídá skutečnosti
- 13) Kód pol. 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ – DODÁVKA A POKLÁDKA – nová položka, JC převzata z OTSKP 2021, množství odpovídá skutečnosti
- 14) Kód pol. 915231 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ – DOD A POKLÁDKA – nová položka, JC převzata z OTSKP 2021, množství odpovídá skutečnosti
- 15) Kód pol. 02520.R ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU – nová položka – množství odpovídá skutečnosti
- 16) Kód pol. 02720R OSTATNÍ POŽADAVKY – VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE – nová položka – množství odpovídá skutečnosti
- 17) Kód pol. 029113R OSTATNÍ POŽADAVKY – GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ – CELKY – nová položka – množství odpovídá skutečnosti
- 18) Kód pol. 9990204.R POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY – nová položka – množství odpovídá skutečnosti
- 19) Kód pol. 113534 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ DO 5KM
- 20) Kód pol. 113728.R RUČNÍ DOBOURÁNÍ A DOČIŠTĚNÍ PO FRÉZE (3 % z frézované plochy) – nová položka – množství odpovídá skutečnosti
- 21) Kód pol. 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I – nová položka, JC převzata z OTSKP 2021, množství odpovídá skutečnosti
- 22) Kód pol. 56366 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 300MM – nová položka, JC převzata z OTSKP 2021, množství odpovídá skutečnosti
- 23) Kód pol. 572224 SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2 – nová položka, JC převzata z OTSKP 2021, množství odpovídá skutečnosti
- 24) Kód pol. 57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY – nová položka, JC převzata z OTSKP 2021, množství odpovídá skutečnosti
- 25) Kód pol. 574D68 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S TL. 70MM – nová položka, JC převzata z OTSKP 2021, množství odpovídá skutečnosti
- 26) Kód pol. 574J54 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+, 11S TL. 40MM – nová položka, JC převzata z OTSKP 2021, množství odpovídá skutečnosti
- 27) Kód pol. 57621 POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2 – nová položka, JC převzata z OTSKP 2021, množství odpovídá skutečnosti
- 28) Kód pol. 57793E VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ ACP TL. DO 100MM – nová položka, JC převzata z OTSKP 2021, množství odpovídá skutečnosti
- 29) Kód pol. 91723 OBRUBY Z BETON KRAJNÍKŮ – nová položka, JC převzata z OTSKP 2021, množství odpovídá skutečnosti
- 30) Kód pol. 935843 PŘEDLÁŽDĚNÍ ŽLABŮ A RIGOLŮ DLÁŽDĚNÝCH Z BETON DLAŽDIC – nová položka, JC převzata z OTSKP 2021, množství odpovídá skutečnosti
- 31) Kód pol. 93818 OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM – nová položka, JC převzata z OTSKP 2021, množství odpovídá skutečnosti
- 32) Kód pol. 93832 OČIŠTĚNÍ DLAŽEB OD VEGETACE – nová položka, JC převzata z OTSKP 2021, množství odpovídá skutečnosti



**TDI provedl kontrolu jednotkových cen, množství a posoudil ZBV z technického hlediska.
Z ekonomického i technického hlediska nemám k předložené dokumentaci ZBV připomínek.
Na základě výše uvedeného souhlasím s předloženou dokumentací ZBV č. 4.**

TDI : Jakub Kaprel


.....

Nové položky:

- 11) Kód pol. 113728 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM – nová položka, JC převzata z OTSKP 2021, množství odpovídá skutečnosti
- 12) Kód pol. 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ – DODÁVKA A POKLÁDKA – nová položka, JC převzata z OTSKP 2021, množství odpovídá skutečnosti
- 13) Kód pol. 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ – DODÁVKA A POKLÁDKA – nová položka, JC převzata z OTSKP 2021, množství odpovídá skutečnosti
- 14) Kód pol. 915231 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ – DOD A POKLÁDKA – nová položka, JC převzata z OTSKP 2021, množství odpovídá skutečnosti
- 15) Kód pol. 02520.R ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU – nová položka – množství odpovídá skutečnosti
- 16) Kód pol. 02720R OSTATNÍ POŽADAVKY – VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE – nová položka – množství odpovídá skutečnosti
- 17) Kód pol. 029113R OSTATNÍ POŽADAVKY – GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ – CELKY – nová položka – množství odpovídá skutečnosti
- 18) Kód pol. 9990204.R POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY – nová položka – množství odpovídá skutečnosti
- 19) Kód pol. 113534 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ DO 5KM
- 20) Kód pol. 113728.R RUČNÍ DOBOURÁNÍ A DOČIŠTĚNÍ PO FRÉZE (3 % z frézované plochy) – nová položka – množství odpovídá skutečnosti
- 21) Kód pol. 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I – nová položka, JC převzata z OTSKP 2021, množství odpovídá skutečnosti
- 22) Kód pol. 56366 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 300MM – nová položka, JC převzata z OTSKP 2021, množství odpovídá skutečnosti
- 23) Kód pol. 572224 SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2 – nová položka, JC převzata z OTSKP 2021, množství odpovídá skutečnosti
- 24) Kód pol. 57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY – nová položka, JC převzata z OTSKP 2021, množství odpovídá skutečnosti
- 25) Kód pol. 574D68 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S TL. 70MM – nová položka, JC převzata z OTSKP 2021, množství odpovídá skutečnosti
- 26) Kód pol. 574J54 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+, 11S TL. 40MM – nová položka, JC převzata z OTSKP 2021, množství odpovídá skutečnosti
- 27) Kód pol. 57621 POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2 – nová položka, JC převzata z OTSKP 2021, množství odpovídá skutečnosti
- 28) Kód pol. 57793E VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ ACP TL. DO 100MM – nová položka, JC převzata z OTSKP 2021, množství odpovídá skutečnosti
- 29) Kód pol. 91723 OBRUBY Z BETON KRAJNÍKŮ – nová položka, JC převzata z OTSKP 2021, množství odpovídá skutečnosti
- 30) Kód pol. 935843 PŘEDLÁŽDĚNÍ ŽLABŮ A RIGOLŮ DLÁŽDĚNÝCH Z BETON DLAŽDIC – nová položka, JC převzata z OTSKP 2021, množství odpovídá skutečnosti
- 31) Kód pol. 93818 OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM – nová položka, JC převzata z OTSKP 2021, množství odpovídá skutečnosti
- 32) Kód pol. 93832 OČIŠTĚNÍ DLAŽEB OD VEGETACE – nová položka, JC převzata z OTSKP 2021, množství odpovídá skutečnosti



**Z technického hlediska nemám k předložené dokumentaci ZBV č.4 připomínek.
Na základě výše uvedeného souhlasím s předloženou dokumentací ZBV č. 4.**



TDI : Jakub Kaprel

.....

10. Přehled cenových nabídek

Poř. č. pol.	kód položky	Název položky	č. nab./s tr.	Firma	Cena celkem	Cena vč. DPH
096	02520.R	ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU	2/16	VIACONTROL spol. s. r. o	40 000,00 Kč	48 400,00 Kč
			3/16	SILAB zkušební laboratoř s. r. o.	44 001,00 Kč	53 241,21 Kč
			4/16	ESLAB, spol. s. r. o.	46 250,00 Kč	55 962,50 Kč
097	02720R	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	5/16	M - PROJEKCE s. r. o.	70 000,00 Kč	84 700,00 Kč
			6/16	BORA projekt s. r. o.	77 000,00 Kč	93 170,00 Kč
			7/16	Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb a. s.	83 000,00 Kč	100 430,00 Kč
098	029113R	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY	8/16	PRAGEMA s. r. o.	60 000,00 Kč	72 600,00 Kč
			9/16	FOXGEO s. r. o.	69 800,00 Kč	84 458,00 Kč
			10/16	Delta G. s. r. o.	70 000,00 Kč	84 700,00 Kč
99	9990204.R	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	11/16	SEDOZ DZ s.r.o.	118 750,00 Kč	143 687,50 Kč
			12/16	GLOBAL dopravní značení s. r.o.	121 000,00 Kč	146 410,00 Kč
			13/16	BIZETT CZ s. r. o.	127 000,00 Kč	153 670,00 Kč
101	113728.R	RUČNÍ DOBOURÁNÍ A DOČIŠTĚNÍ PO FRÉZE (3 % z frézované plochy)	14/16	OK STAVBY s. r. o.	40 670,00 Kč	49 210,70 Kč
			15/16	X SEVEN DOPRAVNÍ STAVBY s. r.o.	44 728,87 Kč	54 121,93 Kč
			16/16	LoStav Building s. r. o.	47 909,26 Kč	57 970,20 Kč

M-SILNICE a.s.

Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové

Louny dne 10.6.2021

Cenová nabídka na laboratorní zkoušky

Akce **II/331 Brandýs nad Labem**
Popis úseku: Prodloužení ulice Okružní

Místopis: ul. Okružní

Kontrolní zkoušky - obrušné a ložní vrstvy					
Poř. číslo	Popis úkonu	Jedn.	Cena za jednotku bez DPH	Počet jednotek	Cena celkem bez DPH 21%
1	Rozbor asfaltové směsi - Odběr, KA	ks	4 100,00 Kč	2	8 200,00 Kč
2	Stanovení objemové hmotnosti radiometrickou sondou Troxler	ks	400,00 Kč	20	8 000,00 Kč
3	Odběr - Jádrové vývrty o Ø 100 mm /odběr ložní a obrušné vrstvy současně/	ks	1 500,00 Kč	2	3 000,00 Kč
4	Jádrové vývrty /Tloušťka vrstvy, Míra zhuštění, Mezerovitost vrstvy/	ks	400,00 Kč	2	800,00 Kč
5	Jádrové vývrty /Spojení vrstev dle Leutnera/	ks	480,00 Kč	2	960,00 Kč
6	Měření podélné rovinatosti - planograf /podkladní, ložní a obrušná vrstva/	m	4,50 Kč	1 600	7 200,00 Kč
7	Měření příčné rovinatosti - lat' 2 m /obrušná vrstva/	položení	6,00 Kč	1 600	9 600,00 Kč
8	Jízdní výkony - vrtací souprava, Troxler, Lat' (Louny - Brandýs nad Labem a zpět)	km	16,00 Kč	140	2 240,00 Kč
Celkem bez DPH					40 000,00 Kč
Celkem s DPH 21%					48 400,00 Kč

Michal Paradič

Podpis objednatele

Vedoucí pracoviště Louny

SILAB zkušební laboratoř, s.r.o.

Mánesova 307/9	
417 01 Dubí	
Tel: Ing. L. Vofechovský	
Bankovní spojení	FIO Banka
číslo účtu / kód banky	
IČO :	06778739
DIČ :	CZ06778739
datum vystavení:	12.06.2021

Platnost CN je 1 měsíc.

Cenová nabídka č. 001-2022

odběratel:	
M-SILNICE a.s.	
Resslova 956/13	
500 02 Hradec Králové	
IČO:	42196868
DIČ:	CZ42196868

Na základě Vaší poptávky jsme Vám připravili cenovou nabídku pro akci: II/331 Brandýs nad Labem, ul. Okružní

<i>položka</i>	<i>cena měrné jednotky</i>	<i>jednotka</i>	<i>počet jednotek</i>	<i>Cena celkem bez DPH</i>
Příprava vzorku, ohřev směsi, navážka	605,00	1 stanovení	2	1 210,00
Přetlakování směsi	600,00	1 stanovení	2	1 200,00
Stanovení OH zkušebního tělesa	75,00	1 stanovení	6	450,00
Stanovení max. OH směsi	1 100,00	1 stanovení	2	2 200,00
Stanovení mezerovitosti směsi	55,00	1 stanovení	2	110,00
Stanovení křivky zrnitosti	1 450,00	1 stanovení	2	2 900,00
Stanovení obsahu asfaltu	1 100,00	1 stanovení	2	2 200,00
Stanovení objemové hmotnosti a míry zhutnění sondou PQI	330,00	1 stanovení	20	6 600,00
Stanovení míry zhutnění	55,00	1 stanovení	20	1 100,00
Stanovení mezerovitosti	55,00	1 stanovení	20	1 100,00
Odběr vzorku - JV pr.100mm o hloubce 101- 200 mm s utěsněním	990,00	1 vývrt	2	1 980,00
Stanovení tloušťky vrstvy	55,00	1 stanovení	4	220,00
Stanovení OH vrstvy z vývrtů	75,00	1 stanovení	4	300,00
Stanovení mezerovitosti vrstvy	55,00	1 stanovení	4	220,00
Stanovení míry zhutnění	55,00	1 stanovení	4	220,00
Smyková zkouška spojení vrstev dle Leutnera	550,00	1 stanovení	2	1 100,00
Fotodokumentace	200,00	1 foto	2	400,00
Měření nerovnosti vozovek - planografem	3,00	1m jízdního pruhu	1 600	4 800,00
Měření nerovnosti vozovek -latí (příčná nerovnost)	10,00	1 stanovení	1 600	16 000,00
Vyhotovení protokolu	500,00	1 protokol	3	1 500,00
Laboratorní vozidlo (dodávka s přívěsem)	22,00	1 km	140	3 080,00
Základ pro DPH 21%				48 890,00
Cena po slevě 10% (základ pro DPH 21%)				44 001,00
DPH 21%				9 240,21
Celkem vč. DPH				53 241,21

Cena bude fakturována dle skutečně provedených zkoušek. Cena může být ponížena nebo navýšena v závislosti na délce jádrového vývrtu, počtu vrstev na jádrovém vývrtu, mezerovitosti, míry zhutnění a stanovení OH vrstvy z vývrtů

CENOVÁ NABÍDKA LABORATORNÍCH PRACÍ



Odběratel : **M-SILNICE a.s., Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové**

Období : **06/2021**

II/331 Brandýs nad Labem - prodloužení ul. Okružní

pol. č.	popis položky	j. c. Kč	počet	celkem Kč
B.03	Rozbor asfaltové směsi – komplet vč. odběru - 1 ks	4 070,00	2	8 140,00
F.20	Stanovení objemové hmotnosti - radiosonda TROXLER - 1 ks	350,00	20	7 000,00
F.10	Odběr - vývrt pr. 100 mm (obrusná + ložní) 1 ks	1 600,00	2	3 200,00
F.25	Vývrt - tloušťka vrstvy, míra zhutnění, mezerovitost vrstvy - 1 ks	500,00	2	1 000,00
F.26	Vývrt - spojení vrstev dle Leutnera - 1 ks	500,00	2	1 000,00
F.08	Měření rovinatosti planografem (podkladní, ložní, obrusná) - 1 mb	5,00	1 600	8 000,00
F.07	Měření rovinatosti 2m latí (obrusná vrstva) - 1 měření	8,00	1 600	12 800,00
H.03	Dopravné souprava OA + vrtačka (České Budějovice - Brandýs nad Labem a zpět)	15,00	340	5 100,00

Součet položek Kč 46 240,00

Cena bez DPH Kč 46 240,00

DPH 21% 9 710,40

Celkem vč. DPH Kč 55 950,00

Havlátová Eliška

Od: Mikel Josef
Odesláno: pondělí 21. června 2021 10:43
Komu: Havlátová Eliška
Předmět: FW: Brandys

Příznak pro zpracování: Zpracovat
Stav příznaku: Opatřeno příznakem

From: Břichnáč Václav
Sent: Monday, June 21. 2021 10:16 AM
To: Mikel Josef
Subject: RE: Brandys

Dobrý den,

naše nabídka:

Prodloužení rekonstrukce ulice Okružní 70 000,- Kč bez DPH

S pozdravem,

Ing. Václav Břichnáč
Vedoucí pracoviště Praha
mobil: +
vaclav.brichnac@m-projekce.cz
www.m-projekce.cz



M – PROJEKCE s.r.o.	Pracoviště Praha
Resslova 956	Freyova 82/27
500 02 Hradec Králové	190 00 Praha 9

Společnost M-PROJEKCE s.r.o. poskytuje v souladu s požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) veškeré informace o zpracování Vašich osobních údajů na svých webových stránkách www.m-projekce.cz

Dobrý den,

na základě Vaší poptávky Vám v rámci akce „II/331 Brandýs n. Labem – rekonstrukce“ nabízíme zpracování:

Prodloužení rekonstrukce ulice Okružní

77 000,- Kč bez DPH

Termín: dle dohody

S pozdravem


k


s.r.o.

Doručovací adresa: BORA projekt s.r.o.
Veletržní 47

IČ: 170 00 Praha 7

Obchodní rejstřík: 072 44 878

vedený Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 297495

Havlátová Eliška

Od: Mikel Josef
Odesláno: pátek 18. června 2021 17:39
Komu: Havlátová Eliška
Předmět: Fwd: II/331 Brandýs n. Labem – rekonstrukce _ nabídka projekčních prací

Příznak pro zpracování: Zpracovat
Stav příznaku: Opatřeno příznakem

M-Silnice a.s.

Začátek preposílané zprávy:

Od: Ivan Šír
Datum: 18. června 2021 13:54:21 SEČ
Komu: Mikel Josef <
Předmět: FW: II/331 Brandýs n. Labem – rekonstrukce _ nabídka projekčních prací

Dobrý den,

na základě dohody Vám nabízíme zpracování RDS v této finanční výši:

Prodloužení rekonstrukce ulice Okružní

83 000,- Kč bez DPH

Termín: říjen 2021

Děkuji

S pozdravem Ivan Šír

Ing. Ivan Šír

tel: e-mail: [s](mailto:) web: www.sirivan.cz

Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb a.s.

Haškova 1714/3, 500 02 Hradec Králové

IČ: 287 86 793, DIČ: CZ28786793, bankovní spojení: ČSOB Hradec Králové, číslo účtu: 2801 15 102/0000

Společnost je držitelem certifikátů dle norem: ČSN EN ISO 14001:2005, ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN OHSAS 18001:2008, ČSN ISO 10006:2004, ČSN ISO/IEC 27001:2006

Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb CZ s.r.o.

Haškova 1714/3, 500 02 Hradec Králové

IČ: 259 62 914, DIČ: CZ25962914, bankovní spojení: ČSOB Hradec Králové, číslo účtu:

Nedílnou součástí této zprávy je právní doložka, jejíž plné znění naleznete na adrese <http://www.sirivan.cz/dolozka>



**Nabídka geodetických prací
Ostrůvek v km 18,2:**

kancelář: Na Pankráci 58/1062
140 00 Praha 4
tel./fax: 777 240 515
e-mail: lukas.weiss@pragema.cz
www: www.pragema.cz

Položka	MJ	počet MJ	cena/MJ	cena celkem
Práce před zahájením stavby				
Změření podkladů pro projekt	1 kpl	1	20 000 Kč	20 000 Kč
Práce v průběhu stavby				
Vytyčovací práce				
vytyčení obrub, osy vozovky a dalších stavebních objektů v intravilánu	1 kpl	1	25 000 Kč	25 000 Kč
Práce po dokončení stavby				
Zaměření a zpracování geodetické dokumentace skutečného provedení stavby	1 kpl	1	15 000 Kč	15 000 Kč
Cena celkem bez DPH:				60 000 Kč

Vyhotovil: Ing. Lukáš Weiss



FOXGeo s.r.o.
Za Trati 928/6
196 00 Praha 9 - Čakovice
tel.
e-m
IČ: 05090709, DIČ: CZ05090709

Cenová nabídka geodetických prací

1) **Zákazník :** M-Silnice a.s.
Husova 1697
530 03 Pardubice

2) **Stavba :**

„II/331 Brandýs n. Labem - I/9, rekonstrukce“

3) **Specifikace cenové nabídky :**

Prodloužení SO 108.1:

- zaměření podkladů pro projekt – KPL = 20.500,-Kč
- vytyčovací práce – KPL = 28.800,-Kč
- geodetické zaměření skutečného provedení stavby – KPL = 20.500,-Kč

4) **Celková cena :**

- **Celková cena za geodetické práce = 69.800,-Kč bez DPH**

Poznámka : Výsledná cena zahrnuje činnost UOZI – Z po celou dobu stavby.

Cenovou nabídku vyhotovila

IČ
DIČ

Geodetické práce - nabídka

Objednatel: M-Silnice a.s.
Husova 1697
530 03 Pardubice

Zhotovitel: Delta G s.r.o.
Tiskařská 257/10
108 00 Praha 10

Název zakázky: II/331 Brandýs n. Labem - I/9, rekonstrukce

Předmět nabídky jsou tyto práce:

Prodloužení SO 108.1:

- zaměření podkladů pro projekt
- vytyčovací práce
- geodetické zaměření skutečného provedení stavby

Nabízená cena: **70 000 Kč** bez 21% DPH.

Nabídku vypracoval: Ing. Petr Váša
jednatel Delta G s.r.o.

Cenová nabídka**Číslo:CN20210282****Dodavatel:**
SEDOZ DZ s.r.o.Primátorská 296/38
180 00 Praha 8

IČ:24218537

DIČ:CZ24218537

Korespondenční adresa:
Poděbradova 1751, 289 22 Lysá nad Labem**Odběratel:**
M - SILNICE a.s.Husova 1697
53003 Pardubice

IČ:42196868

DIČ:CZ42196868

Korespondenční adresa:
Husova 1697, dubice, 53003 Par

Datum vystavení dokladu: 09.06.2021

Vystavil : Chlup

Jednotkový ceník na pronájem dopravního značení pro realizaci stavby: prodloužení rekonstrukce - Brandýs nad Labem II/331

Jednorázové položky

Název	Mn.	j.	Kč/J	Sleva %	Cena po slevě	Celkem	DPH
Zpracování projektu DIO	1	kpl	3 350,00	0,00	0,00	3 350,00	21,0
Povolení DIR	1	km	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	21,0
Projednání s účastníky řízení, místní šetření	1	ks	3 150,00	0,00	0,00	3 150,00	21,0
Pronájem dopravního značení po dobu stavby	1	ks	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	21,0
Montáž, Demontáž, Doprava	1	ks	43 250,00	0,00	0,00	43 250,00	21,0
						118 750,00	21,0

Sazba DPH	Základ (Kč)	Výše DPH (Kč)	Celkem s DPH (Kč)
21.0	118 750,00	24 937,50	143 687,50

15.0

Razítko a podpis :

Poštou

Převzal :

11. červen 2021

Od :
GLOBALdopravní značení s.r.o.
Světova 523/1
180 00 Praha 8
IČ: 03438651
DIČ: CZ03438651

Komu :
M - SILNICE a.s.
Husova 1697
530 03 Pardubice
IČ: 42196868
DIČ: CZ42196868

E-mail :

CN036/2021

Akce: **Stará Boleslav - křižovatka ul. Okružní a Boleslavská**

inženýrské práce (DIO, DIR)	1,00	12 000,00 Kč	12 000,00 Kč
Montáž a demontáž	1,00	28 000,00 Kč	28 000,00 Kč
pronájem DZ	1,00	65 000,00 Kč	65 000,00 Kč
Doprava	1,00	16 000,00 Kč	16 000,00 Kč
celkem:			121 000,00 Kč

CELKEM bez DPH:

121 000,00 Kč

Datum : **11. červen 2021**

Vypracoval : Antonín Bartoň

GSM :

Cenová nabídka - pronájem dopravního značení

Akce: Stará Boleslav - ul. Boleslavská x Okružní

Soupis položek

Montáž a demontáž DZ	ks	1,00	40 000,00 Kč	30 000,00
Zpracování DIO + povolení DIR	ks	1,00	10 000,00 Kč	10 000,00
pronájem DZ po dobu stavby	ks	1,00	75 000,00 Kč	75 000,00
Doprava	ks	1,00	12 000,00 Kč	12 000,00

Cena jednorázových položek **127 000,00**

CELKEM bez DPH	127 000,00
-----------------------	-------------------

10.6.2021

BIZETT CZ s.r.o.

Zdětín 4

294 71 Benátky nad Jizerou

IČ: 26727692

tel:

zpracoval: Jan Kavalír

Položkový rozpočet - II/331 Brandýs nad Labem - I/9, rekonstrukce - VII. etapa

S:	SO 108	SO 108 Silnice II/331, úsek km 17,52 - KÚ
O:	SO 108	Prodloužení rekonstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Prodloužení rekonstrukce	kpl	1,00000		44 728,87
003	113728.R	RUČNÍ DOBOURÁNÍ A DOČISTĚNÍ PO FRÉZE (3 % z frézované plochy)	m3	8,1340	5499	44 728,87
Celkem						44 728,87

Příloha č.1 - rozpočet k SO 108 Silnice II/331-prodloužení rekonstrukce

Středisko Kolín

II/331 Brandýs nad Labem - I/9, rekonstrukce - VII. etapa

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Zhotovitel: M - SILNICE a.s.

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7
	HSV	Práce a dodávky HSV				47 909,26
	1	Zemní práce				47 909,26
	3 113728.R	RUČNÍ DOBOURÁNÍ A DOČIŠTĚNÍ PO FRÉZE (3 % z frézované plochy)	m3	8,134	5890,00	47 909,26
		Celkem bez DPH				47 909,26
		DPH 21%				10 060,94
		Celkem včetně DPH				57 970,20

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

II/331 Brandýs nad Labem - I/9, rekonstrukce - VII. etapa

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Silnice II/331, úsek km 13,9 - 17,52

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

107/1

Číslo ZBV:

5

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov
IČ: 00066001

Obec Borek
Borek 61, 277 14 Borek
IČ: 00236713

Zhotovitel: M - SILNICE a. s.
Husova 1697, 530 03 Pardubice
IČ: 42196868

Rekapitulace ZBV č. 5 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5.3	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5.4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5.5	0,00	319 325,16	319 325,16

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5	0,00	319 325,16	319 325,16

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré:

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: II/331 Brandýs nad Labem - I/9, rekonstrukce - VII. etapa Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Silnice II/331, úsek km 13,9 - 17,52	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 107/1	Číslo ZBV: 5.5																																
Strany smlouvy o dílo objednatel č.: S-3799/00066001/2020 a zhotovitel č.: 25-SOD-2021-002 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 29.01.2021 (dále jen Smlouva): Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov Obec Borek, Borek 61, 277 14 Borek Zhotovitel: M - SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice, IČO: 421 96 868																																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" style="padding: 5px;"> Přílohy Změnového listu: </td> <td style="width: 15%; padding: 5px;">Paré č.</td> <td style="width: 15%; padding: 5px;">Příjemce</td> </tr> <tr> <td style="width: 40%; padding: 5px;">1. Krycí list</td> <td style="width: 10%; padding: 5px;">1</td> <td style="width: 10%; padding: 5px;">počet listů</td> <td style="width: 35%; padding: 5px;">1, 2 Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">2. Změnový list</td> <td style="padding: 5px;">1</td> <td style="padding: 5px;">počet listů</td> <td style="padding: 5px;">3, 4 Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací</td> <td style="padding: 5px;">1</td> <td style="padding: 5px;">počet listů</td> <td style="padding: 5px;">5 Projektant (AD)</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">4. Rozpis ocenění Změn položek ZBV</td> <td style="padding: 5px;">1</td> <td style="padding: 5px;">počet listů</td> <td style="padding: 5px;">6 Stavební dozor</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">5. Přehled zařazení změn do skupin</td> <td style="padding: 5px;">1</td> <td style="padding: 5px;">počet listů</td> <td style="padding: 5px;">7 Supervize</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">6. Přehled dalších dokladů</td> <td style="padding: 5px;">1</td> <td style="padding: 5px;">počet listů</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Další doklady dle přehledu dokladů</td> <td style="padding: 5px;">11</td> <td style="padding: 5px;">počet listů</td> <td></td> </tr> </table>			Přílohy Změnového listu:		Paré č.	Příjemce	1. Krycí list	1	počet listů	1, 2 Objednatel	2. Změnový list	1	počet listů	3, 4 Zhotovitel	3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů	5 Projektant (AD)	4. Rozpis ocenění Změn položek ZBV	1	počet listů	6 Stavební dozor	5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů	7 Supervize	6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů		Další doklady dle přehledu dokladů	11	počet listů	
Přílohy Změnového listu:		Paré č.	Příjemce																															
1. Krycí list	1	počet listů	1, 2 Objednatel																															
2. Změnový list	1	počet listů	3, 4 Zhotovitel																															
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů	5 Projektant (AD)																															
4. Rozpis ocenění Změn položek ZBV	1	počet listů	6 Stavební dozor																															
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů	7 Supervize																															
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů																																
Další doklady dle přehledu dokladů	11	počet listů																																
Iniciátor změny: Zhotovitel Popis a zdůvodnění Změny:																																		
Dílčí změna 1: Výměna zábradlí, sanace mostních řím V projektové dokumentaci PDPS byl z objektu SO 107 vynechán most evidenční číslo 331-007 ve staničení km 16,989. Na základě žádosti objednatele byla, nad rámec položek ve smlouvě, navrženo odfrézování živiničných vrstev v tloušťce 150 mm, pokládka nového asfaltového souvrství, zasanování mostních řím a následná výměna mostního zábradlí dle TP 186. Jedná se o Změnu nepodstatnou, která je podle § 5, odst.1 písm. e), resp. podle § 12 Směrnice R-Sm-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29. 05. 2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek zařazena do skupiny 5 jako změna de minimis. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 4) se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, její hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15 % původní hodnoty závazku.																																		
Údaje v Kč bez DPH:																																		
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných																															
0,00	319 325,16	319 325,16	319 325,16																															
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:																																		
Zhotovitel (stavbyvedoucí): M - SILNICE a. s.	jméno	Ing. Tomáš Kučera	datum	podpis																														
Projektant (autorský dozor): Pontex, spol. s.r.o.	jméno	Ing. Pavel Hrdina	datum	podpis																														
Stavební dozor: SGS Czech Republic s. r. o.	jméno	Jakub Kaprel	datum	podpis																														
Supervize (Regionální dotační kancelář)	jméno	Ing. Václav Chytil	datum	podpis																														
Zástupce Objednatel: KSÚS SK	jméno	Bc. Marek Hanuš	datum 15.9.2022	podpis																														
Zástupce Objednatel: Obec Borek	jméno	Vratislav Ryk	datum	podpis																														
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitel sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.																																		
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel)	jméno	Ing. Jan Fidler	datum	podpis																														
Zhotovitel	jméno	Mgr. Michal Kropáč M - SILNICE a.s.	datum	podpis																														
		Ing. Zdeněk Babka M - SILNICE a.s.																																
				Číslo pa																														

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 5**

Název Stavby: II/331 Brandýs nad Labem - I/9, rekonstrukce - VII. Etapa
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 107/1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Silnice II/331, úsek km 13,9 - 17,52

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
30 172 254,56

Poznámka:

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	30 172 254,56	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	319 325,16	319 325,16	1,06%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	0,00	30 491 579,72	319 325,16	1,06%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

M - SILNICE a. s.

souhlasím

Ing. Tomáš Kučera

Projektant (autorský dozor):

Pontex spol. s r.o.

souhlasím

Ing. Pavel Hrdina

Stavební dozor:

SGS Czech Republic s. r. o.

souhlasím

Jakub Kaprel

Zástupce Objednatele:

KSÚS SK

souhlasím

Bc. Marek Hanuš

Zástupce Objednatele:

Obec Borek

souhlasím

Vratislav Ryk

Supervize

regionální dotační kancelář

souhlasím

Ing. Václav Chytil

Zaměstnanec KSÚS SK

odpovědný za cenové

projednání Změny:

souhlasím

Ing. Jaroslava Jurková

Rozpis ocenění Změn položek pro ZBV číslo 5.5

Evidenční číslo a název stavby: II/331 Brandýs nad Labem - I/9,
rekonstrukce - VII. Etapa

Číslo a název SO/PS: SO 107 Silnice II/331, úsek km 13,9 - 17,52

Číslo a název rozpočtu: SO 107 Silnice II/331, úsek km 13,9 - 17,52

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

č. 1

Skupina Změn: 5

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
027	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	m2	45 922,600	46 091,600	169,000	9,000	413 303,400	0,000	1 521,000	414 824,400	1 521,000	0,368
028	574B34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM	m2	22 197,050	22 281,550	84,500	148,000	3 285 163,400	0,000	12 506,000	3 297 669,400	12 506,000	0,381
029	574D56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM	m2	22 809,650	22 894,150	84,500	205,000	4 675 978,250	0,000	17 322,500	4 693 300,750	17 322,500	0,370
041	919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	m	106,150	117,450	11,300	30,000	3 184,500	0,000	339,000	3 523,500	339,000	10,645
042	931324	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 400MM2	m	261,230	272,530	11,300	35,000	9 143,050	0,000	395,500	9 538,550	395,500	4,326
Nové položky													
046	11372D	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALT DROBNÝCH OPRAV A PLOŠ ROZPADŮ DO 2000M2	m3	1 755,614	1 768,289	12,675	1 740,000	3 054 768,360	0,000	22 054,500	3 076 822,860	22 054,500	0,722
047	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	KUS	684,108	717,697	33,589	607,000	415 253,560	0,000	20 388,520	435 642,080	20 388,520	4,910
048	9112A3	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	m	3,006	10,500	7,494	1 011,000	3 039,070	0,000	7 576,430	10 615,500	7 576,430	249,301
049	9112B1R	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ	m	0,000	10,500	10,500	15 333,330	0,000	0,000	160 999,970	160 999,970	160 999,970	100,000
050	626112	REPROFILACE PODHLEDŮ SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU TL. 20MM	m2	0,000	8,443	8,443	1 760,000	0,000	0,000	14 859,680	14 859,680	14 859,680	100,000
051	626122	REPROFILACE PODHLEDŮ SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU TL. 50MM	m2	0,000	8,443	8,443	4 150,000	0,000	0,000	35 038,450	35 038,450	35 038,450	100,000
052	272315	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37	m3	0,000	1,000	1,000	4 070,000	0,000	0,000	4 070,000	4 070,000	4 070,000	100,000
053	12940	ČIŠTĚNÍ RÁMOVÝCH A KLENBOVÝCH PROPUSTŮ OD NÁNOSŮ	m3	0,000	20,000	20,000	378,000	0,000	0,000	7 560,000	7 560,000	7 560,000	100,000
054	62631	SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM	m2	0,000	14,238	14,238	189,000	0,000	0,000	2 690,980	2 690,980	2 690,980	100,000
055	78387	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S11 (OS-F)	m2	0,000	14,238	14,238	843,000	0,000	0,000	12 002,630	12 002,630	12 002,630	100,000
		Celkem							0,00	319 325,16		319 325,16	

Odpovědný zástupce Objednatelů i odpovědný zástupce Zhotovitelů odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.

Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele Ing. Tomáš Kučera

Za Objednatelů: Jakub Kaprel

Datum:

Datum:

Podpis:

Podpis:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: II/331 Brandýs nad Labem - I/9, rekonstrukce - VII. etapa

1	Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	66 596 000,20
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	71 905 043,77
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	87 005 102,96
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	107,97%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%
40=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, odst. (5), písm. b)	-0,05%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	1 442 357,80
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	2,17%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	19 978 800,06

9=(32A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	0,58%
10=(36A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	1,69%
10A=32A+36A	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	1 510 199,80
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	33 298 000,10

12=(37/1)*100	Sledování limitu 15%	5,81
13=37	Sledování limitu 140 448 000	3 866 685,77
14=140448000-37		136 581 314,23

40=(19/1)*100		Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, odst. (5), písm. b)		-0,05%																	
						- 1 -			- 2 -			- 3 -				- 4 -				- 5 -	
						Vyhrazené změny (Doměrky)			Záměna položek (Započítávání)			Nepředvídanost				Nezbytnost				Změny de minimis	
SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny de minimis (15% nebo 140 448 000 Kč)	limit 15 %
16	17	18	19=23+26+29+33	20=24+27+30+34+37+39	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	32=29+30	32A=ABS(29)+30	33	34	36=33+34	36A=ABS(33)+34	37	38=(37/1)*100
		0,00	- 33 921,00	5 342 964,57	5 309 043,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 33 921,00	349 663,00	315 742,00	383 584,00	0,00	1 126 615,80	1 126 615,80	1 126 615,80	3 866 685,77	5,81
187	1	Přechodné dopravní značení/Změna přechodného DZ	- 33 921,00	349 663,00	315 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 33 921,00	349 663,00	315 742,00	383 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	2	Silnice II/331, úsek km 17,52 - KÚ/Výšková úprava ostrůvku	0,00	204 852,59	204 852,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 852,59	204 852,59	204 852,59	0,00	0,00
108	3	Silnice II/331, úsek km 17,52 - KÚ/Hloubení a zpětný zásyp jam, oprava kanalizace	0,00	921 763,21	921 763,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921 763,21	921 763,21	921 763,21	0,00	0,00
108	4	Silnice II/331, úsek km 17,52 - KÚ/Prodloužení rekonstrukce ulice Okružní	0,00	3 547 360,61	3 547 360,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 547 360,61	5,33
107	5	Silnice II/331, úsek km 13,9 - 17,52/Výměna zábradlí, sanace mostních říms	0,00	319 325,16	319 325,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 325,16	0,48

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	1
Název a evidenční číslo stavby:	II/331 Brandýs nad Labem - I/9, rekonstrukce - VII. etapa
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Silnice II/331, úsek km 13,9 - 17,52
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	107/1

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
07 Rozpis ocenění SO celkem	1	
08 Pokyn objednatele	1	
09 Vyjádření TDI	5	
10 Přehled cenových nabídek	4	
Počet listů celkem	11	

Rozpis ocenění Změn položek - celkem													
Evidenční číslo a název stavby:				II/331 Brandýs nad Labem - I/9, rekonstrukce - VII.				ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS:				etapa				č. 1					
Číslo a název rozpočtu:				Silnice II/331, úsek km 13,9 - 17,52				celkem					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
027	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 84,5*2=169,00	m2	45 922,600	46 091,600	169,000	9,000	413 303,400	0,000	1 521,000	414 824,400	1 521,000	0,368
028	574B34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM 84,5	m2	22 197,050	22 281,550	84,500	148,000	3 285 163,400	0,000	12 506,000	3 297 669,400	12 506,000	0,381
029	574D56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM 84,5	m2	22 809,650	22 894,150	84,500	205,000	4 675 978,250	0,000	17 322,500	4 693 300,750	17 322,500	0,370
041	919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM 6,5+4,8=11,3	m	106,150	117,450	11,300	30,000	3 184,500	0,000	339,000	3 523,500	339,000	10,645
042	931324	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 400MM2 6,5+4,8=11,3	m	261,230	272,530	11,300	35,000	9 143,050	0,000	395,500	9 538,550	395,500	4,326
Nové položky													
046	11372D	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALT DROBNÝCH OPRAV A PLOŠ ROZPADŮ DO 2000M2 Cena dle expertních cen OTSKP 2021 0,15*13*6,5=12,675	m3	1 755,614	1 768,289	12,675	1 740,000	3 054 768,360	0,000	22 054,500	3 076 822,860	22 054,500	0,722
047	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU 39,223 SOD; 684,101 ZBV 4 12,675*2,65=33,589	KUS	684,108	717,697	33,589	607,000	415 253,560	0,000	20 388,520	435 642,080	20 388,520	4,910
048	9112A3	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM 7,494; cena dle SOD, SO 204	m	3,006	10,500	7,494	1 011,000	3 039,070	0,000	7 576,430	10 615,500	7 576,430	249,301
049	9112B1R	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ 10,5; cena stanovena dle nejnižší cenové nabídky (Příloha 10. Přehled cenových nabídek +15 % (poplatky správní, poplatky výrobní, zisk))	m	0,000	10,500	10,500	15 333,330	0,000	0,000	160 999,970	160 999,970	160 999,970	100,000
050	626112	REPROFILACE PODHLEDŮ SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU TL. 20MM Cena dle expertních cen OTSKP 2021	m2	0,000	8,443	8,443	1 760,000	0,000	0,000	14 859,680	14 859,680	14 859,680	100,000
051	626122	REPROFILACE PODHLEDŮ SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU TL. 50MM Cena dle expertních cen OTSKP 2021	m2	0,000	8,443	8,443	4 150,000	0,000	0,000	35 038,450	35 038,450	35 038,450	100,000
052	272315	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37 Cena dle expertních cen OTSKP 2021 Dobetonávka okapového nosu římsy 1	m3	0,000	1,000	1,000	4 070,000	0,000	0,000	4 070,000	4 070,000	4 070,000	100,000
053	12940	ČIŠTĚNÍ RÁMOVÝCH A KLENBOVÝCH PROPUSTŮ OD NÁNOSŮ Cena dle expertních cen OTSKP 2021	m3	0,000	20,000	20,000	378,000	0,000	0,000	7 560,000	7 560,000	7 560,000	100,000
054	62631	SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM Cena dle expertních cen OTSKP 2021 (4,8+6,5)*0,42+(4,8+6,5)*0,42+(4,8+6,5)*0,42	m2	0,000	14,238	14,238	189,000	0,000	0,000	2 690,980	2 690,980	2 690,980	100,000
055	78387	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S11 (OS-F) Cena dle expertních cen OTSKP 2021 (4,8+6,5)*0,42+(4,8+6,5)*0,42+(4,8+6,5)*0,42	m2	0,000	14,238	14,238	843,000	0,000	0,000	12 002,630	12 002,630	12 002,630	100,000
Celkem								11 859 833,59	0,00	319 325,16	12 179 158,75	319 325,16	2,69%

V Říčanech

14. 12. 2021

Vážený pan
Josef Mikel
M-SILNICE a.s.
Husova 1697,
530 03 Pardubice

Věc: II/331 Brandýs nad Labem- I/9, rekonstrukce – VII. etapa

Vážený pane vedoucí,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o. (dále jen KSÚS), jako investor akce „**II/331 Brandýs nad Labem- I/9, rekonstrukce – VII. etapa**“ tímto žádá zhotovitele, kterou je společnost M-SILNICE a.s. o zpracování ZBV, které bude zpracováno na nutné opravy mostu ev. č. 331-007. Tento most není předmětem PD, ale bohužel je dle mostní prohlídky je nutné provést výměnu živičného krytu na mostě, a taktéž výměnu zádržného systému. Výměna zádržného systému byla urgována i ze strany Policie ČR (viz hlášení poruchy, které je přílohou č. 1).

KSÚS bere na vědomí, že zhotovitel nemohl v době zadávací lhůty soutěže předvídat výskyt těchto okolností, a proto KSÚS žádá zhotovitele společnost M-SILNICE a.s. o vypracování Změnových listů, a to v souladu se směrnicí KSÚS, která je nedílnou součástí Smlouvy o dílo. Tyto ZBV budou následně projednány a podrobně posouzeny supervizorem zakázky, následně budou posouzeny vedením KSÚS.

S pozdravem

Ing. Jan Lichtneger

Ing. Jan Lichtneger
Ředitel KSÚS



Vyřizuje: Jakub Kaprel, TDI

Datum: 20.12.2021

Krajská správa a údržba silnic

Marek Hanuš

Středočeského kraje, příspěvková organizace

Zborovská 11, 150 21

Praha 5

Věc: vyjádření TDI k dokumentaci ZBV č.5 – výměna zábradlí a sanace říms SO 107

Stavba: II/331 Brandýs nad Labem – I/9, rekonstrukce

V projektové dokumentaci PDPs byl v objektu SO 107 vynechán most evidenční číslo 331-007 ve staničení km 16,989. Na základě žádosti objednatele, vzhledem ke špatnému stavu vozovky, říms a zábradlí bylo nad rámec PDPs navrženo odfrézování živičných vrstev v tloušťce 150 mm, pokládka nového asfaltového souvrství, zasanování mostních říms a následná výměna mostního zábradlí. Při provádění prací byla prováděna průběžná kontrola TDI a množství bylo zaznamenáno do listu výkazu výměr/popřípadě doloženo geodetickým protokolem.

V ZBV č. 5 jsou předmětné práce řešeny následujícími položkami:

Původní položky:

- 1) Kód pol. 11372D FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALT DROBNÝCH OPRAV A PLOŠ ROZPADŮ DO 2000M² – navýšeno množství stávající položky, množství odpovídá skutečnosti
- 2) Kód pol. 572214 SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M² – navýšeno množství stávající položky, množství odpovídá skutečnosti
- 3) Kód pol. 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM – navýšeno množství stávající položky, množství odpovídá skutečnosti
- 4) Kód pol. 574D56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM – navýšeno množství stávající položky, množství odpovídá skutečnosti
- 5) Kód pol. 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM 931324 – navýšeno množství stávající položky, množství odpovídá skutečnosti
- 6) Kód pol. 931324 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 400MM² – navýšeno množství stávající položky, množství odpovídá skutečnosti

Nové položky:

- 7) Kód pol. 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU – nová položka, JC převzata z OTSKP 2021, množství odpovídá skutečnosti
- 8) Kód pol. 9112A3 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM – nová položka, JC převzata z OTSKP 2021, množství odpovídá skutečnosti
- 9) Kód pol. 9112B1R ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ – nová položka, množství odpovídá skutečnosti
- 10) Kód pol. 626112 REPROFILACE PODHLEDŮ SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU TL. 20MM – nová položka, JC převzata z OTSKP 2021, množství odpovídá skutečnosti



Vyřizuje: Jakub Kaprel, TDI

Datum: 20.12.2021

Krajská správa a údržba silnic

Marek Hanuš

Středočeského kraje, příspěvková organizace

Zborovská 11, 150 21

Praha 5

Věc: vyjádření TDI k dokumentaci ZBV č.5 – výměna zábradlí a sanace říms SO 107

Stavba: II/331 Brandýs nad Labem – I/9, rekonstrukce

V projektové dokumentaci PDPS byl v objektu SO 107 vynechán most evidenční číslo 331-007 ve staničení km 16,989. Na základě žádosti objednatele, vzhledem ke špatnému stavu vozovky, říms a zábradlí bylo nad rámec PDPS navrženo odfrézování živichých vrstev v tloušťce 150 mm, pokládka nového asfaltového souvrství, zasanování mostních říms a následná výměna mostního zábradlí. Při provádění prací byla prováděna průběžná kontrola TDI a množství bylo zaznamenáno do listu výkazu výměr/popřípadě doloženo geodetickým protokolem.

V ZBV č. 5 jsou předmětné práce řešeny následujícími položkami:

Původní položky:

- 1) Kód pol. 11372D FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALT DROBNÝCH OPRAV A PLOŠ ROZPADŮ DO 2000M² – navýšeno množství stávající položky, množství odpovídá skutečnosti
- 2) Kód pol. 572214 SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M² – navýšeno množství stávající položky, množství odpovídá skutečnosti
- 3) Kód pol. 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM – navýšeno množství stávající položky, množství odpovídá skutečnosti
- 4) Kód pol. 574D56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM – navýšeno množství stávající položky, množství odpovídá skutečnosti
- 5) Kód pol. 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM 931324 – navýšeno množství stávající položky, množství odpovídá skutečnosti
- 6) Kód pol. 931324 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 400MM² – navýšeno množství stávající položky, množství odpovídá skutečnosti

Nové položky:

- 7) Kód pol. 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU – nová položka, JC převzata z OTSKP 2021, množství odpovídá skutečnosti
- 8) Kód pol. 9112A3 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM – nová položka, JC převzata z OTSKP 2021, množství odpovídá skutečnosti
- 9) Kód pol. 9112B1R ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ – nová položka, množství odpovídá skutečnosti
- 10) Kód pol. 626112 REPROFILACE PODHLEDŮ SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU TL. 20MM – nová položka, JC převzata z OTSKP 2021, množství odpovídá skutečnosti




- 11) Kód pol. 626121 REPROFILACE PODHLEDŮ SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU TL.
50MM– nová položka, JC převzata z OTSKP 2021, množství odpovídá skutečnosti
- 12) Kód pol. 272315 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37– nová položka, JC převzata
z OTSKP 2021, množství odpovídá skutečnosti
- 13) Kód pol. 12940 ČIŠTĚNÍ RÁMOVÝCH A KLENBOVÝCH PROPUSTŮ OD NÁNOSŮ– nová
položka, JC převzata z OTSKP 2021, množství odpovídá skutečnosti
- 14) Kód pol. 62631 SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM– nová
položka, JC převzata z OTSKP 2021, množství odpovídá skutečnosti
- 15) Kód pol. 78387 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S11 (OS-F) – nová položka, JC převzata
z OTSKP 2021, množství odpovídá skutečnosti

**TDI provedl kontrolu jednotkových cen, množství a posoudil ZBV z technického hlediska.
Z ekonomického i technického hlediska nemám k předložené dokumentaci ZBV připomínek.
Na základě výše uvedeného souhlasím s předloženou dokumentací ZBV č. 5.**

TDI : Jakub Kaprel

.....

- 
- A large handwritten 'X' mark, likely indicating a cancellation or a specific status.
- 11) Kód pol. 626121 REPROFILACE PODHLEDŮ SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU TL.
50MM– nová položka, JC převzata z OTSKP 2021, množství odpovídá skutečnosti
- 12) Kód pol. 272315 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37– nová položka, JC převzata
z OTSKP 2021, množství odpovídá skutečnosti
- 13) Kód pol. 12940 ČIŠTĚNÍ RÁMOVÝCH A KLENBOVÝCH PROPUSTŮ OD NÁNOSŮ– nová
položka, JC převzata z OTSKP 2021, množství odpovídá skutečnosti
- 14) Kód pol. 62631 SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM– nová
položka, JC převzata z OTSKP 2021, množství odpovídá skutečnosti
- 15) Kód pol. 78387 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S11 (OS-F) – nová položka, JC převzata
z OTSKP 2021, množství odpovídá skutečnosti

**Z technického hlediska nemám k předložené dokumentaci ZBV č.5 připomínek.
Na základě výše uvedeného souhlasím s předloženou dokumentací ZBV č. 5.**

TDI : Jakub Kaprel

.....

10. Přehled cenových nabídek

Poř. Č. pol.	kód položky	Název položky	č. nab./s tr.	Firma	Cena celkem	Cena vč. DPH
049	9112B1R	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ	2/6	M - STROJÍRNY a. s.	140 000,00 Kč	169 400,00 Kč
			4/6	Jiří Krámpel	165 000,00 Kč	199 650,00 Kč
			5/6	M - konstrukce s. r. o.	167 250,00 Kč	202 372,50 Kč

Odesílatel:

M - STROJIRNY a.s.

Husova 1697

530 03 Pardubice

Oldřich Nápravník

e-mail: Oldrich.Naprapnik@m-strojirny.cz

<http://www.m-strojirny.cz>

Adresát:

M – SILNICE a.s.

Husova 1697

530 03 Pardubice

Jaroslav Kašpar

Nabídka číslo: N21298

Datum: 04.08.2021

Předmět nabídky: Zábradlí mostní

Akce: -

Podklady pro zpracování nabídky:

- Výkres 507.01 - Zábradlí se svislou výplní.

Rozsah dodávky:

- Výrobní dokumentace
- Materiál pro výrobu
- Výroba dle ČSN EN 1090-2
- PKO dle specifikace (žárový Zn + 3-vrstvý nátěr)
- Doprava na stavbu
- Montáž zábradlí

Dodávka nezahrnuje:

- defektoskopické zkoušky
- práce geodeta
- zpevněné přístupové komunikace na stavenišťě
- provedení spodní stavby a stavební práce
- dopravní opatření na stavbě

Cena:

- **Cena celkem: 140 000,-CZK + DPH 21%**

Uvedená cena se může měnit na základě změny technického řešení a upřesnění detailů ve VTD/RDS.

Platnost cenové nabídky

Cenová nabídka platí do 31.8..2021

Platební podmínky:

Dle zásad MEDIS Holding

Dodací termín:

6 týdnů od objednání.

Záruční lhůta:

60 měsíců

Zpracoval: Nápravník Oldřich

NABÍDKA Č. 087

Dobrý den,
na základě Vaší poptávky Vám nabízíme

OCELOVÉ ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ DL. 10,5 m (segmenty 6,1 + 4,4 m)

CENA: 165 000,00 Kč bez DPH

Součástí ceny je výroba a dodání ocelového zábradlí včetně VTD, PKO (zinkování + 3x nátěr, barva modrá), vč. dopravy a montáže.

Platnost nabídky:	do 17. srpna 2021
Termín dodání:	do 60 dní od objednání
Záruka:	60 měsíců

V Táboře dne 3. srpna 2021

Jiří Krampál


Dodavatel:**M-konstrukce s.r.o.**

Oříkov 43

264 01 Sedlčany

IČ : 24314234

DIČ: CZ24314234

**M - konstrukce**
s.r.o.**Investor:****Ing. Eliška Havlátová****M-silnice a.s.****Trabantská 290/31****190 15 Praha 9 - Satalice**

Značka: N-G-349/M-silnice/2021

Datum: 1.8.2021

Nabídka na akci: "Brandýs nad Labem"

Na základě Vaší poptávky Vám předkládáme cenovou nabídku na výše uvedenou zakázku. Cenová nabídka byla zpracována na základě předané výkresové dokumentace. Bohužel upozorňujeme na zvýšení vstupního materiálu oproti normálu o 6Kč/kg, nadále se mají ceny vstupu stále zvyšovat dle informací z hutí !!!

Zábradlí	10,5 m	x	14 450 Kč/m	=	152 250,00 Kč
VTD	SO	x	10 000 Kč/SO	=	10 000,00 Kč
Doprava	nájezd	x	15 000,00 Kč	=	15 000,00 Kč
Nabídková cena celkem bez DPH					167 250,00 Kč

Nabídková cena zahrnuje výrobu, protikorozi ochranu PKO (zinek + nátěr I.cenové kategorie – celkem 280 um) dle TKP 19, dopravu na 1 nájezd na stavbu (kompletní připravenost říms) a montáž zábradlí dle předané dokumentace včetně zinkovaného spojovacího materiálu, kotvení – zinkové kotvy, podmazání patních desek, dílenské přejímky, technologické postupy, závěrečnou zprávu v 1 vyhotovení.

Cena neobsahuje zemní práce, PVC trubky, případně dodávku betonu, zpevněné plochy pro jeřáb, příjezdové komunikace, zaměření na stavbě, geodetické zaměření, vytyčení inženýrských sítí, ruční hloubení děr v případě nevhodného podložení pro beranění sloupků, radiusové svodnice včetně zakončení svodidel do země - náběhy. V případě více nájezdů na stavbu bude účtován příplatek 15 000 Kč/nájezd/SO. Dlouhý výškový náběh- 1 ks 15 000,00 Kč, krátký výškový náběh – 1ks 10 000,00 Kč, VTD – 4 000 Kč/SO.

Pro kalkulaci cen dodávky ocelových konstrukcí byly použity ceny vstupů hutních materiálů platných do 29.07.2021. Vyhrazujeme si právo úpravy ceny v případě zvýšení ceny materiálových vstupů po 29.07.2021 o více než 3%.

Platební podmínky: splatnost faktur bude 30 dní od doručení objednateli;


Fakturace po částech : 60 % po výrobě a přejímce v černém stavu, 30 % po PKO a Přejímce, 10 % po montáži – vždy po dohodě s investorem

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu C, vložce 195707

Bankovní spojení : Komerční banka a.s., č.úctu 107-2599260237/0100

M-konstrukce s.r.o., Oříkov 43, 26401 Sedlčany, tel:

www.m-konstrukce.cz



M - konstrukce
s.r.o.

Termíny:

- *SOD nebo objednávka musí být uzavřena před zahájením prací*
- *záruční doba 60 měsíců od předání díla objednateli*
- *platnost CN 14 dnů od data nabídky viz výše – z důvodů neustálého zvyšování vstupního materiálu z hutí*

V případě, že dodávka podléhá nezávislé kontrolní činnosti supervize, vyhrazujeme si právo na dodatečnou úpravu ceny. Cena bude upravena pouze při nestandardních požadavcích ze strany supervize.

Žádáme Vás o stanovisko k námi nabízené ceně. Případnou objednávku nebo dotazy zašlete na email: nebo na tel.

S pozdravem

Gabriela Moudrá



Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu C, vložce 195707

Bankovní spojení : Komerční banka a.s., č.úctu

M-konstrukce s.r.o., Oříkov 43, 26401 Sedlčany, tel:

www.m-konstrukce.cz
