

## Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby: <b>II/105 Severní obchvat Jílového u Prahy, 5211521005</b> Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) <b>Severní obchvat Jílové u Prahy, I. etapa</b>	Číslo SO/PS/ /číslo Změny SO/PS: <b>102.1/1</b>	Číslo ZBV: <b>1.3</b>
---	---	--------------------------

Objednatel: <b>Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace,</b> Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov IČO: 00066001  <b>Město Jílové u Prahy</b> Masarykovo náměstí 194, 254 01 Jílové u Prahy, IČO: 00241326
--

Zhotovitel: <b>„Společnosti pro II/105 – Severní obchvat Jílového u Prahy“</b> Vedoucí společník a správce společnosti: <b>IMOS Brno, a.s.,</b> se sídlem: Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno, IČO: 253 22 257, Společník: <b>Froněk, spol. s r.o.,</b> se sídlem: Zátíší 2488, 269 01 Rakovník, IČO: 475 34 630 Společník: <b>PSN &amp; DS a.s.,</b> se sídlem: Hlinky 505/118, Pisárky, 603 00 Brno, IČO: 043 77 036
--

## Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.3	0,00	185 437,50	185 437,50

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1	0,00	185 437,50	185 437,50

Části ZBV se čísly číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.  
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy  
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list	Číslo paré:
------------------	-------------

## Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: <b>II/105 Severní obchvat Jílového u Prahy, 5211521005</b>	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: <b>102.1/1</b>	Číslo ZBV: <b>1.3</b>
---	---	--------------------------

Strany smlouvy o dílo objednatel č.: S-2028/00066001/2021 a zhotovitel č. 20379 - 002 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 31.08.2021 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov  
Město Jílové u Prahy, Masarykovo náměstí 194, 254 01 Jílové u Prahy

Zhotovitel: „Společnosti pro II/105 – Severní obchvat Jílového u Prahy“, Vedoucí společník a správce společnosti: IMOS Brno, a.s., se sídlem: Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno

Přílohy Změnového listu:	Paré č.	Příjemce
1. Krycí list 1 počet listů	1	Objednatel
2. Změnový list 2 počet listů	2	Zhotovitel
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů	3	Projektant
4. Rozpis ocenění Změn položek ZBV 2 1 počet listů	4	Stavební dozor
5. Přehled zařazení změn do skupin 1 počet listů	5	Supervize
6. Přehled dalších dokladů 1 počet listů		
Další doklady dle přehledu dokladů 23 počet listů		

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Nutnost vybudovat paralelně s budovanou komunikací zábrany proti vstupu obojživelníků na staveniště vyplývá již z výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných živočichů z důvodu realizace stavby „II/105 Severní obchvat Jílové u Prahy, která byla vydána OŽP, KÚSK dne 29.8.2017, viz doklad č. 08. Byl tedy stanoven biologický dozor, který je oprávněný stanovit specifikace těchto zábran proti vstupu obojživelníků na staveniště. V souladu s požadavkem biologického dozoru, který vyplývá ze zprávy ze dne 13.1. 2022 (ve které byla dohodnuta podoba a umístění zábran), je tedy nutné vybudovat, a po dobu trvání výstavby udržovat, dočasné zábrany pro migrující obojživelníky (ropucha obecná). Je navrženo provedení pevné zábrany výšky 0,3 m s výztuhou po cca 1,5 m. V rámci opatření budou na určených místech osazeny sběrné koše, které budou 2x denně kontrolovány a případně odchycené obojživelníky přesunuty mimo nebezpečnou oblast staveniště, a to po celou dobu trvání migrace. Celková délka uvedené pevné bariéry je 350 m, viz příloha 09.

Jedná se o Změnu nepodstatnou, která je podle § 5, odst. (1) písm. c), resp. podle § 10 Směrnice R-Sm-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 04. 11. 2020) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek zařazena do **Skupiny 3** jako změna z nepředvídaných důvodů.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná o změnu, která vznikla v průběhu realizace zakázky z důvodu požadavku třetí osoby, která je k tomu oprávněna. Jedná se tak o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Tato změna současně nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
<b>0,00</b>	<b>185 437,50</b>	<b>185 437,50</b>	<b>185 437,50</b>

## Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí)	jméno	Ing. Kamil Hrbek	datum	podpis
Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Milan Strnad	datum	podpis
Stavební dozor	jméno	Ing. Peter Latečka	datum	podpis
Supervize (Regionální dotační kancelář)	jméno		datum	podpis
Zástupce Objednatele KSÚS SK, p.o.	jméno	Ing. Milan Fiala	datum	podpis
Zástupce Objednatele Město Jílové u Prahy	jméno	Jan Prostřední	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

<b>Objednatel 1</b> (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Ing. Jan Fidler, DiS.	datum	podpis
<b>Objednatel 2</b> (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Pavel Pešek	datum	podpis
<b>Zhotovitel</b>	jméno	Ing. Kamil Hrbek	datum	podpis

Číslo paré:



**ZÁPIS****o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)  
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 1**

<b>Název a evidenční číslo Stavby:</b> II/105 Severní obchvat Jílového u Prahy, 5211521005
<b>Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:</b> SO 102.1
<b>Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):</b> 102.1 Severní obchvat Jílové u Prahy, I. etapa

Údaje v Kč bez DPH

<b>Cena SO/PS dle Smlouvy</b>
1 - zadat
<b>482 402,57</b>

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

**Cena SO/PS v předchozích ZBV:**

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	482 402,57	0,00

**Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:**

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	185 437,50	185 437,50	38,44%

**Cena SO/PS po této ZBV:**

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	0,00	667 840,07	185 437,50	38,44%

**Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis**

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

souhlasím Ing. Kamil Hrbek

Projektant (autorský dozor):

souhlasím Ing. Milan Strnad

Stavební dozor:

souhlasím Ing. Peter Latečka

Zástupce Objednatele KSÚS:

souhlasím Ing. Milan Fiala

Zástupce Objednatele  
Město Jílové u Prahy:

souhlasím Jan Prostřední

Supervize (RDK):

Zaměstnanec KSÚS  
odpovědný za cenové  
projednání Změny:

souhlasím Ing. Jaroslav Jurková

## Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 1.3

Název a evidenční číslo stavby:								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS:								102.1/1					
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:								Skupina Změn: 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Nové položky</b>													
32	02920	Dočasné zábrany pro migrující obojživelníky	KPL	0,000	1,000	1,000	185 437,50	0,00	0,00	185 437,50	185 437,50	185 437,50	100,00%
<b>CELKEM</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185 437,50</b>	<b>185 437,50</b>	<b>185 437,50</b>	

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu. Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Kamil Hrbek

Za Objednatele: Ing. Peter Latečka, TDI

Datum:

Datum:

Podpis:

Podpis:

**PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN**

Název a evidenční číslo Stavby:

II/105 Severní obchvat Jílového u Prahy

1	Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	124 390 914,03
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	124 576 351,53
	<b>Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH</b>	<b>150 737 385,35</b>
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	100,15%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%
40=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, odst. (5), písm. b)	0,00%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	185 437,50	ABS
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	0,15%	
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	37 317 274,21	

9=(32A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	0,15%	ABS
10=(36A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,00%	ABS
10A=32A+36A	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	185 437,50	
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	62 195 457,02	

12=39	Sledování limitu 15 %	0,00%
13=38-37	Sledování limitu 137366 000 Kč	0,00
14=137366000-13		137 366 000,00

				- 1 -				- 2 -				- 3 -				- 4 -				- 5 -		
				Vyhrazené změny (Doměrky)				Záměna položek (Započítávání)				Nepředvídanost				Nezbytnost				Změny de minimis		
SO	ZBV č.	Název SO/PS/předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	limit 15 %
16	17	18	19=23+26+29+33	20=24+27+30+34+37+39	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	32=29+30	32A=ABS(29)+30	33	34	36=33+34	36A=ABS(33)+34	37	38	39=ABS(37)+38
		II/105 Severní obchvat Jílového u Prahy	0,00	185 437,50	185 437,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 437,50	185 437,50	185 437,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102.1	1	Severní obchvat Jílové u Prahy, I. etapa / dočasné zábrany pro migrující obojživelníky	0,00	185 437,50	185 437,50			0,00			0,00	0,00	185 437,50	185 437,50	185 437,50				0,00		0,00	

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

## Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	1.3
Název a evidenční číslo stavby:	II/105 Severní obchvat Jílového u Prahy, 5211521005
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Severní obchvat Jílové u Prahy, I. etapa
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	102.1/1

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
07 Změnový soupis prací SO 102.1 po změně 1	2	
08 Výjimka OŽP KÚSK dne 29.8.2017	5	
09 Zpráva biologického dozoru ze dne 13.1. 2022	3	
10 Vyhodnocení CN a Cenové nabídky na dočasné zábrany	6	
11 Oznámení Zhotovitele o změně ze dne 14.10.2021	2	
12 Pokyn Objednatele ke změně ev.č. 28704_2022 KSÚS	1	
13 Stanovisko AD k ZBV 1	1	
14 Stanovisko TDI k ZBV 1	2	
15 Zplnomocnění pro Ing. Hrbka	1	
Počet listů celkem	23	

## Změnový soupis prací SO 102.1 po změně 1 pro ZBV č.1

Název a evidenční číslo stavby: II/105 Severní obchvat Jílového u Prahy, 5211521005

Číslo a název SO/PS: SO 102.1 Severní obchvat Jílové u Prahy, I. etapa

Číslo a název  
podobjektu/rozpočtu:

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

102.1/1

Pof. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	113765	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	51,50	0	0	119,00	6 128,50	0,00	0,00	6 128,50	0,00	0,00%
2	12373	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I	M3	133,37	0	0	155,70	20 765,71	0,00	0,00	20 765,71	0,00	0,00%
3	13273	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	5,00	0	0	238,20	1 191,00	0,00	0,00	1 191,00	0,00	0,00%
4	17110PAR	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ SE ZHUTNĚNÍM PARAMETRICKY	M3	36,97	0	0	338,00	12 495,86	0,00	0,00	12 495,86	0,00	0,00%
5	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	71,05	0	0	487,00	34 601,35	0,00	0,00	34 601,35	0,00	0,00%
6	17320	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	24,00	0	0	190,40	4 569,60	0,00	0,00	4 569,60	0,00	0,00%
7	17380	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	16,90	0	0	190,40	3 217,76	0,00	0,00	3 217,76	0,00	0,00%
8	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	580,52	0	0	12,75	7 401,63	0,00	0,00	7 401,63	0,00	0,00%
9	18220	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU	M3	44,71	0	0	184,50	8 249,00	0,00	0,00	8 249,00	0,00	0,00%
10	18230	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ	M3	51,00	0	0	141,80	7 231,80	0,00	0,00	7 231,80	0,00	0,00%
11	21263	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM	M	22,00	0	0	277,10	6 096,20	0,00	0,00	6 096,20	0,00	0,00%
12	451312	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	0,61	0	0	2 320,50	1 415,51	0,00	0,00	1 415,51	0,00	0,00%
13	451314	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	1,57	0	0	2 694,50	4 230,37	0,00	0,00	4 230,37	0,00	0,00%
14	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	84,42	0	0	791,00	66 776,22	0,00	0,00	66 776,22	0,00	0,00%
15	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	53,34	0	0	791,00	42 191,94	0,00	0,00	42 191,94	0,00	0,00%
16	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	395,66	0	0	23,00	9 100,18	0,00	0,00	9 100,18	0,00	0,00%
17	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	501,76	0	0	11,00	5 519,36	0,00	0,00	5 519,36	0,00	0,00%
18	5740E6	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S	M3	18,94	0	0	4 142,00	78 449,48	0,00	0,00	78 449,48	0,00	0,00%



19	574A03	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11	M3	14,88	0	0	4 803,00	71 468,64	0,00	0,00	71 468,64	0,00	0,00%
20	574C06	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S	M3	7,38	0	0	4 157,00	30 678,66	0,00	0,00	30 678,66	0,00	0,00%
21	57621	POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2	M2	395,66	0	0	7,00	2 769,62	0,00	0,00	2 769,62	0,00	0,00%
22	89980	TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ	M	22,00	0	0	85,20	1 874,40	0,00	0,00	1 874,40	0,00	0,00%
23	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	28,00	0	0	432,00	12 096,00	0,00	0,00	12 096,00	0,00	0,00%
24	9183B3	PROPUSTY Z TRUB DN 400MM PLASTOVÝCH	M	6,05	0	0	1 555,50	9 410,78	0,00	0,00	9 410,78	0,00	0,00%
25	919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	23,50	0	0	80,00	1 880,00	0,00	0,00	1 880,00	0,00	0,00%
26	931315	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 600MM2	M	51,50	0	0	72,00	3 708,00	0,00	0,00	3 708,00	0,00	0,00%
27	935212	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	M	53,00	0	0	545,00	28 885,00	0,00	0,00	28 885,00	0,00	0,00%

## Nová položka

32	02920	Dočasné zábrany pro migrující obojživelníky	KPL	0	1,00	1,00	185 437,50	0,00	0,00	185 437,50	185 437,50	185 437,50	100%
		ZBV1 položka v OTSKP bez ceny, výběr ze tří nabídek - doklad č. 10 161 250,00 + 15 % = 185 437,50 Kč											
<b>CELKEM</b>							<b>482 402,57</b>	<b>0,00</b>	<b>185 437,50</b>	<b>667 840,07</b>	<b>185 437,50</b>	<b>38,44%</b>	

**Praha:** 29 8. 2017  
**Číslo jednací:** 092495/2017/KUSK  
**Spisová značka:** SZ\_092495/2017/KUSK/3  
**Vyřizuje:** Ing. Michaela Anýžová l. 584  
**Značka:** OŽP/MK

**Věc: Výjimka z ochranných podmínek zvláště chráněných živočichů z důvodu realizace stavby „II/105 Severní obchvat Jílové u Prahy“**

## Rozhodnutí

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „Krajský úřad“) jako příslušný orgán ochrany přírody podle ust. § 77a odst. 5 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 114/1992 Sb.“), v souladu s ust. § 29 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, na základě správního řízení vedeného podle zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)

## povoluje výjimku

podle ust. § 56 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. ze zákazů uvedených v ust. § 50 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje zvláště chráněného druhu ropucha obecná (*Bufo bufo*) konkrétně je rušit, zraňovat nebo usmrcovat, chytat, sbírat, přemísťovat, ničit, poškozovat jejich vývojová stádia a jimi užívaná sídla, a to v rámci stavby „II/105 Severní obchvat Jílové u Prahy“ v k.ú. Jílové u Prahy. Výjimka je povolena Krajské správě a údržbě silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IČ: 00066001, sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5 za dodržení následujících podmínek:

1. V těsné blízkosti rybníka v obci Radlíku, kde byl potvrzen výskyt ropuchy obecné a v oblasti migračního koridoru, budou, před jarní a podzimní migrací jedinců, paralelně s budovanou komunikací umístěny zábrany proti vstupu obojživelníků na staveniště. V této oblasti nebudou umístěny sklady materiálů, stavební dvory, dočasné komunikace apod.

2. V době jarní a podzimní migrace ropuch obecných bude na staveništi zajištěna přítomnost odborně způsobilé osoby, která zajistí přenos zvláště chráněných jedinců, kteří se v trase obchvatu budou vyskytovat a budou probíhajícími pracemi ohroženi na existenci. Biologický dozor stanoví počátek i konec migračního období.
3. V severní části obchvatu trasy, který se nachází v blízkosti rybníka v jižní části obci Radlíku budou vybudovány funkční podchody pro obojživelníky s trvale naváděcími bariérami.
4. Platnost výjimky je omezena po dobu realizace předmětného záměru, nejpozději však do 31. 12. 2022.

Účastník řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IČ: 00066001, sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5.

Nositel výjimky je povinen do 31. 12. každého roku, a to až do konce platnosti rozhodnutí, nahlásit příslušnému orgánu ochrany přírody zásahy, provedené na základě vydané výjimky pro zvláště chráněné druhy dle § 56 zákona č. 114/1992 Sb.

Tímto rozhodnutím nejsou dotčena ustanovení podle jiných právních předpisů.

## **Odůvodnění**

Krajskému úřadu byla dne 21. 7. 2017 doručena žádost společnosti PRAGOPROJEKT, a.s., IČ: 45272387, sídlem K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4, která zastupuje na základě plné moci Krajskou správu a údržbu silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IČ: 00066001, sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5 o vydání výjimky podle ust. § 56 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. ze zákazů uvedených v ust. § 50 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje zvláště chráněného druhu ropucha obecná (*Bufo bufo*) konkrétně rušit, zraňovat nebo usmrcovat, chytat, sbírat, přemísťovat, ničit, poškozovat jejich vývojová stádia a jimi užívaná sídla, a to v rámci stavby „II/105 Severní obchvat Jílové u Prahy“ v k.ú. Jílové u Prahy.

Předmětný záměr řeší výstavbu nové komunikace v převážné části ve stávající trase silnice v severní části města, dále zasahuje do ploch agrocenóz a vede v blízkosti stávajících průmyslových a komerčních ploch. Trasa silnice propojí silnice II/105 a II/104 mimo centrum města Jílové u Prahy s cílem zlepšit dopravní situaci a životní prostředí v centrální historické části města Jílovém u Prahy. Na předmětný záměr byl vypracován biologický průzkum „II/105 – Severní obchvat Jílového u Prahy“, zpracovatel RNDr. Jiří Vávra, CSc., 7/2017.

Dopisem ze dne 4. 8. 2017 Krajský úřad oznámil účastníkům řízení, v souladu s ust. § 47 odst. 1 správního řádu, zahájení správního řízení. O zahájení správního řízení byly též tímto dopisem informovány zapsané spolky „Českomoravská myslivecká jednota, z.s.“, „KLIDNÉ ÚDOLÍ, SPOLEK PRO OCHRANU PŘÍRODY“, „Krajina 2000“ a „Sdružení Miláčov, z.s.“. Podle § 70 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb. je občanské sdružení resp. zapsaný spolek oprávněn účastnit se správního řízení, pokud oznámí svou účast písemně do osmi dnů od oznámení o zahájeném řízení. Ve stanovené lhůtě se do předmětného řízení žádný z obeslaných spolků nepřihlásil.

Účastníkům řízení byla dána možnost činit úkony dle § 36, § 37 a § 38 správního řádu, zejména vyjádřit své stanovisko navrhopvat důkazy a činit jiné návrhy, to po celou dobu předmětného řízení až do vydání rozhodnutí. Krajský úřad poskytl v souladu s ust. § 36 odst. 3 správního řádu účastníkům řízení možnost vyjádřit se před vydáním rozhodnutí k podkladům rozhodnutí. Žádný z účastníků řízení se do dnešního dne nevyjádřil.

Ropucha obecná je dle vyhlášky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb. zvláště chráněným živočichem, zařazeným do kategorie „ohrožený“ živočich. Výjimky u zvláště chráněných druhů může orgán ochrany přírody povolit v případech, kdy jiný veřejný zájem převažuje nad zájmem ochrany přírody nebo v zájmu ochrany přírody. Na základě této skutečnosti Krajský úřad prostudoval předloženou žádost, zhodnotil možné dopady realizace záměru na dotčený zvláště chráněný druh a dospěl k závěru, že realizace záměru je ve veřejném zájmu, který převažuje nad zájmem ochrany přírody. Převaha veřejného zájmu na realizaci předmětného záměru nad zájmy ochrany přírody, v tomto případě nad ochranou dotčeného zvláště chráněného druhu, je Krajským úřadem spatřována ve skutečnosti, že realizací záměru dojde k odklonění dopravy mimo zastavěnou část obce Jílového u Prahy. Stavbou bude zvýšena bezpečnost řidičů a obyvatel obce. Dále dojde ke snížení množství exhalací produkovaných automobilovou dopravou. Realizace záměru tedy bude mít pozitivní vliv na kvalitu života a čistotu prostředí obyvatel v dotčené obci. Stavba je navíc v souladu s územně plánovací dokumentací. Úkolem územního plánování je dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, zejména prověřovat a posuzovat potřebu změn v území, veřejný zájem na jejich provedení, jejich přínosy, problémy, rizika s ohledem na veřejné zdraví, životní prostředí, geologickou stavbu území, vliv na veřejnou infrastrukturu a na její hospodárné využívání. Dále je nutné si uvědomit, že realizací záměru bude dotčen jeden druh, a to křížením komunikace přes jeho migrační trasu.

Migrační trasa již v současnosti přechází přes stávající komunikaci a dochází zde k usmrcování jedinců. Tento stav bude minimalizován výstavbou podchodů pro obojživelníky s trvale navádějícími bariérami, což by v konečném důsledku mělo vést ke zlepšení stavu.

Pro zmírnění negativního dopadu záměru na předmětné druhy stanovil správní orgán dle § 56 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb. několik podmínek, za jejichž dodržení je možné předmětný záměr realizovat. V podmínce č. 1 byla žadateli uložena povinnost v místech výskytu obojživelníka, který deklaruje biologický průzkum vybudovat v období před jarní a podzimní migrací souběžně s budovanou komunikací bariéry proti vnikání těchto živočichů na staveniště. Cílem této podmínky je zamezit vniknutí jedinců na staveniště a tím snížit riziko usmrcení zvláště chráněného druhu. Podmínkou č. 2 je žadateli uložena povinnost v době jarní a podzimní migrace ropuch zajistit na staveništi přítomnost odborně způsobilé osoby, která bude zajišťovat kontrolu staveniště a území, a to zejména v severní části obchvatu a bude zároveň odchyťovat a přenášet zvláště chráněné živočichy, kteří budou probíhajícími pracemi ohroženi. Zvláště chránění živočichové budou vypuštěni v okolí realizace záměru na stanovištně odpovídajících místech, kde nebudou záměrem dotčeni. Cílem této podmínky je také snížit riziko usmrcení jedinců při výstavbě silnice. Jelikož výstavba liniové stavby vytváří v krajině bariéru, je třeba zajistit dostatečnou migrační prostupnost. Zejména vezmeme-li v úvahu, že předmětný záměr křížuje migrační koridor dotčeného zvláště chráněného druhu. Migrační prostupnost zajišťuje podmínka č. 3 kdy je žadateli uložena povinnost vybudovat funkční podchody pro obojživelníky. Aby živočichové nepřekonávali komunikaci přímo, kde dojde k usmrcení podstatné části migrujících jedinců projíždějícími automobily, je třeba instalovat trvalé naváděcí bariéry.

Platnost rozhodnutí je omezena do 31. 12. 2022, i když žadatel žádá platnost rozhodnutí do kolaudace předmětné stavby. Z hlediska ochrany přírody je žádoucí, aby vydaná výjimka byla časově omezena, a to zejména z důvodu možných změn přírodních poměrů v dotčeném zájmovém území. Pro následující období je možné si zažádat o novou výjimku, případně je možné platnost rozhodnutí na základě žádosti prodloužit.

Vzhledem k výše uvedenému Krajský úřad udělil Krajské správě a údržbě silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IČ: 00066001, sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5 předmětnou výjimku z ochranných podmínek zvláště chráněného druhu ropucha obecná, a to z důvodu realizace stavby „II/105 Severní obchvat Jílové u Prahy“ v k.ú. Jílové u Prahy.

Orgán ochrany přírody v předmětném řízení vycházel z následujících podkladů:

- žádost o udělení výjimky
- plná moc
- pověření osoby k zastupování
- část dokumentace pro územní rozhodnutí
- Biologický průzkum „II/105 – Severní obchvat Jílového u Prahy“, zpracovatel RNDr. Jiří Vávra, CSc., 7/2017.

### **Poučení o odvolání**

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat ve lhůtě do 15 dní ode dne jeho oznámení odvolání k Ministerstvu životního prostředí podáním učiněným u Krajského úřadu Středočeského kraje.

.....  
oprávněná úřední osoba  
*Ing. Michaela Anýžová*  
*Odbor životního prostředí a zemědělství*  
*Oddělení ochrany přírody a krajiny*  
*Odborný referent*  
*/“otisk úředního razítka“/*

Na doručenkou obdrží účastníci řízení:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5 prostřednictvím PRAGOPROJEKT a.s., K Ryšance 1668/16, 147 54 Praha 4 (datovou schránkou)

Město Jílové u Prahy, Masarykovo náměstí 194, 25401 Jílové u Prahy (datovou zprávou)

Na vědomí:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5

## Hofreiterová Lucie

---

**Od:** Kateřina Zímová  
**Odesláno:** čtvrtek 13. ledna 2022 11:59  
**Komu:** Mikeska Jan  
**Kopie:** on.la; Jan Fidler  
**Předmět:** Re: Biodozor Jílové u Prahy

Krásný den pane Mikesko

Moc Vás také zdravím v novém roce a přeji vše nejlepší :)

V příloze posílám zákres, kde by se měly zábrany nainstalovat. Předpoklad je, že se ropuchy nacházejí přes zimu v lesním porostu jižně od záměru a budou migrovat z jihu směrem k vodní nádrži. Proto je tedy nejdelší zábrana jižně od trasy obchvatu. Další pak mějí zabránit mortalitě během případného přechodu přes stávající vozovku, ačkoli není moc pravděpodobné, že se přes ni dostanou přes trasu obchvatu.

Je potřeba, aby zábrany byly na místě nejpozději 10.3, někdy v druhé polovině února bychom přijeli na lokalitu zkontrolovat, jak vypadá aktuální stav stavby a zda se již ropuchy probudily. Poté bychom případně postup upřesnili.

Zábrany mají být 30 cm vysoké, tvořené z jakéhokoli pevnějšího nepromokavého materiálu - plast, kari síť, geotextilie. Materiál je natlučen, nebo přisvorkován na sloupky, rozestup mezi sloupky je 1 - 1,5 m. Konec materiálu se nechává položený na zemi (v našem případě z jižní strany) a zatíží se kameny anebo zeminou. Schéma najdete v manuálu na str. 19. Pokud budete chtít, určitě rádi přijedeme na stavbu při stavbě bariér a vše můžeme doladit na místě.


Manuál na zábrany zde:

<https://standardy.nature.cz/res/archive/310/072339.pdf?seek=1601055816>

Tah ropuch probíhá od poloviny března do konce dubna, ale největší frekvence pohybu je jen několik dní. Jakmile tah začne, dohodneme se na dalším postupu dle jeho intenzity. V zásadě jde o přenášet jednou denně jedine před bariérami k vodní ploše. Vše bychom ale ještě upřesnili na místě.

Pokud máte nějaké otázky, jsem k dispozici, jinak bychom se potkali v druhé polovině února na stavbě.


Pěkné dny

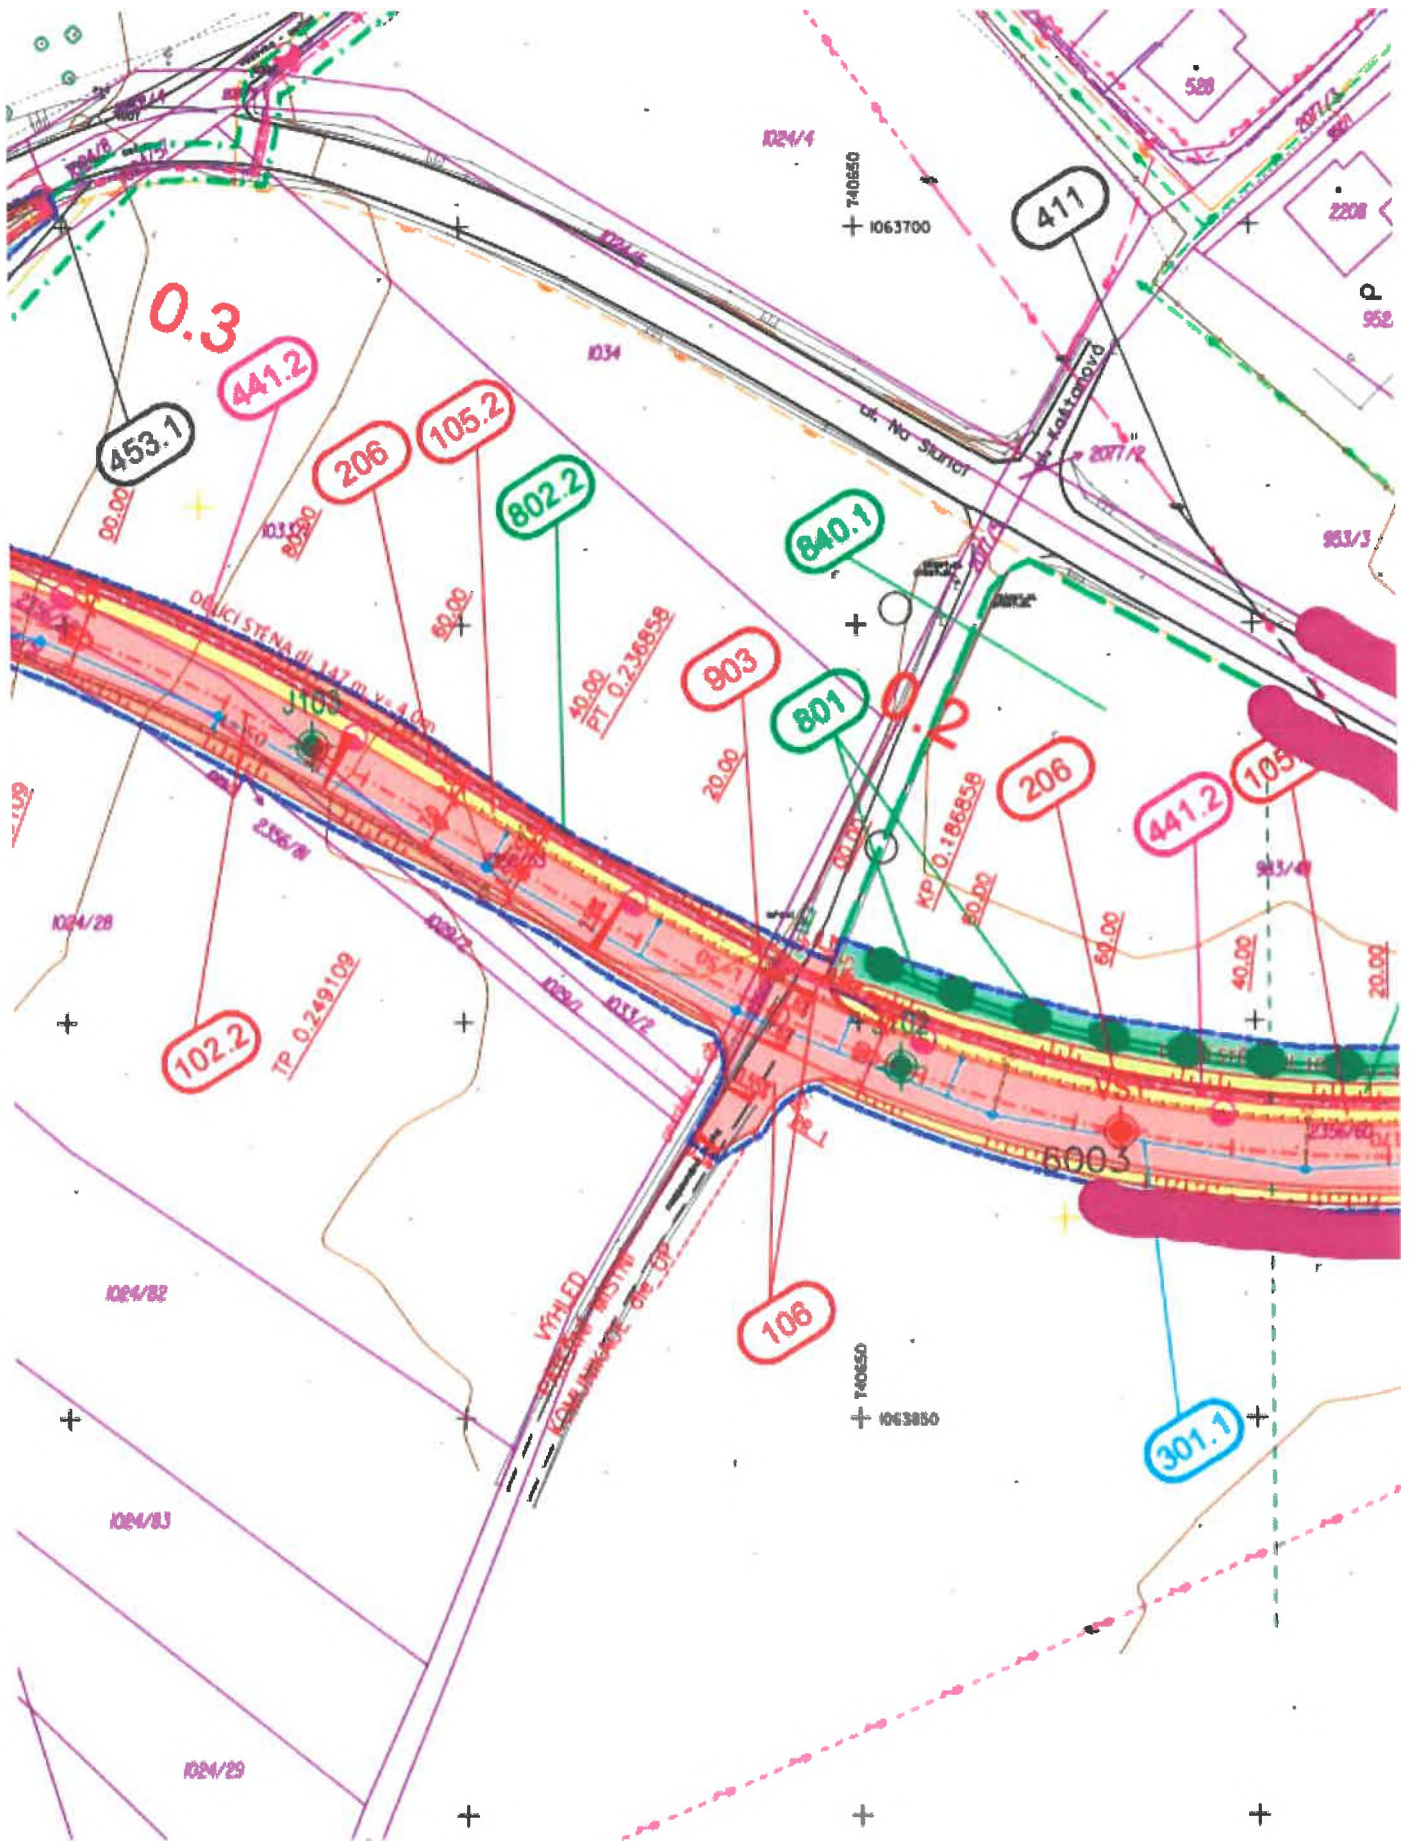


S pozdravem Kateřina Lagner Zímová [www.katerinazimova.cz](http://www.katerinazimova.cz)

12. 1. 2022 v 15:33 píše Mikeska Jan



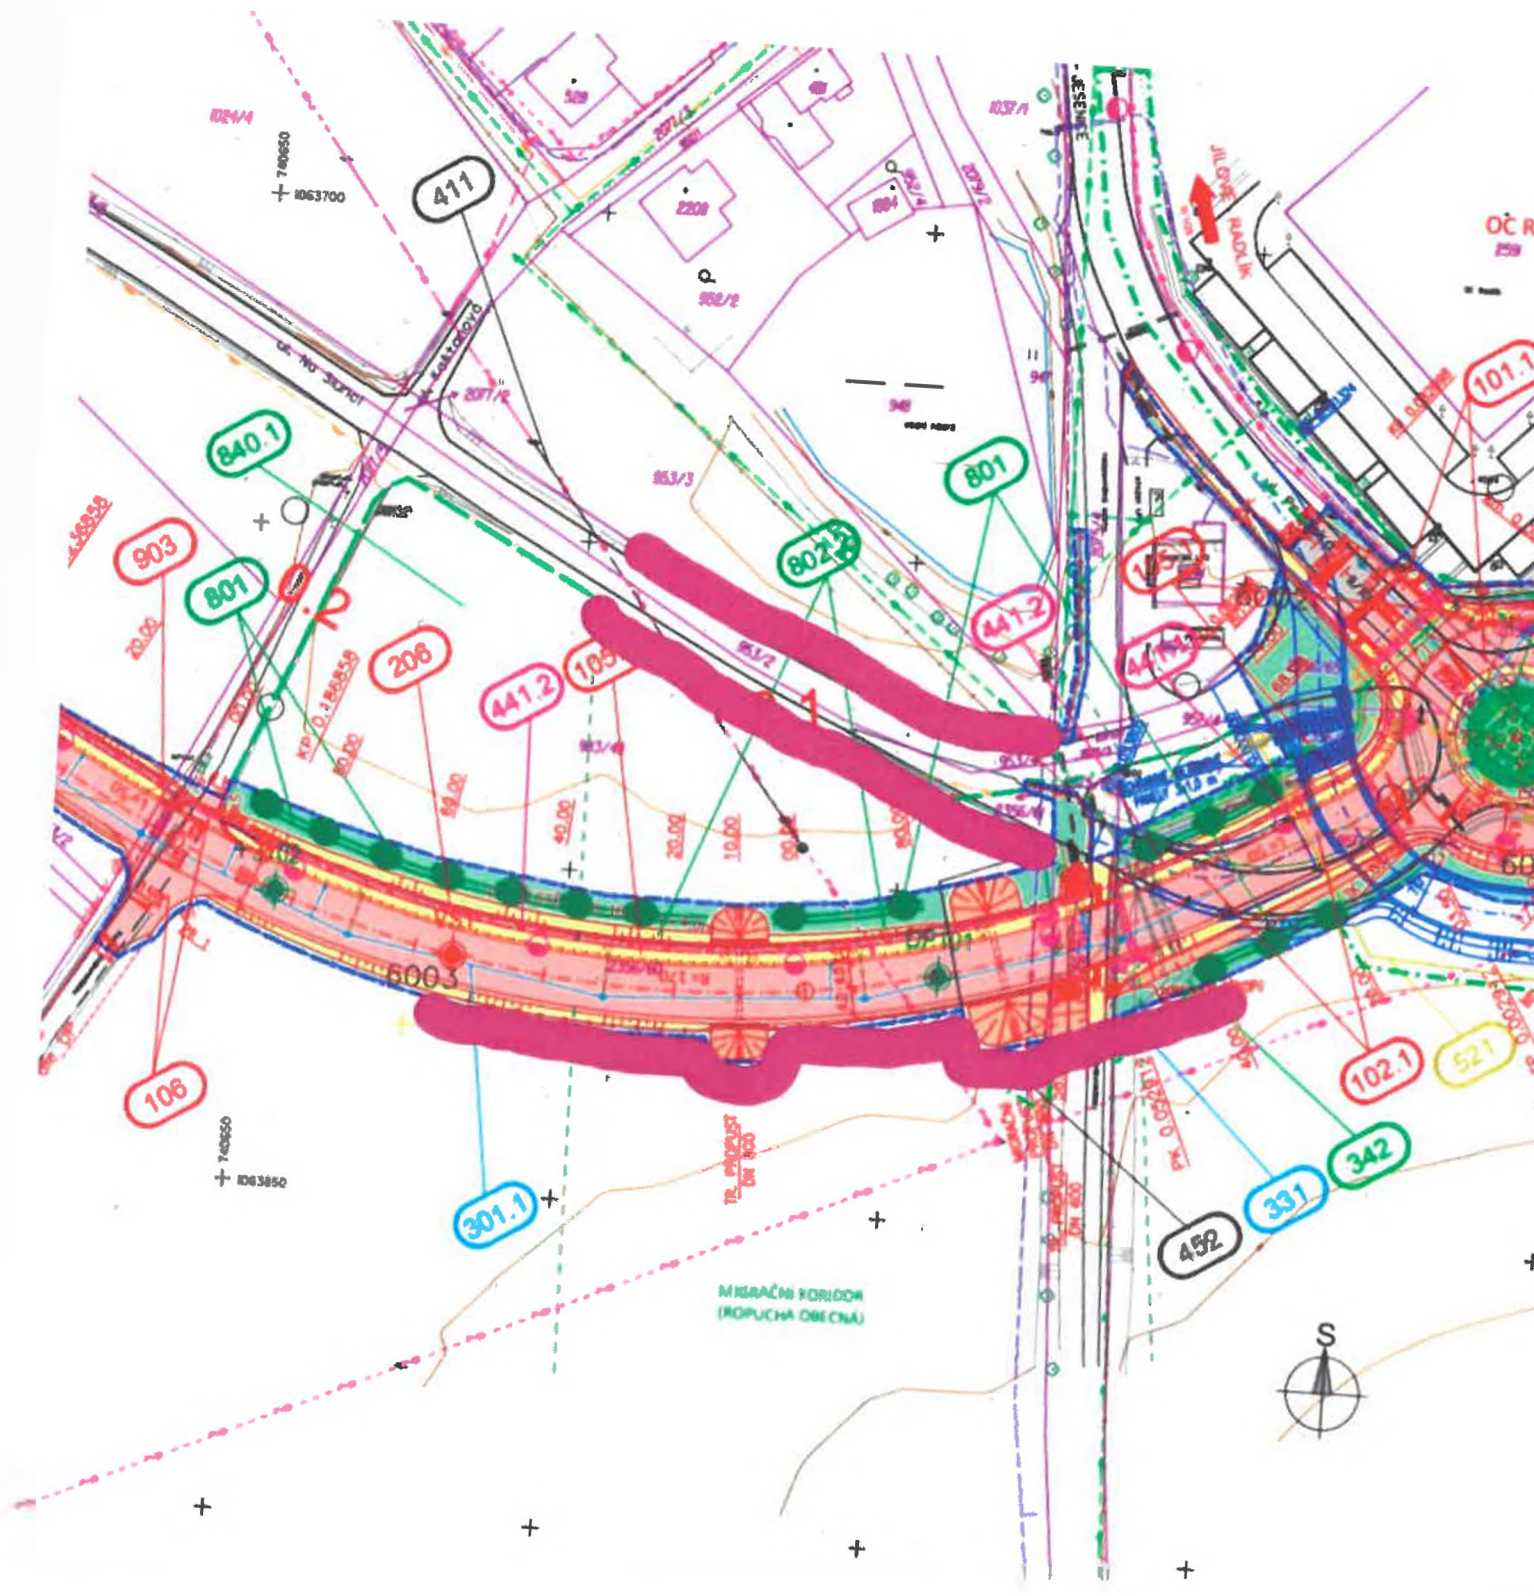

 Firma:					
<b>Soupis prací objektu</b>					
Stavba: 22102 Severní obchvat Jílového u Prahy-RDS					
Rozpočet: SO 102.1 Severní obchvat Jílové u Prahy, I. etapa					
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství
1	2	3	4	5	6
		9	Ostatní konstrukce a práce		
32	02920	N	Svodidlová stěna - naváděcí bariéra pro migrující obojživelníky - po dobu výstavby	kpl	1,00
			<i>cena obsahuje: zhotovení bariéry dle návrhu biologického dozoru, údržbu po dobu migrace obojživelníků 30 dnů, demontáž délka celkem 350 bm</i>		

Dodávka a montáž					
Celkem bez DPH		203 000,00	161 250,00	209 650,00	
CN 1		CN 2		CN 3	
Kateřina Zimová		Naturaservis		ROZA Mšec s.r.o.	
Jednotková	Celkem	Jednotková	Celkem	Jednotková	Celkem
203 000,00	203 000,00	161 250,00	161 250,00	209 650,00	209 650,00
-	-	-	-	-	-

Nejlevnější CN	15%	Cena ZBV = nejlevnější CN + 15 %
<b>161 250,00</b>		<b>185 437,50</b>
161 250,00	15%	185 437,50
<b>15 % tvoří: 5 % správní režie, 5 % výrobní režie a 5 % zisku</b>		
		-

**Mikeska Jan**

---

**Od:** Kateřina Zímová  
**Odesláno:** čtvrtek 31. března 2022 11:06  
**Komu:** Mikeska Jan  
**Předmět:** Re: Dočasné zábrany realizace pro stavbu : II/105 -Severní ochvat Jílové u Prahy.  
**Přílohy:** Rozpocet ZBV-opatreni obojziveln po dobu stavby\_slepý.xlsx

Dobrý den

dle dohody zasílám upravený rozpočet

S pozdravem Kateřina Lagner Zímová [www.katerinazimova.cz](http://www.katerinazimova.cz)

3. 3. 2022 v 19:11 píše Kateřina Zímová <

Dobrý den

zasílám dle dohody

S pozdravem Kateřina Lagner Zímová [www.katerinazimova.cz](http://www.katerinazimova.cz)

2. 3. 2022 v 10:58 píše Mikeska Jan

Dobrý den,

Na základě tel. dohody zasílám žádost o vyhotovení cenové nabídky na montáž, údržbu, demontáž dočasných zábran proti vniku obojživelníků do staveniště.

Požádám o zaslání do připraveného výkazu výměr, který je přílohou tohoto emailu.

Požádám o zaslání co nejdříve.

Děkuji za váš čas s tímto spojením.

S pozdravem



Firma:

**Soupis prací objektu**Stavba: **18-267-2 CELEK** Severní obchvat Jilového u Prahy

ZBV 1 203 000,00

Rožpočet: **ZBV 1** Provizorní naváděcí bariéra pro migrující obojživelníky po dobu výstavby

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena		
						Jednotková	Celkem	
1	2	3	4	5	6	9	10	
						<b>9</b>	<b>Ostatní konstrukce a práce</b>	<b>203 000,00</b>
1	02920		Svodilová stěna - naváděcí bariéra pro migrující obojživelníky - po dobu výstavby	M	350 00	580,00	203 000,00	
<i>cena obsahuje: zhotovení bariéry dle návrhu biologického dozoru, údržbu po dobu migrace obojživelníků cca 30 dnů, demontáž délka celkem 350 bm</i>								

**Mikeska Jan**

---

**Od:**  
**Odesláno:** pátek 25. února 2022 15:07  
**Komu:** Mikeska Jan  
**Kopie:**  
**Předmět:** RE: Provizorní zábrana proti vniku obojživelníků na stavbu a komunikace po dobu výstavby

Zdravím Vás.

Nabízíme Vám instalaci dočasné bariéry včetně materiálu v ceně 200,- Kč/bm + DPH, deinstalaci 75,- Kč/bm + DPH. Denní obsluha bariéry (vybírání odchytných nádob, údržba bariéry, transfery) 2.000,- Kč/den + DPH. Oboje bude účtováno dle skutečně odvedených úkonů. Zpracování závěrečné zprávy pro orgány OOP 5.000,- Kč + DPH.

Sdělte nám, prosím, co nejdříve, zda naši nabídku akceptujete.

**Roman Rozínek**

jednatel společnosti

Říčařova 66, 503 01 Hradec Králové

☎ Tel: +

☎ Mobil: +

E-mail:

www:

**From:** Mikeska Jar**Sent:** Mondav. Februarv 21. 2022 11:18 AM**To:** jiri.f**Subject:** Provizorní zábrana proti vniku obojživelníků na stavbu a komunikace po dobu výstavby

Dobrý den,

Na základě požadavku biodozoru stavby, kdy u naší stavby je migrační koridor pro obojživelníky ( ropucha obecná) vás tímto chci požádat o zaslání cenové nabídky na zhotovení provizorní bariéry.

Stavba: Severní obchvat Jílové u Prahy

Termín provedení cca: 1.3 – 1.4.2022 dle migrace.

Délka cca 350mb viz příložená situace v km 0,100 – 0,200

Cena by měla obsahovat.

*Montáž vč. materiálu.*

*Údržba po dobu migrace vč. přenosu obojživelníků.*

*Demontáž*

Požádám o cenovou nabídku co nejdříve.

Dále se na vás tomto týdnu se na vás ještě obrátí kolegyně s poptávkou na zhotovení trvalé zábrany po dokončení stavebních prací.

**Mikeska Jan**

---

**Od:** Monika Topková  
**Odesláno:** čtvrtek 5. května 2022 14:50  
**Komu:** Mikeska Jan  
**Předmět:** FW: Dočasné zábrany realizace pro stavbu : II/105 -Severní ochvat Jílové u Prahy.  
**Přílohy:** ~WRD001.jpg; image002.gif; image003.jpg; Rozpocet ZBV-opatreni obojziveln po dobu stavby\_ROZA zákazníkovi.xlsx

Dobrý den,

Přeposílám cenovou nabídku od zahradnické firmy ROZA CZ.

Kontakt na majitele pana Rosenreitera: |

S pozdravem

**Bc. Monika Topková**  
Připravářka zakázek

Froněk, spol. s r.o.  
Zátiší 2488, CZ 269 01 Rakovník  
[www.fronek.cz](http://www.fronek.cz)

 **Froněk**  
dopravní stavby

---

**From:** roza.msec [mailto: ]  
**Sent:** Thursday, May 5, 2022 2:35 PM  
**To:** Monika Topková  
**Subject:** RE: Dočasné zábrany realizace pro stavbu : II/105 -Severní ochvat Jílové u Prahy.

Dobrý den,  
posílám požadované.

Ing. Václav Rosenreiter - jednatel

-----  
ROZA Mšec, s. r. o.  
Mšec 211  
270 64 Mšec  
IČO: 27891551  
DIČ: CZ27891551

Mobil.  
Tel: +4  
Fax: +4  
email: ]  
www: ]



Firma:

## Soupis prací objektu

Stavba: 18-267-2 CELEK Severní obchvat Jilového u Prahy

ZBV 1 209 650,00

Rožpočet: ZBV 1 Provizorní naváděcí bariéra pro migrující obojživelníky po dobu výstavby

1	2	3	4	5	6	Jednotková cena	
						9	10
9 Ostatní konstrukce a práce						209 650,00	
1	02920		Svodilová stěna - naváděcí bariéra pro migrující obojživelníky - po dobu výstavby	M	350,00	599,00	209 650,00
<i>cena obsahuje: zhotovení bariéry dle návrhu biologického dozoru, údržbu po dobu migrace obojživelníků cca 30 dnů, demontáž délka celkem 350 bm</i>							

Dne 5.5.2022

Zpracoval: Rosenreiter

**FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY  
„II/105 – Severní obchvat Jílové u Prahy“**

**Určeno:** Ing. Jan Lichtneger, ředitel KSÚS

**Číslo Jednací :** ohlášení\_změn\_stavby 01

**Číslo SoD:** S-2028/00066001/2021

**Termín plnění:** 13.9.2021 – 13.6.2023

**Celková cena díla:** 124 390 914,03 Kč bez DPH

**Zhotovitel:** Společnost pro II/105 – Severní obchvat Jílového u Prahy

**IČ:** 253 22 257

**Oprávněná osoba:** Ing. Kamil Hrbek

**Telefonní spojení:** +420 608 772 556

**Popis předmětu informace:**

**Objekt SO – celá stavba**

Na základě biologického dozoru stavby je nutné vybudovat dočasné zábrany pro migrující obojživelníky (ropucha obecná) i po dobu výstavby pro zabránění vnikání tomuto ohroženému druhu do prostoru staveniště.

**Popis problému/opatření :**

Dle biologického dozoru je navrženo provedení zábrany výšky 0,3m s výztuhou po cca 1,5m a osazení sběrných košů, které je nutné v intervalu 2 denně procházet a případné odchycené obojživelníky přenést do bezpečí a to po celou dobu migrace. Celková délka této bariéry je cca 350m.



**Čeho se zhotovitel domáhá:**

Tímto dochází ke změně a musí být PD upravena, čímž dojde ze změně oproti SOD.  
Upozorňujeme, že na tuto změnu bude muset být zpravováno ZBV.

**Datum, podpis oprávněné osoby**

14.10.2021

6

Evidenční číslo: 28704/2022-KSÚS

Číslo jednací: 323/22/KSUS/KRK

Vážený pan  
Ing. Kamil Hrbek  
IMOS Brno, a.s.  
Olomoucká 704/174.Černovice  
627 00 Brno

**Věc: II/105 Severní obchvat Jílového u Prahy - Ohlášení změn během výstavby**

Dobrý den,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o. (dále jen KSÚS), jako investor akce „II/105 Severní obchvat Jílového u Prahy“ je seznámena se žádostí o zpracování ZBV jehož předmětem je:

Během realizace vzešlo z požadavku biologického dozoru stavby vybudovat dočasné zábrany pro migrující obojživelníky (ropucha obecná) i po dobu výstavby pro zabránění vnikání tomuto ohroženému druhu do prostoru staveniště.

Na základě požadavku investora budou v trase obchvatu dodatečně umístěny chráničky pro budoucí optickou síť, jedná se o dvě chráničky.

KSÚS bere na vědomí, že zhotovitel nemohl v době zadávací lhůty soutěže předvídat výskyt těchto okolností, a proto KSÚS žádá zhotovitele společnost „Společnosti pro II/105 – Severní obchvat Jílového u Prahy“, o vypracování Změnových listů, a to v souladu se směrnicí KSÚS, která je nedílnou součástí Smlouvy o dílo. Tyto ZBV budou následně projednány a podrobně posouzeny supervizorem zakázky, následně budou posouzeny vedením KSÚS.

S pozdravem

Ředitel KSÚS<sup>ger</sup>

NAŠE ZNAČKA:

VYŘIZUJE Ing. Milan Strnad

DATUM 25.5.2022

Ing. Jan Fidler  
KSÚS Stč.kraje

**Věc: II/105 – Severní obchvat jílového u Prahy  
Vyjádření autorského dozoru (AD)**

**Formulář změn č.: 01**

**Objekt:** celá stavba

**Předmět:**

Doplnění dočasných zábrán pro zabránění vniku migrujících živočichů na staveniště dle požadavku biologického dozoru.

**Odůvodnění:**

Konkrétní umístění dočasných zábrán vychází z požadavku biologického dozoru na základě situace na staveništi v době výstavby.

Tedy dočasné zábrany nemohly být součástí dokumentace PDPS.

**Stanovisko AD:**

Souhlasím.

Ing. Milan Strnad

**Na vědomí:** ing. Peter Latečka, TDI

Naše značka:

Vyřizuje: Ing. Peter Latečka

Datum: 17. 06. 2022

**Krajská správa a údržba silnic**

**Středočeského kraje, příspěvková organizace**

Ing. Jan Fidler

Vedoucí investic

Se sídlem: Zborovská 11, Praha 5  
Oblastní pracoviště: Žižkova, 263/1,  
Říčany u Prahy 251 01

**Akce: II/105 – Severní obchvat Jílového u Prahy**

**Věc: Vyjádření TDI k ohlášení změny stavby č. 01**

Dotčený objekt: není součástí žádného SO

### **Popis změny**

Požadavek biologického dozoru vybudovat dočasné zábrany pro usměrnění migrace a zabránění volného vstupu obojživelníků (ropuchy obecné) do prostoru staveniště.

### **Odůvodnění změny**

V souladu s požadavkem biologického dozoru ze dne 13. 01. 2022 vybudovat, a po dobu trvání výstavby udržovat dočasné zábrany pro migrující obojživelníky (ropucha obecná) je navrženo provedení pevné zábrany výšky 0,3 m s výztuhou po cca 1,5 m. V rámci opatření budou na určených místech osazeny sběrné koše, které budou 2x denně kontrolovány a případně odchycené obojživelníky přesunuté mimo nebezpečnou oblast staveniště, a to po celou dobu trvání migrace. Celková délka uvedené pevné bariéry je 350 m.

### **Stanovisko TDI**

S ohledem na jednoznačně specifikovaný požadavek biologického dozoru, prostřednictvím objednatele, s navrženou úpravou a jejím provedením TDI souhlasí.

Z důvodu, že související položka pro ocenění prací ani jí podobná není součástí oceněného soupisu prací, předložil zhotovitel, v souladu s SOD čl. 6.8. písm. c) 3 nezávislé nabídek jiných zhotovitelů.

v Praze dne 17. 06. 2022

Zpracoval: Ing. Peter Latečka  
Pragoprojekt, a.s.

## PLNÁ MOC

Zmocnitelé: **IMOS Brno, a.s.**,  
IČ: 25322257,  
se sídlem Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno,  
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2211,  
zastoupená Ing. Robertem Suchánkem, předsedou představenstva

**PSN & DS a.s.**,  
IČ: 04377036,  
se sídlem Hlinky 505/118, Pisárky, 603 00 Brno,  
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 7379,  
zastoupená Davidem Noskem, členem správní rady

Zmocněnec: **Froněk, spol. s r.o.**,  
IČ: 47534630,  
se sídlem Rakovník, Zátíší 2488, PSČ 26901,  
zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 15879,  
zastoupená Ing. Robertem Suchánkem, jednatelem a Ing. Kamilem Hrbkem,  
prokuristou

Zmocněnec a zmocnitelé jsou společníky společnosti „Společnost pro II/105 - Severní obchvat Jílového u Prahy“, založené za účelem realizace veřejné zakázky „II/105 – Severní obchvat Jílového u Prahy“ pro zadavatele Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IČ 00066001, se sídlem Zborovská 81/11, Smíchov, 150 00 Praha 5 („**Zakázka**“).

Zmocnitelé udělují zmocněnci plnou moc k jednání ve všech věcech smluvních a technických stran Zakázky, zejména ohledně změn během výstavby (změnových listů a jiných úprav).

Zmocněnec není oprávněn, dát se dále zastoupit; to neplatí pro prokuru udělenou zmocněncem.

V Brně dne .....  
Za zmocnitele IMOS Brno, a.s.

Ing. Robert Suchánek,  
předseda představenstva

V Brně dne .....  
Za zmocnitele PSN & DS a.s.,

David Nosek, člen správní rady
