

Krycí list ZBV

Název Stavby dle SoD:

Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská - Stará Boleslav

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Účelová komunikace

Číslo SO/PS /

/ pořadí Změny SO/PS:

122/2

Číslo ZBV:

10

Objednatel č. 1: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov
IČ: 00066001

Objednatel č. 2: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
Masarykovo náměstí 1/6, 250 01 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
IČ: 00240079

Zhotovitel:

EUROVIA CS, a.s.

U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

IČ: 45274924

Rekapitulace ZBV č. 10 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
10.1	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
10.2	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
10.3	-19 373,87	0,00	-19 373,87

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
10.4	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
10.5	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ SUMA	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
10	-19 373,87	0,00	-19 373,87

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Změnové listy (02)
a pro Rozpis ocenění změn položek (04).

Změnový list

Název Stavby dle SoD: Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská - Stará Boleslav Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Účelová komunikace	Číslo SO/PS / / pořadí Změny SO/PS: <div style="text-align: center; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">122/2</div>	Číslo ZBV / Skupina změny: <div style="text-align: center; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">10.3</div>
---	---	--

Strany smlouvy o dílo č. S-2259/00066001/2021 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 22.10.2022 (dále jen Smlouva):
 Objednatel č.1: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov
 Objednatel č.2: Město Brandýs nad Labem- Stará Boleslav se sídlem Masarykovo náměstí 1/6, 250 01 Brandýs nad Labem- Stará Boleslav
 Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s. se sídlem U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

Přílohy Změnového listu:		Paré č.	Příjemce
1. Krycí list	1	1	Objednatel
2. Změnový list	1	2	Zhotovitel
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	3	Projektant (AD)
4. Rozpis ocenění Změn položek	1	4	Stavební dozor
5. Přehled zařazení změn do Skupin	1		
6. Přehled dokladů	1		
7. Soupis prací SO po všech změnách	2		
Další doklady dle přehledu dokladů	5		

Iniciátor Změny: Objednatel
 Předmět Změny: Oprava množství pol. č. 30

Toto ZBV p.č. 10 (SO122/2) řeší úpravu množství položky č. 30 – 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNIKŮ ŠÍŘ 150MM. Dochází ke snížení množství o 47m.

Zdůvodnění:
 Důvodem snížení množství výše uvedené položky č. 30 je nesoulad v PDPS/RDS. Konkrétně se jedná o nesoulad mezi soupisem prací a výkresovou částí (viz situace RDS příloha č. 8 a příčné řezy RDS příloha č. 9).
 Výše uvedené skutečnosti oznámil Zhotovitel Objednateli dopisem č.j.: 1030818ZGO/35_22 (viz příloha č. 10). TDS vydal doporučení ke zpracování ZBV dne 29.11.2022 (viz příloha č. 11). AD vydal souhlasné stanovisko k tomuto ZBV dne 2.12.2022 (viz příloha č. 12).

Na základě výše uvedeného lze konstatovat, že Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl tuto skutečnost při zadání zakázky předvídat. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50% původní hodnoty závazku. Zákonná podmínka nepředvídatelnosti dle paragrafu 222 odst. 6 ZZVZ 134/2016 Sb. je splněna.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-19 373,87	0,00	-19 373,87	19 373,87

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (hl. stavbyvedoucí):	jméno	Zbyněk Goldberger	datum	podpis
Projektant (autorský dozor):	jméno	Ing. Pavel Hrdina Pontex, spol s.r.o.	datum	podpis
Stavební dozor:	jméno	Petr Jiřímský TES Consulting, s.r.o.	datum	podpis
Zástupce Objednatel č. 1:	jméno	Ing. Marek Hanuš, MPA	datum	podpis
Zástupce Objednatel č. 2:	jméno	Ing. Jaroslava Koukalová	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Obchodních podmínek. **Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo.** Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitel sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel č. 1 (Oprávněná osoba):	jméno	Ing. Jan Fidler, DiS	datum	podpis
Objednatel č. 2 (Oprávněná osoba):	jméno	Ing. Robert Pecha	datum	podpis
Zhotovitel:	jméno	Ing. Tomáš Juna	datum	podpis

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 10

Název Stavby: Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská - Stará Boleslav
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 122/2
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Účelová komunikace

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
2 601 834,83

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	943 157,50	3 544 992,33	943 157,50

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-19 373,87	0,00	943 157,50	36,25%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-19 373,87	3 525 618,46	923 783,63	35,51%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Datum

Podpis

Zhotovitel (hl. stavbyvedoucí):	Zbyněk Goldberger	souhlasím
Projektant (autorský dozor):	Ing. Pavel Hrdina	souhlasím
Technický dozor investora:	Petr Jiřímský	souhlasím
Zástupce Objednatele č. 1:	Ing. Marek Hanuš, MPA	souhlasím
Zástupce Objednatele č. 2:	Ing. Jaroslava Koukalová	souhlasím
Zaměstnanec KSÚS SK odpovědný za cenové projednání Změny:	Ing. Jaroslava Jurková	souhlasím
Zaměstnanec města Brandýs nad Labem- Stará Boleslav odpovědný za cenové projednání Změny:	Ing. Jaroslava Koukalová	souhlasím

Rozpis položek a cen Změny

Název stavby: Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská - Stará Boleslav								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: SO 122 - Účelová komunikace								2					
Číslo a název rozpočtu: SO 122 - Účelová komunikace								Skupina změn 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
30	917224.	SILNIČNÍ A CHODNIKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	275,500	228,500	-47,000	412,210	113 563,86	-19 373,87		94 189,99	-19 373,87	82,94
		Celkem							- 19 373,87	0,00		- 19 373,87	

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu. Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Zbyněk Goldberger, (hl. stavbyvedoucí)
Podpis:

Za Objednatele: Petr Jiřimský, (TDS/TDI)
Podpis:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby:

Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská - Stará Boleslav, 1617900

1	Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	34 596 205,67
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	46 757 909,90
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	56 577 070,98
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	135,15%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%
40=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, odst. (5), písm. b)	-3,10%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	7 216 731,03
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	20,86%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	10 378 861,70

9=(32A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	26,29%
10=(36A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,77%
10A=32A+36A	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	9 363 781,59
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	17 298 102,84

12=(1)*0,15	Limit	5 189 430,85
13=(39)/(1)	Sledování limitu (15%)	14,29%
14=(ABS(37)+(38))	Hodnota skupiny 5	4 944 973,20

- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -
Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)	Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)	Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)	Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)	Změny de minimis Změny neměnní celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)

SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (žadavat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (žadavat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadavat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadavat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (žadavat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (žadavat se znaménkem minus)	Změny kladné	limit 15 %
16	17	18	19=23+26+29+33	20=24+27+30+34+37+39	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	32=29+30	32A=ABS(29)+30	33	34	36=33+34	36A=ABS(33)+34	37	38	39=ABS(37)+38
		Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská - Stará Boleslav	- 1 073 525,28	13 235 229,51	12 161 704,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1 073 525,28	8 023 053,15	6 949 527,87	9 096 578,43	0,00	267 203,16	267 203,16	267 203,16	0,00	4 944 973,20	4 944 973,20
901.1	1	Úprava DIO dle požadavku UK	- 479 691,79	913 417,17	433 725,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 479 691,79	913 417,17	433 725,38	1 393 108,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
901.1a	2	Provizorní komunikace	0,00	3 187 831,75	3 187 831,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 187 831,75	3 187 831,75	3 187 831,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122a	3	Kanalizace - skutečné podmínky	0,00	529 370,96	529 370,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 370,96	529 370,96	529 370,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	4	Výbudování provizorního chodníku	0,00	267 203,16	267 203,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 203,16	267 203,16	267 203,16	0,00	0,00	0,00
122	5	Dočasné rozšíření stávající komunikace	0,00	943 157,50	943 157,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943 157,50	943 157,50	943 157,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	6	Bourání stávajícího betonového základu podél větve D	0,00	323 143,77	323 143,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 143,77	323 143,77	323 143,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.1	7	Frézování cementové stabilizace	- 574 459,62	1 510 640,00	936 180,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 574 459,62	1 510 640,00	936 180,38	2 085 099,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
901.1	8	Doplnění betonových svodidel Rebloc (T3)	0,00	615 492,00	615 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 492,00	615 492,00	615 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.1	9	Asfalty s obsahem dehtu	0,00	4 944 973,20	4 944 973,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 944 973,20	4 944 973,20
122	10	Oprava množství pol. č. 30	- 19 373,87	0,00	- 19 373,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 19 373,87	0,00	- 19 373,87	19 373,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.


Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	10
Název stavby:	Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská - Stará Boleslav
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Účelová komunikace
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	122/2

Doklad	počet listů
07_Soupis prací SO po změnách	2
08_Situace RDS	1
09_Příčné řezy RDS	1
10_Oznámení Zhotovitele	1
11_Vyjádření TDS	1
12_Vyjádření AD	1
Počet listů celkem	7

Soupis prací SO po všech změnách								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Název stavby: Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská - Stará Boleslav								2					
Číslo a název SO/PS: SO 122 - Účelová komunikace													
Číslo a název rozpočtu: SO 122 - Účelová komunikace								celkem po všech změnách					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změnách	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změnách v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	015111.	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T	2 777,520	2 777,520	0,000	53,950	149 847,20	0,00	0,00	149 847,20	0,00	100,00
2	113763.	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	15,780	15,780	0,000	53,950	851,33	0,00	0,00	851,33	0,00	100,00
3	113765.	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	279,270	279,270	0,000	59,350	16 574,67	0,00	0,00	16 574,67	0,00	100,00
4	12373.	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I	M3	1 388,760	1 609,135	220,375	241,930	335 982,71	0,00	53 315,32	389 298,03	53 315,32	115,87
ZBV 5 Dočasné rozšíření stávající komunikace						220,375							
geod. protokol č. 3/OK/2022 = 840 m2 geod. protokol č. 11/OK/2022 = 41,5 m2 (840+41,5)*0,25=220,375 [A] m3 uložení v pol. č.17120													
5	125734.	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 5KM	M3	282,510	282,510	0,000	141,140	39 873,46	0,00	0,00	39 873,46	0,00	100,00
6	17120.	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	1 388,760	1 609,135	220,375	3,240	4 499,58	0,00	714,02	5 213,60	714,02	115,87
ZBV 5 Dočasné rozšíření stávající komunikace						220,375							
dočasné uložení pro zpětné použití (pol.12373)													
7	17180.a	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	806,158	806,158	0,000	210,850	169 978,41	0,00	0,00	169 978,41	0,00	100,00
8	17180.b	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	165,346	165,346	0,000	333,440	55 132,97	0,00	0,00	55 132,97	0,00	100,00
9	17380.	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	46,774	46,774	0,000	324,370	15 172,08	0,00	0,00	15 172,08	0,00	100,00
10	17481.	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	16,226	16,226	0,000	324,370	5 263,23	0,00	0,00	5 263,23	0,00	100,00
11	17581.	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	8,254	8,254	0,000	324,370	2 677,35	0,00	0,00	2 677,35	0,00	100,00
12	18110.	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	4 030,790	4 912,290	881,500	13,870	55 907,06	0,00	12 226,41	68 133,47	12 226,41	121,87
ZBV 5 Dočasné rozšíření stávající komunikace						881,500							
geod. protokol č. 3/OK/2022 = 840 m2 geod. protokol č. 11/OK/2022 = 41,5 m2 plocha celkem 840+41,5=881,500 [A] m2													
13	18232.	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M	M2	1 883,400	1 883,400	0,000	20,610	38 816,87	0,00	0,00	38 816,87	0,00	100,00
14	18241.	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	1 883,400	1 883,400	0,000	16,190	30 492,25	0,00	0,00	30 492,25	0,00	100,00
15	18247.	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	1 883,400	1 883,400	0,000	4,320	8 136,29	0,00	0,00	8 136,29	0,00	100,00
16	21461.	SEPARAČNÍ GEOTEXILIE	M2	2 015,395	2 015,395	0,000	49,260	99 278,36	0,00	0,00	99 278,36	0,00	100,00
17	27231A.	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C20/25	M3	0,600	0,600	0,000	3 873,920	2 324,35	0,00	0,00	2 324,35	0,00	100,00
18	45131A.	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25	M3	3,053	3,053	0,000	3 323,590	10 146,92	0,00	0,00	10 146,92	0,00	100,00
19	45152.	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	0,393	0,393	0,000	1 057,510	415,60	0,00	0,00	415,60	0,00	100,00
20	465512.	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	0,786	0,786	0,000	5 632,830	4 427,40	0,00	0,00	4 427,40	0,00	100,00
21	56333.	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 150MM	M2	1 926,254	1 926,254	0,000	119,580	230 341,45	0,00	0,00	230 341,45	0,00	100,00
22	56334.	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 200MM	M2	2 159,861	2 159,861	0,000	139,520	301 343,81	0,00	0,00	301 343,81	0,00	100,00
23	56933.	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 150MM	M2	193,695	193,695	0,000	98,540	19 086,71	0,00	0,00	19 086,71	0,00	100,00
24	572123.	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	1 905,683	1 905,683	0,000	13,160	25 078,79	0,00	0,00	25 078,79	0,00	100,00
25	572214.	SPOJOVAČÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	1 859,055	1 859,055	0,000	10,680	19 854,71	0,00	0,00	19 854,71	0,00	100,00
26	574B34.	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	1 839,856	1 839,856	0,000	183,300	337 245,60	0,00	0,00	337 245,60	0,00	100,00
27	574E68.	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 70MM	M2	1 868,655	1 868,655	0,000	246,960	461 483,04	0,00	0,00	461 483,04	0,00	100,00
28	87433.	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM	M	11,590	11,590	0,000	373,360	4 327,24	0,00	0,00	4 327,24	0,00	100,00
29	89712.	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	1,000	1,000	0,000	9 852,060	9 852,06	0,00	0,00	9 852,06	0,00	100,00

30	917224.	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	275,500	228,500	-47,000	412,210	113 563,86	-19 373,87	0,00	94 189,99	-19 373,87	82,94
ZBV 10 Oprava množství pol. č. 30						-47,000							
31	931323.	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRUŘ DO 300MM2	M	15,780	15,780	0,000	43,160	681,06	0,00	0,00	681,06	0,00	100,00
32	931325.	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRUŘ DO 600MM2	M	279,270	279,270	0,000	53,950	15 066,62	0,00	0,00	15 066,62	0,00	100,00
33	935812.	ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 100MM	M2	11,820	11,820	0,000	1 532,300	18 111,79	0,00	0,00	18 111,79	0,00	100,00
Nové položky													
34	12273.N	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBEČNÉ TŘ. I	M3	0,000	352,600	352,600	141,140	0,00	0,00	49 765,96	49 765,96	49 765,96	100,00
ZBV 5 Dočasné rozšíření stávající komunikace						352,600							
odtěžení provizorní komunikace geod. protokol č. 3/OK/2022 = 840 m2 geod. protokol č. 11/OK/2022 = 41,5 m2 plocha celkem 881,5 m2 881,5*0,4=352,600 [A]m3													
35	015130.N	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ - ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU		0,000	881,500	881,500	257,000	0,00	0,00	226 545,50	226 545,50	226 545,50	100,00
ZBV 5 Dočasné rozšíření stávající komunikace						881,500							
likvidace provizor. vozovky geod. protokol č. 3/OK/2022 = 840 m2 geod. protokol č. 11/OK/2022 = 41,5 m2 plocha celkem 881,5 m2 881,5*0,4*2,5=881,500 [A] T													
36	17110.N	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUT	M3	0,000	220,375	220,375	90,640	0,00	0,00	19 974,79	19 974,79	19 974,79	100,00
ZBV 5 Dočasné rozšíření stávající komunikace						220,375							
obnova odtěžené vrstvy zeminy (pol. 12373)													
37	56360.N	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU	M3	0,000	352,600	352,600	1 020,000	0,00	0,00	359 652,00	359 652,00	359 652,00	100,00
ZBV 5 Dočasné rozšíření stávající komunikace						352,600							
geod. protokol č. 3/OK/2022 = 840 m2 geod. protokol č. 11/OK/2022 = 41,5 m2 plocha celkem 881,5 m2 881,5*0,4=352,600 [A]m3													
38	916362.N	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLII TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	0,000	35,000	35,000	217,000	0,00	0,00	7 595,00	7 595,00	7 595,00	100,00
ZBV 5 Dočasné rozšíření stávající komunikace						35,000							
39	916363.N	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLII TŘ 2 - DEMONTÁŽ	KUS	0,000	35,000	35,000	149,000	0,00	0,00	5 215,00	5 215,00	5 215,00	100,00
ZBV 5 Dočasné rozšíření stávající komunikace						35,000							
40	916369.N	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLII TŘ 2 - NÁJEMNÉ	KSDEN	0,000	3 535,000	3 535,000	16,100	0,00	0,00	56 913,50	56 913,50	56 913,50	100,00
ZBV 5 Dočasné rozšíření stávající komunikace						3 535,000							
20.4.2022 - 30.7.2022 (101 dni) 35 ks * 101 dni=3 535,000 [A] ksden													
41	9166C2.N	DOČASNÁ SVODIDLA, ÚROVEŇ ZADRŽENÍ T3 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	M	0,000	60,000	60,000	1 400,000	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	100,00
ZBV 5 Dočasné rozšíření stávající komunikace						60,000							
42	9166C3.N	DOČASNÁ SVODIDLA, ÚROVEŇ ZADRŽENÍ T3 - DEMONTÁŽ	M	0,000	60,000	60,000	714,000	0,00	0,00	42 840,00	42 840,00	42 840,00	100,00
ZBV 5 Dočasné rozšíření stávající komunikace						60,000							
43	9166C9.N	DOČASNÁ SVODIDLA, ÚROVEŇ ZADRŽENÍ T3 - NÁJEMNÉ	MDEN	0,000	1 800,000	1 800,000	9,200	0,00	0,00	16 560,00	16 560,00	16 560,00	100,00
ZBV 5 Dočasné rozšíření stávající komunikace						1 800,000							
60 m*30 dni=1 800,000 [A] mden													
44	916722.N	UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	0,000	35,000	35,000	149,000	0,00	0,00	5 215,00	5 215,00	5 215,00	100,00
ZBV 5 Dočasné rozšíření stávající komunikace						35,000							
45	916723.N	UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - DEMONTÁŽ	KUS	0,000	35,000	35,000	75,000	0,00	0,00	2 625,00	2 625,00	2 625,00	100,00
ZBV 5 Dočasné rozšíření stávající komunikace						35,000							
Celkem								2 601 834,83	- 19 373,87	943 157,50	3 525 618,46	923 783,63	35,51

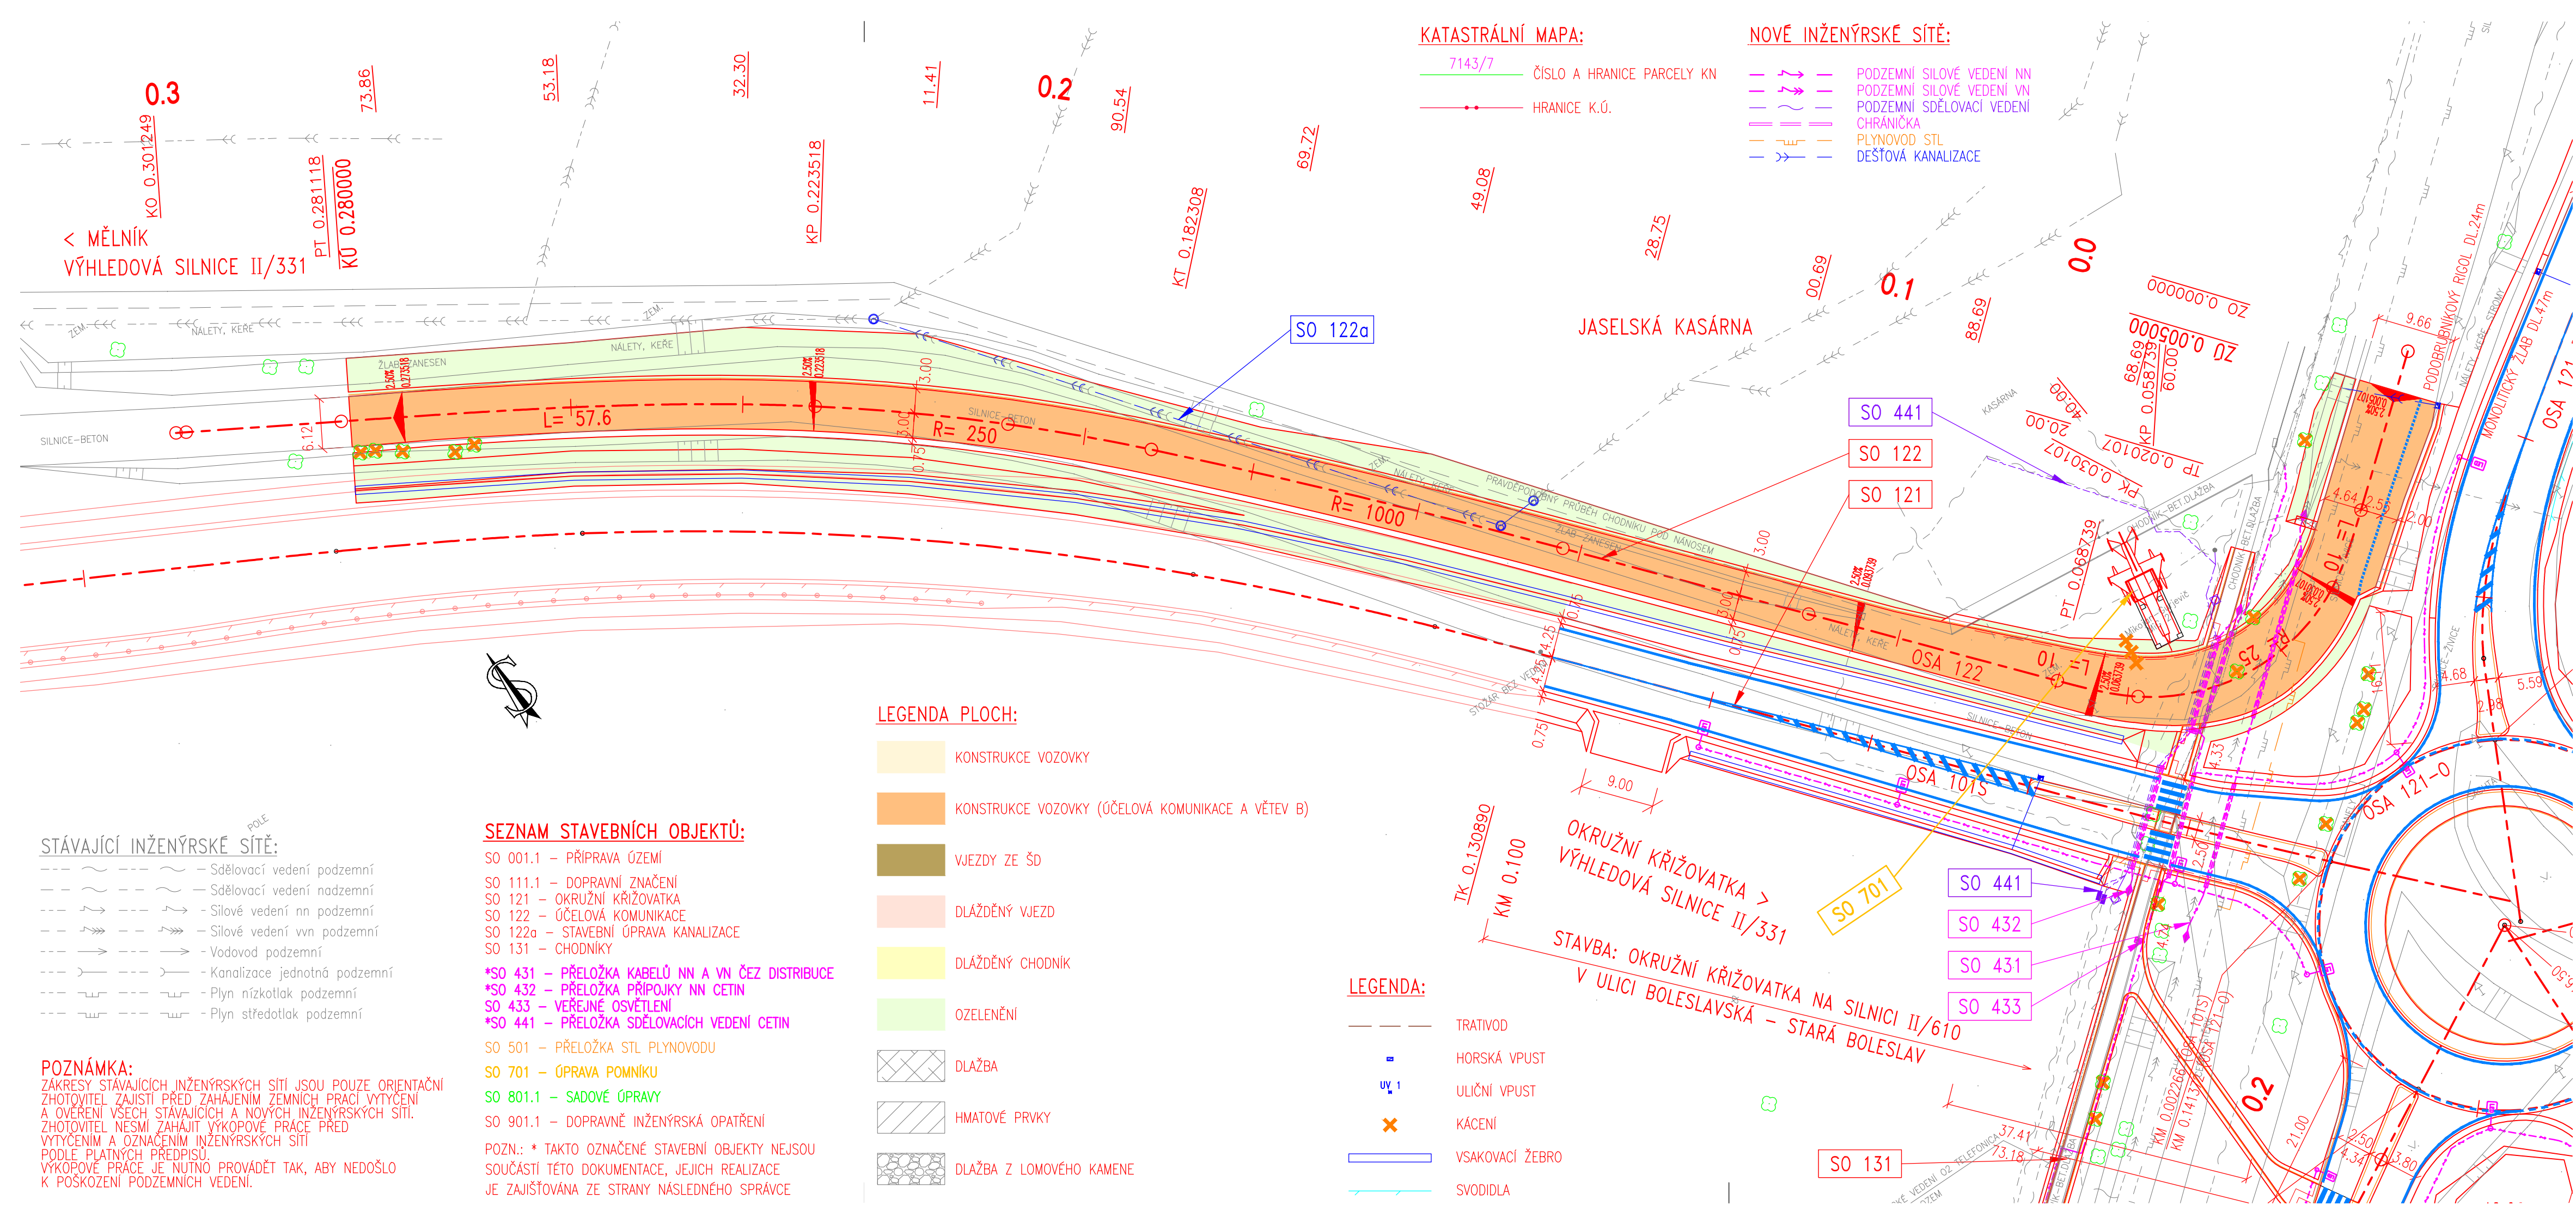

KATASTRÁLNÍ MAPA:

- 7143/7 ČÍSLO A HRANICE PARCELY KN
- HRANICE K.Ú.

NOVÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ:

- PODZEMNÍ SILOVÉ VEDENÍ NN
- PODZEMNÍ SILOVÉ VEDENÍ VN
- PODZEMNÍ SDĚLOVACÍ VEDENÍ
- CHRÁNIČKA
- PLYNOVOD STL
- DEŠŤOVÁ KANALIZACE

LEGENDA PLOCH:

- KONSTRUKCE VOZOVKY
- KONSTRUKCE VOZOVKY (ÚČELOVÁ KOMUNIKACE A VĚTVY B)
- VJEZDY ZE ŠD
- DLÁŽDĚNÝ VJEZD
- DLÁŽDĚNÝ CHODNÍK
- OZELENĚNÍ
- DLAŽBA
- HMATOVÉ PRVKY
- DLAŽBA Z LOMOVÉHO KAMENE

SEZNAM STAVEBNÍCH OBJEKTŮ:

- SO 001.1 – PŘÍPRAVA ÚZEMÍ
 - SO 111.1 – DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
 - SO 121 – OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA
 - SO 122 – ÚČELOVÁ KOMUNIKACE
 - SO 122a – STAVEBNÍ ÚPRAVA KANALIZACE
 - SO 131 – CHODNÍKY
 - *SO 431 – PŘELOŽKA KABELŮ NN A VN ČEZ DISTRIBUCE
 - *SO 432 – PŘELOŽKA PŘÍPOJKY NN CETIN
 - *SO 433 – VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
 - *SO 441 – PŘELOŽKA SDĚLOVACÍCH VEDENÍ CETIN
 - SO 501 – PŘELOŽKA STL PLYNOVODU
 - SO 701 – ÚPRAVA POMNIKU
 - SO 801.1 – SADOVÉ ÚPRAVY
 - SO 901.1 – DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ
- POZN.: * TAKTO OZNAČENÉ STAVEBNÍ OBJEKTY NEJSOU SOUČÁSTÍ TĚTO DOKUMENTACE, JEJICH REALIZACE JE ZAJIŠŤOVÁNA ZE STRANY NÁSLEDNĚHO SPRÁVCE

LEGENDA:

- TRATIVOD
- HORSKÁ VPUST
- ULIČNÍ VPUST
- KÁCENÍ
- VSAKOVACÍ ŽEBRO
- SVODIDLA

STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ:

- Sdělovací vedení podzemní
- Sdělovací vedení nadzemní
- Silové vedení nn podzemní
- Silové vedení vn podzemní
- Vodovod podzemní
- Kanalizace jednotná podzemní
- Plyn nízkotlak podzemní
- Plyn středotlak podzemní

POZNÁMKA:
ZÁKRESY STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JSOU POUZE ORIENTAČNÍ. ZHOTOVITEL ZAJISTÍ PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ VYTÝČENÍ A OVĚŘENÍ VŠECH STÁVAJÍCÍCH A NOVÝCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ. ZHOTOVITEL NESMÍ ZAHÁJIT VÝKOPOVÉ PRÁCE PŘED VYTÝČENÍM A OZNAČENÍM INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ PODLE PLATNÝCH PŘEDPISŮ. VÝKOPOVÉ PRÁCE JE NUTNÓ PROVÁDĚT TAK, ABY NEDOŠLO K POŠKOZENÍ PODZEMNÍCH VEDENÍ.

a			
b			
c			
č	text změny – odůvodnění	datum	podpis

Název stavby: OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA NA SIL. II/610 V UL. BOLESLAVSKÁ - STARÁ BOLESLAV	SO 122
--	---------------

Objednatel: KSÚS Středočeského kraje, p.o. Zborovská 11, 150 21 Praha 5	
--	--

Technický dozor: 	Společnost: IBR Consulting, s r. o. Sokolovská 352/215 190 00 Vysočany – Praha 9	Razítko: Ověřil: Datum: Podpis:
----------------------	---	--


Zhotovitel stavby: 	Společnost: EUROVIA CS, a.s. U Michelského lesa 1581/2 140 00 Praha 4	Razítko: Ověřil: Datum: Podpis:
------------------------	--	--

Autorský dozor: 	PONTEX, spol. s r. o. Bezová 1658 147 14 Praha 4 IČ: 407 63 439, DIČ: CZ40763439	Razítko: Ověřil: Datum:
---------------------	---	-------------------------------

Souřadnicový systém: S–JTSK Výškový systém: Bpv

Číslo zakázky: 16 179 01	HIP: Ing. Václav HONZÍK	
Schválil: Ing. Milan MIMRA	Zodp. projektant: Ing. Martin NEJEDLIK	
Tech. kontrola: Martin TFSI FVÍČ	Vypracoval: Ing. Jakub DVORÁK	

Objednatel: STŘEDOČESKÝ KRAJ	Obec: BRANDÝS NAD LABEM – STARÁ BOLESLAV	Kraj: STŘEDOČESKÝ
Akce: OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA NA SIL. II/610 V UL. BOLESLAVSKÁ – STARÁ BOLESLAV	Datum: 09/2021	Stupeň: RDS
Objekt: SO 122 – ÚČELOVÁ KOMUNIKACE	Souprava	Č. přílohy
Příloha: SITUACE 1:500		2.a



a			
b			
c			
č	text změny – odůvodnění	datum	podpis

Název stavby:
OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA NA SIL. II/610 V UL. BOLESLAVSKÁ - STARÁ BOLESLAV **SO 122**

Objednatel:
KSÚS Středočeského kraje, p.o.
 Zborovská 11, 150 21 Praha 5



Technický dozor:
IBXR
 Společnost:
 IBR Consulting, s r. o.
 Sokolovská 352/215
 190 00 Vysočany – Praha 9

Razítko:
 Ověřil:
 Datum:
 Podpis:

Zhotovitel stavby:
EUROVIA VINCI
 Společnost:
 EUROVIA CS, a.s.
 U Michelského lesa 1581/2
 140 00 Praha 4

Razítko:
 Ověřil:
 Datum:
 Podpis:

Autorský dozor:
PONTEX S.R.O.
 PONTEx spol. s r. o.
 Bezová 1658
 147 14 Praha 4
 IČ: 407 63 439, DIČ: CZ40763439

Razítko:
 Ověřil:
 Datum:
 Podpis:

Souřadnicový systém: S-JTSK Výškový systém: Bpv
 Číslo zakázky: **16 179 01** HIP: Ing. **Václav HONZÍK**
 Schválil: Ing. **Milan MIMRA** Zodp. projektant: Ing. **Martin NEUDERT**



Tech. kontrola: **Martín TESLVIČ** Vypracoval: Ing. **Jakub DVORÁK**
 Objednatel: **STŘEDOČESKÝ KRAJ** Obec: **BRANĚNÝ NAD LABEM – STARÁ BOLESLAV** Kraj: **STŘEDOČESKÝ**
 Akce: **OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA NA SIL. II/610 V UL. BOLESLAVSKÁ - STARÁ BOLESLAV** Datum: **09/2021** Stupeň: **RDS**
 Objekt: **SO 122 – OČELOVÁ KOMUNIKACE** Souprava: **C. přílohy**
 Příloha: **CHARAKTERISTICKÉ PŘÍČNÉ ŘEZY 1:100** **2.d**

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

K rukám Ing. Jan Lichneger, ředitel
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5 – Smíchov

Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

K rukám Ing. Vlastimil Píček, starosta
Masarykovo nám. 1/6,
25001 Brandýs nad Labem- Stará Boleslav

V Praze dne 15.8.2022

Dopis č. 1030818ZGO/35_22

Stavba: Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská – Stará Boleslav
Věc: Oznámení události a žádost o pokyn ke změně díla

Vážený pane řediteli, Vážený pane starosto,
jako Zhotovitel stavby „Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská – Stará Boleslav“ na základě smlouvy o dílo ze dne 22.10.2021 (dále „**Smlouva o dílo**“), Vám tímto jako Objednateli oznamujeme, že v rámci výstavby byl zjištěn nesoulad mezi PDPS a RDS. Konkrétně se jedná o nesoulad mezi soupisem prací a výkresovou částí u SO 122, pol. č. 30 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM. Dochází ke snížení množství o 72m.

Z tohoto důvodu Vás žádáme, v souladu se Směrnicí ředitele Objednatele ke změnám staveb (dále jen „**Směrnice**“), **o udělení pokynu ke změně předmětu díla spočívající ve snížení množství realizovaných prací.** Předmětná změna bude následně realizována formou Změnového listu. Na obsahu samotné změny jsme samozřejmě připraveni aktivně spolupracovat.

Uvedená změna nebude mít vliv na dobu provádění díla.

S pozdravem

.....
Ing. Tomáš Cvach
Eurovia CS, a.s.
PON závodu Praha východ

Adresát:

KSÚS
Bc. Marek Hanuš, MPA
Zborovská 11
150 21 Praha 5

V Liberci dne 29. listopadu 2022

Věc: Vyjádření TDS k ZBV 10

Dobrý den, pane Hanuši,

na stavbě „**Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská – Stará Boleslav**“ zhotovitel stavby, společnost EUROVIA CS, a.s., předkládá navrhovanou změnu č. 10 spočívající v dopočítání množství silničních a chodníkových obrub.

V průběhu zpracování RDS byl zjištěn nesoulad mezi soupisem prací a výkresovou částí a dochází ke snížení počtu obrubníků na SO 122 (Účelová komunikace).

Za TDS doporučuji zpracovat změnu.

.....
Petr Jiřímský
TDS

Středočeský kraj

v zastoupení

**Krajské správy a údržby silnic
Středočeského kraje, p. o.
Ing. Aleš Čermák Ph.D. MBA
Zborovská 11
Praha, 150 00**

Čj: PX 2022
V Praze: 2. prosince 2022
Vyřizuje: Ing. Petr Kunc

tel.:
e-m z

Akce: Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská – Stará Boleslav
Věc: Vyjádření AD č. 8

Vážený pane řediteli,

dne 22. 11. 2022 AD obdržel návrh ZBV č. 10, který řeší změnu množství obrubníků na SO 122.

V rámci PDPS byly na SO 122 navrženy betonové obrubníky ve třech lokalitách: vlevo podél podobrubníkového žlabu, vlevo v místě napojení chodníku a vpravo podél hrany vozovky.

V rámci stavby byl obrubník vpravo podél vozovky zkrácen o 47m před konec úpravy po dohodě s AD, neboť tento obrubník již není nutné osazovat.

AD sděluje, že návrh ZBV č. 10 je akceptovatelný.

S pozdravem za Pontex spol. s r.o.
Ing. Pavel Hrdina
