

Krycí list ZBV

Název Stavby dle SoD: Okružní křižovatky Nymburk - II/503 x II/330 a II/503 x II/331 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Dopravní značení	Číslo SO/PS / / pořadí Změny SO/PS: 190/1	Číslo ZBV: 9
---	--	------------------------

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov IČ: 00066001 DIČ: CZ00066001 a Město Nymburk Náměstí Přemyslovců 163, 288 28 Nymburk IČ: 00239500 DIČ: CZ00239500
--

Zhotovitel: Sdružení ČNES-BES, OK Nymburk Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno IČ: 477 81 734 vedoucí účastník ČNES dopravní stavby, a.s.	účastník 2 BES s.r.o. Sukova 625, 256 01 Benešov u Prahy IČ: 437 92 553
Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno IČ: 477 81 734	

Rekapitulace ZBV č. 9 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
9.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
9.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
9.3	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
9.4	-236 260,00	115 634,28	-120 625,72

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
9.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
9	-236 260,00	115 634,28	-120 625,72

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

Změnový list

Název Stavby dle SoD: Okružní křižovatky Nymburk - II/503 x II/330 a II/503 x II/331 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Dopravní značení	Číslo SO/PS / / pořadí Změny SO/PS: 190/1	Číslo ZBV: 9.4
---	---	-----------------------

Strany smlouvy o dílo č. S - 2000/00066001/2021 na realizaci uvedené stavby uzavřené dne 10.08.2021 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov

Město Nymburk, Náměstí Přemyslovců 163, 288 28 Nymburk

Zhotovitel: "Sdružení ČNES-BES, OK Nymburk" vedoucí účastník ČNES dopravní stavby a.s., Milady Horákové 2764,

272 01 Kladno-Kročehlavý společník BES s.r.o., Sukova 625, 256 01 Benešov u Prahy

Přílohy Změnového listu: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 30%;">1. Krycí list</td><td style="width: 10%; text-align: center;">1</td><td style="width: 10%;">počet listů</td></tr> <tr><td>2. Změnový list</td><td style="text-align: center;">1</td><td>počet listů</td></tr> <tr><td>3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací</td><td style="text-align: center;">1</td><td>počet listů</td></tr> <tr><td>4. Rozpis ocenění Změn položek</td><td style="text-align: center;">1</td><td>počet listů</td></tr> <tr><td>5. Přehled zařazení změn do Skupin</td><td style="text-align: center;">1</td><td>počet listů</td></tr> <tr><td>6. Přehled dokladů</td><td style="text-align: center;">1</td><td>počet listů</td></tr> <tr><td>7. Soupis prací SO po všech změnách</td><td style="text-align: center;">2</td><td>počet listů</td></tr> <tr><td>Další doklady dle přehledu dokladů</td><td style="text-align: center;">20</td><td>počet listů</td></tr> </table>	1. Krycí list	1	počet listů	2. Změnový list	1	počet listů	3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů	4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů	5. Přehled zařazení změn do Skupin	1	počet listů	6. Přehled dokladů	1	počet listů	7. Soupis prací SO po všech změnách	2	počet listů	Další doklady dle přehledu dokladů	20	počet listů	Příjemce Objednatel Zhotovitel Projektant Stavební dozor Supervize
1. Krycí list	1	počet listů																							
2. Změnový list	1	počet listů																							
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů																							
4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů																							
5. Přehled zařazení změn do Skupin	1	počet listů																							
6. Přehled dokladů	1	počet listů																							
7. Soupis prací SO po všech změnách	2	počet listů																							
Další doklady dle přehledu dokladů	20	počet listů																							

Iniciátor Změny: Objednatel

Předmět Změny:

Na základě požadavku PČR (viz doklad 08), dochází k úpravě projektu SDZ, v rámci kterého bylo nezbytné upravit množství dopravního značení.

Jedná se o Změnu nepodstatnou, která je podle § 5, odst. (1), písm. d), resp. podle § 11 Směrnice R-Sm-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29. 05. 2017, dále jen "Směrnice KSÚS") upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 4 jako Změna nezbytná k dokončení.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. (5) se jedná o změnu nezbytnou u níž není změna v osobě dodavatele možná z ekonomických anebo technických důvodů, kdy změna v osobě dodavatele by způsobila zadavateli značné obtíže (narušení postupů výstavby, nedodržení technických a technologických postupů, nebo rozdělení odpovědnosti za vady) nebo výrazné zvýšení nákladů a hodnota těchto dodatečných stavebních prací nepřekračuje 50 % původní hodnoty závazku.

Předmětná Změna byla posouzena v souladu s § 16, odst. (1) Směrnice R-Sm-36. Vzhledem ke skutečnosti, že předmětná Změna splňuje podmínky § 222, odst. (5) Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a splňuje tak náležitosti pro Změny nezbytné k dokončení podle § 11 Směrnice KSÚS a limity stanovené v § 13 Směrnice KSÚS, byla pro tuto Změnu určena Skupina 4 – Změny nezbytné k dokončení.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-236 260,00	115 634,28	-120 625,72	351 894,28

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí)	jméno	Pavel Stejskal	datum	podpis
Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Lukáš Ježek	datum	podpis
Stavební dozor	jméno	Dis. Daniel Balla	datum	podpis
Supervize (Regionální dotační kancelář)	jméno		datum	podpis
Zástupce Objednatel:	jméno	Ing. Tomáš Mach, Ph.D.	datum	podpis
Zástupce Objednatel:	jméno	Bc. Marek Hanuš, MPA	datum	podpis
<p>Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitel sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.</p>				
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel)	jméno	Ing. Jan Fidler, DiS	datum	podpis

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 9**

Název Stavby: Okružní křižovatky Nymburk - II/503 x II/330 a II/503 x II/331
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 190/1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Dopravní značení

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
570 385,90

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	570 385,90	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-236 260,00	115 634,28	115 634,28	20,27%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-236 260,00	449 760,18	-120 625,72	-21,15%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): souhlasím Pavel Stejskal

Projektant (autorský dozor): souhlasím Ing. Lukáš Ježek

Stavební dozor: souhlasím Dis. Daniel Balla

Zástupce Objednatele: souhlasím Ing. Tomáš Mach, Ph.D.

Zástupce Objednatele: souhlasím Bc. Marek Hanuš, MPA

Supervize (RDK):

Zaměstnanec KSÚS SK
odpovědný za cenové
projednání Změny: souhlasím Ing. Jaroslava Jurková

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 9.4

Název stavby dle SoD: Okružní křižovatky Nymburk - II/503 x II/330 a II/503 a II/331 Číslo a název SO/PS: 190 Dopravní značení Číslo a název rozpočtu: 190 Dopravní značení								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) č. 1 Skupina Změn: 4					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
9		Ostatní konstrukce a práce						316 481,72	-236 260,00	115 634,28	195 856,00	-120 625,72	-38,11%
2	914131	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	12,000	31,000	19,000	2 680,00	32 160,00	0,00	50 920,00	83 080,00	50 920,00	158,33%
4	914431	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	1,000	4,000	3,000	8 340,00	8 340,00	0,00	25 020,00	33 360,00	25 020,00	300,00%
6	914521	DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ OCEL LAMELY FÓLIE TŘ 2 - DOD A MONT	M2	26,000	0,000	-26,000	6 410,00	166 660,00	-166 660,00	0,00	0,00	-166 660,00	-100,00%
7	914921	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	11,000	14,000	3,000	1 610,00	17 710,00	0,00	4 830,00	22 540,00	4 830,00	27,27%
9	914981	SLOUPKY A STOJKY DZ Z PŘÍHRAD KONSTR DOD A MONTÁŽ	KUS	3,000	0,000	-3,000	23 200,00	69 600,00	-69 600,00	0,00	0,00	-69 600,00	-100,00%
10	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	186,540	482,000	295,460	118,00	22 011,72	0,00	34 864,28	56 876,00	34 864,28	158,39%
Celkem									- 236 260,00	115 634,28		- 120 625,72	

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu. Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Pavel Stejskal, stavbyvedoucí

Za Objednatele: Bc. Marek Hanuš, MPA,

Za Objednatele: Ing. Tomáš Mach, Ph.D., starosta

Podpis:

Podpis:

Podpis:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby:

Okružní křižovatky Nymburk - II/503 x II/330 a II/503 x II/331

1	Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	21 868 773,84
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	23 876 802,68
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	28 890 931,24
3=(2/1)*100	Procento změny Přijáté smluvní částky	109,18%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,17%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%
40=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, odst. (5), písm. b)	-9,60%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	1 971 091,72
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	9,01%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	6 560 632,15

9=(32A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	-4,62%
10=(36A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	1,60%
10A=32A+36A	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	-660 406,34
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	10 934 386,92

12=(37/1)*100	Sledování limitu 15 %	3 280 316,08
13=37	Sledování limitu 140 448 000 Kč	0,00
14=140448000-37		140 448 000,00

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN																						
		- 1 -					- 2 -					- 3 -				- 4 -				- 5 -		
		Vyhrazená změna (Doměrky)					Záměna položek (Započítávání)					Nepředvídanost				Nezbytnost				Změny de minimis		
SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (žadavat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (žadavat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadavat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadavat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (žadavat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (žadavat se znaménkem minus)	Změny kladné	limit 15 %
16	17	18	19=23+26+29+33	20=24+27+30+34+37+39	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	32=29+30	32A=ABS(29)+30	33	34	36=33+34	36A=ABS(33)+34	37	38	39=ABS(37)+38
		Okružní křižovatky Nymburk - II/503 x II/330 a II/503 x II/331	- 2 099 283,03	4 107 311,87	2 008 028,84	- 77 331,78	114 268,90	36 937,12	0,00	0,00	0,00	- 1 303 964,42	293 558,08	- 1 010 406,34	- 1 010 406,34	- 717 986,83	3 699 484,89	2 981 498,06	350 000,00	0,00	0,00	0,00
000	1	Všeobecné a předběžné položky/doplnění zaměření pro DSPS	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
101	2	Okružní křižovatka Zbožská/nepřesnosti v množství prováděných prací stanoveném v zadávací dokumentaci	- 347 108,31	15 680,00	- 331 428,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 347 108,31	15 680,00	- 331 428,31	- 331 428,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	3	Okružní křižovatka Velké Váhy / Výměna nekvalitních asfaltů stmelových vrstev vozovky a dlažďových povrchů	- 363 967,83	138 976,56	- 224 991,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 363 967,83	138 976,56	- 224 991,27	502 944,39	0,00	0,00	0,00
103	4	Úprava ulice Boleslavská / Opravné práce a rozšíření úprav konstrukčních vrstev a narovnání položek na skutečně provedené množství	- 117 759,00	2 817 043,07	2 699 284,07	0,00	44 970,90	44 970,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 117 759,00	2 772 072,17	2 654 313,17	2 654 313,17	0,00	0,00	0,00
104	5	Úprava ulice Zbožská/nepřesnosti v množství prováděných prací stanoveném v zadávací dokumentaci	- 77 331,78	69 298,00	- 8 033,78	- 77 331,78	69 298,00	- 8 033,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	6	Úprava ulice Velké Váhy/ Oprava asfaltového souvrství, části přídlažby a rektifikace inženýrských sítí	0,00	322 801,88	322 801,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 801,88	322 801,88	322 801,88	0,00	0,00	0,00
106	7	Chodníky/nepřesnosti v množství prováděných prací stanoveném v zadávací dokumentaci	- 55 290,53	277 878,08	222 587,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 55 290,53	277 878,08	222 587,55	222 587,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	8	Předláždění chodníků/nepřesnosti v množství prováděných prací stanoveném v zadávací dokumentaci	- 901 565,58	0,00	- 901 565,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 901 565,58	0,00	- 901 565,58	- 901 565,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	9	Dopravní značení/ Úprava projektu SDZ	- 236 260,00	115 634,28	- 120 625,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 236 260,00	115 634,28	- 120 625,72	- 120 625,72	0,00	0,00	0,00

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	9
Název stavby:	Okružní křižovatky Nymburk - II/503 x II/330 a II/503 x II/331
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Dopravní značení
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	190/1

Doklad	počet listů
07 Soupis prací SO po změnách	2
08 Stanovení místní úpravy provozu okružních křižovatek - stanovisko DI PČR Nymburk	2
09 Zápis z KD ze dne 15.10.2022	6
10 Stanovisko autorského dozoru	2
11 Vyjádření TDS	2
12 Oznámení zhotovitele	3
13 Souhlas se zpracováním ZBV_KSÚS	1
14 Souhlas se zpracováním ZBV_Město Nymburk	1
15 Fotodokumentace	1

Soupis prací SO po všech změnách

Název stavby: Okružní křižovatky Nymburk - II/503 x II/330 a II/503 a II/331
 Číslo a název SO/PS: 190 Dopravní značení
 Číslo a název rozpočtu: 190 Dopravní značení

**ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
190/1**

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změnách	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změnách v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0		Všeobecné konstrukce a práce						12,25	0,00	0,00	12,25	0,00	0,00%
1	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU - dopravní značky - ocel	T	0,245	0,245	0,000	50,00	12,25	0,00	0,00	12,25	0,00	0,00%
9		Ostatní konstrukce a práce						570 373,64	-236 260,00	115 634,28	449 747,92	-120 625,72	-21,15%
2	914131	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	12,000	31,000	19,000	2 680,00	32 160,00	0,00	50 920,00	83 080,00	50 920,00	158,33%
		ZBV č.9											
		<i>Osazeno 31 ks nových značek podle konečného trvalého dopravního značení schváleného Policií ČR</i>			31,000								
		Součet			31,000								
3	914133	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DEMONTÁŽ	KUS	0,000	0,000	0,000	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4	914431	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	1,000	4,000	3,000	8 340,00	8 340,00	0,00	25 020,00	33 360,00	25 020,00	300,00%
		ZBV č.9											
		<i>Velkoplošné značky osazeny v námi dokončeném díle - 4 ks</i>			3,000								
		Součet			4,000								
5	914433	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DEMONTÁŽ	KUS	0,000	0,000	0,000	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	914521	DOPRAVNÍ ZNAČKY VELKOPLOŠ OCELOVÉ LAMELY FÓLIE TR 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M2	26,000	0,000	-26,000	6 410,00	166 680,00	-166 680,00	0,00	0,00	-166 680,00	-100,00%
		ZBV č.9											
		<i>Lamelové značky nebudou na základě aktualizace DZ provedeny; - 26,00 ks</i>			-26,000								
		Součet			0,000								
7	914921	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCELI TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	11,000	14,000	3,000	1 610,00	17 710,00	0,00	4 830,00	22 540,00	4 830,00	27,27%
		ZBV č.9											
		<i>Zbývá osazení 14 ks trubek, zbylé značky jdou na lampy VO; 3</i>			3,000								
		Součet			14,000								
8	914923	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCELI TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ	KUS	10,000	10,000	0,000	183,00	1 830,00	0,00	0,00	1 830,00	0,00	0,00%
9	914981	SLOUPKY A STOJKY DZ Z PŘÍHRAD KONSTR DOD A MONTÁŽ	KUS	3,000	0,000	-3,000	23 200,00	69 600,00	-69 600,00	0,00	0,00	-69 600,00	-100,00%
		ZBV č.9											
		<i>Odpočet k pol.č. 914521</i>			-3,000								
		Součet			0,000								
10	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	186,540	482,000	295,460	118,00	22 011,72	0,00	34 864,28	56 876,00	34 864,28	158,39%
		ZBV č.9											
		<i>VDZ v barvě před zimním obdobím obnoveno na celé stavbě, z důvodu opatření VDZ v barvě provozem, VDZ v plastu bude provedeno až po úplném dokončení celého díla.</i>			482,000								
		Součet			482,000								
11	915211	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	335,201	335,201	0,000	389,00	130 393,19	0,00	0,00	130 393,19	0,00	0,00%

12	915221	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	333,339	333,339	0,000	365,00	121 668,74	0,00	0,00	121 668,74	0,00	0,00%
Celkem								570 385,89	- 236 260,00	115 634,28	449 760,17	- 120 625,72	-21,15%

Dopravní inspektorát PČR Nymburk na základě předložené žádosti a návrhu místní úpravy provozu na pozemních komunikacích Vám po prostudování a provedeném místním šetření vydává následující stanovisko.

Předložený návrh dopravního značení spočívá v osazení svislého dopravního značení a vyznačení vodorovného dopravního značení v rámci výstavby okružních křižovatek v obci Nymburk na křížení silnic č. II/330, č. II/331 a č. II/503.

Dopravní inspektorát PČR Nymburk jako dotčený orgán podle § 77 odst. 2) písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů

S O U H L A S Í

s realizací předloženého návrhu dopravního značení.


Dopravní značení musí být rozměrem a barevným provedením v souladu s vyhl. č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích.


Svislé dopravní značení bude provedeno podle zásad pro dopravní značení na pozemních komunikacích - TP 65.

Vodorovné dopravní značení bude provedeno dle TP 133 - Zásad pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích.

Zpracoval: nrap. Jiří Kopřiva, tel.: 974 878 253

npor. Ing. Jiří Ulrich, DiS
vedoucí DI Nymburk

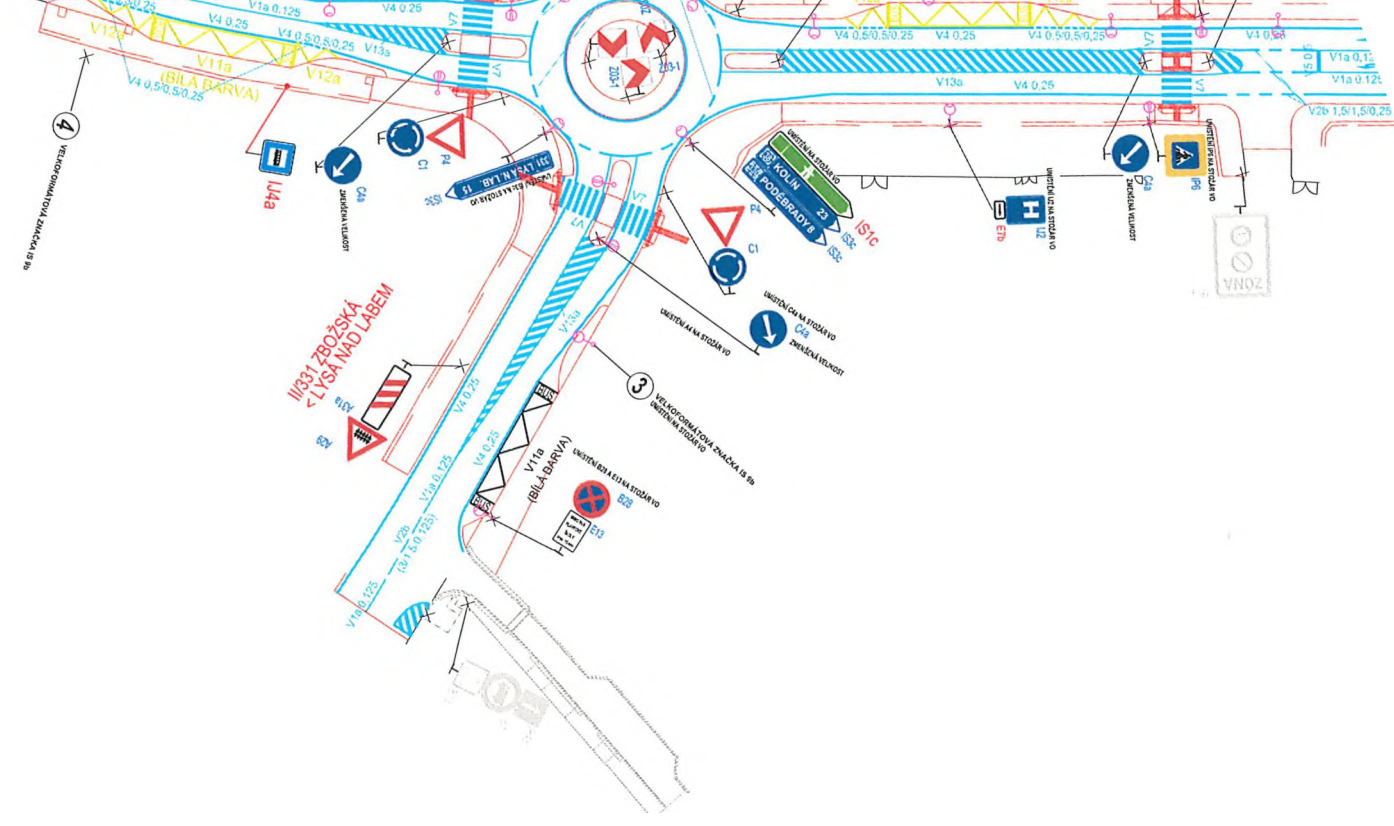


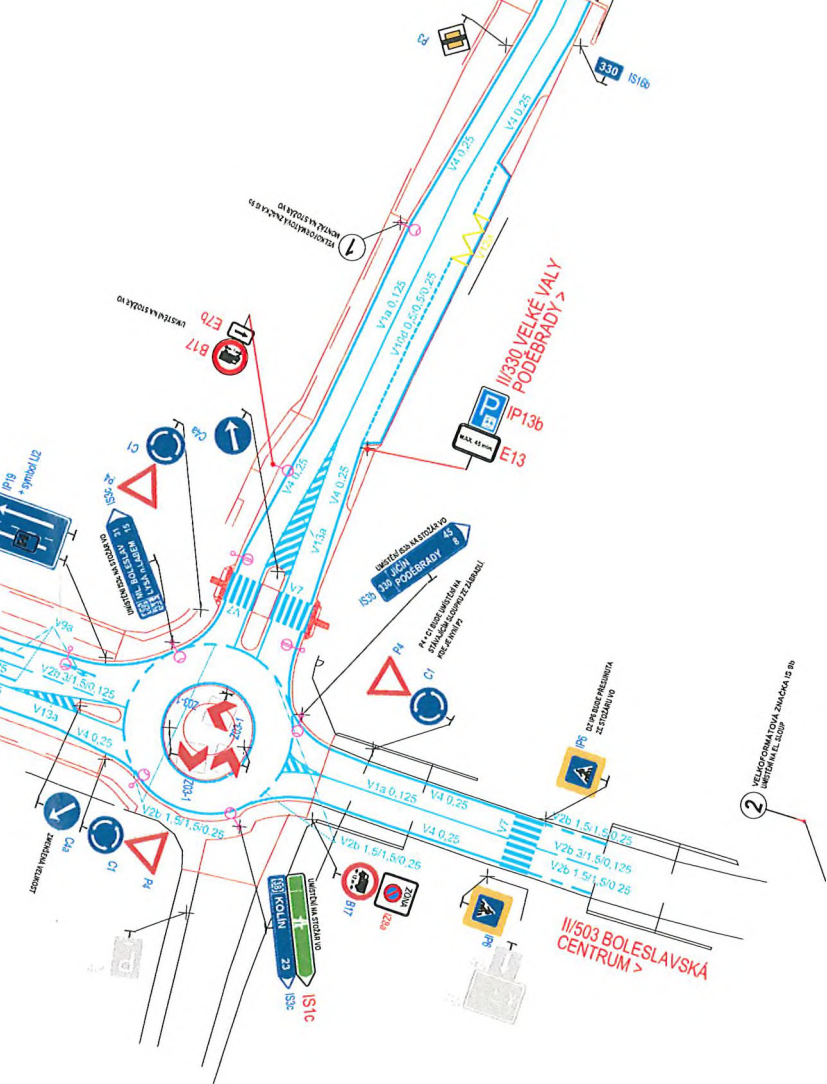

3





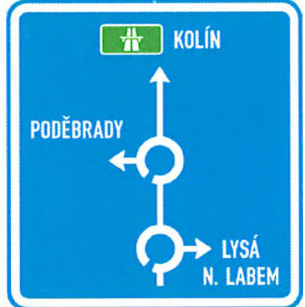

4



POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
 KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE
 STŘEDOČESKÉHO KRAJE
 JOPRAVNÍ INSPEKTORÁT NYMBURK
 Dne: 10.11.2021
 k RPS-2021-1 IČJ-2021-010806-
 E semného vyjádření NEPLATNÉ!!

VÝKRES ZTOTOŽŇUJE NOVÝ STAV DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ
 UMÍSTĚNÍ A PROVEDENÍ DZ BUDE V SOULADU S TP65 A TP133

Poznámky:

-  Stávající značení (šedá)
-  Stávající značení bude odstraněno
-  Nové značení
-  Vodorovné značení

Souřadn. n. JTSK Výškový systém Bpv

FanIT s.r.o., Kublov 210, 267 41 Kublov tel. 605 127 051, e-mail. info@fanit.cz		
Hlavní inženýr projektu:	odpovědný projektant:	vypracoval:
Ing. Tomáš Kapal	Ing. Ondřej Svoboda	Ing. Ondřej Svoboda
Místo stavby:	Město Nymburk	
Katastr:	K.Ú. Nymburk (70B232)	
Stavebník:	STŘEDOČESKÝ KRAJ, ZBOROVSKÁ 11, 150 21, PRAHA 5	

Akce:	OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKY NYMBURK II/503 X II/330 A II/503 X II/331	Stupeň: DSPS Datum: LISTOPAD 2021 Měřítko: 1:500 Formát: BXA4 Číslo paré:
Část:	B. Stavební část - SO190 - Dopravní značení	
Příloha:	SO190 - SITUACE DZ	Číslo přílohy: 2

Evidenční číslo:

Zápis z kontrolního dne stavby

Okružní křižovatky Nymburk, II/503xII/330 a II/503xII/331

Kontrolní den

Číslo **48/6** Konaný dne **15.10.2021** **Nymburk**

Účastníci Seznam účastníků je uveden v příloze č. 1 – F.4.1 Prezenční listina

Kontrola úkolů z 8. kontrolního dne

Úkol číslo	Název	Skutečný stav splnění úkolu	Splněno [A/N] / Odpovídá Z,T,O	Termín Kontrola
4.1	HMG	Předložen - termín dokončení díla je do 30.10.2021 Zprovoznění předpoklad 23.10.21 13 h		
	Plán prací	Týdenní předkládat vždy ve čtvrtek do 14 h	Z	
5.1	DIO	Předat TDI Úprava rozhodnutí	Z	
5.2		Zhotovitel tímto urguje stanovisko objednatele k zaslanému dopisu ze dne 3.září 2021 a z 15.září 2021.	O	Příští KD
		Zhotovitel žádá Objednatele o zajištění koordinace napojení stavby ulice Zbožská na stavbu Úpravy veřejného prostranství před objektem PČR. Zhotovitel požaduje zajištění připravenosti pro provádění podkladních a vozovkových vrstev spočívající zejména v osazených obrubách do 11.10.2021 Prověřit zástupce města Provedeno obruby položeno stavba bez omezení	O, NB	5.10.21
		Zhotovitel navrhuje že uvede stavbu do provozu 23.10.2021. Žádá o upřesnění legalizace zpuštění provozu. Předpoklad je uvedení stavby do předčasného užívání. TDI žádá seznam dokladů, které bude mít Zhotovitel pro uvedení do provozu. Zhotovitel předloží návrh dohody o předčasném užívání Stavba bude uvedena do provozu v režimu Průjezd stavbou viz vyjádření MěÚ Nymburk ze 14.10.21 viz příloha zápisu z KD	Z	7.10.21
		Zhotovitel provede před uvedením do provozu oprava havarijního stavu ul. vpusti na SO 102 předpoklad 17.10.2021.Oznámení zajistí Zhotovitel. Bude formou částečné uzavírky. Platí	Z	17.10.21

Zpráva zhotovitele o průběhu stavebních prací

- plnění věcného harmonogramu
KD 47/5
Práce probíhají v souladu s předloženým HMG
Předpoklad provedení opravy stávající části díla dokončených předchozím zhotovitelem. Etapy je březen-duben, před uzavírkou mostu ev. 503-001
Upřesněno bude provedeno v březnu 2022, část Ulice V Kolonii 11/21
- popis provedených prací za období
1. Objekty řady 100
SO 101 Okružní křižovatka Zbožská.

ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE STAVBY	
DOKUMENTACE STAVBY	
OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKY NYMBURK, II/503xII/330 A II/503xII/331	STRANA: 1/4

Dokončeny obruby, přídlažby, provedena pokládka SC, probíhá pokládka ACP

SO 102 Okružní křižovatka Velké Valy

Bez činnosti

SO 103 Úprava ulice Boletická

Dokončeny obruby, přídlažby, provedena pokládka SC, probíhá pokládka

SO 104 Úprava ulice Zbožská

Dokončeny obruby, přídlažby, provedena pokládka SC, probíhá pokládka

SO 106 Chodníky

Pokládka zámkové dlažby

SO 107 Předláždění chodníků

Pokládka zámkové dlažby, teréni úpravy

SO 180 Dopravní značení

Kontrola značení objízdných tras, příprava

SO 190 Dopravní značení trvalé

Příprava a osazení patek DZ

2. Objekty řady 400

SO 401 Veřejné osvětlení

Dokončeno

SO 413 Přeložka a ochrana TKK+DK SŽDC

dokončeno

3. Objekty řady 800

SO 801 Vegetační úpravy

V uvedeném období práce na objektech řady 800 neprobíhaly.

3. finanční plnění

Za období srpen 2021 fakturace ve výši 3 587 795,27 Kč

Za období září 2021 fakturace ve výši 2 553 431,85 Kč

Celková nabídková cena díla 21 868 773,84 Kč bez DPH

Cena díla KSÚS 20 840 493,41 Kč bez DPH

Cena díla Nymburk 1 028 280,43 Kč bez DPH

Pokyny Objednatele nebo návrhy Zhotovitele s dopadem do ceny díla

ZBV

ZBV ulice Boleslavská x B. Smetany

Objednatel uděluje Zhotoviteli pokyn na zpracování ZBV ul Bedřich Smetany

Zhotovitel předloží návrhy na změny formou ZBV na ostatních stavebních objektech

4. předávání RDS

RDS předloženy elektronicky

SO 101 Okružní křižovatka Zbožská.

SO 102 Okružní křižovatka Velké Valy

SO 103 Úprava ulice Boletická

SO 104 Úprava ulice Zbožská

SO 106 Chodníky

SO 190 Dopravní značení

SO 401 Veřejné osvětlení

SO 413 Přeložka a ochrana TKK+DK SŽDC

SO 801 Vegetační úpravy

SO 107 Předláždění chodníků

RDS odsouhlasena Zhotovitel vydá tištěná paré dle smlouvy

5. fotodokumentace

Zhotovitel předá na konci stavby

Kontrola kvality

1. Technologické předpisy a KZP
Zhotovitel Předloží všechny TePř k odsouhlasení TDI před zahájením prací
2. Podzhotovitelé
Zhotovitel předá přehled podzhotovitelů
3. Laboratorní deník
Zhotovitel zašle laboratorní deník
4. Laboratoř zhotovitele je ALGEO
Zhotovitel předá doklady prokazující způsobilost laboratoře

Stav BOZP a PO za minulé období

bez záznamů o úrazu

Zabezpečení staveniště-závad

Používání OPP a dodržování BOZP bez-závad

Rizika zhotovitele předána

Rizika, nároky, oznámení

1 Oznámení Zhotovitele ze dne 27.8.2021

SO 102 oprava uličních vpustí

Ulice Bedřicha Smetany – výměna konstrukčních vrstev vozovky

Objednatel uděluje Zhotoviteli pokyn na zpracování ZBV ul Bedřich Smetany.

2 Oznámení Zhotovitele ze dne 14.9.2021

Vyjasněná rozsahu oprav OK SO 101 a přilehlých ulic, provedení autobusové zastávky v opačném směru

3 Oznámení formou emailu

Různé

Opravy objízdných tras

Plán dokončení opravy objízdných tras je do 30.11.2021.

Zástupce města Nymburk se Zhotovitelem provede místní šetření pro určení rozsahu a způsobu oprav 4.10.2021

Část ulice v Kolonii v 11/2021 v roce 2022 ulice Tyršova po dokončení investice města Nymburk dle nabídky Zhotovitele ze dne

Zhotovitel po dohodě Smluvních stran předloží návrh Dodatku na termín:

Zprovoznění OK do konce října 2021

Oprava objízdny trasy ulice V Kolonii do 30.11.2021

Oprava vymezené části díla zhotovené předchozím zhotovitelem do konce března 2022

Oprava objízdny trasy ulice Tyršova do dvou měsíců po dokončení plánované investice města rekonstrukce chodníků.

Zhotovitel uvede stavbu do provozu 23.10.2021 ve 13h v režimu Průjezdu stavbou, dílo nelze zkolaudovat do dokončení rekonstrukce veřejného prostranství před budovou PČR (investice města Nymburk).

Trvalé DZ bude osazeno dle stanoviska PČR a na základě požadavku PČR bude umístěno dočasné DZ zohledňující chybějící chodník u budovy PČR.

Z důvodu požadavku města Nymburk na provedení zeleně v OK, Zhotovitel nebude provádět a zohlední neprovedené práce ve fakturaci.

Závěry kontrolního dne

	ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE STAVBY	
	DOKUMENTACE STAVBY	
	OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKY NYMBURK, II/503xII/330 A II/503xII/331	STRANA: 3/4

Datum konání příštího KD Příští KD se uskuteční v pátek **22.10.2021 v 9:00 na stavbě**

Přílohy

Číslo	Název
1	Prezenční listina

Zapsal

Daniel Balla

TDI

Podpis

Rozdělovník

Vyhotoveno ve 2 výtiscích.

Výtisk číslo	Adresát	Datum	Podpis
1	Zhotovitel		
2	TDI		

Prezenční listina

Příloha č. 1 k Zápisu z kontrolního dne stavby
Okružní křižovatky Nymburk- II/503 x II/330 a II/503 x II/331

Kontrolní den stavby			
číslo	48/6	15.10.2021	
Jméno, příjmení, titul	Organizace, funkce	Telefon, e-mail	Podpis
VÍT ZOKROČILÝ	ČMÚS		
JINDŘICH ŠTUKA	ČMÚS		
Daniel Bejda	BES		
MICHAL ŠIKORA	BES		
Frant Štejskal	ČMÚS		
PETR VILD	TDS NYMBURK		
ZDENĚK ZAČEK	BES		
Alena Mikšáková	SMH Nymburk		
JIŘÍ KONHEŘEK	SMH		
JOSEF ULRICH	DI NYMBURK PČR		
			1

VÁŠ DOPIS ZNAČKY:
ZE DNE:
NAŠE ZNAČKA: 202/126/2022
VYŘIZUJE: Ing. Lukáš Ježek
TEL.:
E-MAIL:
IDDS: nd9sqfy
MÍSTO / DATUM: V Praze / 8.4.2022

p. Marek Hanuš
Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje
Zborovská 81/11
150 00 Praha 5 - Smíchov

Okružní křižovatky Nymburk – II/503 x II/330 a II/503 x II/331

Stanovisko autorského dozoru k ZBV 1- ZBV 12.

K předloženým ZBV č.1 -12 autorský dozor uvádí následující:

ZBV 1 - SO 000 Všeobecné a předběžné položky

Jedná se o zařazení položky na zaměření skutečného stavu pro dokončení stavby. V původním, investorem odsouhlaseném rozpočtu PDPS, tato položka uvedena nebyla, akceptace položky je věcí investora.

ZBV 2 - SO 101 Okružní křižovatka Zbožská

Jedná se o doměření skutečných výměr po dokončení stavby, z pohledu AD se jedná o doměrek.

ZBV 3 - SO 102 Okružní křižovatka Velké Valy

Jedná se o opravu nekvalitně provedených prací po předchozím dodavateli, konkrétně se jedná o výměnu asfaltem stmelených vrstev vozovky a dlážděných povrchů.

ZBV 4 - SO 103 Úprava ulice Boleslavská

Jedná se o doměření skutečných výměr po dokončení stavby, z pohledu AD se jedná o doměrek a dále opravu nekvalitně provedených prací po předchozím dodavateli a výměnu stávajícího znehodnocených vrstev vozovky na základě skutečného stavu při realizaci.

ZBV 5 - SO 104 Úprava ulice Zbožská

Jedná se o doměření skutečných výměr po dokončení stavby, z pohledu AD se jedná o doměrek.

ZBV 6 - SO 105 Úprava ulice Velké Valy

Jedná se o opravu nekvalitně provedených prací po předchozím dodavateli, konkrétně se jedná o výměnu asfaltem stmelených vrstev vozovky, přídlažby a úprava povrchových znaků IS.



ZBV 7 - SO 106 Chodníky

Jedná se o doměření skutečných výměr po dokončení stavby a narovnání výměr po předchozím dodavateli.

ZBV 8 - SO 107 Předláždění chodníků

Jedná se o doměření skutečných výměr po dokončení stavby a narovnání výměr po předchozím dodavateli.

ZBV 9 - SO 190 Dopravní značení

Jedná se o zařazení dodatečných požadavků Policie ČR k dopravnímu značení v průběhu realizace stavby.

ZBV 10 - SO 301 Úprava odvodnění

Jedná se o doměření skutečných výměr po dokončení stavby a přidání uliční vpusti na základě místního šetření.

ZBV 11 - SO 401 Veřejné osvětlení

Jedná se o doměření skutečných výměr po dokončení stavby a narovnání výměr po předchozím dodavateli.

ZBV 12 - SO 801 Vegetační úpravy

Na základě jednání s následným správcem došlo k vypuštění veškerých prací na SO ze stavby.

S ohledem na výše uvedené AD s předloženými ZBV souhlasí.

S přátelským pozdravem



Stavba : Okružní křižovatky Nymburk, II/503xII/330 a II/503xII/331

Věc : Vyjádření TDS k předloženým ZBV

SO 000 Všeobecné a předběžné položky

Ve Smlouvě o dílo je uvedena položka 02910 Zaměření skutečného provedení pro DSPS, kde je zaslavněna jednotková cena, ale není uvedeno žádné množství. Pro zpracování DSPS, která je nutná pro dokončení díla a jeho užívání, je nezbytné provést nejprve zaměření skutečného stavu pro vytvoření DSPS a GDSP. TDI doporučuje Objednateli akceptovat navrženou změnu.

Dle TDI se jedná o změnu nepodstatnou, kterou nemohl Objednatel předvídat, nedochází jí k řetězení změn a doporučuje Objednateli ji zařadit a administrovat jako Skupinu 3 – Změny z nepředvídatelných důvodů dle Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona R-SM-36.

SO 101 Okružní křižovatka Zbožská

Stavební práce na tomto objektu byly zaměřeny a tímto ZBV je provedeno narovnání položek, dle skutečně provedené množství. Jedná se zejména o plochy asfaltových vrstev, SC, žulové dlažby, zámkové dlažby a délky obrubníků.

TDI souhlasí s uvedenými výměrami, které jsou podloženy geodetickým zaměřením. Dle TDS se jedná o změnu nepodstatnou, nedochází jí k řetězení změn a doporučuje Objednateli ji zařadit a administrovat jako Skupinu 1 – Vyhrazené změny závazků dle Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona R-SM-36.

SO 102 Okružní křižovatka Velké Valy

Okružní křižovatka Velké Valy byla součástí zadání jako oprava po předchozím dodavateli, kdy mělo dojít k výměně nekvalitních asfaltových vrstev náhradou za nové, navíc na základě místního šetření byl zhodnocen stav betonové přídlažby a žulové obruby vnitřního prstence a bylo konstatováno, že je tato oprava také nutná.

Práce obsažené v tomto stavebním Objektu, byli částečně provedeny předchozím Zhotovitelem

Na základě provedeného šetření byl určen rozsah opravných prací a rozšíření úprav konstrukčních vrstev vozovky v křižovatce ulic Boleslavská a Bedřicha Smetany, dále bylo nutné doplnit odvodnění a provést úpravy obrubníků. TDS souhlasí s rozsahem prací doložených zaměřením. Práce byly provedeny dle požadavku Objednatel a v uvedeném rozsahu.

Dle TDS se jedná o změnu nepodstatnou, nedochází jí k řetězení změn a doporučuje Objednateli ji zařadit a administrovat jako Skupinu 3 – Změny z nepředvídatelných důvodů díla dle Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona R-SM-36.

SO 103 Úprava ulice Boleslavská

Práce obsažené v tomto stavebním Objektu, byli částečně provedeny předchozím Zhotovitelem

Na základě provedeného šetření byl určen rozsah opravných prací a rozšíření úprav konstrukčních vrstev vozovky v křižovatce ulic Boleslavská a Bedřicha Smetany, dále bylo nutné doplnit odvodnění a provést úpravy obrubníků.

TDS souhlasí s rozsahem prací doložených zaměřením. Práce byly provedeny dle požadavku Objednatel a v uvedeném rozsahu.

Dle TDS se jedná o změnu nepodstatnou, nedochází jí k řetězení změn a doporučuje Objednateli ji zařadit a administrovat jako Skupinu 4 – Dodatečné stavební práce nezbytné k dokončení díla dle Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona R-SM-36.

Doměrky položek obsažených ve smlouvě se Zhotovitelem, nesouvisející s opravou po předchozím Zhotoviteli navrhuje TDI administrovat jako Skupinu 1 – Vyhrazené změny závazků dle Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona R-SM-36.

SO 104 Úprava ulice Zbožská

ZBV je zpracováno na základě doměření skutečně provedených prací.

TDS souhlasí s uvedenými výměrami, které jsou podloženy geodetickým zaměřením. Dle TDS se jedná o změnu nepodstatnou, nedochází jí k řetězení změn a doporučuje Objednateli ji zařadit a administrovat jako Skupinu 1 – Vyhrazené změny závazků dle Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona R-SM-36.

SO 105 Úprava ulice Velké Valy

Na místním šetření v zimním období byla provedena kontrola položeného asfaltového souvrství na tomto objektu, bylo zjištěno, že část nekvalitně provedeného asfaltového souvrství zasahuje i do objektu SO 105 Úprava ulice Velké Valy, které bude nutné také vyměnit za nové asfaltové souvrství, včetně opravy poškozených částí přídlažby a rektifikace znaků inženýrských sítí.

TDS souhlasí s rozsahem skutečně provedených prací, doložených zaměřením. Práce byly provedeny dle požadavku Objednatel a v uvedeném rozsahu.

Dle TDS se jedná o změnu nepodstatnou, kterou Objednatel nemohl předvídat, nedochází jí k řetězení změn a doporučuje Objednateli ji zařadit a administrovat jako Skupinu 3 – Změny z nepředvídatelných důvodů díla dle Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona R-SM-36.

SO 106 Chodníky

ZBV je zpracováno na základě doměření skutečně provedených prací.

TDS souhlasí s uvedenými výměrami, které jsou podloženy geodetickým zaměřením. Dle TDS se jedná o změnu nepodstatnou, nedochází jí k řetězení změn a doporučuje Objednateli ji zařadit a administrovat jako Skupinu 1 – Vyhrazené změny závazků dle Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona R-SM-36.

SO 107 Předláždění chodníků

ZBV je zpracováno na základě doměření skutečně provedených prací.

TDS souhlasí s uvedenými výměrami, které jsou podloženy geodetickým zaměřením. Dle TDS se jedná o změnu nepodstatnou, nedochází jí k řetězení změn a doporučuje Objednateli ji zařadit a administrovat jako Skupinu 1 – Vyhrazené změny závazků dle Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona R-SM-36.

SO 190 Dopravní značení

Na základě požadavku PČR došlo k úpravě a změnám dopravního značení, a dle těchto požadavků byl upraven projekt SDZ počty dopravního značení.

TDS souhlasí s uvedeným rozsahem prací.

Dle TDS se jedná o změnu nepodstatnou, nedochází jí k řetězení změn a doporučuje Objednateli ji zařadit a administrovat jako Skupinu 4 – Dodatečné stavební práce nezbytné k dokončení díla dle Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona R-SM-36.

SO 301 Úprava odvodnění

ZBV je zpracováno na základě doměření skutečně provedených prací.

TDS souhlasí s uvedenými výměrami, které jsou podloženy geodetickým zaměřením.

Dle TDS se jedná o změnu nepodstatnou, nedochází jí k řetězení změn a doporučuje Objednateli ji zařadit a administrovat jako Skupinu 4 – Dodatečné stavební práce nezbytné k dokončení díla dle Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona R-SM-36.

SO 401 Veřejné osvětlení

ZBV je zpracováno na základě doměření skutečně provedených prací.

TDS souhlasí s uvedenými výměrami, které jsou podloženy geodetickým zaměřením.

Dle TDS se jedná o změnu nepodstatnou, nedochází jí k řetězení změn a doporučuje Objednateli ji zařadit a administrovat jako Skupinu 4 – Dodatečné stavební práce nezbytné k dokončení díla dle Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona R-SM-36.

SO 801 Vegetační úpravy

Po dohodě se zástupci Technických služeb města Nymburk, došlo k dohodě, že veškeré práce na vegetačních úpravách provedou tyto technické služby a zajistí zřízení zeleně tak, aby byly ve vzájemné koordinaci s ostatní zelení v okolí stavby.

Dle TDS se jedná o změnu nepodstatnou, kterou nemohl Objednatel předvídat, nedochází jí k řetězení změn a doporučuje Objednateli ji zařadit a administrovat jako Skupinu 3 – Změny z nepředvídatelných důvodů dle Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona R-SM-36.

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5 - Smíchov
IČO: 00066001

Vyřizuje	Telefon	E-mail	Datum
Ing. Jindřich Štika			9.5.2022

Věc: Oznámení zhotovitele o změnách na akci: „Okružní křižovatky Nymburk – II/503 x II/330 a II/503 x II/331“

Vážení,

dovolujeme si Vám zaslat oznámení o změnách, které vznikly v průběhu provádění díla *Okružní křižovatky Nymburk – II/503 x II/330 a II/503 x II/331* (dále jen Dílo).

SO 000 Všeobecné a předběžné položky

V původním vysoutěženém rozpočtu nebylo uvedeno zaměření pro DSPS, které bylo nutné provést na části díla námi zhotoveném, aby bylo možné provést DSPS.

SO 101 Okružní křižovatka Zbožská

Stavební práce na tomto objektu zaměřeny a tímto ZBV provedeno narovnání položek, dle skutečně provedené množství. Jedná se zejména o plochy asfaltových vrstev, SC, žulové dlažby, zámkové dlažby a délky obrubníků.

SO 102 Okružní křižovatka Velké Valy

Okružní křižovatka Velké Valy byla součástí zadání jako oprava po předchozím dodavateli, kdy mělo dojít k výměně nekvalitních asfaltových vrstev a náhradou za nové, navíc na základě místního šetření byl zhodnocen stav betonové přídlažby a žulové obruby vnitřního prstence a bylo konstatováno, že je tato oprava také nutná.

SO 103 Úprava ulice Boleslavská

Tento stavební objekt je obsažen jak v části díla, které dokončovalo sdružení ČNES - BES, tak i v části opravy po předchozím zhotoviteli.

V části, které dokončovalo sdružení ČNES - BES se jedná především o doměření do skutečně provedené množství, po prokázání nedostatečných parametrů v křižovatce ulic Boleslavská a Bedřicha Smetany bylo navíc provedeno kompletní souvrství i v této části stavby. Na části opravované po předchozím zhotoviteli byly položeny stejné nekvalitní asfaltové vrstvy jako na SO 102, proto bylo nutné provést výměnu těchto vrstev, vlivem nepřesně provedených sklonů a

tel.: +4

e-mai

web: www.cnes.cz

identifikátor datové schránky: rwpdmfa

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., č. ú.: 1

společnost je držitelem certifikátu ISO 9001 a ISO 14001

položených obrubníků bylo nutné přidání jedné uliční vpusti v autobusové zastávce. Na místním šetření byl na místě určen i rozsah opravy přídlažby.

SO 104 Úprava ulice Zbožská

Stavební objekt SO 104 byl geodeticky doměřen a rozpočet byl narovnaný na skutečně provedené práce, navíc byla přidána jedna uliční vpust' v napojení na ulici Nerudovu, v tomto prostoru byla provedena i úprava v pokládce obrubníků a obrubníky byly napojeny na další pokračování ulice Zbožské.

SO 105 Úprava ulice Velké Valy

Na místním šetření v zimním období byla provedena kontrola položeného asfaltového souvrství na tomto objektu, bylo zjištěno, že část nekvalitně provedeného asfaltového souvrství zasahuje i do objektu SO 105 Úprava ulice Velké Valy, které bude nutné také vyměnit za nové asfaltovou souvrství, včetně opravy poškozených částí přídlažby a rektifikace znaků inženýrských sítí.

SO 106 Chodníky

Na základě skutečně provedených prací sdružení ČNES - BES bylo provedeno geodetické zaměření chodníků a původní rozpočet stavby dle SoD je tímto ZBV upraven na toto zaměřené množství. Jedná se o úpravu ploch dlažby, délky obrubníků, ale i práce souvislé s přípravou chodníků a konstrukčních vrstev.

SO 107 Předláždění chodníků

Na základě skutečně provedených prací sdružení ČNES - BES bylo provedeno geodetické zaměření chodníků a původní rozpočet stavby dle SoD je tímto ZBV upraven na toto zaměřené množství. Jedná se o úpravu ploch dlažby, délky obrubníků, ale i práce souvislé s přípravou chodníků a konstrukčních vrstev.

SO 190 Dopravní značení

Stavební objekt dopravního značení je tímto ZBV narovnaný na skutečnost, která byla před uvedením do provozu projednána s Policií ČR a na základě těchto požadavků byl upraven projekt SDZ počty dopravního značení.

SO 301 Úprava odvodnění

Stavební objekt úpravy odvodnění je tímto změnovým listem narovnaný na počty skutečně provedených uličních vpustí, tomu odpovídající délky přípojek dle tabulky přípojek a všechny práce, které se týkají zemních prací a zásypů jsou narovnány podle tohoto skutečně provedeného množství. V autobusové zastávce před poliklinikou byla na základě místního šetření v zimním období přidána jedna uliční vpust' pro zajištění odvodu vody z autobusové zastávky.

SO 401 Veřejné osvětlení

Stavební objekt veřejného osvětlení je narovnaný na skutečně provedené práce, dopočítány osazené lampy VO a s tím související délky kabelů, zemnění a zemních prací s tím souvisejících.

SO 801 Vegetační úpravy

Po dohodě se zástupci Technických služeb města Nymburk, došlo k dohodě, že veškeré práce na vegetačních úpravách provedou tyto technické služby a zajistí zřízení zeleně tak, aby byly ve vzájemné koordinaci s ostatní zelení v okolí stavby.

ČNES dopravní stavby, a.s.

IČO: 477 81 734

DIČ: CZ47781734

sídlem Kladno - Kročehlavy, Milady Horákové 2764, PSČ 27201

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4964

ČNES
člen skupiny ČNES

S přátelským pozdravem

..
ČNES dopravní stavby, a.s.

IČO: 477 81 734

Ing. Vladimír Ložek, předseda představenstva

Příloha:

PR01 – Stanovisko autorského dozoru k ZBV 1 – ZBV 12

PR02 – Vyjádření TDS k předloženým ZBV

tel.: +

e-ma

web: www.cnes.cz

identifikátor datové schránky: rwpdmfa

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., č. ú.:

společnost je držitelem certifikátu ISO 9001 a ISO 14001

V Říčanech

09.06.2022

Evidenční číslo:

Číslo jednací:

Vážený pan

Ing. Vladimír Ložek

Předseda představenstva

ČNES dopravní stavby, a.s.

Milady Horákové 2764,

272 01 Kladno- Kročehlavy

Věc: Okružní křižovatky Nymburk- II/503 x II/330 a II/503 x II/331- Souhlas se zpracováním ZBV

Vážený pane vedoucí,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o. (dále jen KSÚS), jako investor akce „Okružní křižovatky Nymburk- II/503 x II/330 a II/503 x II/331“ je seznámena se žádostí o zpracování ZBV na Vámi uvedené okolnosti, které se v projektové dokumentaci ve stupni PDPS nedali předpokládat (viz příloha č. 1 – Oznámení zhotovitele o změnách od společnosti ČNES dopravní stavby, a.s.).

KSÚS bere na vědomí žádost zhotovitele o zpracování ZBV, a proto KSÚS žádá zhotovitele společnost ČNES dopravní stavby, a.s. o vypracování Změnových listů, a to v souladu se směnicí KSÚS, která je nedílnou součástí Smlouvy o dílo. Tyto ZBV budou následně projednány a podrobně posouzeny supervizorem zakázky, následně budou posouzeny vedením KSÚS. Posuzována bude jejich relevantnost a nepředvídatelnost, následně také cenové vyjádření ZBV.

Připomínáme, že je taktéž nutné vyjádření objednatele č. 2, kterým je město Nymburk.

S pozdravem

Přílohy:

1. Oznámení zhotovitele o změnách od společnosti na akci: „Okružní křižovatky Nymburk- II/503 x II/330 a II/503 x II/331“

Spisová značka: MUNYM-050/58225/2022/Hub
Číslo jednací: MUNYM-050/58225/2022/Hub
Vyřizuje: Věra Hubená
Telefon:
E-mail:
Nymburk: 27.7.2022

ČNES dopravní stavby, a.s.

Milady Horákové 2764
272 01 Kladno

Vážení obchodní přátelé,
připojujeme svůj souhlas se zpracováním ZBV akci „Okružní křižovatky Nymburk – II/503 x II/330 a II/503 x II/331“.

Potvrzujeme, že zástupci města Nymburk byly seznámeni s Vaší žádostí o zpracování ZBV na Vámi uvedené okolnosti, které se v projektové dokumentaci ve stupni PDPS nedaly předpokládat.

S pozdravem



Ing. Jiří Konhefr
vedoucí

