

## Krycí list ZBV

Název Stavby dle SoD: <b>Okružní křižovatky Nymburk - II/503 x II/330 a II/503 x II/331</b> Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>Veřejné osvětlení</b>	Číslo SO/PS / / pořadí Změny SO/PS: <b>401/1</b>	Číslo ZBV: <b>11</b>
--	--	-------------------------

Objednatel: <b>Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace</b> Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov IČ: 00066001 DIČ: CZ00066001  a <b>Město Nymburk</b> Náměstí Přemyslovců 163, 288 28 Nymburk IČ: 00239500 DIČ: CZ00239500
--

Zhotovitel: Sdružení ČNES-BES, OK Nymburk Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno IČ: 477 81 734 vedoucí účastník ČNES dopravní stavby, a.s.	účastník 2 BES s.r.o.  Sukova 625, 256 01 Benešov u Prahy IČ: 437 92 553
Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno IČ: 477 81 734	

## Rekapitulace ZBV č. 11 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
11.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
11.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
11.3	-2 940,00	369 028,03	366 088,03

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
11.4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
11.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
<b>11</b>	<b>-2 940,00</b>	<b>369 028,03</b>	<b>366 088,03</b>

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.  
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Změnové listy  
a pro Rozpis ocenění změn položek.

## Změnový list

<b>Název Stavby dle SoD:</b> Okružní křižovatky Nymburk - II/503 x II/330 a II/503 x II/331	Číslo SO/PS / / pořadí Změny SO/PS:	Číslo ZBV:
<b>Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):</b> Veřejné osvětlení	401/1	11.3

Strany smlouvy o dílo č. S - 2000/00066001/2021 na realizaci uvedené stavby uzavřené dne 10.08.2021 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov

Město Nymburk, Náměstí Přemyslovců 163, 288 28 Nymburk

Zhotovitel: "Sdružení ČNES-BES, OK Nymburk" vedoucí účastník ČNES dopravní stavby a.s., Milady Horákové 2764,

272 01 Kladno-Kročehlavý společník BES s.r.o., Sukova 625, 256 01 Benešov u Prahy

<b>Přílohy Změnového listu:</b>	<b>Příjemce</b>
1. Krycí list 1 počet listů	Objednatel
2. Změnový list 1 počet listů	Zhotovitel
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů	Projektant
4. Rozpis ocenění Změn položek 1 počet listů	Stavební dozor
5. Přehled zařazení změn do Skupin 1 počet listů	Supervize
6. Přehled dokladů 1 počet listů	
7. Soupis prací SO po všech změnách 2 počet listů	
Další doklady dle přehledu dokladů 14 počet listů	

Iniciátor Změny: Objednatel

Předmět Změny:

Tímto ZBV dochází k narovnání skutečně provedených prací, došlo k dopočítání lamp VO a tím i upřesnění délky kabelů, zemnění a zemních prací s tím souvisejících.

Zadavatel při zadávání zadávací dokumentace stavby postupoval s náležitou péčí, tj. vyhledal pomoc autorizované osoby, která se ve smyslu Zákona č. 89/2012 Sb. hlásí k odbornému výkonu jako příslušník určitého povolání nebo stavu a dává tím najevo, že je schopna jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním nebo stavem spojena. Zadavatel tímto naplnil požadavek jednání s náležitou péčí, který je na něj kladen § 222 odst. (6) písm. a) Zákona č. 134/2016 Sb., přičemž nemohl předvídat předmětné drobné nepřesnosti ve stanoveném množství v předchozím stupni projektové dokumentace.

Jedná se o Změnu nepodstatnou, která je podle § 5, odst. (1), písm. c), resp. podle § 10 Směrnice R-Sm-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29. 05. 2017, dále jen "Směrnice KSÚS") upřeshňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 3 jako Změna z nepředvídaných důvodů.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. (6) se jedná o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, současně se jedná o Změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota této Změny prací nepřekračuje 30 % původní hodnoty závazku.

Předmětná Změna byla posouzena v souladu s § 16, odst. (1) Směrnice R-Sm-36. Vzhledem ke skutečnosti, že předmětná Změna splňuje podmínky § 222, odst. (6) Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a splňuje tak náležitosti pro Změny z nepředvídaných důvodů podle § 10 Směrnice KSÚS a limity stanovené v § 13 Směrnice KSÚS, byla pro tuto Změnu určena Skupina 3 – Změny z nepředvídaných důvodů.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
<b>-2 940,00</b>	<b>369 028,03</b>	<b>366 088,03</b>	<b>371 968,03</b>

## Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí)	jméno	Pavel Stejskal	datum	podpis
Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Lukáš Ježek	datum	podpis
Stavební dozor	jméno	Dis. Daniel Balla	datum	podpis
Supervize (Regionální dotační kancelář)	jméno		datum	podpis
Zástupce Objednatele:	jméno	Ing. Tomáš Mach, Ph.D.	datum	podpis
Zástupce Objednatele:	jméno	Bc. Marek Hanuš, MPA	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

**Objednatel** (Oprávněná osoba Objednatele) jméno Ing. Jan Fidler, DiS datum podpis

**ZÁPIS**

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)  
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 11**

<b>Název Stavby:</b> Okružní křižovatky Nymburk - II/503 x II/330 a II/503 x II/331
<b>Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:</b> 401/1
<b>Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):</b> Veřejné osvětlení

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
396 578,20

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

**Cena SO/PS v předchozích ZBV:**

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	396 578,20	0,00

**Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:**

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-2 940,00	369 028,03	369 028,03	93,05%

**Cena SO/PS po této ZBV:**

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-2 940,00	762 666,23	366 088,03	92,31%

**Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis**

Zhotovitel (stavbyvedoucí):	souhlasím	Pavel Stejskal
Projektant (autorský dozor):	souhlasím	Ing. Lukáš Ježe
Stavební dozor:	souhlasím	Dis. Daniel Ball
Zástupce Objednatele:	souhlasím	Ing. Tomáš Mach, Ph.D.
Zástupce Objednatele:	souhlasím	Bc. Marek Hanuš, MPA
Supervize (RDK):		
Zaměstnanec KSÚS SK odpovědný za cenové projednání Změny:	souhlasím	Ing. Jaroslava Jurková

### Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 11.3

Název stavby dle SoD: Okružní křižovatky Nymburk - II/503 x II/330 a II/503 a II/331

Číslo a název SO/PS: 401 Veřejné osvětlení

Číslo a název rozpočtu: 401 Veřejné osvětlení

#### ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

č. 1

Skupina Změn: 3

1	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
<b>1</b>		<b>Zemní práce</b>						<b>35 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131 452,50</b>	<b>166 552,50</b>	<b>131 452,50</b>	<b>374,51%</b>
26	R130001	Kabelová rýha - šířky 0,35m a hloubky 0,6m, tř.horniny 3 (včetně výkopu, pískového lože, krytí kabelů, záhozu, hutnění, úpravy povrchů, odvozu přebytečného výkopku a skládkovného atd.)	M	78,000	253,450	175,450	450,000	35 100,000	0,000	78 952,500	114 052,500	78 952,500	224,94%
29	R130004	Pouzdrový základ sloupu - v.6m resp. 6,2m, hl.založení 1m, úplný, vč.materiálu (včetně výkopu, usazení sloupu, plechu nebo keram.desky pod sloup, záspu ekrazitem, záhozu,odvozu přebytečného výkopku atd.)	M3	0,000	15,000	15,000	3 500,000	0,000	0,000	52 500,000	52 500,000	52 500,000	100,00%
<b>70</b>		<b>Všeobecné práce pro silnoproud a slaboproud</b>						<b>3 665,60</b>	<b>0,00</b>	<b>4 879,94</b>	<b>8 545,54</b>	<b>4 879,94</b>	<b>133,13%</b>
1	702212	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM	M	14,000	32,500	18,500	160,000	2 240,000	0,000	2 960,000	5 200,000	2 960,000	132,14%
2	702312	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM	M	108,000	253,450	145,450	13,200	1 425,600	0,000	1 919,940	3 345,540	1 919,940	100,00%
<b>74</b>		<b>Silnoproud</b>						<b>317 934,60</b>	<b>-2 940,00</b>	<b>231 735,59</b>	<b>546 730,19</b>	<b>228 795,59</b>	<b>71,96%</b>
3	741911	UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2	M	161,600	276,878	115,278	60,00	9 696,00	0,00	6 916,69	16 612,69	6 916,69	71,34%
4	742H12	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2	M	185,500	353,552	168,052	118,00	21 889,00	0,00	19 830,15	41 719,15	19 830,15	90,59%
5	742L12	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2	KUS	12,000	31,000	19,000	208,00	2 496,00	0,00	3 952,00	6 448,00	3 952,00	158,33%
6	742P15	OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK NA KABEL	KUS	13,000	31,000	18,000	17,20	223,60	0,00	309,60	533,20	309,60	138,46%
9	743121.1	OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR PEVNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ DÉLKY DO 6 M	KUS	2,000	4,000	2,000	5 390,00	10 780,00	0,00	10 780,00	21 560,00	10 780,00	100,00%
10	743121.2	OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR PEVNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ DÉLKY DO 6 M	KUS	1,000	2,000	1,000	5 390,00	5 390,00	0,00	5 390,00	10 780,00	5 390,00	100,00%
8	743121.A	OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR PEVNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ DÉLKY DO 6 M	KUS	6,000	9,000	3,000	5 390,00	32 340,00	0,00	16 170,00	48 510,00	16 170,00	50,00%
12	743142.1	OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR PŘECHODOVÝ - VÝLOŽNÍK S DÉLKOU VYLOŽENÍ DO 3 M	KUS	1,000	2,000	1,000	4 030,00	4 030,00	0,00	4 030,00	8 060,00	4 030,00	100,00%
11	743142.A	OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR PŘECHODOVÝ - VÝLOŽNÍK S DÉLKOU VYLOŽENÍ DO 3 M	KUS	3,000	4,000	1,000	4 030,00	12 090,00	0,00	4 030,00	16 120,00	4 030,00	33,33%
14	743312	VÝLOŽNÍK PRO MONTÁŽ SVÍTIDLA NA STOŽÁR JEDNORAMENNÝ DÉLKA VYLOŽENÍ PŘES 1 DO 2 M	KUS	6,000	9,000	3,000	1 930,00	11 580,00	0,00	5 790,00	17 370,00	5 790,00	50,00%
17	743554.1	SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ LED, MIN. IP 44, PŘES 45 W	KUS	1,000	2,000	1,000	21 700,00	21 700,00	0,00	21 700,00	43 400,00	21 700,00	100,00%
18	743554.2	SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ LED, MIN. IP 44, PŘES 45 W	KUS	3,000	4,000	1,000	21 700,00	65 100,00	0,00	21 700,00	86 800,00	21 700,00	33,33%
19	743554.3	SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ LED, MIN. IP 44, PŘES 45 W	KUS	5,000	9,000	4,000	21 700,00	108 500,00	0,00	86 800,00	195 300,00	86 800,00	80,00%
20	743Z11	DEMONTÁŽ OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU ULIČNÍHO VÝŠKY DO 15 M	KUS	4,000	3,000	-1,000	2 940,00	11 760,00	-2 940,00	0,00	8 820,00	-2 940,00	-25,00%
21	743Z92	DEMONTÁŽ - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO)	tkm	0,000	20,000	20,000	22,00	0,00	0,00	440,00	440,00	440,00	100,00%
22	744R35	OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK DO ROZVADĚČE NN	KUS	9,000	15,000	6,000	40,00	360,00	0,00	240,00	600,00	240,00	66,67%
23	746Z34	DEMONTÁŽE BETONOVÝCH ZÁKLADŮ	M3	0,000	0,630	0,630	7 720,00	0,00	0,00	4 863,60	4 863,60	4 863,60	100,00%
24	74F322	REVIZNÍ ZPRÁVA	KUS	0,000	0,484	0,484	12 800,00	0,00	0,00	6 193,55	6 193,55	6 193,55	100,00%
33	R74F331	SOUČINNOST SPRÁVCE SÍTĚ	HOD	0,000	9,000	9,000	600,00	0,00	0,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	100,00%
34	R74F332	DOZOR SPRÁVCE SÍTĚ	HOD	0,000	12,000	12,000	600,00	0,00	0,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	100,00%
<b>78</b>		<b>Dokonč.práce</b>						<b>2 640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>960,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>960,00</b>	<b>36,36%</b>
25	78311	PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁTĚREM JEDNOVRST	M2	11,000	15,000	4,000	240,00	2 640,00	0,00	960,00	3 600,00	960,00	36,36%
<b>Celkem</b>								<b>- 2 940,00</b>	<b>369 028,03</b>	<b>366 088,03</b>			

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.  
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Pavel Stejskal, stavbyvedoucí

Za Objednatele: Bc. Marek Hanuš, MPA,

Za Objednatele: Ing. Tomáš Mach, Ph.D., starosta

Podpis:

Podpis:

Podpis:

## PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby:

Okružní křižovatky Nymburk - II/503 x II/330 a II/503 x II/331

1	Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	21 868 773,84
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	24 379 626,59
	<b>Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH</b>	<b>29 499 348,17</b>
3=(2/1)*100	Procento změny Přijáté smluvní částky	111,48%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,17%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%
40=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, odst. (5), písm. b)	-9,77%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	2 473 915,63
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	11,31%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	6 560 632,15

9=(32A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	-2,32%
10=(36A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	1,60%
10A=32A+36A	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	-157 582,43
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	10 934 386,92

12=(37/1)*100	Sledování limitu 15 %	3 280 316,08
13=37	Sledování limitu 140 448 000 Kč	0,00
14=140448000-37		140 448 000,00

SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (žadavat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	- 1 -			- 2 -			- 3 -				- 4 -				- 5 -		
						Vyhrazená změna (Doměrky)			Záměna položek (Započítávání)			Nepředvídanost				Nezbytnost				Změny de minimis		
						Změny záporné (žadavat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadavat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadavat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (žadavat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (žadavat se znaménkem minus)	Změny kladné	limit 15 %
16	17	18	19=23+26+29+33	20=24+27+30+34+37+39	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	32=29+30	32A=ABS(29)+30	33	34	36=33+34	36A=ABS(33)+34	37	38	39=ABS(37)+38
		Okružní křižovatky Nymburk - II/503 x II/330 a II/503 x II/331	- 2 136 245,65	4 647 098,40	2 510 852,75	- 77 331,78	114 268,90	36 937,12	0,00	0,00	0,00	- 1 340 927,04	833 344,61	-507 582,43	- 507 582,43	- 717 986,83	3 699 484,89	2 981 498,06	350 000,00	0,00	0,00	0,00
000	1	Všeobecné a předběžné položky/doplnění zaměření pro DSPS	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
101	2	Okružní křižovatka Zbožská/nepřesnosti v množství prováděných prací stanoveném v zadávací dokumentaci	- 347 108,31	15 680,00	- 331 428,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 347 108,31	15 680,00	-331 428,31	-331 428,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	3	Okružní křižovatka Velké Vály / Výměna nekvalitních asfaltem stmelěných vrstev vozovky a dlaždičkových povrchů	- 363 967,83	138 976,56	- 224 991,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 363 967,83	138 976,56	-224 991,27	502 944,39	0,00	0,00	0,00
103	4	Úprava ulice Boleslavská / Opravné práce a rozšíření úprav konstrukčních vrstev a narovnání položek na skutečně provedené množství	- 117 759,00	2 817 043,07	2 699 284,07	0,00	44 970,90	44 970,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 117 759,00	2 772 072,17	2 654 313,17	2 654 313,17	0,00	0,00	0,00
104	5	Úprava ulice Zbožská/nepřesnosti v množství prováděných prací stanoveném v zadávací dokumentaci	- 77 331,78	69 298,00	- 8 033,78	- 77 331,78	69 298,00	- 8 033,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	6	Úprava ulice Velké Vály/ Oprava asfaltového souvrství, části přídlažby a rektifikace inženýrských sítí	0,00	322 801,88	322 801,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 801,88	322 801,88	322 801,88	0,00	0,00	0,00
106	7	Chodníky/nepřesnosti v množství prováděných prací stanoveném v zadávací dokumentaci	- 55 290,53	277 878,08	222 587,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 55 290,53	277 878,08	222 587,55	222 587,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	8	Předláždění chodníků/nepřesnosti v množství prováděných prací stanoveném v zadávací dokumentaci	- 901 565,58	0,00	- 901 565,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 901 565,58	0,00	-901 565,58	-901 565,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	9	Dopravní značení/Úprava projektu SDZ	- 236 260,00	115 634,28	- 120 625,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 236 260,00	115 634,28	-120 625,72	-120 625,72	0,00	0,00	0,00
301	10	Úprava odvodnění/ Navýšení přípojek	- 34 022,62	170 758,50	136 735,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 34 022,62	170 758,50	136 735,88	136 735,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401	11	Veřejné osvětlení/ Narovnání na skutečně provedené množství	- 2 940,00	369 028,03	366 088,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 2 940,00	369 028,03	366 088,03	366 088,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

## Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	11
Název stavby:	Okružní křižovatky Nymburk - II/503 x II/330 a II/503 x II/331
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Veřejné osvětlení
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	401/1

Doklad	počet listů
07 Soupis prací SO po změnách	2
08 Zápis v SD list č. 14122	1
09 Zákres VO	1
10 Stanovisko autorského dozoru	2
11 Vyjádření TDS	2
12 Oznámení zhotovitele	3
13 Souhlas se zpracováním ZBV_KSÚS	1
14 Souhlas se zpracováním ZBV_Město Nymburk	1
15 Fotodokumentace	1







19	743554.3	SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ LED, MIN. IP 44, PŘES 45 W	KUS	5,000	9,000	4,000	21 700,00	108 500,00	0,00	86 800,00	195 300,00	86 800,00	80,00%
		<b>ZBV č. 11</b>											
		<i>Svítlidlo na silniční silniční lampy, zde máme 5 ks a zbývá osadit 9 ks</i>			9,000								
		<i>Součet</i>			9,000								
16	743554.A	SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ LED, MIN. IP 44, PŘES 45 W	KUS	0,000	0,000	0,000	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
20	743Z11	DEMONTÁŽ OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU ULIČNÍHO VÝŠKY DO 15 M	KUS	4,000	3,000	-1,000	2 940,00	11 760,00	-2 940,00	0,00	8 820,00	-2 940,00	-25,00%
		<b>ZBV č. 11</b>											
		<i>Bude demontováno 3 ks starých lamp - odečet 1 ks</i>			3,000								
		<i>Součet</i>			3,000								
21	743Z92	DEMONTÁŽ - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO)	tkm	0,000	20,000	20,000	22,00	0,00	0,00	440,00	440,00	440,00	100,00%
		<b>ZBV č. 11</b>											
		<i>Nemáme v rozpočtu žádné demontáže i když něco demontovat budeme - chybí cca 20 tkm</i>			20,000								
		<i>Součet</i>			20,000								
22	744R35	OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK DO ROZVADĚČE NN	KUS	9,000	15,000	6,000	40,00	360,00	0,00	240,00	600,00	240,00	66,67%
		<b>ZBV č. 11</b>											
		<i>Chybí oštítkovat 15 ks lamp</i>			15,000								
		<i>Součet</i>			15,000								
23	746Z34	DEMONTÁŽE BETONOVÝCH ZÁKLADŮ	M3	0,000	0,630	0,630	7 720,00	0,00	0,00	4 863,60	4 863,60	4 863,60	100,00%
		<b>ZBV č. 11</b>											
		<i>Chybí vybourat 3 ks základů u stávajících lamp - 6,5 / 31 * 3</i>			0,630								
		<i>Součet</i>			0,630								
24	74F322	REVIZNÍ ZPRÁVA	KUS	0,000	0,484	0,484	12 800,00	0,00	0,00	6 193,55	6 193,55	6 193,55	100,00%
		<b>ZBV č. 11</b>											
		<i>Revizní zpráva na zbytek lamp - zbývá osadit 15 z 31 stožárů</i>			0,484								
		<i>Součet</i>			0,484								
30	R130005	Kabelová spojka 1kV, za tepla smrštlitelná Al/Cu, 1+3 žily, průměr žil 6-35mm <sup>2</sup> , do země	KUS	2,000	2,000	0,000	5 500,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00%
31	R749001	KONTROLNÍ MĚŘENÍ A NASTAVENÍ OSVĚTLOVACÍ SOUSTAVY	KPL	0,300	0,300	0,000	35 000,00	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00%
32	R749002	Zajištění provizorního napájení VO	KPL	0,000	0,000	0,000	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
33	R74F331	SOUČINNOST SPRÁVCE SÍTĚ	HOD	0,000	9,000	9,000	600,00	0,00	0,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	100,00%
		<b>ZBV č. 11</b>											
		<i>Zbývá osadit 15 ze 31 stožárů - cca polovina původního množství</i>			9,000								
		<i>Součet</i>			9,000								
34	R74F332	DOZOR SPRÁVCE SÍTĚ	HOD	0,000	12,000	12,000	600,00	0,00	0,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	100,00%
		<b>ZBV č. 11</b>											
		<i>Zbývá osadit 15 ze 31 stožárů - cca polovina původního množství</i>			12,000								
		<i>Součet</i>			12,000								
<b>78</b>		<b>Dokonč.práce</b>						<b>2 640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>960,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>960,00</b>	<b>36,36%</b>
25	78311	PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁTĚREM JEDNOVRST	M2	11,000	15,000	4,000	240,00	2 640,00	0,00	960,00	3 600,00	960,00	36,36%
		<b>ZBV č.9</b>											
		<i>Zbývá osadit 15 ze 31 stožárů</i>			15,000								
		<i>Součet</i>			15,000								
<b>Celkem</b>								<b>396 578,20</b>	<b>- 2 940,00</b>	<b>369 028,03</b>	<b>762 666,23</b>	<b>366 088,03</b>	<b>92,31%</b>

ZAPIS: DLEŠIHO DNE PROBEH KONTROLY  
 PRU O. 4311 - VE SAKOSTATI ZAPIS.  
 ZUCOBIENNA STAVBY PROVEDU PROMIDU  
 STAVANIE. ZMOTOVITEL KONSTATUJE,  
 ZE STAVBY OBJEKTU SO 301 A SO 401  
 JSOU V JINEM STAVU NEZI PREDPOKLADANE  
 ZADAVACI KONSTATACE ZAPISHO VIKAZ  
 VIDEA.  
 TDI NA ZAKLAD TECTO SUTVEDOSTI  
 ZAVAZUJ PROBIT REVIZI A PORADU.  
 STAVBY SE DODATU ZE PLYNUSI  
 OSMYKUTI ZUDOU REKAM FONDU  
 VICEPRACI A ZUDOU DO PODPANE VEDOU  
 V STAVBYM OBJEKTU PRO VICEPRACE.

STW


Pocasi: Polojasno 16 - 26°C

Pracovníci: 1x TAP, 2x strojník,  
 2x řidič, 3x dělník

Technika: 2x bagr Komatsu 14P, 11P  
 ržr. velké Ammann, obracim'  
 pech Wacker, 2x nácl. auto

Práce: kalyby ing rti' (oodorod, chra'nicia  
 pro opticky label), katicim' nakypni,  
 poskladka kryci folie. Terim' starajicich  
 terennich vrstev v SO 101, 103 ve vro-  
 veni PP. Nabyt kryci vrstvy PP ve SD,  
 hadnim'. Uclid a zabezpecim' sta-  
 kemisti.

Stejshel

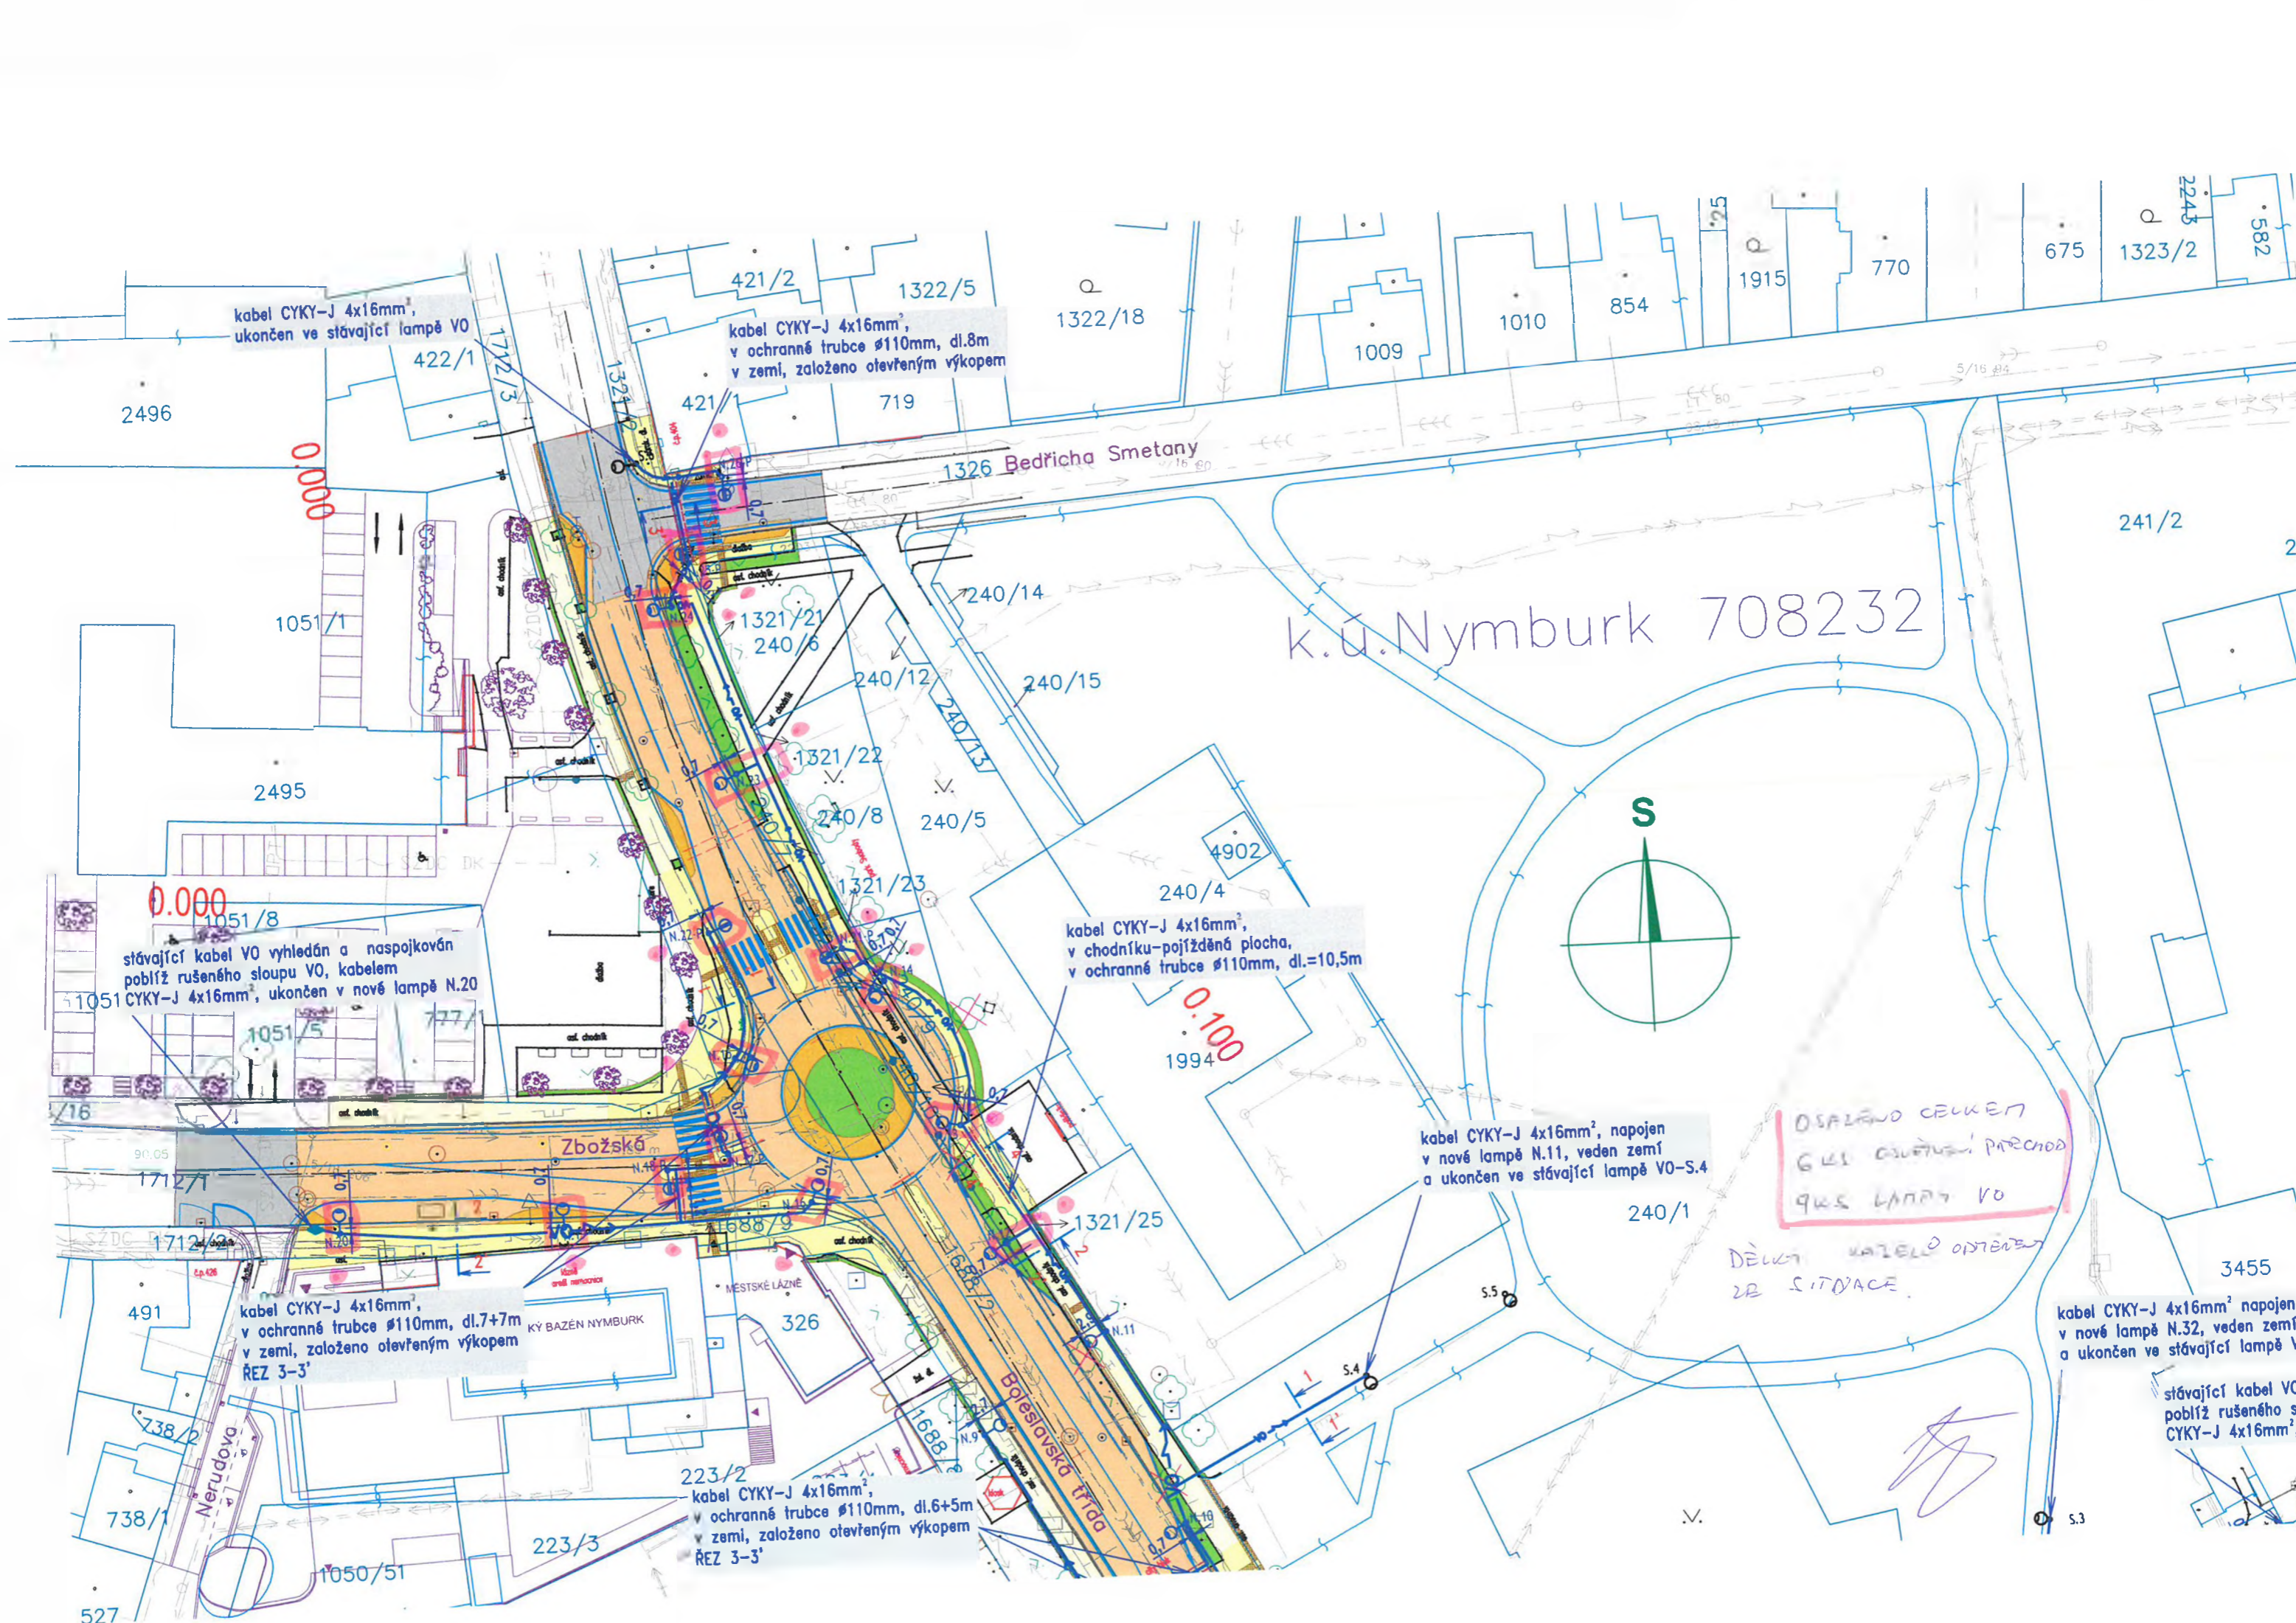

k.ú. Nymburk 708232

kabel CYKY-J 4x16mm<sup>2</sup>,  
ukončen ve stávající lampě VO

kabel CYKY-J 4x16mm<sup>2</sup>,  
v ochranné trubce ø110mm, dl.8m  
v zemi, založeno otevřeným výkopem

2496

0.000

0.000

stávající kabel VO vyhledán a naspojován  
poblíž rušeného sloupu VO, kabelem  
CYKY-J 4x16mm<sup>2</sup>, ukončen v nové lampě N.20

kabel CYKY-J 4x16mm<sup>2</sup>,  
v chodníku-pojížděná plocha,  
v ochranné trubce ø110mm, dl.=10,5m

0.100

kabel CYKY-J 4x16mm<sup>2</sup>, napojen  
v nové lampě N.11, veden zemi  
a ukončen ve stávající lampě VO-S.4

*OSAZENO CELKEM  
6 KS GLE OSVĚTL. PŘECHOD  
9 KS LAMPY VO*

*DĚLKA KABELU OTEVŘEN  
28 SÍŤOVACE*

kabel CYKY-J 4x16mm<sup>2</sup>,  
v ochranné trubce ø110mm, dl.7+7m  
v zemi, založeno otevřeným výkopem  
REZ 3-3'

kabel CYKY-J 4x16mm<sup>2</sup> napojen  
v nové lampě N.32, veden zemi  
a ukončen ve stávající lampě VO

kabel CYKY-J 4x16mm<sup>2</sup>,  
v ochranné trubce ø110mm, dl.6+5m  
v zemi, založeno otevřeným výkopem  
REZ 3-3'

stávající kabel VO vyhledán a naspojován  
poblíž rušeného sloupu  
CYKY-J 4x16mm<sup>2</sup>, ukončen

VÁŠ DOPIS ZNAČKY:  
ZE DNE:  
NAŠE ZNAČKA: 202/126/2022  
VYŘIZUJE: Ing. Lukáš Ježek  
TEL.:  
E-MAIL:  
IDDS: nd9sqfy  
MÍSTO / DATUM: V Praze / 8.4.2022

**p. Marek Hanuš**  
Krajská správa a údržba silnic  
Středočeského kraje  
Zborovská 81/11  
150 00 Praha 5 - Smíchov

### Okružní křižovatky Nymburk – II/503 x II/330 a II/503 x II/331

#### Stanovisko autorského dozoru k ZBV 1- ZBV 12.

K předloženým ZBV č.1 -12 autorský dozor uvádí následující:

#### **ZBV 1 - SO 000 Všeobecné a předběžné položky**

Jedná se o zařazení položky na zaměření skutečného stavu pro dokončení stavby. V původním, investorem odsouhlaseném rozpočtu PDPS, tato položka uvedena nebyla, akceptace položky je věcí investora.

#### **ZBV 2 - SO 101 Okružní křižovatka Zbožská**

Jedná se o doměření skutečných výměr po dokončení stavby, z pohledu AD se jedná o doměrek.

#### **ZBV 3 - SO 102 Okružní křižovatka Velké Valy**

Jedná se o opravu nekvalitně provedených prací po předchozím dodavateli, konkrétně se jedná o výměnu asfaltem stmelených vrstev vozovky a dlážděných povrchů.

#### **ZBV 4 - SO 103 Úprava ulice Boleslavská**

Jedná se o doměření skutečných výměr po dokončení stavby, z pohledu AD se jedná o doměrek a dále opravu nekvalitně provedených prací po předchozím dodavateli a výměnu stávajícího znehodnocených vrstev vozovky na základě skutečného stavu při realizaci.

#### **ZBV 5 - SO 104 Úprava ulice Zbožská**

Jedná se o doměření skutečných výměr po dokončení stavby, z pohledu AD se jedná o doměrek.

#### **ZBV 6 - SO 105 Úprava ulice Velké Valy**

Jedná se o opravu nekvalitně provedených prací po předchozím dodavateli, konkrétně se jedná o výměnu asfaltem stmelených vrstev vozovky, přídlažby a úprava povrchových znaků IS.



**ZBV 7 - SO 106 Chodníky**

Jedná se o doměření skutečných výměr po dokončení stavby a narovnání výměr po předchozím dodavateli.

**ZBV 8 - SO 107 Předláždění chodníků**

Jedná se o doměření skutečných výměr po dokončení stavby a narovnání výměr po předchozím dodavateli.

**ZBV 9 - SO 190 Dopravní značení**

Jedná se o zařazení dodatečných požadavků Policie ČR k dopravnímu značení v průběhu realizace stavby.

**ZBV 10 - SO 301 Úprava odvodnění**

Jedná se o doměření skutečných výměr po dokončení stavby a přidání uliční vpusti na základě místního šetření.

**ZBV 11 - SO 401 Veřejné osvětlení**

Jedná se o doměření skutečných výměr po dokončení stavby a narovnání výměr po předchozím dodavateli.

**ZBV 12 - SO 801 Vegetační úpravy**

Na základě jednání s následným správcem došlo k vypuštění veškerých prací na SO ze stavby.

S ohledem na výše uvedené AD s předloženými ZBV souhlasí.

S přátelským pozdravem



## **Stavba : Okružní křižovatky Nymburk, II/503xII/330 a II/503xII/331**

### **Věc : Vyjádření TDS k předloženým ZBV**

#### **SO 000 Všeobecné a předběžné položky**

Ve Smlouvě o dílo je uvedena položka 02910 Zaměření skutečného provedení pro DSPS, kde je zaslavněna jednotková cena, ale není uvedeno žádné množství. Pro zpracování DSPS, která je nutná pro dokončení díla a jeho užívání, je nezbytné provést nejprve zaměření skutečného stavu pro vytvoření DSPS a GDSP. TDI doporučuje Objednateli akceptovat navrženou změnu.

Dle TDI se jedná o změnu nepodstatnou, kterou nemohl Objednatel předvídat, nedochází jí k řetězení změn a doporučuje Objednateli ji zařadit a administrovat jako Skupinu 3 – Změny z nepředvídatelných důvodů dle Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona R-SM-36.

#### **SO 101 Okružní křižovatka Zbožská**

Stavební práce na tomto objektu byly zaměřeny a tímto ZBV je provedeno narovnání položek, dle skutečně provedené množství. Jedná se zejména o plochy asfaltových vrstev, SC, žulové dlažby, zámkové dlažby a délky obrubníků.

TDI souhlasí s uvedenými výměrami, které jsou podloženy geodetickým zaměřením. Dle TDS se jedná o změnu nepodstatnou, nedochází jí k řetězení změn a doporučuje Objednateli ji zařadit a administrovat jako Skupinu 1 – Vyhrazené změny závazků dle Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona R-SM-36.

#### **SO 102 Okružní křižovatka Velké Valy**

Okružní křižovatka Velké Valy byla součástí zadání jako oprava po předchozím dodavateli, kdy mělo dojít k výměně nekvalitních asfaltových vrstev náhradou za nové, navíc na základě místního šetření byl zhodnocen stav betonové přídlažby a žulové obruby vnitřního prstence a bylo konstatováno, že je tato oprava také nutná.

Práce obsažené v tomto stavebním Objektu, byli částečně provedeny předchozím Zhotovitelem Na základě provedeného šetření byl určen rozsah opravných prací a rozšíření úprav konstrukčních vrstev vozovky v křižovatce ulic Boleslavská a Bedřicha Smetany, dále bylo nutné doplnit odvodnění a provést úpravy obrubníků. TDS souhlasí s rozsahem prací doložených zaměřením. Práce byly provedeny dle požadavku Objednatel a v uvedeném rozsahu.

Dle TDS se jedná o změnu nepodstatnou, nedochází jí k řetězení změn a doporučuje Objednateli ji zařadit a administrovat jako Skupinu 3 – Změny z nepředvídatelných důvodů díla dle Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona R-SM-36.

#### **SO 103 Úprava ulice Boleslavská**

Práce obsažené v tomto stavebním Objektu, byli částečně provedeny předchozím Zhotovitelem Na základě provedeného šetření byl určen rozsah opravných prací a rozšíření úprav konstrukčních vrstev vozovky v křižovatce ulic Boleslavská a Bedřicha Smetany, dále bylo nutné doplnit odvodnění a provést úpravy obrubníků. TDS souhlasí s rozsahem prací doložených zaměřením. Práce byly provedeny dle požadavku Objednatel a v uvedeném rozsahu.

Dle TDS se jedná o změnu nepodstatnou, nedochází jí k řetězení změn a doporučuje Objednateli ji zařadit a administrovat jako Skupinu 4 – Dodatečné stavební práce nezbytné k dokončení díla dle Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona R-SM-36.

Doměrky položek obsažených ve smlouvě se Zhotovitelem, nesouvisející s opravou po předchozím Zhotoviteli navrhuje TDI administrovat jako Skupinu 1 – Vyhrazené změny závazků dle Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona R-SM-36.

#### **SO 104 Úprava ulice Zbožská**

ZBV je zpracováno na základě doměření skutečně provedených prací.

TDS souhlasí s uvedenými výměrami, které jsou podloženy geodetickým zaměřením. Dle TDS se jedná o změnu nepodstatnou, nedochází jí k řetězení změn a doporučuje Objednateli ji zařadit a administrovat jako Skupinu 1 – Vyhrazené změny závazků dle Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona R-SM-36.

## **SO 105 Úprava ulice Velké Valy**

Na místním šetření v zimním období byla provedena kontrola položeného asfaltového souvrství na tomto objektu, bylo zjištěno, že část nekvalitně provedeného asfaltového souvrství zasahuje i do objektu SO 105 Úprava ulice Velké Valy, které bude nutné také vyměnit za nové asfaltové souvrství, včetně opravy poškozených částí přídlažby a rektifikace znaků inženýrských sítí.

TDS souhlasí s rozsahem skutečně provedených prací, doložených zaměřením. Práce byly provedeny dle požadavku Objednatel a v uvedeném rozsahu.

Dle TDS se jedná o změnu nepodstatnou, kterou Objednatel nemohl předvídat, nedochází jí k řetězení změn a doporučuje Objednateli ji zařadit a administrovat jako Skupinu 3 – Změny z nepředvídatelných důvodů díla dle Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona R-SM-36.

## **SO 106 Chodníky**

ZBV je zpracováno na základě doměření skutečně provedených prací.

TDS souhlasí s uvedenými výměrami, které jsou podloženy geodetickým zaměřením. Dle TDS se jedná o změnu nepodstatnou, nedochází jí k řetězení změn a doporučuje Objednateli ji zařadit a administrovat jako Skupinu 1 – Vyhrazené změny závazků dle Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona R-SM-36.

## **SO 107 Předláždění chodníků**

ZBV je zpracováno na základě doměření skutečně provedených prací.

TDS souhlasí s uvedenými výměrami, které jsou podloženy geodetickým zaměřením. Dle TDS se jedná o změnu nepodstatnou, nedochází jí k řetězení změn a doporučuje Objednateli ji zařadit a administrovat jako Skupinu 1 – Vyhrazené změny závazků dle Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona R-SM-36.

## **SO 190 Dopravní značení**

Na základě požadavku PČR došlo k úpravě a změnám dopravního značení, a dle těchto požadavků byl upraven projekt SDZ počty dopravního značení.

TDS souhlasí s uvedeným rozsahem prací.

Dle TDS se jedná o změnu nepodstatnou, nedochází jí k řetězení změn a doporučuje Objednateli ji zařadit a administrovat jako Skupinu 4 – Dodatečné stavební práce nezbytné k dokončení díla dle Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona R-SM-36.

## **SO 301 Úprava odvodnění**

ZBV je zpracováno na základě doměření skutečně provedených prací.

TDS souhlasí s uvedenými výměrami, které jsou podloženy geodetickým zaměřením.

Dle TDS se jedná o změnu nepodstatnou, nedochází jí k řetězení změn a doporučuje Objednateli ji zařadit a administrovat jako Skupinu 4 – Dodatečné stavební práce nezbytné k dokončení díla dle Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona R-SM-36.

## **SO 401 Veřejné osvětlení**

ZBV je zpracováno na základě doměření skutečně provedených prací.

TDS souhlasí s uvedenými výměrami, které jsou podloženy geodetickým zaměřením.

Dle TDS se jedná o změnu nepodstatnou, nedochází jí k řetězení změn a doporučuje Objednateli ji zařadit a administrovat jako Skupinu 4 – Dodatečné stavební práce nezbytné k dokončení díla dle Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona R-SM-36.

## **SO 801 Vegetační úpravy**

Po dohodě se zástupci Technických služeb města Nymburk, došlo k dohodě, že veškeré práce na vegetačních úpravách provedou tyto technické služby a zajistí zřízení zeleně tak, aby byly ve vzájemné koordinaci s ostatní zelení v okolí stavby.

Dle TDS se jedná o změnu nepodstatnou, kterou nemohl Objednatel předvídat, nedochází jí k řetězení změn a doporučuje Objednateli ji zařadit a administrovat jako Skupinu 3 – Změny z nepředvídatelných důvodů dle Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona R-SM-36.



Krajská správa a údržba silnic  
Středočeského kraje, příspěvková  
organizace  
Zborovská 81/11  
150 21 Praha 5 - Smíchov  
IČO: 00066001

Vyřizuje	Telefon	E-mail	Datum
Ing. Jindřich Štika			9.5.2022

**Věc: Oznámení zhotovitele o změnách na akci: „Okružní křižovatky Nymburk – II/503 x II/330 a II/503 x II/331“**

Vážení,

dovolujeme si Vám zaslat oznámení o změnách, které vznikly v průběhu provádění díla *Okružní křižovatky Nymburk – II/503 x II/330 a II/503 x II/331* (dále jen Dílo).

**SO 000 Všeobecné a předběžné položky**

V původním vysoutěženém rozpočtu nebylo uvedeno zaměření pro DSPS, které bylo nutné provést na části díla námi zhotoveném, aby bylo možné provést DSPS.

**SO 101 Okružní křižovatka Zbožská**

Stavební práce na tomto objektu zaměřeny a tímto ZBV provedeno narovnání položek, dle skutečně provedené množství. Jedná se zejména o plochy asfaltových vrstev, SC, žulové dlažby, zámkové dlažby a délky obrubníků.

**SO 102 Okružní křižovatka Velké Valy**

Okružní křižovatka Velké Valy byla součástí zadání jako oprava po předchozím dodavateli, kdy mělo dojít k výměně nekvalitních asfaltových vrstev a náhradou za nové, navíc na základě místního šetření byl zhodnocen stav betonové přídlažby a žulové obruby vnitřního prstence a bylo konstatováno, že je tato oprava také nutná.

**SO 103 Úprava ulice Boleslavská**

Tento stavební objekt je obsažen jak v části díla, které dokončovalo sdružení ČNES - BES, tak i v části opravy po předchozím zhotoviteli.

V části, které dokončovalo sdružení ČNES - BES se jedná především o doměření do skutečně provedené množství, po prokázání nedostatečných parametrů v křižovatce ulic Boleslavská a Bedřicha Smetany bylo navíc provedeno kompletní souvrství i v této části stavby. Na části opravované po předchozím zhotoviteli byly položeny stejné nekvalitní asfaltové vrstvy jako na SO 102, proto bylo nutné provést výměnu těchto vrstev, vlivem nepřesně provedených sklonů a

tel.:

e-m

web: www.cnes.cz

identifikátor datové schránky: rwpdmfa

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., č. ú.:

společnost je držitelem certifikátu ISO 9001 a ISO 14001

položených obrubníků bylo nutné přidání jedné uliční vpusti v autobusové zastávce. Na místním šetření byl na místě určen i rozsah opravy přídlažby.

#### **SO 104 Úprava ulice Zbožská**

Stavební objekt SO 104 byl geodeticky doměřen a rozpočet byl narovnaný na skutečně provedené práce, navíc byla přidána jedna uliční vpust' v napojení na ulici Nerudovu, v tomto prostoru byla provedena i úprava v pokládce obrubníků a obrubníky byly napojeny na další pokračování ulice Zbožské.

#### **SO 105 Úprava ulice Velké Valy**

Na místním šetření v zimním období byla provedena kontrola položeného asfaltového souvrství na tomto objektu, bylo zjištěno, že část nekvalitně provedeného asfaltového souvrství zasahuje i do objektu SO 105 Úprava ulice Velké Valy, které bude nutné také vyměnit za nové asfaltovou souvrství, včetně opravy poškozených částí přídlažby a rektifikace znaků inženýrských sítí.

#### **SO 106 Chodníky**

Na základě skutečně provedených prací sdružení ČNES - BES bylo provedeno geodetické zaměření chodníků a původní rozpočet stavby dle SoD je tímto ZBV upraven na toto zaměřené množství. Jedná se o úpravu ploch dlažby, délky obrubníků, ale i práce souvislé s přípravou chodníků a konstrukčních vrstev.

#### **SO 107 Předláždění chodníků**

Na základě skutečně provedených prací sdružení ČNES - BES bylo provedeno geodetické zaměření chodníků a původní rozpočet stavby dle SoD je tímto ZBV upraven na toto zaměřené množství. Jedná se o úpravu ploch dlažby, délky obrubníků, ale i práce souvislé s přípravou chodníků a konstrukčních vrstev.

#### **SO 190 Dopravní značení**

Stavební objekt dopravního značení je tímto ZBV narovnaný na skutečnost, která byla před uvedením do provozu projednána s Policií ČR a na základě těchto požadavků byl upraven projekt SDZ počty dopravního značení.

#### **SO 301 Úprava odvodnění**

Stavební objekt úpravy odvodnění je tímto změnovým listem narovnaný na počty skutečně provedených uličních vpustí, tomu odpovídající délky přípojek dle tabulky přípojek a všechny práce, které se týkají zemních prací a zásypů jsou narovnány podle tohoto skutečně provedeného množství. V autobusové zastávce před poliklinikou byla na základě místního šetření v zimním období přidána jedna uliční vpust' pro zajištění odvodu vody z autobusové zastávky.

#### **SO 401 Veřejné osvětlení**

Stavební objekt veřejného osvětlení je narovnaný na skutečně provedené práce, dopočítány osazené lampy VO a s tím související délky kabelů, zemnění a zemních prací s tím souvisejících.

#### **SO 801 Vegetační úpravy**

Po dohodě se zástupci Technických služeb města Nymburk, došlo k dohodě, že veškeré práce na vegetačních úpravách provedou tyto technické služby a zajistí zřízení zeleně tak, aby byly ve vzájemné koordinaci s ostatní zelení v okolí stavby.

**ČNES dopravní stavby, a.s.**

IČO: 477 81 734

DIČ: CZ47781734

sídlem Kladno - Kročehlavy, Milady Horákové 2764, PSČ 27201

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4964

**ČNES**  
člen skupiny ČNES

S přátelským pozdravem

L

..

stavby, a.s.  
Kladno

Ing. Vli

**Příloha:**

PR01 – Stanovisko autorského dozoru k ZBV 1 – ZBV 12

PR02 – Vyjádření TDS k předloženým ZBV

V I

tel.: +

e-m

web: [www.cnes.cz](http://www.cnes.cz)

identifikátor datové schránky: rwpdmfa

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., č. ú.:

společnost je držitelem certifikátu ISO 9001 a ISO 14001

V Říčanech

09.06.2022

Evidenční číslo:

Číslo jednací:

Vážený pan

Ing. Vladimír Ložek

Předseda představenstva

ČNES dopravní stavby, a.s.

Milady Horákové 2764,

272 01 Kladno- Kročehlavy

**Věc: Okružní křižovatky Nymburk- II/503 x II/330 a II/503 x II/331- Souhlas se zpracováním ZBV**

Vážený pane vedoucí,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o. (dále jen KSÚS), jako investor akce „Okružní křižovatky Nymburk- II/503 x II/330 a II/503 x II/331“ je seznámena se žádostí o zpracování ZBV na Vámi uvedené okolnosti, které se v projektové dokumentaci ve stupni PDPS nedali předpokládat (viz příloha č. 1 – Oznámení zhotovitele o změnách od společnosti ČNES dopravní stavby, a.s.).

KSÚS bere na vědomí žádost zhotovitele o zpracování ZBV, a proto KSÚS žádá zhotovitele společnost ČNES dopravní stavby, a.s. o vypracování Změnových listů, a to v souladu se směnicí KSÚS, která je nedílnou součástí Smlouvy o dílo. Tyto ZBV budou následně projednány a podrobně posouzeny supervizorem zakázky, následně budou posouzeny vedením KSÚS. Posuzována bude jejich relevantnost a nepředvídatelnost, následně také cenové vyjádření ZBV.

Připomínáme, že je taktéž nutné vyjádření objednatele č. 2, kterým je město Nymburk.

S pozdravem

Přílohy:

1. Oznámení zhotovitele o změnách od společnosti na akci: „Okružní křižovatky Nymburk- II/503 x II/330 a II/503 x II/331“

Spisová značka: MUNYM-050/58225/2022/Hub  
Číslo jednací: MUNYM-050/58225/2022/Hub  
Vyřizuje: Věra Hubená  
Telefon:   
E-mail:   
Nymburk: 27.7.2022

ČNES dopravní stavby, a.s.

Milady Horákové 2764  
272 01 Kladno

Vážení obchodní přátelé,  
připojujeme svůj souhlas se zpracováním ZBV akci „Okružní křižovatky Nymburk – II/503 x II/330 a II/503 x II/331“.

Potvrzujeme, že zástupci města Nymburk byly seznámeni s Vaší žádostí o zpracování ZBV na Vámi uvedené okolnosti, které se v projektové dokumentaci ve stupni PDPS nedaly předpokládat.

S pozdravem

Ing. Jiří Konhefr  
vedoucí



