

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též „**občanský zákoník**“) mezi:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, Praha 5, Smíchov PSČ: 150 00

IČO: 00066001

DIČ: CZ00066001

zastoupená: Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem
nebo dále zastoupená Ing. Janem Fidlerem, DiS, statutárním zástupcem ředitele, na
základě plné moci ze dne 28.06.2022

č. smlouvy: S-2531/00066001/2022

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

Froněk, spol. s r.o.

se sídlem: Rakovník, Zátíší 2488, 269 01

IČO: 47534630

DIČ: CZ47534630

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, oddíl C, vložka 15879

zastoupená Ing. Kamilem Hrbkem, prokuristou

č. smlouvy: 1/12/112

dále jen „**Zhotovitel**“ na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „**smluvní strany**“)

Preamble:

Smluvní strany tímto prohlašují, že dne 20. 09. 2022 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na veřejné zakázce s názvem: „**III/23512 Bzová - Točnick**“ (dále jen „**Smlouva o dílo**“). Na základě dohody smluvních stran a ve vazbě na čl. 14. odst. 13. Smlouvy o dílo, uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jen „**Dodatek č. 1**“).

I. Předmět Dodatku č. 1

1. S ohledem na vznik objektivně nepředvídaných okolností v průběhu realizace prací na díle, které nemohl zhotovitel před zahájením prací předpokládat, a které zapříčinily změnu rozsahu prací v podobě méněprací a víceprací, upravuje se po dohodě smluvních stran předmět Smlouvy o dílo. Změna rozsahu prací v podobě méněprací a víceprací obsahují Objednatel schválené změnové listy, které jsou přílohou tohoto Dodatku č. 1. Na základě změny předmětu díla se mění i celková cena za dílo uvedená v čl. 8. odst. 8.1. Smlouvy o dílo, který nově zní:

- 8.1. Smluvní strany se dohodly, že celková cena Díla je stanovena jako neměnná a konečná a činí:

Původní Cena Díla bez DPH	2.640.270,00 Kč
---------------------------	-----------------

Nová Cena díla dle Dodatku č. 1 bez DPH	2.606.797,70 Kč
DPH 21%	547.427,52 Kč
DPH 15 %	0,- Kč
Cena Díla včetně DPH	3.154.225,22 Kč

Daň z přidané hodnoty (dále též „DPH“) bude na základě výslovné dohody smluvních stran připočtena ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že veškerá množství uvedená v soupise prací k Dílu a jeho jednotlivým částem jsou pouze odhadovaná, a jejich změna neznamená změnu ceny Díla.

Přílohou tohoto Dodatku č. 1 je Objednatelem odsouhlasen Změnový list 1.

II. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 bude uveřejněn dle § 219 zákona o ZVZ na profilu Objednatele.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tento Dodatek č. 1 uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy o dílo. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, která nejsou tímto Dodatkem č. 1 výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze smluvních stran obdrží její elektronický originál.
5. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento Dodatek č. 1 uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto Dodatku č. 1 za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku č. 1 rozhodující.

V Říčanech dne _____

V Rakovníku dne _____

**Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace**

Froněk, spol s r.o.
Ing. Kamil Hrbek
prokurista

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

III/23512 Bzová - Točnick

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

01 Silnice III/23512 v km 9,180 - 10,636

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

01 Silnice III/23512 v km 9,180 - 10,636

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

01/1

Číslo ZBV:

1

Objednatel:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
 Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov
 IČ 00066001

Zhotovitel:

Froněk, spol.s r.o.
 Zátiší 2488, 269 01 Rakovník
 IČ 47534690

Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.3	-33 472,30	0,00	-33 472,30

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1	-33 472,30	0,00	-33 472,30

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.

Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy

a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré:

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: III/23512 Bzová - Točnick	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 01/1	Číslo ZBV: 1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 01 Silnice III/23512 v km 9,180 - 10,636		

Strany smlouvy o dílo objednatel č.: S-2531/00066001/2022 a zhotovitel č.: 1/12/112 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 19.9.2022 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: Froněk, spol.s r.o., Zátíší 2488, 269 01 Rakovník

Přílohy Změnového listu:			Paré č.	Příjemce
1. Krycí list	1	počet listů	1, 2	Objednatel
2. Změnový list	1	počet listů	3	Zhotovitel
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů	4	Projektant (AD)
4. Rozpis ocenění Změn položek ZBV 2	1	počet listů	5	Stavební dozor
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů		
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů		
Další doklady dle přehledu dokladů	5	počet listů		

Iniciátor změny: Zhotovitel

Oprava silnice III/23512 ve staničení km 9,180 - 10,636

1) V rámci zakázky III/23512 Bzová - Točnick bylo dle technické specifikace počítáno s opravou silnice v délce 1 456 metrů v šířce 5,412 m. Celková plocha tedy měla být 7 880 m².

2) Při předání staveniště byl zástupcem objednatele (Martin Šebek) určen začátek a konec úseku zhotoviteli (Tomáš Macálka) - předávací protokol.

3) Firma Froněk, spol. s r.o. provedla práce dle výkazu výměr a po zaměření skutečného provedení geodetem bylo zjištěno:

- Celková zaměřená plocha je 7 749,56 m²

- Délka úseku byla oproti původním 1 456 m o cca 24 m kratší, tj. 1432 m.

4) Tyto změny se týkají položek číslo:

- 113728 - frézování asfalt. ploch, odvoz do 20 km,

- 93818 - čištění vozovek samosběrem,

- 572213 - spojovací postřik z emulze do 0,5 kg/m²,

- 574A44 - asfalt.beton ACO 11S 50/70 tl. 50 mm.

5) Po zjištění skutečného stavu dle zaměření geodetem bylo rozhodnuto o zpracování ZBV.

Jedná se o Změny nepředvídané, které jsou podle čl. 5, odst. 1, písm. c), resp. podle čl. 10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 01.01.2022) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazených do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná o změnu nepředvídanou.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-33 472,30	0,00	-33 472,30	33 472,30

Technická pomoc Objednatel: jméno datum podpis

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí): jméno Tomáš Macálka datum 5. 12. 2022 podpis

Projektant (autorský dozor): jméno xxx datum podpis

Stavební dozor: jméno Blanka Příbylová datum 6. 12. 2022 podpis

Zástupce Objednatel: KSÚS SK, p.o. jméno Karel Motal datum podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smlouvy představené dodatkem Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitel nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel): jméno Ing. Jan Fidler, DiS. datum podpis

Zhotovitel jméno Ing. Kamil Hrbek datum 5. 12. 2022 podpis

Číslo paré:

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 1

Název a evidenční číslo Stavby: III/23512 Bzová - Točník
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 01/1
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 01 Silnice III/23512 v km 9,180 - 10,636

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
2 640 270,00

Poznámka:

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	2 640 270,00	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-33 472,30	0,00	0,00	0,00%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-33 472,30	2 606 797,70	-33 472,30	-1,27%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

souhlasím

Tomáš Macálka

5.12.2022

Projektant (autorský dozor):

souhlasím

xxx

Stavební dozor:

souhlasím

Blanka Příbylová

6.12.2022

Zástupce Objednatele KSÚS:

souhlasím

Karel Motal

Zaměstnanec KSÚS

odpovědný za cenové

projednání Změny:

souhlasím

Ing. Jaroslava Jurková

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 1

Název a evidenční číslo stavby: III/23512 Bzová - Točnick Číslo a název SO/PS: 01 Silnice III/23512 v km 9,180 - 10,636 Číslo a název podobjektu/rozpočtu: 01 Silnice III/23512 v km 9,180 - 10,636								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) 01/1 Skupina změn 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Nové položky													
2	113728	frézování asfalt. ploch, odvoz do 20 km	m3	394,000	387,500	-6,500	233,00	91 802,00	-1 514,50	0,00	90 287,50	-1 514,50	-1,65%
3	93818	čištění vozovek samosběrem	m2	7 880,000	7 749,560	-130,440	2,00	15 760,00	-260,88	0,00	15 499,12	-260,88	-1,66%
5	572213	spojovací postřik z emulze do 0,5 kg/m2	m2	7 880,000	7 749,560	-130,440	7,00	55 160,00	-913,08	0,00	54 246,92	-913,08	-1,66%
6	574A44	asfalt. beton ACO 11S 50/70 tl. 50 mm	m2	7 880,000	7 749,560	-130,440	236,00	1 859 680,00	-30 783,84	0,00	1 828 896,16	-30 783,84	-1,66%
CELKEM								2 022 402,00	-33 472,30	0,00	1 988 929,70	-33 472,30	

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
 Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Tomáš Macálka, stavbyvedoucí

Datum: 5.12.2022

Podpis: 

Za Objednatele: Blanka Příbylová, TDI

Datum: 6.12.2022

Podpis: 

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: III/23512 Bzová - Točník

1	Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH	2 640 270,00
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	2 606 797,70
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	3 154 225,22
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	98,73%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	Sledování změny položek (Skupina 2)	0,00%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	-33 472,30
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	-1,27%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	792 081,00

9=(32A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	1,27%
10=(36A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,00%
10A=32A+36A	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	33 472,30
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	1 320 135,00

12=(1)*0,15	Limit	396 040,50
13=(39)/(1)	Sledování limitu (15%)	0,00%
14=(ABS(37)+(38))	Hodnota skupiny 5	0,00

						- 1 -			- 2 -			- 3 -				- 4 -				- 5 -		
						Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)			Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nepředvidané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)				Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)				Změny de minimis Změny neměnicí celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)		
SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (žadavat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (žadavat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadavat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadavat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (žadavat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (žadavat se znaménkem minus)	Změny kladné	limit 15 %
16	17	18	19=23+26+29+33	20=24+27+30+34+37+39	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	32=29+30	32A=ABS(29)+30	33	34	36=33+34	36A=ABS(33)+34	37	38	39=ABS(37)+38
		III/23512 Bzová - Točník	- 33 472,30	0,00	- 33 472,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 33 472,30	0,00	-33 472,30	33 472,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	1	Silnice III/23512 v km 9,180 - 10,636 / oprava výměr podle geodetického zaměření	- 33 472,30	0,00	- 33 472,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 33 472,30	0,00	-33 472,30	33 472,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	1
Název a evidenční číslo stavby:	III/23512 Bzová - Točník
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	01 Silnice III/23512 v km 9,180 - 10,636
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	01/1

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
07 Změnový soupis prací SO 01 po změně 1	1	
08 Geodetické zaměření skutečného provedení	2	
09 Oznámení zhotovitele o změně a pokyn objednatele ke zpracování ZBV	2	
Počet listů celkem	5	

Změnový soupis prací SO 01 po změně 1 pro ZBV 1

Název a evidenční číslo stavby: III/23512 Bzová - Točnick Číslo a název SO/PS: 01 Silnice III/23512 v km 9,180 - 10,636 Číslo a název podobjektu/rozpočtu: 01 Silnice III/23512 v km 9,180 - 10,636								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) 01/1				
---	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--

Por. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	agregovaná položka	DIO vč. Zajištění, geodetické zaměření stavby	kpl	1,000	1,000	0,000	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00%
2	113728	frézování asfalt. ploch, odvoz do 20 km	m3	394,000	387,500	-6,500	233,00	91 802,00	-1 514,50	0,00	90 287,50	-1 514,50	-1,65%
3	919111	řezání asfaltového krytu vozovek do 50mm	bm	31,000	31,000	0,000	100,00	3 100,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00%
4	93818	čištění vozovek samosběrem	m2	7 880,000	7 749,560	-130,440	2,00	15 760,00	-260,88	0,00	15 499,12	-260,88	-1,66%
5	574A04	Asfaltový beton pro ohrusné vrstvy ACO 11S (lokální vyrovnávka)	m3	3,000	3,000	0,000	4 728,00	14 184,00	0,00	0,00	14 184,00	0,00	0,00%
6	572213	spojovací postřik z emulze do 0,5 kg/m2	m2	7 880,000	7 749,560	-130,440	7,00	55 160,00	-913,08	0,00	54 246,92	-913,08	-1,66%
7	574A44	asfalt. beton ACO 11S 50/70 tl. 50 mm	m2	7 880,000	7 749,560	-130,440	236,00	1 859 680,00	-30 783,84	0,00	1 828 896,16	-30 783,84	-1,66%
8	113761	frézování spár š. do 10mm, hl. do 20mm	m	31,000	31,000	0,000	80,00	1 880,00	0,00	0,00	1 880,00	0,00	0,00%
9	931312	zalévání sprá dilatačních asf.zalivkou	m	31,000	31,000	0,000	50,00	1 550,00	0,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00%
10	12922	čištění krajnic od nánosů tl. do 100 mm s odvozem na skládku	m2	1 450,000	1 450,000	0,000	34,00	49 300,00	0,00	0,00	49 300,00	0,00	0,00%
11	56962	zpevnění krajnic z recyklátu do tl. 100 mm	m2	1 450,000	1 450,000	0,000	73,00	105 850,00	0,00	0,00	105 850,00	0,00	0,00%
12	915111	VDZ V2 - 12,5 cm, barvou, základní	m2	363,000	363,000	0,000	275,00	99 825,00	0,00	0,00	99 825,00	0,00	0,00%
13	15112	poplatky za likvidaci odpadu nekontaminovaných	!	183,000	183,000	0,000	103,00	18 849,00	0,00	0,00	18 849,00	0,00	0,00%
14	915221	vodorovné dopravní značení plastem strukturně nehluché - vodící proužky V2 - 12,5	m2	363,000	363,000	0,000	450,00	163 350,00	0,00	0,00	163 350,00	0,00	0,00%
CELKEM								2 640 270,00	-33 472,30	0,00	2 606 797,70	-33 472,30	-1,27%

**TECHNICKÁ ZPRÁVA – ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ**

Název akce/zakázky : **Oprava komunikace III/23512 Bzová – Březová**
Zaměření asfaltových ploch
Číslo zakázky : 402 / 2022
Katastrální území : Bzová u Hořovic [617318], Březová u Hořovic [614602], Točnick [795704]
Obec : Bzová [531120], Březová [531090], Točnick [534463]
Kraj : Středočeský
Souřadnicový systém : **S-JTSK**
Výškový systém : **Bpv**
Datum provedení měření : 14. 11. 2022
Zaměřil : Kristýna Gregorová, Jan Slivanský
Použité přístroje : GPS Trimble R2 (výř.č. 5849S10961)
Objednavatel : **FRONĚK, spol. s r.o., Zátíší 2488, 269 01 Rakovník**
Dodavatel : MESS GEO s.r.o., K. H. Borovského 1144/4, 434 01 Most

POLNÍ PRÁCE

Polohové a výškové měření provedeno metodou GNSS.
Příjem datových korekcí byl proveden přes síť Trimble VRS Now.
Transformace do S-JTSK byla provedena v transformačním klíči Křovák 2018.

KANCELÁŘSKÉ PRÁCE

Výpočty byly zpracovány programovým systémem Geus 16.0, grafické výstupy byly zpracovány programovým systémem Bentley Map PowerView V8i (SELECTseries 4), určeným ke zpracování naměřených dat, souřadnicovým výpočtům a grafickým výstupům v zeměměřičské praxi.

Jako podklad pro tištěnou část byla použita digitální katastrální mapa.

Veškeré polní a kancelářské práce byly provedeny podle norem platných pro zeměměřičské práce ve výstavbě a přesností a způsobem provedení těmto předpisům odpovídají. Měřičské zápisníky, náčrty a protokoly o výpočtech jsou uloženy v dokumentaci firmy, která měření provedla.

Zakázka je vyhotovena dle platných norem ČSN 01 3410, ČSN 01 3411, ČSN 73 0415 a ČSN ISO 4463.

SEZNAM PŘÍLOH: 1. Seznam souřadnic.
2. Výkresová dokumentace.
3. CD s výstupními formáty txt, pdf, dgn, dxf, dwg.

V Mostě 22. 11. 2022


Číslo ověření : 150 / 2022 / 01

Datum ověření : 22. 11. 2022

**Dílo náležitostmi a přesností odpovídá
právním předpisům a podmínkám
dohodnutým s objednatelem**

Vyhotovil.....
Jan Slivanský

Ověřil.....
Ing. Petra Vokřálová

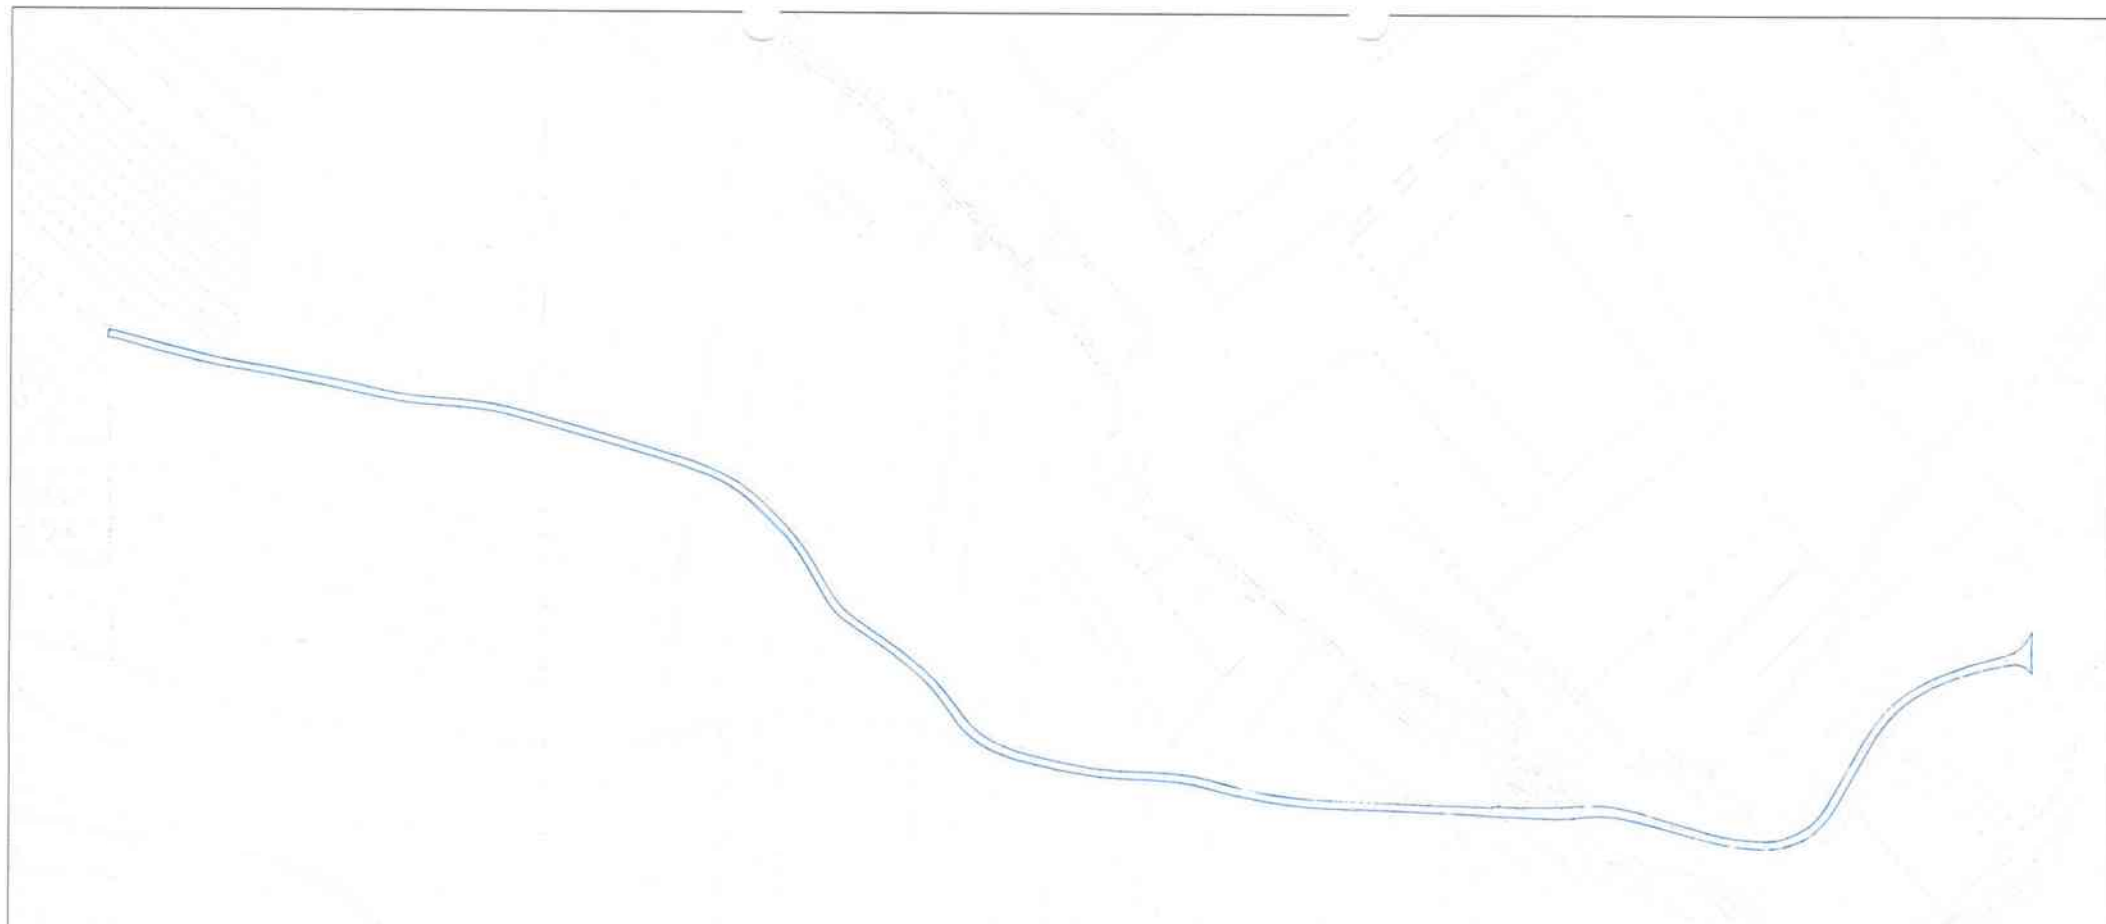

výsledná plocha asfaltu = 7 749,56 m²

ZAMĚŘIL:	VYHOTOVIL:	OVĚŘIL:	MESS GEO s.r.o. messgeo@volny.cz gsm: 777014069 777014090 773304496 773304497 tel: +76108945 fax: +76108920 		
Kristýna Gregorová	Jan Slivanský				
Jan Slivanský					
KAT. ÚZEMÍ: Bzová u Hořovic, Březová u Hořovic, Točnick	OBEC: Bzová u Hořovic, Březová u Hořovic, Točnick	KRAJ: Středočeský			
OBJEDNAVATEL:	FRONĚK, spol. s r.o.				
AKCE/ZAKÁZKA:			ČÍSLO ZAKÁZKY: 402 / 2022		
Oprava komunikace III/23512 Bzová - Březová Zaměření asfaltových ploch			SOUŘAD. SYSTÉM: S-JTSK		
			VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv		
			DATUM: 14. 11. 2022		
			MĚŘITKO: 1 : 5000		
PROJEKT:			ČÍSLO VÝKRESU:		PARÉ:
OBSAH:	zaměření skutečného provedení s výměrami				

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

Froněk spol. s.r.o.
Zátiší 2488
269 01 Rakovník

Vyřizuje/telefon
Motal / ;

Praha
21.11.2022

Věc : „III/23512 Bzová - Točnick“ - změny rozsahu díla

Na základě oznámení zhotovitele zde dne 21.11.2022 se jedná o následující změnu oproti zadávací dokumentaci, kterou nešlo předvídat a která vznikla během realizace stavby „III/23512 Bzová - Točnick“:

- Dle geodetického zaměření skutečného provedení díla bylo zjištěno, že celková výměry živičné vrstvy je menší o 130,44m².

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje jako správce a zároveň zástupce Středočeského kraje jako vlastníka nemovitostí, tj. dotčené silnice III/23512 a jako zadavatel stavby „III/23512 Bzová - Točnick“ tímto vydává zhotoviteli pokyn ke zpracování ZBV k této změně stavby a to v souladu s platnými směrnicemi KSÚS SK a zákonem o zadávání veřejných zakázek.

Karel Motal
vedoucí TSÚ-oblast Kladno

Přílohy: oznámení zhotovitele ke změnám

Froněk, spol. s r.o.
Zátiší 2488, CZ 269 01 Rakovník
tel. +420 313 517 276
fax +420 313 516 361
www.fronek.cz, info@fronek.cz

Vyřizuje: Tomáš Macálka
tel.:

Věc: Oznámení zhotovitele o ZBV

Stavba: „III/23512 Bzová – Točník“

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zhotovitel: Froněk, spol. s r.o.

Žádáme o změnu rozsahu díla na akci „III/23512 Bzová - Točník“. Po zaměření skutečného stavu bylo zjištěno, že celková výměra položené živичné vrstvy je oproti rozpočtu menší o 130,44 m². Došlo ke snížení rozsahu prací u souvisejících položek – frézování asfalt. ploch, čištění vozovek samosběrem a spojovací postřik.

S pozdravem

21-11-2012

Tomáš Macálka
stavbyvedoucí
