

Dodatek č. I (dále jen „Dodatek“)

ke Smlouvě o dílo ze dne 8.6.2017, uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami  
(dále jen „Smlouva“)

„III/33736 KAMENNÉ MOSTY, MOST ev.č. 33736-1“

Číslo smlouvy objednatele: 152/00066001/2017

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace  
se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5  
IČ : 00066001  
DIČ: CZ00066001  
Jednající: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel  
osoba oprávněná jednat  
ve věcech smluvních: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

(dále jen „Objednatel“)

na straně jedné

a

**STRABAG a.s.**

se sídlem: Na Bělidle 198/21, Praha 5, 150 00

IČO: 60838744

DIČ: CZ60838744

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložka 7634  
jejímž jménem jedná Ing. Karel Frankota a Ing. Irena Sedmíková – zmocněnci

č. smlouvy: SDI/841/COCH/0007/17

dále jen „Zhotovitel“ na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též „Smluvní strany“ a jednotlivě jako „Smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl., § 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek dále uvedených, tento Dodatek:

1. Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly, na změně **Článku 4. Doba a místo plnění** a to následovně:

**Článek 4.1. se upravuje následovně:**

Stavba Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 10 dnů od převzetí Staveniště a Dílo dokončit a předat Objednateli **do 10,5 měsíců** od předání Staveniště Zhotoviteli. V případě, že by předání Staveniště, zahájení nebo provádění stavebních prací připadalo na zimní období,

zavazují se smluvní strany, pokud to bude nezbytné, po vzájemné písemné dohodě přiměřeně prodloužit termíny plnění Díla či jeho částí.

Konečný termín pro kompletní dokončení celého díla je do **31.8.2018**


Přílohou tohoto dodatku je opravený harmonogram výstavby, který zohledňuje předpokládané přerušení výstavby v zimním období na 75 dnů a pozastavení prací na 19 dnů z důvodu zjištění nových skutečností – při odhalení rubu konstrukcí kleneb a opěrných zdí byl zjištěn větší rozsah poškození než bylo původně předpokládáno.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.

2. Tento Dodatek je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, které mají platnost originálu. Zhotovitel obdrží po dvou (2) stejnopise a Objednatel obdrží po třech (3) stejnopisech.
3. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

V Říčanech dne **30. 11. 2017**  
Objednatel:

V Praze dne **1. 12. 2017**  
Zhotovitel:



Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace  
Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

STRABAG a.s.  
Ing. Karel Frankota  
Na základě plné moci

STRABAG a.s.  
Ing. Irena Sedmíková  
Na základě plné moci

STRABAG a.s.  
odštěpný závod Praha  
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5  
(236)

za STRABAG a.s.  
PŘEZKOUMAL  
Rosenthalerová Vladimíra

**STRABAG a.s.**  
Dopravní stavitelství  
Odštěpný závod Praha  
Oblast MOSTY  
Ústřední 423/62  
102 00 Praha 10

**STRABAG**

**KSÚS Středočeského kraje,  
Příspěvková organizace  
Bc. Zdeněk Dvořák  
Zborovská 81/11  
150 21 Praha 5**

Vyřizuje:  
Ing. Karel Frankota  
Mobil +420 602 347 276  
karel.frankota@strabag.com

Naše značka:  
2017/11/2

27.11.2017

**Stavba: „III/33736 Kamenné mosty, Most ev.č. 33736-1“**  
Číslo smlouvy Objednatele: 152/00066001/2017  
Číslo smlouvy Zhotovitele: SDI/841/ZOCN/0007/17

**Předmět: Žádost o prodloužení doby výstavby**

Vážený pane řediteli,

Na základě Článku 4. „Doba a místo plnění“ výše uvedené smlouvy o dílo žádáme o prodloužení doby realizace stavby. Smluvní dobu **9 měsíců** požadujeme prodloužit na **10,5 měsíců** (314 dní) z následujících důvodů.

Po obnazení rubů kleneb a poprsních zdí byl zjištěn větší rozsah poškození stávajících nosných konstrukcí. Na základě prohlídky odhalených konstrukcí byl zástupci zúčastněných stran (projektant, památková péče, investor) odsouhlasen nový rozsah a způsob opravy mostu, který má dopad i do prodloužení doby realizace.

Přílohou naší žádosti je podrobný aktualizovaný harmonogram, který je odsouhlasen zástupce investora a zohledňuje zjištěné skutečnosti.

S pozdravem



Ing. Karel Frankota  
Technický vedoucí oblasti  
STRABAG a.s.

Přílohy:

- 1) Aktualizovaný HMG ze dne 16.11.2017

**STRABAG**

STRABAG a.s.  
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5  
(5)


ID	Název úlohy	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Přechodčí
1	2. HMG verze 16.11.2017 - Převzetí staveniště 20.7.2017	1 den	20.7.17	20.7.17	
2	Zpracování a předložení RDS	134 dny	20.7.17	30.11.17 <sup>185</sup>	
3	HMG - III3736 Kamenné mosty, most ev.č. 33736-1	408 dny?	20.7.17	31.6.18	
4	Předání staveniště včetně zahájení DIO	1 den	20.7.17	20.7.17 <sup>188</sup>	
5	Provedení zkoušky očistění části mostu vysokotlakým vodním paprskem, za účasti NPÚ, TDS, zhotovitelem RDS	1 den?	20.7.17	20.7.17 <sup>188</sup>	
6	Očistění dna vodoteče včetně odstranění náletových dřevin	7 dny	21.7.17	27.7.17 <sup>5</sup>	
7	Montáž dočasných lávky pro chodce	3 dny	31.7.17	2.8.17 <sup>185+10 dny</sup>	
8	Montáž podskružení kleneb	7 dny	2.8.17	8.8.17 <sup>175 1 den</sup>	
9	Demolice kompletních zábradelních zdí mostu	3 dny	9.8.17	11.8.17 <sup>4</sup>	
10	Odstanění vozovky v prostoru severní klenby	1 den?	9.8.17	9.8.17 <sup>188</sup>	
11	Zhotovení dočasného brodu na návodní straně mostu včetně přístupových komunikací	6 dny	10.8.17	15.8.17 <sup>10</sup>	
12	Odstanění záspy severní klenby po úroveň opěrných zdí. Včetně obnažení a očistění obvodových zdí mostu	4 dny	14.8.17	17.8.17 <sup>11FS 2 dny</sup>	
13	Dočasná pozastavená práce s ohledem na zjištěné odlišnosti od zadávací dokumentace stavby	19 dny	17.8.17	4.9.17 <sup>12FS 1 den</sup>	
14	Práce spojené se znovu obnovením stavebních prací	1 den?	5.9.17	6.9.17 <sup>13</sup>	
15	Demolice obvodových zdí mostu včetně zajištění, podepření ponechaných částí zdí v prostoru severní klenby. V rozsahu dle požadavků NPÚ, TDS, zhotovitelem RDS a AD	6 dny	6.9.17	11.9.17 <sup>14</sup>	
16	Sanace rubu severní klenby, dále opětovná výstavba nových obvodových zdí a zábradelních zdí	95 dny	12.9.17	15.12.17 <sup>15</sup>	
17	Zhotovení částí koncového povodňového prahu dílečky	1 den?	4.10.17	4.10.17 <sup>16SS+22 dny</sup>	
18	Zásyp mostu včetně izolace a odvodnění	13 dny	23.10.17	4.11.17 <sup>17FS+18 dny</sup>	
19	Dílčedění dna a svahů vodoteče v prostoru severní klenby	64 dny	23.10.17	15.12.17 <sup>18SS</sup>	
20	Zimní přeštávka	75 dny	16.12.17	28.2.18 <sup>19</sup>	
21	Práce spojené se znovu obnovením stavebních prací	1 den	1.3.18	1.3.18 <sup>20</sup>	
22	Odstanění vozovky	2 dny	2.3.18	3.3.18 <sup>21</sup>	
23	Odstanění záspy mostu po úroveň opěrných zdí kleneb. Včetně obnažení a očistění rubu obvodových zdí mostu	8 dny	4.3.18	11.3.18 <sup>22</sup>	
24	Demolice obvodových zdí mostu včetně zajištění, podepření ponechaných částí zdí. V rozsahu dle požadavků NPÚ, TDS, zhotovitelem RDS a AD	7 dny	12.3.18	18.3.18 <sup>23</sup>	
25	Sanace rubu kleneb, dále opětovná výstavba nových obvodových zdí a zábradelních zdí včetně odstranění toxikatu a spárování	160 dny	19.3.18	25.8.18 <sup>24</sup>	
26	Zásyp mostu včetně izolace a odvodnění	30 dny	18.4.18	17.5.18 <sup>25SS+30 dny</sup>	
27	Demontáž podepření kleneb	4 dny	1.5.18	4.5.18 <sup>26FS 17 dny</sup>	
28	Injektáž opěrných zdí kleneb včetně založení mostu	5 dny	20.5.18	24.5.18 <sup>27FS+15 dny</sup>	
29	Zhotovení koncových prahů dílečky	75 dny	5.5.18	18.7.18 <sup>27</sup>	
30	Dílčedění koryta, svahů pod a kolem mostního objektu	110 dny	8.5.18	25.8.18 <sup>28FS+3 dny</sup>	
31	Zhotovení podkladu vozovky, obrub a pokládky nové vozovky	25 dny	1.8.18	25.8.18 <sup>30FS 25 dny</sup>	
32	Dokončovací práce, terénní úpravy, montáž svodidel, vodorovného a svislého dopravního značení	21 dny	10.8.18	30.8.18 <sup>31FS 18 dny</sup>	
33	Demontáž DIO - předání dokončeného díla	1 den	31.8.18	31.8.18 <sup>32</sup>	
34	Výpočet dnů výstavby mostu, 408 - 19 - 75 = 314 dni	1 den?	31.8.18	31.8.18 <sup>33FS 1 den</sup>	



STRABAG a.s.  
odštěpný závod Praha  
Na Benátské 198/21 150 00 Praha 5  
(239)

Přemysl Paulenka

HMG - III3736 Kamenné mosty, most ev.č. 33736-1

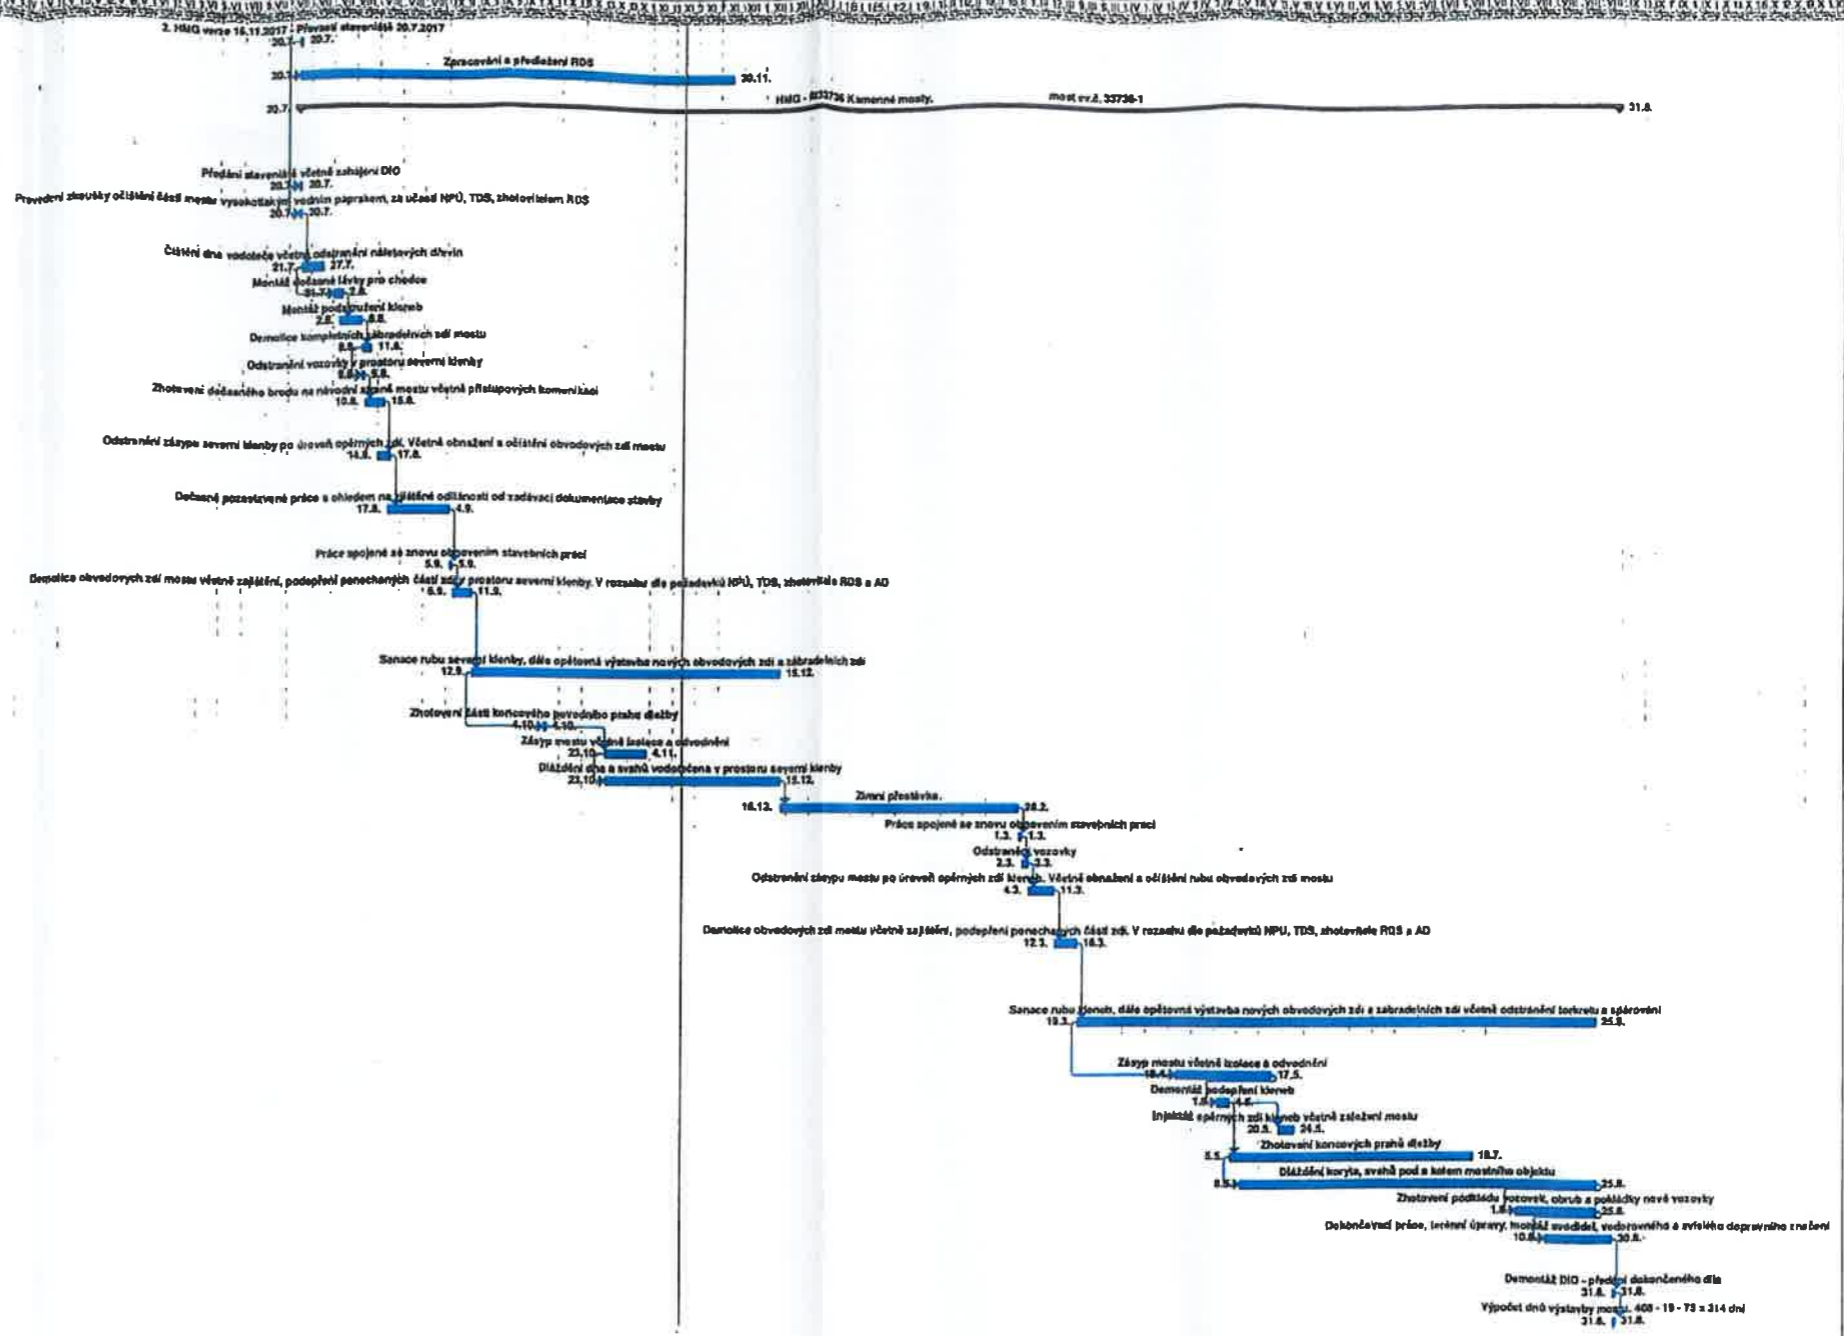

*Součástí s předloženou zprávou  
HMG stavby, která obsahuje zvláštní  
u technologické výstavby (viz zvl. č. 1)  
a předpoklady přečtení práce  
u jiných období 2017/2018.*

Dus 16.11.2017

M. Jeřábek

Krajanská společnost pro výstavbu  
Čižkova 111, Praha 5  
příspěvková organizace  
Zpracováno: 11.11.2017 Praha 5  
ICO: 00950001 DIČ: CZ0950001
