

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též „**občanský zákoník**“) mezi:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, Praha 5, Smíchov PSČ: 150 00

IČO: 00066001

DIČ: CZ00066001

zastoupená: Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem
nebo dále zastoupená Ing. Janem Fidlerem, DiS, statutárním zástupcem ředitele, na
základě plné moci ze dne 28.06.2022

č. smlouvy: S-879/00066001/2022

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

STRABAG a.s.

se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

IČO: 60838744

DIČ: CZ60838744

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634

zastoupená: Davidem Müllerem a Evou Klufovou, v zastoupení dle plné moci z
12.12.2022

č. smlouvy: 841/TC/DB/2022/011/DBJI

dále jen „**Zhotovitel**“ na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „**smluvní strany**“)

Preambule:

Smluvní strany tímto prohlašují, že dne 30.03.2022 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na veřejné zakázce s názvem: „**III/00436 Zalužany - průtah**“ (dále jen „**Smlouva o dílo**“). Na základě dohody smluvních stran a ve vazbě na čl. 14. odst. 14. Smlouvy o dílo, uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jen „**Dodatek č. 1**“).

I. Předmět Dodatku č. 1

1. S ohledem na vznik objektivně nepředvídaných okolností v průběhu realizace prací na díle, které nemohl zhotovitel před zahájením prací předpokládat, a které zapříčinily změnu rozsahu prací v podobě méněprací a víceprací, upravuje se po dohodě smluvních stran předmět Smlouvy o dílo. Jedná se o změnu technologie z důvodu umožnění uzavírky, nově není nutno realizovat dělicí technologickou spáru. Změna rozsahu prací v podobě méněprací a víceprací obsahují Objednatel schválené změnové listy, které jsou přílohou tohoto Dodatku č. 1. Na základě změny předmětu díla se mění i celková cena za dílo uvedená v čl. 8. odst. 8.1. Smlouvy o dílo, který nově zní:

2. Smluvní strany se dohodly, že celková cena Díla je stanovena jako neměnná a konečná a činí:

Původní Cena Díla bez DPH	4 045 837,08 Kč
Nová Cena díla dle Dodatku č. 1 bez DPH	3 930 864,60 Kč
DPH 21%	825 481,57 Kč
DPH 15 %	0,- Kč
Cena Díla včetně DPH	4 756 346,17 Kč

Daň z přidané hodnoty (dále též „DPH“) bude na základě výslovné dohody smluvních stran připočtena ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že veškerá množství uvedená v soupise prací k Dílu a jeho jednotlivým částem jsou pouze odhadovaná, a jejich změna neznamena změnu ceny Díla.

Přílohou tohoto Dodatku č. 1 je Objednatelům odsouhlasen Změnový list 1.

II. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 bude uveřejněn dle § 219 zákona o ZVZ na profilu Objednatel.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tento Dodatek č. 1 uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy o dílo. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, která nejsou tímto Dodatkem č. 1 výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze smluvních stran obdrží její elektronický originál.
5. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento Dodatek č. 1 uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto Dodatku č. 1 za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku č. 1 rozhodující.

V Říčanech dne

V Praze dne

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace

STRABAG a.s.
Eva Klufová, zmocněnec

David Müller, zmocněnec

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

„III/00436 Zalužany - průtah“

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

Číslo ZBV:

1

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

sil. III/00436 od 0,000 do 1,554 km, délka úseku 1.554

01/1

Objednatel: **Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**
 Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov
 IČ: 00066001

Zhotovitel: **STRABAG a.s.**

Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
 IČ: 60838744

Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupiny 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.3	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.4	-114 972,48	0,00	-114 972,48

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1	-114 972,48	0,00	-114 972,48

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
 Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
 a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré: 1

Změnový list				
Název a evidenční číslo Stavby: „III/00436 Zalužany - průtah“ Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): sil. III/00436 od 0,000 do 1,554 km, délka úseku 1.554		Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 01/1	Číslo ZBV: 1.4	
Strany smlouvy o dílo č. S-879/00066001/2022 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 21.4.2022 (dále jen Smlouva): Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov Zhotovitel: STRABAG a.s. se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov				
Přílohy Změnového listu:		Paré č.	Příjemce	
1. Krycí list	1 počet listů	1	Objednatel	
2. Změnový list	1 počet listů	2	Zhotovitel	
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1 počet listů			
4. Rozpis ocenění Změn položek	1 počet listů			
5. Přehled zařazení změn do skupin	1 počet listů			
6. Přehled dalších dokladů	1 počet listů			
Další doklady	11 počet listů			
Iniciátor změny: Zhotovitel				
Popis a zdůvodnění Změny: Změna technologie pokládky obrusné vrstvy				
Zadávací dokumentace předpokládala při opravě povrchu silnice č. III/00436 v obci Zalužany obrusnou asfaltovou vrstvu s podélnou spárou mezi jízdními pruhy a umožnění střídavého provozu řízeného semaforu. Během realizace stavby byla Zhotovitelem navržena a projednána změna přechodného dopravního značení s úplnou uzavírkou částí silnice (se třemi postupnými etapami a odpovídajícími objízdnými trasami) při současně změně technologického postupu pokládky obrusné asfaltové vrstvy ACO 11+50/70 50 mm v celé šíři vozovky (viz doklad č. 11 - DIO a souhlas PČR). Nebylo proto nutné realizovat podélnou pracovní spáru mezi jízdními pruhy (profežávat a zalévat asfaltovou zálivkou), ale byly pouze realizovány příčné pracovní spáry mezi jednotlivými etapami.				
Jedná se o Změnu nepodstatnou, která je podle čl. 5, odst. 5.1 písm.d), resp. podle čl. 11 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29. 05. 2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek zařazena do skupiny 4 jako nezbytná. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 5) se jedná o změnu nezbytnou.				
Údaje v Kč bez DPH:				
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	
-114 972,48	0,00	-114 972,48	114 972,48	
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:				
Zhotovitel (stavbyvedoucí):	jméno	Ing. Vlastimil Ptáček	datum	podpis
Projektant (autorský dozor):	jméno	xxx	datum	podpis
Stavební dozor:	jméno	Boleslav Kostínek	datum	podpis
Supervize:	jméno	xxx	datum	podpis
Zástupce Objednatele:	jméno	Judr. Luděk Beneš	datum	podpis
Zástupce Objednatele odpovědný za cenové projednání Změny:	jméno	Ing. Jaroslava Jurková	datum	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Obchodních podmínek. Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.				
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Ing. Jan Fidler, DIS.	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	David Müller	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	Eva Klufová	datum	podpis
				Číslo paré: 11

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 1**

Název Stavby: „III/00436 Zalužany - průtah“		
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	01/1	
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): sil. III/00436 od 0,000 do 1,554 km, délka úseku 1.554		

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
4 045 837,08

Poznámka:

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	4 045 837,08	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-114 972,48	0,00	0,00	0,00%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-114 972,48	3 930 864,60	-114 972,48	-2,84%

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 1													
Evidenční číslo a název stavby: „III/00436 Zalužany - průtah“ Číslo a název SO/PS: sil. III/00436 od 0,000 do 1,554 km, délka úseku 1.554								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								č. 01					
Skupina Změn: 4													
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	113761	frézování spár š. do 10 mm, hl. do 20 mm	m	1 979,000	467,000	-1 512,00	41,82	82 761,78	-63 231,84	0,00	19 529,94	-63 231,84	-76,40%
13	931312	zalévání spár dilatační asf. zálivkou	m	1 979,000	467,000	-1 512,00	34,22	67 721,38	-51 740,64	0,00	15 980,74	-51 740,64	-76,40%
Celkem								150 483,16	-114 972,48	0,00	35 510,68	-114 972,48	

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu. Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Vlastimil Ptáček

Za Objednatele: Boleslav Kostínek

Datum:

Datum:

Podpis:

Podpis:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: „III/00436 Zalužany - průtah“

1	Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	4 045 837,08
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	3 930 864,60
3=(2/1)*100	Procento změny Přijáté smluvní částky	97,16%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	-114 972,48
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	-2,84%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	1 213 751,12

9=(32A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	0,00%
10=(36A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	2,84%
10A=32A+36A	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	114 972,48
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	2 022 918,54

12=(37/1)*100	Limit 15 %	606 875,58
13=37	Sledování limitu 15%	0,00
14=14266800-37	Hodnota Skupiny 5	0,00

		- 1 -																				- 2 -			- 3 -					- 4 -					- 5 -	
		Vyhrazená změna (Doměrky)																				Záměna položek (Započítávání)			Nepředvídanost					Nezbytnost					Změny de minimis	
SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Procentní vyjádření Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Procentní vyjádření Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny de minimis (15% nebo limit 142 668 000 Kč)	limit 15 %													
16	17	18	19=23+26+29+33	20=24+27+30+34+37+39	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	31=(30/1)*100	32=29+30	32A=ABS(29)+30	33	34	35=(34/1)*100	36=33+34	36A=ABS(33)+34	37	38=(37/1)*100													
Název stavby: „III/00436 Zalužany - průtah“			-114 972,48	0,00	-114 972,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-114 972,48	0,00	0,00	-114 972,48	114 972,48	0,00	0,00													
01	1	síl. III/00436 od 0,000 do 1,554 km, délka úseku 1,554	-114 972,48	0,00	-114 972,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-114 972,48	0,00	0,00%	-114 972,48	114 972,48	0,00	0,00%													

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	1	
Název a evidenční číslo stavby:	„III/00436 Zalužany - průtah“	
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	sil. III/00436 od 0,000 do 1,554 km, délka úseku 1.554	
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	01/1	

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
07 Soupis prací SO po změnách	1	
08 Oznámení Zhotovitele	1	
09 Vyjádření TDI	1	
10 Prohlášení o zaměření	1	
11 DIO a souhlas PČR	7	
počet listů celkem	11	

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 1													
Evidenční číslo a název stavby: „III/00436 Zalužany - průtah“								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: sil. III/00436 od 0,000 do 1,554 km, délka úseku 1.554								č. 1					
Skupina Změn: 4													
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	R položka	DIO vč. zajištění, zjištění a vytyčení inž. sítí, geodetické zaměření stavby	kpl	1,00	1,000	0,00	46 795,49	46 795,49	0,00	0,00	46 795,49	0,00	0,00%
2	113728	frézování asfalt. ploch, odvoz do 20km	m3	620,00	620,000	0,00	678,83	420 874,60	0,00	0,00	420 874,60	0,00	0,00%
3	919111	řezání asfaltového krytu vozovek do 50mm	bm	425,00	425,000	0,00	32,47	13 799,75	0,00	0,00	13 799,75	0,00	0,00%
4	93818	čištění vozovek samosběrem	m2	12932,00	12 932,000	0,00	2,29	29 614,28	0,00	0,00	29 614,28	0,00	0,00%
5	574C06	vyrovnávka asfalt. bet. ACL 16+	m3										
6	574A04	vyrovnávka ACo11+	m3	50,00	50,000	0,00	3 556,24	177 812,00	0,00	0,00	177 812,00	0,00	0,00%
7	572123	spojovací postřik ze sil. emulze do 0,5kg/m2	m2	12932,00	12 932,000	0,00	11,09	143 415,88	0,00	0,00	143 415,88	0,00	0,00%
8	574A44	asfalt. beton ACO 11+ 50/70 tl. 50 mm,	m2	12932,00	12 932,000	0,00	230,58	2 981 860,56	0,00	0,00	2 981 860,56	0,00	0,00%
9	R položka	Sanace konstrukčních vrstev tl. 350 mm (dle technické specifikace)	m2										
10	89921	výšková úprava šachty, vpusti	ks	9,00	9,000	0,00	2 464,24	22 178,16	0,00	0,00	22 178,16	0,00	0,00%
11	89923	výšková úprava krycích hrnců	ks										
12	113761	frézování spár š. do 10mm, hl. do 20mm	m	1979,00	467,000	-1 512,00	41,82	82 761,78	-63 231,84	0,00	19 529,94	-63 231,84	-76,40%
13	931312	Zalévání spár dilatační asf. zálivkou	m	1979,00	467,000	-1 512,00	34,22	67 721,38	-51 740,64	0,00	15 980,74	-51 740,64	0,00%
14	12922	čištění krajnic od nánosů tl do 100 mm s odvozem na skládku	m2	800,00	800,000	0,00	28,99	23 192,00	0,00	0,00	23 192,00	0,00	0,00%
15	56962	zpevnění krajnic z recyklátu do tl. 100mm	m2	800,00	800,000	0,00	39,85	31 880,00	0,00	0,00	31 880,00	0,00	0,00%
16	12931	čištění příkopu do 0,25m3/m s odvozem na skládku	m										
17	12932	čištění příkopu do 0,5m3/m s odvozem na skládku	m										
18	014102b	poplatky za likvidaci odpadu nekontaminovaných	t	112,00	112,000	0,00	35,10	3 931,20	0,00	0,00	3 931,20	0,00	0,00%
19	91551	VDZ- předem připravené symboly	ks										
20	915111	VDZ V2 - 12,5 cm, barvou, základní	m2										
21	915211	VDZ - vodící proužky V2 -12,5, přechod pro chodce atd., plast, retroreflexní	m2										
	Celkem							4 045 837,08	-114 972,48	0,00	3 930 864,60	-114 972,48	-2,84%

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Sídlo: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov
IČO: 00066001
DIČ: CZ00066001
Zastoupený: Ing. Aleš Čermák Ph.D. MBA.
Kontaktní osoba: Boleslav Kostínek, technický dozor investora

Vyřizuje:
Ing. Jiří Bauer

22.8.2022

Předmět: Oznámení o zjištění skutečností

„III/00436 Zalužany - průtah“

Vážený pane,

z důvodu technologického postupu pokládky obrusné asfaltové vrstvy ACO 11+ 50/70 50 mm, nebude nutné podélnou pracovní spáru mezi jízdními pruhy prořezávat a zalévat asf. zálivkou.

S přátelským pozdravem
Ing. Jiří Bauer



Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Sídlo: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov
IČO: 00066001
DIČ: CZ00066001

Vyřizuje:
Boleslav Kostínek
Mobil

23.8.2022

Předmět: Souhlasné stanovisko TDI

„III/00436 Zalužany - průtah“

V návaznosti na projednání technologického postupu pokládky ohrusné asfaltové vrstvy ACO 11+ 50/70 50 mm, v rámci akce Zalužany – průtah, souhlasím s navrženou a projednanou změnou. Jmenovitě souhlasím s tím, že nebude nutné podélnou pracovní spáru mezi jízdními pruhy prořezávat a zalévat asfaltovou zálivkou.

S pozdravem
Boleslav Kostínek

STRABAG a.s.
Odstěpný závod Praha

STRABAG

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Sídlo: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov
IČO: 00066001
DIČ: CZ00066001
Zastoupený: Ing. Aleš Čermák Ph.D. MBA
Kontaktní osoba: Boleslav Kostínek, technický dozor investora

Vyřizuje
Ing. Jiří Bauer

K
J

2.9.2022

Předmět: Protokol zhotovitele o plnění zakázky dle SOD

„III/00436 Zalužany - průtah“

Vážený pane,

stavba byla provedena v rozsahu dle SOD s výjimkou položek frézování spár š. do 10 mm, hl do 20 mm a zalévání spár dilatační asfaltovou zálivkou. Z důvodu změny technologie pokládky asfaltové vrstvy nebylo nutné provádět prořezání a zalití podélné pracovní spáry mezi jízdními pruhy asfaltovou zálivkou v délce 1512 m.

S přátelským pozdravem
Ing. Jiří Bauer


B. K

Schéma dopravního značení - přechodná úprava provozu, dopravní omezení na silnici č. I/4 a III/00436 v obci Zalužany z důvodu opravy povrchu. 1 etapa, frézování povrchu


LEGENDA:

 FRÉZOVANÝ ÚSEK (1540m)

SCHÉMA 1 : POSUVNÉ PRACOVNÍ MÍSTO
V PRACOVNÍ DOBĚ OD 7⁰⁰ DO 17⁰⁰ HOD.
max. 30 m



Provoz řízen náležitě poučenou osobou

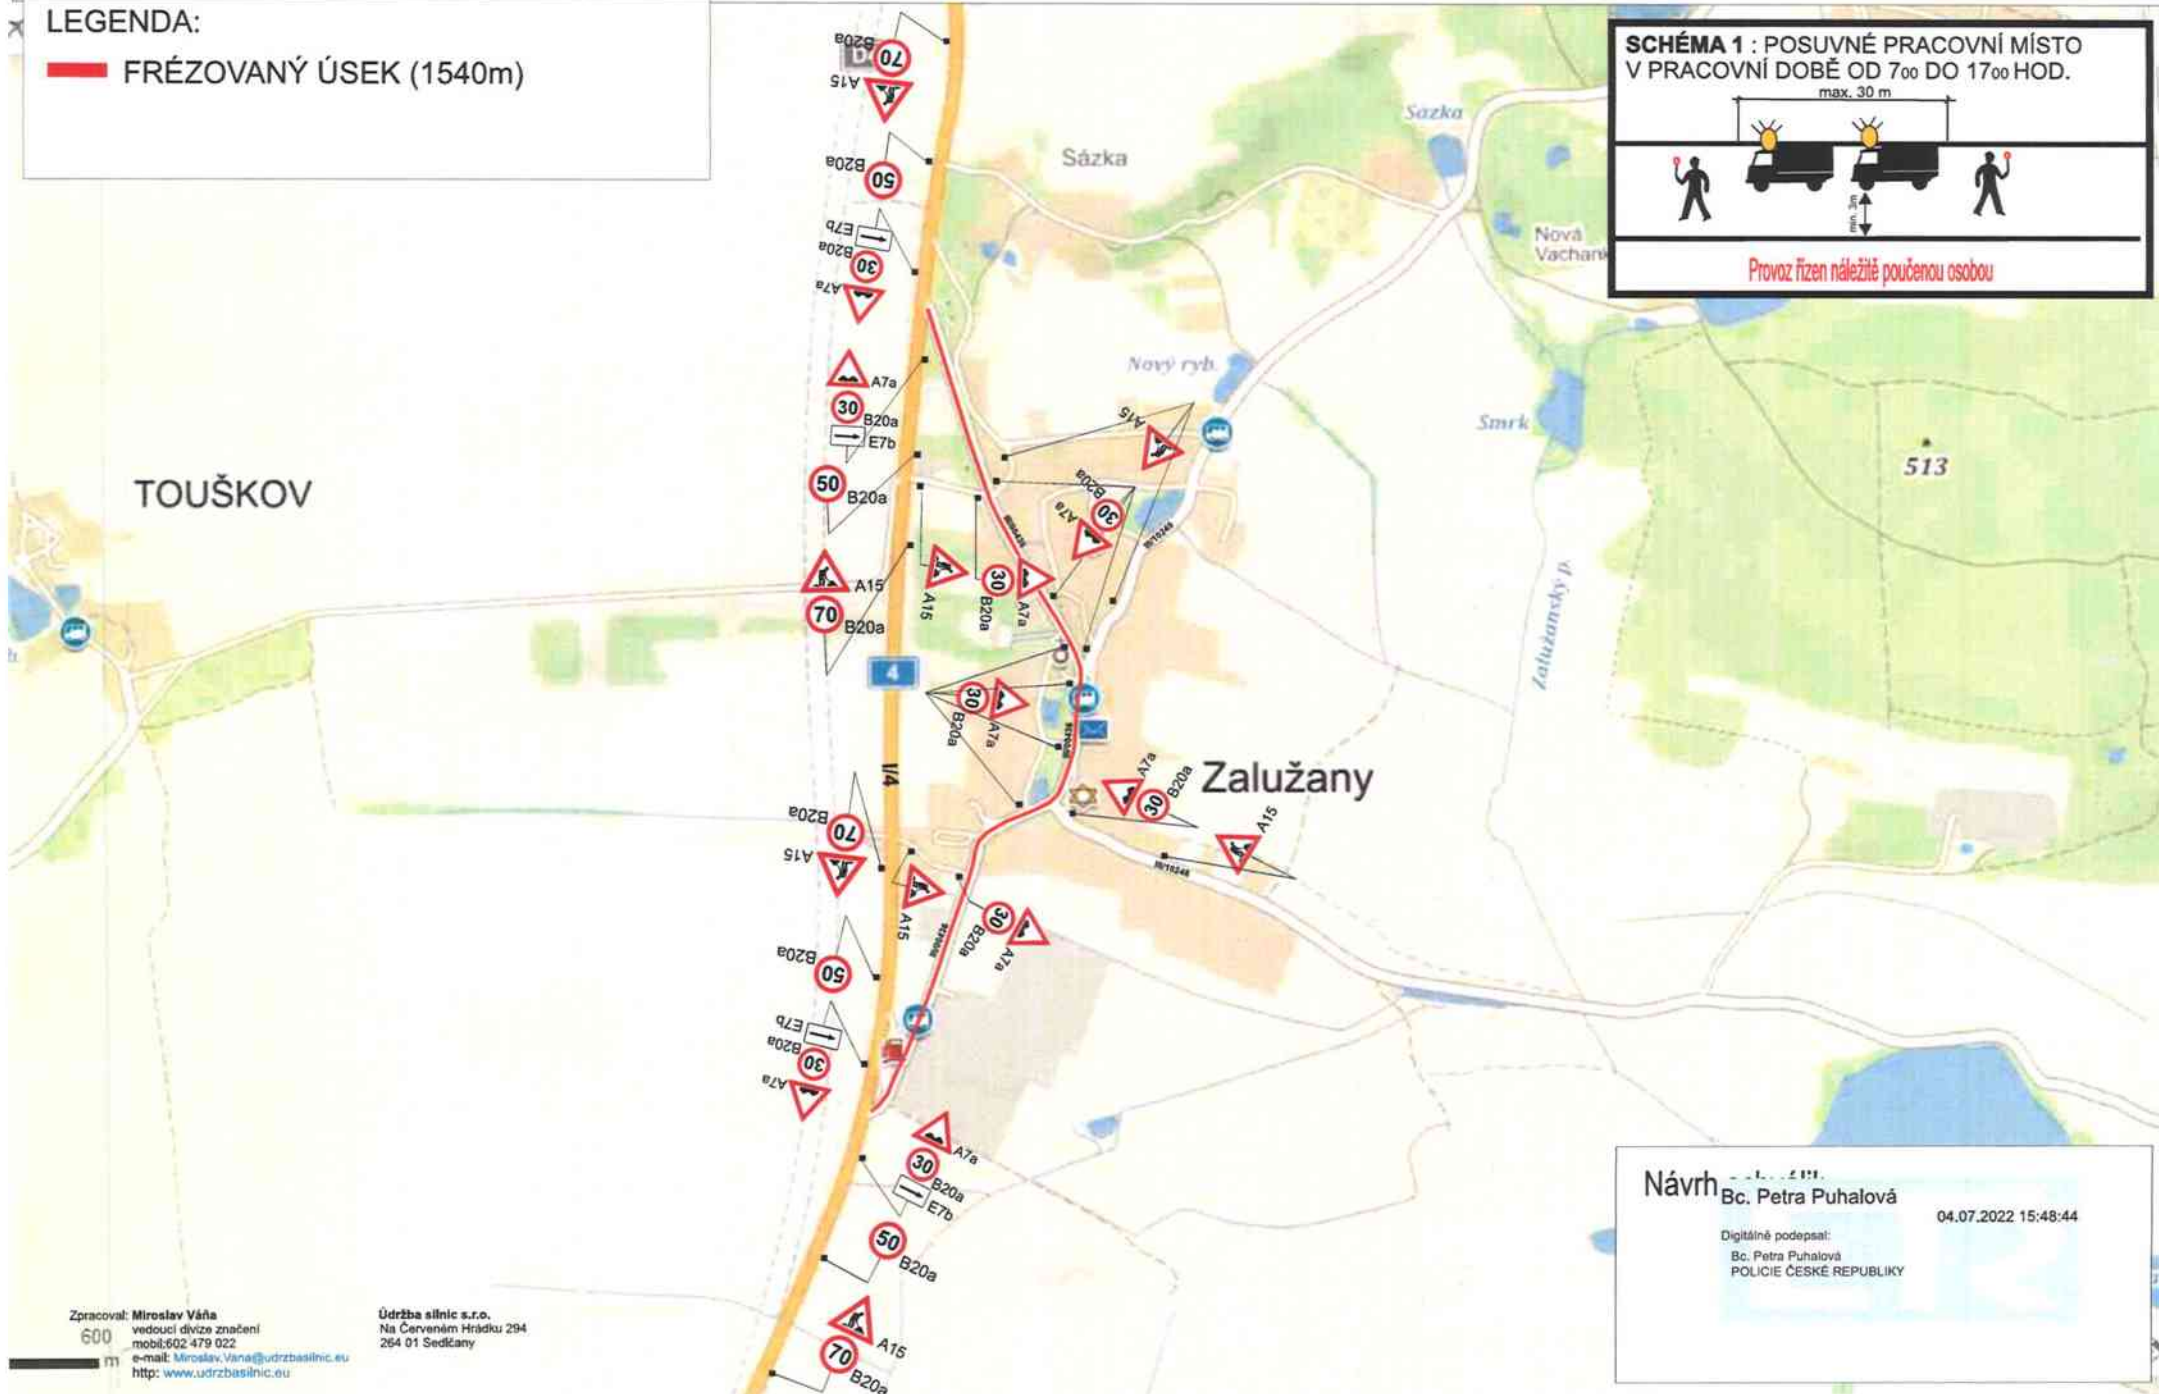

Návrh
Bc. Petra Puhalová

04.07.2022 15:48:44

Digitálně podepsal:
Bc. Petra Puhalová
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

Schéma dopravního značení - přechodná úprava provozu, úplná uzavírka silnice III/00436 v obci Zalužany z důvodu opravy povrchu uzavírka - 2 etapa

Návrh schválil:

Bc. Petra Puhalová

04.07.2022 15:49:07

Digitálně podepsal:
Bc. Petra Puhalová
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

LEGENDA:

- FRÉZOVANÝ ÚSEK
- UZAVŘENÝ ÚSEK (650m)

OBJÍZDNÁ TRASA 2 300m

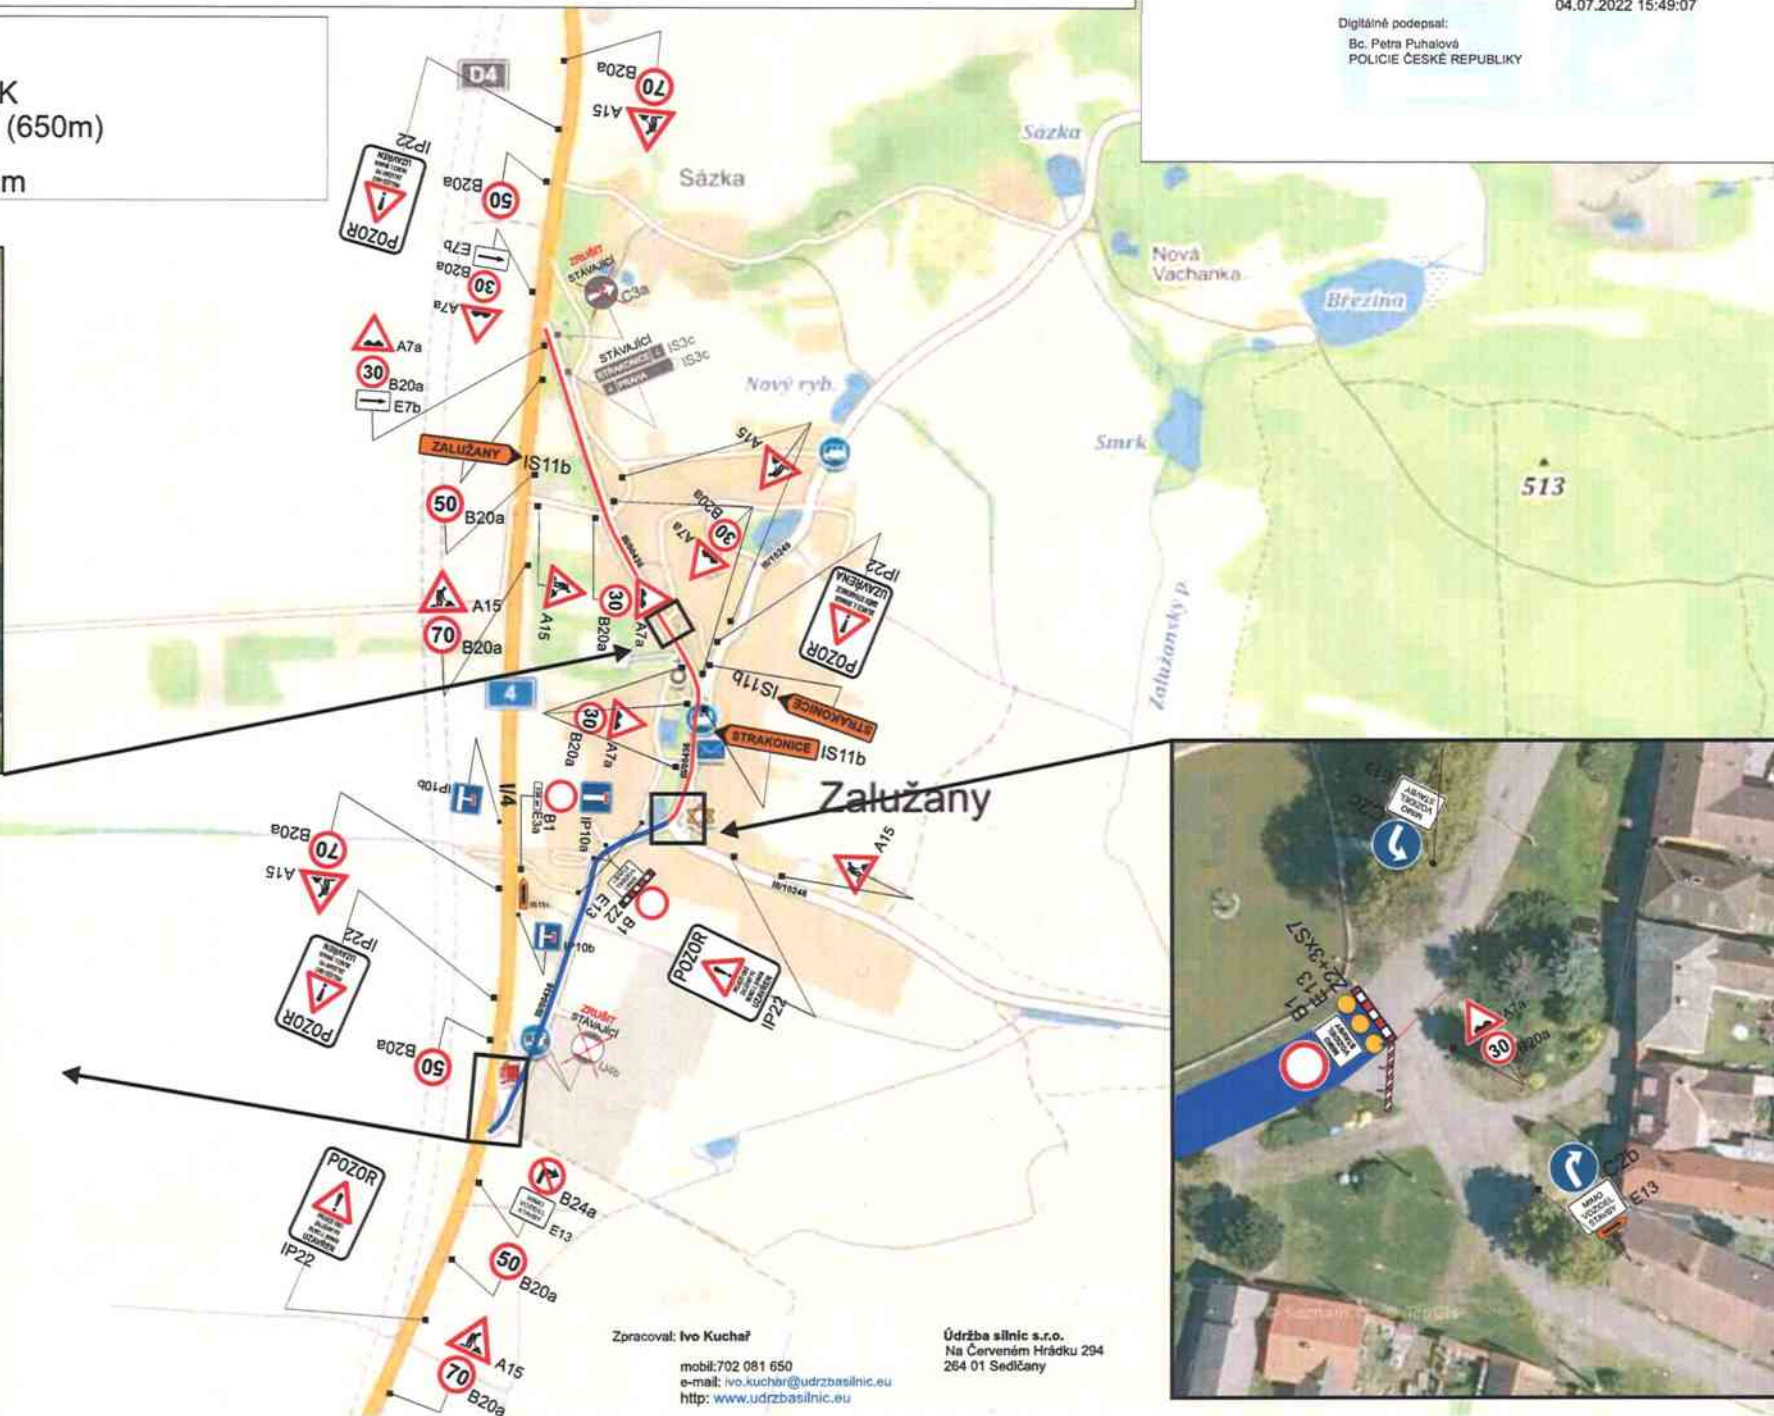


Schéma dopravního značení - přechodná úprava provozu, úplná uzavírka silnice III/00436 v obci Zalužany z důvodu opravy povrchu uzavírka - 3 etapa

Návrh schválil:

Bc. Petra Puhalová


04.07.2022 15:49:28

Digitálně podepsal:
Bc. Petra Puhalová
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

LEGENDA:

- FRÉZOVANÝ ÚSEK
- UZAVŘENÝ ÚSEK (220m)

OBJÍZDNÁ TRASA 2 700m

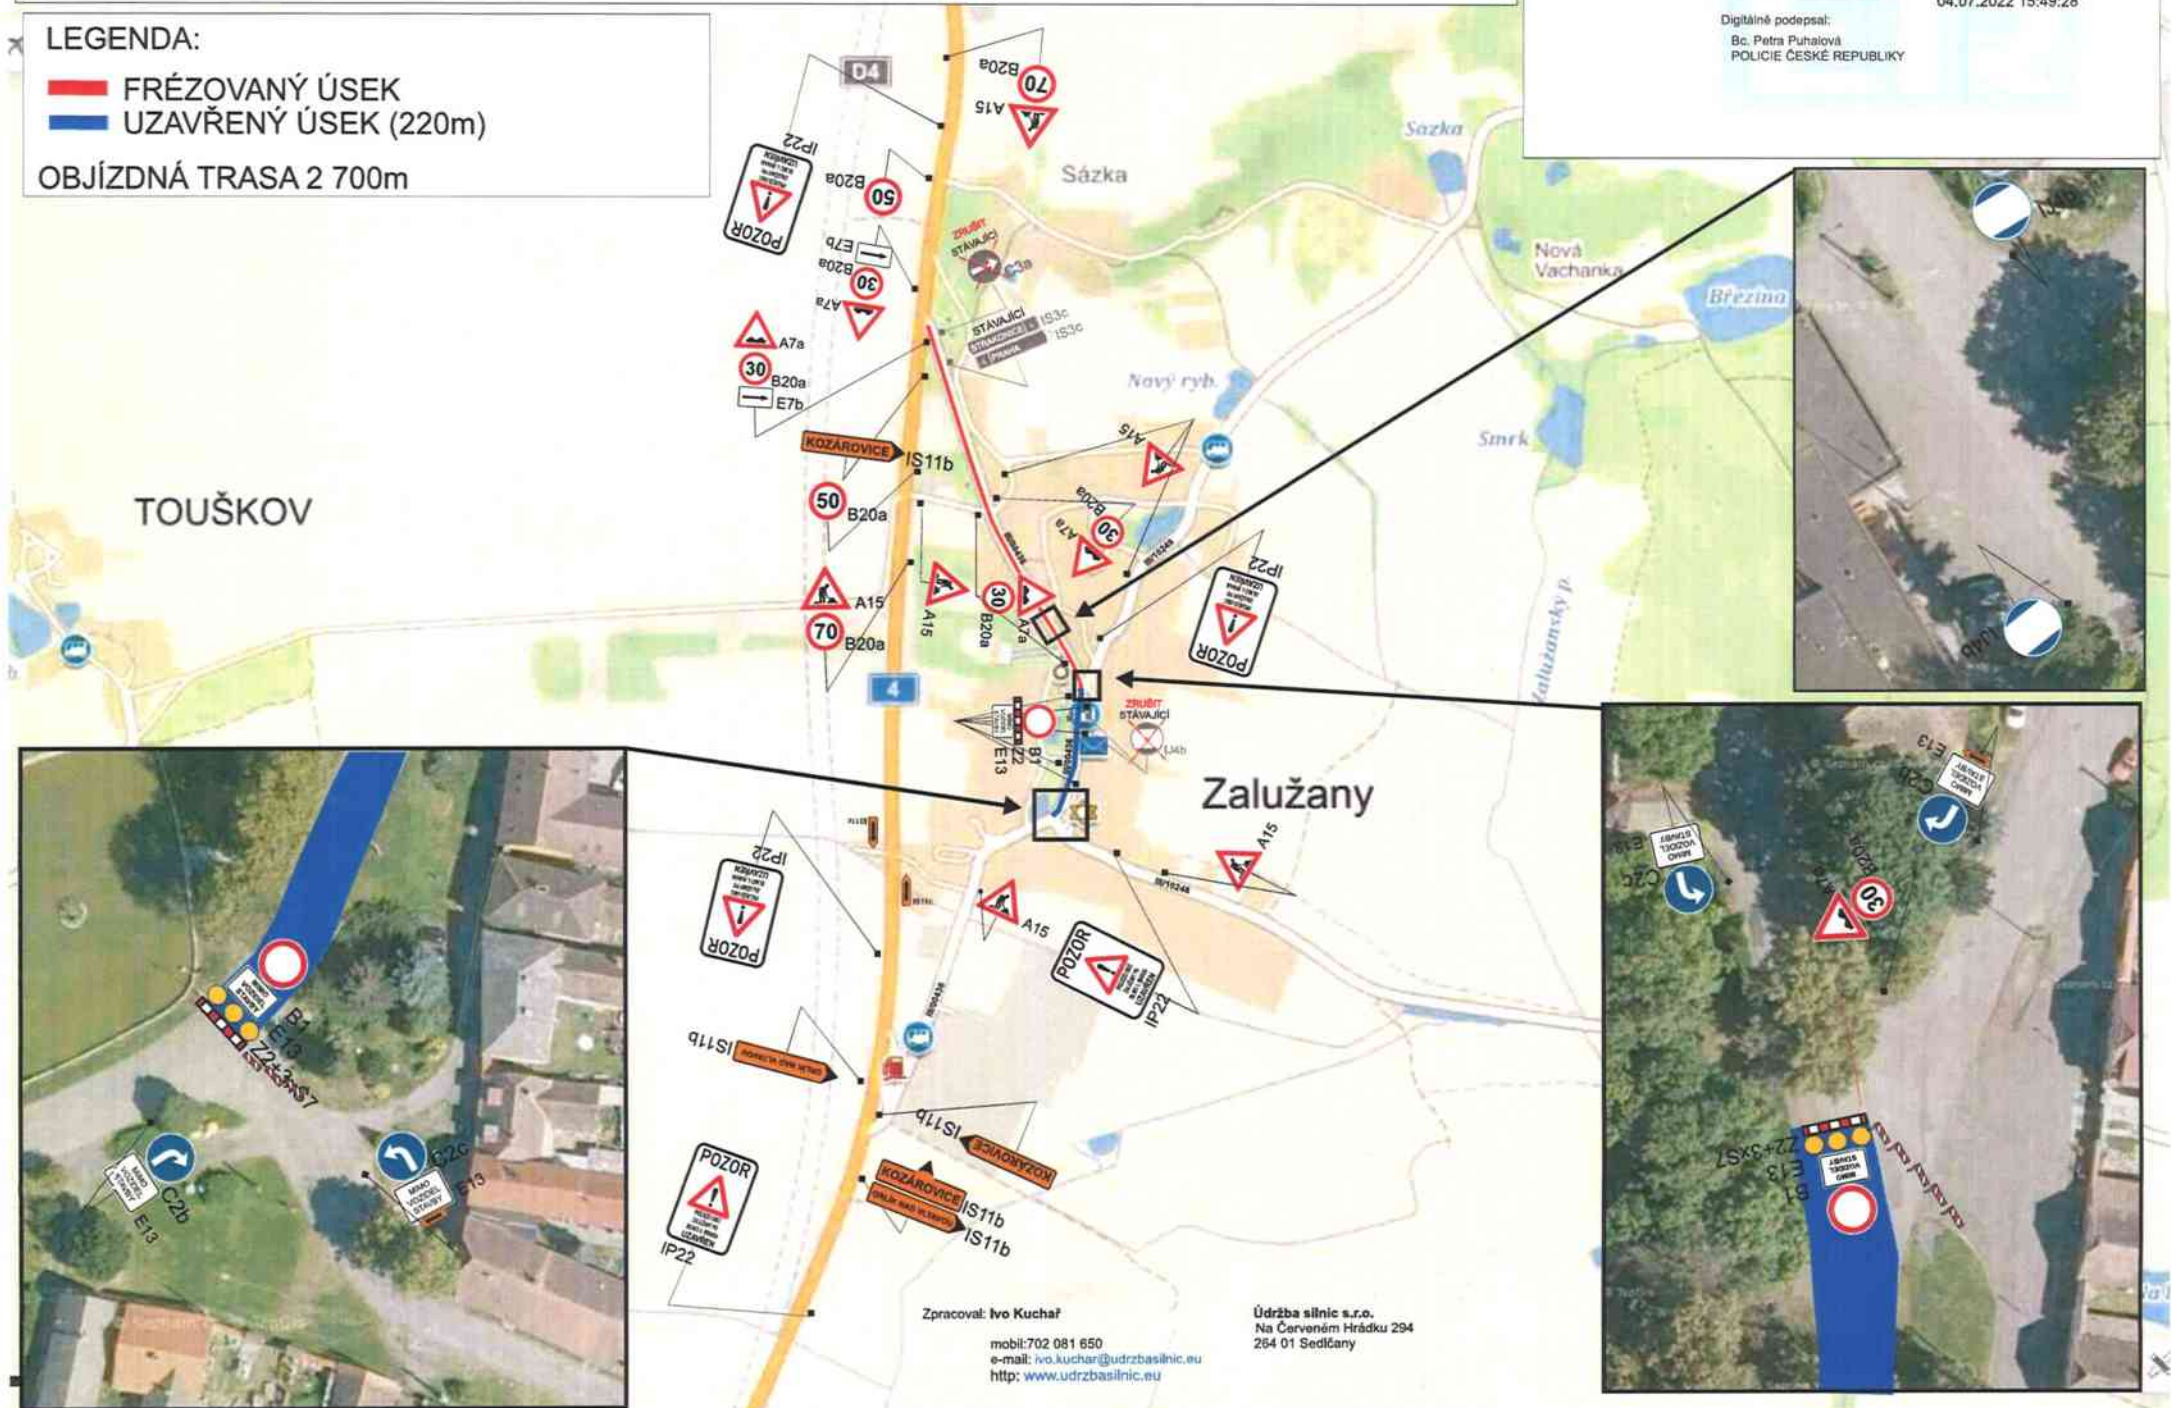

Zpracoval: Ivo Kuchař
mobil: 702 081 650
e-mail: ivo.kuchar@udrzbasilnic.eu
http: www.udrzbasilnic.eu

Údržba silnic s.r.o.
Na Červeném Hrádku 294
264 01 Sedčický

Schéma dopravního značení - přechodná úprava provozu, úplná uzavírka silnice III/00436 v obci Zalužany z důvodu opravy povrchu uzavírka - 4 etapa

Návrh schválil:

Bc. Petra Puhalová


04.07.2022 15:49:50

Digitálně podepsal:
Bc. Petra Puhalová
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

LEGENDA:

UZAVŘENÝ ÚSEK (670m)

OBJÍZDNÁ TRASA 2 200m

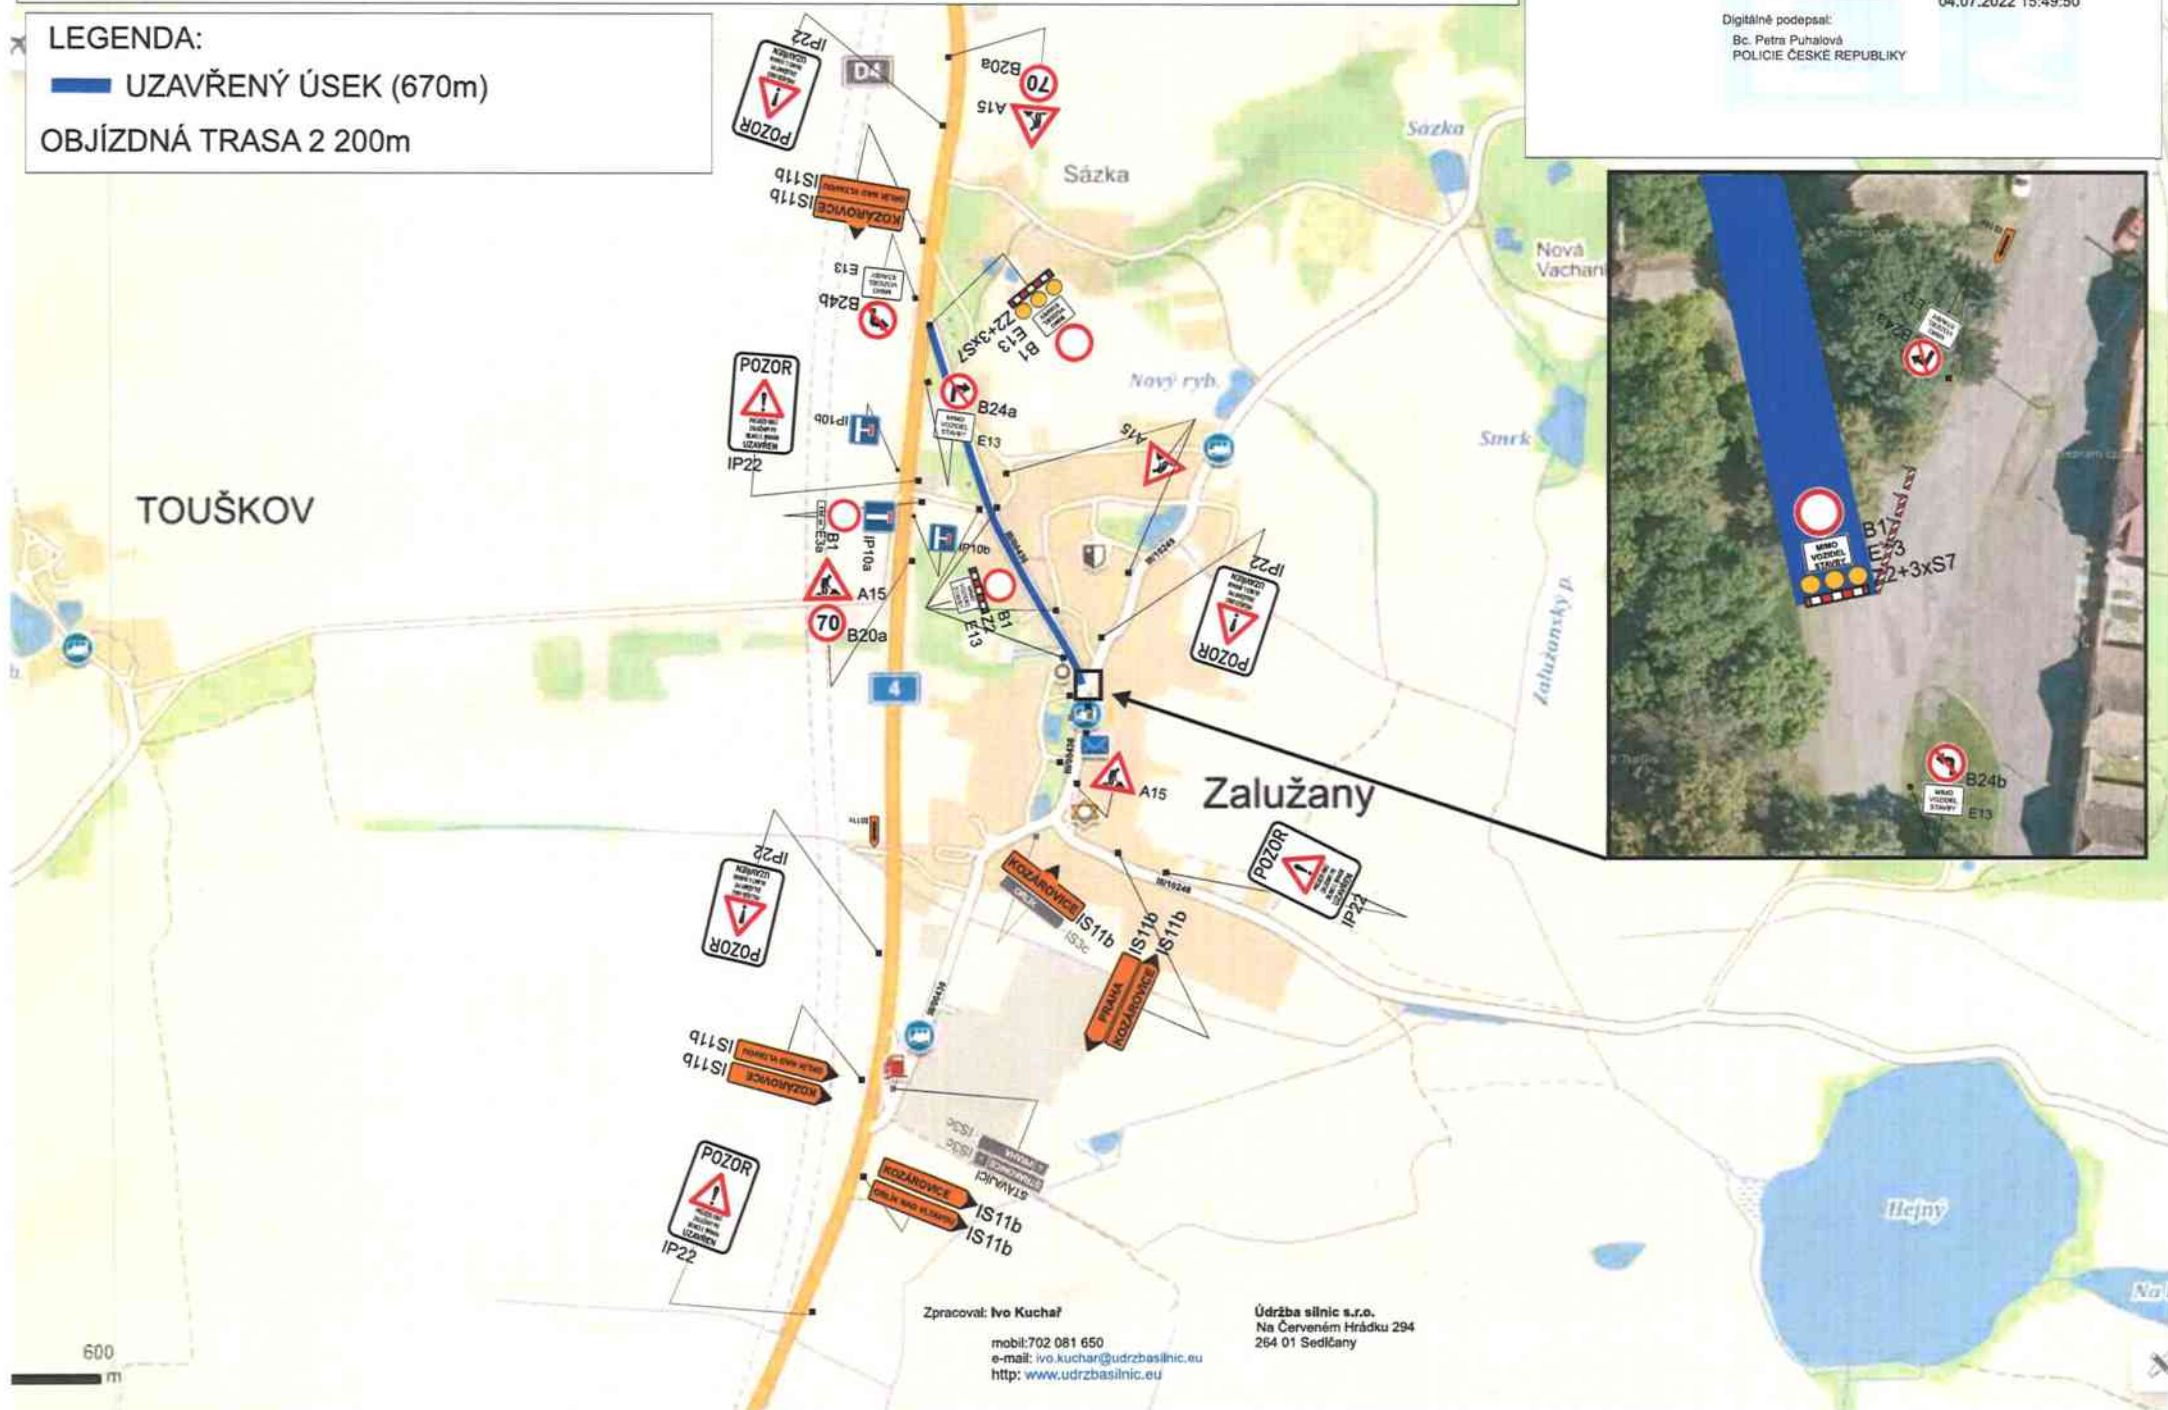

Zpracoval: Ivo Kuchař


mobil: 702 081 650
e-mail: ivo.kuchar@udrzbasilnic.eu
http: www.udrzbasilnic.eu

Údržba silnic s.r.o.
Na Červeném Hrádku 294
264 01 Sedčany

Schéma dopravního značení - přechodná úprava provozu, dopravní omezení na silnici č. I/4 a III/00436 v obci Zalužany z důvodu opravy povrchu - **etapa 5** dokončovací práce

LEGENDA:

 DOKONČOVACÍ PRÁCE - ÚSEK (1540m)

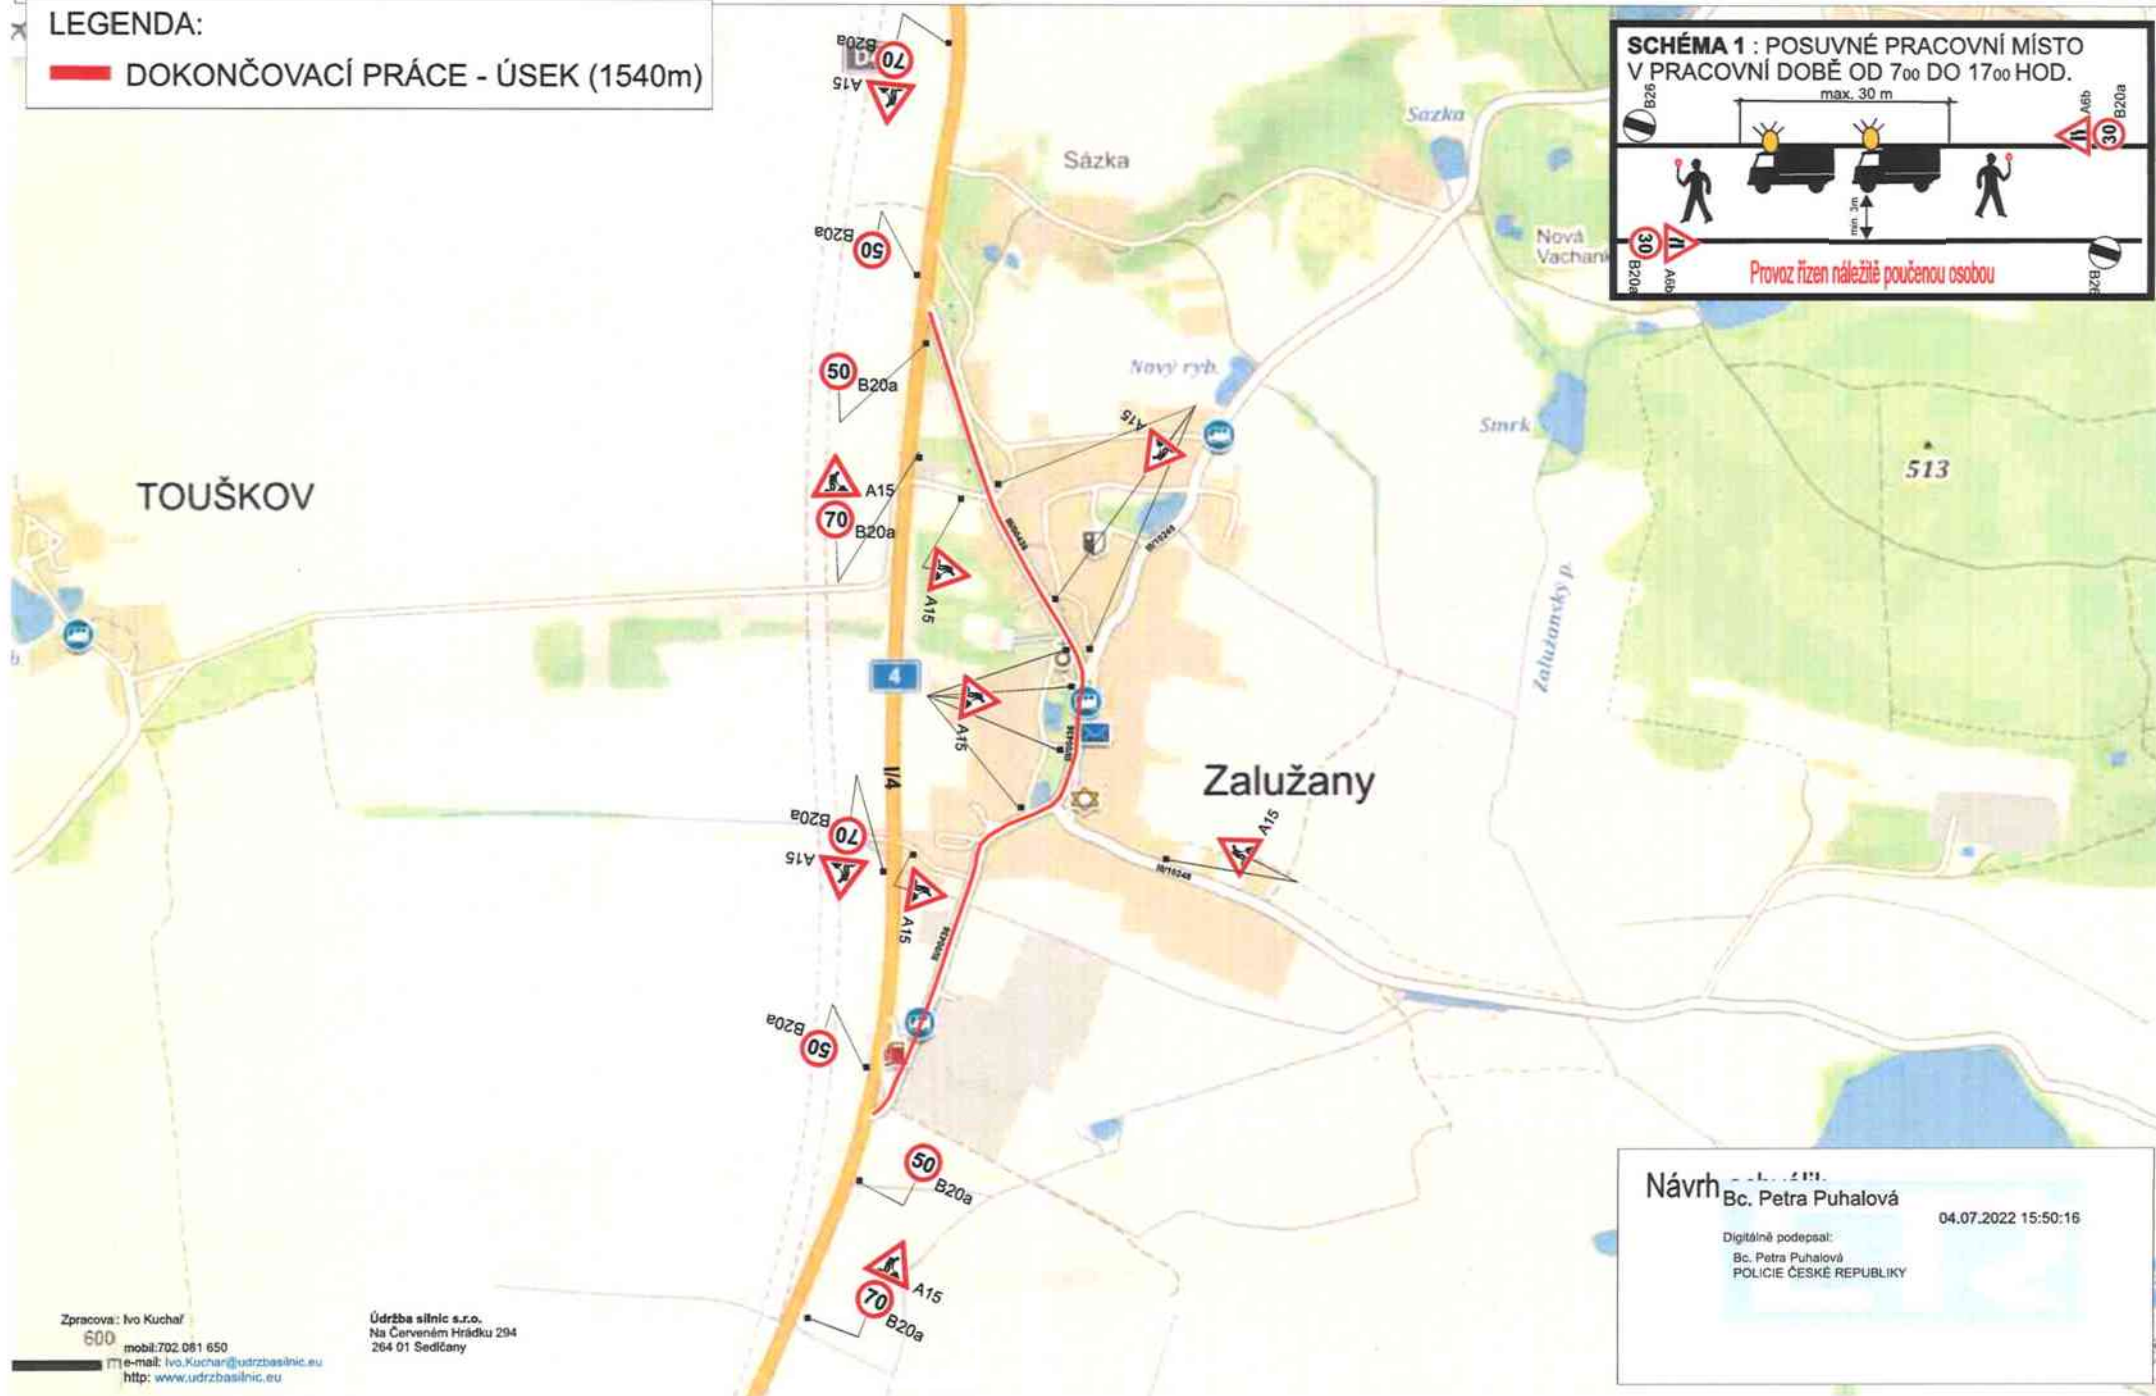

Návrh
Bc. Petra Puhalová 04.07.2022 15:50:16

Digitálně podepsal:
Bc. Petra Puhalová
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Středočeského kraje
Územní odbor Příbram
Dopravní inspektorát
Žežická 498, 26123 Příbram V - Zdaboř

Č. j. KRPS-147230-2/ČJ-2022-011106

Příbram V - Zdaboř 4. července 2022

Počet stran: 2

Přílohy: 1x DIO

Údržba silnic s.r.o.
Na Červeném Hrádku 294
264 01 Sedlčany

Závazné stanovisko ke zvláštnímu užívání komunikace a stanovisko k DIO pro opravu povrchu silnice č. III/00436 v obci Zalužany

Policie ČR, Územní odbor Příbram, Dopravní inspektorát na základě předložené žádosti s přílohou, jako přízvaný příslušný orgán Policie České republiky podle ustanovení § 24 odst. 2 písm. d), § 25 odst. 6 písm. c) bod 3 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů a § 77 odst. 2 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích

s o u h l a s í

se zvláštním užíváním komunikace a s návrhem přechodného dopravního značení **pro dopravní omezení z důvodu opravy povrchu silnice č. III/00436 v obci Zalužany za úplné uzavírky části silnice**, dle předloženého návrhu přechodného dopravního značení, který je nedílnou součástí tohoto vyjádření.

Realizace stavebních prací bude probíhat tak, aby nebyla v kolizi s jinými uzavírkami.

Stávající DZ, které by bylo v rozporu s PDZ, bude zřetelně zneplatněno. Veškeré DZ bude v souladu s platnými normami, vyhláškou č. 294/2015 Sb. a bude osazeno v souladu s platnými TP 66 subjektem oprávněným k instalaci dopravního značení. Osobou odpovědnou za PDZ bude prováděna pravidelná kontrola stavu tohoto značení a v případě zjištěné závady na PDZ bude tato závada bezodkladně odstraněna.

Policie České republiky, jakožto dotčený orgán vydávající závazné stanovisko, s předloženým návrhem souhlasí, neboť při dodržení výše uvedených podmínek, návrh odpovídá obecným požadavkům na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.

PČR DI Příbram si vyhrazuje toto stanovisko doplnit nebo činit návrhy a opatření v zájmu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na dotčených komunikacích.

Zpracoval:
por. Bc. Petra Puhalová
Tel:

npor. Bc. Zdeněk Míka
vedoucí DI Příbram

schváleno elektronicky
