

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic - zbývajících úsek

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Dopravní značení

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

161.2 / 1

Číslo ZBV:

20Objednatel: **Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**

Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov

IČ: 00066001

Město Beroun

Husovo náměstí 68, 266 01 Beroun - Centrum

IČ: 00233129

Město Králův Dvůr

náměstí Míru 139, 267 01 Králův Dvůr

IČ: 00509701

Zhotovitel:

STRABAG a.s.

Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 – Jinonice

IČ: 60838744

Rekapitulace ZBV č. 20 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
20.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
20.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
20.3	-177 850,32	210 317,71	32 467,39

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
20.4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
20.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
20	-177 850,32	210 317,71	32 467,39

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic - zbývajících úsek Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Dopravní značení	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 161.2 / 1	Číslo ZBV: 20.3
---	--	--

Strany smlouvy o dílo č. S - 2256/00066001/2021 KSÚS na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 25.10.2021 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov a Město Beroun se sídlem Husovo náměstí 68, 266 01 Beroun - Centrum a Město Králův Dvůr se sídlem náměstí Míru 139, 267 01 Králův Dvůr

Zhotovitel: STRABAG, a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 – Jinonice

<u>Přílohy Změnového listu:</u> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;">1. Krycí list</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">1</td> <td style="width: 50%;">počet listů</td> </tr> <tr> <td>2. Změnový list</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>4. Rozpis ocenění Změn položek</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>5. Přehled zařazení změn do skupin</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>6. Přehled dalších dokladů</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>Další doklady</td> <td style="text-align: center;">25</td> <td>počet listů</td> </tr> </table>	1. Krycí list	1	počet listů	2. Změnový list	1	počet listů	3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů	4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů	5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů	6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů	Další doklady	25	počet listů	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">Paré č.</td> <td style="width: 70%;">Příjemce</td> </tr> <tr> <td>1,2</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Projektant</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>TDI</td> </tr> </table>	Paré č.	Příjemce	1,2	Objednatel	3	Zhotovitel	4	Projektant	5	TDI
1. Krycí list	1	počet listů																														
2. Změnový list	1	počet listů																														
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů																														
4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů																														
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů																														
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů																														
Další doklady	25	počet listů																														
Paré č.	Příjemce																															
1,2	Objednatel																															
3	Zhotovitel																															
4	Projektant																															
5	TDI																															

Iniciátor změny:

Popis a zdůvodnění Změny:

Při projednávání návrhu trvalého dopravního značení došlo ze strany Odboru dopravy města Beroun a Policie Středočeského kraje k předložení požadavků na doplnění a úpravu návrhu dopravního značení oproti předpokladu PDPS. Úpravy množství položek soupisu prací byly provedeny na základě Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, vydaných Odborem dopravy a správních agend Městského úřadu Beroun, ze dne 19.12.2022 a 15.2.2023.

Tato Změna vznikla na základě nových zjištění při provádění stavby.

Jedná se o Změnu nepodstatnou, nepředvídanou, která je tak podle § 5, odst. 1, písm.c), resp. podle § 10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29.05.2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena **do Skupiny 3**. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6 se jedná o změnu nepředvídanou.

Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-177 850,32	210 317,71	32 467,39	388 168,03

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí)	jméno	Ing. Jan Novák	datum	podpis
Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Martin Máša	datum	podpis
Zástupce Objednatel KSÚS SK	jméno	Martin Voříšek	datum	podpis
Technický dozor stavby (TDS)	jméno	Pavel Novák	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněně jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel)	jméno	Ing. Jan Fidler, DiS.	datum	podpis
	jméno	RNDr. Soňa Chalupová	datum	podpis
	jméno	Petr Vychodil	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	Ing. Tomáš Hajič	datum	podpis
	jméno	Ing. Karel Klofáč	datum	podpis

	Číslo paré:
--	-------------

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 20**

Název Stavby: II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic - zbývajcí úsek	
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 161.2 / 1	
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Dopravní značení	

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
574 308,07

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	574 308,07	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-177 850,32	210 317,71	210 317,71	36,62%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-177 850,32	606 775,46	32 467,39	5,65%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): Ing. Jan Novák

Projektant (autorský dozor): Ing. Martin Máša

Technický dozor stavby (TDS) Pavel Novák

Zástupce Objednatele KSÚS SK: Martin Voříšek

Zaměstnanec KSÚS SK
odpovědný za cenové projednání Ing. Jaroslava Jurková
Změny:

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 20.3

Evidenční číslo a název stavby: II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic - zbývajcí úsek								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: SO 161.2 - Dopravní značení								č. 1					
Číslo a název rozpočtu: SO 161.2 - Dopravní značení								Skupina Změn: 3					
č.p.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	kus	42,00	44,00	2,00	169,74	7 129,08		339,48	7 468,56	339,48	4,76
2	404440040	značka dopravní svislá reflexní výstražná AL 3M A1 - A30, P1,P4 700 mm	KUS	4,00	6,00	2,00	1 235,70	4 942,80		2 471,40	7 414,20	2 471,40	50,00
3	404440560	značka dopravní svislá reflexní STOP AL 3M P6 700 mm	KUS	1,00	7,00	6,00	1 201,76	1 201,76		7 210,56	8 412,32	7 210,56	600,00
4	404441130	značka svislá reflexní zákazová B AL- 3M 700 mm	KUS	1,00	6,00	5,00	1 372,63	1 372,63		6 863,15	8 235,78	6 863,15	500,00
5	404442130	značka svislá reflexní zákazová C AL- 3M 700 mm	KUS	7,00	6,00	-1,00	1 372,63	9 608,41	-1 372,63		8 235,78	-1 372,63	-14,29
7	404442380	značka svislá reflexní AL- 3M 750 x 750 mm	KUS	1,00	4,00	3,00	2 647,94	2 647,94		7 943,82	10 591,76	7 943,82	300,00
9	404443140	značka svislá reflexní AL- 3M 700 x 330 mm	KUS	1,00	0,00	-1,00	740,06	740,06	-740,06		0,00	-740,06	-100,00
10	914111112	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 páskováním na sloup	kus	10,00	22,00	12,00	169,74	1 697,40		2 036,88	3 734,28	2 036,88	120,00
13	404442820	značka svislá reflexní AL- 3M 1100 (1350) x 330 mm	KUS	2,00	5,00	3,00	1 631,76	3 263,52		4 895,28	8 158,80	4 895,28	150,00
14	404442870	značka svislá reflexní AL- 3M 1100 (1350) x 500 mm	KUS	1,00	0,00	-1,00	2 103,64	2 103,64	-2 103,64		0,00	-2 103,64	-100,00
16	914211112	Montáž svislé dopravní značky velkoplošné velikosti do 12 m2	kus	4,00	0,00	-4,00	396,06	1 584,24	-1 584,24		0,00	-1 584,24	-100,00
17	404442720-1	značka svislá reflexní velkoplošná AL- 3M, lamela Fe Zn	M2	26,60	0,00	-26,60	3 677,69	97 826,55	-97 826,55		0,00	-97 826,55	-100,00
18	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	42,00	36,00	-6,00	1 230,05	51 662,10	-7 380,30		44 281,80	-7 380,30	-14,29
19	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	41,00	36,00	-5,00	463,96	19 022,36	-2 319,80		16 702,56	-2 319,80	-12,20
20	40445256	svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm	kus	84,00	116,00	32,00	50,92	4 277,28		1 629,44	5 906,72	1 629,44	38,10
21	915111111	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm základní bílá barva	m	656,00	1 273,00	617,00	10,18	6 678,08		6 281,06	12 959,14	6 281,06	94,05
22	915111115	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm základní žlutá barva	m	358,00	35,00	-323,00	16,97	6 075,26	-5 481,31		593,95	-5 481,31	-90,22
23	915111121	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry přerušované š 125 mm základní bílá barva	m	358,00	89,00	-269,00	10,18	3 644,44	-2 738,42		906,02	-2 738,42	-75,14
24	915121111	Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm základní bílá barva	m	2 087,00	1 589,00	-498,00	19,24	40 153,88	-9 581,52		30 572,36	-9 581,52	-23,86
26	915131111	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly základní bílá barva	m2	65,00	121,00	56,00	135,79	8 826,35		7 604,24	16 430,59	7 604,24	86,15
27	915211111	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm bílý plast	m	656,00	1 273,00	617,00	30,55	20 040,80		18 849,35	38 890,15	18 849,35	94,05

28	915211115	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm žlutý plast	m	358,00	165,00	-193,00	32,82	11 749,56	-6 334,26		5 415,30	-6 334,26	-53,91
29	915211121	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry přerušované š 125 mm bílý plast	m	358,00	89,00	-269,00	30,55	10 936,90	-8 217,95		2 718,95	-8 217,95	-75,14
30	915221111	Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm bílý plast	m	2 087,00	1 589,00	-498,00	61,11	127 536,57	-30 432,78		97 103,79	-30 432,78	-23,86
32	915231111	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly bílý plast	m2	65,00	121,00	56,00	282,90	18 388,50		15 842,40	34 230,90	15 842,40	86,15
33	915241111	Bezpečnostní barevný povrch vozovek červený pro podklad asfaltový	m2	29,00	84,00	55,00	961,86	27 893,94		52 902,30	80 796,24	52 902,30	189,66
34	915311111	Předformátované vodorovné dopravní značení dopravní značky do 1 m2	kus	2,00	0,00	-2,00	418,69	837,38	-837,38		0,00	-837,38	-100,00
36	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	7 470,00	6 674,00	-796,00	1,13	8 441,10	-899,48		7 541,62	-899,48	-10,66
		Nové položky											
201	914211111	Montáž svislé dopravní značky velkoplošné velikosti do 6 m2	kus	0,00	4,00	4,00	396,06	0,00		1 584,24	1 584,24	1 584,24	100,00
202	404442720-2	značka svislá reflexní velkoplošná AL- 3M	M2	0,00	9,00	9,00	2 889,34	0,00		26 004,06	26 004,06	26 004,06	100,00
203	40445642-R	informativní značky směrové Z4a reflexní 400x1200mm	kus	0,00	1,00	1,00	1 181,05	0,00		1 181,05	1 181,05	1 181,05	100,00
204	914511111-R	Montáž sloupku dopravních značek délky nad 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	0,00	2,00	2,00	1 932,00	0,00		3 864,00	3 864,00	3 864,00	100,00
205	40445220-R	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 4,0m	kus	0,00	2,00	2,00	966,00	0,00		1 932,00	1 932,00	1 932,00	100,00
206	912211111	Montáž směrového sloupku silničního plastového prosté uložení bez betonového základu	kus	0,00	8,00	8,00	320,00	0,00		2 560,00	2 560,00	2 560,00	100,00
207	40445158	sloupek směrový silniční plastový 1,2m	kus	0,00	8,00	8,00	222,00	0,00		1 776,00	1 776,00	1 776,00	100,00
208	915131111-R	Vodorovné dopravní značení symboly V15 2 000 x 5 000 mm, barevné, barva	kus	0,00	4,00	4,00	2 242,50	0,00		8 970,00	8 970,00	8 970,00	100,00
209	915231111-R	Vodorovné dopravní značení symboly V15 2 000 x 5 000 mm, barevné, plast	kus	0,00	4,00	4,00	6 894,25	0,00		27 577,00	27 577,00	27 577,00	100,00
		Celkem							-177 850,32	210 317,71		32 467,39	

Za Zhotovitele: Ing. Jan Novák

Datum:

Podpis:

Za Objednatele: Martin Voříšek

Datum:

Podpis:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic - zbývajcí úsek

1	Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	121 013 705,79
2=1+18+19	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	123 191 335,64
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) s DPH	149 061 516,12
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	101,80%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	-0,02%
40=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, odst. (5), písm. b)	-15,67%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	2 302 302,65
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	1,90%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	36 304 111,74

9=(32A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	14,47%
10=(36A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	2,59%
10A=32A+36A	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	20 635 386,47
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	60 506 852,90

12=(37/1)*100	Sledování limitu 15 %	13,27%
13=37	Sledování limitu 137 366 000 Kč	16 060 974,73
14=+137366000-37		121 305 025,27

5=(28/1)*100		Sledování změny položek (Skupina 2)	-0,02%																				
40=(19/1)*100		Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, odst. (5), písm. b)	-15,67%																				
SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	- 1 -			- 2 -			- 3 -					- 4 -					- 5 -	
						Vyhrazená změna (Doměrky)			Záměna položek (Započítávání)			Nepředvídanost					Nezbytnost					Změny de minimis	
			Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Procentní vyjádření Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Procentní vyjádření Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny de minimis (15% nebo limit 137 366 000 Kč)	limit 15 %			
16	17	18	19=23+26+29+33	20=24+27+30+34+37+39	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	31=(30/1)*100	32=29+30	32A=ABS(29)+30	33	34	35=(34/1)*100	36=33+34	36A=ABS(33)+34	37	38=(37/1)*100
		II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic - zbývajcí úsek	- 18 958 778,31	21 136 408,16	2 177 629,85	0,00	0,00	0,00	- 1 713 569,11	1 685 256,16	- 28 312,95	- 9 166 541,91	8 338 345,46	6,89%	-828 196,45	17 504 887,37	0,00	3 130 499,10	2,59%	3 130 499,10	3 130 499,10	16 060 974,73	13,27%
102	1	Rekonstrukce III/2365 / recyklace podloží	- 8 078 667,29	7 821 907,90	- 256 759,39			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00	15 900 575,19	13,14%
161	2	Dopravní značení / zvýšení bezpečnosti chodců	0,00	160 399,54	160 399,54			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00	160 399,54	0,13%
302	3	Kanalizace dešťová - II/605 km 1,440-2,538 / kolize s plynovodem	0,00	176 006,40	176 006,40			0,00			0,00		176 006,40	0,15%	176 006,40	176 006,40			0,00%	0,00	0,00		0,00%
303	4	Kanalizace dešťová - III/2365 / úpravy horkovodu a bourání betonu	0,00	71 385,48	71 385,48			0,00			0,00		71 385,48	0,06%	71 385,48	71 385,48			0,00%	0,00	0,00		0,00%
202	5	Rekonstrukce mostu ev.č. 2365-2 přes Dibelský potok (ulice Jungmannova) / změna založení mostu	-1 413 973,63	1 404 806,20	- 9 167,43			0,00	-1 413 973,63	1 404 806,20	- 9 167,43			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
312	6	Přeložky a úpravy vodovodů - III/2365 / oprava armatur přípojek	-2 265 546,08	134 266,01	- 2 131 280,07							- 2 265 546,08	134 266,01	0,11%	-2 131 280,07	2 399 812,09			0,00%	0,00	0,00		0,00%
102 / 2	7	Rekonstrukce III/2365 / ACO žlab a betonové žlabovky	0,00	93 396,62	93 396,62			0,00			0,00	93 396,62	0,08%	93 396,62	93 396,62			0,00%	0,00	0,00		0,00%	
162.1	8	Dopravně inženýrská opatření (silnice II/605) / DIO rok 2022	0,00	91 342,36	91 342,36												0,00	91 342,36	0,08%	91 342,36	91 342,36		0,00%
162.2	9	Dopravně inženýrská opatření (silnice III/2365) / DIO rok 2022	0,00	3 039 156,74	3 039 156,74												0,00	3 039 156,74	2,51%	3 039 156,74	3 039 156,74		0,00%
112	10	Okružní křižovatka Zahofany / zábradlí nad propustkem	0,00	37 556,00	37 556,00							0,00	37 556,00	0,03%	37 556,00	37 556,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
423.1	11	Přeložka stávajícího veřejného osvětlení k.ú. Králův Dvůr / změny svítidel	-196 694,39	911 259,27	714 564,88							- 196 694,39	911 259,27	0,75%	714 564,88	1 107 953,66			0,00%	0,00	0,00		0,00%
423.2	12	Přeložka stávajícího veřejného osvětlení k.ú. Králův Dvůr / změny svítidel	-97 180,27	409 206,90	312 026,63			0,00			0,00	- 97 180,27	409 206,90	0,34%	312 026,63	506 387,17			0,00%	0,00	0,00		0,00%
424	13	Přeložka stávajícího veřejného osvětlení k.ú. Beroun / změny svítidel	-77 709,45	323 509,35	245 799,90			0,00			0,00	- 77 709,45	323 509,35	0,27%	245 799,90	401 218,80			0,00%	0,00	0,00		0,00%
801.1	14	Vegetační úpravy - Středočeský kraj / záměna kačírek za zeleň	-30 707,20	88 793,88	58 086,68							- 30 707,20	88 793,88	0,07%	58 086,68	119 501,08							
102 / 3	15	Rekonstrukce III/2365 / úprava výměr podle skutečnosti	-4 080 462,98	3 944 064,83	- 136 398,15			0,00			0,00	-4 080 462,98	3 944 064,83	3,26%	-136 398,15	8 024 527,81			0,00%	0,00	0,00		0,00%
111	16	Okružní křižovatka silnic II/605 a III/2365 / záměna betonových obrubníků za žulové krajníky	-130 950,85	120 638,16	- 10 312,69				-130 950,85	120 638,16	-10 312,69												
112 / 2	17	Okružní křižovatka Zahofany / záměna betonových obrubníků za žulové krajníky	-168 644,63	159 811,80	- 8 832,83				-168 644,63	159 811,80	-8 832,83												
201	18	Rekonstrukce opěrné zdi, silnice III/2365 - Zahofany / změna zajištění svahu, náhrada části kamenné zdi železobetonovou stěnou	-1 475 484,80	1 173 678,49	- 301 806,31							- 1 475 484,80	1 173 678,49	0,97%	-301 806,31	2 649 163,29							
181.1	19	Úpravy komunikací užívaných stavbou / náhrada dvouvrstvého nátěru asfaltovou vyrovnávkou a obrusnou asfaltovou vrstvou 40 mm	-764 906,42	764 904,52	- 1,90							- 764 906,42	764 904,52	0,63%	-1,90	1 529 810,94							
161.2	20	Dopravní značení /úprava nového trvalého DZ	-177 850,32	210 317,71	32 467,39							- 177 850,32	210 317,71	0,17%	32 467,39	388 168,03							

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	20
Název a evidenční číslo stavby:	II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic - zbývajících úsek
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Dopravní značení
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	161.2 / 1

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
07 - Změnový soupis prací SO 161.2 po změně 1	4	
08 - Policie ČR stanovisko 1_9_2022	2	
09 - MUBE stanovení místní úpravy 19_12_2022	3	
10 - Policie ČR stanovisko 8_12_2022	2	
11 - MUBE stanovení místní úpravy 15_2_2023	5	
12 - Oznámení Zhotovitele	1	
13 - Nabídka dodavatele DZ	4	
14 - Stanovisko AD k ZBV 20	1	
15 - Stanovisko TDS k ZBV 20	2	
16 - Stanovisko KSÚS a pokyn ke zpracování ZBV 20	1	
Počet listů celkem	25	

Příloha č. 7

24	915121111	Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm základní bílá barva	m	2 087,00	1 589,00	-498,00	19,24	40 153,88	30 572,36	-9 581,52	-23,86
		ZBV č_20: -498									
25	915121121	Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 250 mm základní bílá barva	m	276,00	276,00		19,24	5 310,24	5 310,24	0,00	0,00
26	915131111	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly základní bílá barva	m2	65,00	121,00	56,00	135,79	8 826,35	16 430,59	7 604,24	86,15
		ZBV č_20: 56									
27	915211111	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm bílý plast	m	656,00	1 273,00	617,00	30,55	20 040,80	38 890,15	18 849,35	94,05
		ZBV č_20: 617									
28	915211115	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm žlutý plast	m	358,00	165,00	-193,00	32,82	11 749,56	5 415,30	-6 334,26	-53,91
		ZBV č_20: -193									
29	915211121	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry přerušované š 125 mm bílý plast	m	358,00	89,00	-269,00	30,55	10 936,90	2 718,95	-8 217,95	-75,14
		ZBV č_20: -269									
30	915221111	Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm bílý plast	m	2 087,00	1 589,00	-498,00	61,11	127 536,57	97 103,79	-30 432,78	-23,86
		ZBV č_20: -498									
31	915221121	Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 250 mm bílý plast	m	276,00	276,00		61,11	16 866,36	16 866,36	0,00	0,00
32	915231111	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly bílý plast	m2	65,00	121,00	56,00	282,90	18 388,50	34 230,90	15 842,40	86,15
		ZBV č_20: 56									
33	915241111	Bezpečnostní barevný povrch vozovek červený pro podklad asfaltový	m2	29,00	84,00	55,00	961,86	27 893,94	80 796,24	52 902,30	189,66
		ZBV č_20: 55									
34	915311111	Předformátované vodorovné dopravní značení dopravní značky do 1 m2	kus	2,00	0,00	-2,00	418,69	837,38	0,00	-837,38	-100,00
		ZBV č_20: -2									
35	915351112	Předformátované vodorovné dopravní značení číslice nebo písmeno délky do 2,5 m	kus	30,00	30,00		301,00	9 030,00	9 030,00	0,00	0,00
36	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	7 470,00	6 674,00	-796,00	1,13	8 441,10	7 541,62	-899,48	-10,66
		ZBV č_20: -796									
37	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	130,00	130,00		5,66	735,80	735,80	0,00	0,00
38	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	16,00	16,00		452,64	7 242,24	7 242,24	0,00	0,00

39	966006211	Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	22,00	22,00		113,16	2 489,52	2 489,52	0,00	0,00
40	997013511-R	Odvoz sutí a vybouraných hmot z mezískládky na skládku s naložením a se složením do vzdálenosti dle možností zhotovitele	t	1,44	1,44		70,61	101,68	101,68	0,00	0,00
41	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	48,05	48,05		5,66	271,96	271,96	0,00	0,00
		Nové položky									
201	914211111	Montáž svislé dopravní značky velkoplošné velikosti do 6 m2 <i>položka č. 21 z SO 161.1</i> <i>ZBV č. 20: 4</i>	kus	0,00	4,00	4,00	396,06	0,00	1 584,24	1 584,24	100,00
202	404442720-2	<i>značka svislá reflexní velkoplošná AL - 3M</i> <i>j.c. přepočtena z položky č. 19 SO 161.1; 4 334,02 Kč/kus / (1,0x1,5) m2/kus = 2 889,34 Kč/m2</i> <i>ZBV č. 20: 9</i>	M2	0,00	9,00	9,00	2 889,34	0,00	26 004,06	26 004,06	100,00
203	40445642-R	<i>informativní značky směrové Z4a reflexní 400x1200mm</i> <i>R položka - nabídka dodavatele dopravního značení - doklad č. 13</i> <i>ZBV č. 20: 1 1 027 Kč/kus * 1,15 = 1 181,05 Kč/kus</i>	kus	0,00	1,00	1,00	1 181,05	0,00	1 181,05	1 181,05	100,00
204	914511111-R	Montáž sloupku dopravních značek délky nad 3,5 m s betonovým základem a patkou <i>R položka - nabídka dodavatele dopravního značení - doklad č. 13</i> <i>ZBV č. 20: 2 1 680 Kč/kus * 1,15 = 1 932 Kč/kus</i>	kus	0,00	2,00	2,00	1 932,00	0,00	3 864,00	3 864,00	100,00
205	40445220-R	<i>sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 4,0m</i> <i>R položka - nabídka dodavatele dopravního značení - doklad č. 13</i> <i>ZBV č. 20: 2 840 Kč/kus * 1,15 = 966 Kč/kus</i>	kus	0,00	2,00	2,00	966,00	0,00	1 932,00	1 932,00	100,00
206	912211111	Montáž směrového sloupku silničního plastového prosté uložení bez betonového základu <i>položka z URS 2022/II</i> <i>ZBV č. 20: 8</i>	kus	0,00	8,00	8,00	320,00	0,00	2 560,00	2 560,00	100,00
207	40445158	sloupek směrový silniční plastový 1,2m <i>položka z URS 2022/II</i> <i>ZBV č. 20: 8</i>	kus	0,00	8,00	8,00	222,00	0,00	1 776,00	1 776,00	100,00
208	915131111-R	Vodorovné dopravní značení symboly V15 2 000 x 5 000 mm, barevné, barva <i>R položka - nabídka dodavatele dopravního značení - doklad č. 13</i> <i>ZBV č. 20: 4 1 950 Kč/kus * 1,15 = 2 242,50 Kč/kus</i>	kus	0,00	4,00	4,00	2 242,50	0,00	8 970,00	8 970,00	100,00
209	915231111-R	Vodorovné dopravní značení symboly V15 2 000 x 5 000 mm, barevné, plast <i>R položka - nabídka dodavatele dopravního značení - doklad č. 13</i> <i>ZBV č. 20: 4 5 995 Kč/kus * 1,15 = 6 894,25 Kč/kus</i>	kus	0,00	4,00	4,00	6 894,25	0,00	27 577,00	27 577,00	100,00
		Celkem						574 308,07	606 775,46	32 467,39	5,65%



Pomáhat a chránit

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE

Územní odbor Beroun
Dopravní inspektorát

Č. j. KRPS-40715-38/ČJ-2022-010206

Beroun 1. září 2022

Počet stran: 1

Přílohy: SituaceADSUM, spol. s.r.o.
Havlíčková 923
273 51 Unhošť**Stanovisko k trvalému dopravnímu značení v rámci stavby "II/605 a III/2365 Beroun
rekonstrukce - zbývající úsek, SO 161 - Dopravní značení"**

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, územní odbor, Dopravní inspektorát Beroun v souladu s ust. § 77 odst. 2 písm. b) zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v platném znění

S O U H L A S Í

s návrhem umístění svislého a vodorovného dopravního značení při výše uvedené stavbě, viz. příloha.

Vyřizuje:

por. Bc. Petr Krejbich

telefon: 974 872 253

e-mail: be.di@pcr.cz

datová schránka: 2dtai5u

npor. Mgr. Soňa Pfeiferová
vedoucíTyršova 1635
266 50 Beroun

Mgr. Soňa Pfeiferová

02.09.2022 11:58:32

Digitálně podepsal:

Mgr. Soňa Pfeiferová
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

Důvod:

www.policie.cz

Tel.:

E-mail: epodatelna.policie@pcr.cz

ID DS: 2dtai5u

Vypracoval: **Martin Frolík**
tel.: 777 690 022, e-mail: frolik@adsum.cz

Zodpovědný projektant, kontrola:
Martin Frolík

Investor:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
přísp. org. Stř. kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Objednatel (stavebník):

STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice



• **DOPRAVNÍ ZNAČENÍ** •
PROJEKTY REALIZACE PRONÁJEM

ADSUM spol. s r.o.
Havlíčková 923, 273 51 Unhošť
provozovna: Lidická 7, 273 51 unhošť
tel./fax: +420 312 698 482 mobil: +420 777 690 022
e-mail: adsum@adsum.cz http://www.adsum.cz
IČ: 451 44 991, DIČ: CZ 451 44 991, KB Kladno, E.ú. 807741141/0100
Společnost vedená od 21. února 1992 u Městského soudu v Praze, spisová značka C7462

Stavba:

**II/605 a III/2365 BEROUN
REKONSTRUKCE - ZBÝVAJÍCÍ ÚSEK**

Číslo zakázky: **P-164-8/2022-1**

Objekt:

S0 161 - Doprávní značení

Datum: **srpen 2022**

Stupeň: **RDS**

Část:

Část stavby uvedená do provozu v 09/2022

Termín:

Počet formátů: **A3**

II/605 od křiž. s ulicí Havlíčkova - KÚ, včetně nové OK „Na Knížecí“
III/2365 od nové OK „Na Knížecí“ ke křižovatce s ulicí Macháčkova

Číslo přílohy:

1

Paré:

Mgr. Soňa Pfeiferová

Digitálně podepsal:
Mgr. Soňa Pfeiferová
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

02.09.2022 11:59:17

ZDICE

2.5

2.45

2.4

2.25

2.3

Městský úřad Beroun
Odbor dopravy a správních agend

Datum:
19.12.2022

Číslo jednací:
MBE/83462/2022/DOPR-Mij

Spisová značka:
938/2022/DOPR

Vyřizuje / telefon:
Miláček/ 311654326

E-mail:
doprava4@muberoun.cz

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

STANOVENÍ MÍSTNÍ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACI

Městský úřad Beroun, odbor dopravy a správních agend, jako příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“), na základě žádosti společnosti STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 IČ: 60838744 zastoupené na základě plné moci společností ADSUM spol. s r.o., Lidická 7, 273 51 Unhošť, IČ: 45144991 a po písemném vyjádření příslušného orgánu policie, tj. Policie ČR, Krajského ředitelství Policie Středočeského kraje, územního odboru Beroun, dopravního inspektorátu, pod č.j.: KRPS-40715-38/ČJ-2022-010206

s t a n o v u j e

podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o provozu na pozemních komunikacích opatřením obecné povahy podle § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)

MÍSTNÍ ÚPRAVU PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

Místní úprava provozu na pozemních komunikacích spočívá v osazení svislého dopravního značení (dále jen SDZ), vodorovného dopravního značení (dále jen VDZ) a dopravního zařízení na silnici II/605, silnici III/2365 a místních komunikacích v obci Králův Dvůr:

- dle grafického vyobrazení dopravního značení ve schématické mapce (str. 3).

O d ů v o d n ě n í :

Městský úřad Beroun, odbor dopravy a správních agend, přistoupil ke stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, na základě žádosti společnosti STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 IČ: 60838744, zastoupené na základě plné moci společností ADSUM spol. s r.o., Lidická 7, 273 51 Unhošť, IČ: 45144991, kdy důvodem k úpravě dopravního značení na silnici II/605, silnici III/2365 a místních komunikacích v obci Králův Dvůr je dokončení výstavby nového úseku rekonstrukce silnice II/605 a II/2365, včetně výstavby nové okružní křižovatky. Jedná se o úpravu dopravního značení v úseku silnice II/605 (ul. Plzeňská), od křižovatky s MK (ul. Havlíčkova) po č.p. 233 ve směru od Berouna (včetně vyústujících místních komunikací) a úseku silnice III/2365 od křižovatky se silnicí II/605 (ul. Plzeňská) ke křižovatce s místní komunikací (ul. Macháčkova) včetně vyústujících místních komunikací, a to z důvodu změny dopravní situace v uvedeném úseku pozemních komunikací (výstavba okružní křižovatky, parkovacích zálivů, autobusových zastávek, přechodů pro chodce).

Místní úpravu provozu na pozemních komunikacích, v tomto případě na místní komunikaci, stanovil obecní úřad s rozšířenou působností po předchozím písemném vyjádření policie, v tomto případě Policie ČR, Krajského ředitelství Policie Středočeského kraje, územního odboru Beroun, dopravního inspektorátu, Tyršova 1635, 266 50 Beroun, která dala k tomuto stanovení místní úpravy kladné vyjádření pod č.j.: KRPS-40715-38/ČJ-2022-010206.

Toto kladné vyjádření je i směrodatné pro vydání opatření obecné povahy s tím, že s touto skutečností Městský úřad Beroun, odbor dopravy a správních agend seznámil v návrhu opatření obecné povahy ze dne 19.10.2022, č.j. MBE/52178/2022/DOPR-Mij, v němž také vyzval dotčené osoby (tedy kohokoliv – obecné užívání pozemní komunikace – podle § 19 odst. 1 zákona č. 13/1997Sb., o pozemních komunikacích), aby k návrhu opatření podali písemně připomínky a námítky ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho zveřejnění. Návrh opatření obecné povahy byl zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Beroun dne 20.10.2022 a sejmuto dne 5.11.2022, na úřední desce Městského úřadu Králův Dvůr zveřejněn dne 21.10.2022 a sejmuto dne 8.11.2022. Návrh byl zveřejněn též na elektronické úřední desce Městského úřadu Beroun a Městského úřadu Králův Dvůr způsobem umožňujícím dálkový přístup.

K návrhu opatření obecné povahy nebyly ve stanovené lhůtě doručeny dotčenými osobami žádné připomínky ani námítky.

Poučení: Toto stanovení se vydává formou opatření obecné povahy, které se oznamuje veřejnou vyhláškou. Opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky. Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek (§ 173 odst. 2 správního řádu)

Ing. Albert Červenka, v.r.

vedoucí odboru dopravy a správních agend

Za správnost vyhotovení: Tomáš Peterka

Toto opatření obecné povahy (č.j. MBE/83462/2022/DOPR-MiJ) musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Beroun a úřední desce Městského úřadu Králův Dvůr.

Vývěsní lhůta začíná den následující po dni vyvěšení. Sejmutí vyhlášky je možno následující pracovní den po posledním (patnáctém) dni vývěsní lhůty. Po uplynutí lhůty vyznačení údajů musí být vyhláška neprodleně vrácena zpět odboru dopravy a správních agend. Zároveň žádáme o zveřejnění písemnosti způsobem umožňujícím dálkový přístup a o potvrzení této skutečnosti!

Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:
Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí.

Obdrží:

Dotčené orgány:

- Policie ČR, Krajské ředitelství Policie Středočeského kraje, dopravní inspektorát, Tyršova 1635, 266 01 Beroun

Ostatní:

- Městský úřad Beroun, kancelář tajemníka, podatelna MěÚ Beroun, Husovo náměstí 68, 266 01 Beroun
(pro zveřejnění na úřední desce na dobu nejméně 15 dnů – podle § 172 odst. 1 správního řádu)

- Městský úřad Králův Dvůr, náměstí Míru 139, 267 01 Králův Dvůr
(pro zveřejnění na úřední desce na dobu nejméně 15 dnů – podle § 172 odst. 1 správního řádu)


- KSÚS Středočeského kraje, p.o., Zborovská 11, 150 21 Praha 5

- ADSUM spol. s r.o., Lidická 7, 273 51 Unhošť, IČ: 45144991



Am Dm

Výnosová: Martin Frolík Vytvořeno: 14.07.2022, e-mail: frolik@adsum.cz (Inva. 020)	Za stavební projekt, kótován: Martin Frolík	ADSUM • DOPRAVNÍ ZNAČENÍ • PRŮBĚHY REALIZACE PRŮJEMU
Krajská správa a úřadba silnic Středočeského kraje přísp. org. Stř. kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5		
STRABAG a.s. Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 – Jinonice	Číslo stavby uvedené do provozu v 09/2022 III/605 od křiž. s ulicí Havlíčkova - KÚ, včetně nové OK „Na Knížecí“ III/2345 od nové OK „Na Knížecí“ ke křižovatce s ulicí Machalčova	Číslo zakázky: P-164-8/2022-1
Rekonstrukce	Číslo stavby: 1	Číslo zakázky: P-164-8/2022-1
Rekonstrukce	Číslo stavby: 1	Číslo zakázky: P-164-8/2022-1
Rekonstrukce	Číslo stavby: 1	Číslo zakázky: P-164-8/2022-1
Rekonstrukce	Číslo stavby: 1	Číslo zakázky: P-164-8/2022-1
Rekonstrukce	Číslo stavby: 1	Číslo zakázky: P-164-8/2022-1
Rekonstrukce	Číslo stavby: 1	Číslo zakázky: P-164-8/2022-1
Rekonstrukce	Číslo stavby: 1	Číslo zakázky: P-164-8/2022-1
Rekonstrukce	Číslo stavby: 1	Číslo zakázky: P-164-8/2022-1
Rekonstrukce	Číslo stavby: 1	Číslo zakázky: P-164-8/2022-1
Rekonstrukce	Číslo stavby: 1	Číslo zakázky: P-164-8/2022-1
Rekonstrukce	Číslo stavby: 1	Číslo zakázky: P-164-8/2022-1
Rekonstrukce	Číslo stavby: 1	Číslo zakázky: P-164-8/2022-1
Rekonstrukce	Číslo stavby: 1	Číslo zakázky: P-164-8/2022-1
Rekonstrukce	Číslo stavby: 1	Číslo zakázky: P-164-8/2022-1
Rekonstrukce	Číslo stavby: 1	Číslo zakázky: P-164-8/2022-1
Rekonstrukce	Číslo stavby: 1	Číslo zakázky: P-164-8/2022-1
Rekonstrukce	Číslo stavby: 1	Číslo zakázky: P-164-8/2022-1
Rekonstrukce	Číslo stavby: 1	Číslo zakázky: P-164-8/2022-1
Rekonstrukce	Číslo stavby: 1	Číslo zakázky: P-164-8/2022-1
Rekonstrukce	Číslo stavby: 1	Číslo zakázky: P-164-8/2022-1
Rekonstrukce	Číslo stavby: 1	Číslo zakázky: P-164-8/2022-1
Rekonstrukce	Číslo stavby: 1	Číslo zakázky: P-164-8/2022-1
Rekonstrukce	Číslo stavby: 1	Číslo zakázky: P-164-8/2022-1
Rekonstrukce	Číslo stavby: 1	Číslo zakázky: P-164-8/2022-1

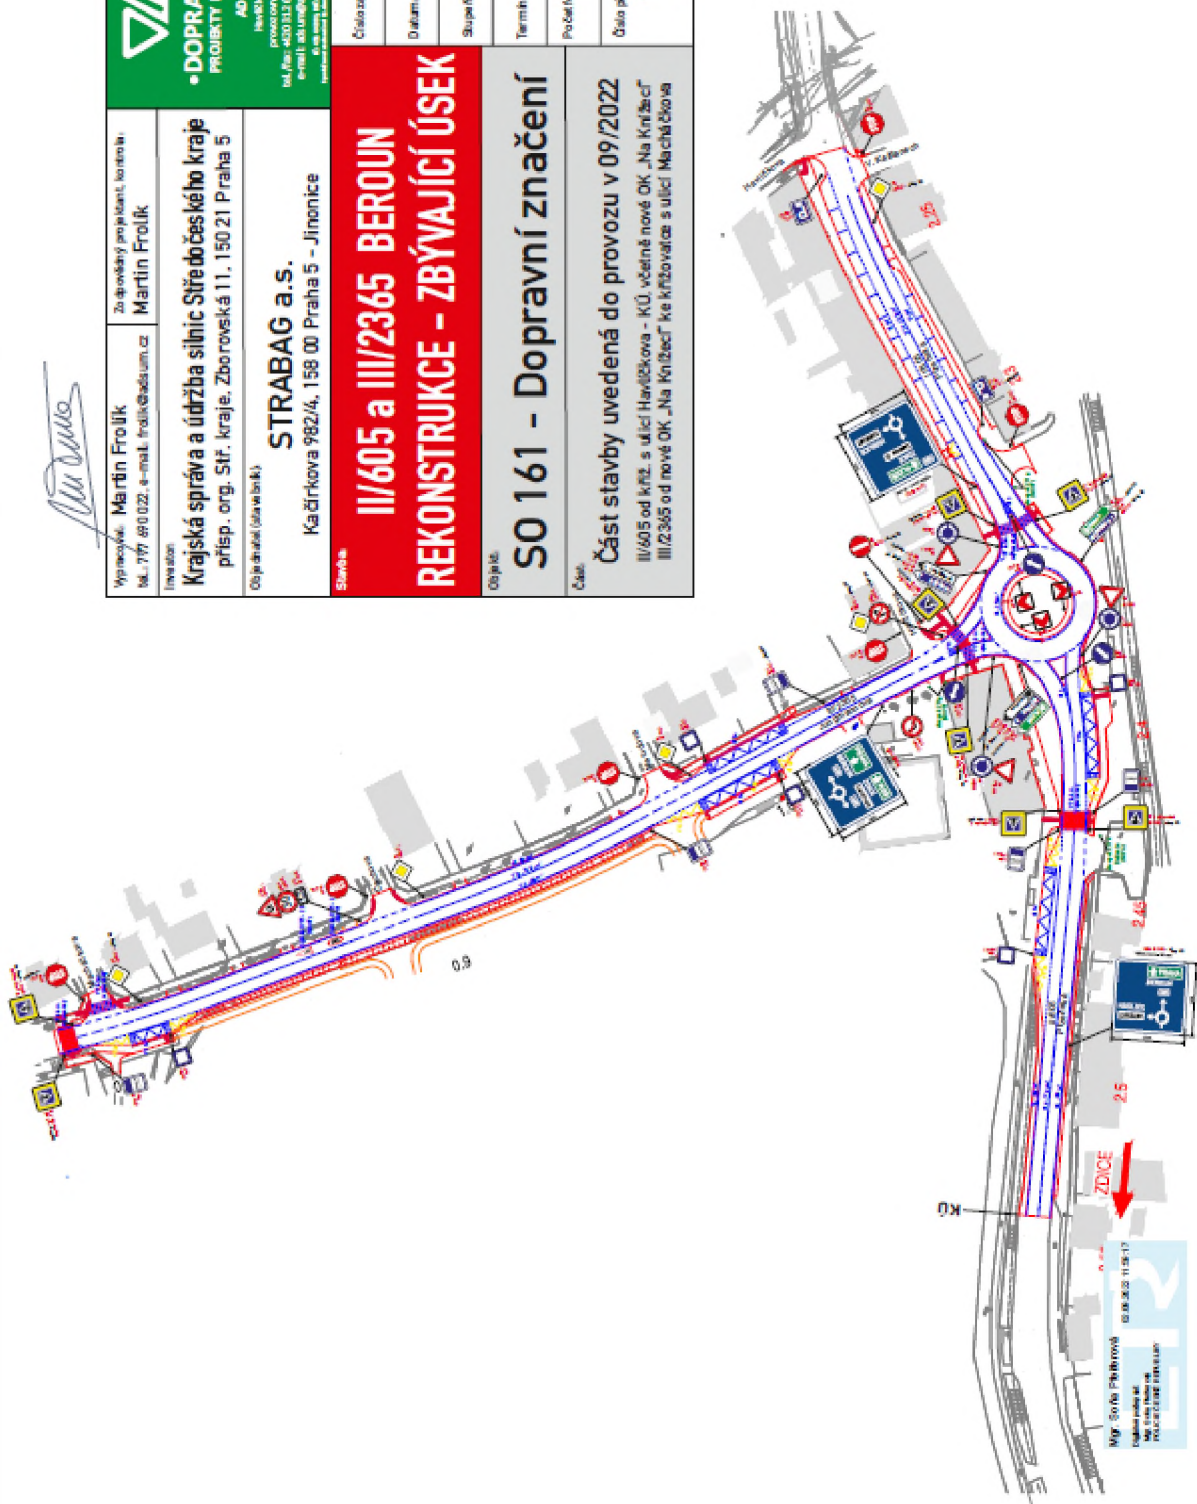



Pomáhat a chránit

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE

Územní odbor Beroun
Dopravní inspektorát

Č. j. KRPS-40715-66/ČJ-2022-010206

Beroun 8. prosince 2022

Počet stran: 1

Přílohy: SituaceADSUM, spol. s r.o.
Havlíčková 923
273 51 Unhošť**Stanovisko k trvalému dopravnímu značení v rámci stavby "II/605 a III/2365 Beroun
rekonstrukce - zbývající úsek, SO 161 - Dopravní značení"**

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, územní odbor, Dopravní inspektorát Beroun v souladu s ust. § 77 odst. 2 písm. b) zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v platném znění

S O U H L A S Í

s návrhem umístění svislého a vodorovného dopravního značení při výše uvedené stavbě, viz. příloha.

Vyřizuje:

por. Bc. Petr Krejbich

telefon: 974 872 253

e-mail: be.di@pcr.cz

datová schránka: 2dtai5u

npor. Mgr. Soňa Pfeiferová
vedoucíTyršova 1635
266 50 Beroun

Mgr. Soňa Pfeiferová

08.12.2022 08:21:15

Digitálně podepsal:

Mgr. Soňa Pfeiferová
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY


Důvod:

www.policie.cz

Tel.:

E-mail: epodatelna.policie@pcr.cz

ID DS: 2dtai5u

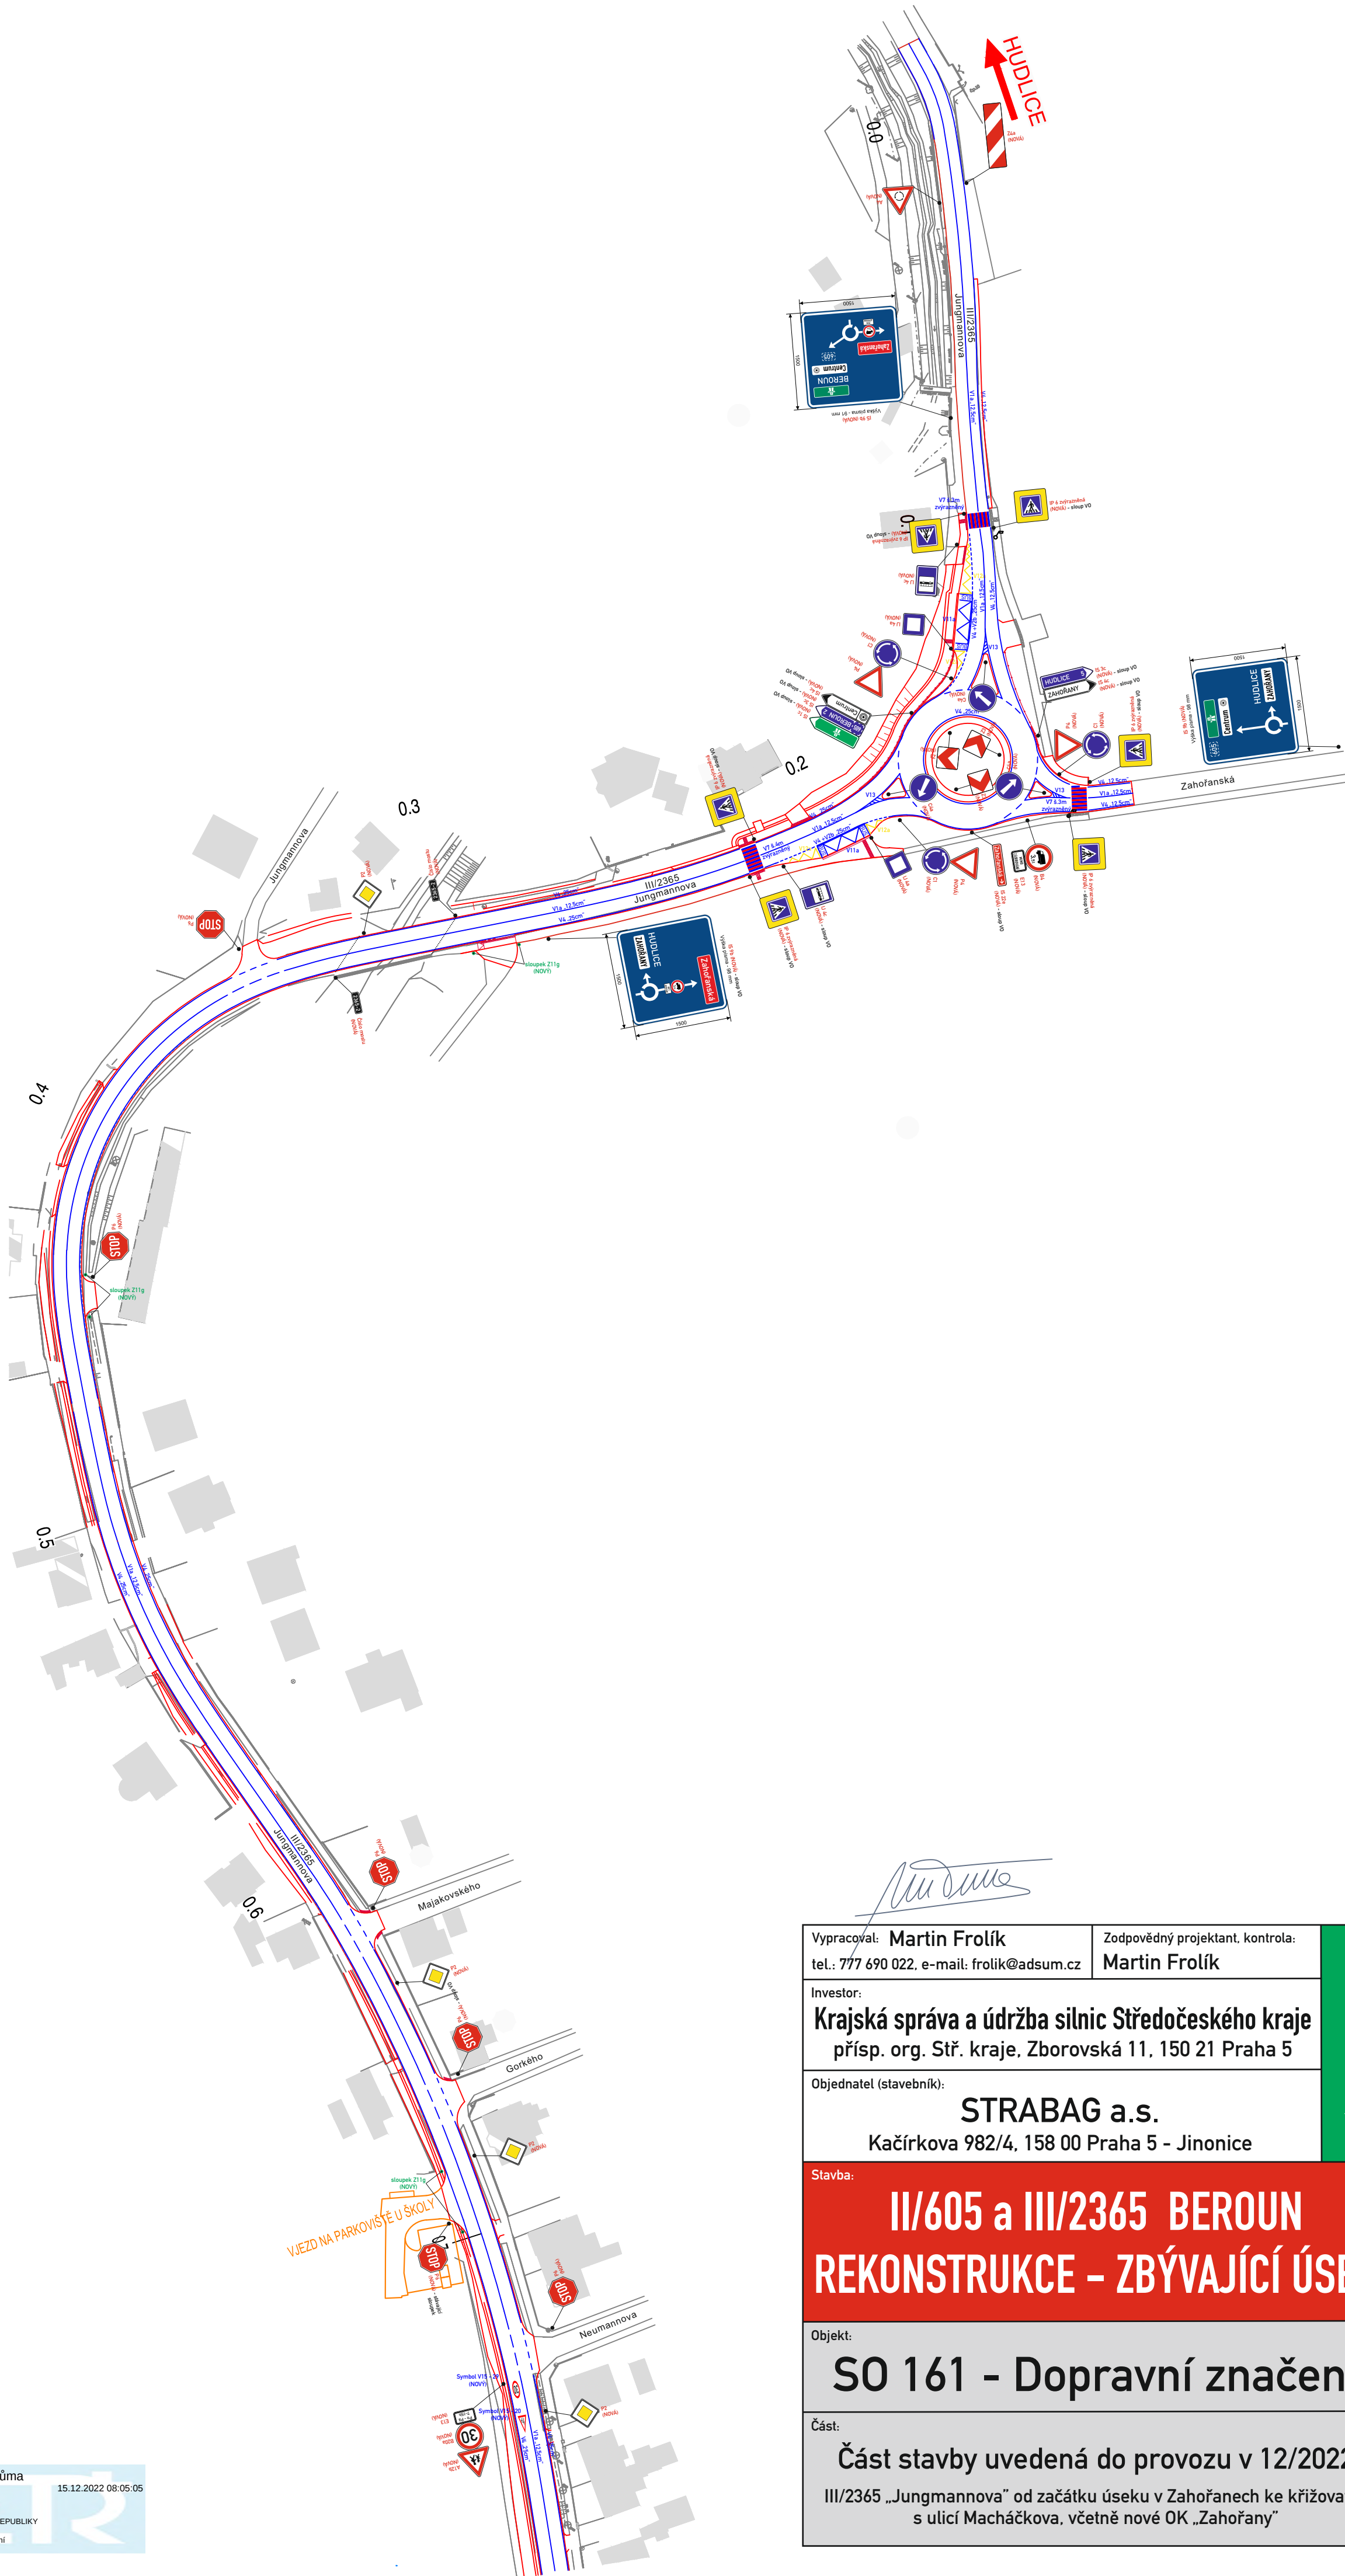

Vypracoval: Martin Frolík tel.: 777 690 022, e-mail: frolik@adsum.cz		Zodpovědný projektant, kontrola: Martin Frolík		 •DOPRAVNÍ ZNAČENÍ• PROJEKTY REALIZACE PRONÁJEM ADSUM spol. s r.o. Havlíčková 923, 273 51 Unhošť provozovna: Lidická 7, 273 51 unhošť tel./fax: +420 312 698 482 mobil: +420 777 690 022 e-mail: adsum@adsum.cz http://www.adsum.cz IČ: 451 44 991, DIČ: CZ 451 44 991, IČ Kladno, č.d. 807741141/0100 Společnost vedená od 21. února 1992 u Městského soudu v Praze, spisová značka C7462	
Investor: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje přísp. org. Stř. kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5					
Objednatel (stavebník): STRABAG a.s. Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice					
Stavba:					
II/605 a III/2365 BEROUN REKONSTRUKCE – ZBÝVAJÍCÍ ÚSEK				Číslo zakázky: P-164-8/2022-2	
Objekt: S0 161 – Dopravní značení				Datum: prosinec 2022	
				Stupeň: RDS	
Část: Část stavby uvedená do provozu v 12/2022 III/2365 „Jungmannova“ od začátku úseku v Zahořanech ke křižovatce s ulicí Macháčkova, včetně nové OK „Zahořany“				Termín:	
				Počet formátů: A2	
				Číslo přílohy:	Paré:
				2	



Městský úřad Beroun
Odbor dopravy a správních agendDatum:
15.02.2023Číslo jednací:
MBE/13538/2023/DOPR-MijSpisová značka:
1099/2022/DOPRVyřizuje / telefon:
Miláček/ 311654326E-mail:
doprava4@muberoun.cz**VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA****OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY****STANOVENÍ MÍSTNÍ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACI**

Městský úřad Beroun, odbor dopravy a správních agend, jako příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“), na základě žádosti společnosti STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 IČ: 60838744 zastoupené na základě plné moci společností ADSUM spol. s r.o., Lidická 7, 273 51 Unhošť, IČ: 45144991 a po písemném vyjádření příslušného orgánu policie, tj. Policie ČR, Krajského ředitelství Policie Středočeského kraje, územního odboru Beroun, dopravního inspektorátu, pod č.j.: KRPS-40715-66/ČJ-2022-010206

s t a n o v u j e

podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o provozu na pozemních komunikacích opatřením obecné povahy podle § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)

MÍSTNÍ ÚPRAVU PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

Místní úprava provozu na pozemních komunikacích spočívá v osazení svislého dopravního značení (dále jen SDZ), vodorovného dopravního značení (dále jen VDZ) a dopravního zařízení na silnici III/2365, místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích v obci Králův Dvůr:

- dle grafického vyobrazení dopravního značení ve schématické mapce (str. 5).

O d ů v o d n ě n í :

Městský úřad Beroun, odbor dopravy a správních agend, přistoupil ke stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, na základě žádosti společnosti STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 IČ: 60838744, zastoupené na základě plné moci společností ADSUM spol. s r.o., Lidická 7, 273 51 Unhošť, IČ: 45144991, kdy důvodem k úpravě dopravního značení na silnici III/2365, místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích v obci Králův Dvůr je dokončení výstavby nového úseku rekonstrukce silnice III/2365, včetně výstavby nové okružní křižovatky. Jedná se o úpravu dopravního značení v úseku silnice III/2365 - od křižovatky s MK (ul. Macháčkova) po okružní křižovatku (včetně) v k.ú. Zahořany, včetně vyúsťujících místních a účelových komunikací, a to z důvodu změny dopravní situace v uvedeném úseku pozemních komunikací (rekonstrukce silnice, výstavba okružní křižovatky, přechodů pro chodce atd.).

Místní úpravu provozu na pozemních komunikacích, v tomto případě na místní komunikaci, stanovil obecní úřad s rozšířenou působností po předchozím písemném vyjádření policie, v tomto případě Policie ČR, Krajského ředitelství Policie Středočeského kraje, územního odboru Beroun, dopravního inspektorátu, Tyršova 1635, 266 50 Beroun, která dala k tomuto stanovení místní úpravy kladné vyjádření pod č.j.: KRPS-40715-66/ČJ-2022-010206.

Toto kladné vyjádření je i směrodatné pro vydání opatření obecné povahy s tím, že s touto skutečností Městský úřad Beroun, odbor dopravy a správních agend seznámil v návrhu opatření obecné povahy ze dne 19.12.2022, č.j. MBE/81298/2022/DOPR-Mij, v němž také vyzval dotčené osoby (tedy kohokoliv – obecné užívání pozemní komunikace – podle § 19 odst. 1 zákona č. 13/1997Sb., o pozemních komunikacích), aby k návrhu opatření podali písemně připomínky a námítky ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho zveřejnění. Návrh opatření obecné povahy byl zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Beroun dne 19.12.2022 a sejmut dne 4.1.2023, na úřední desce Městského úřadu Králův Dvůr zveřejněn dne 19.12.2022 a sejmut dne 4.1.2023. Návrh byl zveřejněn též na elektronické úřední desce Městského úřadu Beroun a Městského úřadu Králův Dvůr způsobem umožňujícím dálkový přístup.

K návrhu opatření obecné povahy byly uplatněny v zákonné lhůtě písemné připomínky, a to:

Dne 4.1.2023 byla datovou schránkou doručena připomínka podaná:

- Spolek přátel dopravy, z.s., Urbánkova 3370, Praha 4, 143 00, IČ 17402727

Cílem připomínky je návrh na doplnění stanovení o vyznačení cyklopiktogramového koridoru (V 20) středem jízdního pruhu na kruhovém objezdu.

V odůvodnění návrhu je poukazováno na statistiku dopravních nehod na kruhových objezdech. Jsou v něm rovněž uvedena ustanovení pravidel provozu na pozemních komunikacích upravených zákonem č. 361/2000 Sb., o silničním provozu týkající se cyklistů. Dále jsou připojeny odkazy na statistiky dopravních nehod na kruhových objezdech a jsou zde uvedeny vyjmenované normy týkající se mj. cyklistů s ohledem na pohyb cyklistů na místních komunikacích a navrhování komunikací pro cyklisty na místních komunikacích.

Závěr připomínek „citace“:

Závěr:

*Poukazuji na rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 7. 1. 2009, č. j. 2 Ao 3/2008 - 100, podle něhož je při posuzování zákonnosti omezení osob dopravními značkami nutno zkoumat jeho **proporcionalitu**. To znamená, že je třeba poměřovat v kolizi stojící práva a hodnoty.*

Nezohlednění provozu cyklistů by i přes prokazatelné riziko navrhované úpravy pro cyklisty ignorovalo jejich bezpečnost a zvýšené riziko nehody cyklisty s motorovým vozidlem, které mají pro cyklisty jako méně chráněné účastníky provozu na pozemních komunikacích zpravidla vážné následky. Tím zhoršuje bezpečnosti i atraktivitu jízdy na kole a nerespektuje ČSN 736110 a TP 179.

Odůvodnění návrhu OOP není v souladu s ústavou zaručenými právy, mj. na ochranu zdraví.

Vzhledem k výše uvedenému požadujeme stanovení cyklopiktogramového koridoru (V 20) středem jízdního pruhu na kruhovém objezdu.

Odborem dopravy a správních agend bylo po posouzení připomínek přistoupeno k vyžádání stanoviska dotčeného orgánu Policie České republiky, a to zejména z důvodu, že se připomínky týkají vyznačení vodorovného dopravního značení a je podatelem zmiňována nutnost zajištění bezpečnosti cyklistů.

Dne 9.2.2023 bylo doručeno cestou datové schránky stanovisko Policie České republiky, Krajského ředitelství Policie Středočeského kraje, Územního odboru Beroun, Dopravního inspektorátu (č.j. KRPS-40715-72/ČJ-2022-010206), jehož znění je citováno:

Na základě Vaší žádosti o stanovisko týkající se připomínky Spolku přátel dopravy, která se týká umístění vodorovného dopravního značení V 20 "Piktogramový koridor pro cyklisty" uprostřed jízdního pruhu nových okružních křižovatek v obci Králův Dvůr, na silnici II/605 a III/2365, Vám sdělujeme, že neshledáváme umístění navrhovaného dopravního značení jako opodstatněné a nutné. Stávající dopravní značení je dle schválené projektové dokumentace. Do okružních křižovatek nevyústí žádné stezky pro cyklisty.

Dále byl návrh konzultován se zpracovatelem návrhu dopravního značení, tj. odbornou firmou ADSUM spol. s.r.o., Lidická 7, 273 51 Unhošť, kdy bylo konstatováno i problematické praktické provedení piktogramů u okružní křižovatky s malým průměrem, kdy s ohledem na délku vodorovné dopravní značky V20 (2,7m) by bylo těžko realizovatelné její umístění v oblouku jízdního pruhu v okružní křižovatce.

Zmiňovaná nutnost posuzování zákonnosti omezení osob dopravními značkami, kdy je nutné zkoumat jeho proporcionalitu, byla tato dle odboru dopravy a správních agend plně splněna. Dopravní opatření bylo navrženo odbornou firmou, bylo vydáno souhlasné stanovisko Policie České republiky a samotným posouzením všech podkladů nebylo zjištěno nedostatků ve věci navrženého dopravního značení s ohledem na příslušné předpisy. Dále je nutno uvést, že v předmětném rekonstruovaném úseku nedošlo k omezení osob dopravními značkami nad rámec nutnosti označení okružní křižovatky dopravními značkami zajišťujícími bezpečnost a plynulost silničního provozu.

Provoz cyklistů v předmětné okružní křižovatce plynule navazuje na jejich provoz na příjezdových komunikacích k okružní křižovatce. V místě se nenachází žádné vyústění komunikace pro cyklisty. Tito přijíždějí na okružní křižovatku v jízdním pruhu po silnici III. třídy, resp. místní komunikaci a s ohledem na velikost okružní křižovatky a šířku jízdního pruhu, je řidič nucen projíždět křižovatkou za cyklistou a není zde při dodržení ustanovení zákona možné předjíždění cyklistů, čímž je i zásadně snížena možnost kolizní situace při vyjíždění vozidel a cyklistů z okružní křižovatky.

Po posouzení všech připomínek a zejména na základě stanoviska dotčeného orgánu Policie české republiky, kdy toto stanovisko je směrodatné k případnému stanovení dopravního značení, je odborem dopravy a správních agend konstatováno, že k požadavku na vyznačení vodorovné dopravní značky V20 „piktogramový koridor pro cyklisty“ středem jízdního pruhu na kruhovém objezdu (okružní křižovatce) na silnici III/2365 nebude přistoupeno.

K návrhu opatření obecné povahy nebyly ve stanovené lhůtě doručeny dotčenými osobami žádné další připomínky ani námítky a s přihlédnutím na výše uvedené odůvodnění a souhlasné vyjádření dotčeného orgánu Policie České republiky přistoupil odbor dopravy a správních agend k vydání stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích.

Poučení: Toto stanovení se vydává formou opatření obecné povahy, které se oznamuje veřejnou vyhláškou. Opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky. Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek (§ 173 odst. 2 správního řádu)

Ing. Albert Červenka, v.r.
vedoucí odboru dopravy a správních agend

Za správnost vyhotovení: Iveta Brůnová

Toto opatření obecné povahy (č.j. MBE/13538/2023/DOPR-MiJ) musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Beroun a úřední desce Městského úřadu Králův Dvůr.

Vývěsní lhůta začíná den následující po dni vyvěšení. Sejmutí vyhlášky je možno následující pracovní den po posledním (patnáctém) dni vývěsní lhůty. Po uplynutí lhůty vyznačení údajů musí být vyhláška neprodleně vrácena zpět odboru dopravy a správních agend. Zároveň žádáme o zveřejnění písemnosti způsobem umožňujícím dálkový přístup a o potvrzení této skutečnosti!

Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí.

Obdrží:

Dotčené orgány:

- Policie ČR, Krajské ředitelství Policie Středočeského kraje, dopravní inspektorát, Tyršova 1635, 266 01 Beroun

Ostatní:

- Městský úřad Beroun, kancelář tajemníka, podatelna MěÚ Beroun, Husovo náměstí 68, 266 01 Beroun
(pro zveřejnění na úřední desce na dobu nejméně 15 dnů – podle § 172 odst. 1 správního řádu)

- Městský úřad Králův Dvůr, náměstí Míru 139, 267 01 Králův Dvůr
(pro zveřejnění na úřední desce na dobu nejméně 15 dnů – podle § 172 odst. 1 správního řádu)

- KSÚS Středočeského kraje, p.o., Zborovská 11, 150 21 Praha 5

- ADSUM spol. s r.o., Lidická 7, 273 51 Unhošť, IČ: 45144991



Objekt: Informační Téma
 Datum: 15.12.2022 09:00:05
 Stupeň: 1. stupeň
 Projekt: 1. stupeň
 Projekt: 1. stupeň
 Projekt: 1. stupeň

Vyrabí: Martin Frolík tel.: 777 690 022, e-mail: frolik@adsum.cz Investor: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje příspěvk. org. Stř. kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 Objednatel (stavobník): STRABAG a.s. Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice		Zodpovědný projektant, kontrola: Martin Frolík	
II/605 a III/2365 BEROUN REKONSTRUKCE - ZBÝVAJÍCÍ ÚSEK		Číslo zakázky: P-164-B/2022-2 Datum: prosinec 2022 Stupeň: RDS Termín: Počet formátů: A2	
Objekt: SO 161 - Dopravní značení Část: Část stavby uvedená do provozu v 12/2022 III/2365 „Jungmannova“ od začátku úseku v Zahoranech ke křižovatce s ulicí Macháčkova, včetně nové OK „Zahorany“		Počet příloh: 2 Paré:	



STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4
CZ – 158 00 Praha 5 / Česká republika
Odštěpný závod Praha

STRABAG

Martin Voříšek

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
Zborovská 81/11,
150 21, Praha 5 - Smíchov

Vyřizuje:

Ing. Jan Novák
Mobil +420 724 149 022
jan.novak@strabag.com

Naše značka:

TC/BB/DCLK/027/23/Nov

24.3.2022

Stavba: II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic – zbývajících úsek

Č. smlouvy Objednatele: S-2256/00066001/2021
Č. smlouvy Zhotovitele: 841/DC/DC/2021/041DCLK

Věc: Oznámení Zhotovitele o změnách množství položek objektu SO 161, které vznikly na základě požadavků Odboru dopravy a správních agend Městského úřadu Beroun a Krajského ředitelství Policie Středočeského kraje.


Vážený Objednateli,

Na základě Stanovení místní úpravy provozu a pozemních komunikací, které dne 19.12.2022 a 15.02.2023 vydal Odbor dopravy a správních agend Městského úřadu Beroun a také na základě požadavků Krajského ředitelství Policie Středočeského kraje dochází k úpravám projektu svislého a vodorovného dopravního značení objektu SO 161 a souvisejícím úpravám množství položek soupisu prací tohoto objektu. Zmiňovaná Stanovení místní úpravy provozu a požadavky Krajského ředitelství Policie Středočeského kraje jsou přílohami tohoto dopisu. Jedná se především o nahrazení velkoformátových lamelových tabulí celoplošnými tabulemi a doplnění barevného vodorovného dopravního značení.

Dle našeho názoru nebylo možné výše uvedenou skutečnost předem předvídat a Zhotovitel na ni proto tímto Objednatele upozorňuje a dále uvádí, že:

- a) může nastat prodloužení Doby pro dokončení díla dle Smluvních podmínek. Stavební objekt SO 161 se nyní nenachází na kritické cestě harmonogramu prací, ale jeho dokončení je podmínkou pro dokončení celé stavby. Bez provedení požadovaných úprav nelze očekávat souhlas Krajského ředitelství Policie Středočeského kraje s kolaudací stavby.
- b) nastane změna smluvní ceny, protože bude nutné přistoupit k realizaci opatření vedoucích k vyřešení vzniklé situace. Zvolená opatření se pak projeví změnou některých položek soupisu prací objektu SO 161.

V Berouně dne 24.3.2023


Ing. Jan Novák
Vedoucí projektu

STRABAG

STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
IČ: 60838744
(158)

STRABAG a.s.
Lidická 802
266 01 Beroun/Česká republika
www.strabag.cz

Tel. +420 312 274-721
Fax +420
strabag.praha@strabag.com

Československá obchodní banka, a.s.
IBAN: CZ02 0300 0000 0001 1207 1233
BIC/SWIFT: CEKOCZPPXXX

Sídlo společnosti: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice. Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, sp. zn. B 7634.
IČO 60838744, DIČ CZ60838744

Příloha č. 13 pro ZBV č. 20

Přehled cenových nabídek subdodavatelů

Subdodavatel	cena celkem (Kč)
ADSUM, s.r.o.	37 847
Pražské služby, a.s.	39 401
Značky Praha, s.r.o.	41 270

Vybraný subdodavatel: ADSUM, s.r.o.



DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
SILNIČNÍ SVODIDLA
PROJEKTY REALIZACE PRONÁJEM



STRABAG a.s.

Kačírkova 982/4

158 00 Praha 5 - Jinonice

Ing. Richard Romolini

e-mail: richard.romolini@strabag.com

SOUPIS PRACÍ - VÍCEPRÁCE


Stavba "II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce" - SDZ + VDZ - VÍCEPRÁCE - III/2365

Text	MJ	Počet MJ	Počet dnů pronájmu	Cena za MJ	Celkem
III/2365, vč. OK "Zahořany"					
informativní značky směrové Z4a reflexní 400x1200mm	kus	1,00		1 027,00 Kč	1 027,00 Kč
Montáž sloupku dopravních značek délky nad 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	2,00		1 680,00 Kč	3 360,00 Kč
sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 4,0m	kus	2,00		840,00 Kč	1 680,00 Kč
Vodorovné dopravní značení symboly V15 2 000 x 5 000 mm, barevné, barva	kus	4,00		1 950,00 Kč	7 800,00 Kč
Vodorovné dopravní značení symboly V15 2 000 x 5 000 mm, barevné, plast	kus	4,00		5 995,00 Kč	23 980,00 Kč
Celkem bez DPH					37 847,00 Kč

Zpracoval: Martin Frolík, tel.: 777 690 022

V Unhošti dne 28.2.2023





Strabag, a.s.

Kačírkova 982/4

158 00 Praha 5 - Jinonice

Ing. Martin Vlček

e-mail: martin.vlcek@strabag.com

V Praze dne 2.3.2023

SOUPIS PRACÍ - stavba "II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce" - SDZ + VDZ

Text	MJ	Počet MJ	Cena za MJ	Celkem
III/2365, vč. OK "Zahořany"				
informativní značky směrové Z4a reflexní 400x1200mm	kus	1,00	1 251,00 Kč	1 251,00 Kč
Montáž sloupku dopravních značek délky nad 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	2,00	2 000,00 Kč	4 000,00 Kč
sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 4,0m	kus	2,00	825,00 Kč	1 650,00 Kč
Vodorovné dopravní značení symboly V15 2 000 x 5 000 mm, barevné, barva	kus	4,00	2 000,00 Kč	8 000,00 Kč
Vodorovné dopravní značení symboly V15 2 000 x 5 000 mm, barevné, plast	kus	4,00	6 125,00 Kč	24 500,00 Kč
Celkem bez DPH				39 401,00 Kč

V Praze dne 2.3.2023


PRAŽSKÉ SLUŽBY
 akciová společnost
 Pod Šancemi 444/1 • 180 77 PRAHA 9
 IČ 6019 4120

STRABAG a.s.

Lidická 802

266 01 Beroun

Ing. Martin Vlček

e-mail: martin.vlcek@strabag.com



ZNAČKY PRAHA s. r. o.

Kralupská 90

252 62 Statenice - Černý Vůl

Stavba "II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce" - SDZ + VDZ

Text	MJ	Počet MJ	Počet dnů pronájmu	Cena za MJ	Celkem
III/2365, vč. OK "Zahořany"					
<i>informativní značky směrové Z4a reflexní 400x1200mm</i>	<i>kus</i>	1,00		1 510,00 Kč	1 510,00 Kč
Montáž sloupku dopravních značek délky nad 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	2,00		1 950,00 Kč	3 900,00 Kč
<i>sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 4,0m</i>	<i>kus</i>	2,00		930,00 Kč	1 860,00 Kč
Vodorovné dopravní značení symboly V15 2 000 x 5 000 mm, barevné, barva	<i>kus</i>	4,00		2 050,00 Kč	8 200,00 Kč
Vodorovné dopravní značení symboly V15 2 000 x 5 000 mm, barevné, plast	<i>kus</i>	4,00		6 450,00 Kč	25 800,00 Kč
Celkem bez DPH					41 270,00 Kč

dne 27.2.2023

Ing. Monika Vaculíková

STANOVISKO K ZBV 20

SO/Změna v pořadí	161.2/1
Název SO	Dopravní značení
Název změny	Zvětšení rozsahu

09.05.2023

Stanovisko:

Ve stavebním objektu 161.2 dochází k úpravě množství položek soupisu prací proti předpokladu z PDPS. Změny PD vyplývají z podrobného rozpracování dopravního značení v RDS a jeho projednání s dotčenými orgány státní správy.

Při projednávání návrhu trvalého dopravního značení došlo ze strany Odboru dopravy města Beroun a Policie Středočeského kraje k předložení požadavků na doplnění a úpravu návrhu dopravního značení. Úpravy množství položek soupisu prací byly provedeny na základě Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, vydaných Odborem dopravy a správních agend Městského úřadu Beroun, ze dne 19.12.2022 a 15.2.2023. Doplněny byly zejména bezpečnostní prvky v místě přechodů pro chodce doplněním barevného vodorovného značení.

Zároveň byly z prostorových důvodů nahrazeny velkoformátové lamelové tabule celoplošnými tabulemi.

Autorský dozor s předloženým dokumentem ZBV č. 20 souhlasí.

Další připomínky k ZBV AD neuplatňuje. ZBV je možné autorizovat po cenovém projednání ze strany Krajské správa a údržby Středočeského kraje.

 	Valbek, spol. s r.o. středisko Praha V Olšinách 2300/75 100 00 Praha 10 – Strašnice iČ 48266230 dič CZ48266230	07
--	---	----

Ing. Martin Máša
Autorský dozor



Vyjádření TDS k ZBV č.20



Název akce: „II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic – zbývajících úsek“

Věc: Souhlasné stanovisko k SO 161.2/1

Stanovisko TDS k ZBV č.20

Předmětem ZBV č.20 bylo projednávání návrhu trvalého dopravního značení došlo ze strany Odboru dopravy města Beroun a Policie Středočeského kraje k předložení požadavků na doplnění a úpravu návrhu dopravního značení oproti předpokladu PDPS. Úpravy množství položek soupisu prací byly provedeny na základě Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, vydaných Odborem dopravy a správních agend Městského úřadu Beroun, ze dne 19.12.2022 a 15.2.2023. Posouzení správnosti ZBV zajistí supervize a finální schválení spadá do kompetence vedení KSÚS.

vypracoval: Pavel Novák TDS

Pavel Novák

Digitálně podepsal Pavel
Novák
Datum: 2023.04.16
20:10:37 +02'00'

STRABAG a.s.
Dopravní stavitelství
Kačírkova 982/4
158 00 Praha 5

Projekt: II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic – zbývajících úsek

Věc: Souhlasné stanovisko ke změně v rámci SO 161.2 – Dopravní značení

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o., jako objednatel akce „II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic – zbývajících úsek,“ po dohodě a v souladu se stanoviskem AD a TDS, souhlasí se změnou v rámci SO 161.2 – Dopravní značení. Důvodem je dodatečný požadavek Policie Středočeského kraje a Odboru dopravy města Beroun na doplnění a úpravu dopravního značení oproti předpokladu PD. Úpravy byly provedeny na základě Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, vydaných Odborem dopravy a správních agend MÚ Beroun. Změny budou řešeny formou ZBV č. 20.

Jedná se pouze o souhlas s návrhem technického řešení navrhované ZBV. Posouzení správnosti ZBV zajistí supervize a finální schválení spadá do kompetencí vedení KSÚS.

Martin Voříšek
Projektový manažer



Tel.: 702 266 228

E-mail: martin.vorisek@ksus.cz


Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace

Zborovská 11, 150 21 Praha 5

IČ: 00066001

Kancelář: Praha

www.ksus.cz



Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Zborovská 11
IČO: 00066001
150 21 Praha 5
DIČ: CZ00066001
