

## Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

**"EIB 2021" II/339 Červené Janovice - Štipoklasy**

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

**Dopravně inženýrská opatření (DIO), ZÚ - km 2,76**

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

**180.1/1**

Číslo ZBV:

**1**

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace  
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov  
IČ: 00066001

Zhotovitel: Společnost SILNICE ČÁSLAV + ČNES  
SILNICE ČÁSLAV, s.r.o. (Vedoucí společník)  
Zbraslavice 2, 285 21 Zbraslavice  
IČ: 284 47 085

## Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.3	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.5	-300 000,00	135 161,00	-164 839,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
<b>1</b>	<b>-300 000,00</b>	<b>135 161,00</b>	<b>-164 839,00</b>

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.  
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy  
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré:

## Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: <b>"EIB 2021" II/339 Červené Janovice - Štipoklasy</b>	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: <b>180.1/1</b>	Číslo ZBV: <b>1.5</b>
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>Dopravně inženýrská opatření (DIO), ZÚ - km 2,76</b>		

Strany smlouvy o dílo objednatel č.: S-2050/00066001/2021 a zhotovitel č.: 2021/028 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 03.09.2021 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: Společnost SILNICE ČÁSLAV + ČNES, Vedoucí společník: SILNICE ČÁSLAV, s.r.o., Zbraslavice 2, 285 21 Zbraslavice, IČ: 284 47 085

<u>Přílohy Změnového listu:</u>	Paré č.	Příjemce
1. Krycí list 1 počet listů	1, 2	Objednatel
2. Změnový list 1 počet listů	3	Zhotovitel
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů	4	Stavební dozor
4. Rozpis ocenění Změn položek ZBV 1 počet listů		
5. Přehled zařazení změn do skupin 1 počet listů		
6. Přehled dalších dokladů 1 počet listů		
Další doklady dle přehledu dokladů 12 počet listů		

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

**Dílčí změna č. 1: Dopravně inženýrské opatření**

Zadávací dokumentace předpokládala provedení dopravně inženýrského opatření kyvadlovým provozem.

Na základě návrhu zhotovitele se ve staničení 1,600 km - 2,883 km provede plná uzavírka silnice. Tato změna je vyvolána z důvodu nerealizace středové spáry ve vozovce (zlepšení funkčních a estetických vlastností vozovky) a dále z důvodu nově realizovaného překopu vozovky. Zhotovitel následně navrhl tuto změnu příslušným úřadům, vydávajícím rozhodnutí o uzavírcce.

Tento úřad rozhodl, že způsob provedení DIO na plnou uzavírku je způsobilý k povolení (08 Rozhodnutí o uzavírcce - Město Kutná Hora ze dne 04.04.2022 a 09 Rozhodnutí o uzavírcce - Město Čáslav ze dne 31.03.2022). Pokyn objednatel ke zpracování ZBV1 (10 Pokyn objednatel), vyjádření autorského dozora (11 Souhlasné vyjádření AD) a vyjádření technického dozora investora (12 Souhlasné vyjádření TDI) jsou přílohou tohoto ZBV.

Z těchto důvodů je v rozpočtu proveden odpočet položky na kyvadlový provoz a připočet nových položek na plnou uzavírku.

Dílčí změna č. 1 je vyjádřena položkami č. 5 (kód 02720) a č. 8N, 9N a 10N (kód: 914132, 914133 a 914139) a snižuje smluvní cenu stavby o 164 839 Kč.

Jedná se o změnu, která vznikla na žádost zhotovitele v průběhu prováděcí práce. Celkově se jedná o Změnu de minimis podle § 5, odst. 1, písm. e), resp. § 12 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 04.11.2020) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č.

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazený do **Skupiny 5**. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a jedná se změnu de minimis.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
<b>-300 000,00</b>	<b>135 161,00</b>	<b>-164 839,00</b>	<b>435 161,00</b>

**Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:**

Zhotovitel (stavbyvedoucí): SILNICE ČÁSLAV, s.r.o.	jméno	Ing. Alois Holík	datum	podpis
Autorský dozor: Atelier PROMIKA s.r.o.	jméno	Ing. Michael Kudera	datum	podpis
Stavební dozor: KOMOVIA s.r.o.	jméno	Ing. Jan Sedláček	datum	podpis
Zástupce Objednatel:	jméno	Petr Holan	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitel sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

<b>Objednatel</b> (pověřen řízením)	jméno	Ing. Aleš Čermák, MBA, PhD.	datum	podpis
<b>Zhotovitel</b>	jméno	Ing. Michal Holík	datum	podpis
				Číslo paré:



## Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 1.5

Evidenční číslo a název stavby: "EIB 2021" II/339 Červené Janovice - Štipoklasy								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: SO180.1./Dopravně inženýrská opatření (DIO), ZÚ - km 2,76								č. 1					
Číslo a název rozpočtu: SO180.1./Dopravně inženýrská opatření (DIO), ZÚ - km 2,76								Skupina změn 5					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	2720	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY Částečná uzavírka - 5. a 6. etapa km 1,60 – km 2,76, pravá a levá strana, 1160 m	KPL	1,00	0	-1	300 000,00	300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	-300 000,00	-100,00%
8N	914132	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM kompletní uzavírka - 5. a 6. etapa km 1,600 – km 2,883 <u>způsob stanovení nové výměry:</u> A15+E7b = 3 ks B1+E3a = 1 ks B1+E13 = 2 ks B24b+E13 = 2 ks B21a = 1 ks B4+E13 = 11 ks A10+E7b = 2 ks Z2 = 2 ks Z4 = 40 ks IP22 = 23 ks IS11a = 3 ks IS11b = 40 ks Celkem: 3+1+2+2+1+11+2+2+40+23+3+40=130,0000 [D]	KUS	0,00	130,00	130,000	314,00	0,00	0,00	40 820,00	40 820,00	40 820,00	100,00%
9N	914133	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ kompletní uzavírka - 5. a 6. etapa km 1,600 – km 2,883 <u>způsob stanovení nové výměry:</u> A15+E7b = 3 ks B1+E3a = 1 ks B1+E13 = 2 ks B24b+E13 = 2 ks B21a = 1 ks B4+E13 = 11 ks A10+E7b = 2 ks Z2 = 2 ks Z4 = 40 ks IP22 = 23 ks IS11a = 3 ks IS11b = 40 ks Celkem: 3+1+2+2+1+11+2+2+40+23+3+40=130,0000 [D]	KUS	0,00	130,00	130,000	183,00	0,00	0,00	23 790,00	23 790,00	23 790,00	100,00%
10N	914139	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ kompletní uzavírka - 5. a 6. etapa km 1,600 – km 2,883 <u>způsob stanovení nové výměry:</u> 67 dní x 130 PDZ = 8710 KSDEN	KUSDEN	0,00	8710,00	8710,000	8,10	0,00	0,00	70 551,00	70 551,00	70 551,00	100,00%
<b>Celkem</b>								<b>300 000,00</b>	<b>- 300 000,00</b>	<b>135 161,00</b>	<b>135 161,00</b>	<b>- 164 839,00</b>	<b>-54,95%</b>

Odpovědný zástupce Objednatel i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.

Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Alois Holík, (jednatel společnosti)

Za Objednatel: Petr Holan, (vedoucí oblasti Kutná Hora)

Datum:

Datum:

Podpis:

Podpis:

## PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby:

"EIB 2021" II/339 Červené Janovice - Štípkoklasy

1	Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	32 260 000,00
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	32 095 161,00
	<b>Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH</b>	<b>38 835 144,81</b>
3=(2/1)*100	Procento změny Přijáté smluvní částky	99,49%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%
40=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, odst. (5), písm. b)	-0,93%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	0,00
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	0,00%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	9 678 000,00

9=(32A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	0,00%
10=(36A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,00%
10A=32A+36A	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	0,00
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	16 130 000,00

12=(37/1)*100	Sledování limitu (15%)	1,35
13=37	Sledování limitu 140 448 000	435 161,00
14=140448000-37		140 012 839,00

		- 1 -																				- 2 -			- 3 -				- 4 -				- 5 -	
		Vyhrazené změny (Doměrky)																				Záměna položek (Započítávání)			Nepředvídanost				Nezbytnost				Změny de minimis	
SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny de minimis (15 % nebo limit 140 448 000 Kč)	limit 15 %													
16	17	18	19=23+26+29+33	20=24+27+30+34+37+39	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	32=29+30	32A=ABS(29)+30	33	34	36=33+34	36A=ABS(33)+34	37	38=(37/1)*100													
		"EIB 2021" II/339 Červené Janovice - Štípkoklasy	- 300 000,00	135 161,00	- 164 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 161,00	1,35												
180.1	1	Dopravné inženýrské opatření (DIO), ZÚ - km 2,76 / Dopravné inženýrské opatření	- 300 000,00	135 161,00	- 164 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 161,00	1,35												

**Poznámka:** Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

## Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	1
Název a evidenční číslo stavby:	<b>"EIB 2021" II/339 Červené Janovice - Štipoklasy</b>
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Dopravně inženýrská opatření (DIO), ZÚ - km 2,76
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	180.1/1

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
07 Soupis prací SO po změnách	1	
08 Rozhodnutí o uzavírce - Město Kutná Hora	4	
09 Rozhodnutí o uzavírce - Město Čáslav	4	
10 Pokyn objednatele	1	
11 Souhlasné vyjádření AD	1	
12 Souhlasné vyjádření TDI	1	
Počet listů celkem	12	

Rozpis ocenění Změn položek - celkem													
Evidenční číslo a název stavby: "EIB 2021" II/339 Červené Janovice - Štipoklasy Číslo a název SO/PS: SO180.1./Dopravně inženýrská opatření (DIO), ZÚ - km 2,76 Číslo a název rozpočtu: SO180.1/Dopravně inženýrská opatření (DIO), ZÚ - km 2,76								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								1					
								celkem					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdil cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	0	<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>						<b>862 500,00</b>	<b>- 300 000,00</b>	<b>135 161,00</b>	<b>697 661,00</b>	<b>- 164 839,00</b>	<b>-19,11%</b>
1	027121	PROVIZORNÍ PŘÍSTUPOVÉ CESTY - ZŘÍZENÍ	M2	39,000	39,00	0,000	2 000,00	78 000,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00%
2	027123	PROVIZORNÍ PŘÍSTUPOVÉ CESTY - ZRUŠENÍ	M2	39,000	39,00	0,000	500,00	19 500,00	0,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00%
3	02720	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL	1,000	1,00	0,000	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00%
4	02720	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL	1,000	1,00	0,000	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00%
5	2720	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY Částečná uzavírka - 5. a 6. etapa km 1,60 – km 2,76, pravá a levá strana, 1160 m <u>způsob stanovení měněné výměry:</u> nerealizováno - nahrazeno kompletní uzavírkou	KPL	1,00	0,00	-1,000	300 000,00	300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	-300 000,00	-100,00%
6	02720	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL	1,000	1,00	0,000	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
7	02720	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL	1,000	1,00	0,000	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
8N	914132	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM kompletní uzavírka - 5. a 6. etapa km 1,600 – km 2,883 <u>způsob stanovení nové výměry:</u> A15+E7b = 3 ks B1+E3a = 1 ks B1+E13 = 2 ks B24b+E13 = 2 ks B21a = 1 ks B4+E13 = 11 ks A10+E7b = 2 ks Z2 = 2 ks Z4 = 40 ks IP22 = 23 ks IS11a = 3 ks IS11b = 40 ks Celkem: 3+1+2+2+1+11+2+2+40+23+3+40=130,0000	KUS	0,00	130,00	130,000	314,00	0,00	0,00	40 820,00	40 820,00	40 820,00	100,00%
9N	914133	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ kompletní uzavírka - 5. a 6. etapa km 1,600 – km 2,883 <u>způsob stanovení nové výměry:</u> A15+E7b = 3 ks B1+E3a = 1 ks B1+E13 = 2 ks B24b+E13 = 2 ks B21a = 1 ks B4+E13 = 11 ks A10+E7b = 2 ks Z2 = 2 ks Z4 = 40 ks IP22 = 23 ks IS11a = 3 ks IS11b = 40 ks Celkem: 3+1+2+2+1+11+2+2+40+23+3+40=130,0000	KUS	0,00	130,00	130,000	183,00	0,00	0,00	23 790,00	23 790,00	23 790,00	100,00%
10N	914139	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ kompletní uzavírka - 5. a 6. etapa km 1,600 – km 2,883 <u>způsob stanovení nové výměry:</u> 67 dní x 130 PDZ = 8710 KSDEN	KUSDEN	0,00	8710,00	8710,000	8,10	0,00	0,00	70 551,00	70 551,00	70 551,00	100,00%
<b>Celkem</b>								<b>862 500,00</b>	<b>- 300 000,00</b>	<b>135 161,00</b>	<b>697 661,00</b>	<b>- 164 839,00</b>	<b>-19,11%</b>



**MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA**  
Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195  
**odbor dopravy a silničního hospodářství**  
sídlo odboru: Radnická 178,  
tel.

SPIS. ZN.: MKH/043841/2022/04  
Č.J.: MKH/047626/2022  
VYŘIZUJE: Kateřina Křížová  
TEL.:  
E-MAIL:

SILNICE ČÁSLAV, s.r.o.  
Zbraslavice 2  
285 21 Zbraslavice

DATUM: 4.4.2022

## ROZHODNUTÍ POVOLENÍ UZAVÍRKY

### Výroková část:

Městský úřad Kutná Hora, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") ve správním řízení přezkoumal žádost o povolení uzavírky, kterou dne 21.3.2022 podala společnost

### **SILNICE ČÁSLAV, s.r.o., IČO 28447085, Zbraslavice 2, 285 21 Zbraslavice**

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto přezkoumání a projednání podle § 24 odst. 2 zákona o pozemních komunikacích a § 39 odst. 4 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

### I. P O V O L U J E

**úplnou uzavírku silnice č. II/339** (mezi obcí Štipoklasy a křižovatkou se silnicí č. III/0171 u obce Zdeslavice v km 17,710 – 19,000) a **částečnou uzavírku silnice č. II/339** (úsek řízen pomocí SSZ od křižovatky se silnicí č. III/0171 u obce Zdeslavice po křižovátku s místní komunikací směr Katlov v km 16,830 – 17, 710)

- doba trvání uzavírky: **od 14.4.2022 do 17.6.2022** (na dobu nezbytnou pro provedení stavebních prací)
- důvod uzavírky: provádění stavby: II/339 Červené Janovice - Štipoklasy
- opatření ve vedení linkové osobní dopravy: Dopravní obslužnost je zajišťována linkami PID 402 Praha-Zruč nad Sázavou-Čáslav a 805 Zruč nad Sázavou-Zbraslavice-Kutná Hora-Kolín  
Ruší se zastávka: „Černíny,Zdeslavice,rozc.“ – obousměrně bez náhrady pro obě linky  
„Červené Janovice,Katlov“ – obousměrně bez náhrady pro obě linky  
Zřizuje se zastávka: „Černíny“ – obousměrně v místech bývalé zastávky pro linku 805  
„Černíny,Zavadilka“ – obousměrně v místech bývalé zastávky pro linku 805

### II. N A Ř I Z U J E

**objížd'ku** v návaznosti na uzavírku uvedenou v bodě I. výroku tohoto rozhodnutí se stanovenou objíždznou trasou:

Pro autobusovou dopravu: linka 402 bude vedena ze zastávka „Štipoklasy“ po II/126 - vlevo II/126 - vpravo III/0172 - vpravo II/339 do zastávky „Červené Janovice“ a dále po své pravidelné trase;  
linka 805 bude vedena ze zastávky „Štipoklasy“ po II/126 – vpravo III/0172 do zastávky „Opatovice I“ a jízda zpět po III/0172 a dále po své pravidelné trase.



Pro osobní automobily: z obce Štipoklasy po silnici č. II/126, III/0173 a II/339 přes obec Červené Janovice. Délka objízdné trasy je 13 km. Objízdná trasa je obousměrná.

Pro nákladní automobily: z obce Štipoklasy po silnici č. II/126, II/337 přes obec Křesetice, Kluky a II/339 přes obec Červené Janovice. Délka objízdné trasy je 13 km. Objízdná trasa je obousměrná.

**Pro uzavírku se stanovují tyto podmínky:**

1. Dopravní značení: podle stanovení přechodné úpravy provozu vydané Městským úřadem Kutná Hora, odborem dopravy a silničního hospodářství dne 28.3.2022, spis.zn.: MKH/043841/2022/03 (č.j. MKH/047512/2022) a Městským úřadem Čáslav, Odborem dopravy ze dne 31.3.2022, spis. zn. 3769/2022 na základě vyjádření Policie ČR, KŘ Policie Středočeského kraje, DI Kutná Hora ze dne 22.2.2022, č.j.: KRPS-43350-2/ČJ-2022-010506-ZZ.
2. Pracovník odpovědný za organizování a zabezpečení akce: Pavel Gregor, tel.: 724 047 036.
3. Instalaci a potřebnou manipulaci s dopravním značením bude zajišťovat žadatel na vlastní náklady podle návrhu schváleného KŘ Policie Středočeského kraje, DI Kutná Hora.
4. Na začátku uzavírky bude umístěna orientační tabule s uvedením dat zahájení a ukončení uzavírky, včetně názvu a sídla žadatele.
5. Orgány KŘ Policie Středočeského kraje, DI Kutná Hora mají právo kontroly a určení dalších doplňujících podmínek tohoto rozhodnutí.
6. Před zahájením stavebních prací a po jejich dokončení bude proveden monitoring objízdných tras za účasti zástupce KSÚS a žadatele.
7. V průběhu uzavírky bude zhotovitel stavby provádět pravidelnou kontrolu technického stavu silnic a přechodného dopravního značení na silnicích, po kterých byla vedena objízdná trasa. Případné závady budou neprodleně odstraněny.
8. V průběhu uzavírky musí být v maximální míře zohledněna potřeba zajištění dopravní obsluhy přilehlých nemovitostí v nejbližším okolí staveniště.
9. O zahájení a ukončení úplné uzavírky, jakož i o chystaných dopravních opatřeních, bude žadatel v místě obvyklým a prokazatelným způsobem s předstihem informovat vlastníky a uživatele uzavírkou dotčených sousedních nemovitostí.
10. Práce budou probíhat podle žadatelem předloženého harmonogramu stavebních prací. Nebude překročen stanovený termín uzavírky. O přesném termínu zahájení úplné uzavírky úseku silnice č. II/339 a dalších změnách musí žadatel informovat příslušné orgány Policie ČR, složky záchranného integrovaného systému, dotčenou obec a Městský úřad, odbor dopravy a silničního hospodářství, Krajský úřad Středočeského kraje, odbor veřejné mobility, oddělení veřejné dopravy, IDSK. Dílčí termíny realizace jednotlivých etap stavby uvedené v příloženém harmonogramu jsou závazné a mohou být upraveny pouze výjimečně v případě mimořádně nepříznivých klimatických podmínek znemožňujících provádění stavby navrženou technologií.
11. Žadatel vhodnými technickými opatřeními zabezpečí, aby v rámci doby trvání uzavírky byl umožněn přístup k sousedním nemovitostem.
12. Nikdo nemá nárok na náhradu případných ztrát, jež mu vzniknou v důsledku uzavírky nebo objíždky, podle ust. § 24 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích.
13. Městský úřad Kutná Hora, odbor dopravy a silničního hospodářství si vyhrazuje právo tyto podmínky pozměnit nebo doplnit, bude-li to vyžadovat veřejný zájem.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád – dále jen „správní řád“):

SILNICE ČÁSLAV, s.r.o., IČO 28447085, Zbraslavice 2, 285 21 Zbraslavice

**Odůvodnění:**

Žadatel podal dne 21.3.2022 žádost o povolení úplnou uzavírku silnice č. II/339 (mezi obcí Štipoklasy a křižovatkou se silnicí č. III/0171 u obce Zdeslavice v km 17,710 – 19,000) a částečnou uzavírku silnice č. II/339 (úsek řízen pomocí SSZ od křižovatky se silnicí č. III/0171 u obce Zdeslavice po křižovátku s místní komunikací směr Katlov v km 16,830 – 17, 710).

Za účastníky řízení silniční správní úřad považuje žadatele a vlastníka, resp. pověřeného správce uzavírkou a objíždkou dotčených komunikací, dále obce, jejichž zastavěného území se dotýká uzavírka nebo objíždková trasa.

Žadatel k žádosti doložil mimo jiné následující podklady pro rozhodnutí:

- situace uzavírky, objízdné trasy
- harmonogram
- vyjádření KSÚS ze dne 10.3.2022, č.j. 1984/22/KSUS/KHT/VYC
- vyjádření IDSK ze dne 23.3.202, zn.: 01269/22/BUS
- vyjádření Krajského úřadu Stř. kraje, Odbor veřejné mobility ze dne 23.3.2022
- vyjádření PČR DI Kutná Hora ze dne 22.2.2022, č.j. KRPS+43350-2/ČJ-2022-010506-ZZ
- vyjádření obce Červené Janovice, Štipoklasy, Kluky, Úmonín, Černíny, Močovice, Křesetice, Krchleby

Silniční správní úřad žádost podle § 39 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů posoudil a po projednání podle § 24 odst. 2 písm. a) až c) zákona o pozemních komunikacích a na základě souhlasu příslušného orgánu Policie České republiky podle § 24 zákona o pozemních komunikacích a § 39 odst. 4 a 5 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů povolil uzavírku za podmínek stanovených ve výroku tohoto rozhodnutí.

Účastníci řízení - další dotčené osoby (§ 27 odst. 2 správního řádu):

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace  
Obec Štipoklasy  
Obec Černíny  
Obec Křesetice  
Obec Červené Janovice  
Obec Úmonín  
Obec Kluky  
Obec Močovice  
Obec Krchleby  
Město Čáslav

#### **Poučení účastníků:**

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, odboru dopravy, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 podáním u zdejšího správního orgánu. Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá podle § 24 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích odkladný účinek.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Nedodržení termínů nebo dalších podmínek uvedených v rozhodnutí opravňuje správní orgán zahájit řízení o přestupku s možností uložení pokuty do 500 000 Kč.

Kateřina Křížová  
referent pro silniční hospodářství

#### **Poplatek:**

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů se nevyměřuje.

**Obdrží:**

účastníci (dodejky)

SILNICE ČÁSLAV, s.r.o., IDDS: meu26di

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IDDS: a6ejgmx

Obec Štipoklasy, IDDS: uiuakqg

Obec Černíny, IDDS: 7iebgg5

Obec Křesetice, IDDS: ampbyf5

Obec Červené Janovice, IDDS: 3hxby25

Obec Úmonín, IDDS: d5eakr4

Obec Kluky, IDDS: sgjakfh

Obec Močovice, IDDS: 92ea3av

Obec Krchleby, IDDS: jnxau3f

Město Čáslav, IDDS: ffnb7e

dotčené správní úřady

Krajské ředitelství Policie Středočeského kraje, Územní odbor Kutná Hora, Dopravní inspektorát, IDDS: 2dtai5u

Městský úřad Čáslav, Odbor dopravy, IDDS: ffnb7e

Krajský úřad Středočeského kraje, odbor veřejné mobility, oddělení veřejné dopravy, IDDS: keebyyf


ostatní

Zdravotnická záchraná služba Středočeského kraje, příspěvková organizace, Oblast Benešov - Kutná Hora, IDDS: wmjmahj

Hasičský záchraný sbor Středočeského kraje, územní odbor Kutná Hora, IDDS: f3ahpz8

Integrovaná doprava Středočeského kraje, příspěvková organizace, IDDS: pdrwknv

Příloha: situace uzavírky silnice č. II/339

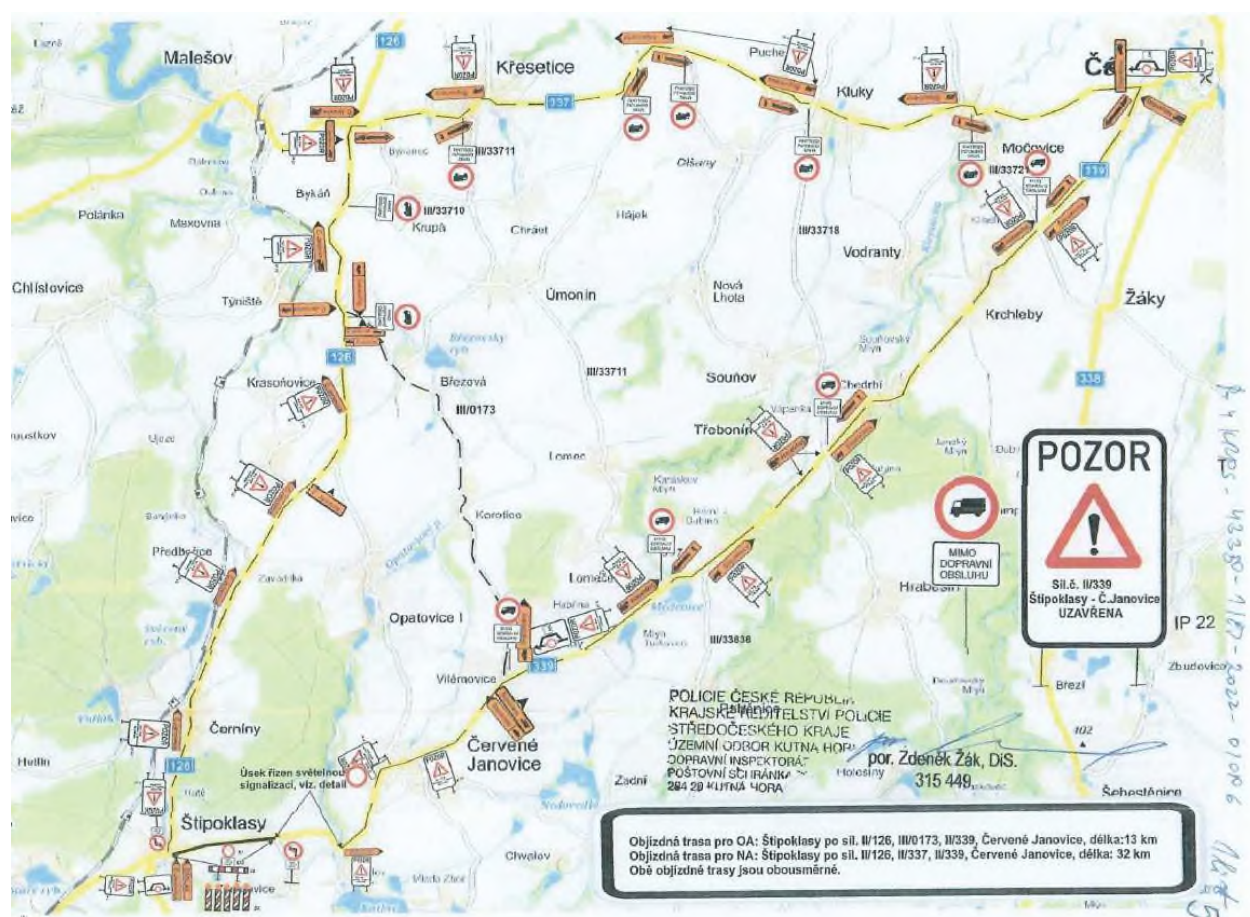



**SILNICE ČÁSLAV, s.r.o.**  
Zbraslavice 2  
285 21 Zbraslavice

Jednací číslo: MěÚ/21261/2022/DOP  
Spis. značka: 3769/2022

Vyřizuje: Jana Šulcová  
Tel.:  
E-mail:  
Datum: 31.3.2022

## **VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA**

### **OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY**

### **STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACI**

Městský úřad Čáslav, Odbor dopravy, jako příslušný správní orgán podle §124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o silničním provozu“) pro stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích na základě žádosti, která byla podána dne 16.3.2022 společností SILNICE ČÁSLAV, s.r.o., Zbraslavice 2, 285 21 Zbraslavice, IČ: 28447085 postupem podle § 171 a násl. části šesté zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) rozhodl podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu

#### **o stanovení přechodné úpravy provozu**

na silnici č. II/339 (Třebonín – Krchleby – Čáslav) a silnice č. II/337 (Čáslav – Močovice – Kluky) v souvislosti s uzavírkou silnice č. II/339 Štipoklasy – Červené Janovice a vedením objízdné trasy pro vozidla NA z důvodu opravy vozovky, spočívající v umístění přechodných dopravních značek a zařízení v rozsahu dle předloženého dopravně inženýrského opatření (DIO), které je nedílnou součástí toho opatření obecné povahy.

#### Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:

1. Zahájení přechodné úpravy provozu bude dne: **11.4.2022**
2. Ukončení přechodné úpravy provozu bude dne: **17.6.2022**
3. Dopravní značení bude umístěno dle schváleného DIO (Policie ČR).
4. Dopravní značení musí být umístěno v souladu s TP 66 Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích, vydané Centrem dopravního výzkumu v Brně. Pracovní místo bude zajištěno proti pádu chodců (ploty, lávky, zábradlí atd.) a za snížené viditelnosti budou použita výstražná světla dle TP 66.
5. Budou dodrženy podmínky, které jsou uvedeny ve vyjádření Policie ČR DI Kutná Hora ze dne 22.2.2022, č.j. KRPS-43350-2/ČJ-2022-010506-ZZ.
6. Žadatel je povinen po celou dobu užití DZ zajistit okamžitou a nepřetržitou údržbu svíslého DZ tak, aby byla zajištěna jeho plná funkčnost. Dopravní značení musí být pravidelně kontrolováno.



## MĚSTSKÝ ÚŘAD ČÁSLAV

Odbor dopravy

Jednací číslo: MěÚ/212161/2022/DOP

7. V průběhu stavby zodpovídá zhotovitel stavby za nepřetržitý úklid případných nečistot z přilehlých částí komunikace.
8. Přechnodné dopravní značení zajistí zhotovitel stavby a bude instalováno odbornou firmou.
9. Odpovědná osoba za dopravní značení: Václav Suchý, tel:
10. Policie ČR, KŘ DI Kutná Hora si vyhrazuje právo toto vyjádření změnit nebo doplnit, pokud si to bude vyžadovat změna situace v silničním provozu nebo z důvodu veřejného zájmu.
11. Městský úřad Čáslav, odbor dopravy, si vyhrazuje právo stanovení změnit, nebo doplnit, jestliže to bude vyžadovat změna silničního provozu nebo veřejný zájem.

### Odůvodnění:

Na základě žádosti podané dne 16.3.2022 bylo žadatelem požádáno o stanovení přechnodné úpravy provozu na silnici na silnici č. II/339 (Třebonín – Krchleby – Čáslav) a silnice č. II/337 (Čáslav – Močovice – Kluky) v souvislosti s uzavírkou silnice č. II/339 Štipoklasy – Červené Janovice a vedením objíždné trasy pro vozidla NA z důvodu opravy vozovky. K žádosti o stanovení přechnodné úpravy provozu bylo předloženo DIO, které bylo projednáno s Policií ČR ze dne 22.2.2022, č.j. KRPS-43350-2/ČJ-2022-010506-ZZ., jako dotčeným orgánem dle § 77 odst. 2 písm. b) zákona o silničním provozu a vyjádření Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, p.o. ze dne 10.3.2022, č.j. 1984/22/KSUS/KHT/VYC.

V souladu s § 173 odst. 1 správního řádu a podle § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu se proto dnešním dnem tímto opatřením obecné povahy stanovuje přechnodná úprava provozu na silnici č. II/339 (Třebonín – Krchleby – Čáslav) a silnice č. II/337 (Čáslav – Močovice – Kluky) v souvislosti s uzavírkou silnice č. II/339 Štipoklasy – Červené Janovice dle předloženého DIO, které je nedílnou součástí tohoto opatření.

### Poučení:

Podle § 173 odst. 2 správního řádu proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek. Podle § 174 odst. 2 správního řádu lze soulad opatření obecné povahy posoudit v přezkumném řízení. Usnesení o zahájení přezkumného řízení lze vydat do 3 let od účinnosti opatření obecné povahy. Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení této veřejné vyhlášky.

Jana Šulcová  
oprávněná úřední osoba

**Příloha:** situace



## MĚSTSKÝ ÚŘAD ČÁSLAV

Odbor dopravy

Jednací číslo: MěÚ/212161/2022/DOP

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů

Vyvěšeno dne:.....

Sejmuto dne:.....

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení:

### Doručí se:

- SILNICE ČÁSLAV, s.r.o., Zbraslavice 2, 285 21 Zbraslavice
- Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IDDS: a6ejgmx
- KŘ PČR Středočeského kraje, DI Kutná Hora, IDDS: 2dtai5u

*se žádostí o bezodkladné vyvěšení na své úřední desce po dobu nejméně 15 dnů a o zpětné zaslání potvrzeného oznámení:*

- Městský úřad Čáslav, kancelář tajemníka
- Obec Krchleby, Krchleby 166, 286 01 Čáslav
- Obec Kluky, Kluky 56, 285 45 Kluky
- Obec Močovice, Močovice 26, 286 01 Čáslav
- Obec Třebonín, Třebonín 14, 286 01 Čáslav



# MĚSTSKÝ ÚŘAD ČÁSLAV

Odbor dopravy

Jednací číslo: MĚÚ/212161/2022/DOP



Silnice Čáslav s.r.o.  
Zbraslavice 2  
285 21 Zbraslavice

V Kolíně dne 21.6.2022

**„II/339 Červené Janovice - Štipoklasy“ – žádost o změnu rozsahu Díla**

S odvoláním na článek 6 Práva a povinnosti objednatele Smlouvy o dílo S-2050/00066001/2021, odst. 6.8.

Objednatel může požadovat změnu rozsahu Díla, a to při respektování povinností Objednatele dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o VZ“). Zhotovitel je v takovém případě povinen vyhovět požadavku Objednatele a (i) snížit rozsah Díla nebo (ii) bez zbytečného odkladu podat nabídku na zvýšení rozsahu Díla o plnění stejného charakteru jako Dílo sjednané ve Smlouvě s tím, že:

- a) při snížení rozsahu se Cena Díla odpovídajícím způsobem sníží,
- b) při zvýšení rozsahu bude Cena Díla v nabídce Zhotovitele stanovena na základě cen uvedených v Nabídce  
v Oceněném soupisu prací,
- c) termín dokončení Díla se ve vhodných případech přiměřeně upraví dohodou smluvních stran,
- d) snížení či zvýšení rozsahu bude upraveno písemným dodatkem Smlouvy

žádáme o změnu rozsahu díla v souladu s návrhem na úpravu:

- úprava dopravně inženýrského opatření ve staničení 1,600 – 2,883 (SO 180.1) – ZBV 1
- úprava dopravně inženýrského opatření ve staničení 1,600 – 2,883 (SO 180.2) – ZBV 2
- úprava spočívající v ponížení frézování pařezů, v ponížení rozsahu sanování aktivní zóny, v neprovedení armovaného svahu, v navýšení množství odláždění lomovým kamenem, v neprovedení příkopového žlabu a v neprovedení bourání ŽB konstrukcí (SO 101.1) – ZBV 3

Současně žádáme zhotovitele o zpracování a předložení Změny během výstavby (ZBV1,2,3).

za  
Krajskou správu a údržbu silnic Středočeského kraje,  
příspěvková organizace  
Zborovská 81/11  
Praha 5, Smíchov  
PSČ: 150 00

Petr Holan  
vedoucí oblasti Kutná Hora



Vyřizuje  
Michael Kudera

Datum  
29. 03. 2022

**Věc: Vyjádření autorského dozoru stavby „II/339 Červené Janovice – Štipoklasy – PD“ (AD) k navržené změně SO 180.1 a SO 180.2 – obrusná vrstva bez středové spáry za plné uzavírky**

Zhotovitel navrhl realizovat pokládku obrusné vrstvy vozovky bez středové spáry v úseku km 1,600 – km 2,883 při plné uzavírce, přičemž v PDPS byla navržena realizace po polovinách vozovky při kyvadlovém provozu na druhé polovině vozovky.

AD považuje změnu za nevýznamnou a souhlasí s provedením obrusné vrstvy bez středové spáry za plné uzavírky.

**Ing. Michael Kudera**  
Atelier PROMIKA s.r.o.  
Machova 9  
160 00 Praha 6

Web: <http://www.promika.cz>

