

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

III/2722 Semice, rekonstrukce

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

DIO - investice kraje

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

181/1

Číslo ZBV:

3

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
 Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
 IČ: 66001
 Obec Semice
 Semice 280, 289 17 Semice
 IČ: 00239747

Zhotovitel: Společnost „Semice“

Rekapitulace ZBV č. 3 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3.3	0,00	111 470,00	111 470,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3.4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3	0,00	111 470,00	111 470,00

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
 Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
 a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré:

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: III/2722 Semice, rekonstrukce Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): DIO - investice kraje	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: <p style="text-align: center;">181/1</p>	Číslo ZBV: <p style="text-align: center;">3.3</p>
---	--	---

Strany smlouvy o dílo objednatel č.: S-2863//00066001/2022 a zhotovitel č: MIROS22400017 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 23.10.2022 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
 Obec Semice se sídlem Semice 280, 289 17 Semice

Zhotovitel: Společnost „Semice“

<u>Přílohy Změnového listu:</u>	Paré č.	Příjemce
1. Krycí list	1	Objednatel
2. Změnový list	1	Zhotovitel
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	Projektant (AD)
4. Rozpis ocenění Změn položek ZBV 2	1	Stavební dozor
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	
6. Přehled dalších dokladů	1	
Další doklady dle přehledu dokladů	53	

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Změna: doplnění dopravního značení

Při projednávání přechodné úpravy provozu v rámci DIO bylo doplněno dopravní značení uzavírky silnice III/2722, tak aby bylo v souladu s TP 66. Konkrétně se jedná o doplnění výstražných dopravních světél (S1) v místech napojení uzavírky na provozované pozemní komunikace. Odsouhlasený návrh dopravně inženýrského opatření (doklad č. 9), který byl takto odsouhlasen dopravním inspektorátem Policie ČR (doklad č. 10), pro všechny etapy výstavby je uveden v Příloze tohoto ZBV, který je nedílnou součástí Rozhodnutí o uzavírce (doklad č. 11), vydaného Městským úřadem Lysá nad Labem, odbor dopravy ze dne 03. 02. 2023, zn. MULNL-OD/8842/2023/Juh/6 .

Zhotovitel zaslal k výše uvedené Změně oznámení Objednateli ze dne 15.03.2023 v dopise zn. MIR/53/23/Semice/ZAP (doklad č. 8).

Změna je vyjádřena položkami novými č. 101, 102, 103, 104, 105, 106. Navyšuje smluvní cenu stavby o 96.890,00 CZK.

Výše uvedené skutečnosti byly projednány a odsouhlaseny TDI (doklad č. 14), projektantem (AD) (doklad č. 13).

Výše popsané změny byly nepředvídatelné, zjištěné po odfrézování stávající vozovky z asfaltových vrstev.

Změny jsou podle § 5, odst. 1, písmeno c) resp. § 10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 1.1.2022) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazeny do Skupiny 3.

Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6 je změnou nepředvídanou.

Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
0,00	111 470,00	111 470,00	111 470,00

Technická pomoc Objednatele	jméno	Ing. Lubomír Smetana	datum	podpis
-----------------------------	-------	----------------------	-------	--------

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel, na základě plné moci:	jméno	Ing. Jiří Zapadlo	datum	podpis
-----------------------------------	-------	-------------------	-------	--------

Projektant (autorský dozor):	jméno	Ing. Juraj Kolcun	datum	podpis
------------------------------	-------	-------------------	-------	--------

Stavební dozor:	jméno	Ing. Jan Volek	datum	podpis
-----------------	-------	----------------	-------	--------

Supervize (Regionální dotační kancelář)	jméno	xxx	datum	podpis
---	-------	-----	-------	--------

Zástupce Objednatele:	jméno	Bc. Petr Müller	datum	podpis
-----------------------	-------	-----------------	-------	--------

Zástupce Objednatele odpovědný za cenové projednání Změny	jméno	Ing. Jaroslava Jurková	datum	podpis
---	-------	------------------------	-------	--------

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Obchodních podmínek. Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Ing. Jan Fidler, DiS	datum	podpis
---	-------	----------------------	-------	--------

Zhotovitel, na základě plné moci	jméno	Ing. Jiří Zapadlo	datum	podpis
---	-------	-------------------	-------	--------

Číslo paré:

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo:**

3

Název Stavby:	III/2722 Semice, rekonstrukce
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	181/1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	DIO - investice kraje

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
319 431,00

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	319 431,00	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	111 470,00	111 470,00	34,90%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	0,00	430 901,00	111 470,00	34,90%

Rozpis ocenění Změn položek - celkem													
Evidenční číslo a název stavby: III/2722 Semice, rekonstrukce								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: SO 181- DIO - investice kraje								181/1					
Číslo a název rozpočtu: SO 181- DIO - investice kraje								Skupina změn 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Nové položky											
101	916112	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	0,000	7,000	7,000	932,000	0,00	0,00	6 524,00	6 524,00	6 524,00	100,00%
102	916113	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ	KUS	0,000	7,000	7,000	430,000	0,00	0,00	3 010,00	3 010,00	3 010,00	100,00%
103	916119	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ	KSDEN	0,000	465,000	465,000	108,000	0,00	0,00	50 220,00	50 220,00	50 220,00	100,00%
104	916122	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	0,000	4,000	4,000	1 400,000	0,00	0,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	100,00%
105	916123	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ	KUS	0,000	4,000	4,000	714,000	0,00	0,00	2 856,00	2 856,00	2 856,00	100,00%
106	916129	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ	KSDEN	0,000	210,000	210,000	206,000	0,00	0,00	43 260,00	43 260,00	43 260,00	100,00%
		Celkem							0,00	111 470,00		111 470,00	

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu. Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Jiří Zapadlo

Datum:

Podpis:

Za Objednatele:

Ing. Jan Volek
TDI

Datum:

Podpis:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby:

III/2722 Semice, rekonstrukce

1	Přijaté smluvní částka bez rezervy a DPH	71 971 115,50
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	72 999 280,63
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	88 329 129,56
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	101,43%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%
40=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, odst. (5), písm. b)	-0,07%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	1 028 165,13
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	1,43%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	21 591 334,65

9=(32A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	1,58%
10=(36A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,00%
10A=32A+36A	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	1 134 178,67
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	35 985 557,75

12=(1)*0,15	Limit	10 795 667,33
13=(39)/(1)	Sledování limitu (15%)	0,08%
14=(ABS(37)+(38))	Hodnota skupiny 5	61 056,00

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN																						
		- 1 -				- 2 -				- 3 -				- 4 -				- 5 -				
		Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)				Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)				Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)				Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)				Změny de minimis Změny neměnicí celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)				
SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	limit 15 %
16	17	18	19=23+26+29+33	20=24+27+30+34+37+39	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	32=29+30	32A=ABS(29)+30	33	34	36=33+34	36A=ABS(33)+34	37	38	39=ABS(37)+38
		III/2722 Semice, rekonstrukce	- 53 006,77	1 081 171,90	1 028 165,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 53 006,77	1 081 171,90	1 028 165,13	1 134 178,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 056,00	61 056,00
301	1	Dešťová kanalizace III/2722/Čištění potrubí a podkladní beton	0,00	299 753,40	299 753,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 753,40	299 753,40	299 753,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 056,00	61 056,00
020	2	Příprava území - investice obce / investice kraje/odstranění kamenných kostek a betonu	- 53 006,77	669 948,50	616 941,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 53 006,77	669 948,50	616 941,73	722 955,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181	3	DIO - investice kraje/doplnění dopravního značení	0,00	111 470,00	111 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 470,00	111 470,00	111 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	3
Název a evidenční číslo stavby:	III/2722 Semice, rekonstrukce
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	DIO - investice kraje
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	181/1

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
07 Soupis prací SO po změnách	3	
08 Žádost zhotovitele o změnu ze dne 05.04.2023, zn. MIR/54/23/Semice/ZAP	23	
09 Návrh dopravně inženýrského opatření etapa I. - etapa IV.	13	
10 Stanovisko DI PČR Nymburk	2	
11 Rozhodnutí o uzavírce, vydané Městským úřadem Lysá nad Labem, odbor dopravy ze dne 03.02. 2023, zn. MULNL-OD88422023Juh6	3	
12 Změnový soupis prací SO 181 DIO	5	
13 Vyjádření AD	1	
14 Vyjádření TDI	1	
15 Souhlasné stanovisko k ZBV	1	
16 Plná moc - Ing. Jiří Zapadlo	1	
Počet listů celkem	53	

Rozpis ocenění Změn položek - celkem													
Evidenční číslo a název stavby: III/2722 Semice, rekonstrukce Číslo a název SO/PS: SO 181- DIO - investice kraje Číslo a název rozpočtu: SO 181- DIO - investice kraje								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								181/1					
								celkem					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5,000	6,000	7,000	8,00	9	10	11	12	13	14
	9	Ostatní konstrukce a práce						319 431,00	0,00	0,00	319 431,00	0,00	0,00%
1	914122	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM instalace provizorních dopravních značek na místa dle projektu	KUS	61,000	61,000	0,000	21,000	1 281,00	0,00	0,00	1 281,00	0,00	0,00%
		IS11b - 11 ks=11,00 [A] IS11c - 5 ks=5,00 [B] IP10a - 11 ks=11,00 [C] E3 - 10 ks=10,00 [D] B1 - 12 ks=12,00 [E] E13 - 12 ks =12,00 [F] Celkem: A+B+C+D+E+F=61,00 [G]											
2	914123	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ demontáž provizorních dopravních značek po ukončení pr	KUS	61,000	61,000	0,000	21,000	1 281,00	0,00	0,00	1 281,00	0,00	0,00%
		z pol. 914122: 61=61,00 [A]											
3	914129	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ nájemné za provizorní dopravní značení	KSDEN	22 265,000	22 265,000	0,000	8,400	187 026,00	0,00	0,00	187 026,00	0,00	0,00%
		dle pol. 914122: 61 ks =61,00 [A] Celkem za 1 rok pronájmu: 365 dní *A=22 265,00 [B]											
4	914422	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM instalace provizorních dopravních značek na místa dle projektu	KUS	6,000	6,000	0,000	21,000	126,00	0,00	0,00	126,00	0,00	0,00%
		IP22 - 6 ks=6,00 [A]											
5	914423	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ demontáž provizorních dopravních značek po ukončení prací	KUS	6,000	6,000	0,000	21,000	126,00	0,00	0,00	126,00	0,00	0,00%
		z pol. 914422: IP22 6 ks =6,00 [A]											
6	914429	DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ nájemné za provizorní dopravní značení	KSDEN	2 190,000	2 190,000	0,000	15,750	34 492,50	0,00	0,00	34 492,50	0,00	0,00%
		z pol. 914422: 6=6,00 [A] Celkem za 1 rok pronájmu: 365*6=2 190,00 [B]											
7	914952	SLOUPKY A STOJKY DZ Z JÁKL PROF PRO OCEL STOJAN MONT S PŘESUN sloupky pro provizorní dopravní značení, upevnění do podkladních desek	KUS	75,000	75,000	0,000	1,050	78,75	0,00	0,00	78,75	0,00	0,00%
		IS11b - 11 ks=11,00 [A] IS11c - 5 ks=5,00 [B] IP10a + E3 - 11 ks=11,00 [C] B1 + E13 - 12 ks=12,00 [D] IP22 - 6 ks *2=12,00 [E] Z2 - 12 ks *2=24,00 [F] Celkem: A+B+C+D+E+F=75,00 [G]											
8	914953	SLOUPKY A STOJKY DZ Z JÁKL PROFILŮ PRO OCEL STOJAN DEMONTÁŽ demontáž sloupků po ukončení prací	KUS	75,000	75,000	0,000	1,050	78,75	0,00	0,00	78,75	0,00	0,00%
		z pol. 914952: 75=75,00 [A]											
9	914959	SLOUP A STOJKY DZ Z JÁKL PRO OCEL STOJAN NÁJEMNÉ nájemné sloupků pro provizorní dopravní značení	KSDEN	27 375,000	27 375,000	0,000	1,050	28 743,75	0,00	0,00	28 743,75	0,00	0,00%

Rozpis ocenění Změn položek - celkem													
Evidenční číslo a název stavby: III/2722 Semice, rekonstrukce								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: SO 181- DIO - investice kraje								181/1					
Číslo a název rozpočtu: SO 181- DIO - investice kraje								celkem					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5,000	6,000	7,000	8,00	9	10	11	12	13	14
		z pol. 914952: 75*365=27 375,00 [A]											
10	916312	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM instalace provizorních dopravních zábran Z2 na místa dle projektu Z2 - 12 ks=12,00 [A]	KUS	12,000	12,000	0,000	21,000	252,00	0,00	0,00	252,00	0,00	0,00%
11	916313	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ demontáž provizorních dopravních zábran Z2 po ukončení prací z pol. 916312 12=12,00 [A]	KUS	12,000	12,000	0,000	21,000	252,00	0,00	0,00	252,00	0,00	0,00%
12	916319	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ nájemné za provizorní dopravní značení z pol. 916312: 12*365=4 380,00 [A]	KSDEN	4 380,000	4 380,000	0,000	8,40	36 792,00	0,00	0,00	36 792,00	0,00	0,00%
13	916712	UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - MONTÁŽ S PŘESUNEM podkladní desky pro upevnění sloupků provizorního dopravního značení a zábran z pol. 914952: 75=75,00 [A]	KUS	75,000	75,000	0,000	1,05	78,75	0,00	0,00	78,75	0,00	0,00%
14	916713	UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - DEMONTÁŽ demontáž podkladních desek po ukončení prací z pol. 914952: 75=75,00 [A]	KUS	75,000	75,000	0,000	1,05	78,75	0,00	0,00	78,75	0,00	0,00%
15	916719	UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLAD DESKA POD 28KG - NÁJEMNÉ nájemné za podkladní desky z pol. 914952: 75*365=27 375,00 [A]	KSDEN	27 375,000	27 375,000	0,000	1,05	28 743,75	0,00	0,00	28 743,75	0,00	0,00%
		Nové položky - JC dle OTSKP 2022						0,00	0,00	111 470,00	111 470,00	111 470,00	100,00%
101	916112	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM ZBV č.3: Etapa I. 1 ks Etapa II. 1 ks Etapa III. 2 ks Etapa IV. 3 ks	KUS	0,000	7,000	7,000	932,00	0,00	0,00	6 524,00	6 524,00	6 524,00	100,00%
102	916113	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ ZBV č.3: Etapa I. 1 ks Etapa II. 1 ks Etapa III. 2 ks Etapa IV. 3 ks	KUS	0,000	7,000	7,000	430,00	0,00	0,00	3 010,00	3 010,00	3 010,00	100,00%
103	916119	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ ZBV č.3: výpočet dní dle rozhodnutí MěÚ Lysá n.Labem (doklad 11) Etapa I. 1ks*60dní=60 ksden Etapa II. 1ks*45dní=45 ksden Etapa III. 2ks*45dní=90 ksden Etapa IV. 3ks*90dní=270 ksden	KSDEN	0,000	465,000	465,000	108,00	0,00	0,00	50 220,00	50 220,00	50 220,00	100,00%
104	916122	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	0,000	4,000	4,000	1 400,00	0,00	0,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	100,00%

Rozpis ocenění Změn položek - celkem													
Evidenční číslo a název stavby: III/2722 Semice, rekonstrukce Číslo a název SO/PS: SO 181- DIO - investice kraje Číslo a název rozpočtu: SO 181- DIO - investice kraje								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								181/1					
								celkem					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5,000	6,000	7,000	8,00	9	10	11	12	13	14
		ZBV č.3: Etapa I. 2 ks Etapa II. 2 ks											
105	916123	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ	KUS	0,000	4,000	4,000	714,00	0,00	0,00	2 856,00	2 856,00	2 856,00	100,00%
		ZBV č.3: Etapa I. 2 ks Etapa II. 2 ks											
106	916129	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ	KSDEN	0,000	210,000	210,000	206,00	0,00	0,00	43 260,00	43 260,00	43 260,00	100,00%
		ZBV č.3: výpočet dní dle rozhodnutí MěÚ Lysá n.Labem (doklad 11) Etapa I. 2ks*60dní=120 ksden Etapa II. 2ks*45dní=90 ksden											
Celkem								319 431,00	0,00	111 470,00	430 901,00	111 470,00	34,90%

Zhotovitel:

Společnost Semice
Správce společnosti MI Roads a.s.
Koželužská 2450/4
180 00 Praha 8 – Libeň

Objednatel:

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace
Ing. Milan Fiala, zástupce náměstka pro
investice
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5 - Smíchov

Naše značka:

MIR/54/23/Semice/ZAP

Vyřizuje / telefon:

Ing. Josef Prášek /

V Praze dne:

15. 03. 2023

Smlouva: Smlouva o dílo ze dne 23. 10. 2022, č. smlouvy objednatele: S-2863/00066001/2022

Stavba: III/2722 Semice, rekonstrukce

Věc: Oznámení dodatečných požadavků při projednávání dopravně-inženýrského opatření, Včasné oznámení podle Pod-čl. 5.1 Smlouvy o Dílo

Vážení,

tímto Vám v souladu Pod-čl. 5.1 Smlouvy o Dílo Zhotovitel výše uvedené stavby oznamuje skutečnost změny rozsahu Díla oproti Zadávací dokumentaci, která byla zjištěna při projednávání dopravně-inženýrských opatření (dále jen „DIO“) nezbytných pro provedení stavby.

Při projednávání přechodné úpravy provozu v rámci DIO byly doplněny ze stran dotčených orgánů požadavky na doplnění dopravního značení uzavírky silnice III/2722, které nebylo součástí Zadávací dokumentace, tj. detailního rozpisu dopravního značení v rámci výše uvedené stavby. Konkrétně se jedná o doplnění výstražných dopravních světél (S1) v místech napojení uzavírky na provozované pozemní komunikace. Odsouhlasený návrh dopravně inženýrského opatření, který byl takto odsouhlasen dopravním inspektorátem Policie ČR, pro všechny etapy výstavby je uveden v Příloze č. 1 tohoto oznámení, který je nedílnou součástí Rozhodnutí o uzavírce, vydané Městským úřadem Lysá nad Labem, odbor dopravy ze dne 03. 02. 2023, zn. MULNL-OD/8842/2023/Juh/6 (Příloha č.2).

Zhotovitel zpracoval podrobný změnový soupis prací SO 181 DIO doplněného dopravního značení vycházející z výše uvedeného návrhu dopravně inženýrského opatření pro jednotlivé etapy výstavby, který je uveden v Příloze č. 3 oznámení, ze kterého vychází **navýšení ceny v celkové výši 96.890,00,- Kč**.

Zhotovitel tímto žádá zástupce Objednatele ve věcech technických v souladu s Pod-čl. 6.8 Smlouvy o Dílo o vydání pokynu ke změně rozsahu Díla.

Předem děkujeme za součinnost a v případě potřeby jsme připraveni k operativnímu jednání.

S pozdravem,

Ing. Jiří Zapadlo
Oblastní ředitel
zástupce Zhotovitele ve věcech technických
MI Roads a.s.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Návrh dopravně inženýrského opatření etapa I. - etapa IV. (počet stran 13)

Příloha č. 2 – Rozhodnutí o uzavírce, vydané Městským úřadem Lysá nad Labem, odbor dopravy ze dne 03. 02. 2023, zn. MULNL-OD88422023Juh6 (počet stran 3)

Příloha č. 3 – Změnový soupis prací SO 181 DIO (počet stran 5)





Semice - III/2722 rekonstrukce komunikace

NÁVRH dopravně inženýrského opatření (DIO)

SEDOZ
DOPRAVNÍ ZNAČENÍ


Při umístění dopravního značení musí
být dodrženy podmínky dané
v TP66 - OZNAČENÍ PRACOVNÍCH MÍST
NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH III.VYDÁNÍ,
zák.č.361/2000 Sb. v platném znění
a zák.č. 13/1997 Sb. v platném znění.

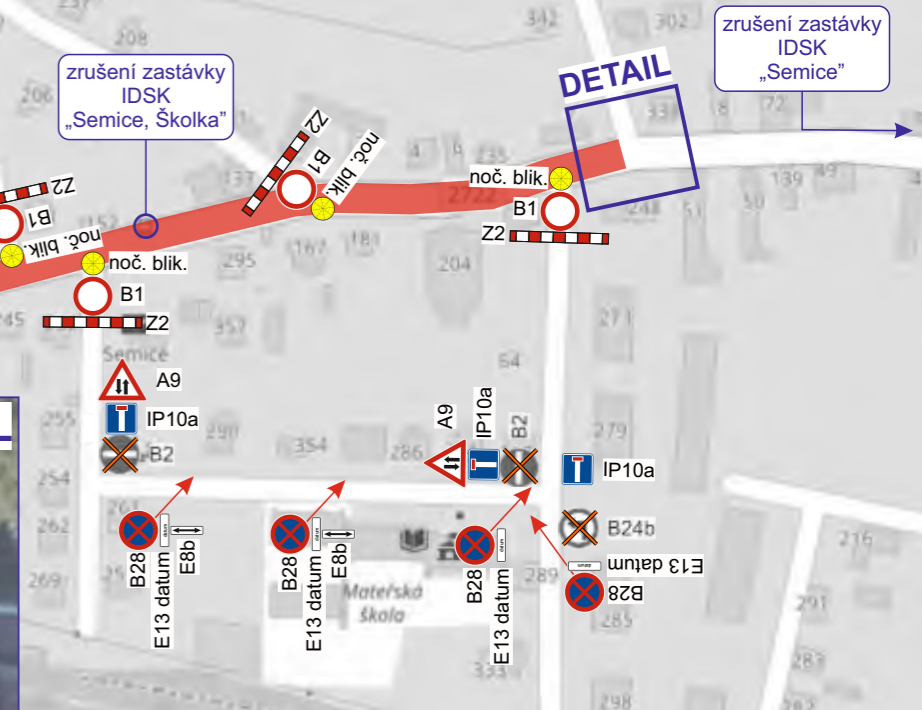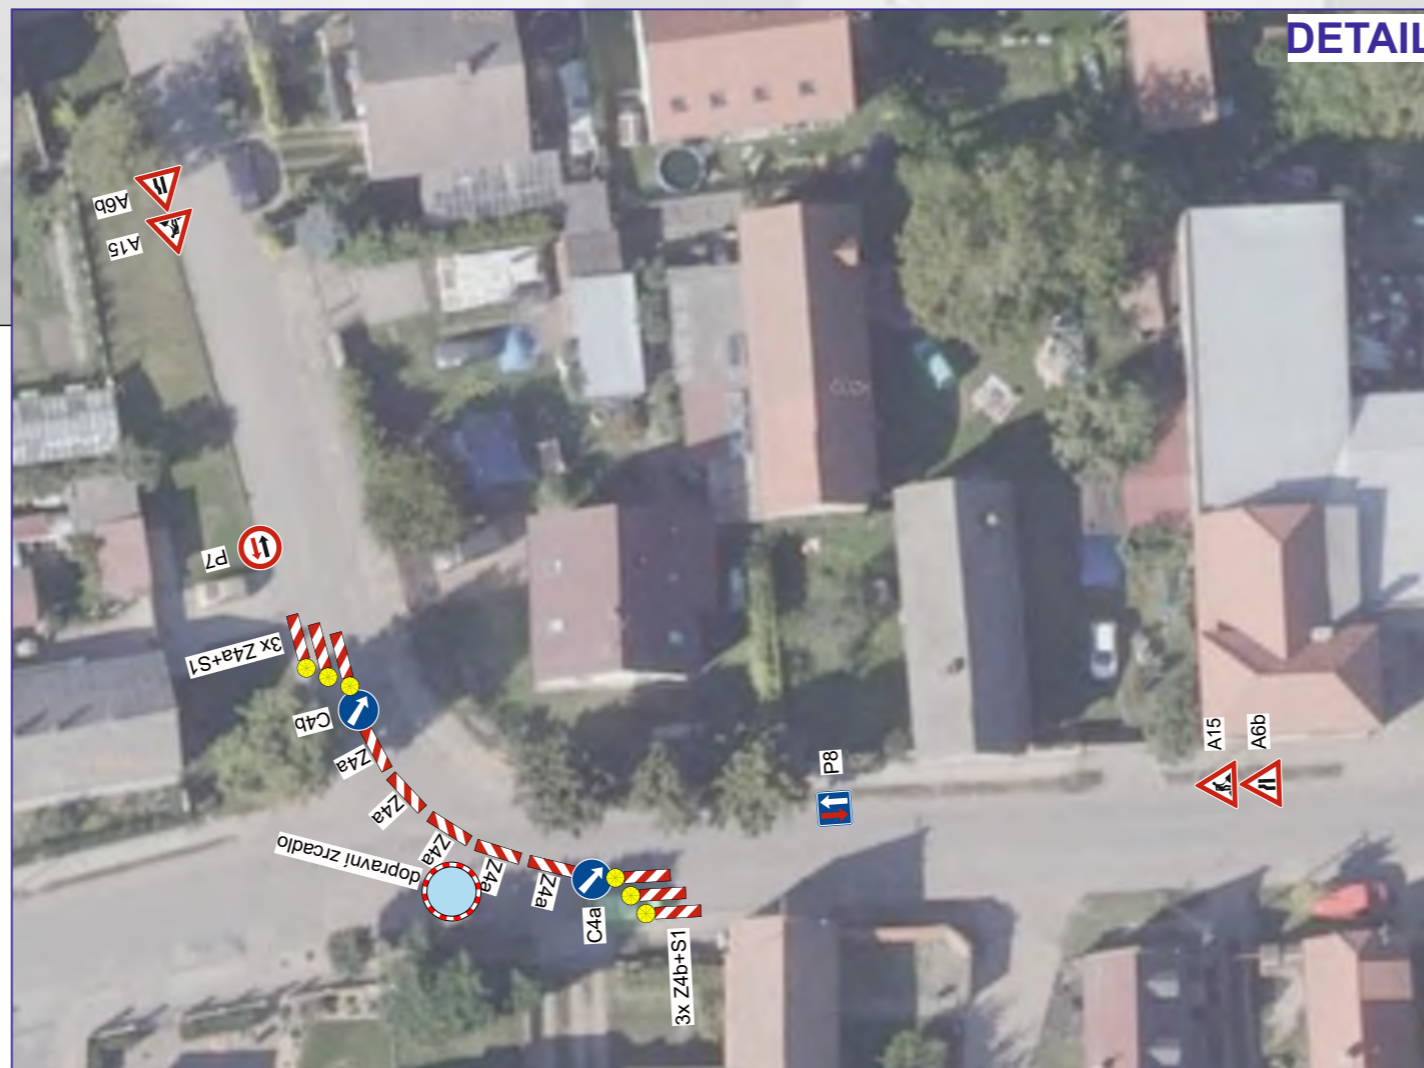


Při umístění dopravního značení musí být dodrženy podmínky dané v TP66 - OZNAČENÍ PRACOVNÍCH MÍST NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH III.VYDÁNÍ, zák.č.361/2000 Sb. v platném znění a zák.č. 13/1997 Sb. v platném znění.



Dopravní značky B28+DT nutno umístit min. 7 dní před začátkem stavby!


razítko DOSS

Zodpovědná osoba: Tomáš Březina	Kontroloval: Tomáš Březina	Kreslil: Tomáš Vydra	 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
Objednatel: miROADS	Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8		
Akce: Semice - III/2722 rekonstrukce komunikace	Formát: A3	Měřítka:	
Obsah: Návrh DIO - I. etapa	Datum: 01/2023	Účel: DIR	
	Číslo výkresu: 01	Paré č.:	

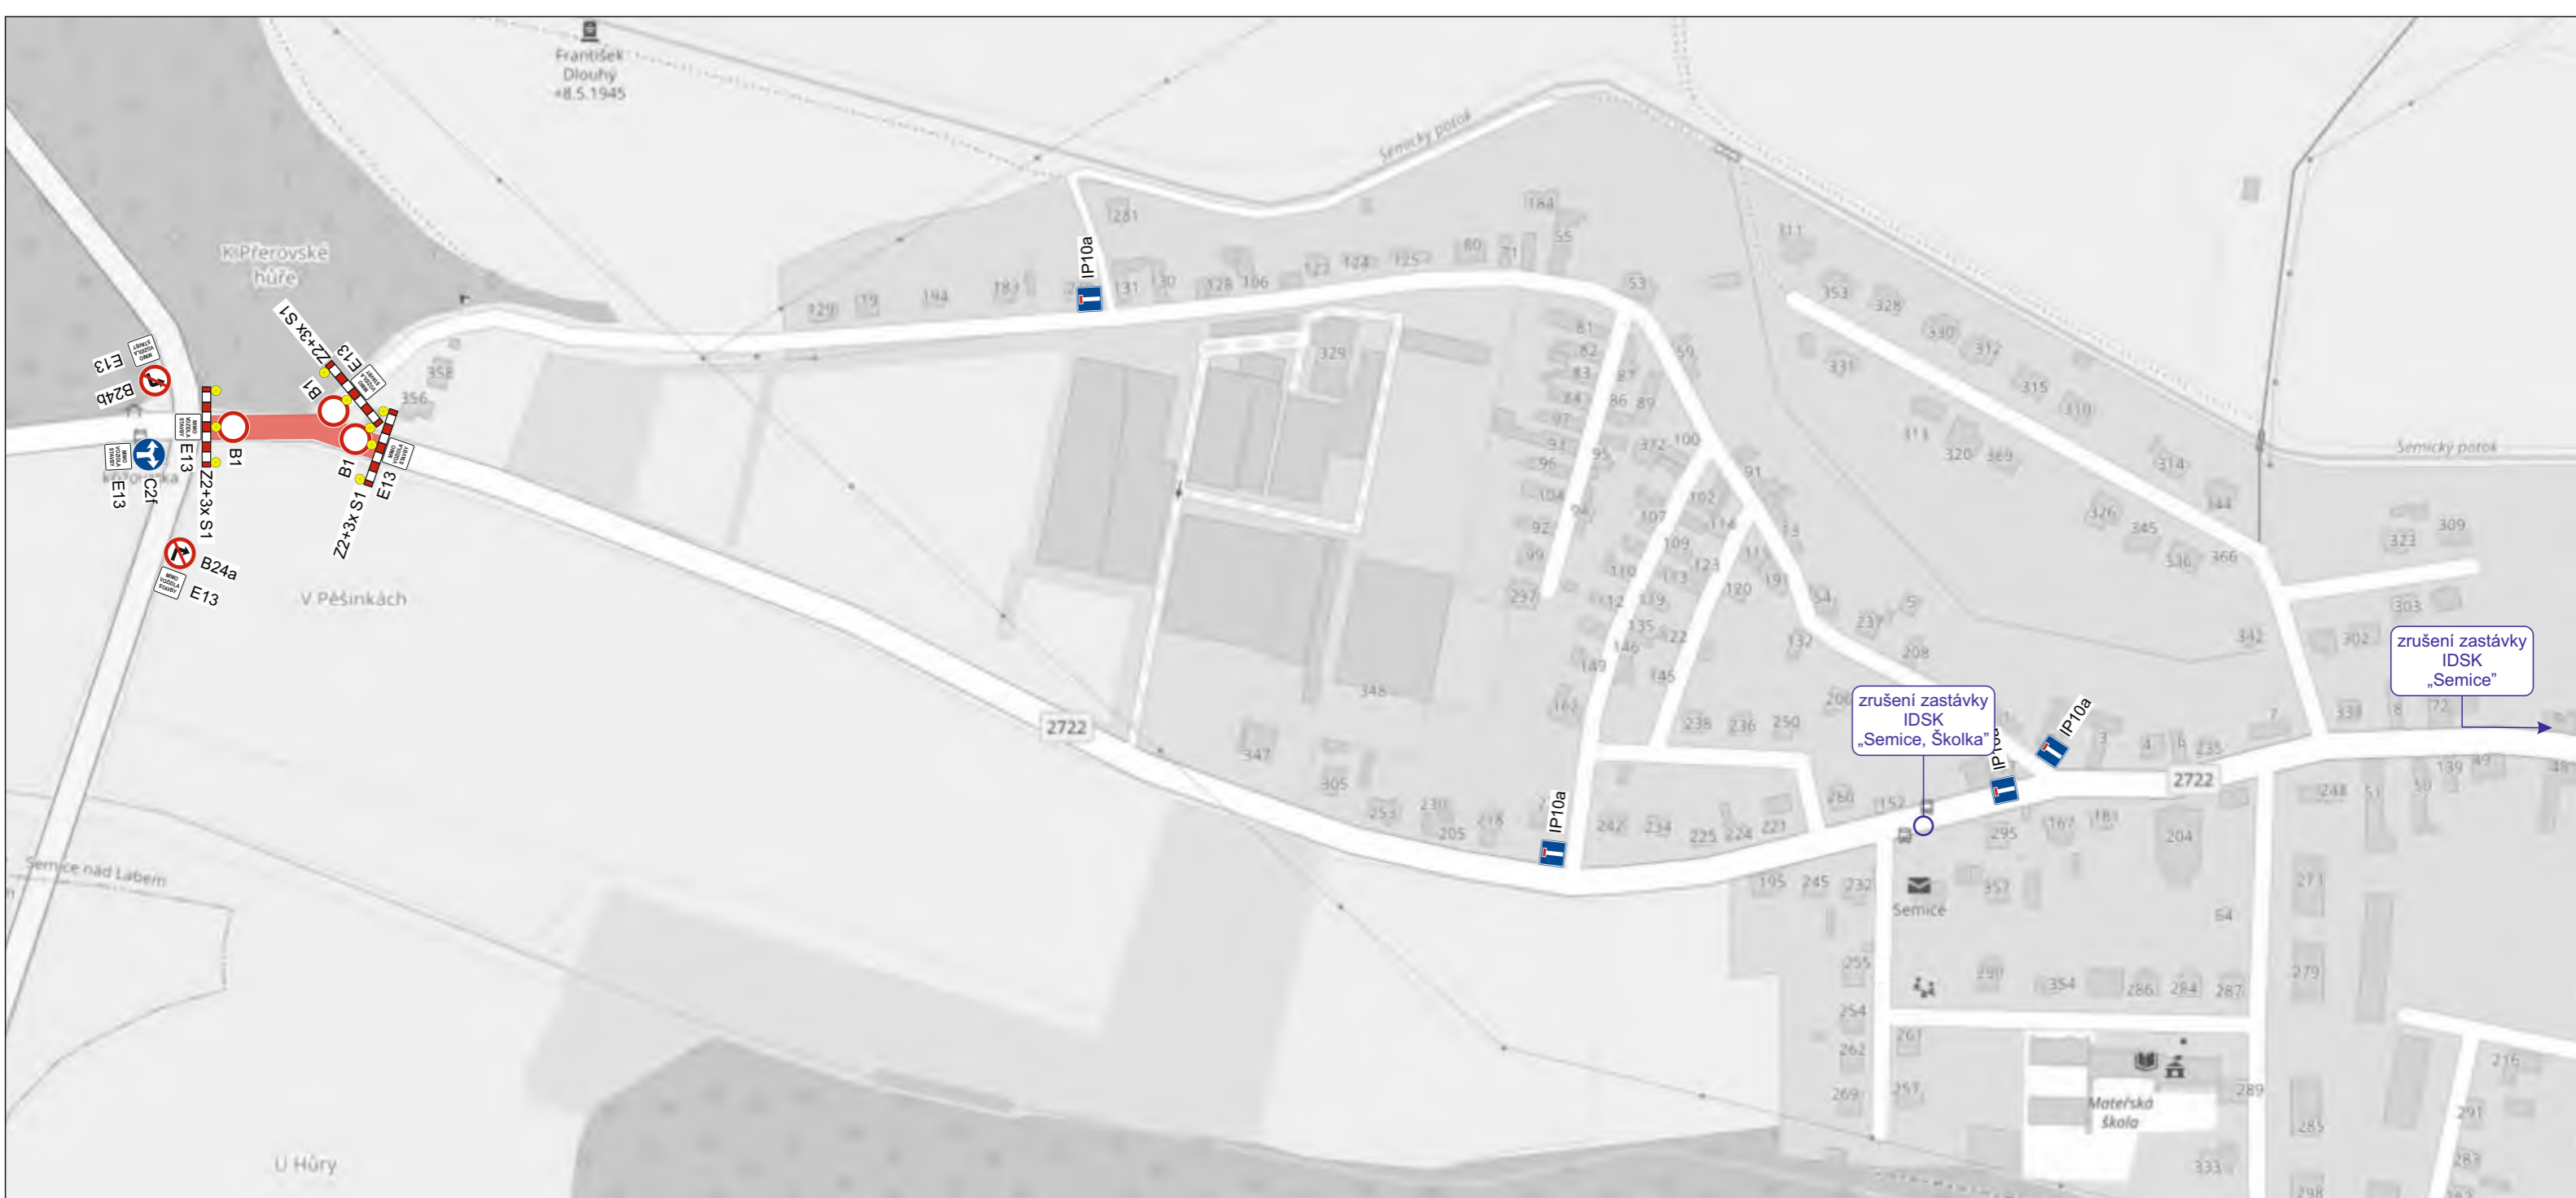

Při umístění dopravního značení musí být dodrženy podmínky dané v TP66 - OZNAČENÍ PRACOVNÍCH MÍST NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH III.VYDÁNÍ, zák.č.361/2000 Sb. v platném znění a zák.č. 13/1997 Sb. v platném znění.

Zodpovědná osoba: Tomáš Březina	Kontrolovat: Tomáš Březina	Kreslil: Tomáš Vydra	 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
Objednatel:  miROADS	Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8		
Akce: Semice - III/2722 rekonstrukce komunikace			Formát: A3
Obsah: Návrh DIO - Ia. etapa			Měřítko:
			Datum: 01/2023
			Účel: DIR
			Číslo výkresu: 02
			Paré č.:

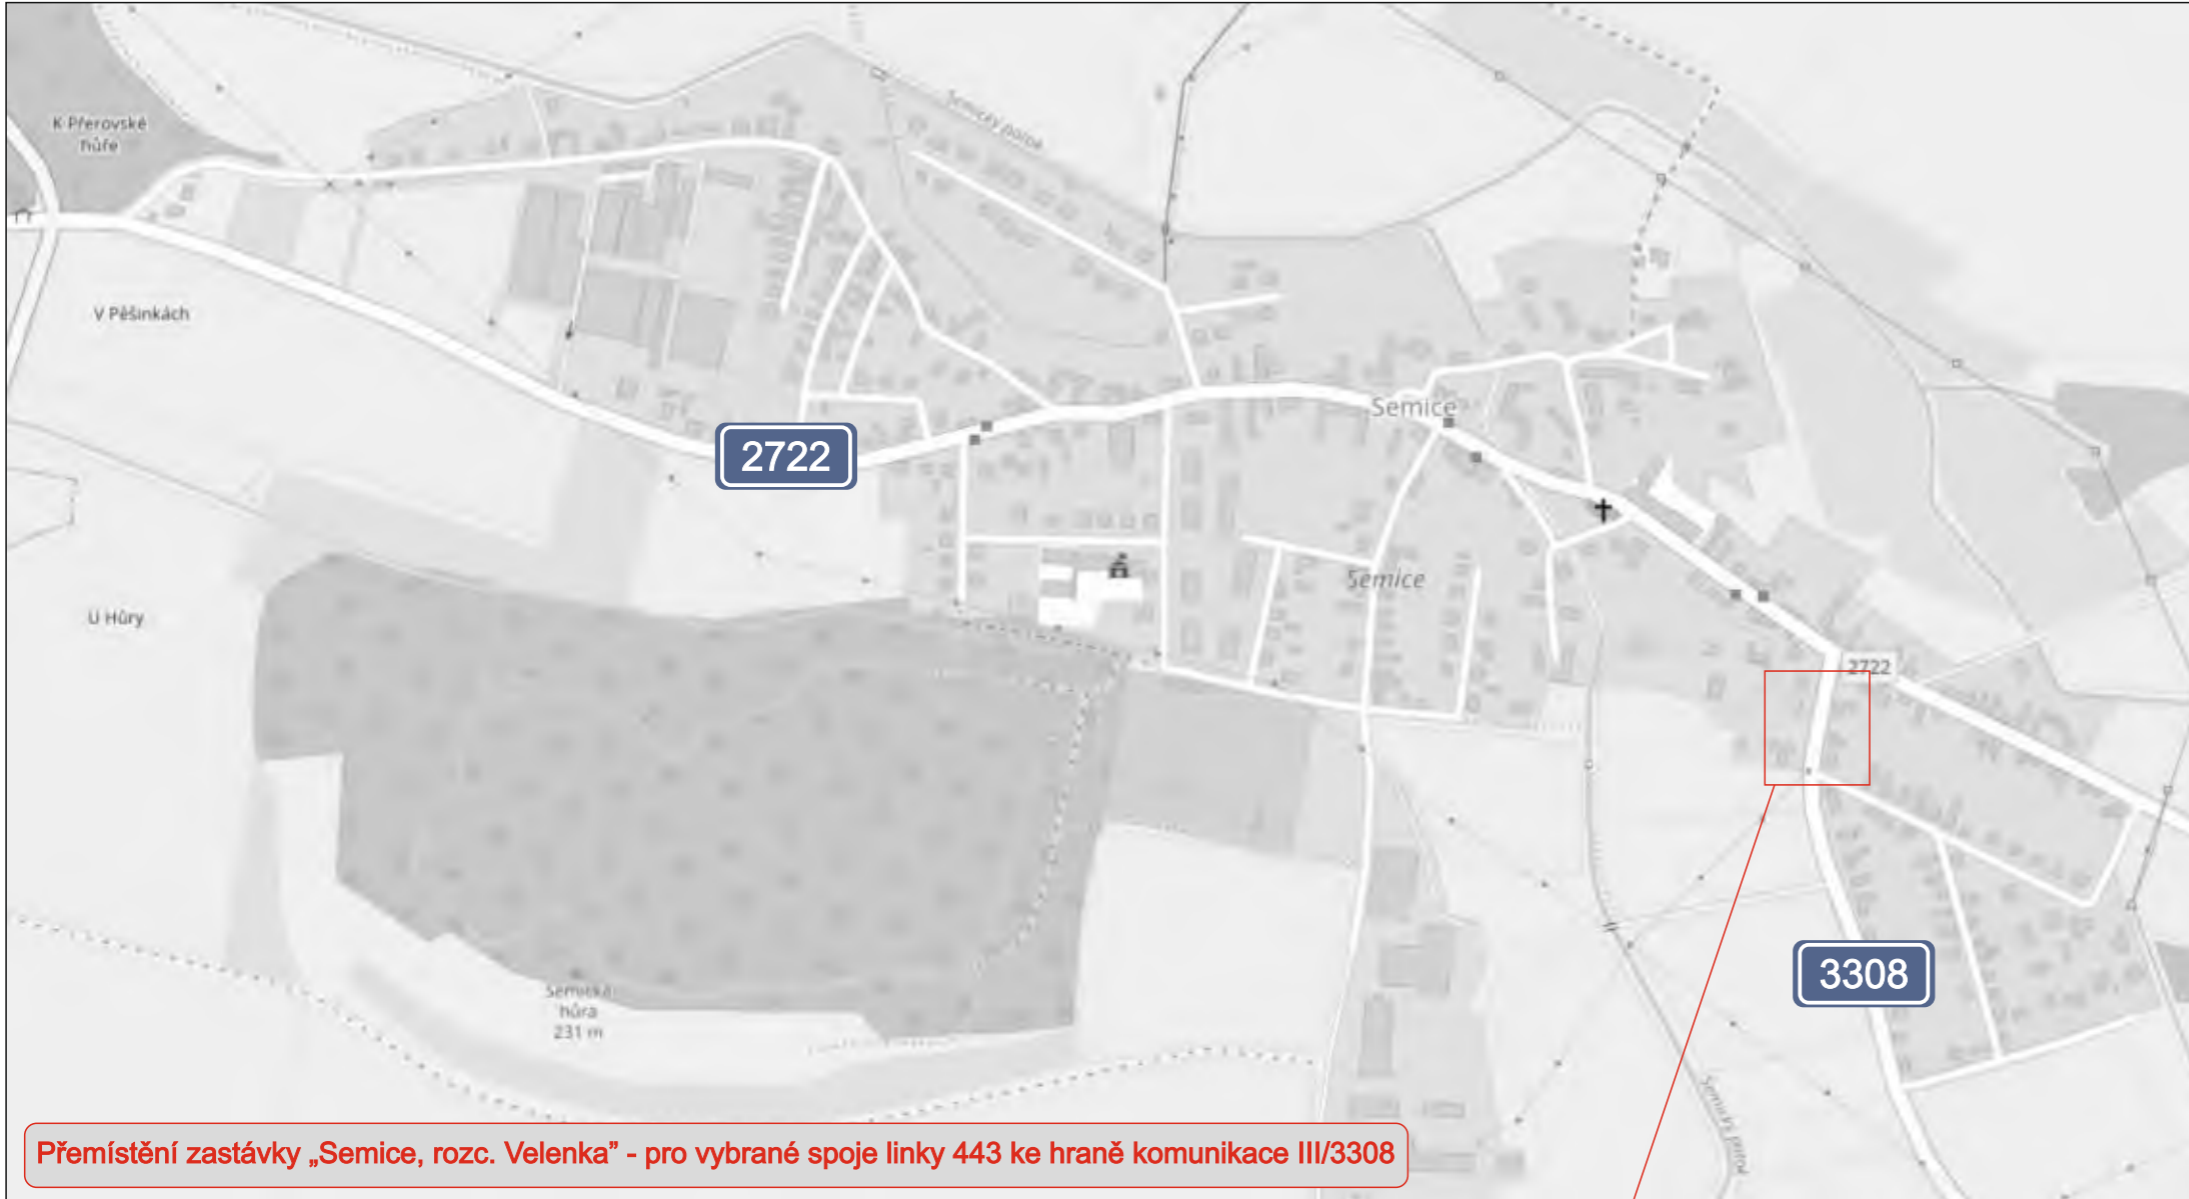

Přemístění zastávky „Semice, rozc. Velenka” - pro vybrané spoje linky 443 ke hraně komunikace III/3308



Při umístění dopravního značení musí být dodrženy podmínky dané v TP66 - OZNAČENÍ PRACOVNÍCH MÍST NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH III.VYDÁNÍ, zák.č.361/2000 Sb. v platném znění a zák.č. 13/1997 Sb. v platném znění.


Zodpovědná osoba: Tomáš Březina	Kontrolovat: Tomáš Březina	Kreslil: Tomáš Vydra	
Objednatel: miROADS	Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8		
Akce: Semice - III/2722 rekonstrukce komunikace			Formát: A3
			Měřítko:
			Datum: 01/2023
			Účel: DIR
Obsah: Návrh DIO - I. + Ia. etapa			Číslo výkresu:
			Paré č.:




Při umístění dopravního značení musí být dodrženy podmínky dané v TP66 - OZNAČENÍ PRACOVNÍCH MÍST NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH III.VYDÁNÍ, zák.č.361/2000 Sb. v platném znění a zák.č. 13/1997 Sb. v platném znění.

razítko DOSS

Zodpovědná osoba: Tomáš Březina	Kontrolovat: Tomáš Březina	Kreslil: Tomáš Vydra	
Objednatel: miROADS	Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8		
Akce: Semice - III/2722 rekonstrukce komunikace			Formát: A3
			Měřítko:
			Datum: 01/2023
			Účel: DIR
Obsah: Návrh DIO - II. etapa			Číslo výkresu: 03
			Paré č.:

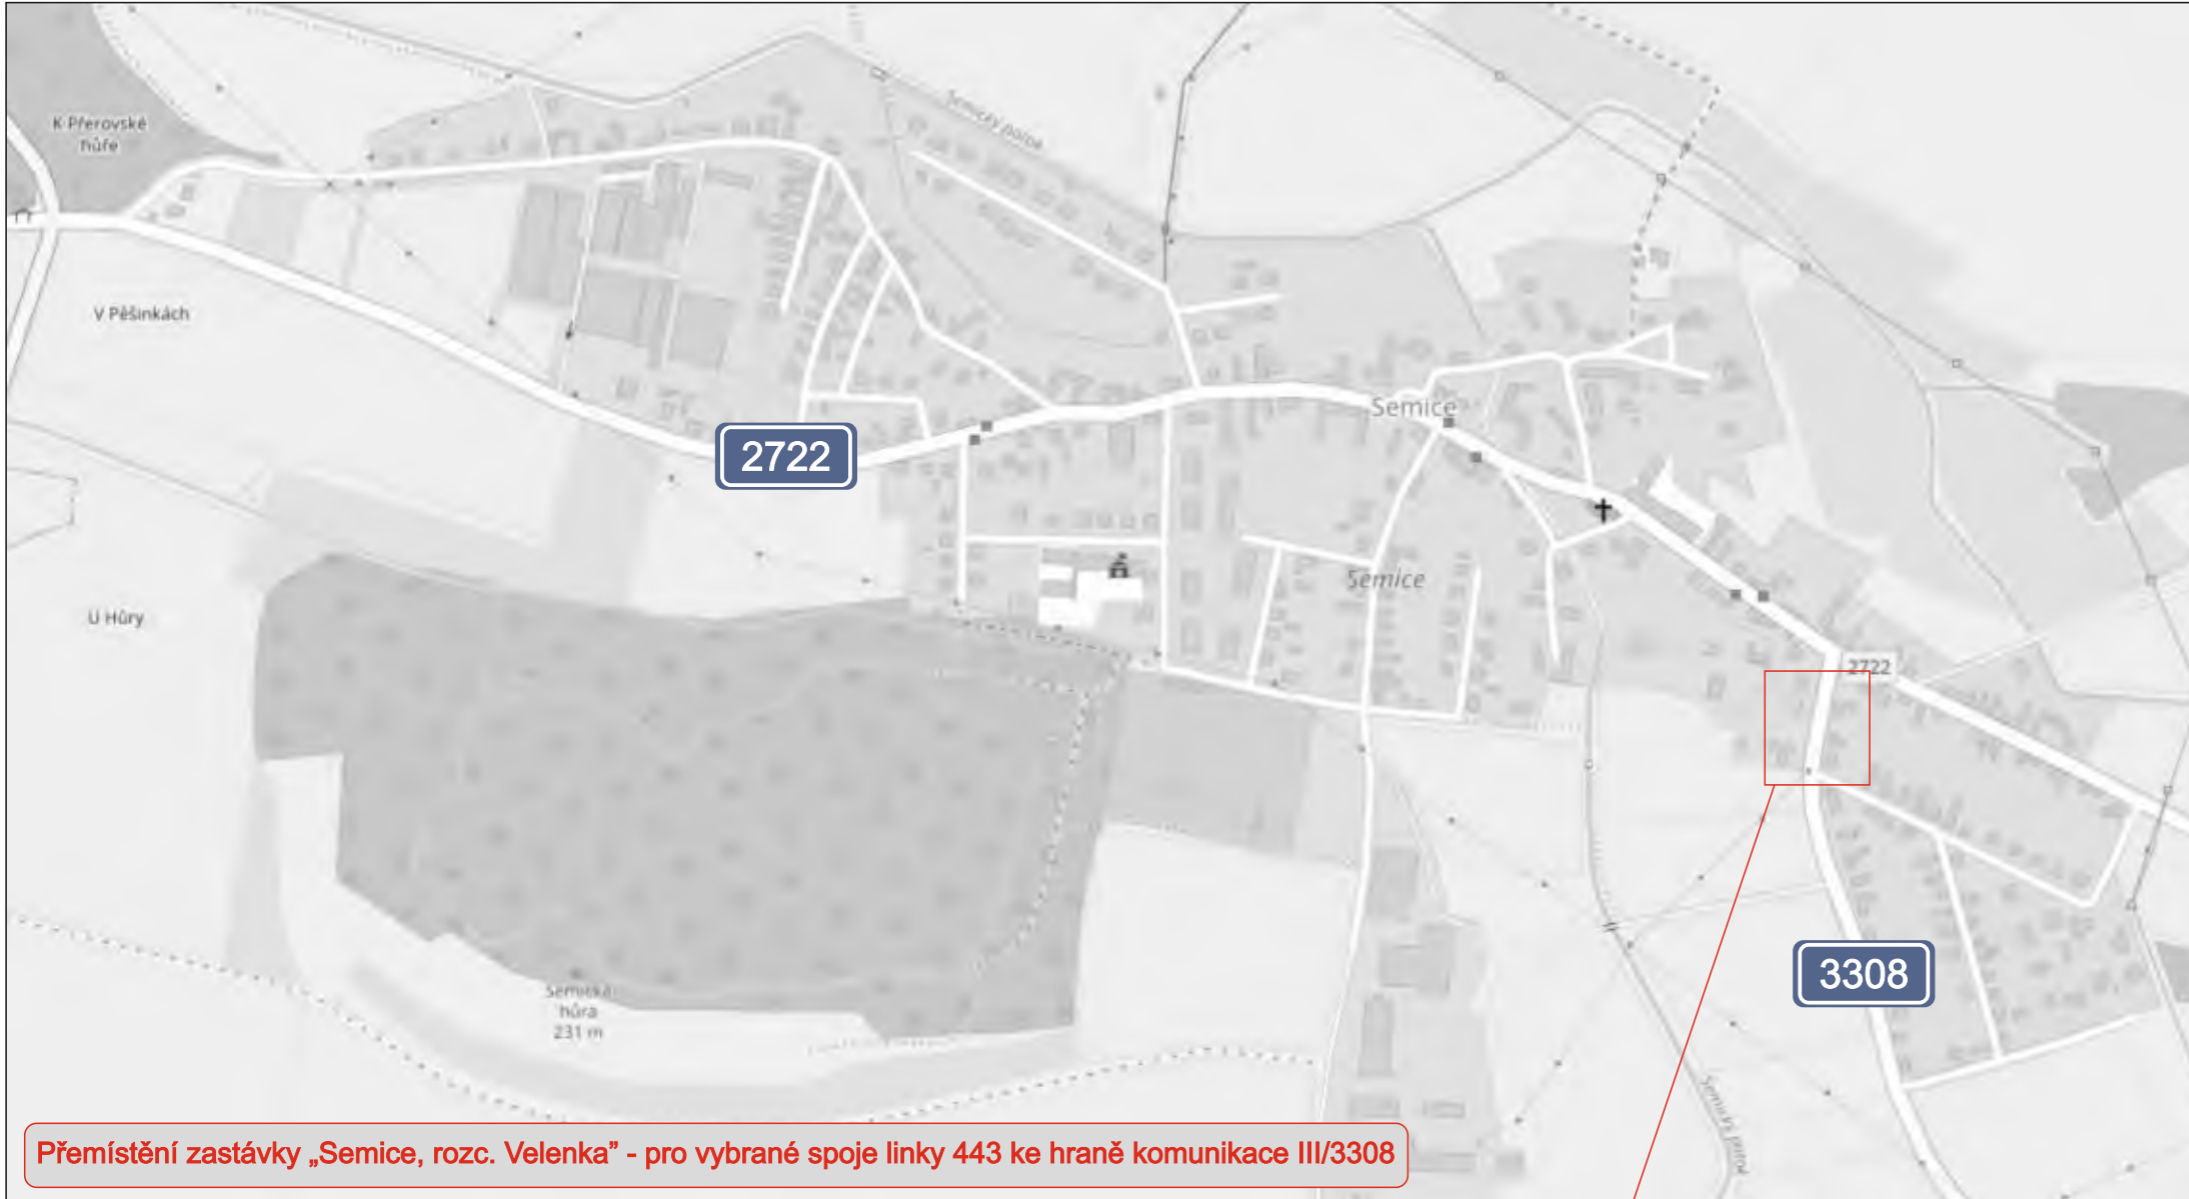

Přemístění zastávky „Semice, rozc. Velenka” - pro vybrané spoje linky 443 ke hraně komunikace III/3308

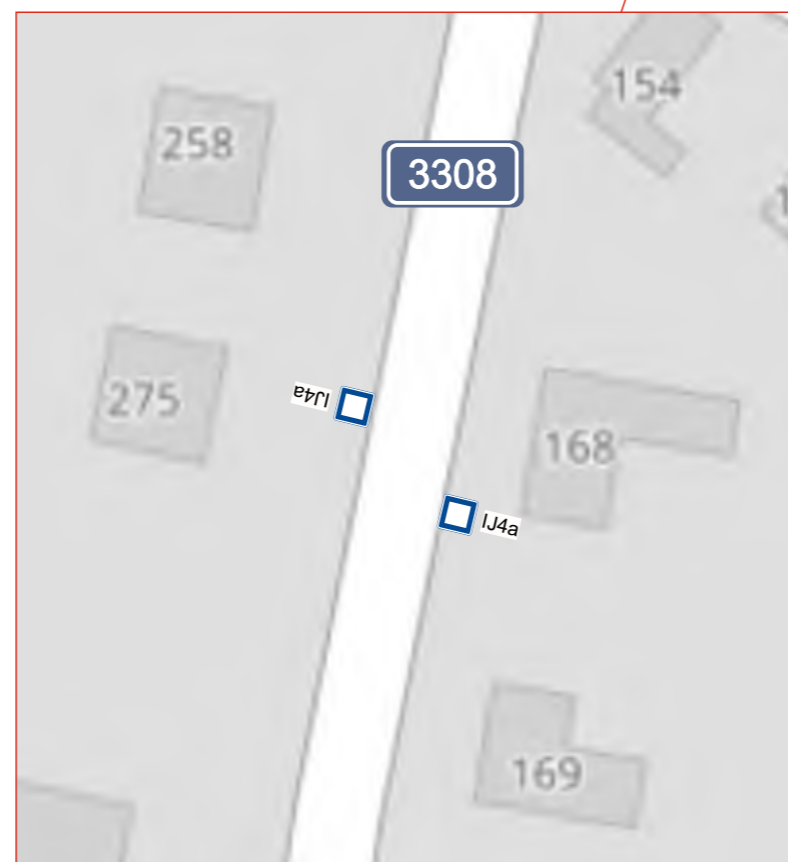

Při umístění dopravního značení musí být dodrženy podmínky dané v TP66 - OZNAČENÍ PRACOVNÍCH MÍST NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH III.VYDÁNÍ, zák.č.361/2000 Sb. v platném znění a zák.č. 13/1997 Sb. v platném znění.

Zodpovědná osoba: Tomáš Březina	Kontrolovat: Tomáš Březina	Kreslil: Tomáš Vydra	
Objednatel: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8			
Akce: Semice - III/2722 rekonstrukce komunikace			Formát: A3
			Měřítko:
			Datum: 01/2023
			Účel: DIR
Obsah: Návrh DIO - II. etapa			Číslo výkresu:
			Paré č.:



Při umístění dopravního značení musí být dodrženy podmínky dané v TP66 - OZNAČENÍ PRACOVNÍCH MÍST NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH III.VYDÁNÍ, zák.č.361/2000 Sb. v platném znění a zák.č. 13/1997 Sb. v platném znění.


razítko DOSS

změny zastávek IDSK:

Ruší se:
 „Hradištko, Kersko, Hrabalova“ – obousměrně pro všechny linky
 „Hradištko, Kersko, U pramene“ – obousměrně pro linku 429
 „Hradištko, Kersko, hl. sil.“ – obousměrně pro linku 429

Zřizuje se:
 „Hradištko, Kersko, U pramene“ – obousměrně pro linku 443 v místech pravidelné zastávky linky 429
 „Hradištko, Kersko, hl. sil.“ – obousměrně pro linku 443 v místech pravidelné zastávky linky 429
 „Velenka“ – obousměrně pro linku 443 v místech pravidelné zastávky linky 398

Zodpovědná osoba: Tomáš Březina	Kontrolovat: Tomáš Březina	Kreslil: Tomáš Vydra	
Objednatel: miROADS	Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8		
Akce: Semice - III/2722 rekonstrukce komunikace			Formát: A3
			Měřítko:
			Datum: 01/2023
			Účel: DIR
Obsah: Návrh DIO - III. etapa			Číslo výkresu: 04
			Paré č.:

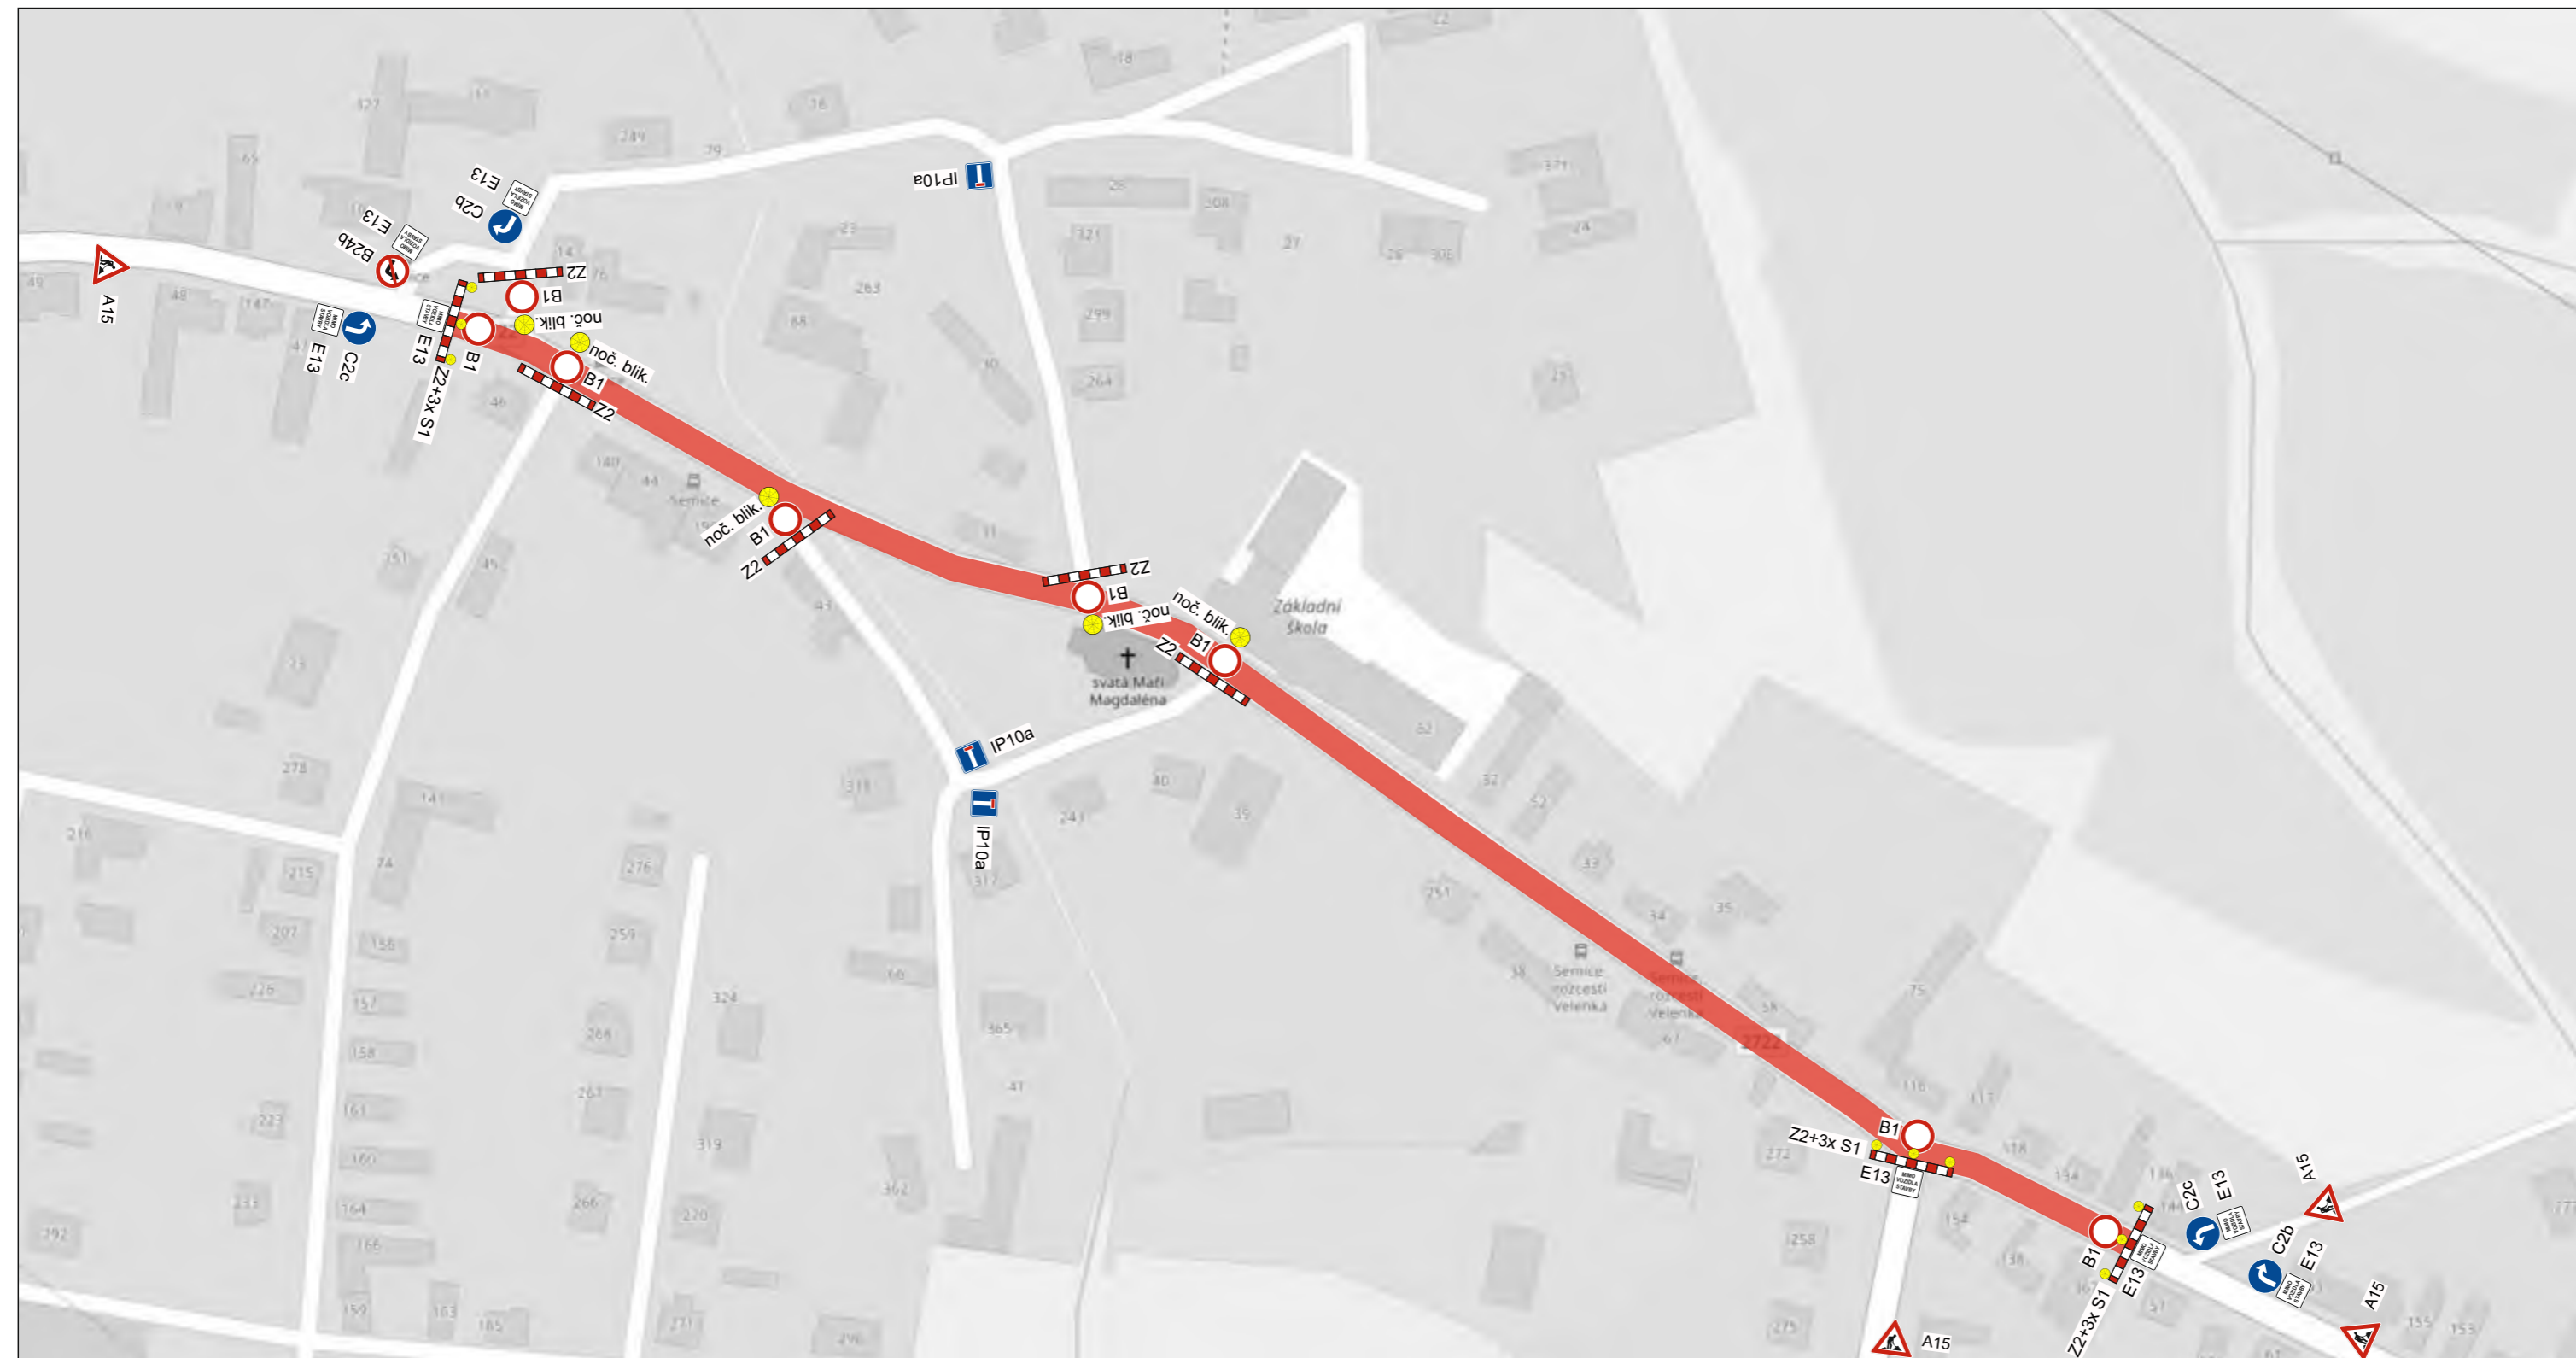

razítko DOSS

změny zastávek IDSK:

Ruší se:
 „Semice, rozc.Velenka“ – obousměrně pro všechny linky
 „Semice“ – obousměrně pro všechny linky
 „Hradištko, Kersko, Hrabalova“ – obousměrně pro všechny linky
 „Hradištko, Kersko, U pramene“ – obousměrně pro linku 429
 „Hradištko, Kersko, hl. sil.“ – obousměrně pro linku 429



Zřizuje se:
 „Hradištko, Kersko, U pramene“ – obousměrně pro linku 443 v místech pravidelné zastávky linky 429
 „Hradištko, Kersko, hl. sil.“ – obousměrně pro linku 443 v místech pravidelné zastávky linky 429
 „Velenka“ – obousměrně pro linku 443 v místech pravidelné zastávky linky 429

Při umístění dopravního značení musí být dodrženy podmínky dané v TP66 - OZNAČENÍ PRACOVNÍCH MÍST NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH III.VYDÁNÍ, zák.č.361/2000 Sb. v platném znění a zák.č. 13/1997 Sb. v platném znění.

Zodpovědná osoba: Tomáš Březina	Kontrolovat: Tomáš Březina	Kreslil: Tomáš Vydra	
Objednatel: miROADS	Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8		
Akce: Semice - III/2722 rekonstrukce komunikace			Formát: A3
Obsah: Návrh DIO - IV. etapa			Měřítko:
			Datum: 01/2023
			Účel: DIR
			Číslo výkresu: 05
			Paré č.:



IP22 - PRŮTAH OBCÍ SEMICE UZAVŘEN

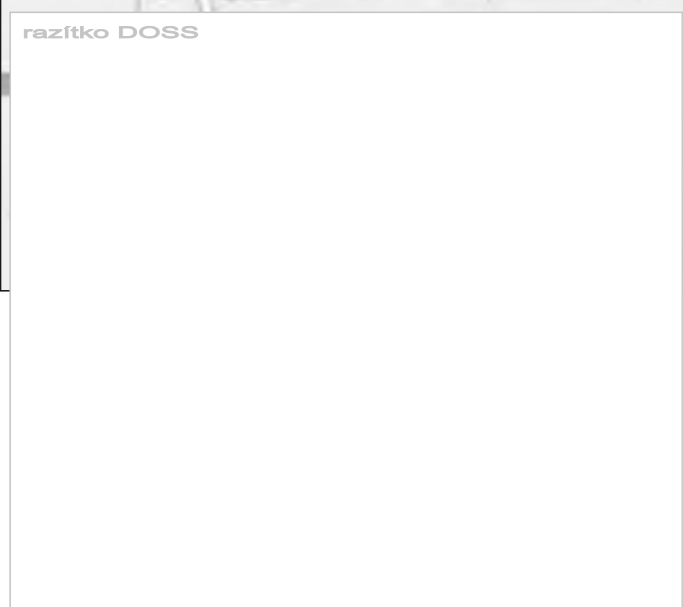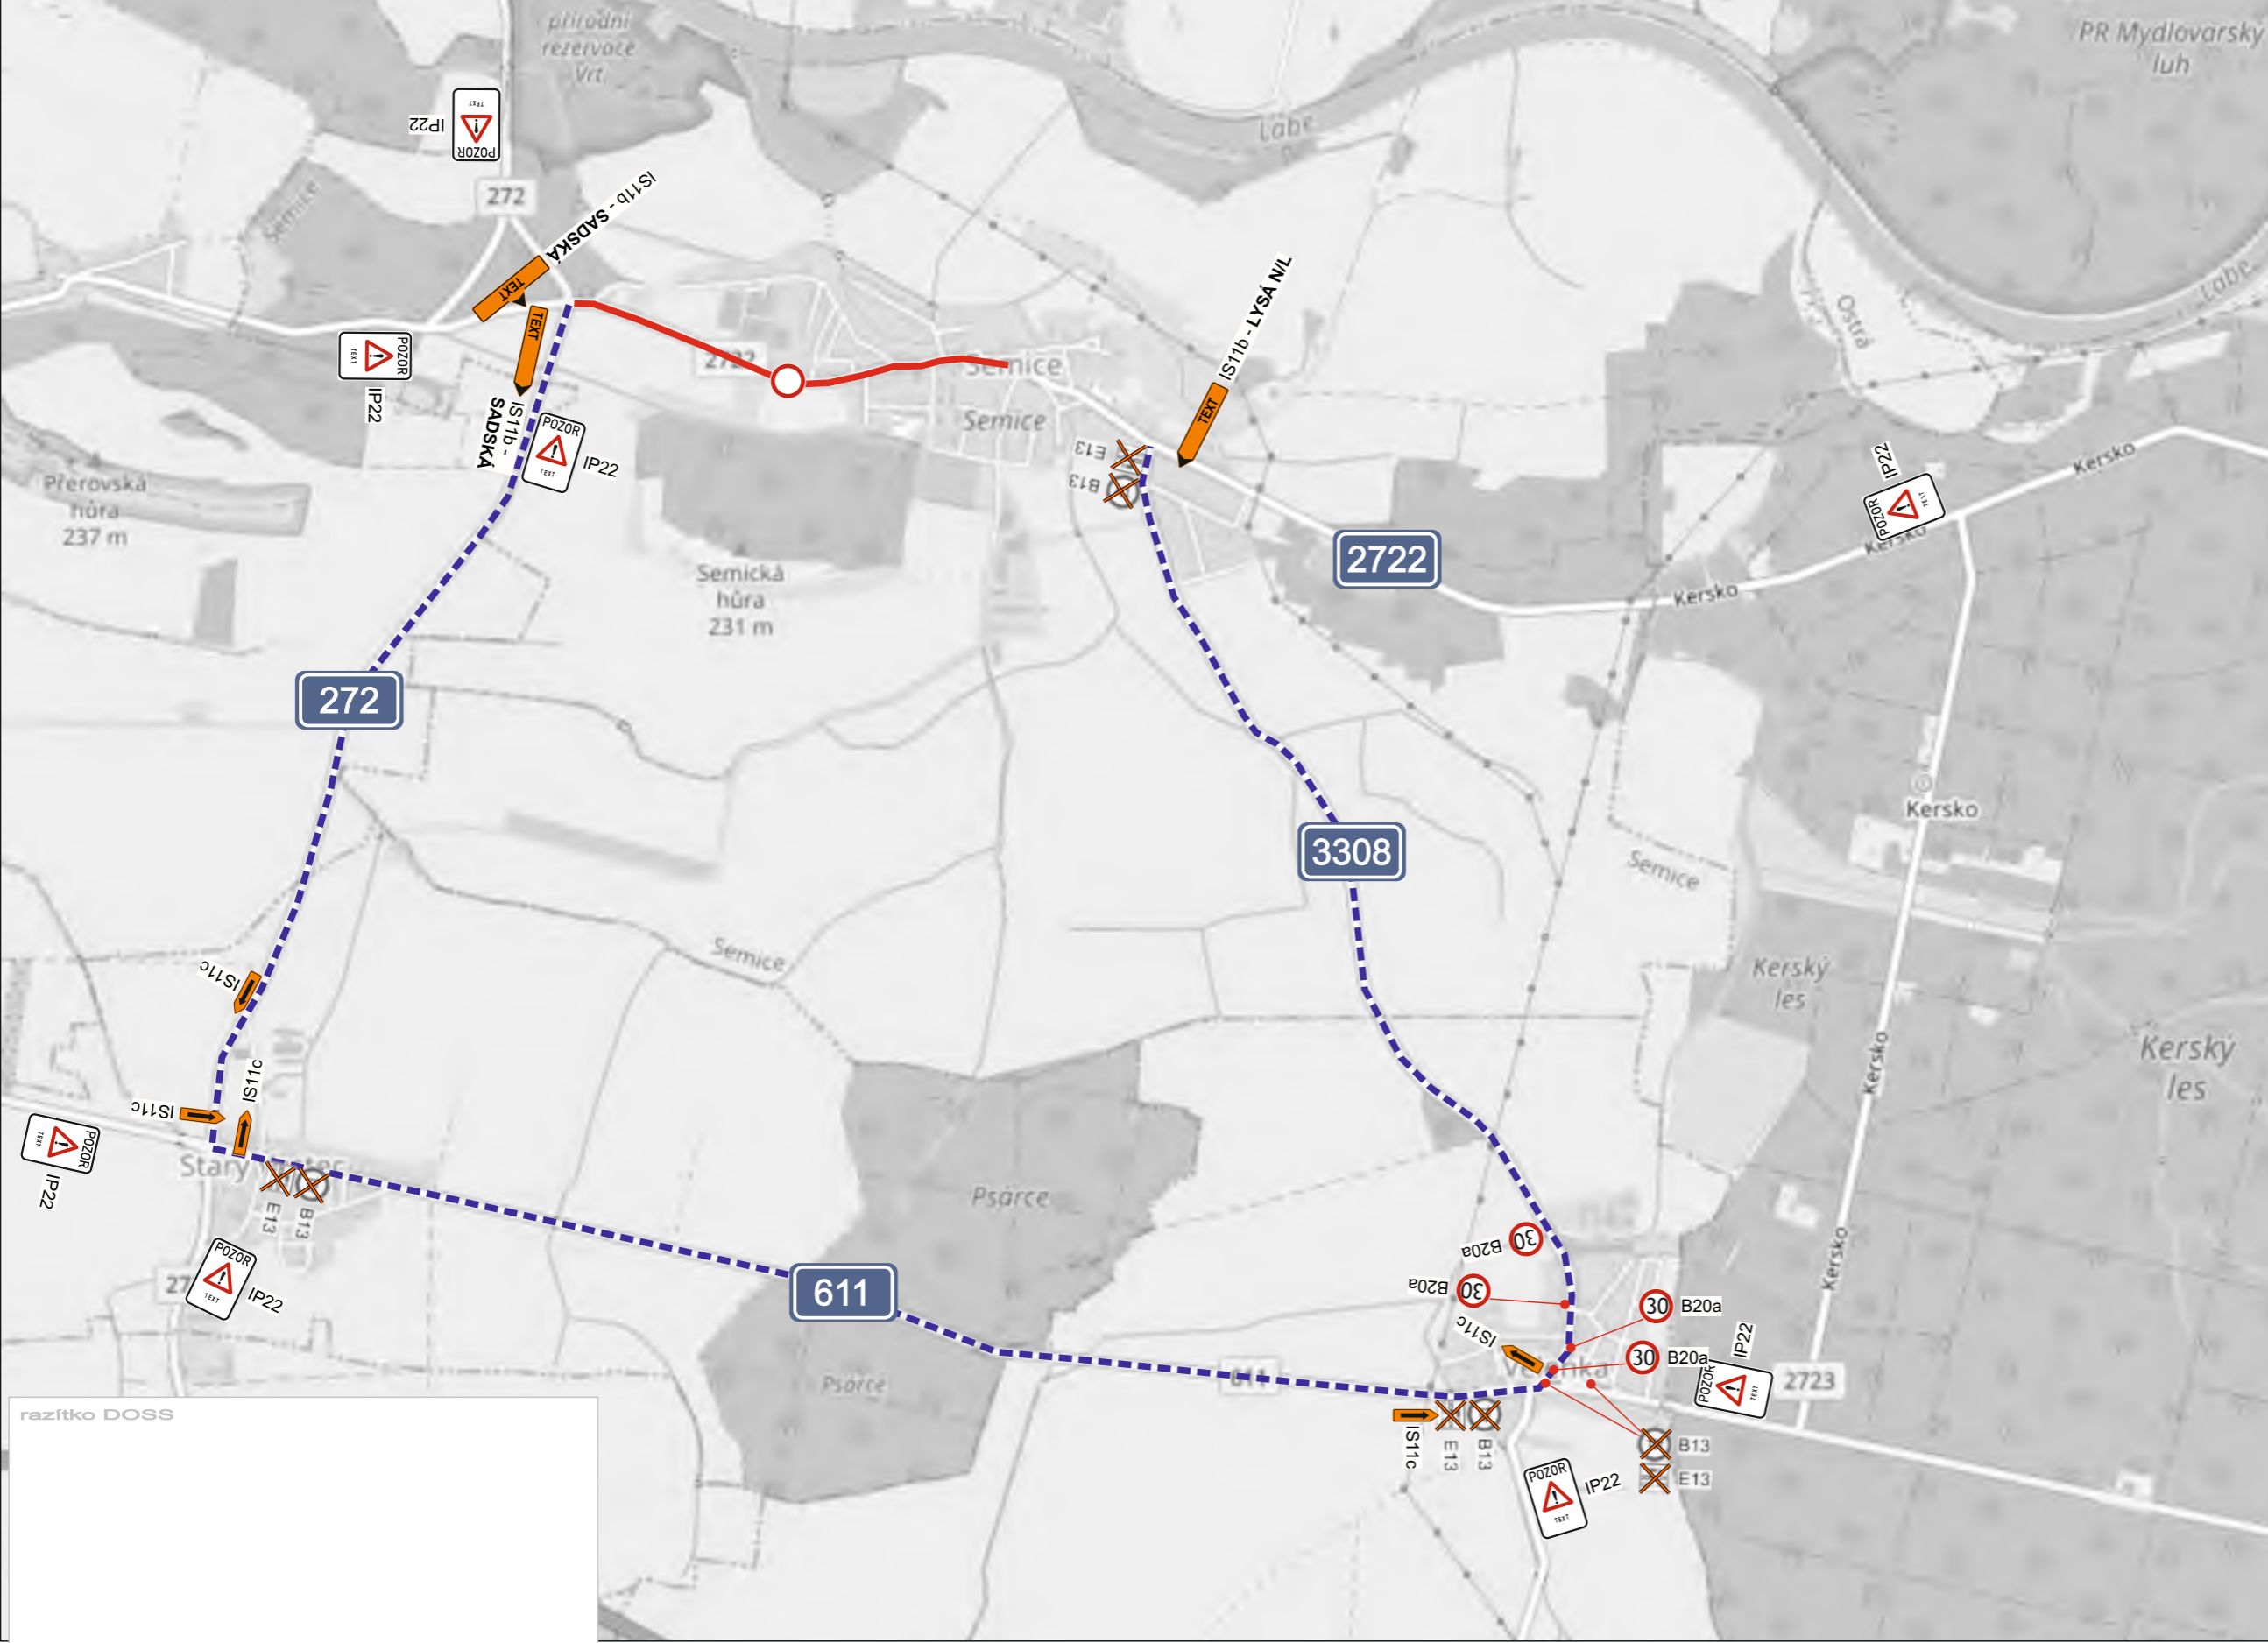


Při umístění dopravního značení musí být dodrženy podmínky dané v TP66 - OZNAČENÍ PRACOVNÍCH MÍST NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH III.VYDÁNÍ, zák.č.361/2000 Sb. v platném znění a zák.č. 13/1997 Sb. v platném znění.

Zodpovědná osoba: Tomáš Březina	Kontroloval: Tomáš Březina	Kreslil: Tomáš Vydra	SEDOZ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
Objednatel: MIROADS	Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8		
Akce: Semice - III/2722 rekonstrukce komunikace	Formát: A3		
Obsah: Návrh DIO - OBJÍZDNÁ TRASA (pro etapu I., Ia., II.)	Měřítko: 01/2023		
	Účel: DIR		
	Číslo výkresu: 06		
	Paré č.:		



IP22 - PRŮTAH OBCÍ SEMICE UZAVŘEN

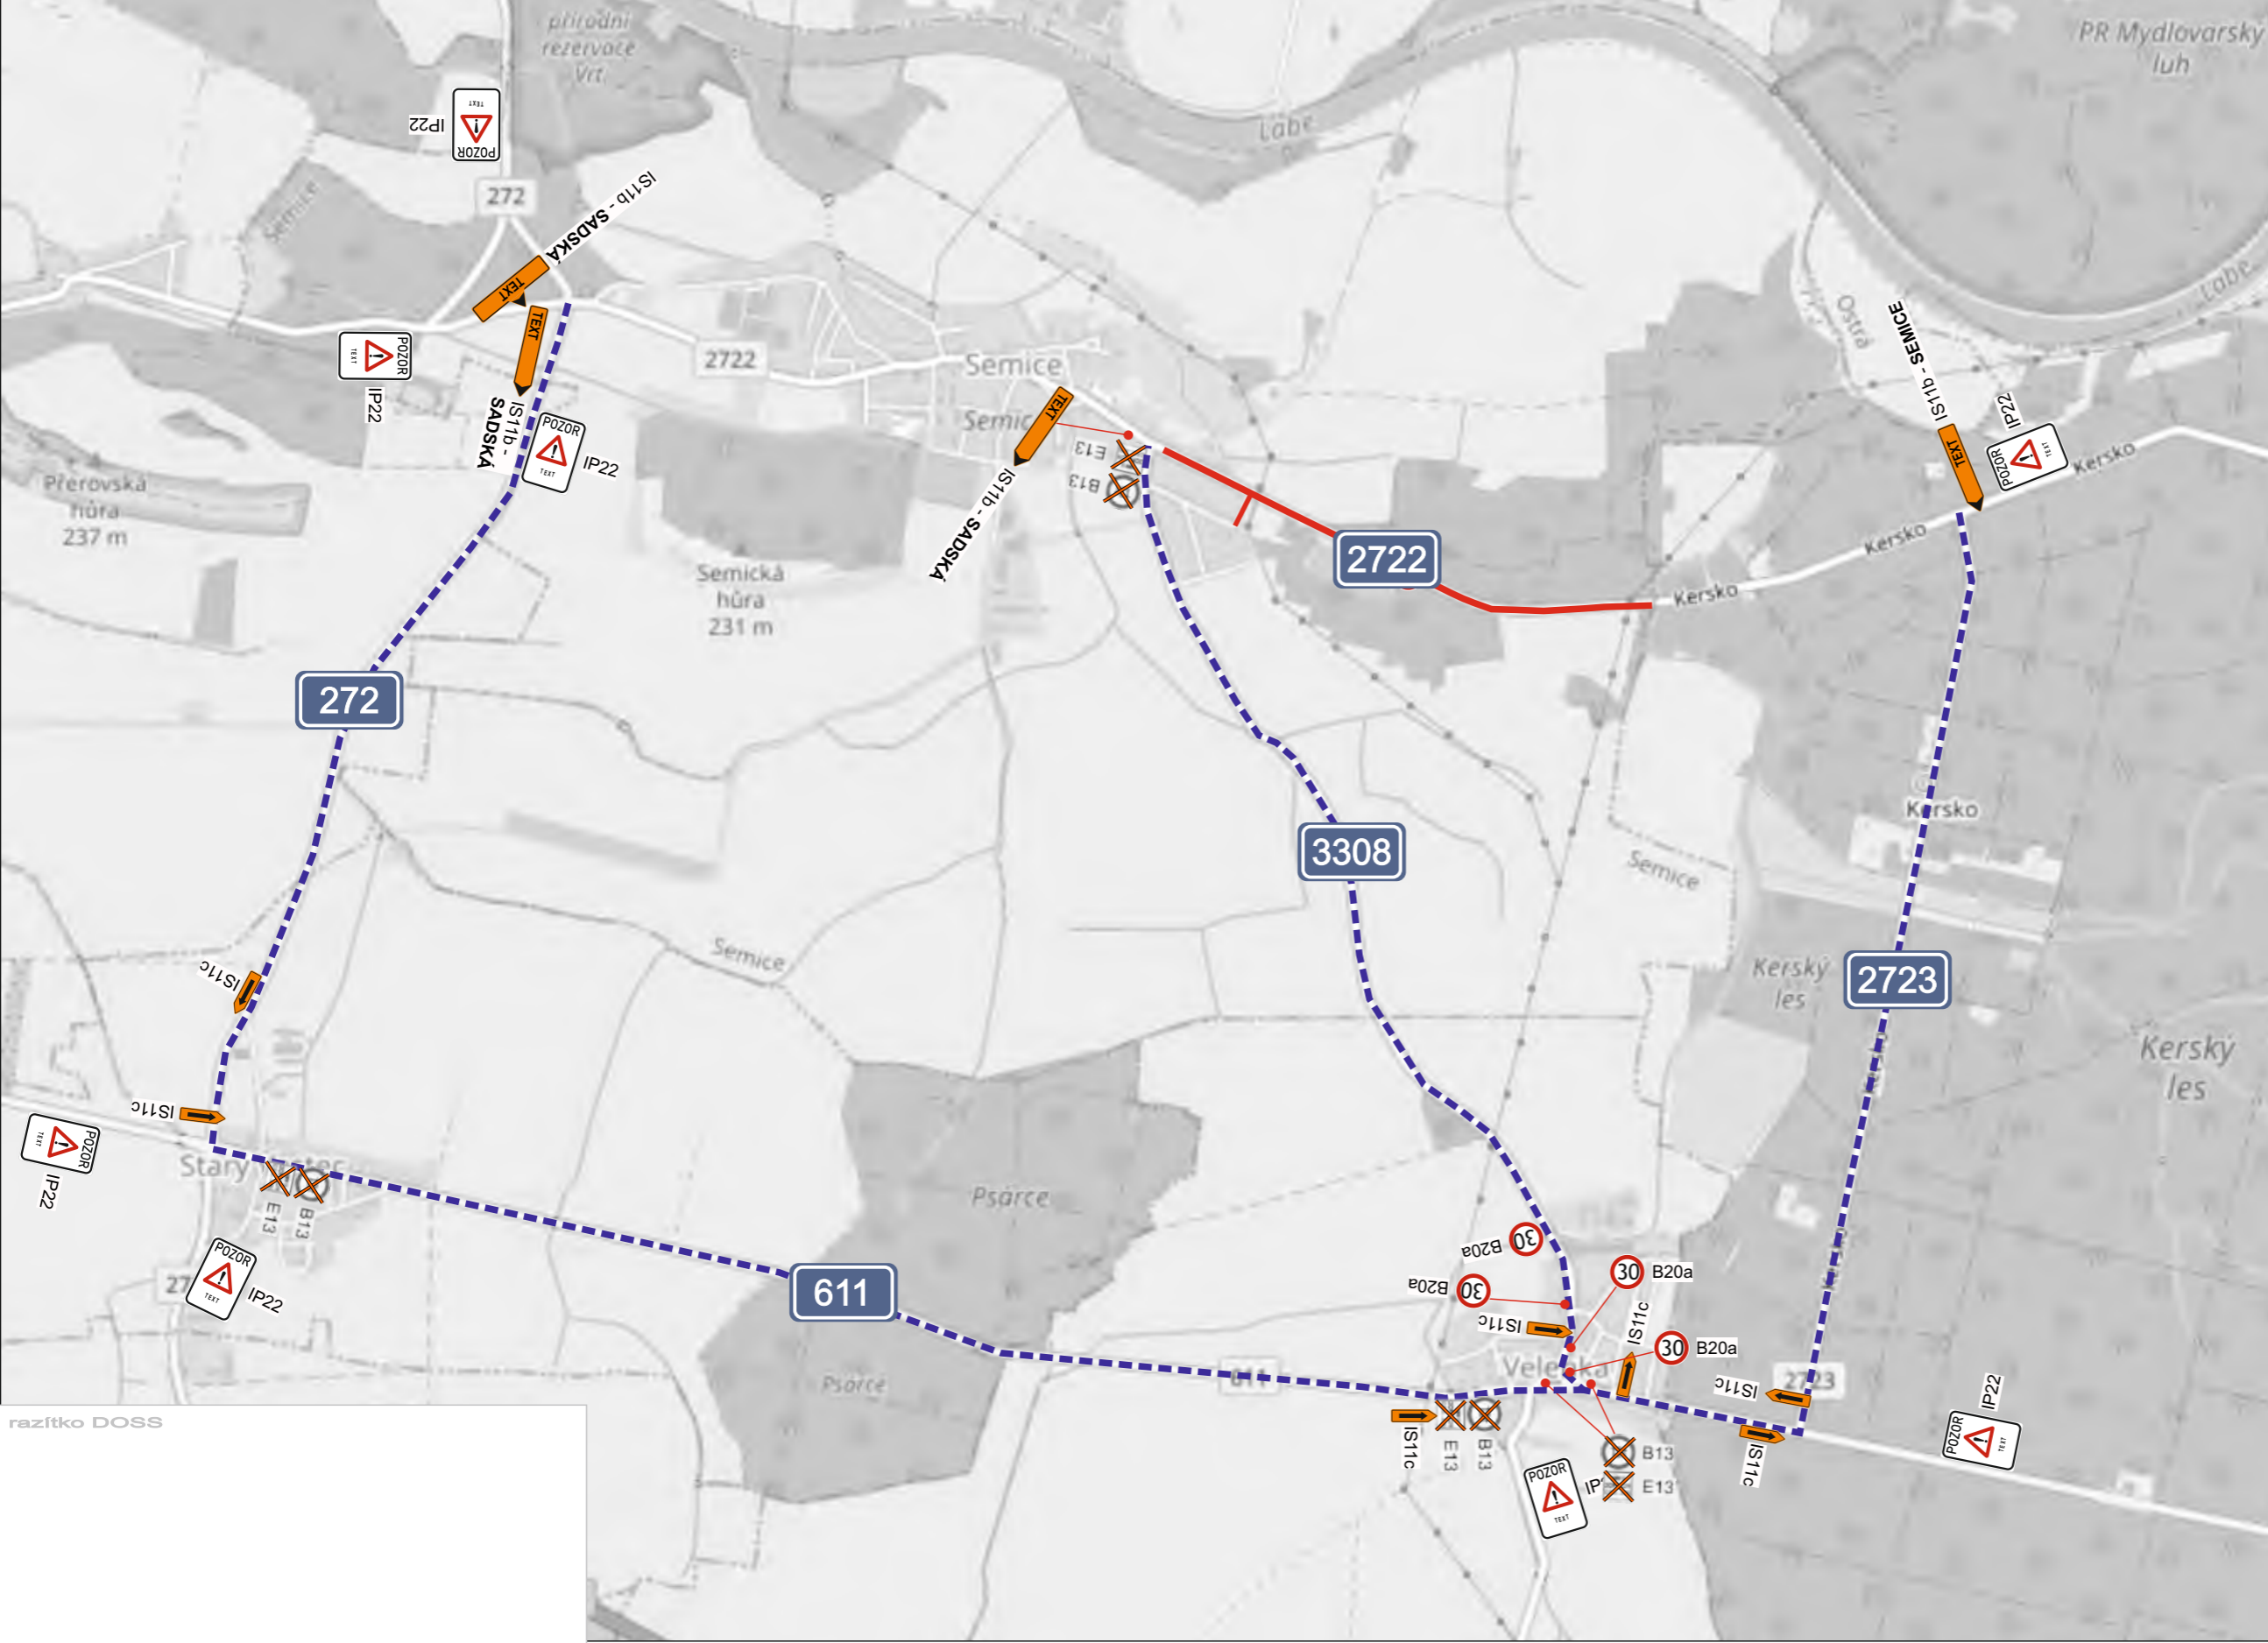


razítko DOSS

Při umístění dopravního značení musí být dodrženy podmínky dané v TP66 - OZNAČENÍ PRACOVNÍCH MÍST NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH III.VYDÁNÍ, zák.č.361/2000 Sb. v platném znění a zák.č. 13/1997 Sb. v platném znění.

Zodpovědná osoba: Tomáš Březina	Kontroloval: Tomáš Březina	Kreslil: Tomáš Vydra	SEDOZ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
Objednatel: mirROADS Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8			
Akce: Semice - III/2722 rekonstrukce komunikace			Formát: A3
			Měřítko:
			Datum: 01/2023
			Účel: DIR
Obsah: Návrh DIO - OBJÍZDNÁ TRASA (pro etapu III.)			Číslo výkresu: 07
			Paré č.:



IP22 - PRŮTAH OBCÍ SEMICE UZAVŘEN

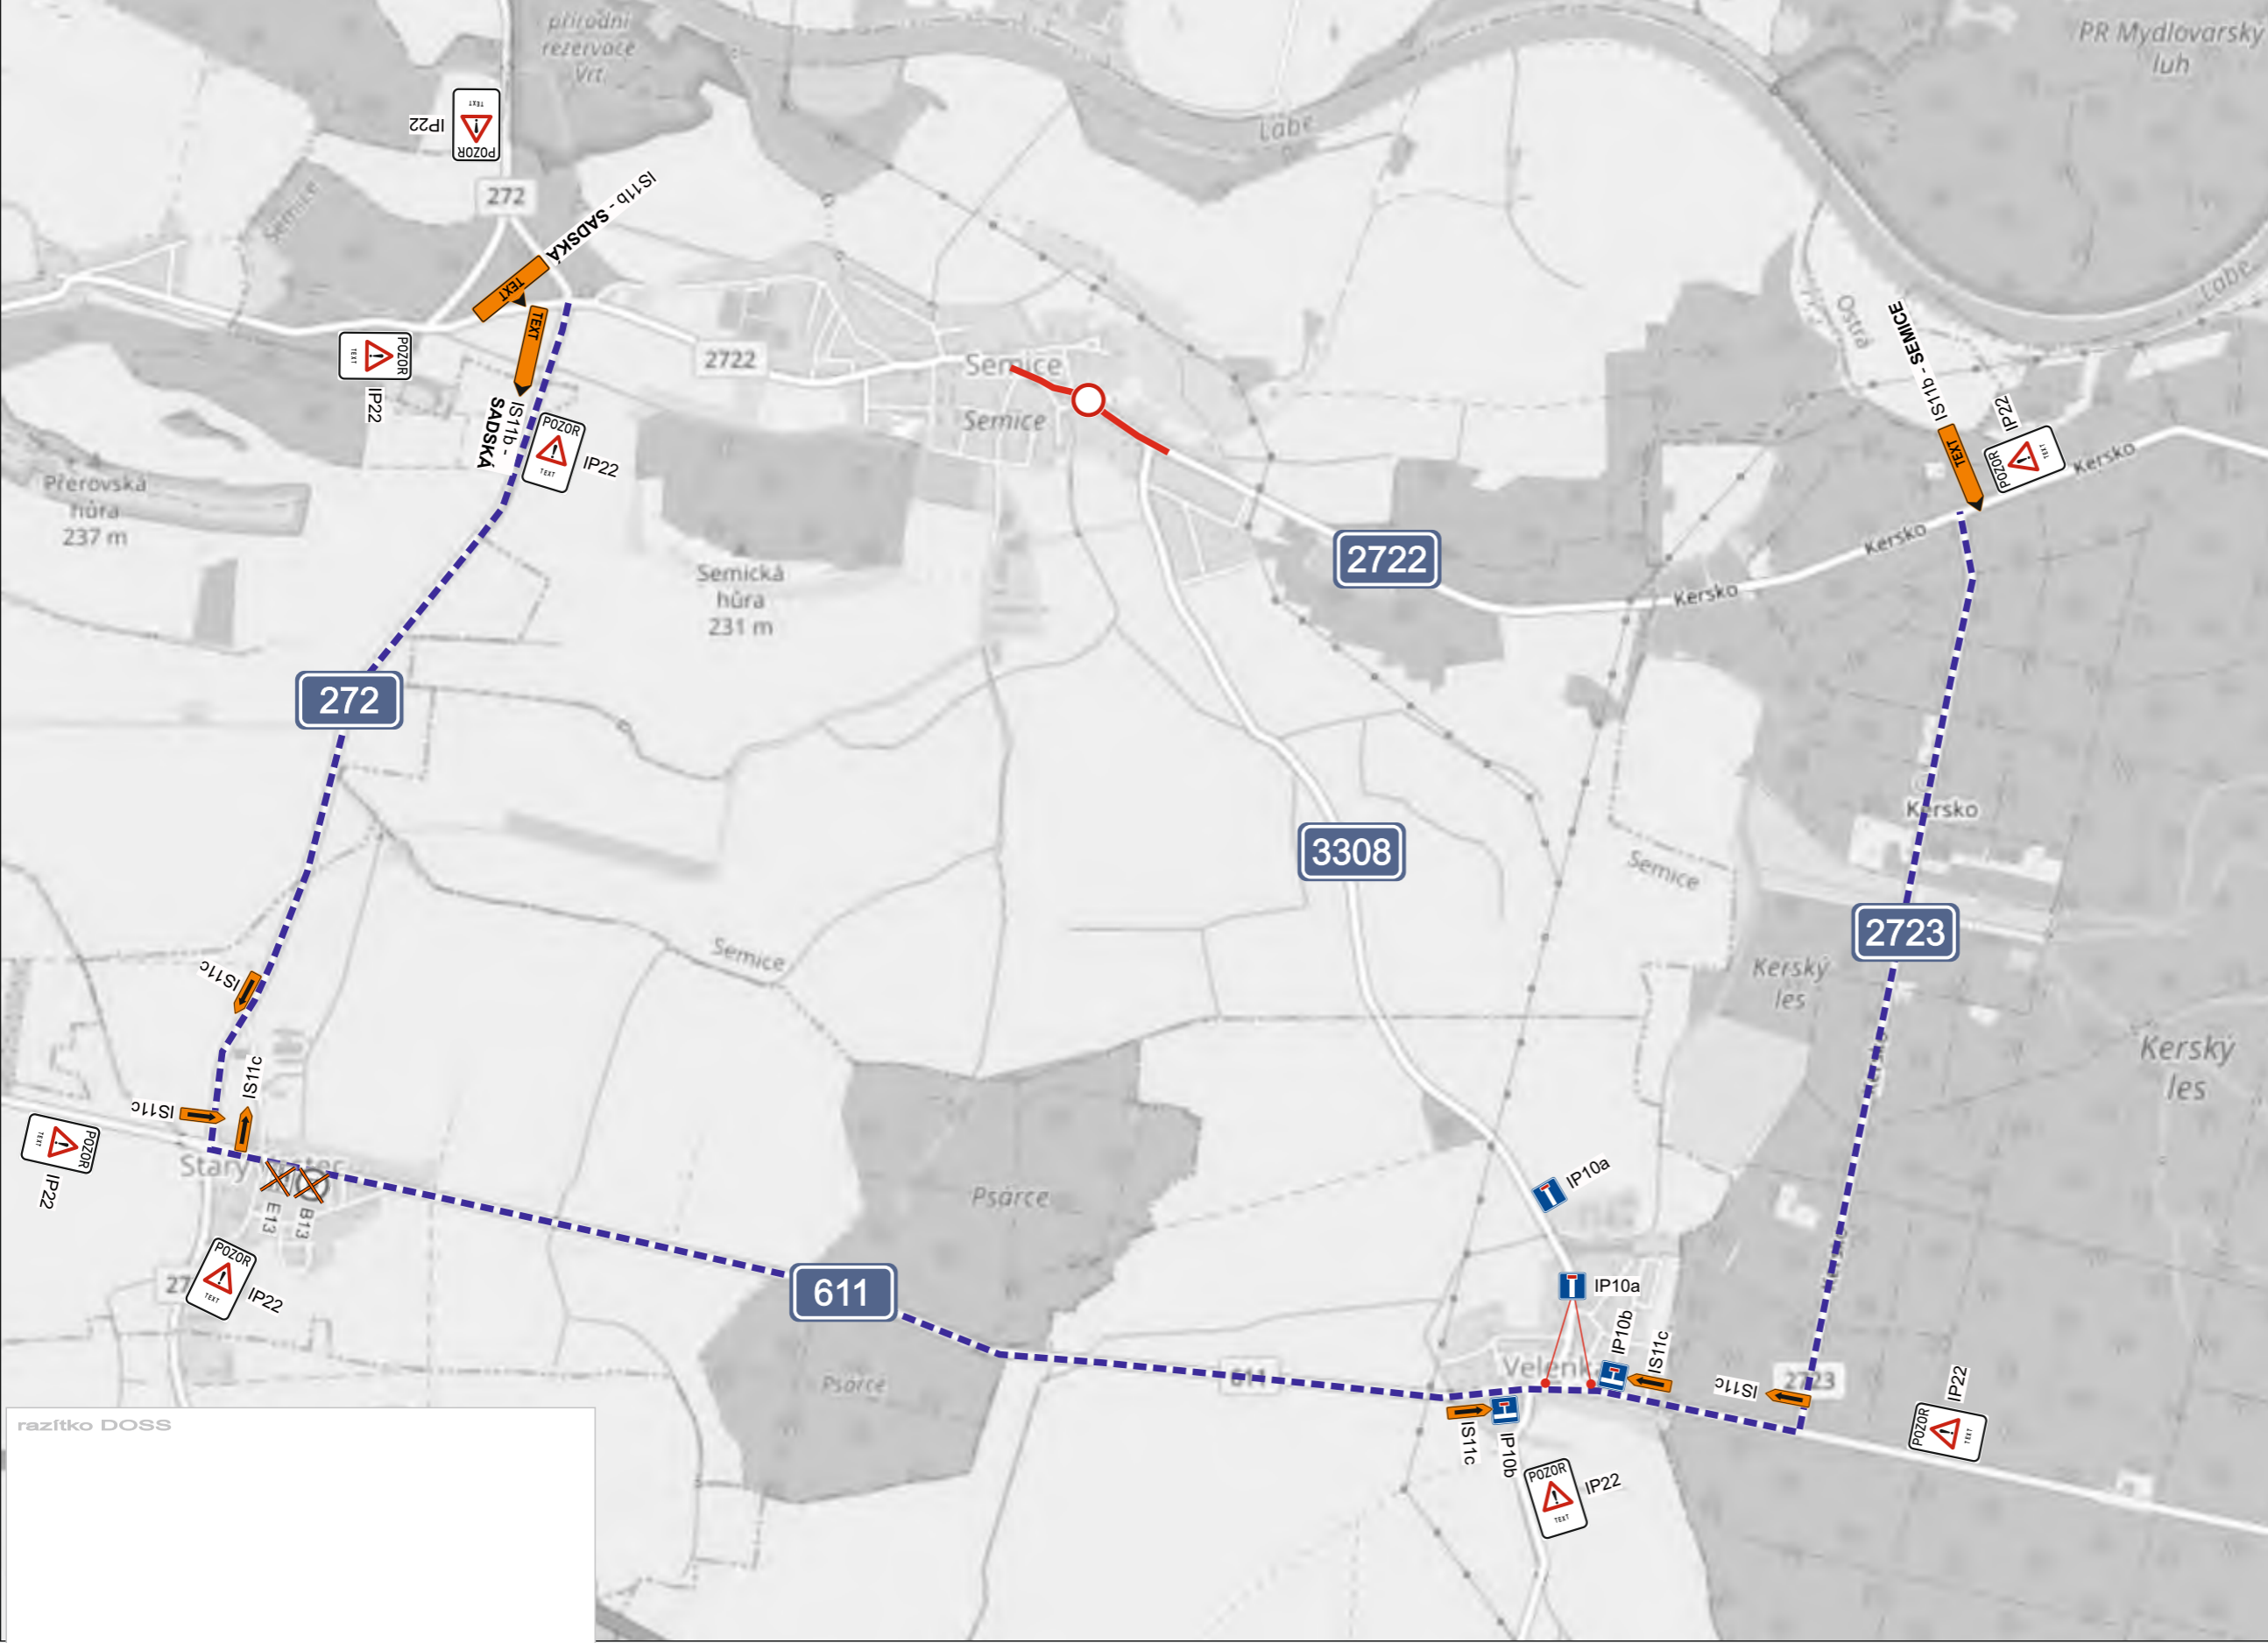


razítko DOSS

Při umístění dopravního značení musí být dodrženy podmínky dané v TP66 - OZNAČENÍ PRACOVNÍCH MÍST NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH III.VYDÁNÍ, zák.č.361/2000 Sb. v platném znění a zák.č. 13/1997 Sb. v platném znění.

Zodpovědná osoba: Tomáš Březina	Kontroloval: Tomáš Březina	Kreslil: Tomáš Vydra	SEDOZ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
Objednatel: míroas Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8			
Akce: Semice - III/2722 rekonstrukce komunikace			Formát: A3
			Měřítko:
			Datum: 01/2023
			Účel: DIR
Obsah: Návrh DIO - OBJÍZDNÁ TRASA (pro etapu IV.)			Číslo výkresu: 08
			Paré č.:

UMÍSTIT PO CELOU DOBU STAVBY!

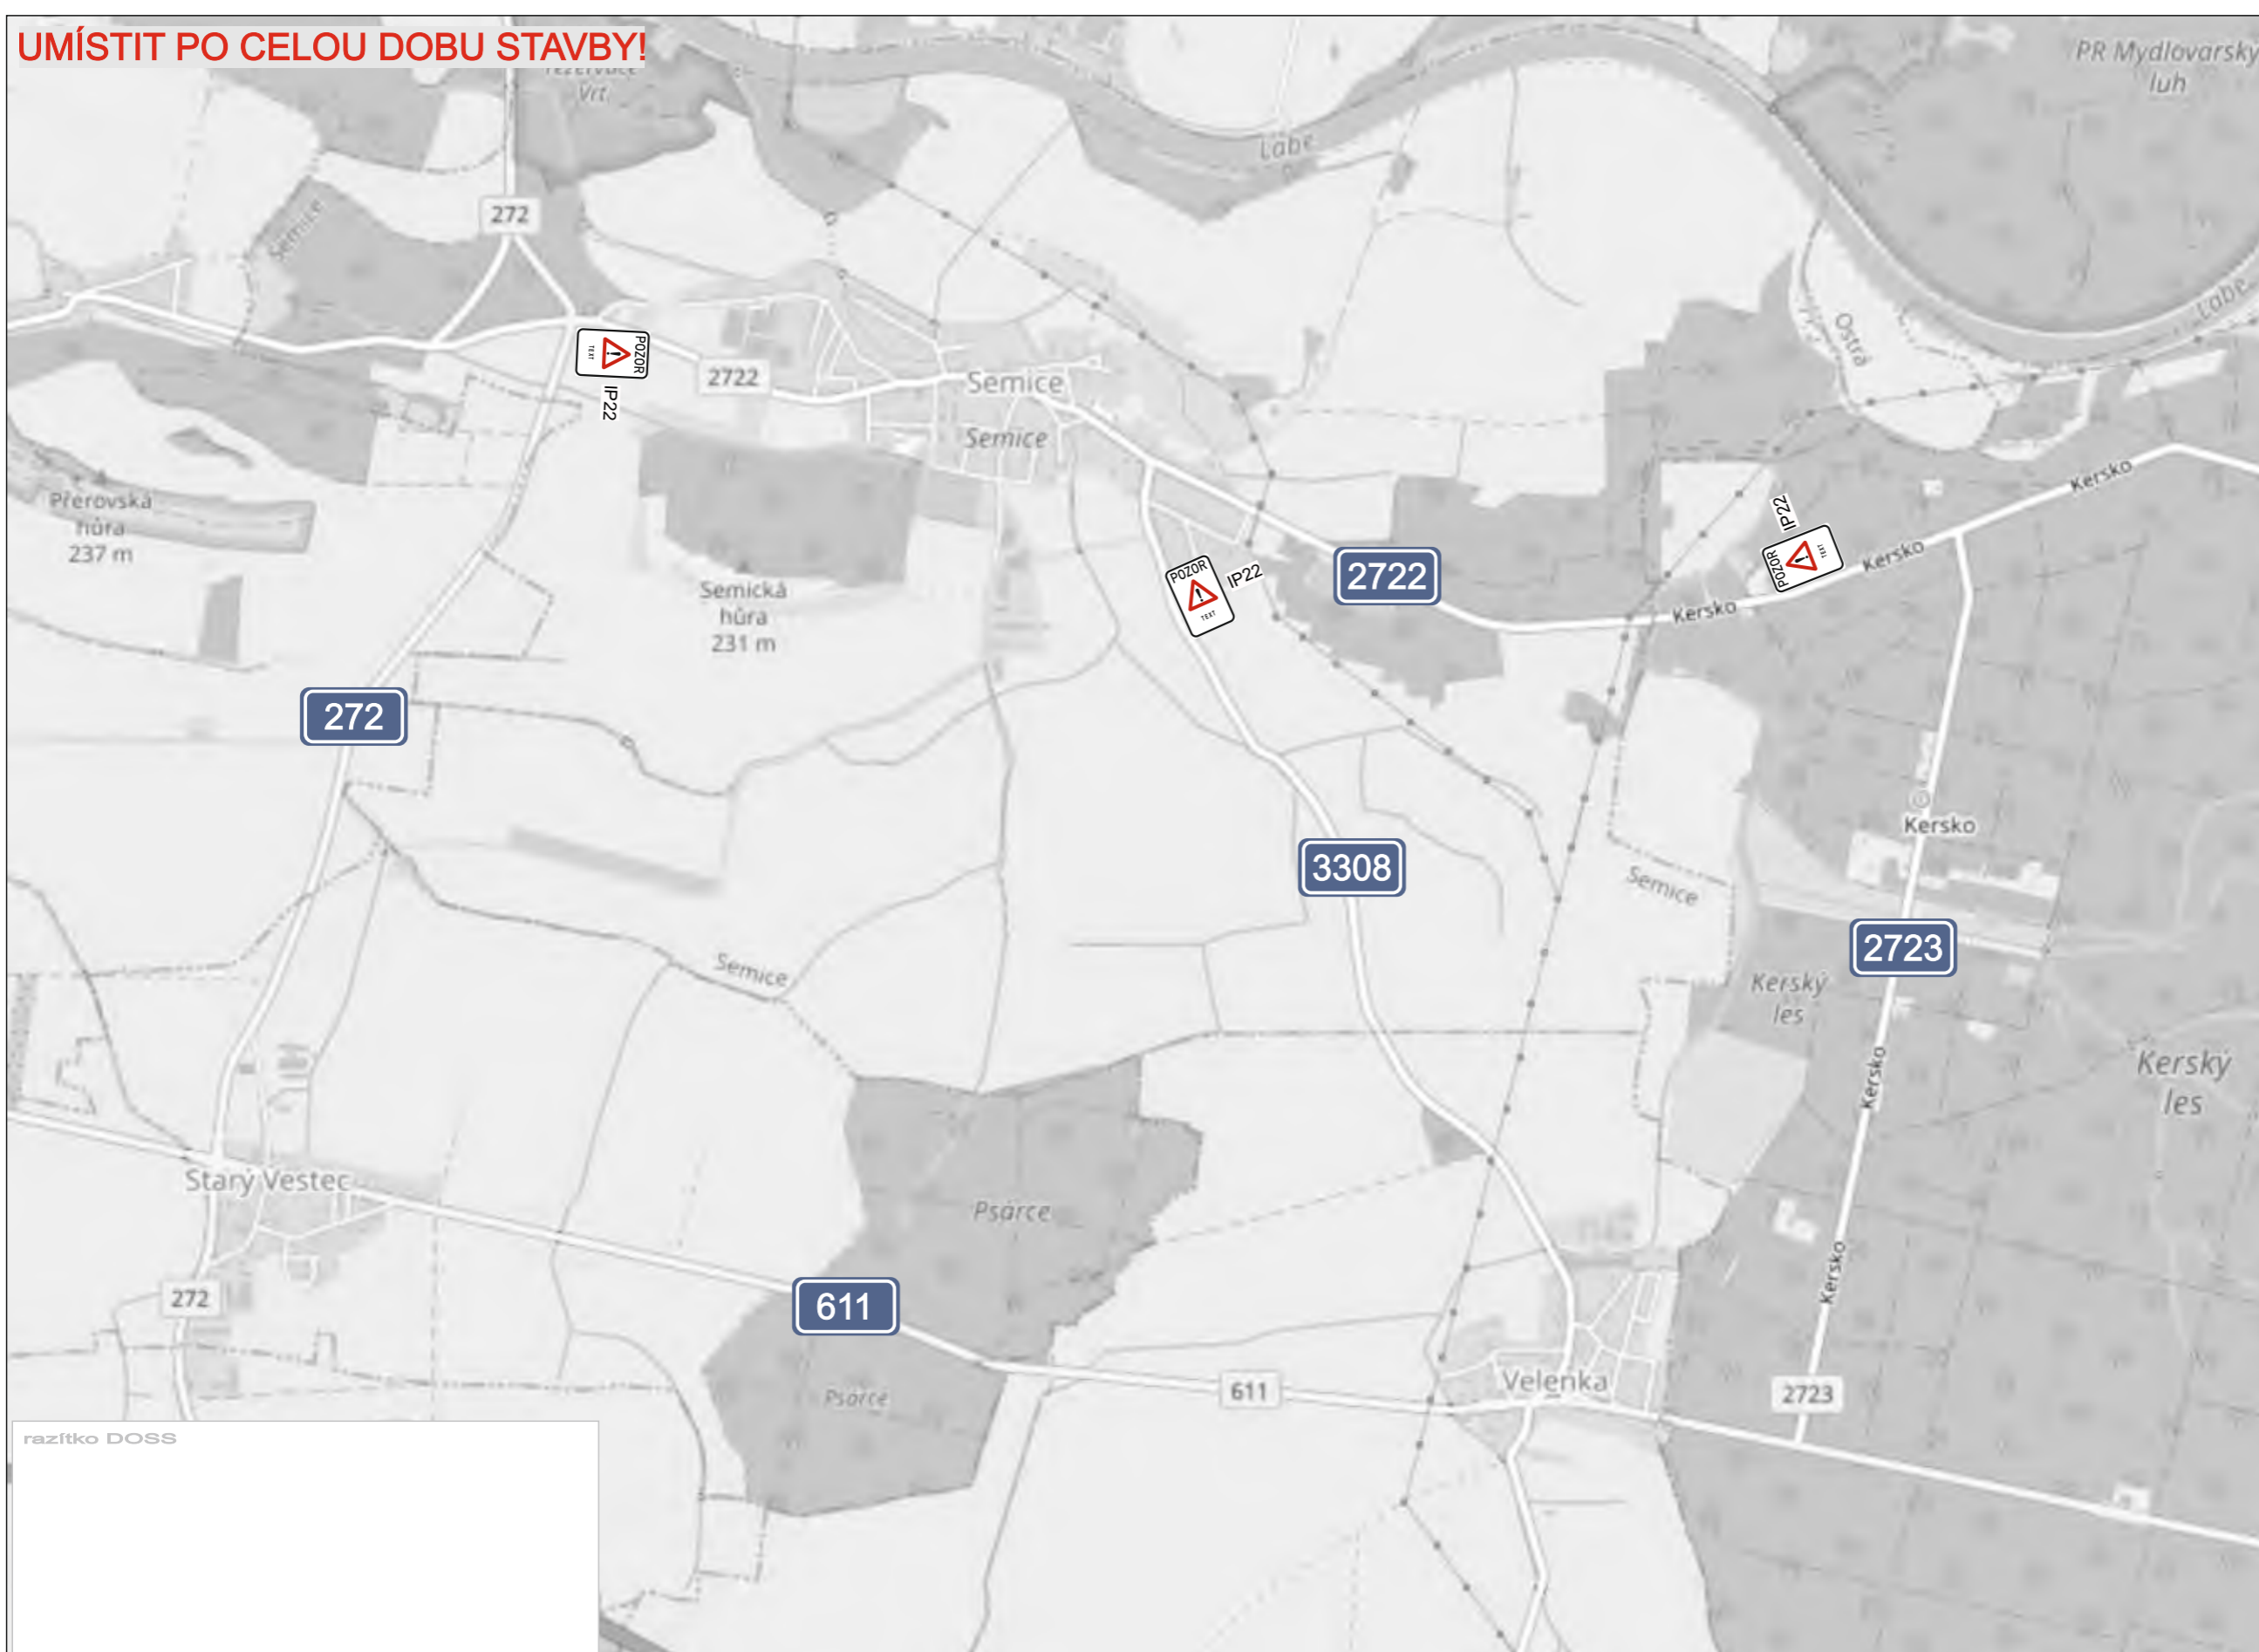

IP22 - PROJÍŽDÍTE STAVBOU


razítko DOSS

Při umístění dopravního značení musí být dodrženy podmínky dané v TP66 - OZNAČENÍ PRACOVNÍCH MÍST NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH III.VYDÁNÍ, zák.č.361/2000 Sb. v platném znění a zák.č. 13/1997 Sb. v platném znění.


Zodpovědná osoba: Tomáš Březina	Kontroloval: Tomáš Březina	Kreslí: Tomáš Vydra
Objednatel: míROADS	Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8	
Akce: Semice - III/2722 rekonstrukce komunikace	Formát: A3	
Obsah: Návrh DIO - IP22	Měřítko: Datum: 01/2023	
	Účel: DIR	
	Číslo výkresu: 09	
	Paré č.:	

SEDOZ
DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

Semice - situace příjezdových tras k dotčeným nemovitostem při rekonstrukci kom. III/2722

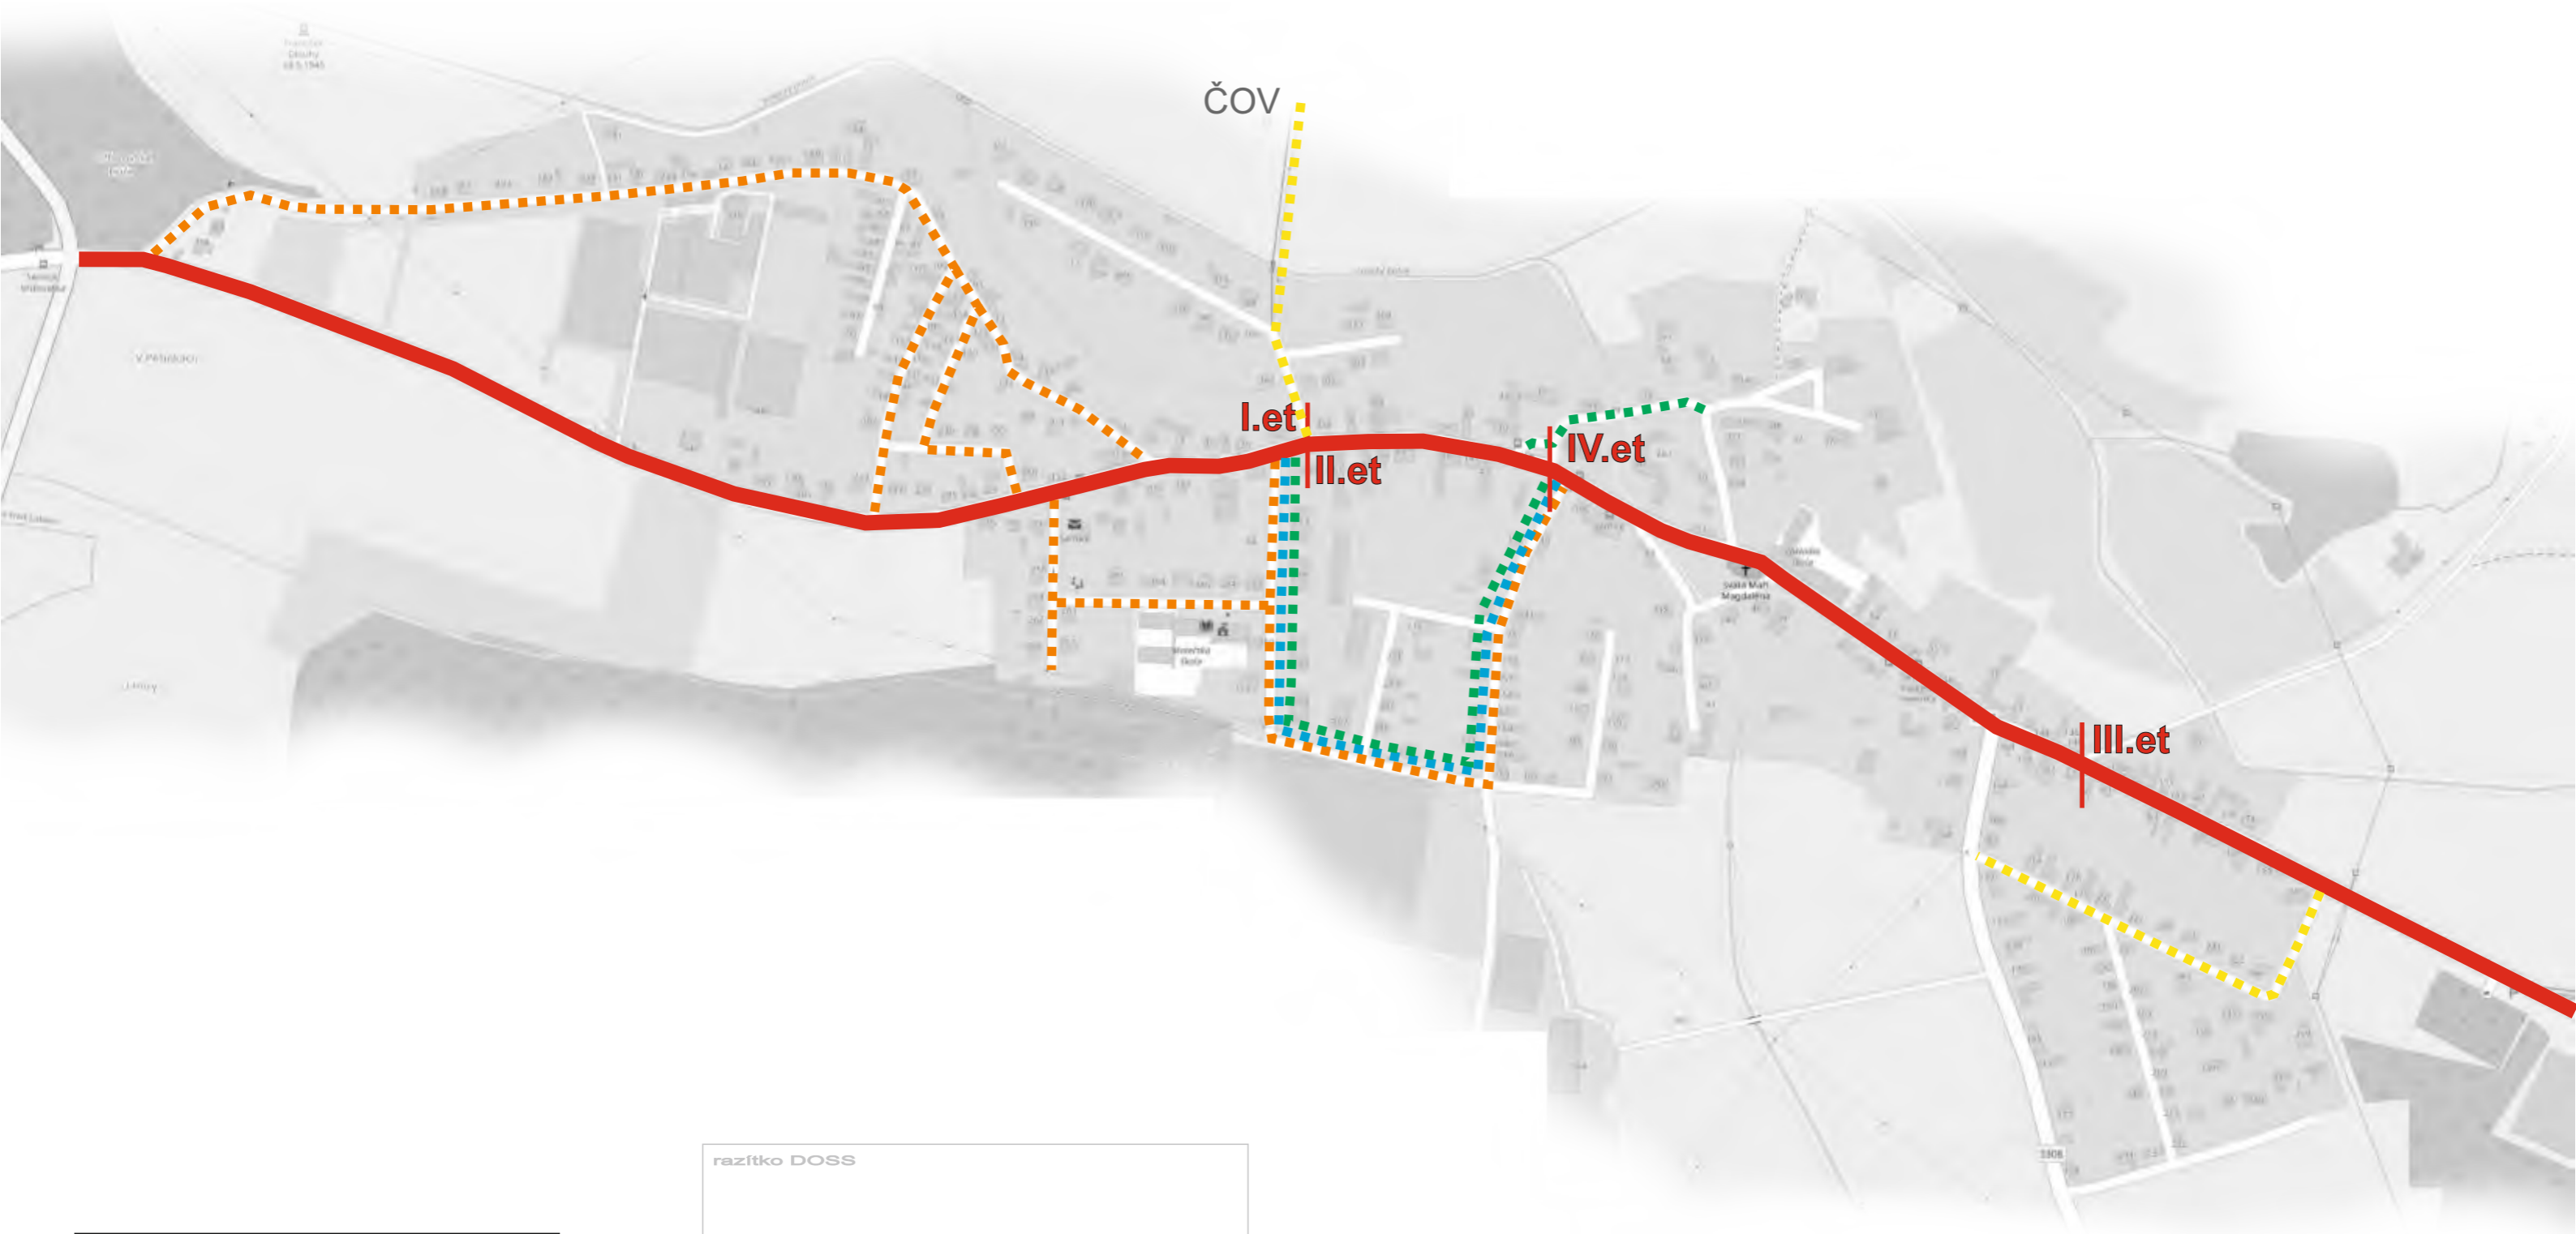

- ■ ■ ■ ■ I. etapa
- ■ ■ ■ ■ II. etapa
- ■ ■ ■ ■ III. etapa
- ■ ■ ■ ■ IV. etapa

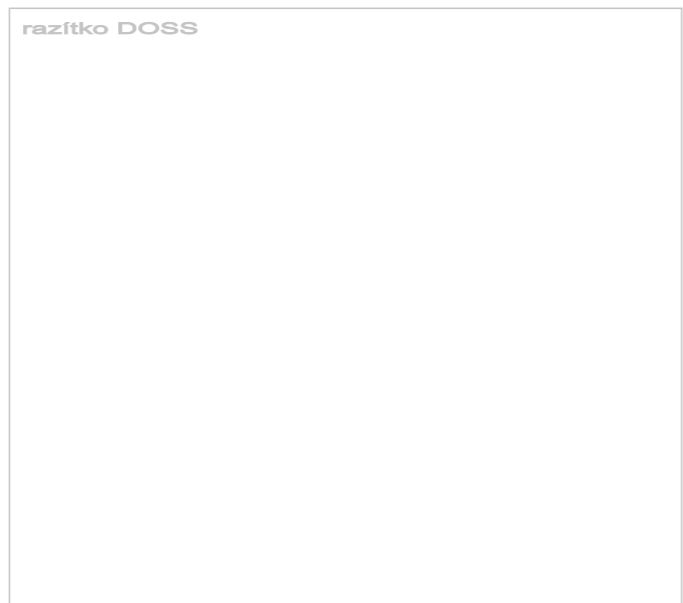

Zodpovědná osoba: Tomáš Březina	Kontroloval: Tomáš Březina	Kreslil: Tomáš Vydra	
Objednatel: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8			
Akce: Semice - III/2722 rekonstrukce komunikace			Formát: A3
			Měřítko:
			Datum: 01/2023
			Účel: DIR
Obsah: Návrh DIO - PŘÍJEZDOVÉ TRASY NA MK			Číslo výkresu: 09
			Paré č.:



Městský úřad Lysá nad Labem

Odbor dopravy

Husovo náměstí 23/1, 289 22 Lysá nad Labem

Spis. zn.: MULNL-OD/8842/2023/Juh/6
PÚP - III/2722
Naše č.j.: MULNL-OD/8842/2023/Juh
Vaše č.j.:
Vyřizuje: Bc. Šárka Juhászová
Telefon:
E-mail:
Dat.schránka: 5adasau
Datum: 3.2.2023

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy

Městský úřad Lysá nad Labem obce s rozšířenou působností, odbor dopravy, správní orgán oprávněný ke stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích dle ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen: „zákon o silničním provozu“), na základě ustanovení § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen: „správní řád“)

v y d á v á o p a t ř e n í o b e c n é p o v a h y

spočívající

ve stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci:

I. etapa – III/2722, II/272, II/611 a MK dle návrhu DIO bezejména (MK vyparkovat 7 dní předem)

Ia. etapa – III/2722, II/272, II/611 a MK dle návrhu DIO bezejména

II. etapa – III/2722, II/272, II/611 a MK dle návrhu DIO bezejména

III. etapa – III/2722, III/3308, II/272, II/611 a MK dle návrhu DIO bezejména

IV. etapa – III/2722, III/3308, II/611, II/272 a MK dle návrhu DIO bezejména

z důvodu zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.

Správní orgán, jako příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností,

s t a n o v í

ve smyslu ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů v platném znění a vyhlášky č. 294/2015 Sb., přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích – k označení provedení omezení provozu na pozemní komunikaci

I. etapa – III/2722, II/272, II/611 a MK dle návrhu DIO bezejména (MK vyparkovat 7 dní předem)

Ia. etapa – III/2722, II/272, II/611 a MK dle návrhu DIO bezejména

II. etapa – III/2722, II/272, II/611 a MK dle návrhu DIO bezejména

III. etapa – III/2722, III/3308, II/272, II/611 a MK dle návrhu DIO bezejména

IV. etapa – III/2722, III/3308, II/611, II/272 a MK dle návrhu DIO bezejména

Žadatel: MI ROADS, a.s., IČ: 24218537, se sídlem Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8, v zastoupení na základě plné moci SEDOZ DZ, s. r. o., IČ 24218537, se sídlem Primátorská 296/38, 180 00 Praha 8

K označení použijte dopravní značky dle ověřeného a schváleného DIO (dopravně inženýrské opatření), které je součástí a přílohou tohoto opatření obecné povahy.

Dopravní značení a zařízení proved'te jako: dopravní zařízení a přenosné svislé dopravní značky
Velikost dopravního značení: základní rozměrová řada

Provedení dopravního značení a zařízení: retroreflexní

Důvod: rekonstrukce komunikace III/2722

Platnost úpravy:

I. etapa: od 14.02.2023 do 31.03.2023

Ia. etapa: od 01.04.2023 do 14.04.2023

II. etapa: od 15.04.2023 do 29.05.2023

III. etapa: od 30.05.2023 do 13.07.2023

IV. etapa od 14.07.2023 do 11.10.2023

Odpovědná osoba za řádné provedení úpravy: Tomáš Havelka, tel.: 702 006 672

Další podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:

- 1) Předmětem přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích je rekonstrukce průtahu silnice č. III/2722 obcí Semice.
- 2) Bude zajištěn bezpečný přístup do nemovitostí dotčených stavbou.
- 3) V případě omezení průchodnosti chodníku, bude chodník uzavřen a chodci na tuto skutečnost upozorněni.
- 4) V době kdy nebudou probíhat stavební práce, bude omezení v maximální možné míře minimalizováno (nesmí však dojít k ohrožení bezpečnosti na pozemních komunikacích).
- 5) Dopravní značení, které je v rozporu s přechodnou úpravou provozu, bude zakryto. "
- 6) Dopravní značení musí být osazeno podle zásad pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích – TP 66.
- 7) Dopravní značky musí být rozměrem a barevným provedením v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích.
- 8) Dopravní značky užívané k přechodnému dopravnímu značení musí být provedeny výhradně jako reflexní.
- 9) Po ukončení akce musí být povrch uveden do řádného stavu a dopravní značky užitě na akci ihned odstraněny.
- 10) Dopravní značení, případně dopravní zařízení, proved'te dle přiloženého situačního plánu, pokud je tento nedílnou součástí tohoto stanovení, nebo podle odkazu či slovního popisu uvedeného v tomto stanovení.
- 11) Žadatel je povinen zajišťovat průběžnou kontrolu a údržbu dopravního značení a zařízení tak, aby bylo v řádném stavu.
- 12) Dopravní značení bude zajištěno proti posunutí, otočení nebo pádu vlivem provozu popřípadě povětrnostních podmínek a instalováno bezprostředně před skutečným zahájením prací.
- 13) Městský úřad Lysá nad Labem, odbor dopravy si vyhrazuje právo stanovení přechodné úpravy dopravního značení změnit nebo doplnit, jestliže to bude vyžadovat změna provozu nebo veřejný zájem. Policie ČR má právo kontroly a předložení dalších podmínek, zajišťujících bezpečnost a plynulost silničního provozu.
- 14) V době kdy nebudou probíhat stavební práce, bude omezení v maximální možné míře minimalizováno (nesmí však dojít k ohrožení bezpečnosti na pozemních komunikacích).

Hrozí-li nebezpečí z prodlení, může příslušný správní orgán stanovit přechodnou úpravu provozu na dálnicích, silnicích, místních komunikacích nebo veřejně přístupných účelových komunikacích bez projednání s dotčenými orgány a bez předchozího řízení o návrhu opatření obecné povahy, nejdéle však na dobu 60 dnů.

Upozornění: Toto opatření obecné povahy nenahrazuje povolení, stanovisko, posouzení, případně jiné opatření dotčeného správního úřadu vyžadované zvláštními předpisy. Tímto stanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vyplývající z případných smluvních vztahů mezi žadatelem a právníckou osobou zajišťující vlastní realizaci dopravního značení.

Odůvodnění:

Městský úřad Lysá nad Labem, odbor dopravy, zpracoval podklady k žádosti žadatele a na základě souhlasných vyjádření příslušných dotčených orgánů věc posoudil a rozhodl o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, kdy v podmínkách pro její platnost stanoví zejména dodržení souladu provedení dopravního značení dle přiloženého dopravně inženýrského opatření (DIO).

Poučení:

Proti opatření obecné povahy nelze dle ustanovení § 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů podat opravný prostředek. Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení.

Bc. Šárka Juhászová
vedoucí odboru dopravy
(otisk úředního razítka)

Tato veřejná vyhláška musí být vyvěšena nejméně po dobu 15-ti dnů na úřední desce MěÚ Lysá nad Labem, Semice, Velenka, Starý Vestec. Současně se zveřejní též způsobem umožňující dálkový přístup. Vývěsní lhůta začíná den následující po dni vyvěšení, sejmutí vyhlášky je možné následující pracovní den po posledním dni vývěsní lhůty. Poslední den této lhůty je dnem doručení.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Obdrží:

Veřejnou vyhláškou (ve smyslu § 172 správního řádu) – se žádostí o vyvěšení na úřední desce obce:

- MěÚ Lysá nad Labem – k vyvěšení na úřední desce
- Obec Semice – k vyvěšení na úřední desce
- Obec Starý Vestec – k vyvěšení na úřední desce
- Obec Velenka – k vyvěšení na úřední desce

Po nabytí účinnosti OOP obdrží:

- MI ROADS, a.s., IČ: 24218537, v zastoupení na základě plné moci SEDOZ DZ, s.r.o., IČ: 24218537,
- MěÚ Lysá nad Labem – k vyvěšení na úřední desce
- Obec Semice – k vyvěšení na úřední desce
- Obec Starý Vestec – k vyvěšení na úřední desce
- Obec Velenka – k vyvěšení na úřední desce
- Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, územní odbor Nymburk, Boleslavská 1831, 288 02 Nymburk




Firma: Firma

Soupis prací objektu

Stavba: 2020/1070 III/2722 Semice, rekonstrukce_neoceněný
Rozpočet: SO 181 DIO - investice kraje

	Celkem PDPS	Celkem projednané
SO 181	0,00	96 890,00
	Rozdíl	96 890,00

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství PDPS	Množství Projednané DIO	Jednotková cena			
							Jednotková	Celkem PDPS	Celkem projednané	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
9								0,00	96 890,00	
			Ostatní konstrukce a práce							
101.N	916112		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	0,000	7,000	932,00	0,00	6 524,00	OTSKP 2022
102.N	916113		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ	KUS	0,000	7,000	430,00	0,00	3 010,00	OTSKP 2022
103.N	916119		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ	KSDEN	0,000	330,000	108,00	0,00	35 640,00	OTSKP 2022
104.N	916122		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	0,000	4,000	1 400,00	0,00	5 600,00	OTSKP 2022
105.N	916123		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ	KUS	0,000	4,000	714,00	0,00	2 856,00	OTSKP 2022
106.N	916129		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ	KSDEN	0,000	210,000	206,00	0,00	43 260,00	OTSKP 2022



Firma: Firma

Soupis prací objektu**Stavba:** 2020/1070 III/2722 Semice, rekonstrukce_neoceněný
Rozpočet: SO 181 I. etapa, 14.02.2023 - 14.04.2023, 60 dní

SO 181 36 790,00

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství Projednané DIO	Jednotková cena			
						Jednotková	Celkem		
1	2	3	4	5	7	8	9		
9			Ostatní konstrukce a práce					36 790,00	
101.N	916112		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	1,000	932,00	932,00		OTSKP 2022
102.N	916113		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ	KUS	1,000	430,00	430,00		OTSKP 2022
103.N	916119		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ	KSDEN	60,000	108,00	6 480,00		OTSKP 2022
104.N	916122		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	2,000	1 400,00	2 800,00		OTSKP 2022
105.N	916123		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ	KUS	2,000	714,00	1 428,00		OTSKP 2022
106.N	916129		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ	KSDEN	120,000	206,00	24 720,00		OTSKP 2022



Firma: Firma

Soupis prací objektu**Stavba:** 2020/1070 III/2722 Semice, rekonstrukce_neoceněný
Rozpočet: SO 181 II. etapa, 15.04.2023 - 29.05.2023, 45 dní

SO 181 28 990,00

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství Projednané DIO	Jednotková cena			
						Jednotková	Celkem		
1	2	3	4	5	7	8	9		
9			Ostatní konstrukce a práce					28 990,00	
101.N	916112		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	1,000	932,00	932,00		OTSKP 2022
102.N	916113		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ	KUS	1,000	430,00	430,00		OTSKP 2022
103.N	916119		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ	KSDEN	45,000	108,00	4 860,00		OTSKP 2022
104.N	916122		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	2,000	1 400,00	2 800,00		OTSKP 2022
105.N	916123		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ	KUS	2,000	714,00	1 428,00		OTSKP 2022
106.N	916129		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ	KSDEN	90,000	206,00	18 540,00		OTSKP 2022



Firma: Firma

Soupis prací objektu

Stavba: 2020/1070 III/2722 Semice, rekonstrukce_neoceněný

SO 181

12 444,00

Rožpočet: SO 181 III. etapa, 30.05.2023 - 13.07.2023, 45 dní

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství Projednané DIO	Jednotková cena		
						Jednotková	Celkem	
1	2	3	4	5	7	8	9	
9						12 444,00		
Ostatní konstrukce a práce								
101.N	916112		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	2,000	932,00	1 864,00	OTSKP 2022
102.N	916113		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ	KUS	2,000	430,00	860,00	OTSKP 2022
103.N	916119		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ	KSDEN	90,000	108,00	9 720,00	OTSKP 2022



Firma: Firma

Soupis prací objektu**Stavba:** 2020/1070 III/2722 Semice, rekonstrukce_neoceněný
Rozpočet: SO 181 IV. etapa, 14.07.2023 - 11.10.2023, 90 dní

SO 181

18 666,00

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství Projednané DIO	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	7	8	9
9						18 666,00	
			Ostatní konstrukce a práce				
101.N	916112		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	3,000	932,00	2 796,00
102.N	916113		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ	KUS	3,000	430,00	1 290,00
103.N	916119		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ	KSDEN	135,000	108,00	14 580,00

OTSKP 2022

OTSKP 2022

OTSKP 2022





Semice - III/2722 rekonstrukce komunikace

NÁVRH dopravně inženýrského opatření (DIO)

SEDOZ
DOPRAVNÍ ZNAČENÍ


Při umístění dopravního značení musí
být dodrženy podmínky dané
v TP66 - OZNAČENÍ PRACOVNÍCH MÍST
NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH III.VYDÁNÍ,
zák.č.361/2000 Sb. v platném znění
a zák.č. 13/1997 Sb. v platném znění.

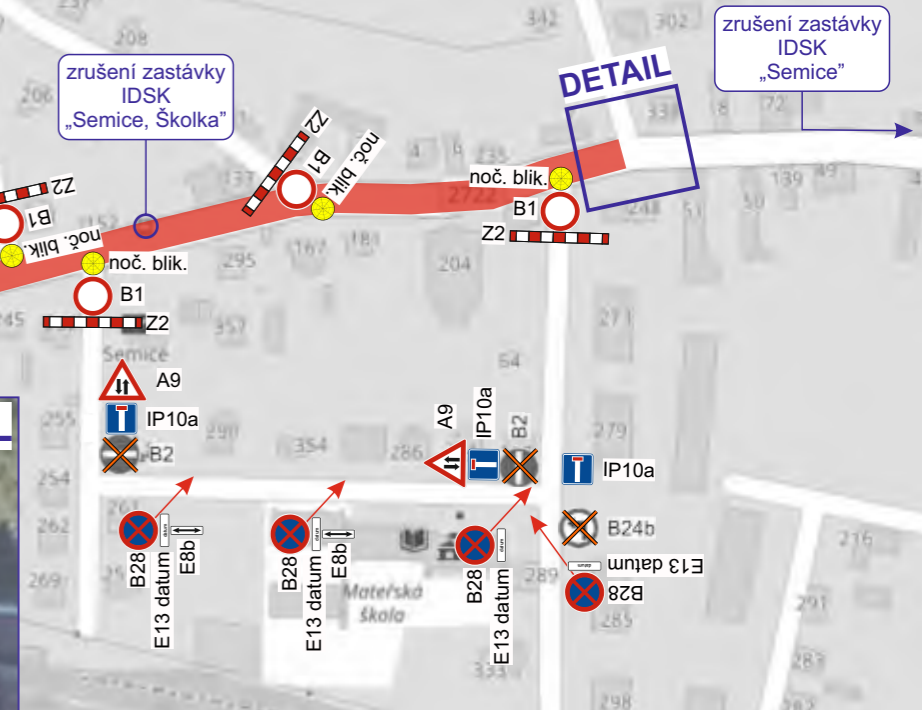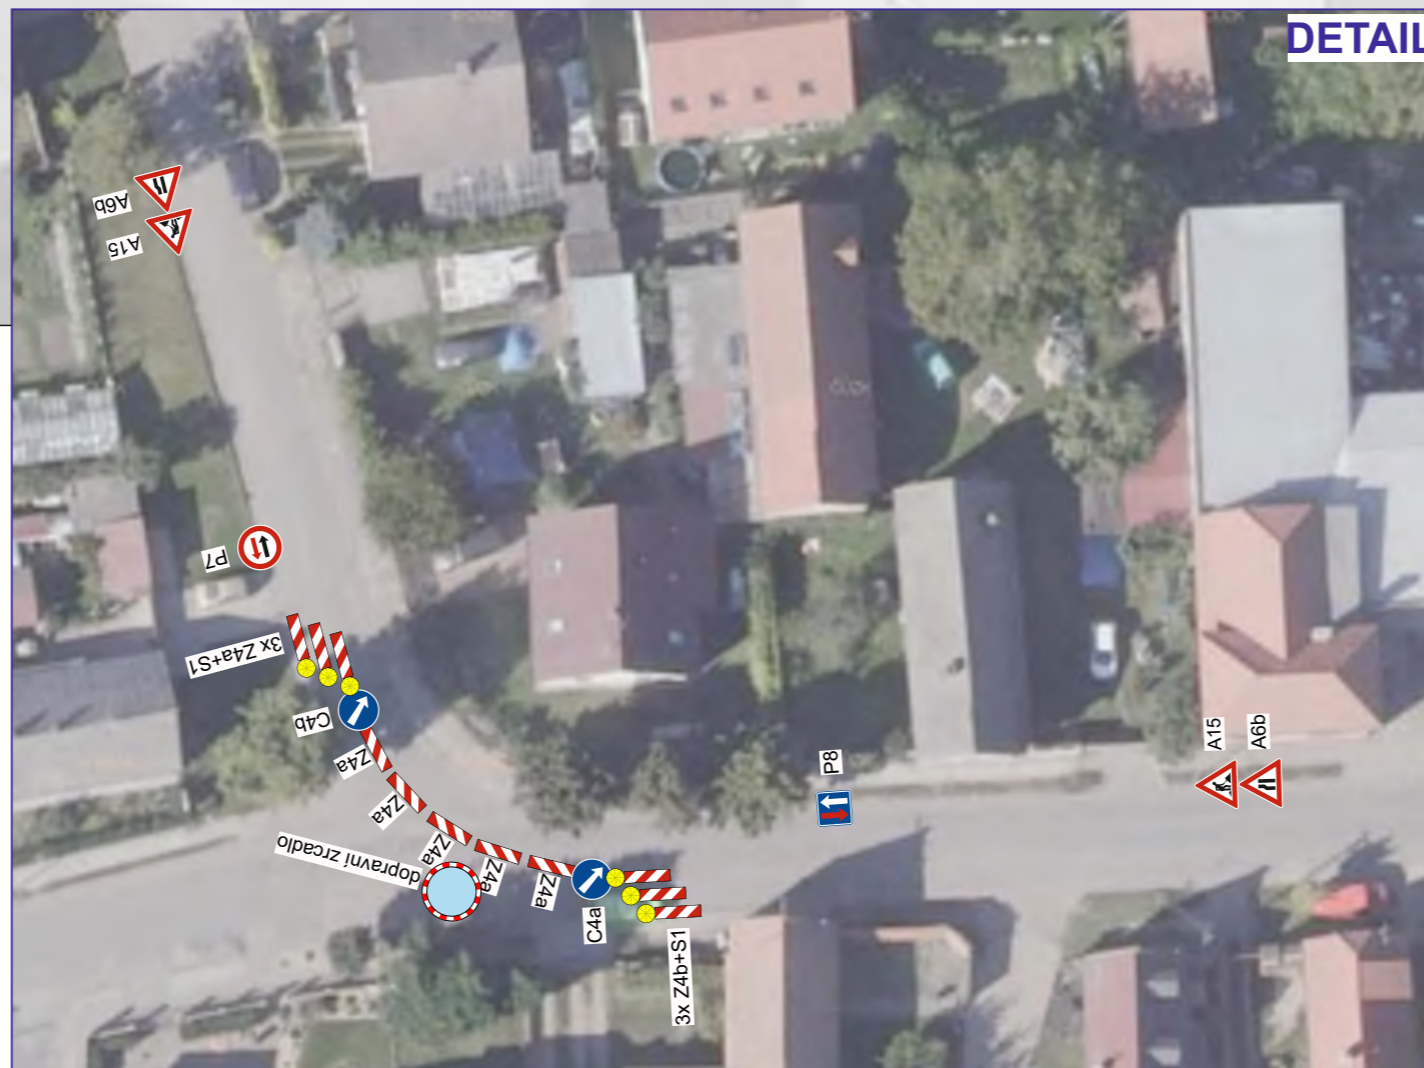


Při umístění dopravního značení musí být dodrženy podmínky dané v TP66 - OZNAČENÍ PRACOVNÍCH MÍST NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH III.VYDÁNÍ, zák.č.361/2000 Sb. v platném znění a zák.č. 13/1997 Sb. v platném znění.



Dopravní značky B28+DT nutno umístit min. 7 dní před začátkem stavby!


razítko DOSS

Zodpovědná osoba: Tomáš Březina	Kontrolovat: Tomáš Březina	Kreslil: Tomáš Vydra	 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
Objednatel: miROADS	Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8		
Akce: Semice - III/2722 rekonstrukce komunikace			Formát: A3
Obsah: Návrh DIO - I. etapa			Měřítka:
			Datum: 01/2023
			Účel: DIR
			Číslo výkresu: 01
			Paré č.:

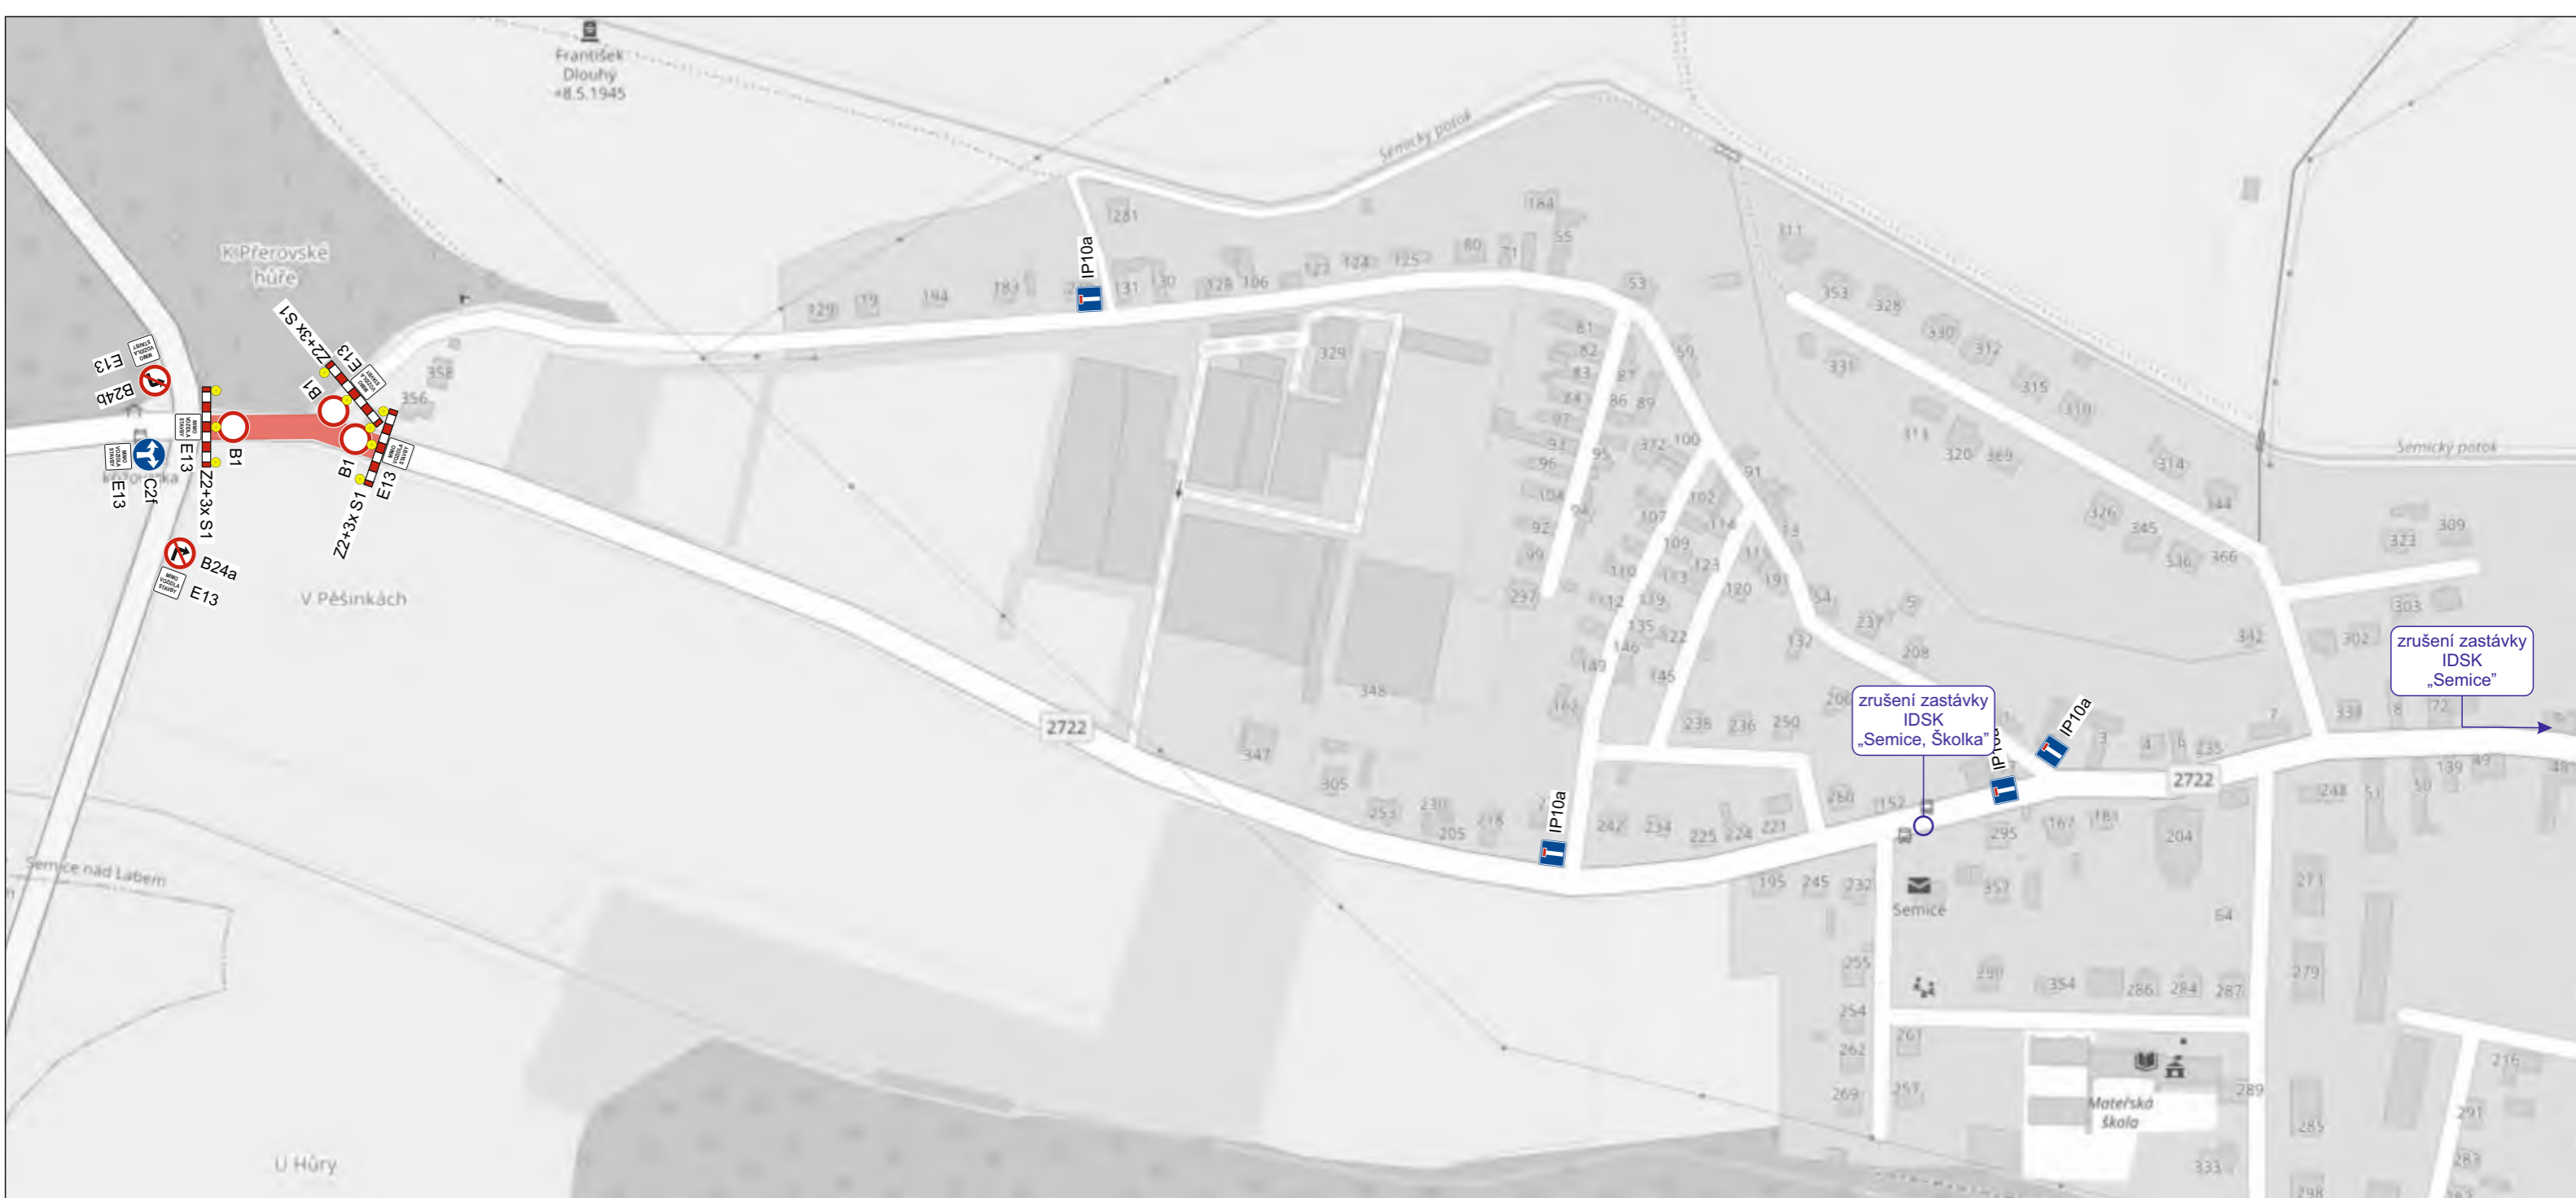


Při umístění dopravního značení musí být dodrženy podmínky dané v TP66 - OZNAČENÍ PRACOVNÍCH MÍST NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH III.VYDÁNÍ, zák.č.361/2000 Sb. v platném znění a zák.č. 13/1997 Sb. v platném znění.

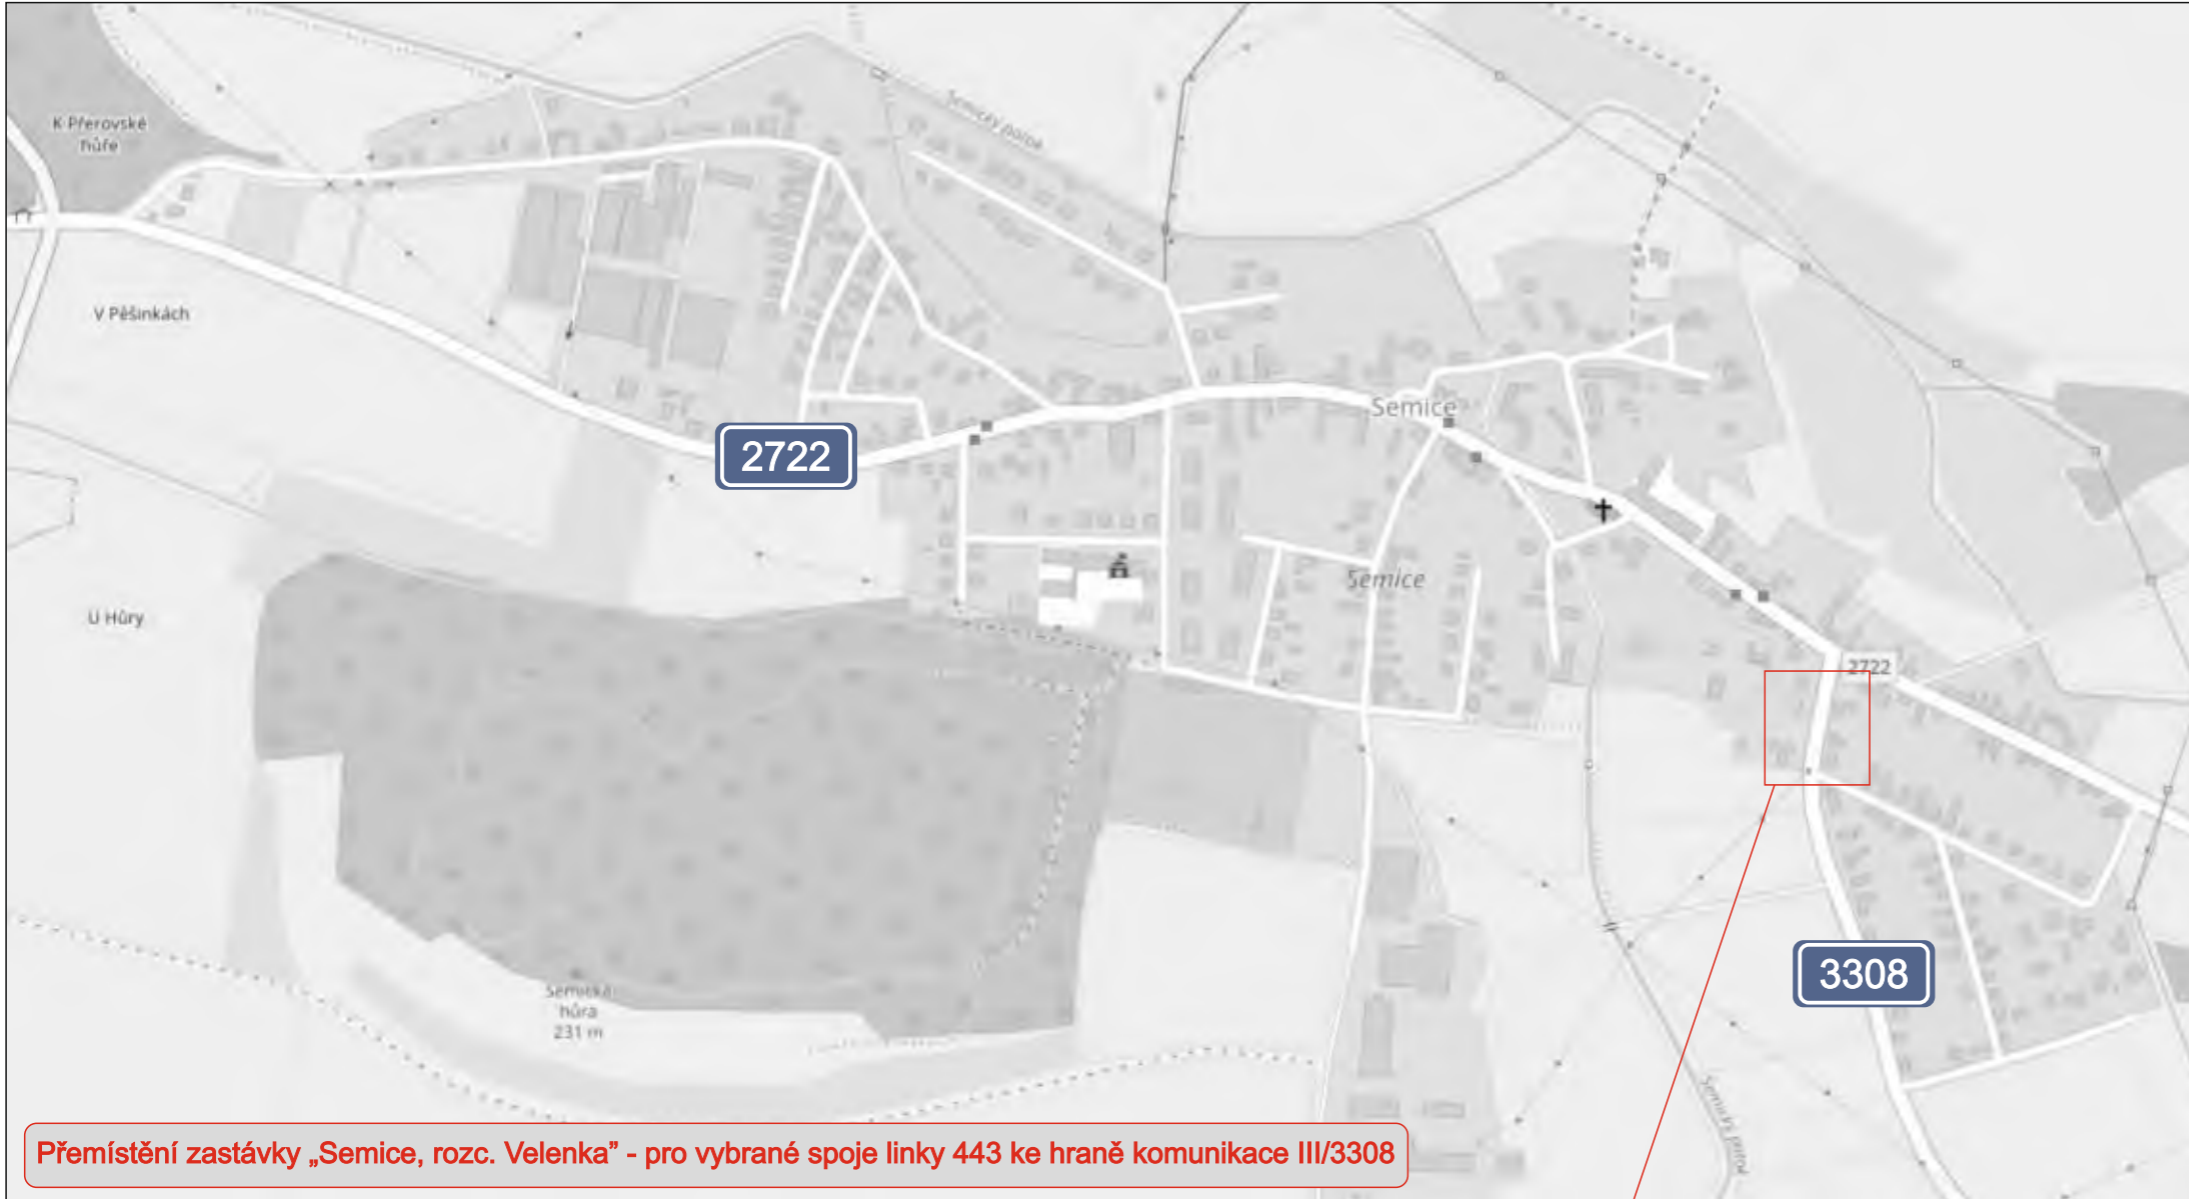

Zodpovědná osoba: Tomáš Březina	Kontrolovat: Tomáš Březina	Kreslil: Tomáš Vydra	 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
Objednatel:  miROADS	Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8		
Akce: Semice - III/2722 rekonstrukce komunikace			Formát: A3
Obsah: Návrh DIO - Ia. etapa			Měřítko:
			Datum: 01/2023
			Účel: DIR
			Číslo výkresu: 02
			Paré č.:

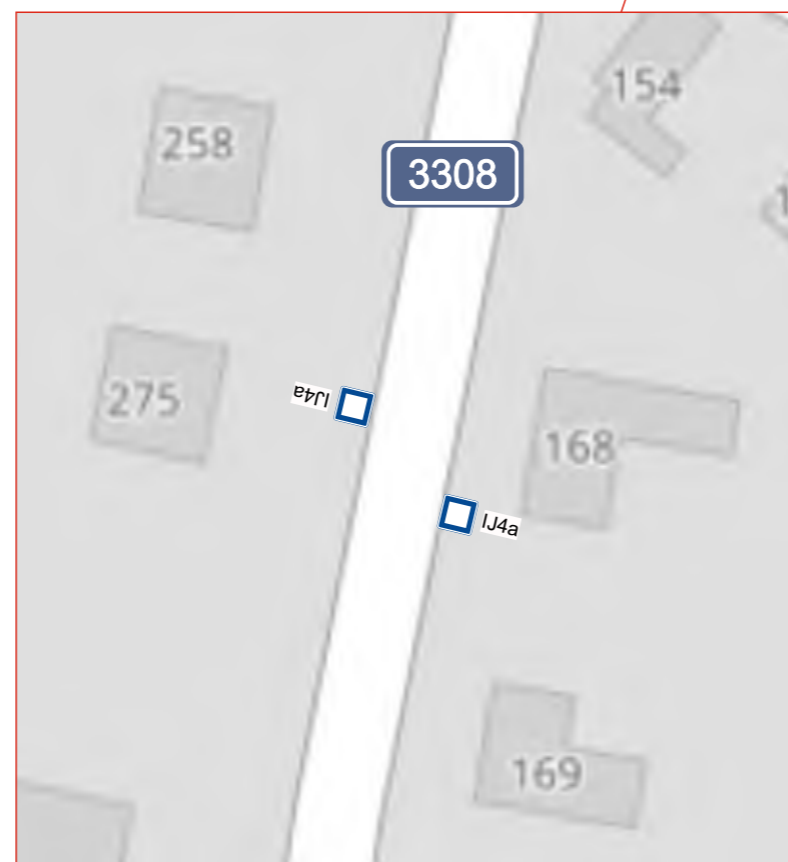

Přemístění zastávky „Semice, rozc. Velenka” - pro vybrané spoje linky 443 ke hraně komunikace III/3308



Při umístění dopravního značení musí být dodrženy podmínky dané v TP66 - OZNAČENÍ PRACOVNÍCH MÍST NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH III.VYDÁNÍ, zák.č.361/2000 Sb. v platném znění a zák.č. 13/1997 Sb. v platném znění.


Zodpovědná osoba: Tomáš Březina	Kontrolovat: Tomáš Březina	Kreslil: Tomáš Vydra	 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
Objednatel:  miROADS	Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8		
Akce: Semice - III/2722 rekonstrukce komunikace			Formát: A3
			Měřítko:
			Datum: 01/2023
			Účel: DIR
Obsah: Návrh DIO - I. + Ia. etapa			Číslo výkresu:
			Paré č.:




Při umístění dopravního značení musí být dodrženy podmínky dané v TP66 - OZNAČENÍ PRACOVNÍCH MÍST NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH III.VYDÁNÍ, zák.č.361/2000 Sb. v platném znění a zák.č. 13/1997 Sb. v platném znění.

razítko DOSS

Zodpovědná osoba: Tomáš Březina	Kontrolovat: Tomáš Březina	Kreslil: Tomáš Vydra	
Objednatel: miROADS	Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8		
Akce: Semice - III/2722 rekonstrukce komunikace			Formát: A3
			Měřítko:
			Datum: 01/2023
			Účel: DIR
Obsah: Návrh DIO - II. etapa			Číslo výkresu: 03
			Paré č.:

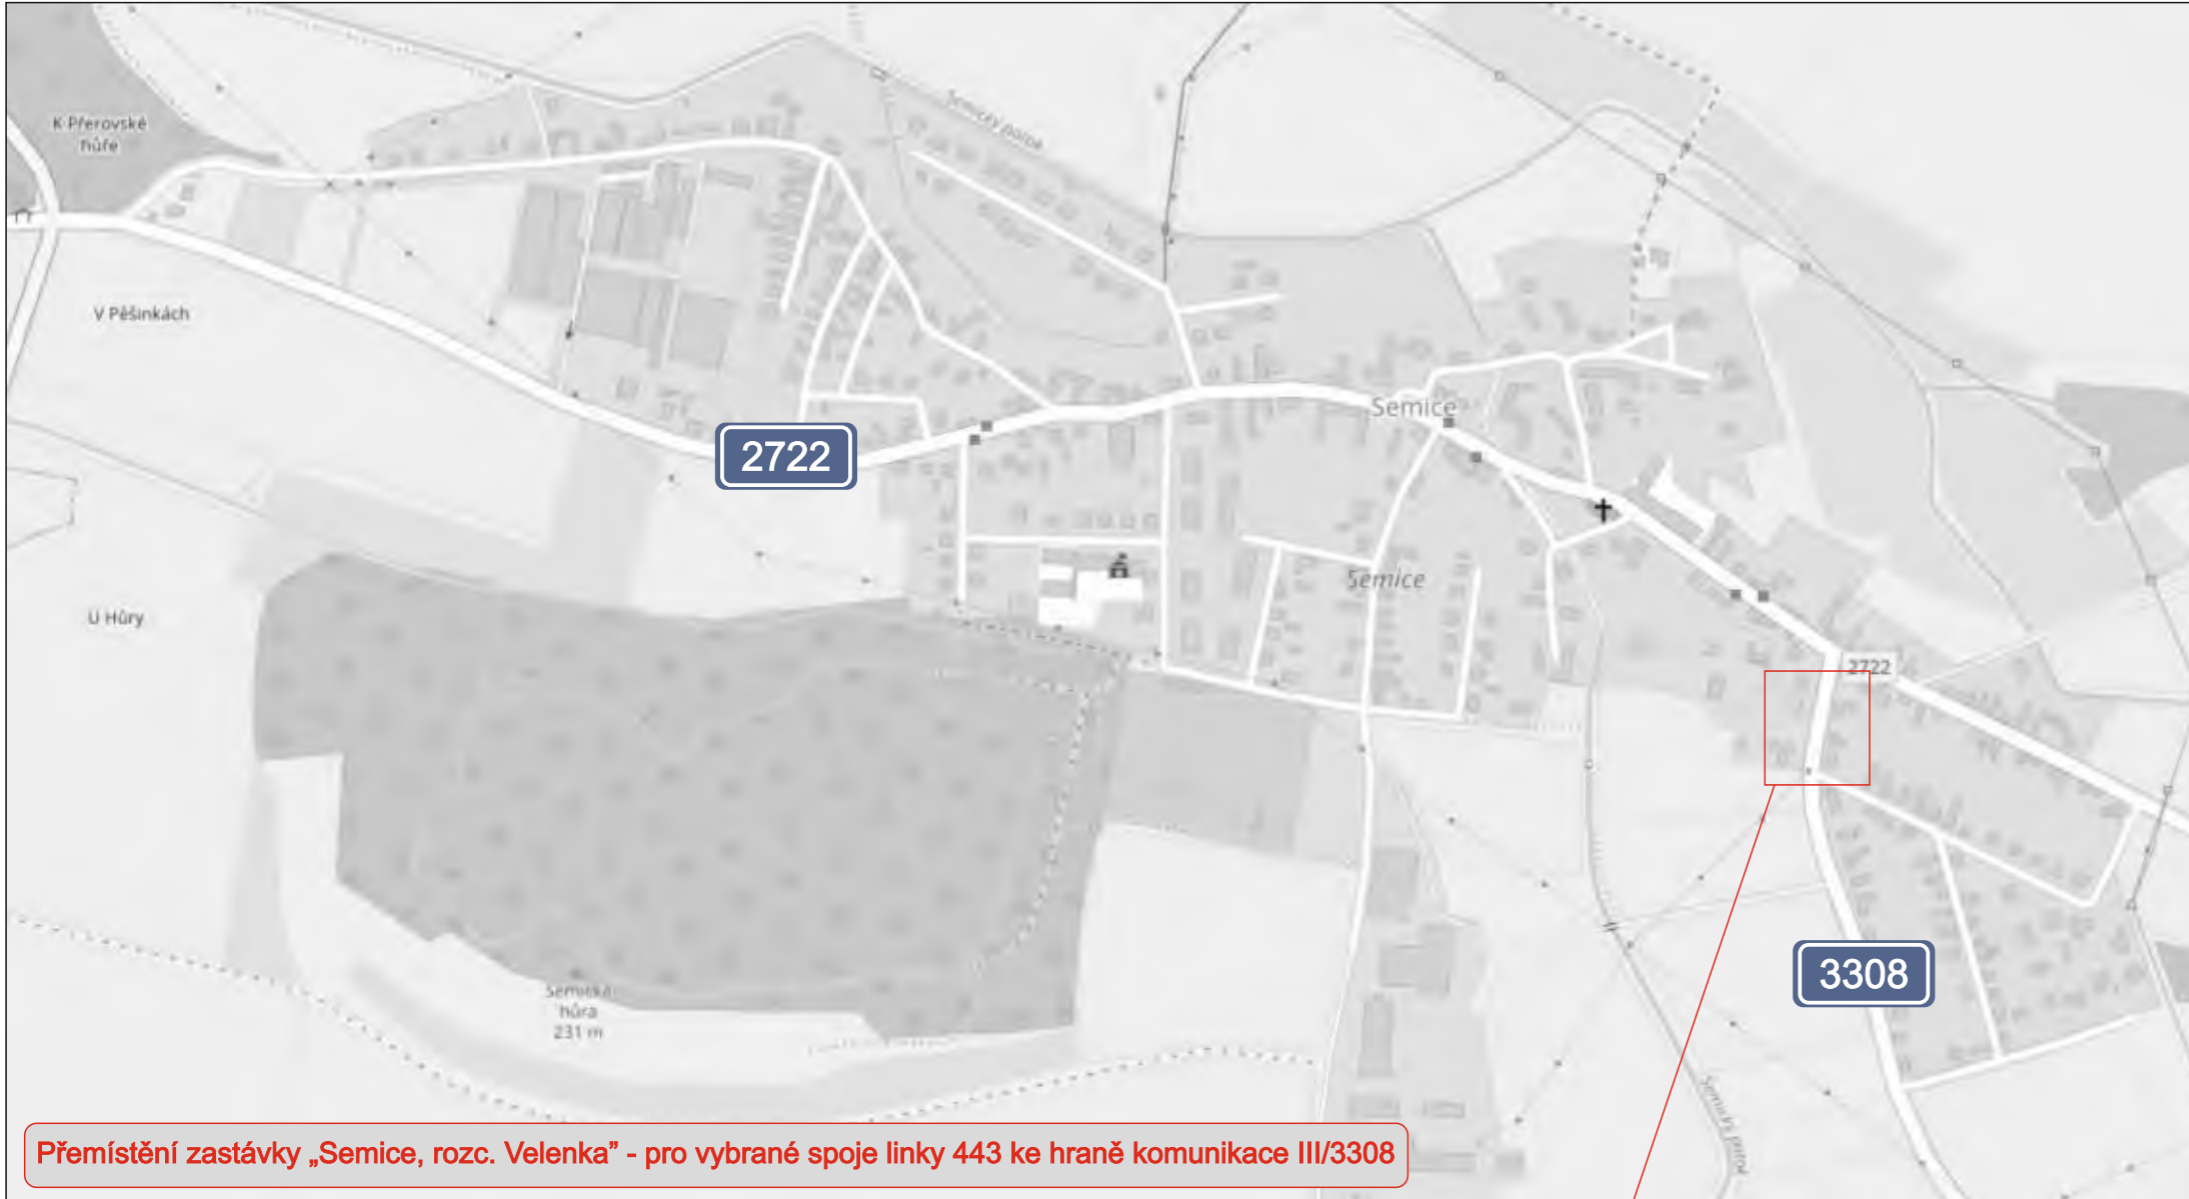

Přemístění zastávky „Semice, rozc. Velenka” - pro vybrané spoje linky 443 ke hraně komunikace III/3308

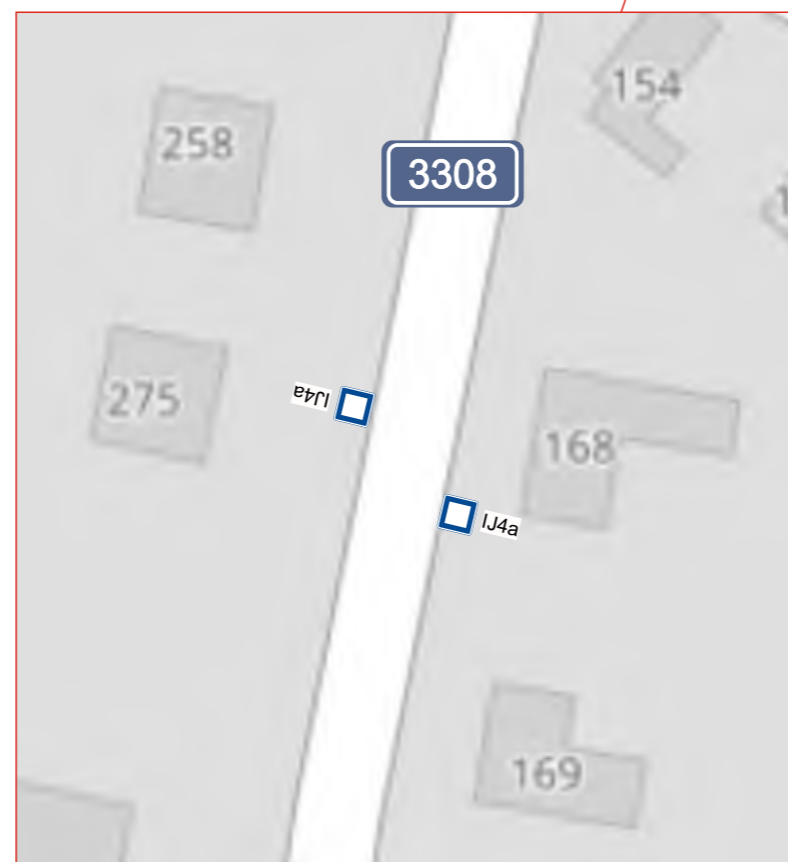

Při umístění dopravního značení musí být dodrženy podmínky dané v TP66 - OZNAČENÍ PRACOVNÍCH MÍST NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH III.VYDÁNÍ, zák.č.361/2000 Sb. v platném znění a zák.č. 13/1997 Sb. v platném znění.

Zodpovědná osoba: Tomáš Březina	Kontrolovat: Tomáš Březina	Kreslil: Tomáš Vydra	
Objednatel: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8			
Akce: Semice - III/2722 rekonstrukce komunikace			Formát: A3
			Měřítko:
			Datum: 01/2023
			Účel: DIR
Obsah: Návrh DIO - II. etapa			Číslo výkresu:
			Paré č.:



Při umístění dopravního značení musí být dodrženy podmínky dané v TP66 - OZNAČENÍ PRACOVNÍCH MÍST NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH III.VYDÁNÍ, zák.č.361/2000 Sb. v platném znění a zák.č. 13/1997 Sb. v platném znění.


razítko DOSS

změny zastávek IDSK:

Ruší se:
 „Hradištko, Kersko, Hrabalova“ – obousměrně pro všechny linky
 „Hradištko, Kersko, U pramene“ – obousměrně pro linku 429
 „Hradištko, Kersko, hl. sil.“ – obousměrně pro linku 429

Zřizuje se:
 „Hradištko, Kersko, U pramene“ – obousměrně pro linku 443 v místech pravidelné zastávky linky 429
 „Hradištko, Kersko, hl. sil.“ – obousměrně pro linku 443 v místech pravidelné zastávky linky 429
 „Velenka“ – obousměrně pro linku 443 v místech pravidelné zastávky linky 398

Zodpovědná osoba: Tomáš Březina	Kontrolovat: Tomáš Březina	Kreslil: Tomáš Vydra	
Objednatel: miROADS	Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8		
Akce: Semice - III/2722 rekonstrukce komunikace			Formát: A3
			Měřítko:
			Datum: 01/2023
			Účel: DIR
Obsah: Návrh DIO - III. etapa			Číslo výkresu: 04
			Paré č.:

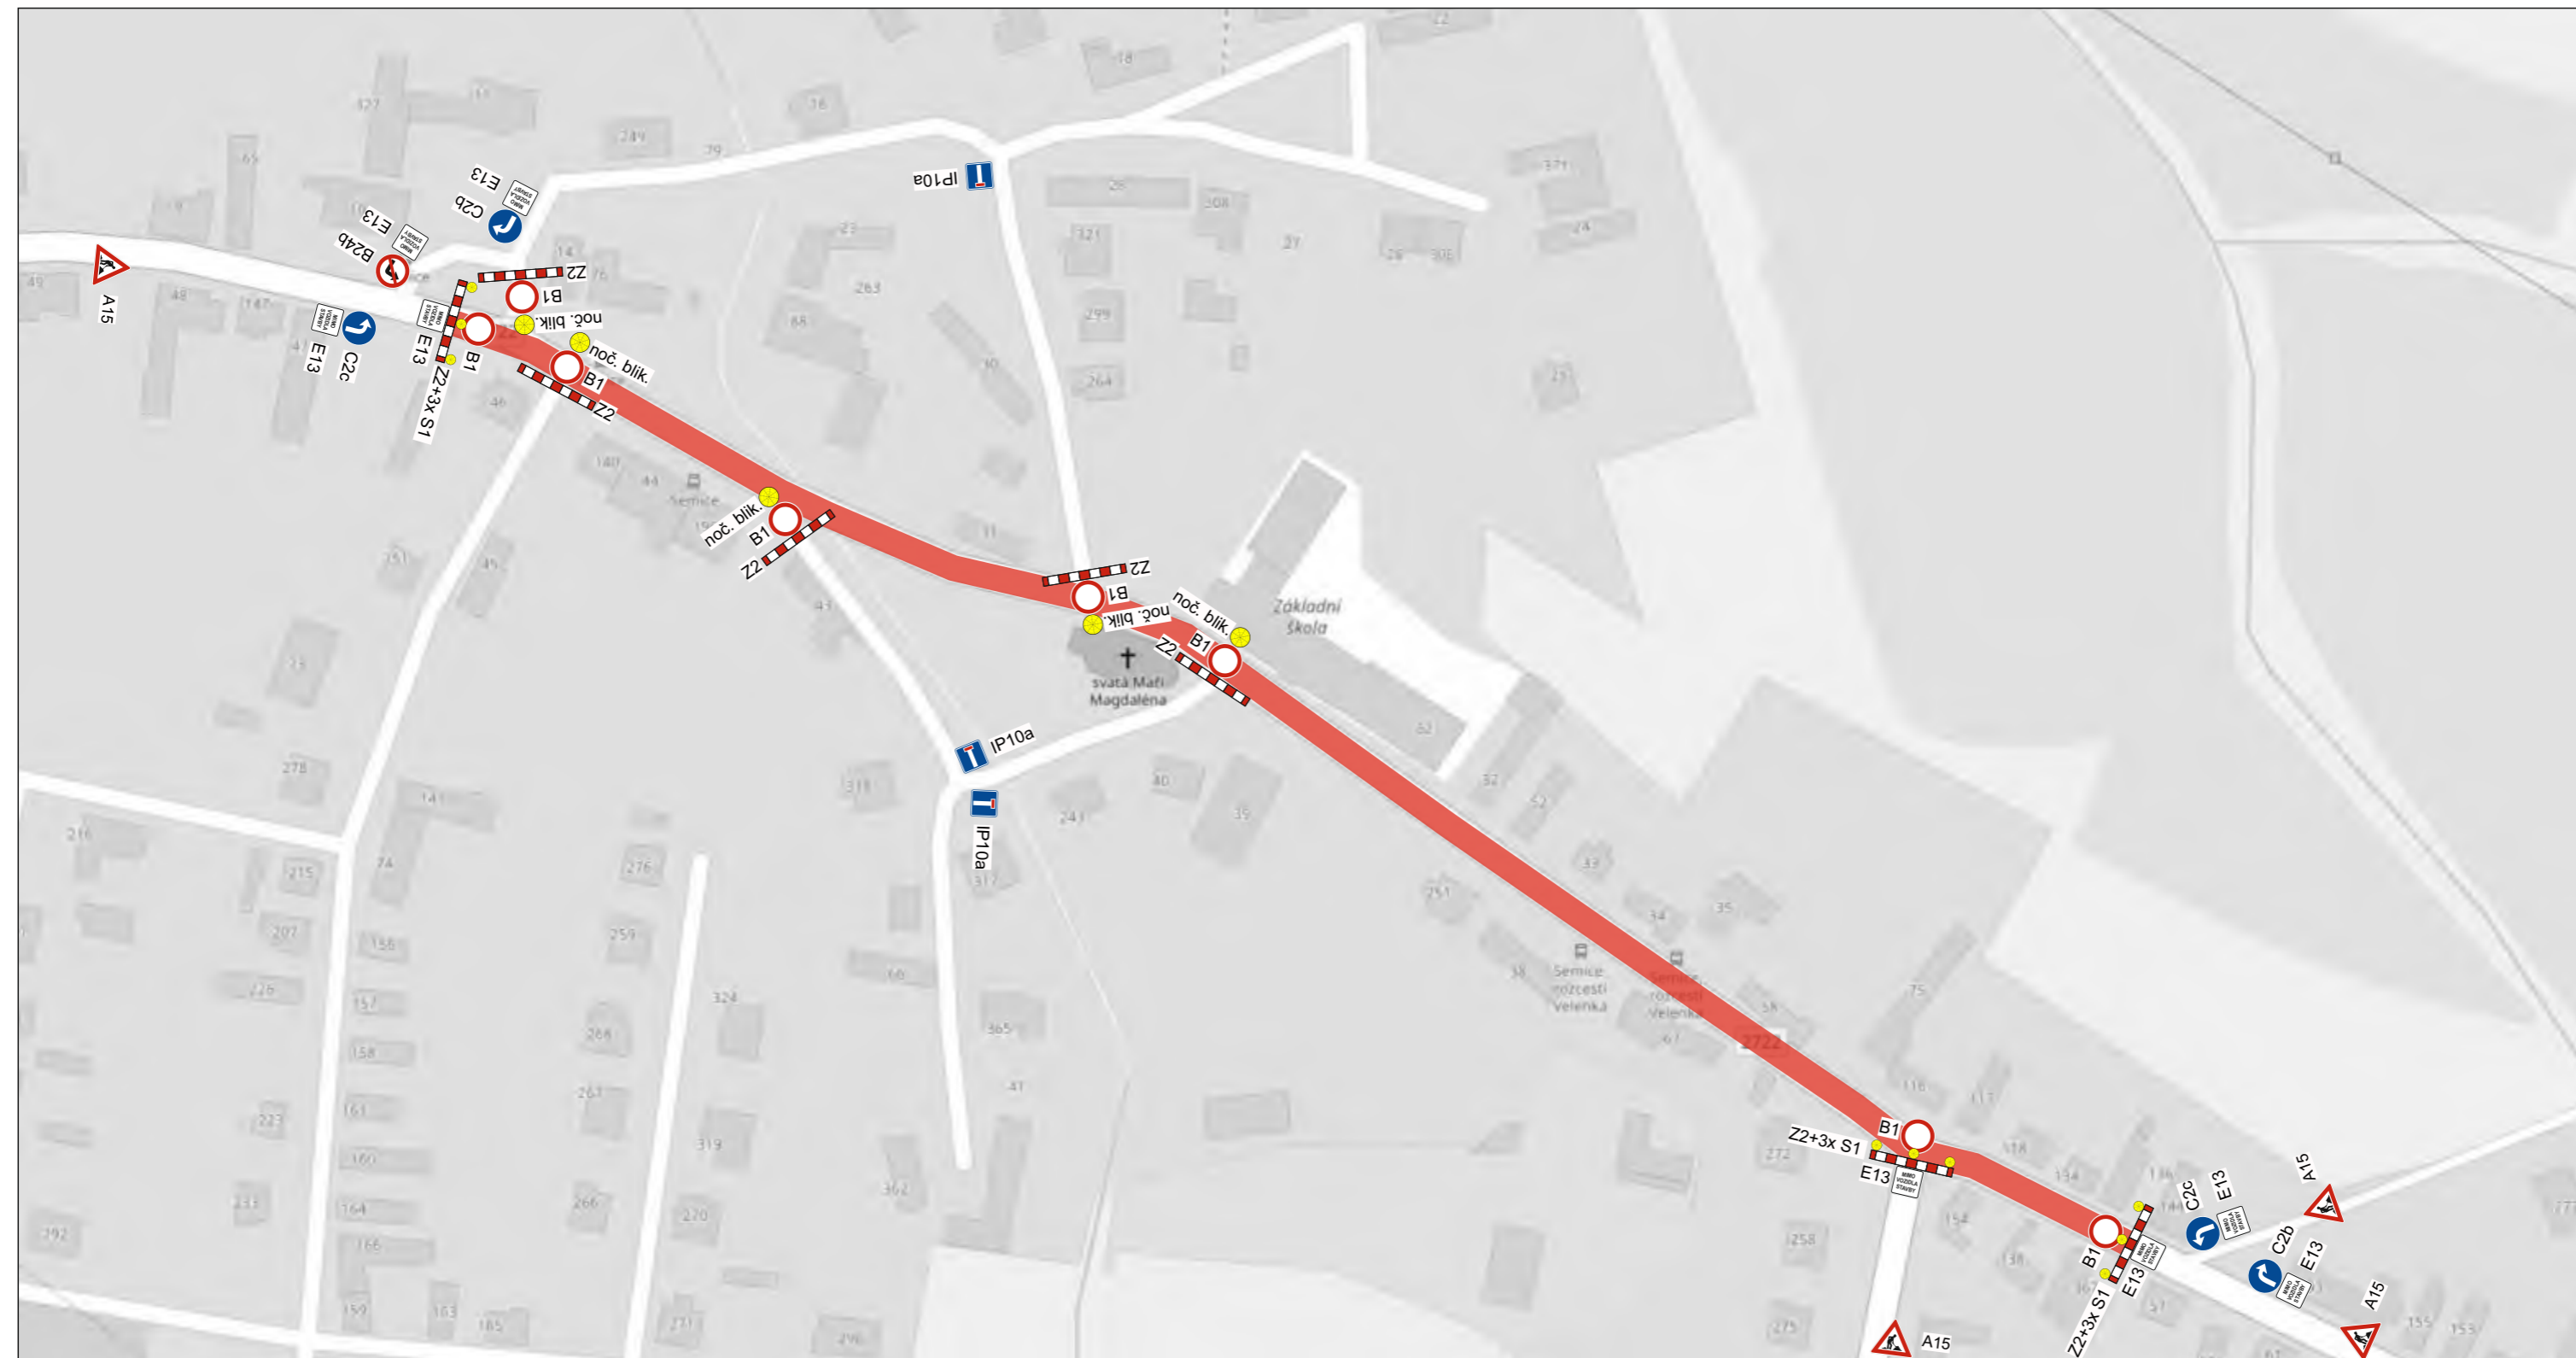

razítko DOSS

změny zastávek IDSK:



Ruší se:
 „Semice, rozc.Velenka“ – obousměrně pro všechny linky
 „Semice“ – obousměrně pro všechny linky
 „Hradištko, Kersko, Hrabalova“ – obousměrně pro všechny linky
 „Hradištko, Kersko, U pramene“ – obousměrně pro linku 429
 „Hradištko, Kersko, hl. sil.“ – obousměrně pro linku 429
 Zřizuje se:
 „Hradištko, Kersko, U pramene“ – obousměrně pro linku 443 v místech pravidelné zastávky linky 429
 „Hradištko, Kersko, hl. sil.“ – obousměrně pro linku 443 v místech pravidelné zastávky linky 429
 „Velenka“ – obousměrně pro linku 443 v místech pravidelné zastávky linky 429

Při umístění dopravního značení musí být dodrženy podmínky dané v TP66 - OZNAČENÍ PRACOVNÍCH MÍST NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH III.VYDÁNÍ, zák.č.361/2000 Sb. v platném znění a zák.č. 13/1997 Sb. v platném znění.

Zodpovědná osoba: Tomáš Březina	Kontrolovat: Tomáš Březina	Kreslil: Tomáš Vydra	
Objednatel: miROADS	Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8		
Akce: Semice - III/2722 rekonstrukce komunikace			Formát: A3
Obsah: Návrh DIO - IV. etapa			Měřítko:
			Datum: 01/2023
			Účel: DIR
			Číslo výkresu: 05
			Paré č.:



IP22 - PRŮTAH OBCÍ SEMICE UZAVŘEN

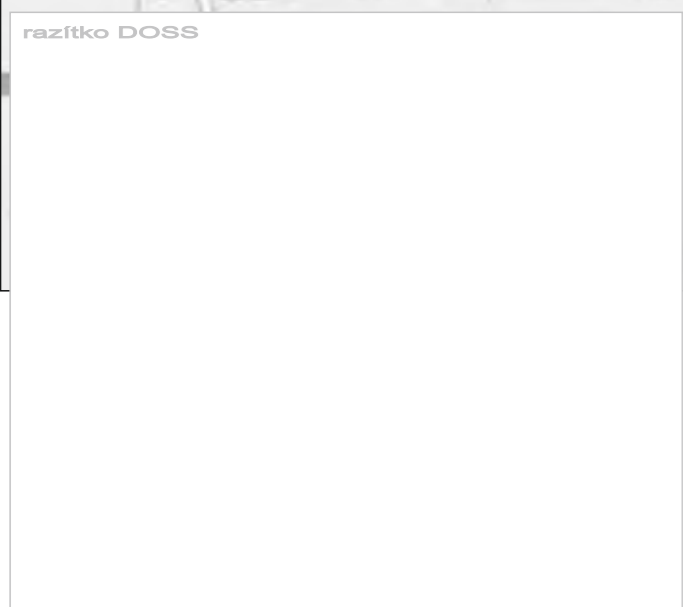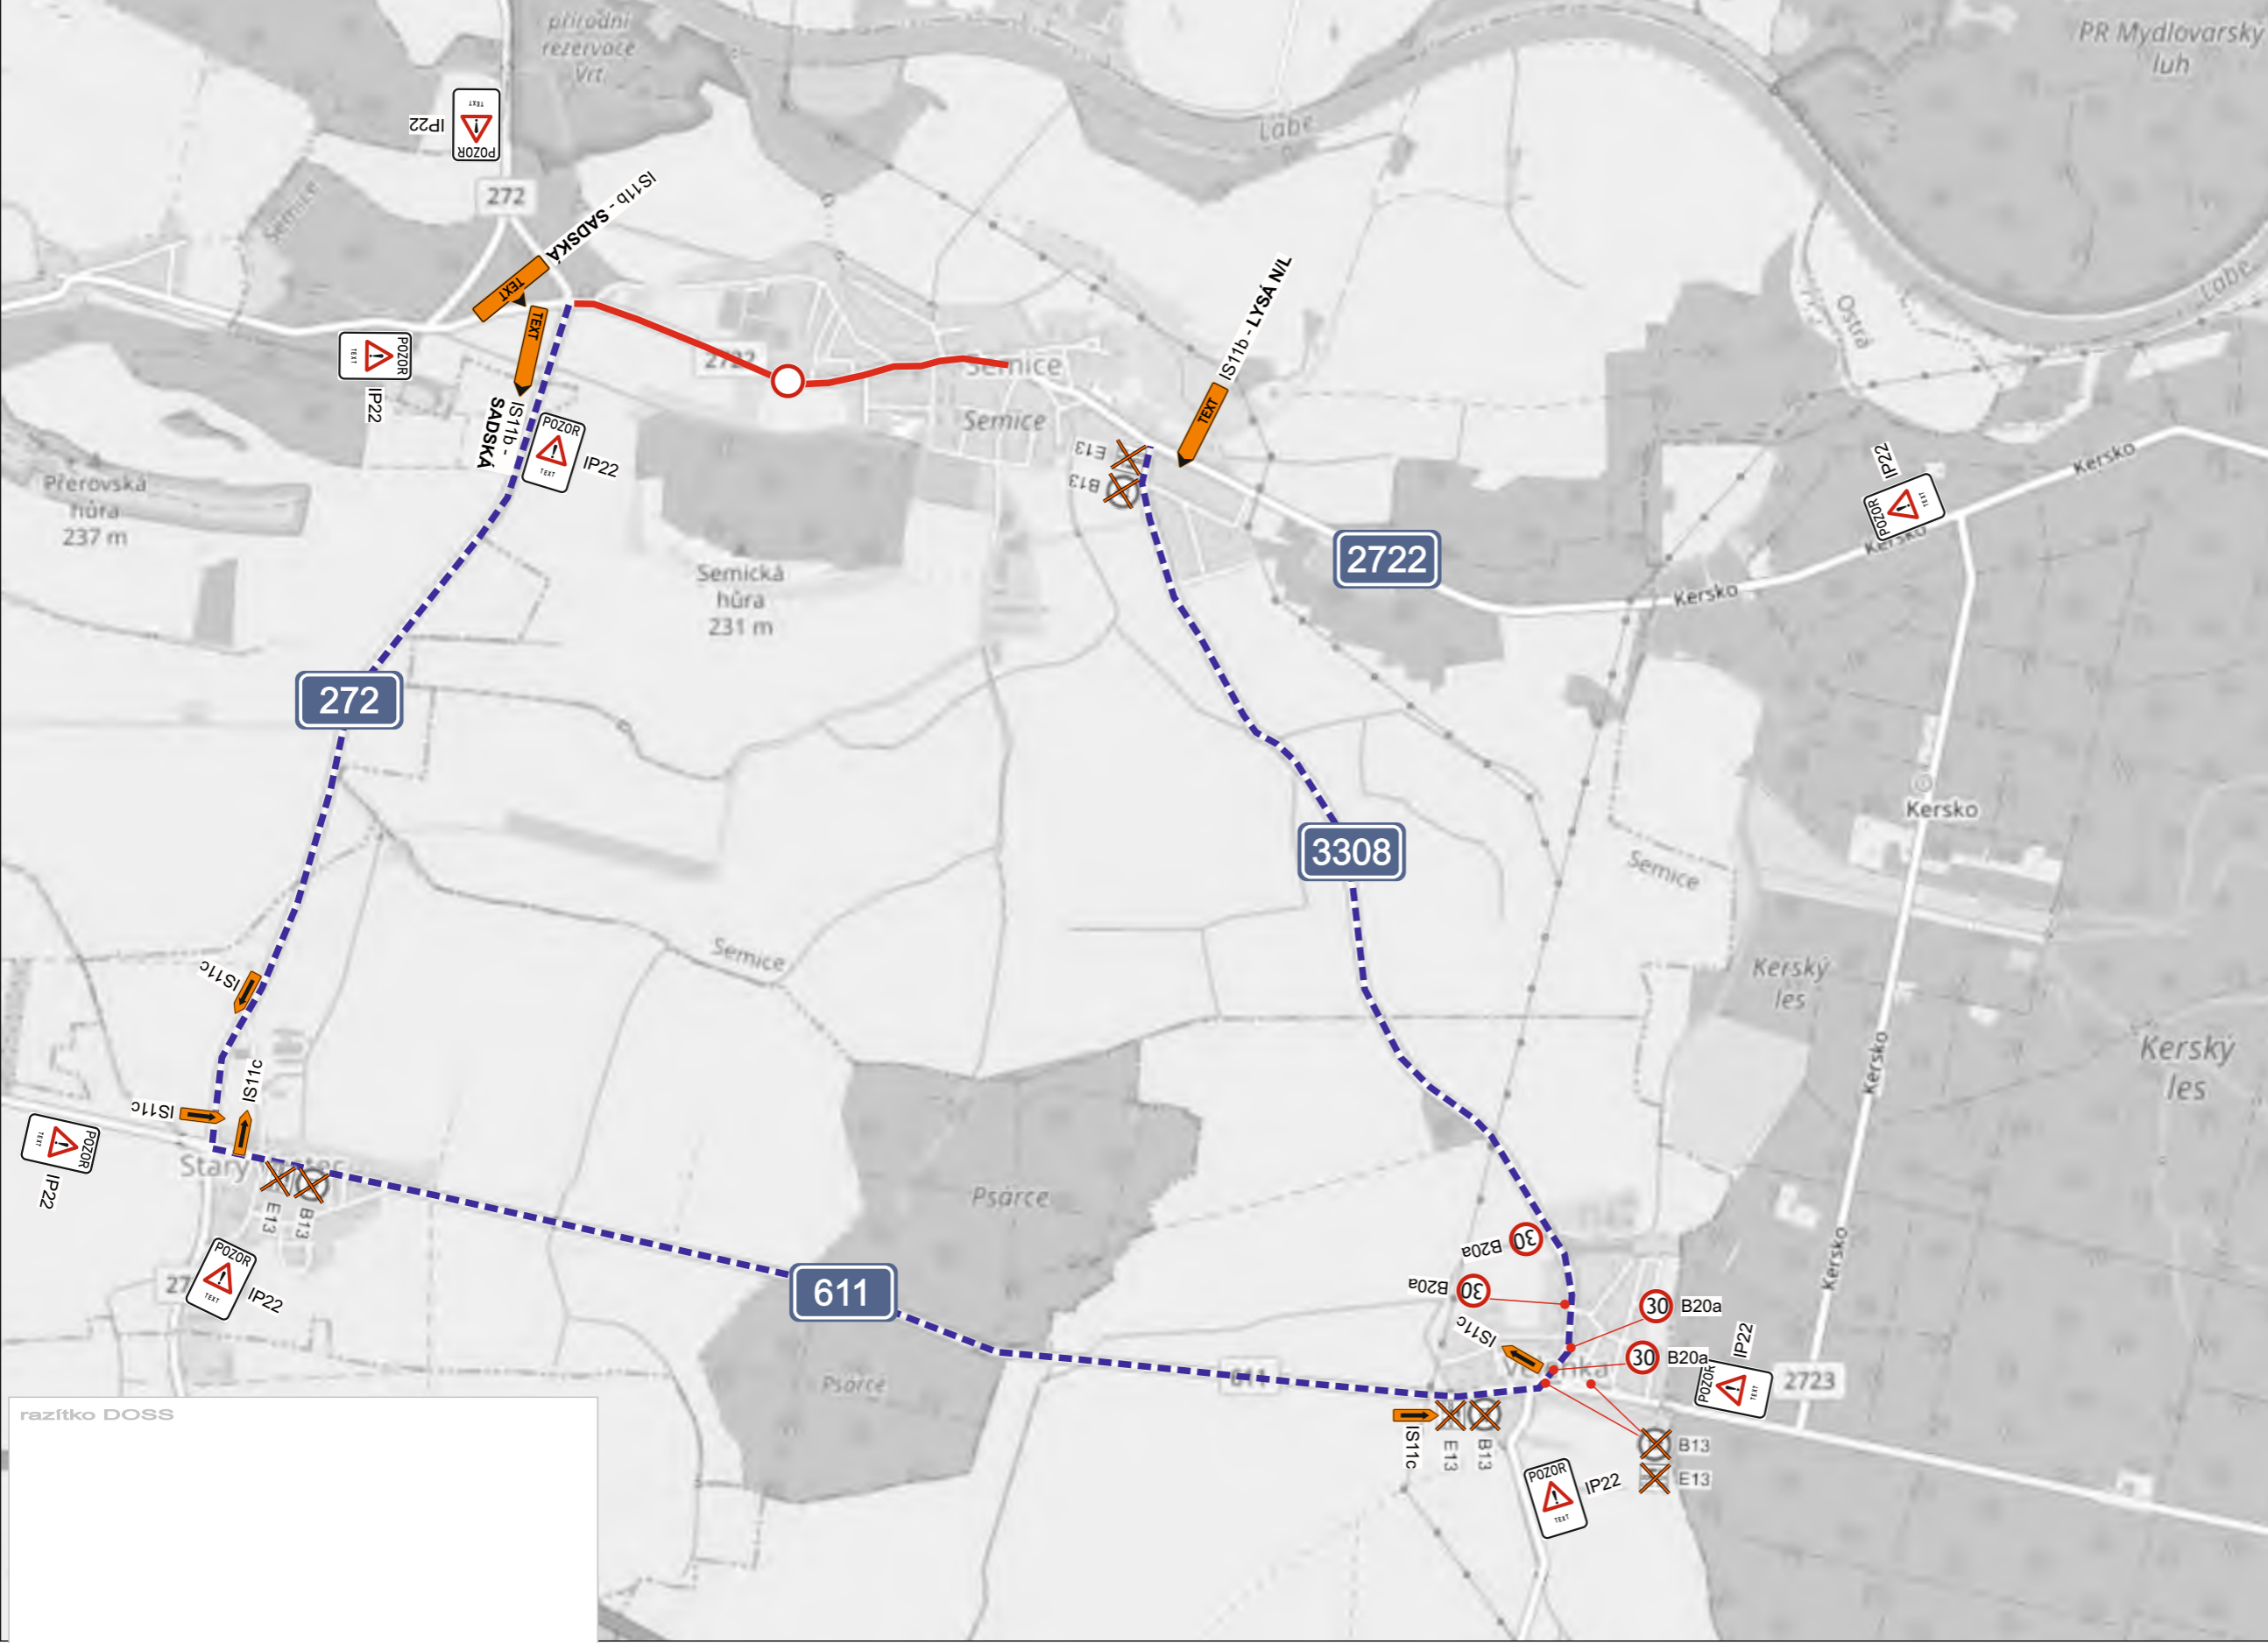


Při umístění dopravního značení musí být dodrženy podmínky dané v TP66 - OZNAČENÍ PRACOVNÍCH MÍST NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH III.VYDÁNÍ, zák.č.361/2000 Sb. v platném znění a zák.č. 13/1997 Sb. v platném znění.

Zodpovědná osoba: Tomáš Březina	Kontroloval: Tomáš Březina	Kreslil: Tomáš Vydra	SEDOZ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
Objednatel: míROADS	Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8		
Akce: Semice - III/2722 rekonstrukce komunikace			Formát: A3
			Měřítko: 01/2023
			Účel: DIR
Obsah: Návrh DIO - OBJÍZDNÁ TRASA (pro etapu I., Ia., II.)			Číslo výkresu: 06
			Paré č.:



IP22 - PRŮTAH OBCÍ SEMICE UZAVŘEN

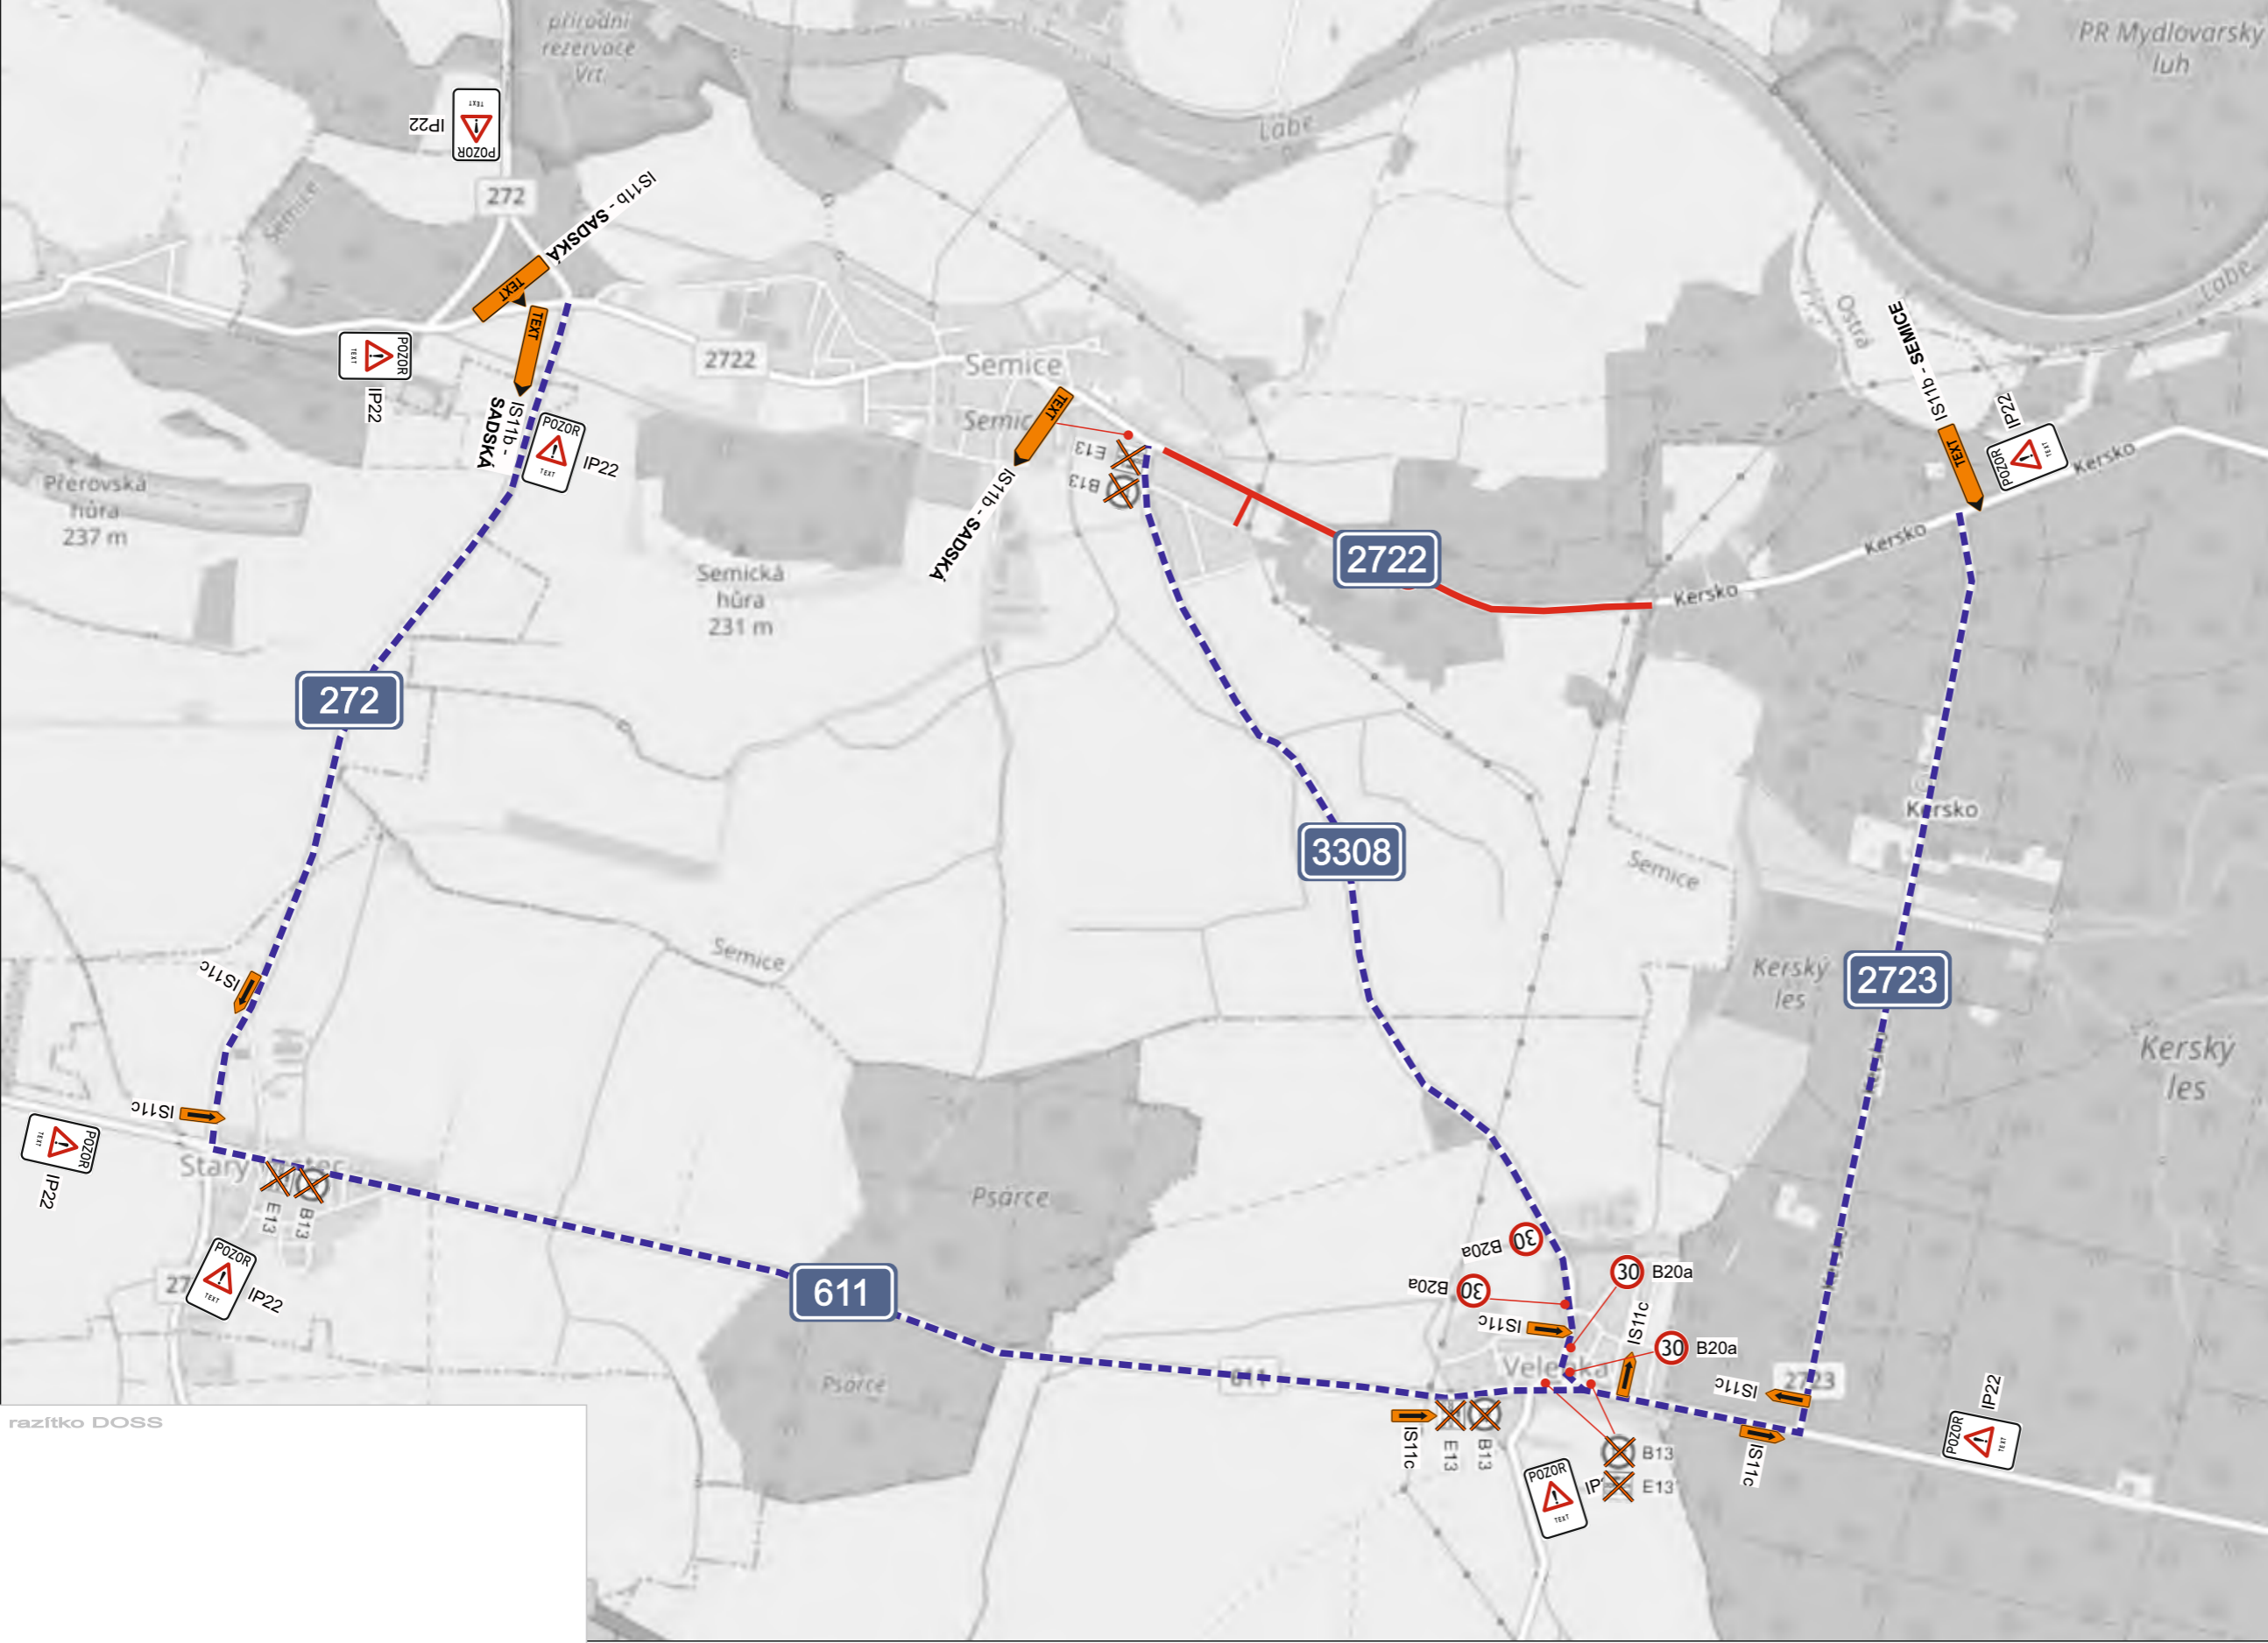


razítko DOSS

Při umístění dopravního značení musí být dodrženy podmínky dané v TP66 - OZNAČENÍ PRACOVNÍCH MÍST NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH III.VYDÁNÍ, zák.č.361/2000 Sb. v platném znění a zák.č. 13/1997 Sb. v platném znění.

Zodpovědná osoba: Tomáš Březina	Kontroloval: Tomáš Březina	Kreslil: Tomáš Vydra	SEDOZ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
Objednatel: mirROADS Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8			
Akce: Semice - III/2722 rekonstrukce komunikace			Formát: A3
			Měřítko:
			Datum: 01/2023
			Účel: DIR
Obsah: Návrh DIO - OBJÍZDNÁ TRASA (pro etapu III.)			Číslo výkresu: 07
			Paré č.:




IP22 - PRŮTAH OBCÍ SEMICE UZAVŘEN

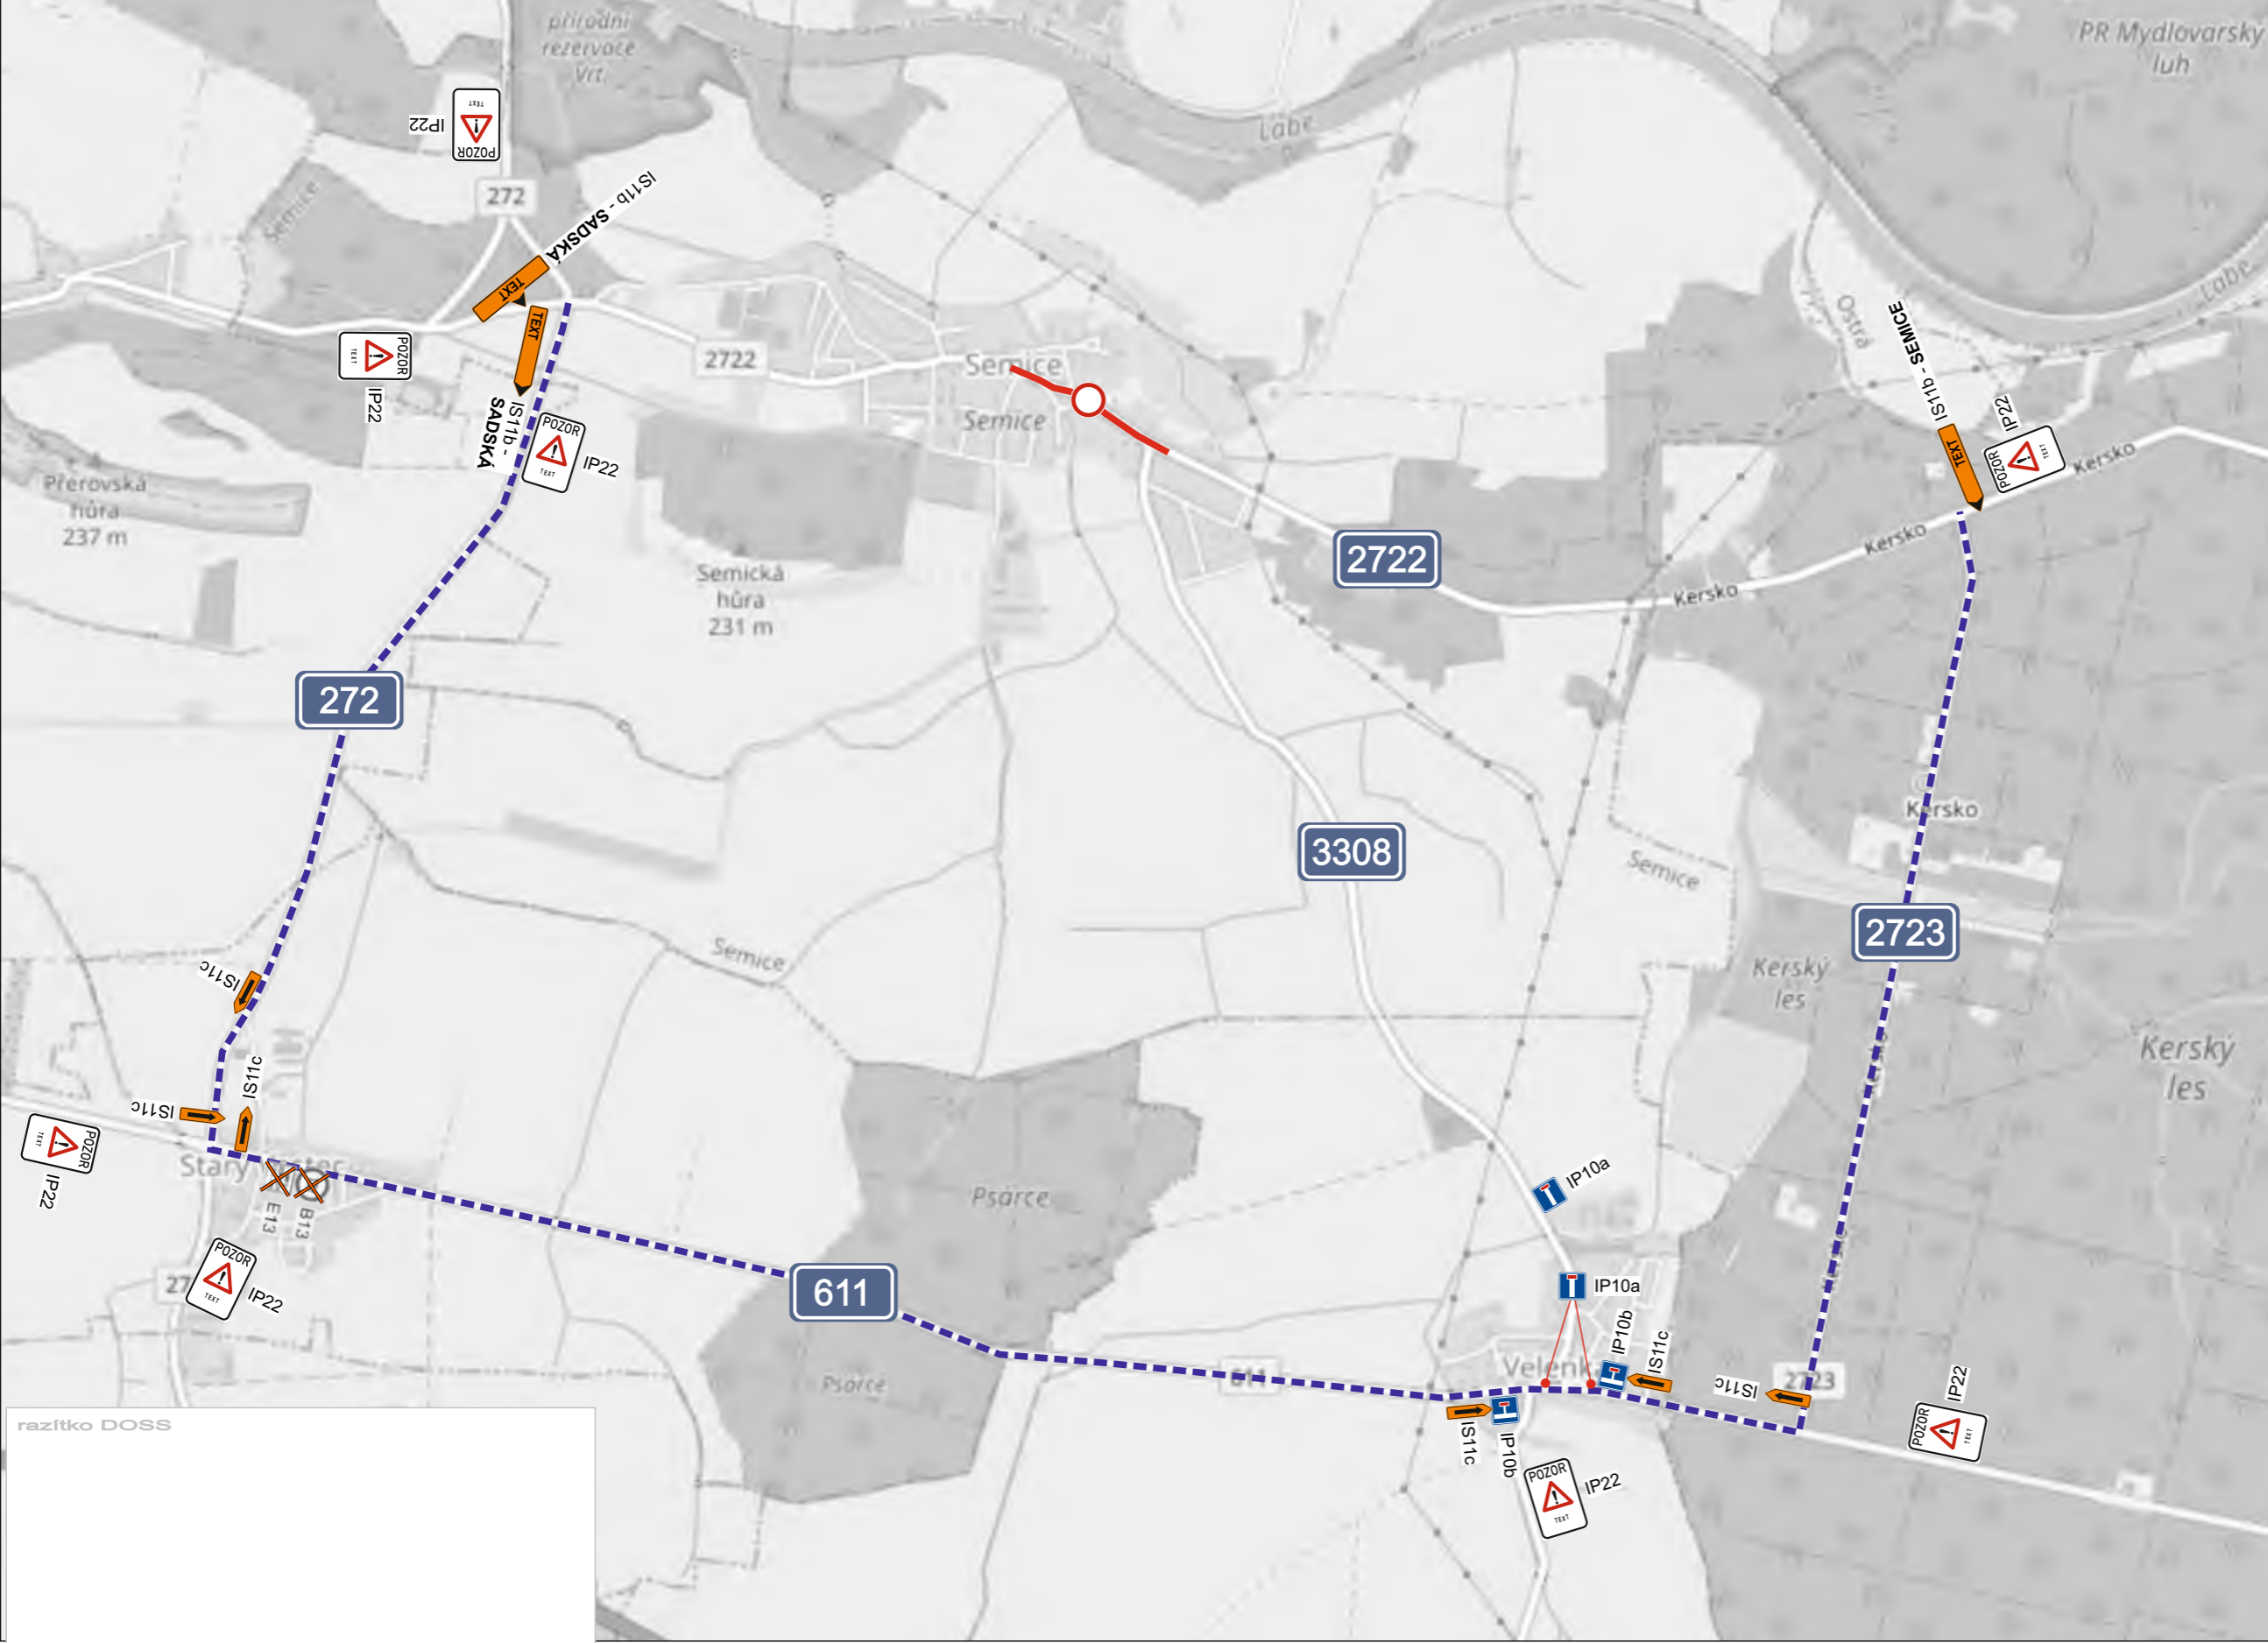

Při umístění dopravního značení musí být dodrženy podmínky dané v TP66 - OZNAČENÍ PRACOVNÍCH MÍST NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH III.VYDÁNÍ, zák.č.361/2000 Sb. v platném znění a zák.č. 13/1997 Sb. v platném znění.

Zodpovědná osoba: Tomáš Březina	Kontroloval: Tomáš Březina	Kreslil: Tomáš Vydra	SEDOZ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
Objednatel: míroads Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8			
Akce: Semice - III/2722 rekonstrukce komunikace			Formát: A3
			Měřítko:
			Datum: 01/2023
			Účel: DIR
Obsah: Návrh DIO - OBJÍZDNÁ TRASA (pro etapu IV.)			Číslo výkresu: 08
			Paré č.:

UMÍSTIT PO CELOU DOBU STAVBY!

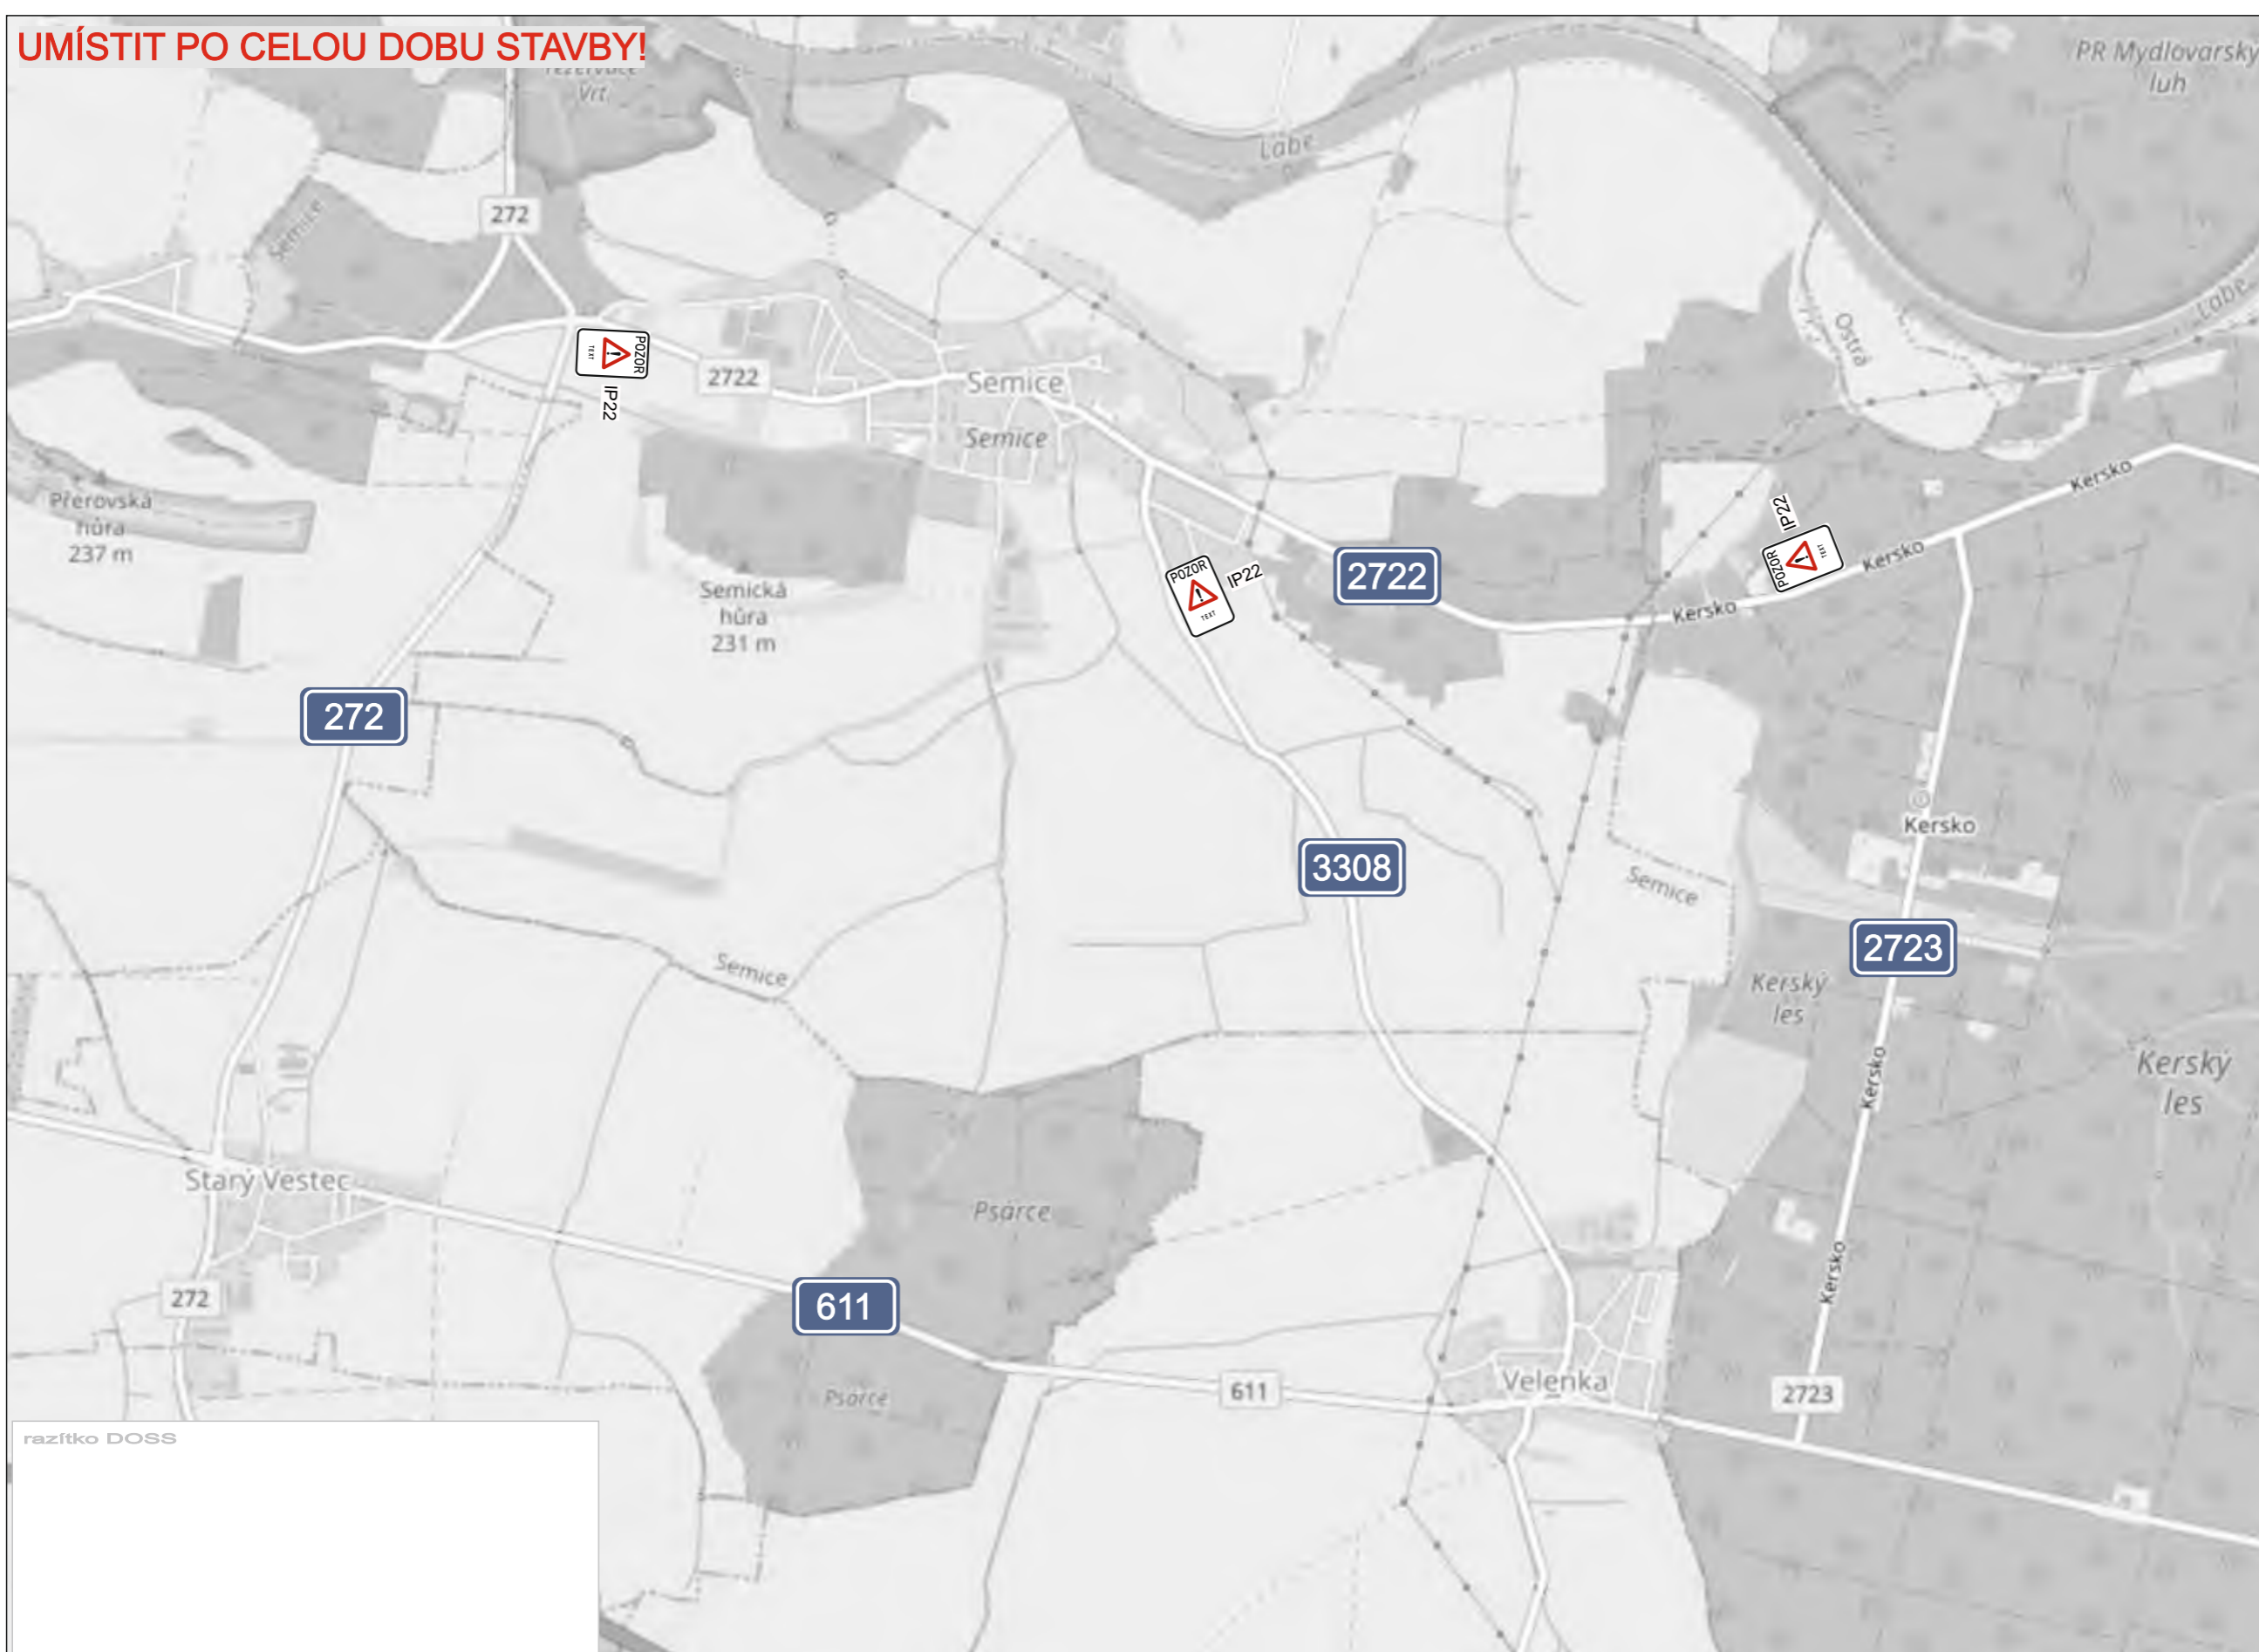


IP22 - PROJÍŽDÍTE STAVBOU

razítko DOSS


Při umístění dopravního značení musí být dodrženy podmínky dané v TP66 - OZNAČENÍ PRACOVNÍCH MÍST NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH III.VYDÁNÍ, zák.č.361/2000 Sb. v platném znění a zák.č. 13/1997 Sb. v platném znění.

Zodpovědná osoba: Tomáš Březina	Kontroloval: Tomáš Březina	Kreslil: Tomáš Vydra	SEDOZ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
Objednatel: míROADS	Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8		
Akce: Semice - III/2722 rekonstrukce komunikace			Formát: A3
Obsah: Návrh DIO - IP22			Měřitko:
			Datum: 01/2023
			Účel: DIR
			Číslo výkresu: 09
			Paré č.:

Semice - situace příjezdových tras k dotčeným nemovitostem při rekonstrukci kom. III/2722

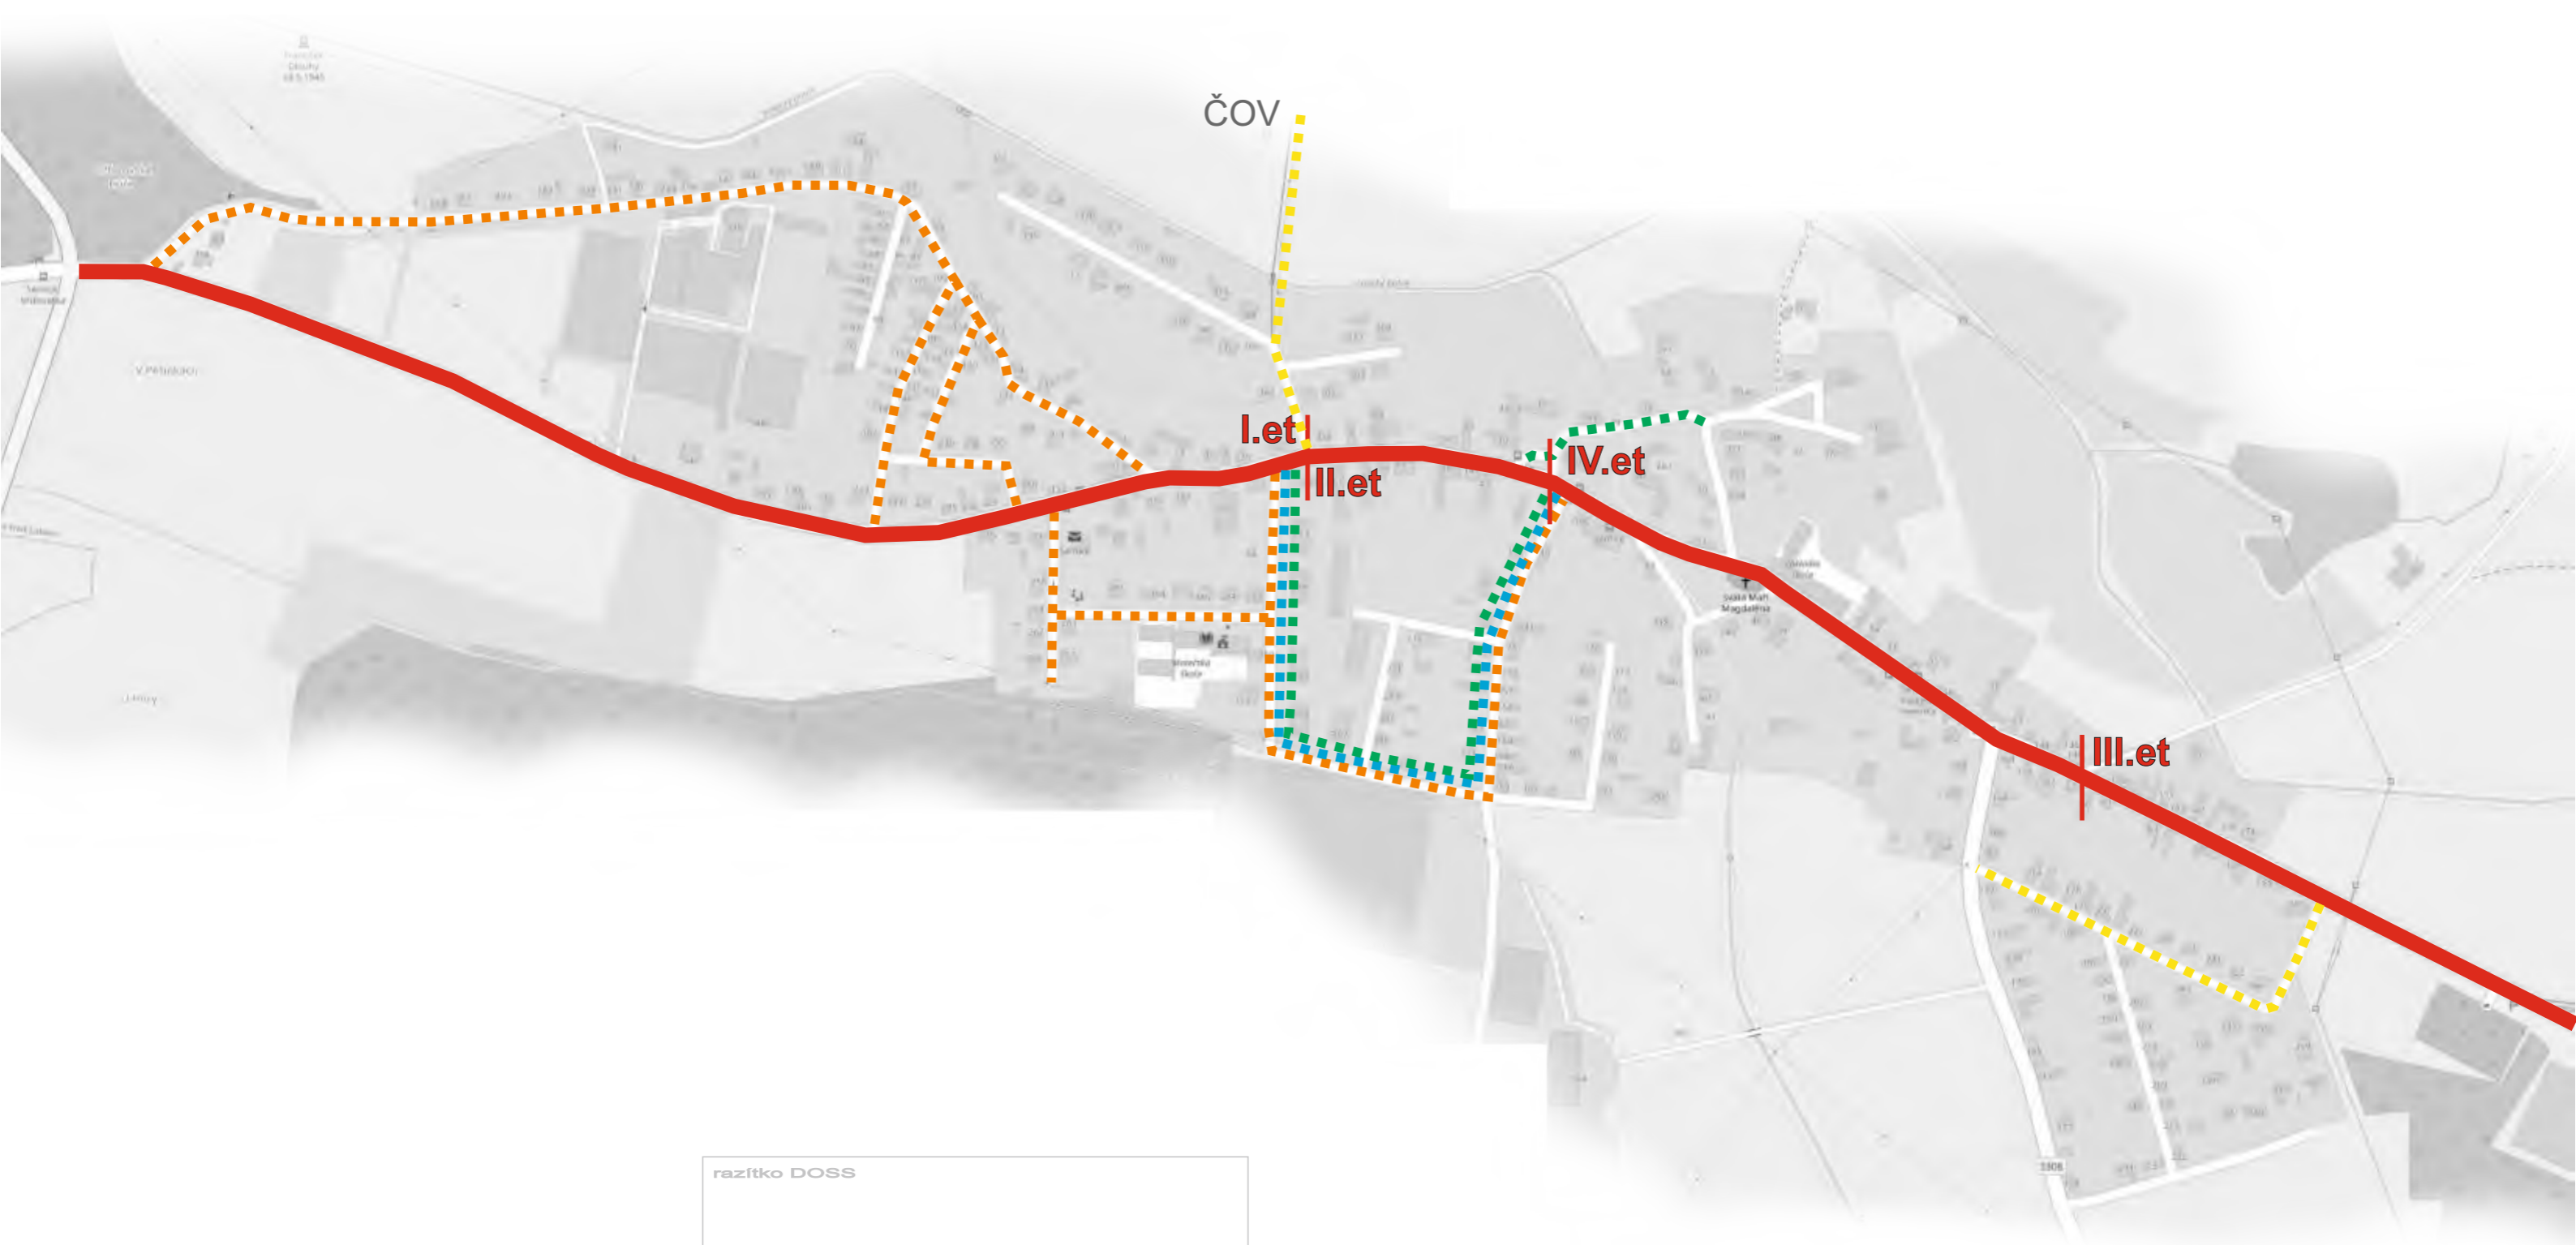

- ■ ■ ■ ■ I. etapa
- ■ ■ ■ ■ II. etapa
- ■ ■ ■ ■ III. etapa
- ■ ■ ■ ■ IV. etapa

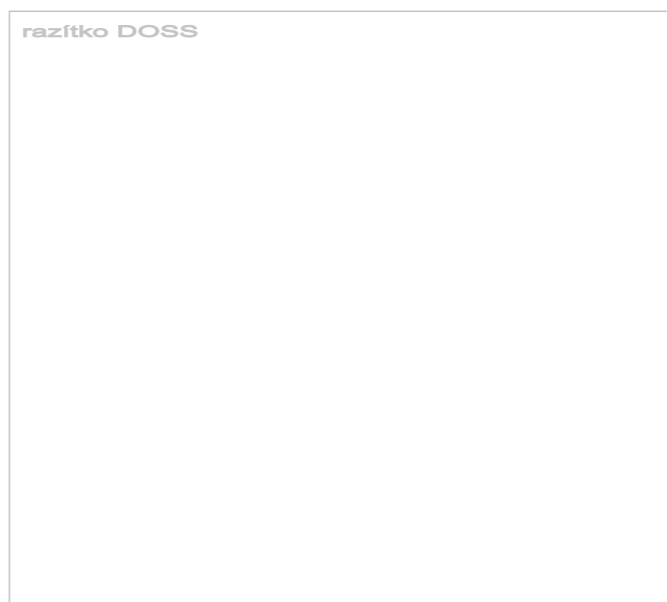

Zodpovědná osoba: Tomáš Březina	Kontroloval: Tomáš Březina	Kreslil: Tomáš Vydra	
Objednatel: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8			
Akce: Semice - III/2722 rekonstrukce komunikace			Formát: A3
			Měřítko:
			Datum: 01/2023
			Účel: DIR
Obsah: Návrh DIO - PŘÍJEZDOVÉ TRASY NA MK			Číslo výkresu: 09
			Paré č.:

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Středočeského kraje
Územní odbor Nymburk
Dopravní inspektorát
Boleslavská 1831, 288 02 Nymburk

Č. j. KRPS-14877-2/ČJ-2023-010806

Nymburk 24. ledna 2023

Počet stran: 2

Přílohy: 1/10

SEDOZ DZ s.r.o.
Poděbradova 1751
289 22 Lysá nad Labem

Semice - rekonstrukce silnice č. III/2722 - stanovisko DI PČR Nymburk.

Dopravní inspektorát PČR Nymburk na základě Vaší žádosti ve věci předloženého návrhu přechodné úpravy provozu na shora uvedenou akci, Vám po prostudování a provedeném šetření, vydává následující stanovisko.

Dopravní inspektorát PČR Nymburk jako příslušný orgán podle § 77 odst. 2) písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů souhlasí s realizací předloženého návrhu přechodného dopravního značení **při dodržení níže uvedených podmínek.**

Odůvodnění:

Předmětem přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích je rekonstrukce průtahu silnice č. III/2722 obcí Semice.

Dopravní inspektorát PČR Nymburk má k návrhu přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích **následující připomínky:**

- Bude zajištěn bezpečný přístup do nemovitostí dotčených stavbou.
- Uzavírka silnice a místních komunikací bude v dostatečném předstihu oznámena a projednána s majiteli všech dotčených nemovitostí.

V případě omezení průchodnosti chodníku, bude chodník uzavřen a chodci na tuto skutečnost upozorněni.

V době, kdy nebudou probíhat práce, bude omezení v maximální možné míře minimalizováno (nesmí však dojít k ohrožení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích).

V případě částečné uzavírky zůstane jízdní pruh šířky min. 2,75 m a při použití DZ č. P 7 a č. P 8 bude zajištěn rozhled pro zastavení (jinak bude použito SSZ).

Dopravní značení, které je v rozporu s přechodnou úpravou provozu, bude zakryto.

Dopravní značení musí být osazeno podle zásad pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích - TP 66.

Dopravní značky musí být rozměrem a barevným provedením v souladu s vyhl. č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích.

Dopravní značky užívané k přechodnému dopravnímu značení musí být provedeny výhradně jako reflexní.

Po ukončení akce musí být povrch uveden do řádného stavu a dopravní značky užitá na akci ihned odstraněny.

Pokud budou výše uvedené podmínky splněny, lze konstatovat, že návrh odpovídá obecným požadavkům na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.

Dopravní inspektorát PČR Nymburk si vyhrazuje možnost stanovit další podmínky, které si vyžádají naléhavé okolnosti při zajišťování bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.

Zpracoval: nrap. Jiří Koptiva, tel.: 974 878 253

z r. por. Bc. Jan Šťastný

npor. Ing. Josef Ulrich, DiS.
vedoucí DI



Městský úřad Lysá nad Labem

Odbor dopravy

Husovo náměstí 23/1, 289 22 Lysá nad Labem

Spis. zn.: MULNL-OD/8842/2023/Juh/6
PÚP - III/2722
Naše č.j.: MULNL-OD/8842/2023/Juh
Vaše č.j.:
Vyřizuje: Bc. Šárka Juhászová
Telefon:
E-mail:
Dat.schránka: 5adasau
Datum: 3.2.2023

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy

Městský úřad Lysá nad Labem obce s rozšířenou působností, odbor dopravy, správní orgán oprávněný ke stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích dle ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen: „zákon o silničním provozu“), na základě ustanovení § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen: „správní řád“)

v y d á v á o p a t ř e n í o b e c n é p o v a h y

spočívající

ve stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci:

I. etapa – III/2722, II/272, II/611 a MK dle návrhu DIO bezejména (MK vyparkovat 7 dní předem)

Ia. etapa – III/2722, II/272, II/611 a MK dle návrhu DIO bezejména

II. etapa – III/2722, II/272, II/611 a MK dle návrhu DIO bezejména

III. etapa – III/2722, III/3308, II/272, II/611 a MK dle návrhu DIO bezejména

IV. etapa – III/2722, III/3308, II/611, II/272 a MK dle návrhu DIO bezejména

z důvodu zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.

Správní orgán, jako příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností,

s t a n o v í

ve smyslu ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů v platném znění a vyhlášky č. 294/2015 Sb., přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích – k označení provedení omezení provozu na pozemní komunikaci

I. etapa – III/2722, II/272, II/611 a MK dle návrhu DIO bezejména (MK vyparkovat 7 dní předem)

Ia. etapa – III/2722, II/272, II/611 a MK dle návrhu DIO bezejména

II. etapa – III/2722, II/272, II/611 a MK dle návrhu DIO bezejména

III. etapa – III/2722, III/3308, II/272, II/611 a MK dle návrhu DIO bezejména

IV. etapa – III/2722, III/3308, II/611, II/272 a MK dle návrhu DIO bezejména

Žadatel: MI ROADS, a.s., IČ: 24218537, se sídlem Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8, v zastoupení na základě plné moci SEDOZ DZ, s. r. o., IČ 24218537, se sídlem Primátorská 296/38, 180 00 Praha 8

K označení použijte dopravní značky dle ověřeného a schváleného DIO (dopravně inženýrské opatření), které je součástí a přílohou tohoto opatření obecné povahy.

Dopravní značení a zařízení proved'te jako: dopravní zařízení a přenosné svislé dopravní značky
Velikost dopravního značení: základní rozměrová řada

Provedení dopravního značení a zařízení: retroreflexní

Důvod: rekonstrukce komunikace III/2722

Platnost úpravy:

I. etapa: od 14.02.2023 do 31.03.2023

Ia. etapa: od 01.04.2023 do 14.04.2023

II. etapa: od 15.04.2023 do 29.05.2023

III. etapa: od 30.05.2023 do 13.07.2023

IV. etapa od 14.07.2023 do 11.10.2023

Odpovědná osoba za řádné provedení úpravy: Tomáš Havelka, tel.: 702 006 672

Další podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:

- 1) Předmětem přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích je rekonstrukce průtahu silnice č. III/2722 obcí Semice.
- 2) Bude zajištěn bezpečný přístup do nemovitostí dotčených stavbou.
- 3) V případě omezení průchodnosti chodníku, bude chodník uzavřen a chodci na tuto skutečnost upozorněni.
- 4) V době kdy nebudou probíhat stavební práce, bude omezení v maximální možné míře minimalizováno (nesmí však dojít k ohrožení bezpečnosti na pozemních komunikacích).
- 5) Dopravní značení, které je v rozporu s přechodnou úpravou provozu, bude zakryto. "
- 6) Dopravní značení musí být osazeno podle zásad pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích – TP 66.
- 7) Dopravní značky musí být rozměrem a barevným provedením v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích.
- 8) Dopravní značky užívané k přechodnému dopravnímu značení musí být provedeny výhradně jako reflexní.
- 9) Po ukončení akce musí být povrch uveden do řádného stavu a dopravní značky užitě na akci ihned odstraněny.
- 10) Dopravní značení, případně dopravní zařízení, proved'te dle přiloženého situačního plánu, pokud je tento nedílnou součástí tohoto stanovení, nebo podle odkazu či slovního popisu uvedeného v tomto stanovení.
- 11) Žadatel je povinen zajišť'ovat průběžnou kontrolu a údržbu dopravního značení a zařízení tak, aby bylo v řádném stavu.
- 12) Dopravní značení bude zajištěno proti posunutí, otočení nebo pádu vlivem provozu popřípadě povětrnostních podmínek a instalováno bezprostředně před skutečným zahájením prací.
- 13) Městský úřad Lysá nad Labem, odbor dopravy si vyhrazuje právo stanovení přechodné úpravy dopravního značení změnit nebo doplnit, jestliže to bude vyžadovat změna provozu nebo veřejný zájem. Policie ČR má právo kontroly a předložení dalších podmínek, zajišťujících bezpečnost a plynulost silničního provozu.
- 14) V době kdy nebudou probíhat stavební práce, bude omezení v maximální možné míře minimalizováno (nesmí však dojít k ohrožení bezpečnosti na pozemních komunikacích).

Hrozí-li nebezpečí z prodlení, může příslušný správní orgán stanovit přechodnou úpravu provozu na dálnicích, silnicích, místních komunikacích nebo veřejně přístupných účelových komunikacích bez projednání s dotčenými orgány a bez předchozího řízení o návrhu opatření obecné povahy, nejdéle však na dobu 60 dnů.

Upozornění: Toto opatření obecné povahy nenahrazuje povolení, stanovisko, posouzení, případně jiné opatření dotčeného správního úřadu vyžadované zvláštními předpisy. Tímto stanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vyplývající z případných smluvních vztahů mezi žadatelem a právníckou osobou zajišťující vlastní realizaci dopravního značení.

Odůvodnění:

Městský úřad Lysá nad Labem, odbor dopravy, zpracoval podklady k žádosti žadatele a na základě souhlasných vyjádření příslušných dotčených orgánů věc posoudil a rozhodl o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, kdy v podmínkách pro její platnost stanoví zejména dodržení souladu provedení dopravního značení dle přiloženého dopravně inženýrského opatření (DIO).

Poučení:

Proti opatření obecné povahy nelze dle ustanovení § 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů podat opravný prostředek. Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení.

Bc. Šárka Juhászová
vedoucí odboru dopravy
(otisk úředního razítka)

Tato veřejná vyhláška musí být vyvěšena nejméně po dobu 15-ti dnů na úřední desce MěÚ Lysá nad Labem, Semice, Velenka, Starý Vestec. Současně se zveřejní též způsobem umožňující dálkový přístup. Vývěsní lhůta začíná den následující po dni vyvěšení, sejmutí vyhlášky je možné následující pracovní den po posledním dni vývěsní lhůty. Poslední den této lhůty je dnem doručení.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Obdrží:

Veřejnou vyhláškou (ve smyslu § 172 správního řádu) – se žádostí o vyvěšení na úřední desce obce:

- MěÚ Lysá nad Labem – k vyvěšení na úřední desce
- Obec Semice – k vyvěšení na úřední desce
- Obec Starý Vestec – k vyvěšení na úřední desce
- Obec Velenka – k vyvěšení na úřední desce

Po nabytí účinnosti OOP obdrží:

- MI ROADS, a.s., IČ: 24218537, v zastoupení na základě plné moci SEDOZ DZ, s.r.o., IČ: 24218537,
- MěÚ Lysá nad Labem – k vyvěšení na úřední desce
- Obec Semice – k vyvěšení na úřední desce
- Obec Starý Vestec – k vyvěšení na úřední desce
- Obec Velenka – k vyvěšení na úřední desce
- Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, územní odbor Nymburk, Boleslavská 1831, 288 02 Nymburk




Firma: Firma

Soupis prací objektu

Stavba: 2020/1070 III/2722 Semice, rekonstrukce_neoceněný
Rozpočet: SO 181 DIO - investice kraje

	Celkem PDPS	Celkem projednané
SO 181	0,00	96 890,00
	Rozdíl	96 890,00

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství PDPS	Množství Projednané DIO	Jednotková cena			
							Jednotková	Celkem PDPS	Celkem projednané	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
9			Ostatní konstrukce a práce					0,00	96 890,00	
101.N	916112		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	0,000	7,000	932,00	0,00	6 524,00	OTSKP 2022
102.N	916113		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ	KUS	0,000	7,000	430,00	0,00	3 010,00	OTSKP 2022
103.N	916119		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ	KSDEN	0,000	330,000	108,00	0,00	35 640,00	OTSKP 2022
104.N	916122		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	0,000	4,000	1 400,00	0,00	5 600,00	OTSKP 2022
105.N	916123		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ	KUS	0,000	4,000	714,00	0,00	2 856,00	OTSKP 2022
106.N	916129		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ	KSDEN	0,000	210,000	206,00	0,00	43 260,00	OTSKP 2022



Firma: Firma

Soupis prací objektu**Stavba:** 2020/1070 III/2722 Semice, rekonstrukce_neoceněný
Rozpočet: SO 181 I. etapa, 14.02.2023 - 14.04.2023, 60 dní

SO 181 36 790,00

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství Projednané DIO	Jednotková cena			
						Jednotková	Celkem		
1	2	3	4	5	7	8	9		
9			Ostatní konstrukce a práce					36 790,00	
101.N	916112		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	1,000	932,00	932,00		OTSKP 2022
102.N	916113		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ	KUS	1,000	430,00	430,00		OTSKP 2022
103.N	916119		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ	KSDEN	60,000	108,00	6 480,00		OTSKP 2022
104.N	916122		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	2,000	1 400,00	2 800,00		OTSKP 2022
105.N	916123		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ	KUS	2,000	714,00	1 428,00		OTSKP 2022
106.N	916129		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ	KSDEN	120,000	206,00	24 720,00		OTSKP 2022



Firma: Firma

Soupis prací objektu**Stavba:** 2020/1070 III/2722 Semice, rekonstrukce_neoceněný
Rožpočet: SO 181 II. etapa, 15.04.2023 - 29.05.2023, 45 dní

SO 181 28 990,00

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství Projednané DIO	Jednotková cena			
						Jednotková	Celkem		
1	2	3	4	5	7	8	9		
9			Ostatní konstrukce a práce					28 990,00	
101.N	916112		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	1,000	932,00	932,00		OTSKP 2022
102.N	916113		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ	KUS	1,000	430,00	430,00		OTSKP 2022
103.N	916119		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ	KSDEN	45,000	108,00	4 860,00		OTSKP 2022
104.N	916122		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	2,000	1 400,00	2 800,00		OTSKP 2022
105.N	916123		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ	KUS	2,000	714,00	1 428,00		OTSKP 2022
106.N	916129		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ	KSDEN	90,000	206,00	18 540,00		OTSKP 2022



Firma: Firma

Soupis prací objektu

Stavba: 2020/1070 III/2722 Semice, rekonstrukce_neoceněný

SO 181

12 444,00

Rožpočet: SO 181 III. etapa, 30.05.2023 - 13.07.2023, 45 dní

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství Projednané DIO	Jednotková cena		
						Jednotková	Celkem	
1	2	3	4	5	7	8	9	
9						12 444,00		
Ostatní konstrukce a práce								
101.N	916112		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	2,000	932,00	1 864,00	OTSKP 2022
102.N	916113		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ	KUS	2,000	430,00	860,00	OTSKP 2022
103.N	916119		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ	KSDEN	90,000	108,00	9 720,00	OTSKP 2022



Firma: Firma

Soupis prací objektu

Stavba: 2020/1070 III/2722 Semice, rekonstrukce_neoceněný

SO 181

18 666,00

Rožpočet: SO 181 IV. etapa, 14.07.2023 - 11.10.2023, 90 dní

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství Projednané DIO	Jednotková cena		
						Jednotková	Celkem	
1	2	3	4	5	7	8	9	
9						18 666,00		
Ostatní konstrukce a práce								
101.N	916112		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	3,000	932,00	2 796,00	OTSKP 2022
102.N	916113		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ	KUS	3,000	430,00	1 290,00	OTSKP 2022
103.N	916119		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ	KSDEN	135,000	108,00	14 580,00	OTSKP 2022



Naše značka: 23-02472

Vyřizuje: Ing. Juraj Kolcun

Telefon:

Praha 15.05.2023

Společnost

"Semice", MI Roads a.s.- BES s.r.o.
Koželužská 2450/4, 180 00 Praha8, Libeň
Ing. Jiří Zapadlo

Stavba: III/2722 Semice, rekonstrukce č. zak. 2020/1070

Věc: Vyjádření AD ke změně týkající se doplnění výstražných světel

Všeobecně

Při projednávání přechodné úpravy provozu v rámci DIO byly doplněny ze stran dotčených orgánů požadavky na doplnění dopravního značení uzavírky silnice III/2722, které nebylo součástí Zadávací dokumentace, tj. detailního rozpisu dopravního značení v rámci výše uvedené stavby. Konkrétně se jedná o doplnění výstražných dopravních světel (S1) v místech napojení uzavírky na provozované pozemní komunikace. Odsouhlasený návrh dopravně inženýrského opatření, který byl takto odsouhlasen dopravním inspektorátem Policie ČR, pro všechny etapy výstavby je uveden v Příloze tohoto ZBV, který je nedílnou součástí Rozhodnutí o uzavírce, vydané Městským úřadem Lysá nad Labem, odbor dopravy ze dne 03. 02. 2023, zn. MULNLOD/ 8842/2023/Juh/6 .

AD:

Na základě výše uvedeného konstatujeme, že souhlasíme se změnou týkající se doplnění výstražných světel.

S pozdravem

Ing. Juraj Kolcun
(HIP)



**Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje**
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5
Ing. Milan Fiala

Brandýs nad Labem 15/5/2023

Věc: **Stanovisko TDI k dokumentaci ZBV č. 3 pro akci „III/2722 Semice, rekonstrukce“**

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5 - Smíchov

Zhotovitel: Společnost „Semice“ zastoupená MI Roads a.s. Koželužská 2450/4,
180 00 Praha 8

TDI, koordinátor BOZP: Sdružení SGS+IBH KSUS
Výkonem TDI pověřen na základě plné moci Ing. Jan Volek, PRAGOPROJEKT,
a.s., K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4

Zpracovatel PDPS: HBH Projekt spol. s r.o., pobočka Praha, Michelská 18/12a, 140 00 Praha 4

Předpokládaná doba výstavby:
11/2022–10/2023

V rámci výkonu TDI na výše uvedené stavbě jsme obdrželi od zhotovitele návrh na ZBV č. 3 pro SO 181 DIO.

Odůvodnění změny:

ZBV obsahuje doplnění dopravního značení podle požadavku TP 66. Dopravní značení je po změně v souladu s Rozhodnutím o uzavírce vydané MÚ Lysá nad Labem, odbor dopravy ze dne 3/2/2023 pod č. j. MULNL - OD/8842/2023/Juh/6.

Stanovisko TDI:

S předloženým ZBV jako technický dozor investora souhlasím.

Na základě plné moci

Správce společnosti MI Roads a.s.
Koželužská 2450/4
180 00 Praha 8 – Libeň

Projekt: III/2722 Semice, rekonstrukce

Věc: Souhlasné stanovisko k ZBV

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o., jako objednatel akce „III/2722 Semice, rekonstrukce“ po dohodě a v souladu se stanoviskem AD a TDS, souhlasí s projednanými změnami během výstavby, jmenovitě souhlasí se:

ZBV č. 3 SO 181 Doplnění výstražných světel, oznámení č. MIR_54_23_Semice_PRA_oznámení
dodatečných požadavků při projednávání dopravně-inženýrského opatření

ZBV č. 4 SO 301 Realizace přeložky plynovodu, oznámení

MIR_37_23_Semice_PRA oznámení o zjištění kolize dešťové kanalizace s plynovodem

Změny budou řešeny formou ZBV. Jedná se pouze o souhlas s návrhem technického řešení navrhovaných ZBV. Posouzení správnosti ZBV zajistí supervize a finální schválení spadá do kompetence vedení KSÚS.

Petr Müller

Projektový manažer

Krajská správa a údržba silnic

Středočeského kraje příspěvková organizace

Se sídlem Zborovská 11, Praha 5

Oblastní pracoviště: Žižkova 1, 251 01 Říčany

Tel.: 601 078 321

E-mail: petr.muller@ksus.cz

PLNÁ MOC

Společnost **MI Roads a.s.**, se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, Praha 8, PSČ 180 00, IČO 17331099, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 27461, zastoupená Ing. Zdeňkem Ludvíkem, předsedou správní rady a Ing. Petrem Hejdrychem, členem správní rady (dále též jen „zmocnitel“), tímto zmocňuje

Ing. Jiřího Zapadla
zaměstnance zmocnitele v pozici „Oblastní ředitel“

narozeného dne 14. 10. 1988, trvale bytem: Ortenovo náměstí 448/9, Praha 7, 170 00
(dále jen „zmocněnec“)

k tomu, aby v souvislosti s realizací zakázky/stavby „III/2722 Semice, rekonstrukce“ (dále jen „stavba“ nebo „dílo“) zastupoval zmocnitele ve věcech realizace díla, zejména k převzetí staveniště, předání dokončeného díla zadavateli, podpisu korespondence související s realizací díla, změnových listů (rozsah díla), zjišťovacích protokolů, faktur a dokumentů obdobné povahy.

Toto zmocnění se nevztahuje na podpisy dodatků ke smlouvě o dílo, na jejímž základě je stavba pro zadavatele realizována.

Plná moc se uděluje na dobu určitou do 31. 12. 2023 nebo do odvolání.

Zmocněnec není oprávněn zmocnit v rozsahu této plné moci další osobu.

V Praze dne 22. 3. 2023

Ing. Zdeněk Ludvík
předseda správní rady
MI Roads a.s.

Ing. Petr Hejdrych
člen správní rady
MI Roads a.s.

Zmocnění ve výše uvedeném rozsahu přijímám.

Ing. Jiří Zapadlo
