

## Krycí list ZBV

Název Stavby dle SoD: II/277 Mohelnice/Podhora – zajištění nestabilní skalní stěny Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 01 - Zajištění nestabilní skalní stěny	Číslo SO/PS / / pořadí Změny SO/PS:  SO 01/002	Číslo ZBV:  2
--	---	---------------------

Objednatel: **Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**  
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov  
IČ: 00066001

Zhotovitel: **ROCKNET s.r.o.**  
Červený Hrádek 10, 431 11 Jirkov  
IČO: 27357694

## Rekapitulace ZBV č. 2 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.1	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.2	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.3	0,00	1 122 572,62	1 122 572,62

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.4	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.5	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ SUMA	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2	0,00	1 122 572,62	1 122 572,62

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.  
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Změnové listy (02)  
a pro Rozpis ocenění změn položek (04).

## Změnový list

## Název Stavby dle SoD:

II/277 Mohelnice/Podhora – zajištění nestabilní skalní stěny

## Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 01 - Zajištění nestabilní skalní stěny

Číslo SO/PS /  
/ pořadí Změny SO/PS:

SO 01/002

Číslo ZBV / Skupina změny:

2 . 3

Strany smlouvy o dílo S-3384/00066001/2022 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 06.12.2022 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: Rocknet s.r.o., Červený Hrádek 10, 431 11 Jirkov

## Přílohy Změnového listu:

1. Krycí list	1	počet listů
2. Změnový list	2	počet listů
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů
4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů
5. Přehled zařazení změn do Skupin	1	počet listů
6. Přehled dokladů	1	počet listů
7. Soupis prací SO po všech změnách	5	počet listů
Další doklady dle přehledu dokladů	55	počet listů

## Příjemce

Objednatel  
Zhotovitel  
Projektant (AD)  
Stavební dozor

Iniciátor Změny: Zhotovitel

Předmět Změny: Navýšení množství odtěžených nestabilních částí skalního masivu

Na základě zadávací dokumentace bylo navrženo očištění skalní stěny horolezeckým způsobem od zvětralého materiálu a veškerých částí, které jsou zcela odděleny od mateřského masivu. Dále je v technické zprávě v zadávací dokumentaci ve stupni PDPS v článku 3.2 uvedeno, že rozsah očištění svahu bude na místě řízen geotechnikem dle aktuálně zjištěného stavu zvětrání v průběhu provádění prací.

V průběhu provádění prací, pod dohledem TDS a geotechnika bylo zjištěno, že rozsah odtěžení zemin (lesní hrabanka) a degradované horniny nestabilních částí skalního masivu je oproti původnímu předpokladu větší. Zvětšení rozsahu bylo způsobeno vlivem vyšší míry zvětrávání a vlivem povětrnostních vlivů. Tímto došlo k navýšení množství odtěženého materiálu.

Množství vychází z geodetického zaměření skutečně provedeného množství na základě 3D skenu ze dne 22.3.2023 [viz Příloha č. 10]. Dále vychází z doložených vážních lístků za období 01 / 2023 a 03 / 2023 [viz Příloha č. 11 a 12].

Tato změna se týká položek č. 1 – 014102.a, č. 16 – 126738, č. 17 – 126838 a č. 19 - 17120.

Hodnota změny je **1 122 572,62 Kč** bez DPH.

Jedná se o Změny nepředvídané, které jsou podle § 5, odst. 1, písm. c) Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 01.01.2022) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazených do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná o změnu nepředvídanou.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
<b>0,00</b>	<b>1 122 572,62</b>	<b>1 122 572,62</b>	<b>1 122 572,62</b>

Technická pomoc Objednatele                      jméno                      Daniel Löffler                      podpis

**Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:**

Zhotovitel (stavbyvedoucí):                      jméno                      Miroslav Zukerstein                      podpis

Projektant (autorský dozor):                      jméno                      Ing. Ladislav Terš                      podpis

Stavební dozor:                      jméno                      Petr Jiřímský                      podpis

Supervize (Regionální dotační kancelář)                      jméno                                           podpis

Zástupce Objednatele:                      jméno                      Tomáš pecka                      podpis

Zástupce Objednatele odpovědný za cenové  
projednání Změny::                      jméno                      Ing. Jaroslava Jurková                      podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 **Obchodních podmínek**. **Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo**. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněně jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

**Objednatel** (Oprávněná osoba):                      jméno                      Ing. Jan Fidler, DIS                      podpis

**Zhotovitel:**                      jméno                      Ladislav Šmucr                      podpis

**ZÁPIS**

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)  
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 2**

<b>Název Stavby:</b>	<b>II/277 Mohelnice/Podhora – zajištění nestabilní skalní stěny</b>
<b>Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:</b>	<b>SO 01/002</b>
<b>Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):</b>	<b>SO 01 Zajištění nestabilní skalní stěny</b>

Údaje v Kč bez DPH

<b>Cena SO/PS dle Smlouvy</b>
1 - zadat
<b>10 623 620,36</b>

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

**Cena SO/PS v předchozích ZBV:**

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	367 530,00	<b>10 991 150,36</b>	<b>0,00</b>

**Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:**

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	1 122 572,62	<b>1 490 102,62</b>	<b>14,03%</b>

**Cena SO/PS po této ZBV:**

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	<b>0,00</b>	<b>12 113 722,98</b>	<b>1 490 102,62</b>	<b>14,03%</b>

**Rozpis položek a cen Změny**

Název stavby dle SoD: II/277 Mohelnice/Podhora – zajištění nestabilní skalní stěny Číslo a název SO/PS: SO 01 - Zajištění nestabilní skalní stěny Číslo a název rozpočtu: SO 01 - Zajištění nestabilní skalní stěny								<b>ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)</b> <b>SO 01/002</b> <b>Skupina změn 3</b>					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	014102.a	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	2617,758	3 752,400	1 134,642	330,000	863 860,14	0,00	374 431,86	1 238 292,00	374 431,86	43,34%
16	126738	ZŘÍZENÍ STUPŇŮ V PODLOŽÍ NÁSPŮ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	860,000	1 199,850	339,850	1300,000	1 118 000,00	0,00	441 805,00	1 559 805,00	441 805,00	39,52%
17	126838	ZŘÍZENÍ STUPŇŮ V PODLOŽÍ NÁSPŮ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM	M3	451,250	678,603	227,353	1300,000	586 625,00	0,00	295 558,90	882 183,90	295 558,90	50,38%
19	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	1326,250	1 893,453	567,203	19,000	25 198,75	0,00	10 776,86	35 975,61	10 776,86	42,77%
		<b>Celkem</b>							<b>0,00</b>	<b>1 122 572,62</b>		<b>1 122 572,62</b>	

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu. Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele:   jméno, (stavbyvedoucí)

Za Objednatele:   jméno, (TDS/TDI)

Podpis:

Podpis:

**PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN**

Název a evidenční číslo Stavby: **II/277 Mohelnice/Podhora – zajištění nestabilní skalní stěny**

1	Přijaté smluvní částka bez rezervy a DPH	10 623 620,36
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	12 113 722,98
	<b>Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH</b>	<b>14 657 604,81</b>
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	114,03%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	3,46%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	1 122 572,62
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	10,57%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	3 187 086,11

9=(32A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	10,57%
10=(36A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,00%
10A=32A+36A	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	1 122 572,62
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	5 311 810,18

12=(1)*0,15	Limit	1 593 543,05
13=(39)/(1)	Sledování limitu v %	0,00%
14=ABS(37)+(38)	Hodnota skupiny 5	0,00

- 1 -																						- 2 -			- 3 -				- 4 -				- 5 -		
Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)																						Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)				Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)				Změny de minimis Změny neměnní celkovou povahou veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)		
SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	limit 15 %													
16	17	18	19=23+26+29+33	20=24+27+30+34+37+39	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	32=29+30	32A=ABS(29)+30	33	34	36=33+34	36A=ABS(33)+34	37	38	39=ABS(37)+38													
		II/277 Mohelnice/Podhora – zajištění nestabilní skalní stěny	0,00	1 490 102,62	1 490 102,62	0,00	367 530,00	367 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 122 572,62	1 122 572,62	1 122 572,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
SO 01	1	Zajištění nestabilní skalní stěny / Doměření provedení zajištění skalního zářezu ocelovými sítěmi s georohoží	0,00	367 530,00	367 530,00	0,00	367 530,00	367 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
SO 01	2	Zajištění nestabilní skalní stěny / Navýšení množství odtěžení nestabilních částí skalního masivu	0,00	1 122 572,62	1 122 572,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 122 572,62	1 122 572,62	1 122 572,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
	3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
	4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													

**Poznámka:** Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

## Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	2
Název a evidenční číslo stavby:	<b>II/277 Mohelnice/Podhora – zajištění nestabilní skalní stěny</b>
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 01 - Zajištění nestabilní skalní stěny
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	SO 01/002

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
07 Soupis prací SO po změnách	5	
08 Oznámení Zhotovitele o události a žádost o pokyn ke změně díla ze dne 10.2.2023	2	
09 Pokyn Objednatele k předložení ZBV	2	
10 Geodetické zaměření 3D provedené sanace ze dne 22.3.2023	1	
11 Seznam a sken Vážních lístků Mohelnice n. J. za období 01 / 2023	30	
12 Seznam a sken Vážních lístků Mohelnice n. J. za období 03 / 2023	15	
13 Vyjádření TDS ze dne 13.2.2023	1	
14 Vyjádření Geotechnika Zhotovitele ze dne 15.2.2023	1	
15 Vyjádření AD ke změnám ze dne 26.5.2023	1	
16 Vyjádření Geotechnika objednatele k ZBV ze dne 15.8.2023	2	
Počet listů celkem	60	

**Soupis prací SO po všech změnách**

Název stavby: II/277 Mohelnice/Podhora – zajištění nestabilní skalní stěny Číslo a název SO/PS: SO 01 - Zajištění nestabilní skalní stěny Číslo a název rozpočtu: SO 01 - Zajištění nestabilní skalní stěny								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) SO 01/002 celkem po všech změnách					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změnách	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změnách v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	014102.a	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina, kamenivo, kamen	T	2 617,758	3 752,400	1 134,642	330,00	863 860,14	0,00	374 431,86	1 238 292,00	374 431,86	43,34%
		<i>dle pol. 113328: 2,325*2,1=4,883 [A]                      dle pol. 126738: 860,0*1,8=1 548,000 [B]                      dle pol. 126838: 451,25*2,3=1 037,875 [C]                      dle pol. 132738: 15,0*1,8=27,000 [D]                      Celkem: A+B+C+D=2 617,758 [E]                      ZBV č.2: množství vychází z vážnivých lístků natěžených rubaniny (Příloha č. 11; Příloha č. 12) a dle položek:                      dle pol. č. 12 (kód 113328): 2,325 * 2,1 = 4,883 t                      dle pol. č. 16 (kód 126738): 1199,850 * 1,8 = 2159,730 t                      dle pol. č. 17 (kód 126838): 678,603 * 2,3 = 1560,787 t                      dle pol. č. 18 (kód 132738): 15,000 * 1,8 = 27,000 t                      Celkem ZBV č. 2 : (4,883 + 2159,730 + 1560,787 + 27,000) - 2617,758 = 1 134,642 t</i>											
2	014102.b	POPLATKY ZA SKLÁDKU asfalt	T	5,348	5,348	0,000	550,00	2 941,40	0,00	0,00	2 941,40	0,00	0,00%
		<i>dle pol. 113138: 2,325*2,3=5,348 [A]</i>											
3	014102.c	POPLATKY ZA SKLÁDKU beton	T	5,580	5,580	0,000	650,00	3 627,00	0,00	0,00	3 627,00	0,00	0,00%
		<i>dle pol. 113348: 2,325*2,4=5,580 [A]</i>											
4	02710	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ OBJÍŽKY A PŘÍSTUP CESTY	KPL	1,000	1,000	0,000	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00%
		Přístup k realizaci sanace - položka zahrnuje veškeré náklady na realizaci prací horolezeckou technikou, převážně ruční provádění prací (nad rámec uvedených položek), ztížené podmínky v místy velmi špatně přístupném terénu a zohlednění veškerých dalších známých skutečností, dle odborných zkušeností zhotovitele / uchazeče. Stavba bude probíhat za úplné uzavírky (již vyznačené uzávěry, havarijní stav).											
5	029113	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY	KUS	2,000	2,000	0,000	35 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00%
		zaměření svahu a dotčení části vozovky před a po provedení sanace (2x)											
6	02943	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KPL	1,000	1,000	0,000	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00%
7	02944	OSTATNÍ POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ	KPL	1,000	1,000	0,000	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00%
8	02960	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR	KPL	1,000	1,000	0,000	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00%
		pravidelný dozor geotechnika stavby, vč. veškerých pomocných a předzružených činností (posudky, zkoušky, stanoviska, ap.)											
9	11120	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN vč. likvidace dřevní hmoty dle dispozic zhotovitele	M2	764,050	764,050	0,000	125,00	95 506,25	0,00	0,00	95 506,25	0,00	0,00%
		<i>Přípravné a bourací práce křoviny, nálety pr. km. do 100mm: 0,35*2183=764,050 [A]</i>											
10	11211	KÁČENÍ STROMŮ D K MENE DO 0,5M s ponecháním kořenového systému! POZN.: Povinný odkup dřevní hmoty (kmeny, silné části větví) zhotovitelem! Ostatní vč. likvidace dle dispozic zhotovitele.	KUS	12,000	12,000	0,000	4 550,00	54 600,00	0,00	0,00	54 600,00	0,00	0,00%
		<i>Přípravné a bourací práce stromy D do 0,5m: 12=12,000 [A]</i>											
11	11214	KÁČENÍ STROMŮ D K MENE DO 0,3M s ponecháním kořenového systému! POZN.: Povinný odkup dřevní hmoty (kmeny, silné části větví) zhotovitelem! Ostatní vč. likvidace dle dispozic zhotovitele.	KUS	10,000	10,000	0,000	3 550,00	35 500,00	0,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00%



		<i>Přípravné a bourací práce stromy D do 0,3m: 10=10,000 [A]</i>												
12	113138	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM vč. odvozu a uložení na obalovně / recyklačním středisku s provozním zařízením pro použití / zpracování znovuzískané asfaltové směsi dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně Předpoklad vybourání asfaltových vrstev v hodnotách PAU třídy ZAS-T1 – ZAS-T3. POZN.: Předpokládána skladba vozovky, bude čerpáno dle skutečnosti.	M3	2,325	2,325	0,000	2 500,00	5 812,50	0,00	0,00	5 812,50	0,00	0,00%	
		<i>Ostatní Vybourání části vozovky pro realizaci propustku - asfalt tl. cca 0,15m: 15,5*0,15=2,325 [A]</i>												
13	113328	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně POZN.: Předpokládána skladba vozovky, bude čerpáno dle skutečnosti.	M3	2,325	2,325	0,000	850,00	1 976,25	0,00	0,00	1 976,25	0,00	0,00%	
		<i>Ostatní Vybourání části vozovky pro realizaci propustku - nestmelené vrstvy tl. cca 0,15m: 15,5*0,15=2,325 [A]</i>												
14	113348	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEM POJIVEM, ODVOZ DO 20KM vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně POZN.: Předpokládána skladba vozovky, bude čerpáno dle skutečnosti.	M3	2,325	2,325	0,000	2 500,00	5 812,50	0,00	0,00	5 812,50	0,00	0,00%	
		<i>Ostatní Vybourání části vozovky pro realizaci propustku - stmelené vrstvy tl. cca 0,15m: 15,5*0,15=2,325 [A]</i>												
15	113764	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	14,000	14,000	0,000	139,00	1 946,00	0,00	0,00	1 946,00	0,00	0,00%	
		<i>Ostatní Napojení obnovy vozovky na stáv. stav - profrézování drážky: 2*7,0=14,000 [A]</i>												
16	126738	ZŘÍZENÍ STUPŇŮ V PODLOŽÍ NÁSPŮ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM vč. odvozu na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně	M3	860,000	1 199,850	339,850	1 300,00	1 118 000,00	0,00	441 805,00	1 559 805,00	441 805,00	39,52%	
		<i>Přípravné a bourací práce Odkopávka v tř. I. - úprava nasypaného / rostlého terénu pro provedení sanací: 4300*0,2=860,000 [A] ZBV č.2: množství vychází z vyšší míry zvětrání - (3D geodetické zaměření plochy viz Příloha č. 10 * tl. vrstvy) = 4799,4*0,25 = 1199,850 - 860,000 = 339,850 m.</i>												
17	126838	ZŘÍZENÍ STUPŇŮ V PODLOŽÍ NÁSPŮ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM vč. odvozu na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně	M3	451,250	678,603	227,353	1 300,00	586 625,00	0,00	295 558,90	882 183,90	295 558,90	50,38%	
		<i>Přípravné a bourací práce Odkopávka v tř. II. - úprava / očištění skalních ploch od rozvolněných kamenů z části povrchu svahu pro provedení sanací: 1805*0,25=451,250 [A] ZBV č.2: množství vychází z vyšší míry zvětrání - (3D geodetické zaměření plochy viz Příloha č. 10 * tl. vrstvy) = 2143,6 * 0,3165718 = 678,603 - 451,25 = 227,353 m.</i>												
18	132738	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM vč. odvozu na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně	M3	15,000	15,000	0,000	3 450,00	51 750,00	0,00	0,00	51 750,00	0,00	0,00%	
		<i>Odvodnění hloubená vykopávka pro zřízení šachty a propustku: 15,0=15,000 [A]</i>												
19	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	1 326,250	1 893,453	567,203	19,00	25 198,75	0,00	10 776,86	35 975,61	10 776,86	42,77%	



31	567104	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z KAMENIVA ZPEV CEMENTEM POZN.: Předpokládaná skladba vozovky (dle stávající), bude čerpáno dle skutečnosti.	M3	2,325	2,325	0,000	1 830,00	4 254,75	0,00	0,00	4 254,75	0,00	0,00%
		<i>Ostatní Obnova části vozovky po realizaci propustku - stmelené vrstvy tl. cca 0,15m: 15,5*0,15=2,325 [A]</i>											
32	567303	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ŠTĚRKODRTI POZN.: Předpokládaná skladba vozovky (dle stávající), bude čerpáno dle skutečnosti.	M3	3,100	3,100	0,000	785,00	2 433,50	0,00	0,00	2 433,50	0,00	0,00%
		<i>Ostatní Obnova části vozovky po realizaci propustku - nestmelené vrstvy tl. min. 0,15m (uvaž. 0,2m): 15,5*0,2=3,100 [A]</i>											
33	577212	VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - SPOJ POSTŘÍK DO 0,5KG/M2 POZN.: Předpokládaná skladba vozovky (dle stávající), bude čerpáno dle skutečnosti.	M2	31,000	31,000	0,000	7,00	217,00	0,00	0,00	217,00	0,00	0,00%
		<i>Ostatní Obnova části vozovky po realizaci propustku: 2*15,5=31,000 [A]</i>											
34	577221	VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - INFILTRAČ POSTŘÍK DO 1,0KG/M2 POZN.: Předpokládaná skladba vozovky (dle stávající), bude čerpáno dle skutečnosti.	M2	15,500	15,500	0,000	13,00	201,50	0,00	0,00	201,50	0,00	0,00%
		<i>Ostatní Obnova části vozovky po realizaci propustku: 15,5=15,500 [A]</i>											
35	5774AE	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 11+, 11S POZN.: Předpokládaná skladba vozovky (dle stávající), bude čerpáno dle skutečnosti.	M3	0,775	0,775	0,000	6 680,00	5 177,00	0,00	0,00	5 177,00	0,00	0,00%
		<i>Ostatní Obnova části vozovky po realizaci propustku - obrusná vrstva tl. cca 0,05m: 15,5*0,05=0,775 [A]</i>											
36	5774CG	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACL 16S, 16+ POZN.: Předpokládaná skladba vozovky (dle stávající), bude čerpáno dle skutečnosti.	M3	0,775	0,775	0,000	6 470,00	5 014,25	0,00	0,00	5 014,25	0,00	0,00%
		<i>Ostatní Obnova části vozovky po realizaci propustku - ložní vrstva tl. cca 0,05m: 15,5*0,05=0,775 [A]</i>											
37	5774EG	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACP 16+, 16S POZN.: Předpokládaná skladba vozovky (dle stávající), bude čerpáno dle skutečnosti.	M3	0,775	0,775	0,000	5 810,00	4 502,75	0,00	0,00	4 502,75	0,00	0,00%
		<i>Ostatní Obnova části vozovky po realizaci propustku - podkladní vrstva tl. cca 0,05m: 15,5*0,05=0,775 [A]</i>											
38	899574	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 VČETNĚ VÝZTUŽE beton C25/30 n XF3, výztuž sítěmi 100/100/5	M3	2,848	2,848	0,000	4 150,00	11 819,20	0,00	0,00	11 819,20	0,00	0,00%
		<i>Odvodnění Obetonování propustku: 7,12*0,4=2,848 [A]</i>											
39	9111A1	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ se zabetonováním stojek do monolitické šachty, příp. s patkami	M	3,850	3,850	0,000	2 500,00	9 625,00	0,00	0,00	9 625,00	0,00	0,00%
		<i>Odvodnění Ochranné ocel. dvoumadlové zábradlí v. 1,1m: 3,85=3,850 [A]</i>											
40	9183B3	PROPUSTY Z TRUB DN 400MM PLASTOVÝCH vč. napojení na šachtu	M	8,100	8,100	0,000	2 200,00	17 820,00	0,00	0,00	17 820,00	0,00	0,00%
		<i>Odvodnění Propust DN 400 z PP, SN16: 8,1=8,100 [A]</i>											
41	919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	14,000	14,000	0,000	157,00	2 198,00	0,00	0,00	2 198,00	0,00	0,00%
		<i>Ostatní Zařízení hrany stávající vozovky pro realizaci propustku: 2*7,0=14,000 [A]</i>											
42	931314	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 400MM2	M	14,000	14,000	0,000	55,00	770,00	0,00	0,00	770,00	0,00	0,00%
		<i>Ostatní Napojení obnovy vozovky na stáv. stav - zálivka: 2*7,0=14,000 [A]</i>											
43	935213	PŘEDLÁŽDĚNÍ ŽLABŮ Z TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM	M	3,500	3,500	0,000	153,00	535,50	0,00	0,00	535,50	0,00	0,00%
		<i>Odvodnění Vybourání a znovu usazení betonových odvod. tvarovek š=0,60 m: 3,5=3,500 [A]</i>											
44	935812	ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 100MM s vyspárováním MC	M2	49,290	49,290	0,000	1 440,00	70 977,60	0,00	0,00	70 977,60	0,00	0,00%
		<i>Odvodnění Zpevněný příkop kam. dlažbou vč. napojení na stáv. propustek: 1,86*26,5=49,290 [A]</i>											
45	93631.R	DROBNÉ DOPLŇK KONSTR ZE SPECIÁLNÍ MALTY	M3	0,150	0,150	0,000	9 500,00	1 425,00	0,00	0,00	1 425,00	0,00	0,00%

		<i>Odvodnění</i> Zatmělení prostupu potrubí propustku ve stávající zdi expanzní maltou, vč. začištění: 0,25*0,6=0,150 [A]											
46	96815	VYSEKÁNÍ OTVORŮ, KAPES, RÝH V ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCI	M3	0,270	0,270	0,000	8 900,00	2 403,00	0,00	0,00	2 403,00	0,00	0,00%
		<i>Odvodnění</i> Vybourání / vyříznutí otvoru ve stáv. stěně pro průchod potrubí propustku, DN 750mm: 0,6*0,45=0,270 [A]											
		Celkem						10 623 620,36	0,00	1 490 102,62	12 113 722,98	1 490 102,62	

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace  
K rukám Ing. Aleš Čermák, Ph.D., MBA, ředitel  
Zborovská 81/11  
150 21 Praha 5 – Smíchov

V Jirkově dne 10.02.2023

Dopis č. 1

**Stavba:** II/277 Mohelnice nad Jizerou / Podhora - zajištění nestabilní skalní stěny

**Věc:** Oznámení události a žádost o pokyn ke změně díla

Vážený pane řediteli,

jako Zhotovitel stavby „II/277 Mohelnice nad Jizerou / Podhora - zajištění nestabilní skalní stěny“ na základě smlouvy o dílo ze dne 06.12.2022 (dále „Smlouva o dílo“), Vám tímto jako Objednateli oznamujeme, že při provádění díla byl během odkopávek zjištěn velmi nízký pokryv skalního masivu zeminou o hloubce maximálně 30-50 cm. Vzrostlé stromy tak mají velmi malý prostor k stabilnímu zakořenění a je na nich možné pozorovat postupné vyvracení. Dále byl zjištěna nadspotřeba injektážní směsi vlivem hloubkového narušení a zastížených puklin při vrtání ve spodní části skalního masivu. Po očištění byl skalní svah přeměřen a zjištěno navýšení rozsahu potřebného k zajištění ocelovými sítěmi s podloženou georochozí, a s tím spojené navýšení počtu systémových kotevních prvků k uchycení sítí. Po prohlídce očištěného skalního masivu navrhnul geotechnik stavby doplnění lokálního kotvení. Po odtěžení a očištění skalního masivu a odvozech veškeré natěžené rubaniny na skládku byly doměřeny výměry zřízení stupňů, nakládky a skládkovného. Z tohoto důvodu vznáší zhotovitel **požadavek spočívající ve vykácení potenciálně nestabilních dřevin nad požadavek PD, vyúčtování navýšení odtěžených hornin a s tím spojených přesunů a skládkovného, navýšení rozsahu síťování a navýšení počtu systémových kotevních prvků a lokálního kotvení.**

Objednatel byl o tomto požadavku informován v rámci kontrolního dne stavby.

**Zhotovitel předpokládá, že cenový dopad změny bude v rozsahu cca 4,3 mil. Kč, přičemž skutečný rozsah (množství položek) bude doměřen.**

Z tohoto důvodu Vás žádáme, v souladu se Směrnicí ředitele Objednatele ke změnám staveb (dále jen „Směrnice“), o udělení pokynu ke změně předmětu díla **spočívající ve vykácení nestabilních stromů, navýšení rozsahu síťování dle doměřené plochy masivu, doplnění potřebných systémových kotevních prvků a lokálního kotvení, navýšení položek spojených s těžbou, očištěním a likvidací rubaniny tak, aby bylo vyhověno požadavkům na stabilizaci skalního masivu.**

Součástí změny bude mimo jiné i souhlasné stanovisko majitelky dotčených dřevin. Geodetické zaměření skutečné plochy zasíťovaného svahu, dále vrtné a injektážní protokoly s vyjádření geotechnika stavby k doplnění lokálního kotvení a doložení vážních lístků od zlikvidované rubaniny.

Předmětná změna bude následně realizována formou Změnového listu. Na obsahu samotné změny jsme samozřejmě připraveni aktivně spolupracovat.

Zhotovitel očekává v souvislosti s touto změnou dopad do harmonogramu prací.

**Žádáme Vás tímto o udělení pokynu k provedení změny díla nejpozději do 24.02.2023.**

S pozdravem

jméno, funkce

**Jan Janderka**

Vedoucí střediska sanačních prací

Rocknet, s.r.o.

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace  
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11**

---

**ROCKNET s.r.o.  
Červený Hrádek 10,  
431 11 Jirkov**

Vás dopis značky / ze dne

Naše značka

Vyřizuje/telefon  
Pecka/

Praha

**Věc : „II/277 Mohelnice nad Jizerou / Podhora – zajištění nestabilní skalní stěny“ – Pokyn ( ZBV č. 1 )**

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje jako správce a zároveň zástupce Středočeského kraje jako vlastníka nemovitostí, tj. předmětné komunikace č. II/277, Vám tímto v souladu s článkem 6.8. smlouvy o dílo č. S-3384/00066001/2022 vydává **Pokyn** k zajištění technického řešení a pokračování ve výše zmíněné akci při zpracování změn během výstavby na stavebním objektu:

### **II/277 Mohelnice nad Jizerou / Podhora – zajištění nestabilní skalní stěny**

Na základě Oznámení zhotovitele o vhodnosti změny :

- z důvodu nedostatečného půdního pokryvu skalního masivu a nebezpečí vývratu vzrostlých stromů je nutno tyto vykácet nad rámec PD
- z důvodu nutného navýšení celkové plochy zasítování po očištění skalního masivu je nutno adekvátně zvýšit počet kotvicích prvků, rohoží a sítí
- z důvodu navýšení odtěženého materiálu při očištění skalního masivu a odvozech veškeré natěžené rubaniny na skládku byly doměřeny výměry zřízení stupňů, nakládky a skládkového
- z důvodu snížení rozsahu dláždění koryta, v místě projektovaného dlážděného odvodňovacího žlabu, byly zastiženy hluboké hliněné pokryvy, které je nezbytné zpevnit kotvenými ocelovými sítěmi s podloženou georohoží a zřídít kotvené železobetonové stupně

vydáváme tímto pokyn k provedení těchto úprav a ke zpracování ZBV

Rozsah změn během výstavby bude stanoven na základě skutečného zaměření stavby nebo správcem schválené realizační dokumentace.

Cenově musí změnu posoudit příslušné majetkové oddělení objednatele.

S pozdravem

Vedoucí

V





Model: sanace Mohelnice  
 22-Mar-23 10:16:55

mm <sup>2</sup>	cm <sup>2</sup>	dm <sup>2</sup>	<b>m<sup>2</sup></b>	a	ha	km <sup>2</sup>
inch <sup>2</sup>	feet <sup>2</sup>	yard <sup>2</sup>	acre	mile <sup>2</sup>		?

0, 0 0 0 0 0

by Container <input type="button" value="v"/>	#Faces	Area
<b>Whole Model</b>	<b>118 517</b>	<b>6 943,0 m<sup>2</sup></b>
geomatrace01	79 772	4 769,0 m <sup>2</sup>
geomatrace02	642	20,4 m <sup>2</sup>
sit'01	471	13,7 m <sup>2</sup>
sit'02	4 364	240,1 m <sup>2</sup>
sit'03	404	10,9 m <sup>2</sup>
sit'04	1 350	40,3 m <sup>2</sup>
sit'05	31 514	1 848,7 m <sup>2</sup>
<b>TOTAL AREA (Whole Model)</b>	<b>118 517</b>	<b>6 943,0 m<sup>2</sup></b>

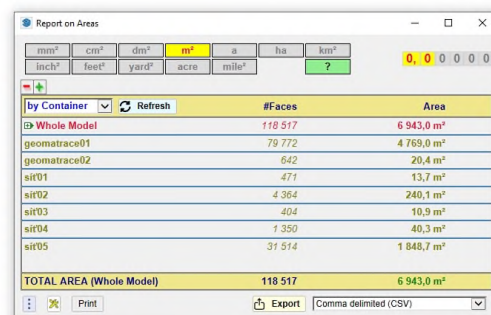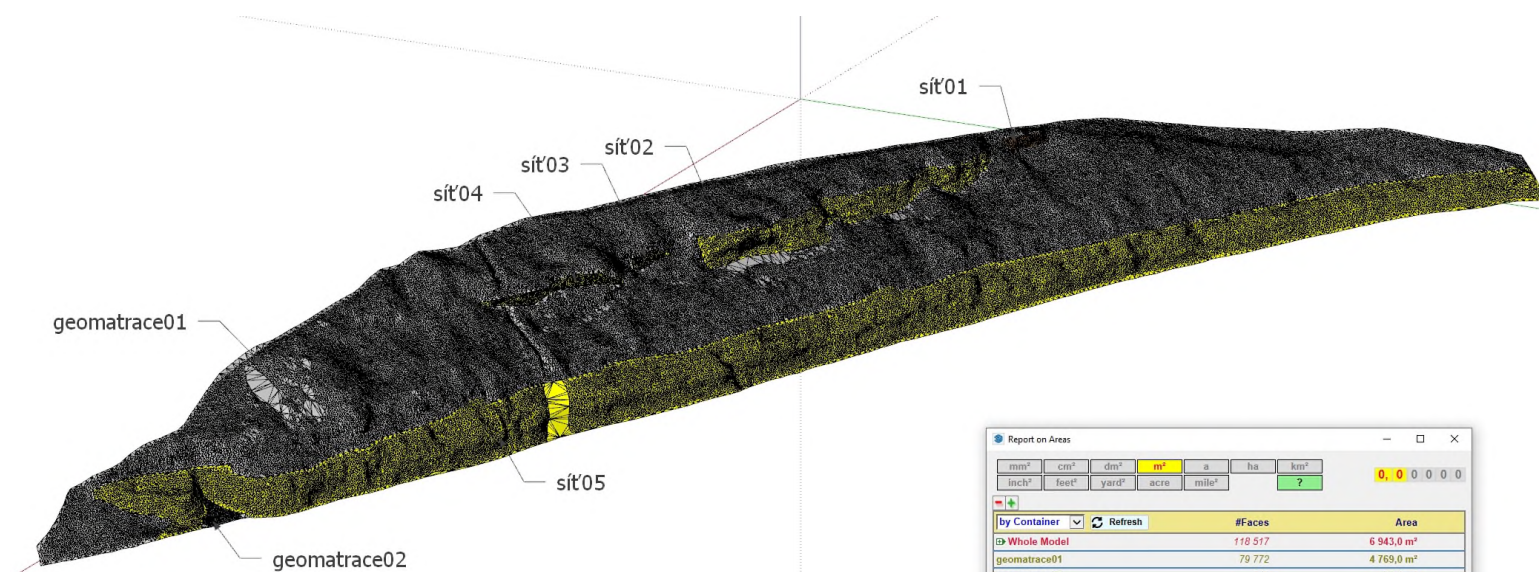

## Příloha faktury číslo 2023006

### Příjem odpadu 17 05 04

Datum návozu	Počet jízd	V celkovém množství	SPZ
03.01.2023	6	95,00 t	8U1 02 97
04.01.2023	6	95,10 t	8U1 02 97
05.01.2023	6	88,50 t	5L4 71 90
05.01.2023	6	91,70 t	5L4 79 09
05.01.2023	6	97,70 t	8U1 02 97
06.01.2023	6	91,80 t	5L4 71 90
06.01.2023	6	92,20 t	5L4 79 09
06.01.2023	6	103,20 t	8U1 02 97
10.01.2023	4	61,50 t	5L4 71 90
10.01.2023	4	61,70 t	5L4 79 09
10.01.2023	4	70,00 t	8U1 02 97
11.01.2023	2	30,20 t	5L4 71 90
11.01.2023	2	31,20 t	5L4 79 09
11.01.2023	2	34,80 t	8U1 02 97
12.01.2023	2	30,60 t	5L4 71 90
12.01.2023	2	32,10 t	5L4 79 09
12.01.2023	2	37,30 t	8U1 02 97
16.01.2023	2	29,10 t	8U1 02 97
17.01.2023	4	60,40 t	8U1 02 97
17.01.2023	4	57,90 t	4SC 59 38

19.01.2023	4	58,00	t	5L4 71 90
19.01.2023	5	75,60	t	8U1 02 97
19.01.2023	4	57,80	t	4SC 59 38
20.01.2023	3	43,50	t	5L4 79 09
20.01.2023	3	43,30	t	4SC 59 38
20.01.2023	2	31,60	t	8U1 02 97
23.01.2023	3	48,30	t	8U1 02 97
23.01.2023	3	43,50	t	5L4 79 09
23.01.2023	4	58,00	t	5L4 71 90
24.01.2023	4	56,00	t	5L4 79 09
24.01.2023	4	58,00	t	5L4 71 90
24.01.2023	2	32,60	t	8U1 02 97
25.01.2023	5	72,50	t	5L4 79 09
25.01.2023	5	80,80	t	8U1 02 97
25.01.2023	4	58,00	t	5L4 71 90
26.01.2023	4	58,00	t	5L4 71 90
26.01.2023	3	49,70	t	8U1 02 97
26.01.2023	4	58,00	t	5L4 79 09
27.01.2023	3	49,80	t	8U1 02 97
27.01.2023	1	14,50	t	5L4 79 09
27.01.2023	1	14,50	t	5L4 71 90
30.01.2023	4	84,60	t	8U1 02 97
31.01.2023	5	85,60	t	8U1 02 97
Celkový příjem odpadu 17 05 04		<b>2524,20</b>	<b>t</b>	

<b>EVIDENČNÍ LÍSTEK ev.číslo:</b>		163 / 2023
<b>Původce odpadu 17 05 04</b>		<b>Příjemce odpadu:</b>
Název:	zemina a kamení	ECO - RETEL s.r.o.
Protokol o zkouškách č.		
Množství:	15,5 t	
SPZ dopravce, typ vozu:	JU1 0214	
Předáno dne:	3.1.23	
<b>ROCKNET s.r.o.; IČO: 27357694</b>		razítko, podpis

<b>EVIDENČNÍ LÍSTEK ev.číslo:</b>		164 / 2023
<b>Původce odpadu 17 05 04</b>		<b>Příjemce odpadu:</b>
Název:	zemina a kamení	ECO - RETEL s.r.o.
Protokol o zkouškách č.		
Množství:	15,4 t	
SPZ dopravce, typ vozu:	JU1 0214	
Předáno dne:	3.1.23	
<b>ROCKNET s.r.o.; IČO: 27357694</b>		

<b>EVIDENČNÍ LÍSTEK ev.číslo:</b>		165 / 2023
<b>Původce odpadu 17 05 04</b>		<b>Příjemce odpadu:</b>
Název:	zemina a kamení	ECO - RETEL s.r.o.
Protokol o zkouškách č.		
Množství:	15,8 t	
SPZ dopravce, typ vozu:	JU1 0214	
Předáno dne:	3.1.23	
<b>ROCKNET s.r.o.; IČO: 27357694</b>		razítko, podpis

<b>EVIDENČNÍ LÍSTEK ev.číslo:</b>		106 / 2023
<b>Původce odpadu 17 05 04</b>		<b>Příjemce odpadu:</b>
Název:	zemina a kamení	ECO - RETEL s.r.o.
Protokol o zkouškách č.		
Množství:	16,2 t	
SPZ dopravce, typ vozu:	↓ U5 Q217	
Předáno dne:	3.9.23	
ROCKNET s.r.o.; IČO: 27357694		razítko, podpis

<b>EVIDENČNÍ LÍSTEK ev.číslo:</b>		104 / 2023
<b>Původce odpadu 17 05 04</b>		<b>Příjemce odpadu:</b>
Název:	zemina a kamení	ECO - RETEL s.r.o.
Protokol o zkouškách č.		
Množství:	16,3 t	
SPZ dopravce, typ vozu:	↓ U5 Q217	
Předáno dne:	3.9.23	
ROCKNET s.r.o.; IČO: 27357694		razítko, podpis

<b>EVIDENČNÍ LÍSTEK ev.číslo:</b>		108 / 2023
<b>Původce odpadu 17 05 04</b>		<b>Příjemce odpadu:</b>
Název:	zemina a kamení	ECO - RETEL s.r.o.
Protokol o zkouškách č.		
Množství:	15,8 t	
SPZ dopravce, typ vozu:	↓ U5 Q217	
Předáno dne:	3.9.23	
ROCKNET s.r.o.; IČO: 27357694		razítko, podpis

EVIDENČNÍ LÍSTEK ev.číslo:		169 / 2023
Původce odpadu 17 05 04		Příjemce odpadu:
Název:	zemina a kamení	ECO - RETEL s.r.o.
Protokol o zkouškách č.		
Množství:	141	
SPZ dopravce, typ vozu:	JUS1 0214	
Předáno dne:	4.1.23	
ROCKNET s.r.o.; IČO: 27357694		razítko, podpis

EVIDENČNÍ LÍSTEK ev.číslo:		140 / 2023
Původce odpadu 17 05 04		Příjemce odpadu:
Název:	zemina a kamení	ECO - RETEL s.r.o.
Protokol o zkouškách č.		
Množství:	155	
SPZ dopravce, typ vozu:	JUS1 0214	
Předáno dne:	4.1.23	
ROCKNET s.r.o.; IČO: 27357694		razítko, podpis

EVIDENČNÍ LÍSTEK ev.číslo:		141 / 2023
Původce odpadu 17 05 04		Příjemce odpadu:
Název:	zemina a kamení	ECO - RETEL s.r.o.
Protokol o zkouškách č.		
Množství:	16,1	
SPZ dopravce, typ vozu:	JUS1 0214	
Předáno dne:	4.1.23	
ROCKNET s.r.o.; IČO: 27357694		razítko, podpis

<b>EVIDENČNÍ LÍSTEK ev.číslo:</b>		142 / 2023
<b>Původce odpadu 17 05 04</b>		<b>Příjemce odpadu:</b>
Název:	zemina a kamení	ECO - RETEL s.r.o.
Protokol o zkouškách č.		
Množství:	15,3	
SPZ dopravce, typ vozu:	JUB 0217	
Předáno dne:	4.1.23	
<b>ROCKNET s.r.o.; IČO: 27357694</b>		razítko, podpis

<b>EVIDENČNÍ LÍSTEK ev.číslo:</b>		143 / 2023
<b>Původce odpadu 17 05 04</b>		<b>Příjemce odpadu:</b>
Název:	zemina a kamení	ECO - RETEL s.r.o.
Protokol o zkouškách č.		
Množství:	15,3	
SPZ dopravce, typ vozu:	JUB 0217	
Předáno dne:	4.1.2023	
<b>ROCKNET s.r.o.; IČO: 27357694</b>		razítko, podpis

<b>EVIDENČNÍ LÍSTEK ev.číslo:</b>		144 / 2023
<b>Původce odpadu 17 05 04</b>		<b>Příjemce odpadu:</b>
Název:	zemina a kamení	ECO - RETEL s.r.o.
Protokol o zkouškách č.		
Množství:	15,3	
SPZ dopravce, typ vozu:	JUB 0217	
Předáno dne:	4.1.2023	
<b>ROCKNET s.r.o.; IČO: 27357694</b>		razítko, podpis

EVIDENČNÍ LÍSTEK ev.číslo:		145 / 2023
Původce odpadu 17 05 04		Příjemce odpadu:
Název:	zemina a kamení	ECO - RETEL s.r.o.
Protokol o zkouškách č.		
Množství:	14,57	
SPZ dopravce, typ vozu:	524 4790	
Předáno dne:	5.1.23	
ROCKNET s.r.o.; IČO: 27357694		
		razítko, podpis

EVIDENČNÍ LÍSTEK ev.číslo:		148 / 2023
Původce odpadu 17 05 04		Příjemce odpadu:
Název:	zemina a kamení	ECO - RETEL s.r.o.
Protokol o zkouškách č.		
Množství:	14,87	
SPZ dopravce, typ vozu:	524 4790	
Předáno dne:	5.1.23	
ROCKNET s.r.o.; IČO: 27357694		
		razítko, podpis

EVIDENČNÍ LÍSTEK ev.číslo:		181 / 2023
Původce odpadu 17 05 04		Příjemce odpadu:
Název:	zemina a kamení	ECO - RETEL s.r.o.
Protokol o zkouškách č.		
Množství:	15,37	
SPZ dopravce, typ vozu:	524 4790	
Předáno dne:	5.1.2023	
ROCKNET s.r.o.; IČO: 27357694		
		razítko, podpis

EVIDENČNÍ LÍSTEK ev.číslo:		184 / 2023
Původce odpadu 17 05 04		Příjemce odpadu:
Název:	zemina a kamení	ECO - RETEL s.r.o.
Protokol o zkouškách č.		
Množství:	15,47	
SPZ dopravce, typ vozu:	524 4790	
Předáno dne:	5.1.2023	
ROCKNET s.r.o.; IČO: 27357694		
		razítko, podpis

EVIDENČNÍ LÍSTEK ev.číslo:		184 / 2023
Původce odpadu 17 05 04		Příjemce odpadu:
Název:	zemina a kamení	ECO - RETEL s.r.o.
Protokol o zkouškách č.		
Množství:	14,57	
SPZ dopravce, typ vozu:	524 4790	
Předáno dne:	5.1.23	
ROCKNET s.r.o.; IČO: 27357694		
		razítko, podpis

EVIDENČNÍ LÍSTEK ev.číslo:		190 / 2023
Původce odpadu 17 05 04		Příjemce odpadu:
Název:	zemina a kamení	ECO - RETEL s.r.o.
Protokol o zkouškách č.		
Množství:	14,27	
SPZ dopravce, typ vozu:	524 4790	
Předáno dne:	5.1.23	
ROCKNET s.r.o.; IČO: 27357694		
		razítko, podpis



<b>EVIDENČNÍ LÍSTEK ev.číslo:</b>		146 / 2023
<b>Původce odpadu 17 05 04</b>		<b>Příjemce odpadu:</b>
Název:	zemina a kamení	ECO - RETEL s.r.o.
Protokol o zkouškách č.		
Množství:	14,8 t	
SPZ dopravce, typ vozu:	524 7909	
Předáno dne:	5.1.25	
<b>ROCKNET s.r.o.; IČO: 27357694</b>		razítko, podpis

<b>EVIDENČNÍ LÍSTEK ev.číslo:</b>		182 / 2023
<b>Původce odpadu 17 05 04</b>		<b>Příjemce odpadu:</b>
Název:	zemina a kamení	ECO - RETEL s.r.o.
Protokol o zkouškách č.		
Množství:	15,8 t	
SPZ dopravce, typ vozu:	524 7909	
Předáno dne:	5.1.25	
<b>ROCKNET s.r.o.; IČO: 27357694</b>		razítko, podpis

<b>EVIDENČNÍ LÍSTEK ev.číslo:</b>		188 / 2023
<b>Původce odpadu 17 05 04</b>		<b>Příjemce odpadu:</b>
Název:	zemina a kamení	ECO - RETEL s.r.o.
Protokol o zkouškách č.		
Množství:	15,3 t	
SPZ dopravce, typ vozu:	524 7909	
Předáno dne:	5.1.25	
<b>ROCKNET s.r.o.; IČO: 27357694</b>		razítko, podpis

<b>EVIDENČNÍ LÍSTEK ev.číslo:</b>		149 / 2023
<b>Původce odpadu 17 05 04</b>		<b>Příjemce odpadu:</b>
Název:	zemina a kamení	ECO - RETEL s.r.o.
Protokol o zkouškách č.		
Množství:	15,2 t	
SPZ dopravce, typ vozu:	564 9909	
Předáno dne:	5.1.23	
ROCKNET s.r.o.; IČO: 27357694		razítko, podpis

<b>EVIDENČNÍ LÍSTEK ev.číslo:</b>		185 / 2023
<b>Původce odpadu 17 05 04</b>		<b>Příjemce odpadu:</b>
Název:	zemina a kamení	ECO - RETEL s.r.o.
Protokol o zkouškách č.		
Množství:	14,8 t	
SPZ dopravce, typ vozu:	524 9909	
Předáno dne:	5.1.23	
ROCKNET s.r.o.; IČO: 27357694		razítko, podpis

<b>EVIDENČNÍ LÍSTEK ev.číslo:</b>		191 / 2023
<b>Původce odpadu 17 05 04</b>		<b>Příjemce odpadu:</b>
Název:	zemina a kamení	ECO - RETEL s.r.o.
Protokol o zkouškách č.		
Množství:	15,2 t	
SPZ dopravce, typ vozu:	564 9909	
Předáno dne:	5.1.23	
ROCKNET s.r.o.; IČO: 27357694		razítko, podpis

EVIDENČNÍ LÍSTEK ev.číslo:		144 / 2023
Původce odpadu 17 05 04		Příjemce odpadu:
Název:	zemina a kamení	ECO - RETEL s.r.o.
Protokol o zkouškách č.		
Množství:	14 1 +	
SPZ dopravce, typ vozu:	JUG 0214	
Předáno dne:	5.1.23	
ROCKNET s.r.o.; IČO: 27357694		razítko, podpis

EVIDENČNÍ LÍSTEK ev.číslo:		180 / 2023
Původce odpadu 17 05 04		Příjemce odpadu:
Název:	zemina a kamení	ECO - RETEL s.r.o.
Protokol o zkouškách č.		
Množství:	16 3 +	
SPZ dopravce, typ vozu:	JUG 0214	
Předáno dne:	5.1.23	
ROCKNET s.r.o.; IČO: 27357694		razítko, podpis

EVIDENČNÍ LÍSTEK ev.číslo:		183 / 2023
Původce odpadu 17 05 04		Příjemce odpadu:
Název:	zemina a kamení	ECO - RETEL s.r.o.
Protokol o zkouškách č.		
Množství:	16 1 +	
SPZ dopravce, typ vozu:	JUG 0214	
Předáno dne:	5.1.2023	
ROCKNET s.r.o.; IČO: 27357694		razítko, podpis

EVIDENČNÍ LÍSTEK ev.číslo:		186 / 2023
Původce odpadu 17 05 04		Příjemce odpadu:
Název:	zemina a kamení	ECO - RETEL s.r.o.
Protokol o zkouškách č.		
Množství:	14 +	
SPZ dopravce, typ vozu:	JUG 0214	
Předáno dne:	5.1.23	
ROCKNET s.r.o.; IČO: 27357694		razítko, podpis

EVIDENČNÍ LÍSTEK ev.číslo:		189 / 2023
Původce odpadu 17 05 04		Příjemce odpadu:
Název:	zemina a kamení	ECO - RETEL s.r.o.
Protokol o zkouškách č.		
Množství:	16 5 +	
SPZ dopravce, typ vozu:	JUG 0214	
Předáno dne:	5.1.23	
ROCKNET s.r.o.; IČO: 27357694		razítko, podpis

EVIDENČNÍ LÍSTEK ev.číslo:		192 / 2023
Původce odpadu 17 05 04		Příjemce odpadu:
Název:	zemina a kamení	ECO - RETEL s.r.o.
Protokol o zkouškách č.		
Množství:	14 9	
SPZ dopravce, typ vozu:	JUG 0214	
Předáno dne:	5.1.23	
ROCKNET s.r.o.; IČO: 27357694		razítko, podpis

EVIDENČNÍ LÍSTEK ev.číslo:		193 / 2023
Původce odpadu 17 05 04		Příjemce odpadu:
Název:	zemina a kamení	ECO - RETEL s.r.o.
Protokol o zkouškách č.		
Množství:	15,5 t	
SPZ dopravce, typ vozu:	524 4190	
Předáno dne:	6.1.2023	
ROCKNET s.r.o.; IČO: 27357694		razítka, podpis

EVIDENČNÍ LÍSTEK ev.číslo:		196 / 2023
Původce odpadu 17 05 04		Příjemce odpadu:
Název:	zemina a kamení	ECO - RETEL s.r.o.
Protokol o zkouškách č.		
Množství:	15,2 t	
SPZ dopravce, typ vozu:	524 4190	
Předáno dne:	6.1.23	
ROCKNET s.r.o.; IČO: 27357694		razítka, podpis

EVIDENČNÍ LÍSTEK ev.číslo:		199 / 2023
Původce odpadu 17 05 04		Příjemce odpadu:
Název:	zemina a kamení	ECO - RETEL s.r.o.
Protokol o zkouškách č.		
Množství:	15,5 t	
SPZ dopravce, typ vozu:	524 4190	
Předáno dne:	6.1.23	
ROCKNET s.r.o.; IČO: 27357694		razítka, podpis

EVIDENČNÍ LÍSTEK ev.číslo:		202 / 2023
Původce odpadu 17 05 04		Příjemce odpadu:
Název:	zemina a kamení	ECO - RETEL s.r.o.
Protokol o zkouškách č.		
Množství:	15,1 t	
SPZ dopravce, typ vozu:	524 4190	
Předáno dne:	6.1.23	
ROCKNET s.r.o.; IČO: 27357694		razítka, podpis

EVIDENČNÍ LÍSTEK ev.číslo:		205 / 2023
Původce odpadu 17 05 04		Příjemce odpadu:
Název:	zemina a kamení	ECO - RETEL s.r.o.
Protokol o zkouškách č.		
Množství:	15,3 t	
SPZ dopravce, typ vozu:	524 4190	
Předáno dne:	6.1.23	
ROCKNET s.r.o.; IČO: 27357694		razítka, podpis

EVIDENČNÍ LÍSTEK ev.číslo:		208 / 2023
Původce odpadu 17 05 04		Příjemce odpadu:
Název:	zemina a kamení	ECO - RETEL s.r.o.
Protokol o zkouškách č.		
Množství:	15,4 t	
SPZ dopravce, typ vozu:	524 4190	
Předáno dne:	6.1.23	
ROCKNET s.r.o.; IČO: 27357694		razítka, podpis

EVIDENČNÍ LÍSTEK ev.číslo:		194 / 2023
Původce odpadu 17 05 04		Příjemce odpadu:
Název:	zemina a kamení	ECO - RETEL s.r.o.
Protokol o zkouškách č.		
Množství:	15,1 t	
SPZ dopravce, typ vozu:	5L4 4909	
Předáno dne:	6.3.23	
ROCKNET s.r.o.; IČO: 27357694		razítko, podpis

EVIDENČNÍ LÍSTEK ev.číslo:		194 / 2023
Původce odpadu 17 05 04		Příjemce odpadu:
Název:	zemina a kamení	ECO - RETEL s.r.o.
Protokol o zkouškách č.		
Množství:	15,1 t	
SPZ dopravce, typ vozu:	5L4 4909	
Předáno dne:	6.1.23	
ROCKNET s.r.o.; IČO: 27357694		razítko, podpis

EVIDENČNÍ LÍSTEK ev.číslo:		300 / 2023
Původce odpadu 17 05 04		Příjemce odpadu:
Název:	zemina a kamení	ECO - RETEL s.r.o.
Protokol o zkouškách č.		
Množství:	15,4	
SPZ dopravce, typ vozu:	5L4 4909	
Předáno dne:	6.1.23	
ROCKNET s.r.o.; IČO: 27357694		razítko, podpis

EVIDENČNÍ LÍSTEK ev.číslo:		203 / 2023
Původce odpadu 17 05 04		Příjemce odpadu:
Název:	zemina a kamení	ECO - RETEL s.r.o.
Protokol o zkouškách č.		
Množství:	14,9 t	
SPZ dopravce, typ vozu:	5L4 4909	
Předáno dne:	6.1.23	
ROCKNET s.r.o.; IČO: 27357694		razítko, podpis

EVIDENČNÍ LÍSTEK ev.číslo:		206 / 2023
Původce odpadu 17 05 04		Příjemce odpadu:
Název:	zemina a kamení	ECO - RETEL s.r.o.
Protokol o zkouškách č.		
Množství:	15,2 t	
SPZ dopravce, typ vozu:	5L4 4909	
Předáno dne:	6.1.23	
ROCKNET s.r.o.; IČO: 27357694		razítko, podpis

EVIDENČNÍ LÍSTEK ev.číslo:		209 / 2023
Původce odpadu 17 05 04		Příjemce odpadu:
Název:	zemina a kamení	ECO - RETEL s.r.o.
Protokol o zkouškách č.		
Množství:	15,8	
SPZ dopravce, typ vozu:	5L4 4909	
Předáno dne:	6.1.23	
ROCKNET s.r.o.; IČO: 27357694		razítko, podpis

EVIDENČNÍ LÍSTEK ev.číslo:		195 / 2023
Původce odpadu 17 05 04		Příjemce odpadu:
Název:	zemina a kamení	ECO - RETEL s.r.o.
Protokol o zkouškách č.		
Množství:	18,1	
SPZ dopravce, typ vozu:	JUG 0214	
Předáno dne:	6.7.23	
ROCKNET s.r.o.; IČO: 27357694		
		razítko, podpis

EVIDENČNÍ LÍSTEK ev.číslo:		198 / 2023
Původce odpadu 17 05 04		Příjemce odpadu:
Název:	zemina a kamení	ECO - RETEL s.r.o.
Protokol o zkouškách č.		
Množství:	14,1 +	
SPZ dopravce, typ vozu:	JUG 0214	
Předáno dne:	6.7.23	
ROCKNET s.r.o.; IČO: 27357694		
		razítko, podpis

EVIDENČNÍ LÍSTEK ev.číslo:		201 / 2023
Původce odpadu 17 05 04		Příjemce odpadu:
Název:	zemina a kamení	ECO - RETEL s.r.o.
Protokol o zkouškách č.		
Množství:	16,1 +	
SPZ dopravce, typ vozu:	JUG 0214	
Předáno dne:	6.7.23	
ROCKNET s.r.o.; IČO: 27357694		
		razítko, podpis

EVIDENČNÍ LÍSTEK ev.číslo:		204 / 2023
Původce odpadu 17 05 04		Příjemce odpadu:
Název:	zemina a kamení	ECO - RETEL s.r.o.
Protokol o zkouškách č.		
Množství:	14,1 +	
SPZ dopravce, typ vozu:	JUG 0214	
Předáno dne:	6.7.23	
ROCKNET s.r.o.; IČO: 27357694		
		razítko, podpis

EVIDENČNÍ LÍSTEK ev.číslo:		207 / 2023
Původce odpadu 17 05 04		Příjemce odpadu:
Název:	zemina a kamení	ECO - RETEL s.r.o.
Protokol o zkouškách č.		
Množství:	14,3	
SPZ dopravce, typ vozu:	JUG 0214	
Předáno dne:	6.7.23	
ROCKNET s.r.o.; IČO: 27357694		
		razítko, podpis

EVIDENČNÍ LÍSTEK ev.číslo:		210 / 2023
Původce odpadu 17 05 04		Příjemce odpadu:
Název:	zemina a kamení	ECO - RETEL s.r.o.
Protokol o zkouškách č.		
Množství:	16,8	
SPZ dopravce, typ vozu:	JUG 0214	
Předáno dne:	6.7.23	
ROCKNET s.r.o.; IČO: 27357694		
		razítko, podpis

EVIDENČNÍ LÍSTEK ev.číslo:		211 / 2023
Původce odpadu 17 05 04		Příjemce odpadu:
Název:	zemina a kamení	ECO - RETEL s.r.o.
Protokol o zkouškách č.		
Množství:	15,4 t	
SPZ dopravce, typ vozu:	564 4790	
Předáno dne:	10.1.23	
ROCKNET s.r.o.; IČO: 27357694		
		razítko, podpis

EVIDENČNÍ LÍSTEK ev.číslo:		214 / 2023
Původce odpadu 17 05 04		Příjemce odpadu:
Název:	zemina a kamení	ECO - RETEL s.r.o.
Protokol o zkouškách č.		
Množství:	15,5	
SPZ dopravce, typ vozu:	564 4790	
Předáno dne:	10.1.23	
ROCKNET s.r.o.; IČO: 27357694		
		razítko, podpis

EVIDENČNÍ LÍSTEK ev.číslo:		214 / 2023
Původce odpadu 17 05 04		Příjemce odpadu:
Název:	zemina a kamení	ECO - RETEL s.r.o.
Protokol o zkouškách č.		
Množství:	15,6 t	
SPZ dopravce, typ vozu:	564 4790	
Předáno dne:	10.1.23	
ROCKNET s.r.o.; IČO: 27357694		
		razítko, podpis

EVIDENČNÍ LÍSTEK ev.číslo:		220 / 2023
Původce odpadu 17 05 04		Příjemce odpadu:
Název:	zemina a kamení	ECO - RETEL s.r.o.
Protokol o zkouškách č.		
Množství:	15,6 t	
SPZ dopravce, typ vozu:	564 4790	
Předáno dne:	10.1.23	
ROCKNET s.r.o.; IČO: 27357694		
		razítko, podpis

EVIDENČNÍ LÍSTEK ev.číslo:		212 / 2023
Původce odpadu 17 05 04		Příjemce odpadu:
Název:	zemina a kamení	ECO - RETEL s.r.o.
Protokol o zkouškách č.		
Množství:	15,7 t	
SPZ dopravce, typ vozu:	564 4790	
Předáno dne:	10.1.23	
ROCKNET s.r.o.; IČO: 27357694		
		razítko, podpis

EVIDENČNÍ LÍSTEK ev.číslo:		215 / 2023
Původce odpadu 17 05 04		Příjemce odpadu:
Název:	zemina a kamení	ECO - RETEL s.r.o.
Protokol o zkouškách č.		
Množství:	15,8	
SPZ dopravce, typ vozu:	564 4790	
Předáno dne:	10.1.23	
ROCKNET s.r.o.; IČO: 27357694		
		razítko, podpis

EVIDENČNÍ LÍSTEK ev.číslo:		218 / 2023
Původce odpadu 17 05 04		Příjemce odpadu:
Název:	zemina a kamení	ECO - RETEL s.r.o.
Protokol o zkouškách č.		
Množství:	15,3 t	
SPZ dopravce, typ vozu:	524/4909	
Předáno dne:	10.1.23	
ROCKNET s.r.o.; IČO: 27357694		razítko, podpis

EVIDENČNÍ LÍSTEK ev.číslo:		221 / 2023
Původce odpadu 17 05 04		Příjemce odpadu:
Název:	zemina a kamení	ECO - RETEL s.r.o.
Protokol o zkouškách č.		
Množství:	15,5 t	
SPZ dopravce, typ vozu:	524/4909	
Předáno dne:	10.1.23	
ROCKNET s.r.o.; IČO: 27357694		razítko, podpis

EVIDENČNÍ LÍSTEK ev.číslo:		213 / 2023
Původce odpadu 17 05 04		Příjemce odpadu:
Název:	zemina a kamení	ECO - RETEL s.r.o.
Protokol o zkouškách č.		
Množství:	14,3	
SPZ dopravce, typ vozu:	504/0214	
Předáno dne:	10.1.23	
ROCKNET s.r.o.; IČO: 27357694		razítko, podpis

EVIDENČNÍ LÍSTEK ev.číslo:		216 / 2023
Původce odpadu 17 05 04		Příjemce odpadu:
Název:	zemina a kamení	ECO - RETEL s.r.o.
Protokol o zkouškách č.		
Množství:	15,1	
SPZ dopravce, typ vozu:	504/0214	
Předáno dne:	10.1.23	
ROCKNET s.r.o.; IČO: 27357694		razítko, podpis

EVIDENČNÍ LÍSTEK ev.číslo:		219 / 2023
Původce odpadu 17 05 04		Příjemce odpadu:
Název:	zemina a kamení	ECO - RETEL s.r.o.
Protokol o zkouškách č.		
Množství:	14,3 t	
SPZ dopravce, typ vozu:	504/0214	
Předáno dne:	10.1.23	
ROCKNET s.r.o.; IČO: 27357694		razítko, podpis

EVIDENČNÍ LÍSTEK ev.číslo:		222 / 2023
Původce odpadu 17 05 04		Příjemce odpadu:
Název:	zemina a kamení	ECO - RETEL s.r.o.
Protokol o zkouškách č.		
Množství:	14,3	
SPZ dopravce, typ vozu:	504/0214	
Předáno dne:	10.1.23	
ROCKNET s.r.o.; IČO: 27357694		razítko, podpis



<b>EVIDENČNÍ LÍSTEK ev.číslo:</b>		223 / 2023
<b>Původce odpadu 17 05 04</b>		<b>Příjemce odpadu:</b>
Název:	zemina a kamení	ECO - RETEL s.r.o.
Protokol o zkouškách č.		
Množství:	15/47	
SPZ dopravce, typ vozu:	524 4190	
Předáno dne:	11. 8. 23	
<b>ROCKNET s.r.o.; IČO: 27357694</b>		razítko, podpis

<b>EVIDENČNÍ LÍSTEK ev.číslo:</b>		224 / 2023
<b>Původce odpadu 17 05 04</b>		<b>Příjemce odpadu:</b>
Název:	zemina a kamení	ECO - RETEL s.r.o.
Protokol o zkouškách č.		
Množství:	15,87	
SPZ dopravce, typ vozu:	5244909	
Předáno dne:	11. 9. 23	
<b>ROCKNET s.r.o.; IČO: 27357694</b>		razítko, podpis

<b>EVIDENČNÍ LÍSTEK ev.číslo:</b>		225 / 2023
<b>Původce odpadu 17 05 04</b>		<b>Příjemce odpadu:</b>
Název:	zemina a kamení	ECO - RETEL s.r.o.
Protokol o zkouškách č.		
Množství:	14,7	
SPZ dopravce, typ vozu:	504 0214	
Předáno dne:	11. 9. 23	
<b>ROCKNET s.r.o.; IČO: 27357694</b>		razítko, podpis

<b>EVIDENČNÍ LÍSTEK ev.číslo:</b>		226 / 2023
<b>Původce odpadu 17 05 04</b>		<b>Příjemce odpadu:</b>
Název:	zemina a kamení	ECO - RETEL s.r.o.
Protokol o zkouškách č.		
Množství:	114,87	
SPZ dopravce, typ vozu:	5L4 9790	
Předáno dne:	11.7.25	
ROCKNET s.r.o.; IČO: 27357694		razítko, podpis

<b>EVIDENČNÍ LÍSTEK ev.číslo:</b>		224 / 2023
<b>Původce odpadu 17 05 04</b>		<b>Příjemce odpadu:</b>
Název:	zemina a kamení	ECO - RETEL s.r.o.
Protokol o zkouškách č.		
Množství:	15,47	
SPZ dopravce, typ vozu:	5L4 9900	
Předáno dne:	11.7.25	
ROCKNET s.r.o.; IČO: 27357694		razítko, podpis

<b>EVIDENČNÍ LÍSTEK ev.číslo:</b>		228 / 2023
<b>Původce odpadu 17 05 04</b>		<b>Příjemce odpadu:</b>
Název:	zemina a kamení	ECO - RETEL s.r.o.
Protokol o zkouškách č.		
Množství:	19,17	
SPZ dopravce, typ vozu:	11.7.25	
Předáno dne:	10.9.2027	
ROCKNET s.r.o.; IČO: 27357694		razítko, podpis

1044,67

<b>EVIDENČNÍ LÍSTEK ev.číslo:</b>		229 / 2023
<b>Původce odpadu 17 05 04</b>		<b>Příjemce odpadu:</b>
Název:	zemina a kamení	ECO - RETEL s.r.o.
Protokol o zkouškách č.		
Množství:	15,1 t	
SPZ dopravce, typ vozu:	544 4210	
Předáno dne:	12.1.23	
<b>ROCKNET s.r.o.; IČO: 27357694</b>		razítko, podpis

<b>EVIDENČNÍ LÍSTEK ev.číslo:</b>		230 / 2023
<b>Původce odpadu 17 05 04</b>		<b>Příjemce odpadu:</b>
Název:	zemina a kamení	ECO - RETEL s.r.o.
Protokol o zkouškách č.		
Množství:	16,2	
SPZ dopravce, typ vozu:	542/41001	
Předáno dne:	12.1.23	
<b>ROCKNET s.r.o.; IČO: 27357694</b>		razítko, podpis

<b>EVIDENČNÍ LÍSTEK ev.číslo:</b>		231 / 2023
<b>Původce odpadu 17 05 04</b>		<b>Příjemce odpadu:</b>
Název:	zemina a kamení	ECO - RETEL s.r.o.
Protokol o zkouškách č.	16,9	
Množství:		
SPZ dopravce, typ vozu:	401 0217	
Předáno dne:	12.1.23	
<b>ROCKNET s.r.o.; IČO: 27357694</b>		razítko, podpis

<b>EVIDENČNÍ LÍSTEK ev.číslo:</b>		232/2023
<b>Původce odpadu 17 05 04</b>		<b>Příjemce odpadu:</b>
Název:	zemina a kamení	ECO - RETEL s.r.o.
Protokol o zkouškách č.	15,5	
Množství:		
SPZ dopravce, typ vozu:	524 4190	
Předáno dne:	12.1.23	
<b>ROCKNET s.r.o.; IČO: 27357694</b>		razítko, podpis

<b>EVIDENČNÍ LÍSTEK ev.číslo:</b>		233/2023
<b>Původce odpadu 17 05 04</b>		<b>Příjemce odpadu:</b>
Název:	zemina a kamení	ECO - RETEL s.r.o.
Protokol o zkouškách č.	15,9	
Množství:		
SPZ dopravce, typ vozu:	524 4900	
Předáno dne:	10.1.23	
<b>ROCKNET s.r.o.; IČO: 27357694</b>		razítko, podpis

<b>EVIDENČNÍ LÍSTEK ev.číslo:</b>		234 / 2023
<b>Původce odpadu 17 05 04</b>		<b>Příjemce odpadu:</b>
Název:	zemina a kamení	ECO - RETEL s.r.o.
Protokol o zkouškách č.		
Množství:	20,4t	
SPZ dopravce, typ vozu:	104 021	
Předáno dne:	12.1.23	
<b>ROCKNET s.r.o.; IČO: 27357694</b>		razítko, podpis

100+

- EVIDENČNÍ LÍSTEK ev.číslo:		64 / 2023
<b>Původce odpadu 17 05 04</b>		<b>Příjemce odpadu:</b>
Název:	zemina a kamení	-----
Protokol o zkouškách č.		
Množství:	74,3 t	
SPZ dopravce, typ vozu:	8U10297	
Předáno dne:	7.6.1	
ROCKNET s.r.o.; IČO: 27357694		razítko, podpis

EVIDENČNÍ LÍSTEK ev.číslo:		65 / 2023
<b>Původce odpadu 17 05 04</b>		<b>Příjemce odpadu:</b>
Název:	zemina a kamení	ECO - RETEL s.r.o.
Protokol o zkouškách č.		
Množství:	74,8	
SPZ dopravce, typ vozu:	8U10297	
Předáno dne:	7.7.2023	
ROCKNET s.r.o.; IČO: 27357694		razítko, podpis

EVIDENČNÍ LÍSTEK ev.číslo:		61 / 2023
<b>Původce odpadu 17 05 04</b>		<b>Příjemce odpadu:</b>
Název:	zemina a kamení	ECO - RETEL s.r.o.
Protokol o zkouškách č.		
Množství:	74,9	
SPZ dopravce, typ vozu:	8U10297	
Předáno dne:	7.7.2023	
ROCKNET s.r.o.; IČO: 27357694		razítko, podpis

EVIDENČNÍ LÍSTEK ev.číslo:		62 / 2023
Původce odpadu 17 05 04		Příjemce odpadu:
Název:	zemina a kamení	ECO - RETEL s.r.o.
Protokol o zkouškách č.		
Množství:	14,8	
SPZ dopravce, typ vozu:	801 0297	
Předáno dne:	76.7.20	
ROCKNET s.r.o.; IČO: 27357694		razítko, podpis

EVIDENČNÍ LÍSTEK ev.číslo:		63 / 2023
Původce odpadu 17 05 04		Příjemce odpadu:
Název:	zemina a kamení	ECO - RETEL s.r.o.
Protokol o zkouškách č.		
Množství:	15,6	
SPZ dopravce, typ vozu:	807 0297	
Předáno dne:	77.7.2023	
ROCKNET s.r.o.; IČO: 27357694		razítko, podpis

EVIDENČNÍ LÍSTEK ev.číslo:		66 / 2023
Původce odpadu 17 05 04		Příjemce odpadu:
Název:	zemina a kamení	ECO - RETEL s.r.o.
Protokol o zkouškách č.		
Množství:	15,1	
SPZ dopravce, typ vozu:	807 0297	
Předáno dne:	79.7.2023	
ROCKNET s.r.o.; IČO: 27357694		razítko, podpis

EVIDENČNÍ LÍSTEK ev.číslo:		44 / 2023
Původce odpadu 17 05 04		Příjemce odpadu:
Název:	zemina a kamení	ECO - RETEL s.r.o.
Protokol o zkouškách č.		
Množství:	14,6 t	
SPZ dopravce, typ vozu:	48C 59-20	
Předáno dne:	14. 1. 23	
ROCKNET s.r.o.; IČO: 27357694		razítko, podpis

EVIDENČNÍ LÍSTEK ev.číslo:		44 / 2023
Původce odpadu 17 05 04		Příjemce odpadu:
Název:	zemina a kamení	ECO - RETEL s.r.o.
Protokol o zkouškách č.		
Množství:	14,4 t	
SPZ dopravce, typ vozu:	48C 59-38	
Předáno dne:	14. 1. 23	
ROCKNET s.r.o.; IČO: 27357694		razítko, podpis

EVIDENČNÍ LÍSTEK ev.číslo:		48 / 2023
Původce odpadu 17 05 04		Příjemce odpadu:
Název:	zemina a kamení	ECO - RETEL s.r.o.
Protokol o zkouškách č.		
Množství:	14,5 t	
SPZ dopravce, typ vozu:	15C 59-38	
Předáno dne:	13. 1. 23	
ROCKNET s.r.o.; IČO: 27357694		razítko, podpis

EVIDENČNÍ LÍSTEK ev.číslo:		43 / 2023
Původce odpadu 17 05 04		Příjemce odpadu:
Název:	zemina a kamení	ECO - RETEL s.r.o.
Protokol o zkouškách č.		
Množství:	14,4 t	
SPZ dopravce, typ vozu:	15C 59-38	
Předáno dne:	14. 1. 23	
ROCKNET s.r.o.; IČO: 27357694		razítko, podpis

EVIDENČNÍ LÍSTEK ev.číslo:		69 / 2023
Původce odpadu 17 05 04		Příjemce odpadu:
Název:	zemina a kamení	ECO - RETEL s.r.o.
Protokol o zkouškách č.		
Množství:	14,5	
SPZ dopravce, typ vozu:	5L4 4190	
Předáno dne:	19. 1. 23	
ROCKNET s.r.o.; IČO: 27357694		razítko, podpis

EVIDENČNÍ LÍSTEK ev.číslo:		40 / 2023
Původce odpadu 17 05 04		Příjemce odpadu:
Název:	zemina a kamení	ECO - RETEL s.r.o.
Protokol o zkouškách č.		
Množství:	<del>14,5</del> 14,5	
SPZ dopravce, typ vozu:	5L4 4190	
Předáno dne:	19. 1. 23	
ROCKNET s.r.o.; IČO: 27357694		razítko, podpis

EVIDENČNÍ LÍSTEK ev.číslo:		86 / 2023
Původce odpadu 17 05 04		Příjemce odpadu:
Název:	zemina a kamení	ECO - RETEL s.r.o.
Protokol o zkouškách č.		
Množství:	14,5	
SPZ dopravce, typ vozu:	5LH 4190	
Předáno dne:	19.1.23	
ROCKNET s.r.o.; IČO: 27357694		
/ razítko, podpis		

EVIDENČNÍ LÍSTEK ev.číslo:		42 / 2023
Původce odpadu 17 05 04		Příjemce odpadu:
Název:	zemina a kamení	ECO - RETEL s.r.o.
Protokol o zkouškách č.		
Množství:	14,5	
SPZ dopravce, typ vozu:	5LH 4190	
Předáno dne:	19.1.23	
ROCKNET s.r.o.; IČO: 27357694		
/ razítko, podpis		

EVIDENČNÍ LÍSTEK ev.číslo:		84 / 2023
Původce odpadu 17 05 04		Příjemce odpadu:
Název:	zemina a kamení	ECO - RETEL s.r.o.
Protokol o zkouškách č.		
Množství:	75,9	
SPZ dopravce, typ vozu:	8V10297	
Předáno dne:	19.7.2023	
ROCKNET s.r.o.; IČO: 27357694		
/ razítko, podpis		

EVIDENČNÍ LÍSTEK ev.číslo:		90 / 2023
Původce odpadu 17 05 04		Příjemce odpadu:
Název:	zemina a kamení	ECO - RETEL s.r.o.
Protokol o zkouškách č.		
Množství:	75,3	
SPZ dopravce, typ vozu:	8V10297	
Předáno dne:	19.7.2023	
ROCKNET s.r.o.; IČO: 27357694		
/ razítko, podpis		

EVIDENČNÍ LÍSTEK ev.číslo:		49 / 2023
Původce odpadu 17 05 04		Příjemce odpadu:
Název:	zemina a kamení	ECO - RETEL s.r.o.
Protokol o zkouškách č.		
Množství:	74,5	
SPZ dopravce, typ vozu:	8V10297	
Předáno dne:	19.7.2023	
ROCKNET s.r.o.; IČO: 27357694		
/ razítko, podpis		

EVIDENČNÍ LÍSTEK ev.číslo:		88 / 2023
Původce odpadu 17 05 04		Příjemce odpadu:
Název:	zemina a kamení	ECO - RETEL s.r.o.
Protokol o zkouškách č.		
Množství:	74,7	
SPZ dopravce, typ vozu:	8V10297	
Předáno dne:	19.7.2023	
ROCKNET s.r.o.; IČO: 27357694		
/ razítko, podpis		
