

## Krycí list ZBV

Název Stavby dle SoD: <b>II/118 Kladno, oprava mostu ev. č. 118-042 přes Huťskou ulici – dokončení díla</b> Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>SO180 Dopravně inženýrská opatření</b>	Číslo SO/PS / / pořadí Změny SO/PS: <b>SO 180/1</b>	Číslo ZBV: <b>2</b>
---	---	------------------------

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace  
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov  
IČ: 00066001

Zhotovitel: **Stavební firma HOBST a.s.**  
Soběšínská 2702, 190 16 Praha 9  
IČ:48033251

## Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.1	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.2	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.3	-179 100,00	366 054,00	186 954,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.4	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.5	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ <b>SUMA</b>	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
<b>2</b>	<b>-179 100,00</b>	<b>366 054,00</b>	<b>186 954,00</b>

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.  
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Změnové listy (02)  
a pro Rozpis ocenění změn položek (04).

## Změnový list

<b>Název Stavby dle SoD:</b> II/118 Kladno, oprava mostu ev. č. 118-042 přes Hutskou ulici – dokončení díla	Číslo SO/PS / / pořadí Změny SO/PS: <b>SO 180/1</b>	Číslo ZBV / Skupina změny: <b>2</b>
<b>Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):</b> SO180 Dopravné inženýrská opatření		

Strany smlouvy o dílo S-3114/00066001/2022 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 24.10.2022 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: **Stavební firma HOBST a.s., Soběšinská 2702, 190 16 Praha 9**

<u>Přílohy Změnového listu:</u>	<u>Příjemce</u>
1. Krycí list 1 počet listů	Objednatel
2. Změnový list 2 počet listů	Zhotovitel
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů	Projektant (AD)
4. Rozpis ocenění Změn položek 1 počet listů	Stavební dozor
5. Přehled zařazení změn do Skupin 1 počet listů	Supervize
6. Přehled dokladů 1 počet listů	
7. Soupis prací SO po všech změnách 3 počet listů	
Další doklady dle přehledu dokladů 43 počet listů	

Iniciátor Změny: Zhotovitel

Předmět Změny: DIO, odstranění provizorního chodníku, oprava výtluků

**Dílčí změna č.1 - Doba realizace - DIO**

Na základě Dodatku č.1 a dle odsouhlaseného HMG - Příloha č. 10, je stanovena skutečná doba realizace 10.11.2022 až 31.5.2023 (celkem 202 dní).

Dle čl.6 Směrnice R-Sm -36 KSÚS SK byla dílčí změna 1 vyvolána objektivně nepředvídanými okolnostmi popsány v dílčí změně č.2 a č.3, čímž došlo k tzv. zřetězení změn a dílčí změna 1 je zařazena do sk.změn 3.

Části DIO jsou dle projektu PDPS, jejich skutečná doba je:

Etapa II: 202 dní

Pod mostem (pilíř P2): 90 dní

Pod mostem (podhled NK): 30 dní

Změna má dopad na položky "nájem", jedná se o změny množství položek č. 8, 11, 16, 19, 22, 25 a 28.

**Dílčí změna č.2 - Provizorní chodník**

Budoucí chodník Etapy I. byl vlivem přerušení stavby na dobu neurčitou dosypán zhotovitelem Etapy I. v celé délce do úrovně HH budoucího asfaltu, aby po něm byl umožněn pohyb chodců před započítáním prací Etapy II.

Jako Etapa I. je pro účely tohoto ZBV označena stavba opravy mostu mezi objednatel: KSÚS Středočeského kraje a zhotovitelem: Raeder & Falge. Objednatel vypověděl původnímu zhotoviteli smlouvu a vypsal novou soutěž na dokončení díla - pro účely tohoto ZBV nazváno jako Etapa II. V rámci první Etapy I. bylo, před přerušением stavby a vypovězením smlouvy, provedeno provizorní dosypání chodníku.

Tento provizorně dosypaný materiál bylo nutno odstranit a odvézt v rozsahu dle upřesnění provedených v rámci zpracování realizační dokumentace stavby - (Příloha č.16 Nákras ploch chodníků) na skládku, aby mohla být provedena definitivní skladba chodníku.

Tato Změna má vliv na změnu množství pol. č. 1. a je zařazena do sk.3

**Dílčí změna č.3 - Vyspravení výtluků**

Skutečně provedené množství oprav povrchů vozovek prováděných na stávajících komunikacích v souvislosti s upřesněními v rámci zpracování realizační dokumentace stavby, bylo zjištěno na základě pasportu komunikací provedeném před zahájením stavby dokladem prokazujícím provedené množství ( Přílohy č. 14 Soupis provedených prací Šlehofer č. 15 Zápis z pochůzky a č.16 Nákras ploch chodníků ).

Tato Změna má vliv na změnu množství pol. č. 3 a 4 a je zařazena do sk.3

Celková hodnota této Změny je 186 954,00 Kč bez DPH.

Jedná se o Změnu nepodstatnou, která je podle § 5, odst. 1, písm. c), resp. podle § 10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 01.01.2022) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná o změnu nepředvídanou.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
<b>-179 100,00</b>	<b>366 054,00</b>	<b>186 954,00</b>	<b>545 154,00</b>

Technická pomoc Objednatele

jméno

**Ing.Lubomír Smetana**

podpis

**Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:**

Zhotovitel (stavbyvedoucí):	jméno	<b>Ing. Dominik Cikhart</b>	podpis
Projektant (autorský dozor):	jméno	<b>Ing. Jan Loško, Ph.D.</b>	podpis
stavební dozor/TDI/TDS:	jméno	<b>Ing. Miroslav Bureš</b>	podpis
Supervize (Regionální dotační kancelář)	jméno	xxx	podpis
Zástupce objednatele odpovědný za cenové projednání změny	jméno	<b>Ing. Jaroslava Jurková</b>	podpis
Zástupce Objednatele:	jméno	<b>Milan Veleba</b>	podpis
<p>Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Obchodních podmínek. <b>Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo.</b> Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.</p>			
<b>Objednatel</b> (Oprávněná osoba):	jméno	<b>Ing. Jan Fidler, DiS.</b>	podpis
<b>Zhotovitel:</b>	jméno	<b>Ondřej Cikhart</b>	podpis

**ZÁPIS**

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)  
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 2**

<b>Název Stavby:</b> II/118 Kladno, oprava mostu ev. č. 118-042 přes Huťskou ulici – dokončení díla
<b>Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:</b> <span style="float: right;"><b>SO 180/1</b></span>
<b>Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):</b> SO180 Dopravně inženýrská opatření

Údaje v Kč bez DPH

<b>Cena SO/PS dle Smlouvy</b>
1 - zadat
<b>570 917,00</b>

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

**Cena SO/PS v předchozích ZBV:**

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	<b>570 917,00</b>	<b>0,00</b>

**Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:**

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-179 100,00	366 054,00	<b>366 054,00</b>	<b>64,12%</b>

**Cena SO/PS po této ZBV:**

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	<b>-179 100,00</b>	<b>757 871,00</b>	<b>186 954,00</b>	<b>32,75%</b>

Rozpis položek a cen Změny													
Název stavby dle SoD: II/118 Kladno, oprava mostu ev. č. 118-042 přes Huťskou ulici – dokončení díla								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: SO180 Dopravně inženýrská opatření								SO 180/1					
Číslo a název rozpočtu: SO180 Dopravně inženýrská opatření								Skupina změn 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	027123	PROVIZORNÍ PŘÍSTUPOVÉ CESTY - ZRUŠENÍ	M2	20,000	139,980	119,980	500,00	10 000,00	0,00	59 990,00	69 990,00	59 990,00	599,90%
3	57792A	VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ ACO TL. DO 50MM	M2	300,000	174,000	-126,000	350,00	105 000,00	-44 100,00	0,00	60 900,00	-44 100,00	-42,00%
4	57793A	VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ ACO TL. DO 100MM	M2	300,000	0,000	-300,000	450,00	135 000,00	-135 000,00	0,00	0,00	-135 000,00	-100,00%
8	914119	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL NEREFLEXNÍ - NÁJEMNÉ	KSDEN	924,000	2822,000	1898,000	18,000	16 632,00	0,00	34 164,00	50 796,00	34 164,00	205,41%
11	914419	DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL - NÁJEMNÉ	KSDEN	350,000	1010,000	660,000	22,000	7 700,00	0,00	14 520,00	22 220,00	14 520,00	188,57%
16	916119	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ	KSDEN	154,000	502,000	348,000	160,000	24 640,00	0,00	55 680,00	80 320,00	55 680,00	225,97%
19	916129	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ	KSDEN	126,000	412,000	286,000	330,000	41 580,00	0,00	94 380,00	135 960,00	94 380,00	226,98%
22	916319	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ	KSDEN	84,000	262,000	178,000	18,000	1 512,00	0,00	3 204,00	4 716,00	3 204,00	211,90%
25	916339	SMĚROVACÍ DESKY Z4 - NÁJEMNÉ	KSDEN	532,000	1678,000	1146,000	18,000	9 576,00	0,00	20 628,00	30 204,00	20 628,00	215,41%
28	916629	VODÍČÍ STĚNY Z DÍLCŮ BETON - NÁJEMNÉ	MDEN	6734,000	17170,000	10436,000	8,000	53 872,00	0,00	83 488,00	137 360,00	83 488,00	154,97%
		<b>Nové položky</b>											
<b>Celkem</b>								<b>405 512,00</b>	<b>- 179 100,00</b>	<b>366 054,00</b>	<b>592 466,00</b>	<b>186 954,00</b>	<b>46,10%</b>

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.  
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: **Ing. Dominik Cíkhart**, (stavbyvedoucí)

Za Objednatele: **Ing. Miroslav Bureš**, (TDS/TDI)

Podpis:

Podpis:

## PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby:

II/118 Kladno, oprava mostu ev. č. 118-042 přes Huťskou ulici – dokončení díla

1	Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH	12 474 230,33
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	12 723 632,53
	<b>Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH</b>	<b>15 395 595,36</b>
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	102,00%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	249 402,20
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	2,00%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	3 742 269,10

9=(32A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	4,37%
10=(36A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,50%
10A=32A+36A	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	607 602,20
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	6 237 115,17

12=(1)*0,15	Limit	1 871 134,55
13=(39)/(1)	Sledování limitu v %	0,00%
14=ABS(37)+(38)	Hodnota skupiny 5	0,00

SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	- 1 - Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)			- 2 - Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)			- 3 - Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)				- 4 - Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)				- 5 - Změny de minimis (Změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)		
						Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	limit 15 %
16	17	18	19=23+26+29+33	20=24+27+30+34+37+39	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	32=29+30	32A=ABS(29)+30	33	34	36=33+34	36A=ABS(33)+34	37	38	39=ABS(37)+38
		II/118 Kladno, oprava mostu ev. č. 118-042 přes Huťskou ulici – dokončení díla	- 179 100,00	428 502,20	249 402,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 179 100,00	366 054,00	186 954,00	545 154,00	0,00	62 448,20	62 448,20	62 448,20	0,00	0,00	0,00
101	1	Vozovky - skutečné provedení	0,00	62 448,20	62 448,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 448,20	62 448,20	62 448,20	0,00	0,00	0,00
180	2	DIO, odstranění provizorního chodníku, oprava výtluků	- 179 100,00	366 054,00	186 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 179 100,00	366 054,00	186 954,00	545 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

## Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	1
Název stavby:	<b>II/118 Kladno, oprava mostu ev. č. 118-042 přes Huťskou ulici – dokončení díla</b>
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO180 Dopravně inženýrská opatření
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	SO 180/1

Doklad	počet listů
08 Oznámení Zhotovitele o vzniku změny	1
09 Pokyn správce stavby	1
10 Harmonogram stavby	1
11 Koordinační jednání 27.10.22 zápis listina	1
13 Fotodokumentace	30
14 Soupis provedených prací Šlehofer	1
15 Zápis z pochůzky 2.8.2023	1
16 Náskres ploch chodníků	2
17 Vyjádření TDS k ZBV	1
18 Vyjádření AD k ZBV	1
19 Výpis z OR - Mott MacDonald CZ, spol. s r.o	2
Počet listů celkem	43





9	914412	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	5,000			350,00	1 750,00	0,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00%
		Značky na objížděné trase: 4 IP22 =4.000 [A] Etapa II: 1 IP18b =1.000 [B] Celkem: A+B=5.000 [C]											
10	914413	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - DEMONTÁŽ	KUS	5,000			130,00	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00%
		Značky na objížděné trase: 4 IP22 =4.000 [A] Etapa II: 1 IP18b =1.000 [B] Celkem: A+B=5.000 [C]											
11	914419	DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL - NÁJEMNÉ	KSDEN	350,000	1 010,000	660,000	22,00	7 700,00	0,00	14 520,00	22 220,00	14 520,00	188,57%
		Značky na objížděné trase: 4 IP22 =4.000 [A] Etapa II: 1 IP18b =1.000 [B] Nájem: A*70+B*70=350.000 [C]											
	ZBV2	Na základě Dodatku č.1 a dle odsouhlaseného HMG (Příloha č. 10) skutečně provedeno: Nájem: A*202+B*202=1010,000 KSDEN											
12	915321	VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - DOD A POKLÁDKA	M2	41,250			1 350,00	55 687,50	0,00	0,00	55 687,50	0,00	0,00%
		Dočasné VDZ na mostě: 0,125*(200+130)=41,250 [A]											
13	915322	VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - ODSTRANĚNÍ	M2	41,250			130,00	5 362,50	0,00	0,00	5 362,50	0,00	0,00%
		Dočasné VDZ na mostě: 0,125*(200+130)=41,250 [A]											
14	916112	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	7,000			350,00	2 450,00	0,00	0,00	2 450,00	0,00	0,00%
		Etapa II: 1=1.000 [A] Pod mostem (komplet): 6=6.000 [B] Celkem: A+B=7.000 [C]											
15	916113	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ	KUS	7,000			130,00	910,00	0,00	0,00	910,00	0,00	0,00%
		Etapa II: 1=1.000 [A] Pod mostem (komplet): 6=6.000 [B] Celkem: A+B=7.000 [C]											
16	916119	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ	KSDEN	154,000	502,000	348,000	160,00	24 640,00	0,00	55 680,00	80 320,00	55 680,00	225,97%
		Etapa II: 1=1.000 [A] Pod mostem (pilíř P2): 2=2.000 [B] Pod mostem (podhled NK): 4=4.000 [C] Nájem: A*70+B*28+C*7=154.000 [D]											
	ZBV2	Na základě Dodatku č.1 a dle odsouhlaseného HMG (Příloha č. 10) skutečně provedeno: Nájem: A*202+B*90+C*30=502,000 KSDEN											
17	916122	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	6,000			600,00	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00%
		Etapa II: 1=1.000 [A] Pod mostem (komplet): 5=5.000 [B] Celkem: A+B=6.000 [C]											
18	916123	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ	KUS	6,000			130,00	780,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00%
		Etapa II: 1=1.000 [A] Pod mostem (komplet): 5=5.000 [B] Celkem: A+B=6.000 [C]											
19	916129	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ	KSDEN	126,000	412,000	286,000	330,00	41 580,00	0,00	94 380,00	135 960,00	94 380,00	226,98%
		Etapa II: 1=1.000 [A] Pod mostem (pilíř P2): 1=1.000 [B] Pod mostem (podhled NK): 4=4.000 [C] Nájem: A*70+B*28+C*7=126.000 [D]											
	ZBV2	Na základě Dodatku č.1 a dle odsouhlaseného HMG (Příloha č. 10) skutečně provedeno: Nájem: A*202+B*90+C*30=412,000 KSDEN											
20	916312	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	3,000			130,00	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00%
		Etapa II: 1=1.000 [A] Pod mostem (komplet): 2=2.000 [B] Celkem: A+B=3.000 [C]											
21	916313	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	3,000			70,00	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00%
		Etapa II: 1=1.000 [A] Pod mostem (komplet): 2=2.000 [B] Celkem: A+B=3.000 [C]											
22	916319	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ	KSDEN	84,000	262,000	178,000	18,00	1 512,00	0,00	3 204,00	4 716,00	3 204,00	211,90%
		Etapa II: 1=1.000 [A] Pod mostem (komplet): 2=2.000 [B] Nájem: A*70+B*7=84.000 [C]											
	ZBV2	Na základě Dodatku č.1 a dle odsouhlaseného HMG (Příloha č. 10) skutečně provedeno: Nájem: A*202+B*30=262,000 KSDEN											
23	916332	SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLÍÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	19,000			70,00	1 330,00	0,00	0,00	1 330,00	0,00	0,00%

		Etapa II: 4=4.000 [A] Pod mostem (komplet): 7+4+4=15.000 [B] Celkem: A+B=19.000 [C]											
24	916333	SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	19,000			70,00	1 330,00	0,00	0,00	1 330,00	0,00	0,00%
		Etapa II: 4=4.000 [A] Pod mostem (komplet): 7+4+4=15.000 [B] Celkem: A+B=19.000 [C]											
25	916339	SMĚROVACÍ DESKY Z4 - NÁJEMNÉ	KSDEN	532,000	1 678,000	1 146,000	18,00	9 576,00		20 628,00	30 204,00	20 628,00	215,41%
		Etapa II: 4=4.000 [A] Pod mostem (pilíř P2): 7=7.000 [B] Pod mostem (podhled NK): 4+4=8.000 [C] Nájem: A*70+B*28+C*7=532.000 [D]											
	ZBV2	Na základě Dodatku č.1 a dle odsouhlaseného HMG (Příloha č. 10) skutečně provedeno: Nájem: A*202+B*90+C*30=1678,000 KSDEN											
26	916622	VODÍČÍ STĚNY Z DÍLCŮ BETON - MONTÁŽ S PŘESUNEM	M	85,000			500,00	42 500,00	0,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00%
		V etapě DIO II: 85=85.000 [B]											
27	916623	VODÍČÍ STĚNY Z DÍLCŮ BETON - DEMONTÁŽ	M	85,000			320,00	27 200,00	0,00	0,00	27 200,00	0,00	0,00%
		V etapě DIO II: 85=85.000 [B]											
28	916629	VODÍČÍ STĚNY Z DÍLCŮ BETON - NÁJEMNÉ	MDEN	6 734,000	17 170,000	10 436,000	8,00	53 872,00	0,00	83 488,00	137 360,00	83 488,00	154,97%
		V etapě DIO II: 85=85.000 [A] Pod mostem (Pilíř P2): 28=28.000 [B] Nájem: A*70+B*28=6 734.000 [C]											
	ZBV2	Na základě Dodatku č.1 a dle odsouhlaseného HMG (Příloha č. 10) skutečně provedeno: Nájem: A*202=17170,000 KSDEN											
		<b>Celkem</b>						<b>570 917,00</b>	<b>-179 100,00</b>	<b>366 054,00</b>	<b>757 871,00</b>	<b>186 954,00</b>	<b>32,75%</b>



# HOBST



Držitel CERTIFIKACE dle ČSN EN ISO 9001:2016 a ČSN EN ISO 14 001:2016

Objednatel:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,  
příspěvková organizace  
se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5  
IČO: 00066001 DIČ: CZ00066001

V Praze dne 02.06.2023

**Oznámení Zhotovitele o vzniku Změny na stavbě „II/118 Kladno, oprava mostu ev. č. 118-042 přes Huťskou ulici – dokončení díla“ s dopadem na cenu Díla.**

Vážený obchodní partnere,

jakožto zhotovitel díla „II/118 Kladno, oprava mostu ev. č. 118-042 přes Huťskou ulici – dokončení díla“ (dále též „Dílo“), které realizujeme na základě smlouvy o dílo č. Smlouvy objednatele S-3114/00066001/2022 Vás informujeme, že došlo ke vzniku / zjištění níže uvedených okolností, které povedou ke změně ceny Díla.

### 1) Dílčí změna č.1 - Doba realizace

Změny jsou vyvolány rozdíly v předpokladu časového rozsahu DIO oproti odsouhlasenému harmonogramu výstavby (10.11.2022 až 31.5. 2023) na základě Dodatku č. 1 z 31.3.2023.

### 2) Dílčí změna č.2 - Provizorní chodník

Změna je vyvolána nutností odstranit provizorně dosypaný materiál chodník, aby mohla být provedena definitivní skladba chodníku.

### 3) Dílčí změna č.3 - Vyspravení výtluků

Změna bude vyvolána na základě skutečně provedeného množství oprav povrchů vozovek na stávajících komunikacích (škody vzniklé rekonstrukcí mostu). Skutečně požadované množství oprav bude stanovené zápisem z pochůzky za účasti zástupce investora a zhotovitele po dokončení stavby.

Změny se týkají objektu SO 180 Dopravně inženýrská opatření.

Výše uvedené změny, které nemohl Objednatel při zadání Díla a Zhotovitel při podání nabídky předvídat, povedou ke změně ceny Díla. Prosíme o schválení procesování ZBV, jímž předpokládáme navýšení nákladů, které budou specifikovány v souvisejícím ZBV 2.

S pozdravem

Ing. Michal Maryško  
Stavební firma HOBST a.s.  
Tel:  
Em:

#### Korespondenční adresa:

Stavební firma HOBST a.s.  
Matějská 533  
250 91 Zeleneč

#### Fakturační adresa:

Stavební firma HOBST a.s.  
Soběšinská 2702  
190 16 Praha 9

IČO: 48033251

DIČ: CZ48033251

Bankovní spojení: KB Praha

Číslo účtu:

Tel./fa

E-mail:

Internet: <http://www.hobot.cz>

**Stavební firma HOBST a.s.**  
**Soběšinská 2702, 190 16, Praha 9**  
Ing. Michal Maryško

**Předmět: Souhlas s oznámenou změnou během výstavby „II/118 Kladno, oprava mostu ev. č. 118-042 přes Hut'skou ulici – dokončení díla“**

Vážený pane inženýre,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o. (dále jen KSÚS), jako investor akce „II/118 Kladno, oprava mostu ev. č. 118-042 přes Hut'skou ulici – dokončení díla“ je seznámena se žádostí o zpracování ZBV (zvětšený rozsah, zpracování a realizace DIO, odstranění provizorně dosypaného materiálu chodníku, výsrava výtluků v rámci objízdných tras dle rozsahu dohodnutém na pozůzce v místě stavby k SO 180 – Dopravně inženýrské opatření) na Vámi uvedené okolnosti, které se v projektové dokumentaci ve stupni PDPS nedali předpokládat a souhlasí s technickým řešením, které uvádí zhotovitel stavebních prací.

KSÚS bere na vědomí, že zhotovitel nemohl v době zadávací lhůty soutěže předvídat výskyt těchto okolností, a proto KSÚS žádá zhotovitele Stavební firmu HOBST a.s. o vypracování Změnových listů, a to v souladu se směrnicí KSÚS, která je nedílnou součástí Smlouvy o dílo. Tyto ZBV budou následně projednány a podrobně posouzeny supervizorem zakázky, následně budou posouzeny vedením KSÚS.

S pozdravem

.....  
**Milan Veleba**

Krajská správa a údržba silnice  
Středočeského kraje, p.o.

# HARMOGRAM PROVÁDĚNÝCH PRACÍ - ČASOVÝ REV. č.1 - ZMĚNA BĚHEM VÝSTAVBY

Stavba : „II/118 Kladno, oprava mostu ev. č. 118-042 přes Huťskou ulici - dokončení díla“

Rok	Měsíc	Týden	2022												2023																			
			11						12						1		2		3		4		5		6									
			44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
<b>Vedlejší a ostatní náklady</b>																																		
	vedlejší a ostatní náklady	10.11.2022-31.05.2023																																
<b>Most</b>																																		
	přípravné práce	10.11.2022-13.11.2022																																
	zemní práce	14.11.2022-20.11.2022																																
	demontáž zábradlí	14.11.2022-20.11.2022																																
	demolice, frézování	14.11.2022-27.11.2022																																
	obetonávka spodní stavby	28.11.2022-25.12.2022																																
	odbourávání a frézování povrchu sprážené desky	13.02.2023-26.02.2023																																
	zemní práce okolo dobetonávek	20.02.2023-05.03.2023																																
	broušení povrchu sprážené desky	27.02.2023-05.03.2023																																
	očistění mostovky tryskání VVP	06.03.2023-12.03.2023																																
	dobourání křídel, nosné konstrukce a úložných prahů	13.03.2023-19.03.2023																																
	závěrné zidky	20.03.2023-26.03.2023																																
	dobetonávka sprážené desky a příčníků	27.03.2023-02.04.2023																																
	osazení MDZ	03.04.2023-09.04.2023																																
	izolace pod římsou	10.04.2023-16.04.2023																																
	římsa na mostě	17.04.2023-30.04.2023																																
	dobetonávka křídel	01.05.2023-07.05.2023																																
	zásypy přechodové oblasti	01.05.2023-07.05.2023																																
	přechodová deska	08.05.2023-14.05.2023																																
	izolace mostovky, včetně vyrovnávky	08.05.2023-14.05.2023																																
	pokládka MA (ochrana izolace)	15.05.2023-21.05.2023																																
	sanace podhledu NK	15.05.2023-28.05.2023																																
	zábradlí	29.05.2023-31.05.2023																																
	vozovky	29.05.2023-31.05.2023																																
	dokončovací práce	29.05.2023-31.05.2023																																
<b>Dopravně inženýrská opatření</b>																																		
	DIO	10.11.2022-31.05.2023																																
	Etapa II	202 dny																																
	Pod mostem (pilíř P2)	90 dny																																
	Pod mostem (podhled NK)	30 dny																																

Milan Veleba

**Název akce, předmět jednání:**

„II/118 Kladno, oprava mostu ev.č. 118-042 přes Hut'skou ulici“ – dokončení díla  
Koordinační jednání, postup realizace díla

**Datum, místo:** 27. 10. 2022, IBH spol. s r.o., Poděbradova 3178, 272 01 Kladno

**Účastníci:** dle prezenční listiny

„II/118 Kladno, oprava mostu ev.č. 118-042 přes Hut'skou ulici“ – dokončení díla

Dne 27. 10. 2022 proběhlo koordinační jednání zástupců investora (KSUS), zhotovitele (HOBST), technického dozoru (IBH), autorského dozoru (Mott MacDonald) a města Kladno.

V úvodu byli přítomni informováni o současném stavu a předešlých jednání.

**Z jednání vyplynuly následující body zápisu:**

- Zhotovitel oznámil, dne 31. 10. 2022 začne probíhat geodetické zaměření aktuálního stavu mostu pro určení míry úpravy betonové desky. Dále budou probíhat přípravné práce pro předání staveniště (úklid, ohraničení a zabezpečení stavby).
- Byl dohodnut termín předání staveniště na 10. 11. 2022.
- Zhotovitel sdělil snahu stavbu před zimní technologickou pauzou dotáhnout do zaizolování a zakonzervování horní stavby mostu, aby nedocházelo k degradaci během zimního období, dále uvedl, práce na horní stavbě mostu budou pokračovat nejdříve v lednu 2023 s ohledem na klimatické podmínky.
- Předpokládaný termín dokončení stavby je závislý na klimatických podmínkách, byl sdělen odhad kompletního zprůjezdnění v první polovině roku 2023.
- Bylo předpokládáno financování DIO v zimní období z údržby KSUS, nicméně byla následně telefonicky domluvena oprava. DIO bude od předání staveniště hradit zhotovitel, vzhledem k předání staveniště před zimou bude jeho případné prodloužení a vzniklé vícenáklady řešeny formou ZBV.

Zaznamenal: Milan Veleba

## Prezenční listina

„II/118 Kladno, oprava mostu ev.č. 118-042 přes Huťskou ulici – dokončení díla“  
Koordinační jednání dne 27.10.2022

Organizace	Příjmení	Tel./e-mail	Podpis
Stavební firma MOBST	Ing. M. Požár		
	Ondřej Cikhart		
	Ing. Dominik Cikhart		
IBH	TOMÁŠ MAČENAVIČ		
MOTT MALDOVALS	MILAN PETŘÍK		
MNK ODS S	JAROSLAV FRIDRICH		
KSUS SK	VEČERA MILAN		
KÚSK tiskové	HOLEK JOSEF		
KSÚS SK, z.o.	Mgr. Martina Šteclíková		
IBH SPOL. S R.O.	MIROSLAV ŽUBRŠ		
IBH SPOL. S R.O.	ING. ROMAN VITNER		



Stavební firma  
**HOBST**



Držitel CERTIFIKACE č. 383/2001 dle ČSN EN ISO 9001:2001 a ČSN EN ISO 14 001



## **FOTODOKUMENTACE**

**II/118 Kladno, oprava mostu ev. č. 118-042 přes Huťskou ulici  
– dokončení díla**

Datum vyhotovení: 07.06.2023  
Vyhotovil: Ing. Michal Maryško



## Původní stav:



Foto 00.01



Foto 00.02



Foto 00.03



Foto 00.04



Foto 00.05



Foto 00.06



Foto 00.07



Foto 00.08



**Foto 00.09**



**Foto 00.10**



**Foto 00.11**



**Foto 00.12**

**ZBV:**



**Foto 1**



Foto 2



Foto 3





**Foto 4**



**Foto 5**



**Foto 6**



**Foto 7**



**Foto 8**



**Foto 9**



**Foto 10**



**Foto 11**



**Foto 12**



**Foto 13**



Foto 14



Foto 15



Foto 16



Foto 17



Foto 18



Foto 19





Foto 20



Foto 21



Foto 22



Foto 23



Foto 24



Foto 25



Foto 26



Foto 27



**Foto 28**



**Foto 29**



Foto 30



Foto 31



Foto 32



Foto 33



Foto 34



Foto 35





Foto 36



Foto 37



Foto 38



Foto 39



Foto 40



Foto 41



Foto 42



Foto 43



**Foto 44**



Stavební společnost Šlehofer s.r.o., Prvomájová 2111/33, 153 00 Praha 5 - Radotín

## SOUPIS PRACÍ

Dodavatel : <b>Stavební společnost Šlehofer, s.r.o.</b>				Měsíc/rok : <b>srpen / 2023</b>		Projekt:	
Datum: <b>28. 08. 2023</b>		Celková částka : <b>168 780,00</b>		Celkem Kč : <b>168 780,00</b>		objednávka : <b>příložená</b>	
FIRMA: <b>HOBST</b>						Místo : <b>Kladno</b>	
Poř.č.	Kód položky	Popis	M.j.	Množství	Cena jedn.	Cena celkem	Poznámka
		<b>Asfaltérské práce - objízdné trasy Kladno, ul. Pod Zámkem</b>					
		Oprava výtluků do tl. 50 mm (fréza, příprava, živice, spáry)	m2	174,00	970,00	168 780,00	
		<b>Práce provedeny dle požadavku objednatele, v požadovaném termínu, bez zjevných vad a nedodělků.</b>					
		<b>celkem</b>				<b>168 780,00</b>	
28. srpna 2023		předal : Tomáš Čapek 608 672 858				převzal : Dominik Cikhart 725 956 922	

## Záznam z pochůzky

Název akce: **Rozsah oprav objízdných tras akce „II/118 Kladno, oprava mostu ev.č. 118-042 přes Huťskou ulici – dokončení díla“**

Datum: 02. 08. 2023

Místo: stavba „II/118 Kladno, oprava mostu ev.č. 118-042 přes Huťskou ulici – dokončení díla“

Účastníci: Milan Veleba  
Ing. Roman Vitner  
Ing. Dominik Cíkhart

Pochůzka se uskutečnila dne 2.8.2023 v místě stavby „II/118 Kladno, oprava mostu ev.č. 118-042 přes Huťskou ulici – dokončení díla“, konkrétně na části objízdné trasy od křižovatky II/238 s ulicí Pod Zámkem v úseku směrem pod zrekonstruovaný most. Na pochůzce byl upřesněn rozsah oprav objízdných tras (fotodokumentace výtluků určených k opravě, ke kterým došlo z důvodu rekonstrukce mostu – odhadem se jedná o výměru do 200 m<sup>2</sup> v tl. do 50 mm) za účasti investora, zhotovitele a technického dozoru. Méněpráce na položkách z rozpočtu určených pro opravu objízdných tras budou řešeny formou ZBV.

ZA HOBST: CÍKHART

Milan Veleba

**CHODNÍK SMĚR CENTRUM**

1:100

SILOVÉ PODZEMNÍ VN ČEZ

SDĚLOVACÍ KABEL Cetin

ZÚ km 0.001 000

ZS km 0.000 000

MIKROVLNÉ SPOJE T-Mobile

CENTRUM

01 km 0.020 000

OSA ULOŽENÍ

REVIZNÍ SCHODIŠTĚ Š. 0.75 M  
MONOLITICKÁ ŽB ŘÍMSA NA KŘÍDLĚ

KAMENNÁ DLAŽBA  
DO BETONU

PRODLOUŽENÍ KŘÍDLA

**Plocha 52,970 m<sup>2</sup>**  
5866/10

NAPOJENÍ CHODNÍKU  
NA STÁVAJÍCÍ STAV

KAMENNÝ OBRUBNÍK

CENTRUM

STÁVAJÍCÍ BETON  
ŽELEZOBETONOVÁ ŘÍMSA

ŘÍMSA NA MOSTĚ 37152

CHODNÍK S ASFALTOBETONOVÝM  
POVRSCHEM


TĚSNĚNÝ OCELOVÝ  
MOSTNÍ ZÁVER

CENTRUM

5866/II


364

3731

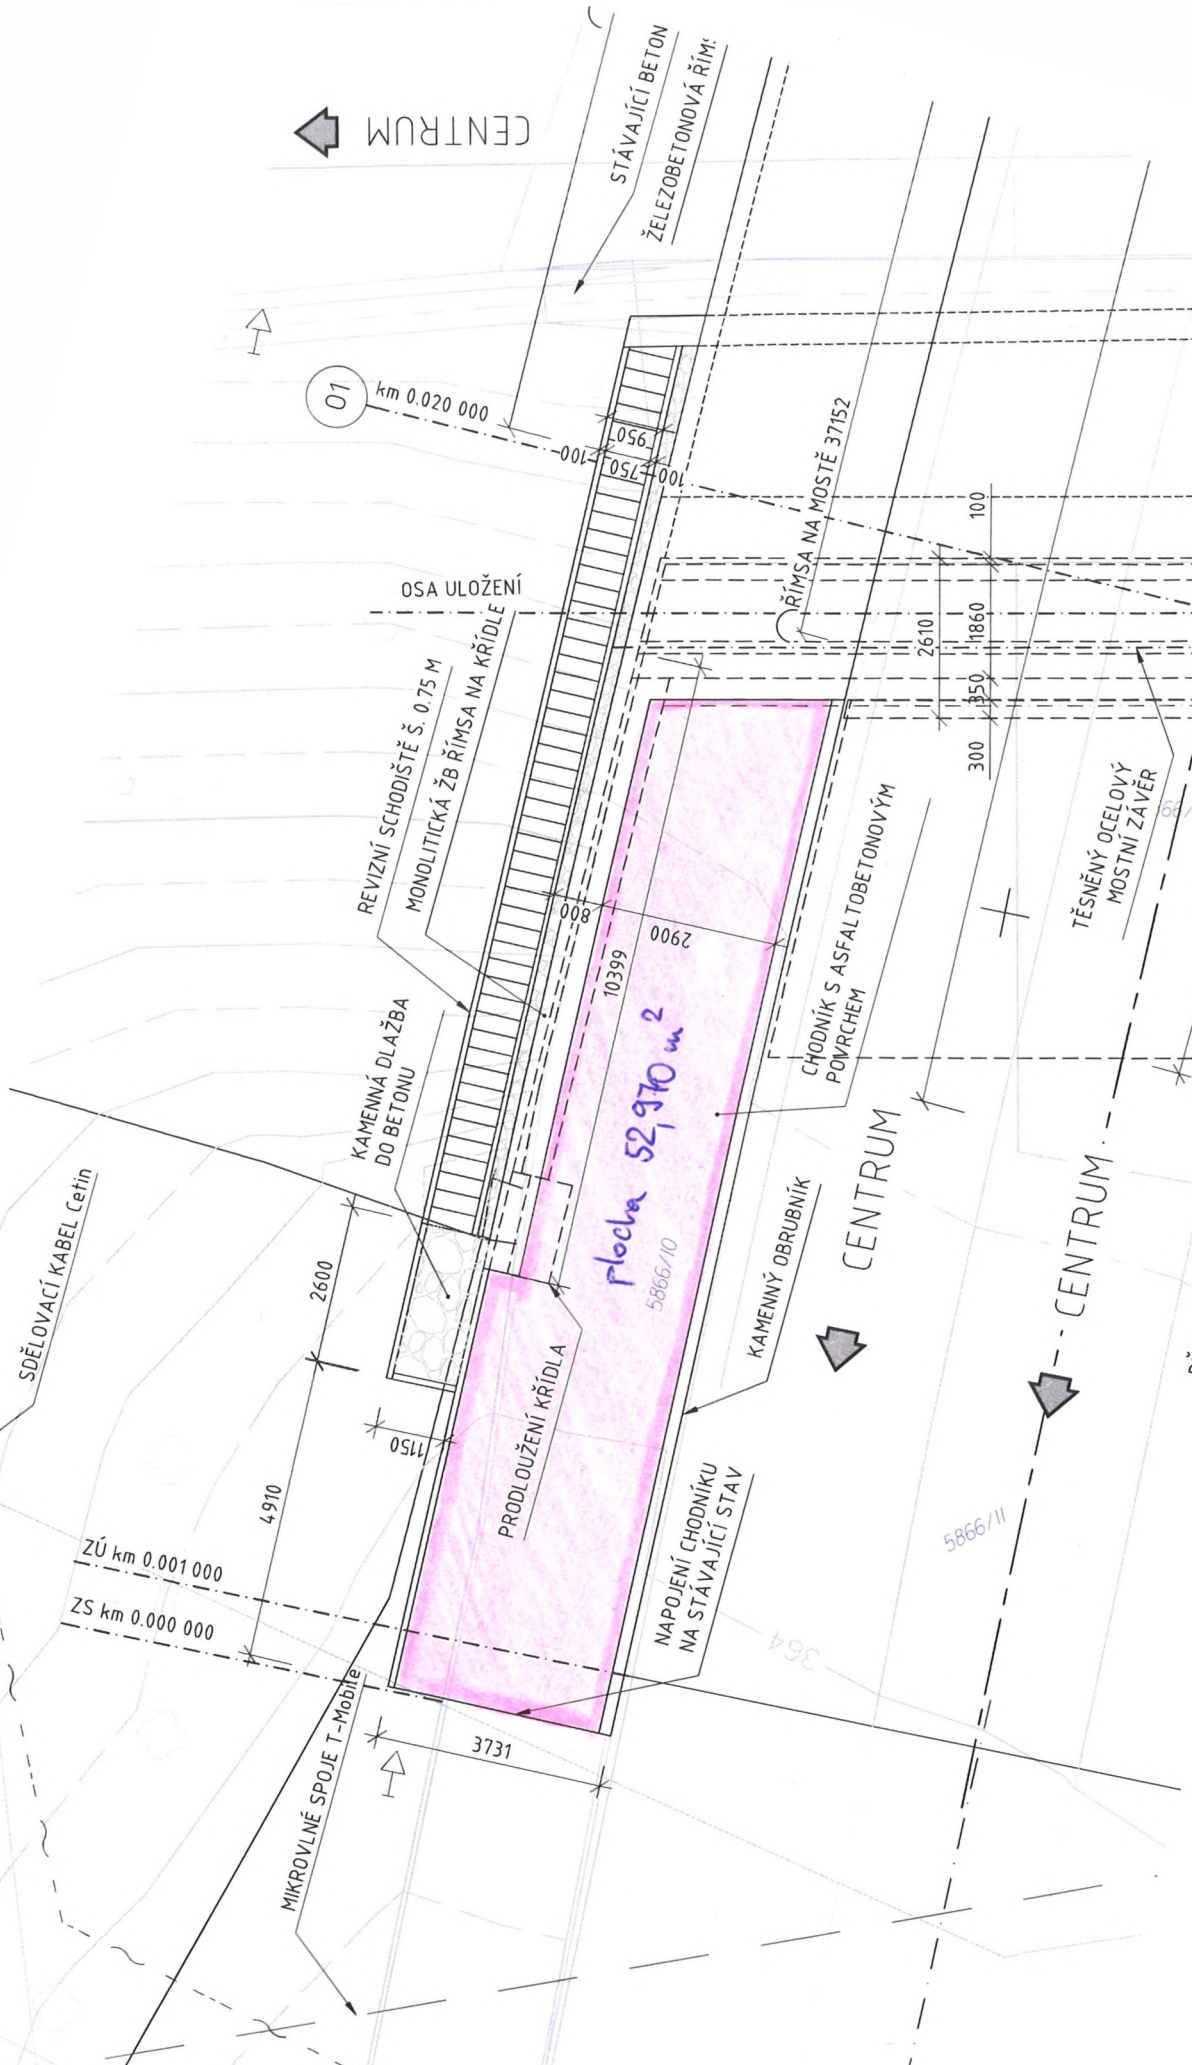



CHODNÍK SMĚR SLAVŮ

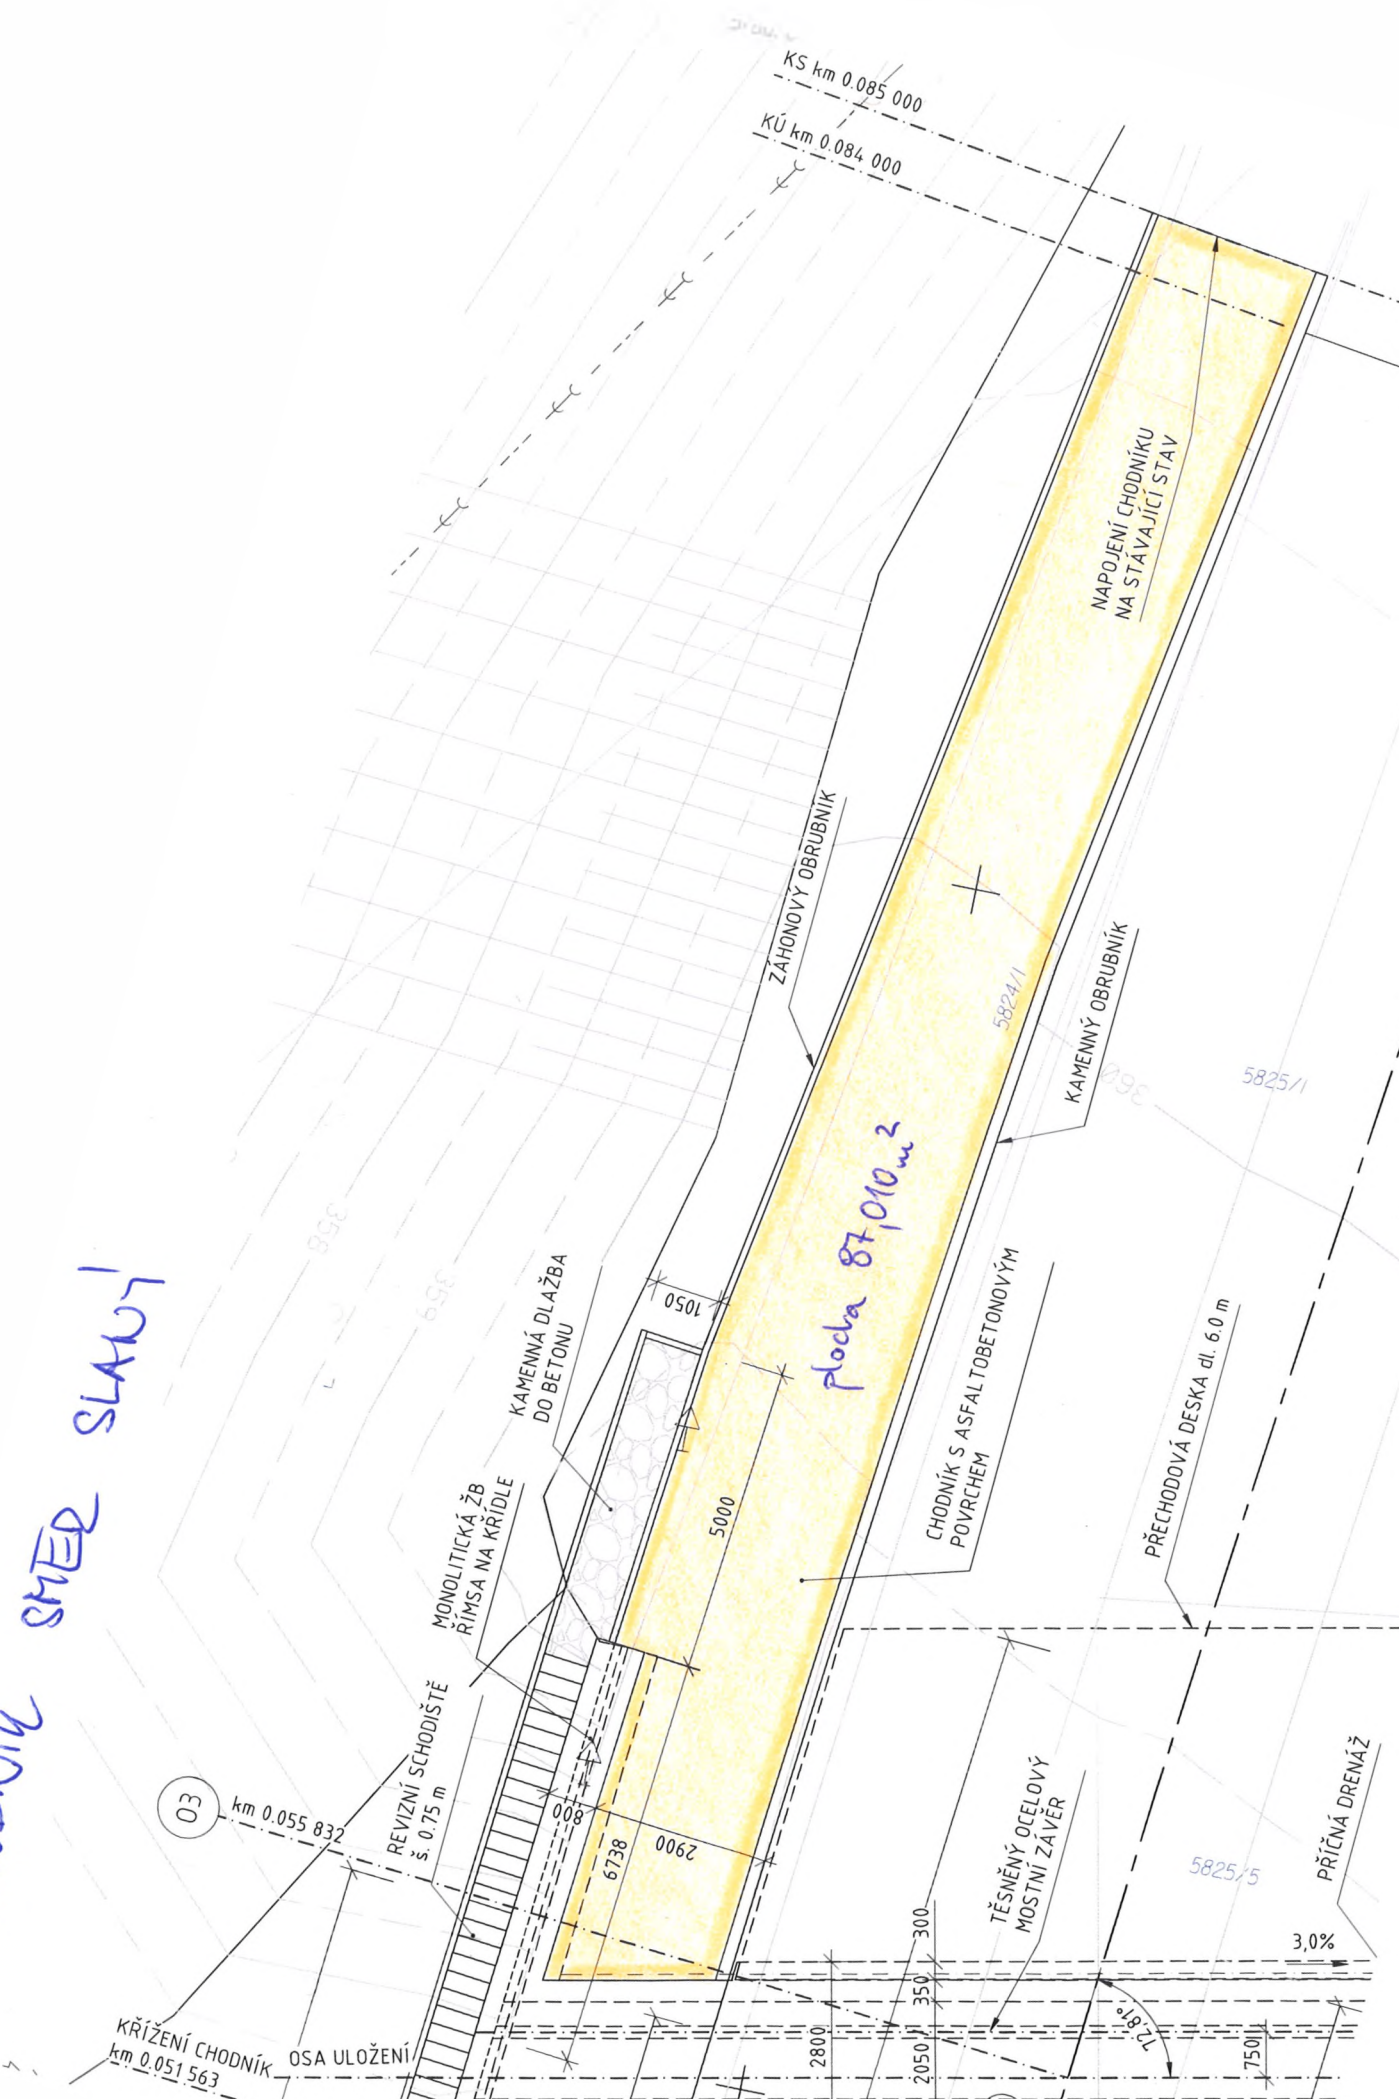

Vyřizuje: Ing. Vitner Roman

V Kladně dne: 11.10.2023

Krajská správa a údržba silnic  
Středočeského kraje, p.o.  
Zborovská 11, Praha 5  
p. Milan Veleba

Věc: Vyjádření TDI k ZBV č.2

Stavba:

**II/118 Kladno, oprava mostu ev. č. 118-042 přes Hut'skou ulici – dokončení díla**

Na základě oznámení zhotovitele o změnách, k nimž došlo v průběhu provádění stavebních prací na SO 180 konstatuji následující:

**1. Popis změn, jejich odůvodnění a navrhovaná řešení**

Dílčí změna č.1 - Doba realizace

Změna je nárokována na základě Dodatku č.1 a dle odsouhlaseného HMG stavby podepsaného zástupci objednatele i zhotovitele. Skutečná doba realizace výstavby byla od 10.11.2022 do 31.5.2023 (celkem 202 dní). Jednotlivé dílčí etapy DIO i jejich délky trvání jsou detailně popsány v harmonogramu.

Dílčí změna č.2 - Provizorní chodník

Změna vznikla zanechaným stavem stavby po Etapě I. Chodník Etapy I. (respektive jeho části na obou předpolích, na nichž měl být definitivní povrch z litého asfaltu) byl vlivem přerušení stavby na dobu neurčitou dosypán štěrkodrtí zhotovitelem Etapy I. Dosypání bylo provedeno v celé délce do úrovně horní hrany nivelety chodníku, aby po něm byl umožněn pohyb chodců před započítáním prací Etapy II.

Tento provizorně dosypaný materiál (štěrkodrt') bylo nutno v rámci této stavby odstranit, aby mohly být provedeny jednotlivé konstrukční vrstvy chodníku dle projektové dokumentace.

Dílčí změna č.3 - Vyspravení výtluků

Jedná se o skutečně provedené množství oprav povrchů vozovek na stávajících komunikacích objízdných tras. Po dokončení stavby byla provedena pochůzka za účasti zástupců objednatele a zhotovitele, ze které vznikl zápis s požadovaným upřesněným rozsahem oprav. Na základě tohoto zápisu provedl zhotovitel opravu výtluků.

**2. Stanovisko TDI**

Z pozice TDI potvrzují, že výše popsané změny skutečně nastaly během výstavby. S navrhovanými změnami souhlasím. Průběhy změn jsou písemně zdokumentovány a dostatečně odůvodněny, množství změn je doloženo harmonogramem, zápisem z pochůzky a fotodokumentací, popř. je lze dovodit výpočty. Nárok zhotovitele na zvýšení ceny považuji za opodstatněný.

za IBH spol. s r.o.  
Ing. Roman Vitner

tel.: \_\_\_\_\_  
e-mail: \_\_\_\_\_

IČO: 47540966  
DIČ: CZ47540966

bankovní spojení :  
Oberbank AG

Krajská správa a údržba silnic  
Středočeského kraje  
Milan Veleba  
Zborovská 11  
CZ-150 21, Praha 5

**II/118 Kladno, oprava mostu ev. č. 118-042 přes Hut'skou ulici**

13. října 2023

**Vaše ref. číslo**

-

na základě výzvy objednatele vydáváme následující vyjádření k návrhu ZBV 2 pro SO 180.

**Naše ref. číslo**

234-MPe-2023

Dle dostupných informací došlo v rámci výstavby ke změně předpokládaného časového rozsahu DIO. Dále bylo potřeba provést odstranění provizorního zpevnění chodníku provedeného původním zhotovitelem (dosyp recyklátu) pro položení jeho finálního povrchu. A dále bylo upraveno množství oprav výtluků na stavbou dotčených komunikací a komunikací objízdných tras na základě skutečně provedeného rozsahu oprav odsouhlaseného investorem.

Mott MacDonald  
Národní 984/15  
110 00  
Praha 1  
Česká republika

Tím došlo ke změně množství položek soupisu prací oproti předpokladům PDPS s celkovým dopadem na cenu díla 249 402.20,- Kč bez DPH.

T  
mottmac.com

AD konstatuje, že k navrženým změnám nemá připomínky a se ZBV č.2 souhlasí.

Vyjádření za AD vypracoval:

Ing. Milan Petřík

## Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného  
Městským soudem v Praze  
oddíl C, vložka 14051

<b>Datum vzniku a zápisu:</b>	8. března 1993
<b>Spisová značka:</b>	C 14051 vedená u Městského soudu v Praze
<b>Obchodní firma:</b>	Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.
<b>Sídlo:</b>	Národní 984/15, Staré Město, 110 00 Praha 1
<b>Identifikační číslo:</b>	485 88 733
<b>Právní forma:</b>	Společnost s ručením omezeným
<b>Předmět podnikání:</b>	projektová činnost ve výstavbě výkon zeměměřičských činností výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence Geologické práce poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
<b>Statutární orgán:</b>	
<b>Jednatel:</b>	Ing. JAN LOŠKO, Ph.D., dat. nar. 9. dubna 1983 Dědinova 2008/13, Chodov, 148 00 Praha 4 Den vzniku funkce: 22. srpna 2016
<b>jednatel:</b>	JAMES HUW KEIR HARRIS, dat. nar. 28. června 1968 LS290AP Ilkley, Ashfield, 1 Stubham Rise, Spojené království Velké Británie a Severního Irska Den vzniku funkce: 5. dubna 2019
<b>jednatel:</b>	IAN MARTIN RICHARD GALBRAITH, dat. nar. 18. července 1963 SW154LA Londýn, 4 Ponsonby Road, Putney Heath, Spojené království Velké Británie a Severního Irska Den vzniku funkce: 5. dubna 2019
<b>jednatel:</b>	Ing. MICHAL BABIČ, dat. nar. 9. července 1970 Magistrů 1529/11, Michle, 140 00 Praha 4 Den vzniku funkce: 1. dubna 2022
<b>Počet členů:</b>	4
<b>Způsob jednání:</b>	Jednatelé jednají za společnost vůči třetím osobám vždy dva společně.
<b>Prokura:</b>	Ing. ONDŘEJ KOKEŠ, dat. nar. 17. února 1975 Rajmonova 1198/13, Kobylisy, 182 00 Praha 8 Ing. PETR MAKÁSEK, Ph.D., dat. nar. 21. listopadu 1981 K Nové Vsi č.ev. 633/10, Jinonice, 158 00 Praha 5 Mgr. Ing. MICHAL BERNAT, Ph.D., dat. nar. 3. února 1980 Botanická 821/29, Veveří, 602 00 Brno Ing. PETR HAVLAN, dat. nar. 27. března 1979 Riegrova 1882/13, Předměstí, 568 02 Svitavy K zastupování a podepisování za společnost je třeba souhlasného projevu vůle dvou prokuristů.
<b>Společníci:</b>	

**Společník:** MOTT MACDONALD INTERNATIONAL LIMITED  
Mott MacDonald House, 8-10 Sydenham Road, Croydon, Surrey, CRO 2EE,  
Spojené království Velké Británie a Severního Irska

---

**Podíl:** Vklad: 80 000,- Kč  
Splaceno: 100%  
Obchodní podíl: 99,9 %  
Druh podílu: základní  
Kmenový list: nebyl vydán

---

**Společník:** MOTT MACDONALD HOLDCO LIMITED  
CRO2EE Croydon, Surrey, 8-10 Sydenham Road, Spojené království Velké  
Británie a Severního Irska  
Registrační číslo: 1160930

---

**Podíl:** Vklad: 20 000,- Kč  
Splaceno: 100%  
Obchodní podíl: 0,1 %  
Druh podílu: základní  
Kmenový list: nebyl vydán

---

**Základní kapitál:** 100 000,- Kč

**Ostatní skutečnosti:**

---

Datum založení společnosti 21.1.93

---

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst.  
5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

---
