

## Krycí list ZBV

Název stavby dle SoD:

III/33310 hr. hl. m. Praha - Sestajovice - Dřevčice - II/610 (III/33310 Zeleneč)

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

sil. III/33310 km 2,550 - 3,600

Číslo SO/PS

/ pořadí Změny SO/PS:

- / 1

Číslo ZBV:

01

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov

IČ: 00066001

Zhotovitel: B E S s.r.o.

Sukova 625, 256 01 Benešov

IČ: 43792553

Rekapitulace ZBV č. 01 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

Údaje v Kč bez DPH:

| ZBV č./Skupina | Cena navrhovaných Změn<br>záporných | Cena navrhovaných<br>Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných<br>celkem |
|----------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1.1            | -365 332,78                         | 0,00                               | -365 332,78                                                |

Údaje v Kč bez DPH:

| ZBV č./Skupina | Cena navrhovaných Změn<br>záporných | Cena navrhovaných<br>Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných<br>celkem |
|----------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1.2            | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                                                       |

Údaje v Kč bez DPH:

| ZBV č./Skupina | Cena navrhovaných Změn<br>záporných | Cena navrhovaných<br>Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných<br>celkem |
|----------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1.3            | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                                                       |

Údaje v Kč bez DPH:

| ZBV č./Skupina | Cena navrhovaných Změn<br>záporných | Cena navrhovaných<br>Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných<br>celkem |
|----------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1.4            | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                                                       |

Údaje v Kč bez DPH:

| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn<br>záporných | Cena navrhovaných<br>Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných<br>celkem |
|-------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1.5         | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                                                       |

Údaje v Kč bez DPH:

| ZBV č. /SUMA | Cena navrhovaných Změn<br>záporných | Cena navrhovaných<br>Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných<br>celkem |
|--------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1            | -365 332,78                         | 0,00                               | -365 332,78                                                |

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny. Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

## Změnový list

### Název Stavby dle SoD:

III/33310 hr. hl. m. Praha – Šestajovice - Dřevčice - II/610 (III/33310 Zeleneč)

### Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

sil. III/33310 km 2,550 - 3,600

Číslo SO/PS

/ pořadí Změny SO/PS:

- / 1

ZBV/Skupina

změny:

**01.1**

Strany smlouvy o dílo č. S-2778/00066001/2023 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 19.09.2023 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov

Zhotovitel: B E S s.r.o. se sídlem Sukova 625, 256 01 Benešov

### Přílohy změnového listu:

|                                             |    |             |
|---------------------------------------------|----|-------------|
| 1. Krycí list                               | 1  | počet listů |
| 2. Změnový list                             | 2  | počet listů |
| 3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací | 1  | počet listů |
| 4. Rozpis ocenění Změn položek              | 1  | počet listů |
| 5. Přehled zařazení změn do Skupin          | 1  | počet listů |
| 6. Přehled dokladů                          | 1  | počet listů |
| 7. Soupis prací SO po všech změnách         | 1  | počet listů |
| Další doklady dle přehledu dokladů          | 20 | počet listů |

### Příjemce

Objednatel  
Zhotovitel  
Projektant (AD)  
Stavební dozor

Iniciátor změny: Zhotovitel

Předmět Změny: Doměření

### Popis a zdůvodnění Změny:

Zhotovitel v rámci uveřejněné Zadávací dokumentace stavby nezastihl předpokládané výměry na stavebním objektu (dále jen „SO“) 100 v rámci rekonstrukce silnice II/335.

Touto Změnou během výstavby dochází k narovnání rozdílů dle skutečnosti u položek č. 574C06, 572223, 574A44, 113761, 931312.

Zhotovitel tuto skutečnost oznámil svým dopisem „Formulář pro ohlášení změn stavby č. 1“ ze dne 30.10.2023, a to včetně příloh - Návrh ocenění změny a Geodetické protokoly (příloha č. 8). Objednatel vydal dne 31.10.2023 Pokyn variací (příloha č. 9).

Jedná se o Změnu nepodstatnou, která je tak podle čl. 5, odst. 1, písmeno a) resp. čl. 7 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazenou do Skupiny 1.

Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. Tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 100, odst. 1) se jedná o změnu vyhrazenou.

Vzhledem k důvodu vzniku předmětných změn se jedná o změny, které nevznikly "řetěžením změn" podle článku 6 Směrnice R-Sm-36 upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. K datu podpisu nejsou známy skutečnosti, které by nasvědčovaly tomu, že předmětné změny vyvolají vznik Smluvních kompenzačních nároků (Claimů) - závazků Objednatele vůči Zhotoviteli v důsledku nesplnění některé ze smluvních povinností, právních povinností či právních skutečností nebo vyvolají "řetězení změn" v budoucnu nebo na dalších stavebních objektech.

| Změnový list                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                       |                                                               |                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Název Stavby dle SoD:<br>III/33310 hr. hl. m. Praha – Šestajovice - Dřevčice - II/610 (III/33310 Zeleneč)<br>Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):<br>sil. III/33310 km 2,550 - 3,600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Číslo SO/PS<br>/ pořadí Změny SO/PS:<br><b>- / 01</b> | Číslo ZBV /<br>Skupina změny:<br><b>01.1</b>                  |                                                                |
| Údaje v Kč bez DPH:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                       |                                                               |                                                                |
| Cena navrhovaných Změn<br>záporných                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Cena navrhovaných Změn<br>kladných                    | Cena navrhovaných Změn<br>záporných a Změn kladných<br>celkem | Součet absolutních hodnot<br>Změn kladných a Změn<br>Záporných |
| <b>-365 332,78</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>0,00</b>                                           | <b>-365 332,78</b>                                            | <b>365 332,78</b>                                              |
| Technická pomoc Objednatel <span>:</span> jméno Daniel Löffler podpis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                               |                                                                |
| <b>Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                       |                                                               |                                                                |
| Zhotovitel (stavbyvedoucí):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | jméno Rostislav Hověžák                               | podpis                                                        |                                                                |
| Projektant (autorský dozor):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | jméno                                                 | podpis                                                        |                                                                |
| Stavební dozor:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | jméno Tomáš Pecka                                     | podpis                                                        |                                                                |
| Supervize (Regionální dotační kancelář):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | jméno                                                 | podpis                                                        |                                                                |
| Zástupce Objednatel <span>:</span>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | jméno Lenka Chmelová                                  | podpis                                                        |                                                                |
| Zástupce Objednatel <span>e</span> odpovědný za cenové<br>projednání Změny:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | jméno Ing. Jaroslava Jurková                          | podpis                                                        |                                                                |
| Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány,<br>zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou<br>zlepšením dle čl. 13.2 <b>Obchodních podmínek</b> . Tento Změnový list představuje Dodatek <b>Smlouvy o dílo</b> . Smlouva se mění v rozsahu upraveném v<br>tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel <span>e</span> a Zhotovitel <span>e</span> sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují<br>příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel <span>e</span> a Zhotovitel <span>e</span> své podpisy. |                                                       |                                                               |                                                                |
| Objednatel (Oprávněná osoba):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | jméno Ing. Jan Fidler, DiS.                           | podpis                                                        |                                                                |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | jméno Ing. Jan Freudl                                 | podpis                                                        |                                                                |

# ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)

pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 01

**Název stavby:**

III/33310 hr. hl. m. Praha - Šestajovice - Dřevčice - II/610 (III/33310 Zeleněč)

**Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:**

- / 1

**Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):**

sil. III/33310 km 2,550 - 3,600

Údaje v Kč bez DPH

|                        |
|------------------------|
| Cena SO/PS dle Smlouvy |
| 1 - zadat              |
| <b>5 240 913,75</b>    |

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

**Cena SO/PS v předchozích ZBV:**

Údaje v Kč bez DPH

|                         | Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS | Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS | Cena SO/PS po všech předchozích Změnách | Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě |
|-------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 2                       | 3 - zadat                                                | 4 - zadat                                               | 5=1+3+4                                 | 6=5-1                                                       |
| stavební/montážní práce | 0,00                                                     | 0,00                                                    | 5 240 913,75                            | 0,00                                                        |

**Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:**

Údaje v Kč bez DPH

|                         | Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS | Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS | Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných) | Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v % |
|-------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 7                       | 8 - zadat                                 | 9 - zadat                                | 10 = 4+9                                                       | 11=(10/1)*100                                                  |
| stavební/montážní práce | -365 332,78                               | 0,00                                     | 0,00                                                           | 0,00                                                           |

**Cena SO/PS po této ZBV:**

Údaje v Kč bez DPH

|                         | Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných) | Cena SO/PS po této změně | Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy | Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v % |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 12                      | 13=3+8                                                          | 14=1+13+10               | 15=14-1                                                       | 16=(15/1)*100                                                     |
| stavební/montážní práce | -365 332,78                                                     | 4 875 580,97             | -365 332,78                                                   | -6,97%                                                            |

| Rozpis položek a cen Změny                                                                                                                                                                                                      |             |                                             |      |                     |                   |                  |                             |                             |                    |                   |                           |                        |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|
| Název stavby dle SoD: III/33310 hr. hl. m. Praha - Šestajovice - Dřevčice - II/610 (III/33310 Zeleneč)<br>Číslo a název SO/PS: sil. III/33310 km 2,550 - 3,600/ 1<br>Číslo a název rozpočtu: sil. III/33310 km 2,550 - 3,600/ 1 |             |                                             |      |                     |                   |                  | ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) |                             |                    |                   |                           |                        |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                 |             |                                             |      |                     |                   |                  | č. 1                        |                             |                    |                   |                           |                        |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                 |             |                                             |      |                     |                   |                  | Skupina změn<br>1           |                             |                    |                   |                           |                        |                       |
| Poř. č. pol.                                                                                                                                                                                                                    | Kód položky | Název položky                               | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč           | Cena celkem ve Smlouvě v Kč | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Rozdíl cen celkem v % |
| 1                                                                                                                                                                                                                               | 2           | 3                                           | 4    | 5                   | 6                 | 7                | 8                           | 9                           | 10                 | 11                | 12                        | 13                     | 14                    |
| -                                                                                                                                                                                                                               | 574C06      | vyrovnávka asphalt. bet. ACL 16+ ,          | m3   | 357,00              | 324,55            | -32,454          | 4 361,00                    | 1 556 876,05                | -141 529,63        | ---               | 1 415 346,43              | -141 529,63            | -9,09%                |
| -                                                                                                                                                                                                                               | 572223      | spojovací potřík ze sil. emulze do 1,0kg/m2 | m2   | 14 280,00           | 12 981,86         | -1 298,140       | 4,80                        | 68 586,54                   | -6 234,94          | ---               | 62 351,60                 | -6 234,94              | -9,09%                |
| -                                                                                                                                                                                                                               | 574A44      | asfalt. beton ACO 11+ 50/70 tl. 50 mm,      | m2   | 7 140,00            | 6 490,93          | -649,070         | 235,13                      | 1 678 825,84                | -152 615,61        | ---               | 1 526 210,23              | -152 615,61            | -9,09%                |
| -                                                                                                                                                                                                                               | 113761      | frézování spár š. do 10mm , hl. do 20mm     | m    | 1 064,00            | 480,00            | -584,000         | 52,96                       | 56 351,57                   | -30 929,81         | ---               | 25 421,76                 | -30 929,81             | -54,89%               |
| -                                                                                                                                                                                                                               | 931312      | Zalévání spár dilatační asf. zálivkou       | m    | 1 064,00            | 480,00            | -584,000         | 58,26                       | 61 986,73                   | -34 022,79         | ---               | 27 963,94                 | -34 022,79             | -54,89%               |
|                                                                                                                                                                                                                                 |             | <b>Celkem</b>                               |      |                     |                   |                  |                             | <b>3 422 626,74</b>         | <b>-365 332,78</b> | <b>0,00</b>       | <b>3 057 293,95</b>       | <b>-365 332,78</b>     | <b>-10,67%</b>        |

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.

Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Rostislav Hověžák, (stavbyvedoucí)

Podpis:

Za Objednatele: Tomáš Pecka, (TDS/TDI)

Podpis:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo stavby:

III/33310 hr. H. m. Praha - Šestákovice - Dřevčice - III/510 (III/33310 Zelenáč)

|              |                                                 |                 |
|--------------|-------------------------------------------------|-----------------|
| 1            | Přijetí emurní částka bez rezervy a DPH         | 5 240 813,75 Kč |
| 2=1+19+20    | Aktuální emurní částka (cena stavby)            | 4 875 580,97 Kč |
|              | Aktuální emurní částka (cena stavby) včetně DPH | 5 899 452,87 Kč |
| 3=(21)*100   | Procento změny Přijetí emurní částky            | 93,03 %         |
| 4=(25/1)*100 | Středování vyhrazených změn (Skupina 1)         | -5,87 %         |
| 5=(28/1)*100 | Středování záměrných položek (Skupina 2)        | 0,00%           |

|             |                                                           |       |
|-------------|-----------------------------------------------------------|-------|
| 6=32+36     | Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4 | 0     |
| 7=(6/1)*100 | Středování limitu 30% - součet Skupiny 3 a Skupiny 4      | 0,00% |
| 8=1*0,3     | Zákonný limit 30% pro Skupinu 3 a Skupinu 4               | 0     |

|                |                                                                                  |       |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 9=(32A/1)*100  | Středování limitu 50% Skupina 3                                                  | 0,00% |
| 10=(36A/1)*100 | Středování limitu 50% Skupina 4                                                  | 0,00% |
| 10A=(32A+36A)  | Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4 | 0     |
| 11=1*0,5       | Zákonný limit 50% pro Skupinu 3 a Skupinu 4                                      | 0     |

|                 |                       |         |
|-----------------|-----------------------|---------|
| 12=(1)*0,15     | Limit                 | 0       |
| 13=(39)/(1)     | Středování limitu v % | 0,00%   |
| 14=ABS(37)+(38) | Hodnota skupiny 5     | 0,00 Kč |

| Skupiny Změn                                                |        |                                               |                                                             |                   |                |                                                               |              |                                     |                                               |                                                           |                                     |                                               |              |                                                                                                               |                                                 |                                               |              |                                     |                                                 |                                               |              |           |
|-------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|-----------|
| - 1 -                                                       |        |                                               | - 2 -                                                       |                   |                | - 3 -                                                         |              |                                     |                                               | - 4 -                                                     |                                     |                                               |              | - 5 -                                                                                                         |                                                 |                                               |              | - 6 -                               |                                                 |                                               |              |           |
| Výhranění změna (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.) |        |                                               | Záměrná položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.) |                   |                | Změny nepřehledné (dle §222 odst. (8) zákona č. 134/2016 Sb.) |              |                                     |                                               | Změny nedržné (dle §222 odst. (9) zákona č. 134/2016 Sb.) |                                     |                                               |              | Změny do minimální Změny nemající celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.) |                                                 |                                               |              |                                     |                                                 |                                               |              |           |
| 80                                                          | ZBV č. | Název ZO/PB / předpokl. Změny                 | Změny záporné (zadávatel se zmanážíkem mínus)               | Změny kladné      | Hodnota ZBV    | Změny záporné (zadávatel se zmanážíkem mínus)                 | Změny kladné | Suma Změn záporných a Změn kladných | Změny záporné (zadávatel se zmanážíkem mínus) | Změny kladné                                              | Suma Změn záporných a Změn kladných | Změny záporné (zadávatel se zmanážíkem mínus) | Změny kladné | Suma Změn záporných a Změn kladných                                                                           | Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných | Změny záporné (zadávatel se zmanážíkem mínus) | Změny kladné | Suma Změn záporných a Změn kladných | Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných | Změny záporné (zadávatel se zmanážíkem mínus) | Změny kladné | Limit 10% |
| 18                                                          | 17     | 18                                            | 19=25+26+29+33+37                                           | 20=34+27+30+34+38 | 21=19+20       | 23                                                            | 24           | 25=23+24                            | 26                                            | 27                                                        | 28=26+27                            | 29                                            | 30           | 32=29+30                                                                                                      | 32A=(29)+30                                     | 33                                            | 34           | 36=33+34                            | 36A=(33)+34                                     | 37                                            | 38           | 39=37+38  |
| síl. III/33310 km 2,550 + 3,600' 1                          | 01     | síl. III/33310 km 2,550 - 3,600' 1 / DOMĚŘENÍ | -365 332,78 Kč                                              | 0,00 Kč           | -365 332,78 Kč | -365 332,78 Kč                                                | 0,00 Kč      | -365 332,78 Kč                      | 0,00 Kč                                       | 0,00 Kč                                                   | 0,00 Kč                             | 0,00 Kč                                       | 0,00 Kč      | 0,00 Kč                                                                                                       | 0,00 Kč                                         | 0,00 Kč                                       | 0,00 Kč      | 0,00 Kč                             | 0,00 Kč                                         | 0,00 Kč                                       | 0,00 Kč      | 0,00 Kč   |
|                                                             |        |                                               |                                                             |                   |                |                                                               |              |                                     |                                               |                                                           |                                     |                                               |              |                                                                                                               |                                                 |                                               |              |                                     |                                                 |                                               |              |           |
|                                                             |        |                                               |                                                             |                   |                |                                                               |              |                                     |                                               |                                                           |                                     |                                               |              |                                                                                                               |                                                 |                                               |              |                                     |                                                 |                                               |              |           |
|                                                             |        |                                               |                                                             |                   |                |                                                               |              |                                     |                                               |                                                           |                                     |                                               |              |                                                                                                               |                                                 |                                               |              |                                     |                                                 |                                               |              |           |

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu vyhrazené změny, Změnového listu ke schválení.

## Přehled dalších dokladů

| Číslo ZBV:                                                                                                                    | 01                                                                               |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Název stavby:                                                                                                                 | III/33310 hr. hl. m. Praha - Šestajovice - Dřevčice - II/610 (III/33310 Zeleneč) |              |
| Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):                                                                        | sil. III/33310 km 2,550 - 3,600                                                  |              |
| Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:                                                                                              | -/1                                                                              |              |
| DOKLAD                                                                                                                        | Součást dokumentace ZBV                                                          |              |
|                                                                                                                               | ANO                                                                              | NE - Uloženo |
|                                                                                                                               | Počet listů                                                                      |              |
| 7. Soupis prací                                                                                                               | 1                                                                                |              |
| 8. Formulář pro ohlášení změn stavby; č. 1 - III/33310 hr. hl. m. Praha - Šestajovice - Dřevčice - II/610 (III/33310 Zeleneč) | 18                                                                               |              |
| 9. Pokyn k ZBV č. 01 ze dne 31.10.2023                                                                                        | 2                                                                                |              |
| <b>Počet listů celkem</b>                                                                                                     | <b>21</b>                                                                        |              |

## Soupis prací

**Stavba:** III/33310 hr. hl. m. Praha - Šestajovice - Dřevčice - II/610 (III/33310 Zeleneč)

**Objekt:** sil. III/33310 km 2,550 - 3,600

**Objednatel:** Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

**Zhotovitel:**

**rozpočet:** OTSKP

| Číslo položky OTSKP | Popis položky                                                                 | MJ  | Výměra   | Kč/MJ      | Celkem Kč    | ZBV 1 - Výměra | Celkem Kč po všech změnách |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------------|--------------|----------------|----------------------------|
| R položka           | DIO vč. zajištění, zjištění a vytyčení inž. sítí , geodetické zaměření stavby | kpl | 1,00     | 129 015,44 | 129 015,44   | 0,00           | 129 015,44                 |
| 113728              | frézování asfalt. ploch, odvoz do 20km                                        | m3  | 714,00   | 703,77     | 502 491,63   | 0,00           | 502 491,63                 |
| 919111              | řezání asfaltového krytu vozovek do 50mm                                      | bm  | 100,00   | 15,89      | 1 588,86     | 0,00           | 1 588,86                   |
| 93818               | čištění vozovek samosběrem                                                    | m2  | 7140,00  | 3,21       | 22 932,55    | 0,00           | 22 932,55                  |
| 574C06              | vyrovnávka asfalt. bet. ACL 16+ ,                                             | m3  | 357,00   | 4 361,00   | 1 556 876,05 | -32,45         | 1 415 346,43               |
| 572223              | spojovací postřik ze sil. emulze do 1,0kg/m2                                  | m2  | 14280,00 | 4,80       | 68 586,54    | -1 298,14      | 62 351,60                  |
| 574A44              | asfalt. beton ACO 11+ 50/70 tl. 50 mm,                                        | m2  | 7140,00  | 235,13     | 1 678 825,84 | -649,07        | 1 526 210,23               |
| R položka           | Sanace konstrukčních vrstev tl. 350 mm (dle technické specifikace)            | m2  | 800,00   | 958,42     | 766 732,27   | 0,00           | 766 732,27                 |
| 91238               | SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU                           | ks  | 44,00    | 296,59     | 13 049,84    | 0,00           | 13 049,84                  |
| 89921               | výšková úprava šachty, vpusti                                                 | ks  | 24,00    | 1 836,72   | 44 081,34    | 0,00           | 44 081,34                  |
| 113761              | frézování spár š. do 10mm , hl. do 20mm                                       | m   | 1064,00  | 52,96      | 56 351,57    | -584,00        | 25 421,76                  |
| 931312              | Zalévání spár dilatační asf. zálivkou                                         | m   | 1064,00  | 58,26      | 61 986,73    | -584,00        | 27 963,94                  |
| 12922               | čištění krajnic od nánosů tl do 100 mm s odvozem na skládku                   | m2  | 700,00   | 9,43       | 6 599,07     | 0,00           | 6 599,07                   |
| 56962               | zpevnění krajnic z recyklátu do tl. 100mm                                     | m2  | 700,00   | 79,89      | 55 926,03    | 0,00           | 55 926,03                  |
| 12931               | čištění příkopu do 0,25m3/m s odvozem na skládku                              | m   | 500,00   | 70,31      | 35 157,30    | 0,00           | 35 157,30                  |
| 015112              | poplatky za likvidaci odpadu nekontaminovaných                                | t   | 273,00   | 192,06     | 52 432,77    | 0,00           | 52 432,77                  |
| 2520                | zkoušení materiálu nezávislou zkušebnou                                       | kpl | 2,00     | 15 888,60  | 31 777,20    | 0,00           | 31 777,20                  |
| 915111              | VDZ V2 - 12,5 cm , barvou, základní                                           | m2  | 375,00   | 108,04     | 40 515,93    | 0,00           | 40 515,93                  |
| 915211              | VDZ - vodící proužky V2 -12,5 , přechod pro chodce atd., plast, retroreflexr  | m2  | 375,00   | 309,30     | 115 986,79   | 0,00           | 115 986,79                 |
|                     | Celkem bez DPH                                                                |     |          |            | 5 240 913,75 |                | 4 875 580,97               |
|                     | DPH 21%                                                                       |     |          |            | 1 100 591,89 |                | 1 023 872,00               |
|                     | Celkem vč. DPH                                                                |     |          |            | 6 341 505,64 |                | 1 023 872,00               |

## FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY; č. 1

„III/33310 hr. hl. m. Praha – Šestajovice – Dřevčice – II/610 (III/33310 Zeleneč)“

### K rukám:

Bc. Tomáš Karásek – Provozní cestmistr, KSÚS  
Tomáš Pecka – Projektový manažer, KSÚS  
Lenka Chmelová – Vedoucí oblasti, KSÚS

### IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

|                                       |                                                                                    |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Název stavby/projektu                 | „III/33310 hr. hl. m. Praha – Šestajovice – Dřevčice – II/610 (III/33310 Zeleneč)“ |
| Název veřejné zakázky                 | „III/33310 hr. hl. m. Praha – Šestajovice – Dřevčice – II/610 (III/33310 Zeleneč)“ |
| Zhotovitel                            | <b>B E S s.r.o.</b><br>se sídlem Sukova 625, 256 01 Benešov<br>IČO 43792553        |
| Osoba oprávněná jednat za zhotovitele | Ing. Zdeněk Račan, vedoucí výroby společnosti B E S s.r.o.                         |

### SMLOUVA O DÍLO

|                       |                                                   |
|-----------------------|---------------------------------------------------|
| Číslo SoD objednatele | S-2778/00066001/2023                              |
| Číslo SoD zhotovitele | S 256/2023                                        |
| Termín plnění         | Dle SoD 6 týdnů od předání staveniště Zhotoviteli |
| Celková cena díla     | 5 240 913,75 Kč bez DPH                           |

Ve vztahu k nadepsané smlouvě o dílo uzavřené v návaznosti na výše uvedenou veřejnou zakázku ohlašujeme v souladu s čl. 6.7 Smlouvy o dílo a v souladu s její Přílohou č. 4 – Směrnice upřesňující provádění změn závazků podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek („Směrnice“), změnu stavby, která dle analýzy zhotovitele představuje v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („ZZVZ“), změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

Jedná se o Změnu nepodstatnou ve smyslu § 100, odst. 1) Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. Tato změna je podle článku 5.1. a), resp. podle článku 7.2. Směrnice R-Sm-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, zařazena do Skupiny 1. Bližší informace jsou uvedeny dále.

Zhotovitel předkládá za účelem zajištění řádného postupu ohlášení změny tento formulář, jehož součástí tvoří veškeré přílohy vyžadované ustanovením článku 18 Směrnice.

Zhotovitel níže uvádí přehled skutečností nutných k posouzení této změny a její dopady na termín plnění a celkové náklady stavby.

# PŘEHLED ZAMÝŠLENÉ ZMĚNY ZÁVAZKU ZE SMLOUVY

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Podstata změny                       | SO 01 - sil. III/33310 km 2,550 - 3,600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Důvody potřeby změny, popis problému | Zadavatel v rámci uveřejněné zadávací projektové dokumentace nezastihnul skutečné výměry na realizovaném SO.<br><br><u>Zhotovitel tímto Ohlášením zjištění skutečnosti Oznamuje Objednateli, následující skutečnosti:</u><br><br>A. Doměrek skutečně provedených položek                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Čeho se zhotovitel domáhá            | Akceptace úprav a vydání pokynu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Vliv na termín plnění                | Bez dopadu na čas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Vliv na celkovou cenu díla           | ANO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Kategorizace změny dle ZZVZ          | Jedná se o Vyhrazenou změnu, která je podle § 5, odst. 1, písm. a) Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 01.01.2022) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 1. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.<br><br>Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 100 se jedná o vyhrazenou změnu. |

V Benešově dne 30/10/2023

V Praze dne

Za zhotovitele

Za objednatele změnu potvrzuje

Ing. Zdeněk Raab  [44]  
Vedoucí výroby Sukova 625, 256 01 Benešov  
B E S s.r.o. IČO 437 92 553, DIČ CZ 437 92 553

Počet listů: 2

Seznam příloh:

1. Návrh ocenění změny
2. Geodetické protokoly

BES s.r.o., Sukova 625, 256 17 Benešov

Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 7496

IC 43792553 DIČ CZ43792553 Bankovní spojení – Česká spořitelna a.s., č. ú. 321096349/0800, Komerční banka a.s., 3300121/0100

T +420 317 722 811, +420 317 725 691 F +420 317 725 691

www.besbn.cz

Stavba: III/33310 hr. hl. m. Praha - Šestajovice - Dřevčice - II/610 (III/33310 Zeleneč)

Objekt: sil. III/33310 km 2,550 - 3,600

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Zhotovitel:

rozpočet: OTSKP

Zpracoval: Bc. Tomáš Karásek

Datum: 8.2.2023

| Číslo položky | Popis položky                                                                 | MJ  | Výměra    | Kč/MJ    | Celkem Kč   |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|-------------|
| R položka     | DIO vč. zajištění, zjištění a vytyčení inž. sítí , geodetické zaměření stavby | kpl | 1,00      |          | 0,00        |
| 113728        | frézování asfalt. ploch, odvoz do 20km                                        | m3  | 714,00    |          | 0,00        |
| 919111        | řezání asfaltového krytu vozovek do 50mm                                      | bm  | 100,00    |          | 0,00        |
| 93818         | čištění vozovek samosběrem                                                    | m2  | 7140,00   |          | 0,00        |
| 574C06        | vyrovnávka asfalt. bet. ACL 16+ ,                                             | m3  | -32,454   | 4 361,00 | -141 529,71 |
| 572223        | spojovací postřik ze sil. emulze do 1,0kg/m2                                  | m2  | -1298,140 | 4,80     | -6 231,07   |
| 574A44        | asfalt. beton ACO 11+ 50/70 tl. 50 mm,                                        | m2  | -649,070  | 235,13   | -152 615,83 |
| R položka     | Sanace konstrukčních vrstev tl. 350 mm (dle technické specifikace)            | m2  | 800,00    |          | 0,00        |
| 91238         | SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU                           | ks  | 44,00     |          | 0,00        |
| 89921         | výšková úprava šachty, vpusti                                                 | ks  | 24,00     |          | 0,00        |
| 113761        | frézování spár š. do 10mm , hl. do 20mm                                       | m   | -584,00   | 52,96    | -30 928,64  |
| 931312        | Zalévání spár dilatační asf. zálivkou                                         | m   | -584,00   | 58,26    | -34 023,84  |
| 12922         | čištění krajnic od nánosů tl. do 100 mm s odvozem na skládku                  | m2  | 700,00    |          | 0,00        |
| 56962         | zpevnění krajnic z recyklátu do tl. 100mm                                     | m2  | 700,00    |          | 0,00        |
| 12931         | čištění příkopu do 0,25m3/m s odvozem na skládku                              | m   | 500,00    |          | 0,00        |
| 015112        | poplatky za likvidaci odpadu nekontaminovaných                                | t   | 273,00    |          | 0,00        |
| 2520          | zkoušení materiálu nezávislou zkušebnou                                       | kpl | 2,00      |          | 0,00        |
| 915111        | VDZ V2 - 12,5 cm , barvou, základní                                           | m2  | 375,00    |          | 0,00        |
| 915211        | VDZ - vodící proužky V2 -12,5 , přechod pro chodce atd., plast, retroreflexní | m2  | 375,00    |          | 0,00        |
|               | Celkem bez DPH                                                                |     |           |          | -365 329,09 |
|               | DPH 21%                                                                       |     |           |          | -76 719,11  |
|               | Celkem vč. DPH                                                                |     |           |          | -442 048,20 |



# TECHNICKÁ ZPRÁVA

**Zaměření asfaltového povrchu před vyfrézováním**

---

**III/33310 hr.hl.m. Praha–Šestajovice–Dřevčice–II/610  
(úsek III/33310 Zeleneč)**

---

**Zhotovitel:**

**BDS Benešov s.r.o.**

Myslíč 30, 256 01 Benešov u Prahy

**Investor:**

**KSÚS Středočeského kraje,**

Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov

**Objednatel:**

**BES s.r.o.**

Sukova 625, 256 01 Benešov

## 1. Zadaný úkol

**Akce :** III/33310 hr.hl.m. Praha–Šestajovice–Dřevčice–II/610 (úsek III/33310 Zeleneč)

**Úkol :** Zaměření asfaltového povrchu před vyfrézováním

**Lokalita :** ppč. 682/1, 785, 890, 706 a část přilehlých pozemků

**Využití výsledků dřívějšího měření :** soubor s katastrální mapou DKM

**Podklady dodané objednatelem :** projektová dokumentace

## 2. Geodetické práce

### 2.1 Popis zájmového území

**a) Okres :** Praha – východ

**Obec :** Zeleneč, Šestajovice u Prahy

**Katastrální území :** Zeleneč, Šestajovice u Prahy

**b) Lokalitu tvoří :** komunikace dle zadaného rozsahu

**c) Investor navíc žádá :** ----

### 2.2 Souřadnicový a výškový systém

Polohopisné měření bylo provedeno v systému S-JTSK

Výškopisné měření bylo provedeno v systému Balt p.v.

### 2.3 Použité měřické metody a přístroje

Pro polohové i výškové připojení stanovisek byla použita vytyčovací síť určená technologií GNSS – přístroje SOUTH INNO7 a Mobilbase DS4 a metoda RTK, Trimble VRS Now Czech.

Pro polohové připojení podrobných bodů byl použit přístroj NIKON XF2 a metoda polární. Pro výškové měření byl použit přístroj NIKON XF2 a metoda trigonometrického určování výšek.

### 2.4 Výpočetní a grafické práce

Souřadnice stanovisek v systému S-JTSK byly určeny technologií GNSS s využitím programu Transform MAX 1710 verze 6.

Pomocí PC a programu Geus 27.0 byly metodou polární vypočteny souřadnice a výšky podrobných bodů. Grafické práce byly provedeny pomocí programu Geus 27.0.

Výpočet výměry byl proveden v programu GEUS 27.0 automatickým výpočtem ploch.

**Plocha asfaltů před vyfrézováním je 6491 m<sup>2</sup>.**

### 3. Rozbor přesnosti

Měřické a výpočetní práce byly provedeny ve 3. třídě přesnosti, žádná z dopustných odchylek nebyla překročena.

Náležitostmi a přesností odpovídá právním předpisům.

### 4. Jiné specifické údaje

### 5. Seznam elaborátů

- a) Technická zpráva
- b) Seznam souřadnic
- c) Tištěný a digitální výstup (DXF, DWG, DGN, PDF) v měřítku 1 : 500

### 6. Vyhotovitelé

|                                 |                             |
|---------------------------------|-----------------------------|
| <b><i>Měřické práce :</i></b>   | Ivana Divišová, Martin Lisý |
| <b><i>Výpočetní práce :</i></b> | Ivana Divišová              |
| <b><i>Grafické práce :</i></b>  | Ivana Divišová              |

===== Výpočet výměry plochy asfaltů před vyfrézováním =====

-----  
přesnost vstupu souřadnic na [cm]

| číslo bodu | oměrná | X         | Y          |
|------------|--------|-----------|------------|
| 170        |        | 724506.94 | 1041251.16 |
| 171        | 16.29  | 724499.59 | 1041265.70 |
| 177        | 13.12  | 724493.82 | 1041277.48 |
| 178        | 14.20  | 724487.33 | 1041290.11 |
| 183        | 14.69  | 724481.37 | 1041303.54 |
| 184        | 14.33  | 724476.31 | 1041316.95 |
| 189        | 15.42  | 724472.31 | 1041331.84 |
| 190        | 14.51  | 724468.86 | 1041345.93 |
| 195        | 20.27  | 724464.16 | 1041365.65 |
| 196        | 20.13  | 724459.94 | 1041385.33 |
| 201        | 20.69  | 724456.17 | 1041405.67 |
| 202        | 20.21  | 724452.94 | 1041425.62 |
| 207        | 20.31  | 724450.07 | 1041445.73 |
| 208        | 19.38  | 724446.78 | 1041464.83 |
| 213        | 19.41  | 724443.97 | 1041484.04 |
| 214        | 20.11  | 724441.21 | 1041503.96 |
| 219        | 19.84  | 724438.53 | 1041523.62 |
| 220        | 7.08   | 724437.25 | 1041530.58 |
| 221        | 3.20   | 724440.42 | 1041531.05 |
| 222        | 3.15   | 724443.53 | 1041531.54 |
| 217        | 7.65   | 724444.54 | 1041523.96 |
| 216        | 19.47  | 724447.26 | 1041504.68 |
| 211        | 20.48  | 724449.94 | 1041484.38 |
| 210        | 19.11  | 724452.86 | 1041465.49 |
| 205        | 19.56  | 724455.56 | 1041446.12 |
| 204        | 19.61  | 724458.56 | 1041426.74 |
| 199        | 20.35  | 724461.81 | 1041406.65 |
| 198        | 20.23  | 724465.47 | 1041386.75 |
| 193        | 20.94  | 724469.90 | 1041366.28 |
| 192        | 19.30  | 724474.42 | 1041347.52 |
| 187        | 15.13  | 724478.02 | 1041332.82 |
| 186        | 13.95  | 724481.90 | 1041319.42 |
| 181        | 14.30  | 724486.86 | 1041306.01 |
| 180        | 14.36  | 724492.89 | 1041292.98 |
| 175        | 14.14  | 724499.44 | 1041280.45 |
| 173        | 13.28  | 724505.69 | 1041268.73 |
| 174        | 8.55   | 724509.84 | 1041261.26 |
| 168        | 8.13   | 724513.42 | 1041253.96 |
| 167        | 17.86  | 724520.78 | 1041237.69 |
| 159        | 18.91  | 724528.90 | 1041220.61 |
| 156        | 14.15  | 724535.34 | 1041208.01 |
| 157        | 14.93  | 724542.15 | 1041194.72 |
| 150        | 18.76  | 724551.16 | 1041178.27 |
| 149        | 19.12  | 724560.51 | 1041161.59 |
| 144        | 19.89  | 724570.12 | 1041144.18 |
| 143        | 8.03   | 724574.15 | 1041137.23 |
| 136        | 31.22  | 724589.49 | 1041110.04 |
| 135        | 8.00   | 724593.46 | 1041103.09 |
| 130        | 15.12  | 724601.47 | 1041090.27 |
| 129        | 13.71  | 724609.27 | 1041079.00 |
| 124        | 13.97  | 724617.89 | 1041068.01 |
| 123        | 14.14  | 724627.23 | 1041057.39 |
| 118        | 13.80  | 724637.08 | 1041047.72 |
| 117        | 13.58  | 724647.20 | 1041038.67 |
| 112        | 14.23  | 724658.39 | 1041029.88 |
| 109        | 28.94  | 724680.64 | 1041011.38 |

\*

|     |       |           |            |   |
|-----|-------|-----------|------------|---|
| 104 | 19.70 | 724696.07 | 1040999.13 |   |
| 103 | 18.99 | 724710.96 | 1040987.35 | * |
| 098 | 20.00 | 724726.63 | 1040974.93 |   |
| 097 | 19.00 | 724741.54 | 1040963.15 |   |
| 090 | 19.13 | 724756.54 | 1040951.28 |   |
| 083 | 14.59 | 724767.97 | 1040942.22 |   |
| 082 | 5.64  | 724772.63 | 1040939.05 |   |
| 068 | 32.81 | 724796.12 | 1040916.15 |   |
| 067 | 8.64  | 724801.60 | 1040909.47 |   |
| 062 | 10.70 | 724808.45 | 1040901.25 |   |
| 056 | 10.26 | 724813.95 | 1040892.59 |   |
| 055 | 11.06 | 724819.47 | 1040883.01 |   |
| 054 | 16.84 | 724827.40 | 1040868.15 |   |
| 049 | 20.59 | 724836.59 | 1040849.72 |   |
| 044 | 18.34 | 724844.85 | 1040833.34 |   |
| 045 | 7.05  | 724848.00 | 1040827.03 |   |
| 048 | 9.98  | 724852.35 | 1040818.05 |   |
| 037 | 6.64  | 724855.31 | 1040812.11 | * |
| 036 | 2.64  | 724856.50 | 1040809.75 |   |
| 031 | 6.79  | 724859.51 | 1040803.66 |   |
| 030 | 2.60  | 724860.60 | 1040801.30 |   |
| 024 | 17.23 | 724868.20 | 1040785.84 | * |
| 020 | 24.77 | 724879.15 | 1040763.62 |   |
| 023 | 10.19 | 724883.62 | 1040754.46 |   |
| 013 | 5.67  | 724886.17 | 1040749.40 |   |
| 012 | 18.76 | 724894.43 | 1040732.56 |   |
| 007 | 19.14 | 724902.91 | 1040715.40 |   |
| 006 | 19.20 | 724911.38 | 1040698.17 |   |
| 001 | 19.18 | 724919.89 | 1040680.98 |   |
| 002 | 3.88  | 724916.41 | 1040679.27 |   |
| 003 | 3.91  | 724912.79 | 1040677.78 |   |
| 004 | 18.99 | 724904.49 | 1040694.86 |   |
| 009 | 18.97 | 724896.17 | 1040711.91 | * |
| 010 | 18.98 | 724887.85 | 1040728.97 |   |
| 015 | 19.00 | 724879.50 | 1040746.04 |   |
| 018 | 20.96 | 724870.25 | 1040764.85 | * |
| 026 | 20.02 | 724861.43 | 1040782.82 |   |
| 028 | 16.98 | 724853.92 | 1040798.05 |   |
| 033 | 2.54  | 724852.78 | 1040800.32 |   |
| 034 | 6.79  | 724849.78 | 1040806.41 |   |
| 039 | 2.64  | 724848.64 | 1040808.79 |   |
| 042 | 23.41 | 724838.32 | 1040829.80 |   |
| 051 | 19.02 | 724829.90 | 1040846.86 |   |
| 052 | 19.99 | 724821.00 | 1040864.76 |   |
| 057 | 13.02 | 724814.88 | 1040876.25 |   |
| 060 | 24.61 | 724801.83 | 1040897.11 |   |
| 065 | 10.04 | 724795.94 | 1040905.24 |   |
| 070 | 7.99  | 724790.59 | 1040911.18 |   |
| 071 | 8.01  | 724784.85 | 1040916.76 |   |
| 079 | 9.04  | 724778.41 | 1040923.11 |   |
| 080 | 9.90  | 724771.58 | 1040930.28 |   |
| 085 | 10.10 | 724763.73 | 1040936.64 |   |
| 088 | 14.77 | 724752.82 | 1040946.60 |   |
| 095 | 18.79 | 724738.23 | 1040958.44 |   |
| 100 | 19.73 | 724722.79 | 1040970.72 |   |
| 101 | 19.48 | 724707.46 | 1040982.74 |   |
| 106 | 19.66 | 724692.03 | 1040994.92 | * |
| 107 | 19.12 | 724677.03 | 1041006.77 |   |
| 114 | 29.43 | 724654.05 | 1041025.16 |   |
| 115 | 13.31 | 724643.81 | 1041033.67 |   |
| 120 | 14.86 | 724632.66 | 1041043.50 |   |


|     |       |           |            |
|-----|-------|-----------|------------|
| 121 | 13.60 | 724622.89 | 1041052.96 |
| 126 | 15.27 | 724612.72 | 1041064.35 |
| 127 | 13.78 | 724604.29 | 1041075.25 |
| 132 | 14.49 | 724596.13 | 1041087.22 |
| 133 | 14.62 | 724588.20 | 1041099.50 |
| 139 | 12.40 | 724582.15 | 1041110.32 |
| 140 | 18.43 | 724573.00 | 1041126.32 |
| 146 | 17.41 | 724564.67 | 1041141.61 |
| 147 | 19.29 | 724555.40 | 1041158.53 |
| 152 | 19.37 | 724546.07 | 1041175.51 |
| 153 | 18.89 | 724536.99 | 1041192.08 |
| 154 | 15.05 | 724529.85 | 1041205.33 |
| 161 | 14.66 | 724523.22 | 1041218.40 |
| 162 | 8.64  | 724519.39 | 1041226.15 |
| 163 | 1.61  | 724518.59 | 1041227.55 |
| 164 | 6.92  | 724515.50 | 1041233.74 |
| 165 | 1.55  | 724514.84 | 1041235.14 |
| 170 | 17.86 | 724506.94 | 1041251.16 |

---

**Vypočtená výměra asfaltové plochy : 6490.931 m2**

Pozn. Výměra je bez vložených bodů označených \* (body na přímce)

**LEGENDA :**

-  vlastnická hranice
-  vlastnická hranice-vnitřní kresba
-  hranice katastrálního území
-  asfaltová komunikace, retardér
-  kolej
-  FIX

Výškový systém : Bpv


Souřadnicový systém : S-JTSK

S



|                                                                                                                                                  |                                    |                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Měřické práce :<br>Ivana Divišová, Martin Lisý                                                                                                   |                                    | <b>BDS Benešov s.r.o.</b><br>Myslíč 30<br>256 01 Benešov |
| Výpočetní práce :<br>Ivana Divišová                                                                                                              | Grafické práce :<br>Ivana Divišová |                                                          |
| Okres : Praha – východ                                                                                                                           | Obec : Zeleneč, Šestajovice        | Kat. úz. : Zeleneč, Šestajovice                          |
| Investor: KSÚS Středočeského kraje,<br>Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 – Smíchov                                                                 |                                    | Datum : 16.10.2023                                       |
|                                                                                                                                                  |                                    | Měřítko : 1 : 500                                        |
| Objednatel : BES s.r.o., Sukova 625, 256 01 Benešov                                                                                              |                                    | Č.zakázky : 84/2023                                      |
| Akce: <b>III/33310 hr.hl.m. Praha – Šestajovice – Dřevčice – II/610<br/>(III/33310 Zeleneč)<br/>Zaměření asfaltového povrchu před frézováním</b> |                                    |                                                          |



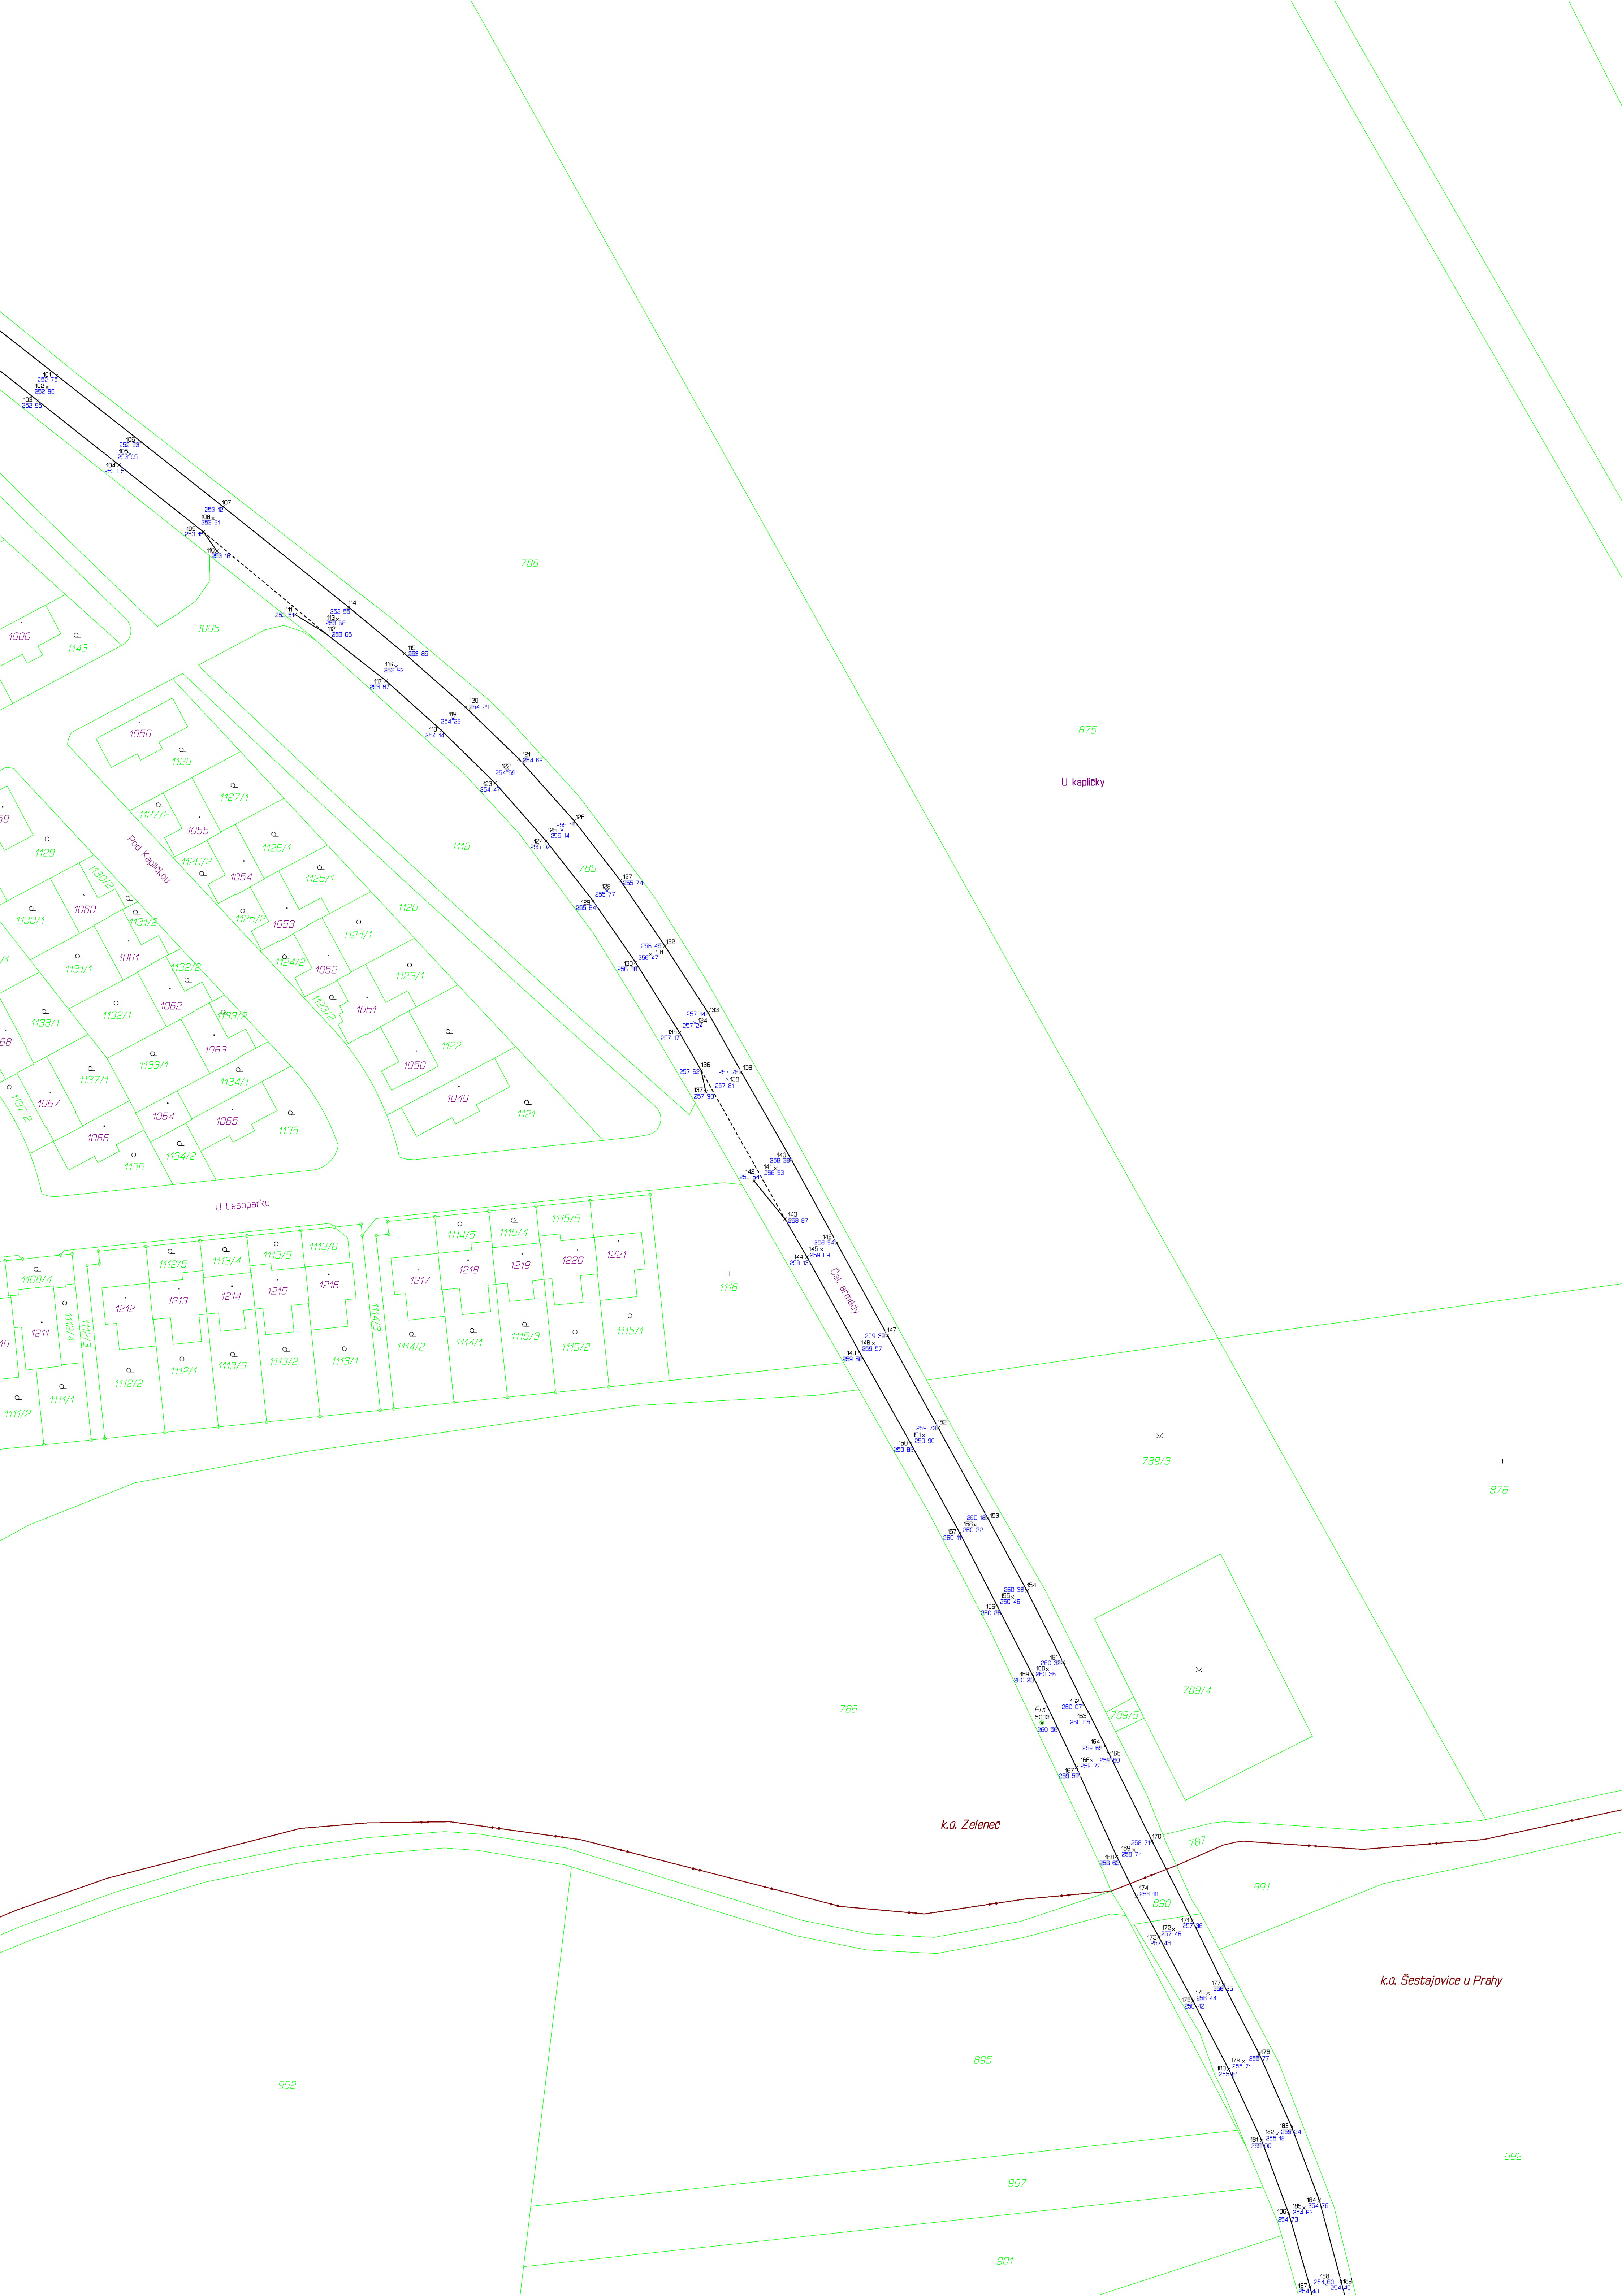



**III/33310 hr.hl.m. Praha-Šestajovice-Dřevčice-II/610  
(úsek III/33310 Zeleneč)**

**Zaměření asfaltového povrchu před vyfrézováním**

=====

**S E Z N A M    S O U Ř A D N Í C**

=====

Souřadnicový systém: S-JTSK

Výškový systém: BPV

-----

| ČÍSLO BODU | Y | X | Z | POPIS |
|------------|---|---|---|-------|
|------------|---|---|---|-------|

-----

|    |           |            |        |          |
|----|-----------|------------|--------|----------|
| 1  | 724919.89 | 1040680.98 | 258.14 |          |
| 2  | 724916.41 | 1040679.27 | 258.18 |          |
| 3  | 724912.79 | 1040677.78 | 258.17 |          |
| 4  | 724904.49 | 1040694.86 | 256.97 |          |
| 5  | 724907.92 | 1040696.46 | 257.02 |          |
| 6  | 724911.38 | 1040698.17 | 256.92 |          |
| 7  | 724902.91 | 1040715.40 | 255.83 |          |
| 8  | 724899.28 | 1040713.64 | 255.96 |          |
| 9  | 724896.17 | 1040711.91 | 255.93 |          |
| 10 | 724887.85 | 1040728.97 | 255.17 |          |
| 11 | 724891.24 | 1040730.70 | 255.27 |          |
| 12 | 724894.43 | 1040732.56 | 255.13 |          |
| 13 | 724886.17 | 1040749.40 | 254.58 |          |
| 14 | 724882.59 | 1040747.79 | 254.67 |          |
| 15 | 724879.50 | 1040746.04 | 254.63 |          |
| 16 | 724876.81 | 1040749.06 | 254.57 |          |
| 17 | 724870.60 | 1040760.09 | 254.32 |          |
| 18 | 724870.25 | 1040764.85 | 254.19 |          |
| 19 | 724874.45 | 1040764.10 | 254.31 |          |
| 20 | 724879.15 | 1040763.62 | 254.26 |          |
| 21 | 724881.04 | 1040762.22 | 254.35 |          |
| 22 | 724883.59 | 1040756.61 | 254.39 |          |
| 23 | 724883.62 | 1040754.46 | 254.40 |          |
| 24 | 724868.20 | 1040785.84 | 253.86 |          |
| 25 | 724864.76 | 1040784.41 | 253.97 |          |
| 26 | 724861.43 | 1040782.82 | 253.90 |          |
| 28 | 724853.92 | 1040798.05 | 253.69 | retardér |
| 29 | 724857.16 | 1040799.62 | 253.86 | retardér |
| 30 | 724860.60 | 1040801.30 | 253.73 | retardér |
| 31 | 724859.51 | 1040803.66 | 253.82 | retardér |
| 32 | 724856.13 | 1040801.99 | 253.92 | retardér |
| 33 | 724852.78 | 1040800.32 | 253.77 | retardér |
| 34 | 724849.78 | 1040806.41 | 253.69 | retardér |
| 35 | 724853.14 | 1040808.06 | 253.84 | retardér |
| 36 | 724856.50 | 1040809.75 | 253.74 | retardér |
| 37 | 724855.31 | 1040812.11 | 253.60 | retardér |
| 38 | 724851.87 | 1040810.36 | 253.72 | retardér |
| 39 | 724848.64 | 1040808.79 | 253.60 | retardér |
| 40 | 724844.95 | 1040812.53 | 253.50 |          |
| 41 | 724839.17 | 1040824.85 | 253.37 |          |
| 42 | 724838.32 | 1040829.80 | 253.36 |          |
| 43 | 724841.52 | 1040831.59 | 253.47 |          |
| 44 | 724844.85 | 1040833.34 | 253.40 |          |
| 45 | 724848.00 | 1040827.03 | 253.43 |          |
| 46 | 724849.50 | 1040826.01 | 253.41 |          |
| 47 | 724852.14 | 1040820.73 | 253.49 |          |
| 48 | 724852.35 | 1040818.05 | 253.49 |          |

|     |           |            |        |          |
|-----|-----------|------------|--------|----------|
| 49  | 724836.59 | 1040849.72 | 253.30 |          |
| 50  | 724833.14 | 1040848.36 | 253.45 |          |
| 51  | 724829.90 | 1040846.86 | 253.34 |          |
| 52  | 724821.00 | 1040864.76 | 253.23 |          |
| 53  | 724824.03 | 1040866.33 | 253.30 |          |
| 54  | 724827.40 | 1040868.15 | 253.16 |          |
| 55  | 724819.47 | 1040883.01 | 253.11 |          |
| 56  | 724813.95 | 1040892.59 | 253.08 |          |
| 57  | 724814.88 | 1040876.25 | 253.14 |          |
| 58  | 724808.80 | 1040881.24 | 253.07 |          |
| 59  | 724802.59 | 1040891.31 | 253.00 |          |
| 60  | 724801.83 | 1040897.11 | 253.01 |          |
| 61  | 724805.27 | 1040898.85 | 253.14 |          |
| 62  | 724808.45 | 1040901.25 | 253.13 |          |
| 63  | 724816.14 | 1040880.90 | 253.15 |          |
| 64  | 724810.51 | 1040890.54 | 253.13 |          |
| 65  | 724795.94 | 1040905.24 | 253.02 |          |
| 66  | 724798.96 | 1040907.48 | 253.13 |          |
| 67  | 724801.60 | 1040909.47 | 253.20 |          |
| 68  | 724796.12 | 1040916.15 | 253.21 |          |
| 69  | 724793.48 | 1040914.01 | 253.19 |          |
| 70  | 724790.59 | 1040911.18 | 253.09 |          |
| 71  | 724784.85 | 1040916.76 | 253.04 |          |
| 72  | 724788.15 | 1040920.12 | 253.18 |          |
| 73  | 724793.48 | 1040920.44 | 253.18 |          |
| 74  | 724792.57 | 1040922.50 | 253.15 |          |
| 75  | 724786.25 | 1040929.28 | 252.99 |          |
| 76  | 724784.57 | 1040930.94 | 252.95 |          |
| 77  | 724776.49 | 1040937.52 | 252.78 |          |
| 78  | 724781.62 | 1040926.56 | 253.08 |          |
| 79  | 724778.41 | 1040923.11 | 252.95 |          |
| 80  | 724771.58 | 1040930.28 | 252.80 |          |
| 81  | 724773.87 | 1040933.92 | 252.89 |          |
| 82  | 724772.63 | 1040939.05 | 252.80 |          |
| 83  | 724767.97 | 1040942.22 | 252.74 | retardér |
| 84  | 724765.98 | 1040939.75 | 252.83 | retardér |
| 85  | 724763.73 | 1040936.64 | 252.79 | retardér |
| 86  | 724762.76 | 1040938.31 | 252.84 | retardér |
| 87  | 724753.30 | 1040945.86 | 252.71 | retardér |
| 88  | 724752.82 | 1040946.60 | 252.67 | retardér |
| 89  | 724754.59 | 1040948.82 | 252.77 | retardér |
| 90  | 724756.54 | 1040951.28 | 252.75 | retardér |
| 91  | 724759.09 | 1040948.45 | 252.82 | retardér |
| 92  | 724764.58 | 1040944.08 | 252.94 | retardér |
| 93  | 724761.42 | 1040940.12 | 252.96 | retardér |
| 94  | 724755.96 | 1040944.44 | 252.89 | retardér |
| 95  | 724738.23 | 1040958.44 | 252.67 |          |
| 96  | 724739.83 | 1040960.78 | 252.79 |          |
| 97  | 724741.54 | 1040963.15 | 252.80 |          |
| 98  | 724726.63 | 1040974.93 | 252.80 |          |
| 99  | 724724.64 | 1040972.67 | 252.84 |          |
| 100 | 724722.79 | 1040970.72 | 252.74 |          |
| 101 | 724707.46 | 1040982.74 | 252.75 |          |
| 102 | 724709.28 | 1040984.92 | 252.96 |          |
| 103 | 724710.96 | 1040987.35 | 252.95 |          |
| 104 | 724696.07 | 1040999.13 | 253.05 |          |
| 105 | 724694.10 | 1040997.16 | 253.05 |          |
| 106 | 724692.03 | 1040994.92 | 252.93 |          |
| 107 | 724677.03 | 1041006.77 | 253.12 |          |
| 108 | 724678.87 | 1041008.95 | 253.21 |          |
| 109 | 724680.64 | 1041011.38 | 253.15 |          |

|     |           |            |        |
|-----|-----------|------------|--------|
| 110 | 724678.16 | 1041014.90 | 253.18 |
| 111 | 724663.83 | 1041026.53 | 253.51 |
| 112 | 724658.39 | 1041029.88 | 253.65 |
| 113 | 724656.09 | 1041027.43 | 253.68 |
| 114 | 724654.05 | 1041025.16 | 253.55 |
| 115 | 724643.81 | 1041033.67 | 253.85 |
| 116 | 724645.35 | 1041036.08 | 253.92 |
| 117 | 724647.20 | 1041038.67 | 253.87 |
| 118 | 724637.08 | 1041047.72 | 254.14 |
| 119 | 724634.94 | 1041045.63 | 254.22 |
| 120 | 724632.66 | 1041043.50 | 254.29 |
| 121 | 724622.89 | 1041052.96 | 254.62 |
| 122 | 724625.03 | 1041055.13 | 254.59 |
| 123 | 724627.23 | 1041057.39 | 254.47 |
| 124 | 724617.89 | 1041068.01 | 255.02 |
| 125 | 724614.98 | 1041065.95 | 255.14 |
| 126 | 724612.72 | 1041064.35 | 255.15 |
| 127 | 724604.29 | 1041075.25 | 255.74 |
| 128 | 724606.75 | 1041077.14 | 255.77 |
| 129 | 724609.27 | 1041079.00 | 255.64 |
| 130 | 724601.47 | 1041090.27 | 256.38 |
| 131 | 724598.73 | 1041088.78 | 256.47 |
| 132 | 724596.13 | 1041087.22 | 256.45 |
| 133 | 724588.20 | 1041099.50 | 257.14 |
| 134 | 724590.63 | 1041101.29 | 257.24 |
| 135 | 724593.46 | 1041103.09 | 257.17 |
| 136 | 724589.49 | 1041110.04 | 257.62 |
| 137 | 724588.65 | 1041113.92 | 257.90 |
| 138 | 724584.74 | 1041111.66 | 257.81 |
| 139 | 724582.15 | 1041110.32 | 257.75 |
| 140 | 724573.00 | 1041126.32 | 258.38 |
| 141 | 724575.85 | 1041127.96 | 258.53 |
| 142 | 724579.80 | 1041130.27 | 258.54 |
| 143 | 724574.15 | 1041137.23 | 258.87 |
| 144 | 724570.12 | 1041144.18 | 259.13 |
| 145 | 724567.42 | 1041142.84 | 259.09 |
| 146 | 724564.67 | 1041141.61 | 258.94 |
| 147 | 724555.40 | 1041158.53 | 259.39 |
| 148 | 724557.98 | 1041160.04 | 259.57 |
| 149 | 724560.51 | 1041161.59 | 259.58 |
| 150 | 724551.16 | 1041178.27 | 259.83 |
| 151 | 724548.76 | 1041176.86 | 259.90 |
| 152 | 724546.07 | 1041175.51 | 259.73 |
| 153 | 724536.99 | 1041192.08 | 260.18 |
| 154 | 724529.85 | 1041205.33 | 260.38 |
| 155 | 724532.51 | 1041206.47 | 260.46 |
| 156 | 724535.34 | 1041208.01 | 260.26 |
| 157 | 724542.15 | 1041194.72 | 260.11 |
| 158 | 724539.31 | 1041193.30 | 260.22 |
| 159 | 724528.90 | 1041220.61 | 260.23 |
| 160 | 724526.10 | 1041219.71 | 260.36 |
| 161 | 724523.22 | 1041218.40 | 260.32 |
| 162 | 724519.39 | 1041226.15 | 260.07 |
| 163 | 724518.59 | 1041227.55 | 260.05 |
| 164 | 724515.50 | 1041233.74 | 259.65 |
| 165 | 724514.84 | 1041235.14 | 259.60 |
| 166 | 724517.98 | 1041236.41 | 259.72 |
| 167 | 724520.78 | 1041237.69 | 259.59 |
| 168 | 724513.42 | 1041253.96 | 258.63 |
| 169 | 724510.30 | 1041252.79 | 258.74 |
| 170 | 724506.94 | 1041251.16 | 258.71 |

|      |           |            |        |     |
|------|-----------|------------|--------|-----|
| 171  | 724499.59 | 1041265.70 | 257.36 |     |
| 172  | 724503.04 | 1041267.35 | 257.46 |     |
| 173  | 724505.69 | 1041268.73 | 257.43 |     |
| 174  | 724509.84 | 1041261.26 | 258.10 |     |
| 175  | 724499.44 | 1041280.45 | 256.42 |     |
| 176  | 724496.68 | 1041279.06 | 256.44 |     |
| 177  | 724493.82 | 1041277.48 | 256.35 |     |
| 178  | 724487.33 | 1041290.11 | 255.77 |     |
| 179  | 724490.20 | 1041291.50 | 255.71 |     |
| 180  | 724492.89 | 1041292.98 | 255.61 |     |
| 181  | 724486.86 | 1041306.01 | 255.00 |     |
| 182  | 724484.03 | 1041304.79 | 255.18 |     |
| 183  | 724481.37 | 1041303.54 | 255.24 |     |
| 184  | 724476.31 | 1041316.95 | 254.76 |     |
| 185  | 724479.13 | 1041318.36 | 254.82 |     |
| 186  | 724481.90 | 1041319.42 | 254.73 |     |
| 187  | 724478.02 | 1041332.82 | 254.48 |     |
| 188  | 724475.09 | 1041332.38 | 254.60 |     |
| 189  | 724472.31 | 1041331.84 | 254.45 |     |
| 190  | 724468.86 | 1041345.93 | 254.23 |     |
| 191  | 724471.48 | 1041346.75 | 254.38 |     |
| 192  | 724474.42 | 1041347.52 | 254.26 |     |
| 193  | 724469.90 | 1041366.28 | 254.04 |     |
| 194  | 724466.91 | 1041366.05 | 254.15 |     |
| 195  | 724464.16 | 1041365.65 | 254.02 |     |
| 196  | 724459.94 | 1041385.33 | 253.89 |     |
| 197  | 724462.73 | 1041386.13 | 253.99 |     |
| 198  | 724465.47 | 1041386.75 | 253.80 |     |
| 199  | 724461.81 | 1041406.65 | 253.71 |     |
| 200  | 724458.88 | 1041406.09 | 253.84 |     |
| 201  | 724456.17 | 1041405.67 | 253.75 |     |
| 202  | 724452.94 | 1041425.62 | 253.49 |     |
| 203  | 724455.89 | 1041426.16 | 253.66 |     |
| 204  | 724458.56 | 1041426.74 | 253.61 |     |
| 205  | 724455.56 | 1041446.12 | 253.34 |     |
| 206  | 724452.96 | 1041446.04 | 253.38 |     |
| 207  | 724450.07 | 1041445.73 | 253.28 |     |
| 208  | 724446.78 | 1041464.83 | 252.96 |     |
| 209  | 724449.81 | 1041465.15 | 253.02 |     |
| 210  | 724452.86 | 1041465.49 | 252.99 |     |
| 211  | 724449.94 | 1041484.38 | 252.35 |     |
| 212  | 724446.97 | 1041484.31 | 252.46 |     |
| 213  | 724443.97 | 1041484.04 | 252.30 |     |
| 214  | 724441.21 | 1041503.96 | 251.81 |     |
| 215  | 724444.32 | 1041504.19 | 251.91 |     |
| 216  | 724447.26 | 1041504.68 | 251.82 |     |
| 217  | 724444.54 | 1041523.96 | 251.50 |     |
| 218  | 724441.60 | 1041523.88 | 251.53 |     |
| 219  | 724438.53 | 1041523.62 | 251.50 |     |
| 220  | 724437.25 | 1041530.58 | 251.34 |     |
| 221  | 724440.42 | 1041531.05 | 251.39 |     |
| 222  | 724443.53 | 1041531.54 | 251.39 |     |
| 5001 | 724850.19 | 1040825.47 | 253.44 | FIX |
| 5002 | 724439.21 | 1041559.57 | 251.87 | FIX |
| 5003 | 724527.08 | 1041229.50 | 260.56 | FIX |

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**  
**150 21 PRAHA 5, Zborovská 11**

---

**BES s.r.o.**  
**Sukova 625**  
**256 01 Benešov**

*Váš dopis značky / ze dne*

*Naše značka*

*Vyřizuje/telefon*  
Pecka/736623713

*Praha*  
31.10.2023

**Věc: „III/33310 hr. hl. m. Praha - Šestajovice - Dřevčice - II-610 (III-33310 Zeleneč)“ – Pokyn (ZBV č. 1)**

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje jako správce a zároveň zástupce Středočeského kraje jako vlastníka nemovitostí, tj. předmětné komunikace č. III/33310, Vám tímto v souladu s článkem 6.7. smlouvy č. S-2778/00066001/2023 vydává **Pokyn** k zajištění technického řešení a pokračování ve výše zmíněné akci při zpracování změn během výstavby na stavebním objektu:

**„III/33310 hr. hl. m. Praha - Šestajovice - Dřevčice - II-610 (III-33310 Zeleneč)“**

Na základě prohlídky staveniště a následného Oznámení zhotovitele o zjištěných odlišnostech oproti zadávací dokumentaci stavby:

Na základě místního měření bude snížena:

- Výměra celkové plochy pokládky
- Z důvodu pokládky v plné šíři vozovky v části úseku bude odečtena část výměry středové spáry

vydáváme tímto **pokyn** k provedení těchto úprav a ke zpracování ZBV.

Rozsah změn během výstavby bude stanoven na základě skutečného zaměření stavby nebo správcem schválené realizační dokumentace.

Změnové listy budou vypracovány v souladu se směrnicí KSÚS, která je nedílnou součástí Smlouvy o dílo. Tyto ZBV budou následně projednány a podrobně posouzeny supervizorem zakázky, následně budou posouzeny vedením KSÚS.

S pozdravem

Lenka Chmelová  
Vedoucí oblasti Mnichovo Hradiště
