

Krycí list ZBV

Název Stavby dle SoD: II/272 Chotětov - Bezno Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Silnice II/272 - Bezno	Číslo SO/PS / / pořadí Změny SO/PS: 103 / 2	Číslo ZBV: 2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------	---------------------

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001

Zhotovitel: **PORR a.s.**
Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10
IČ: 43005560

Rekapitulace ZBV č. 2 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.1	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.2	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.3	0,00	193 121,87	193 121,87

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.4	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.5	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ SUMA	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2	0,00	193 121,87	193 121,87

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Změnové listy (02)
a pro Rozpis ocenění změn položek (04).

Změnový list

Název Stavby dle SoD:

II/272 Chotětov - Bezno

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Silnice II/272 - Bezno

Číslo SO/PS /

/ pořadí Změny SO/PS:

103 / 2

Číslo ZBV / Skupina změny:

2.3

Strany smlouvy o dílo S-2050/00066001/2022 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 12.08.2022 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: PORR a.s., Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10, Strašnice

Přílohy Změnového listu:

1. Krycí list	1	počet listů
2. Změnový list	2	počet listů
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů
4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů
5. Přehled zařazení změn do Skupin	1	počet listů
6. Přehled dokladů	1	počet listů
7. Soupis prací SO po všech změnách	3	počet listů
Další doklady dle přehledu dokladů	8	počet listů

Příjemce

Objednatel
Zhotovitel
Projektant (AD)
Stavební dozor

Iniciátor Změny: Zhotovitel

Předmět Změny: Zřízení štěrbinového žlabu na místní komunikaci

Zřízení štěrbinového žlabu na místní komunikaci

Zadávací dokumentace (zpracovatel PRAGOPROJEKT, a.s.) neuvažovala s žádným opatřením na zachycení povrchové vody z přívalových dešťů, neboť se jedná o extrémní klimatické vlivy. V průběhu stavby se však, po přívalové dešťové srážce, ukázala nutnost přijmout tato opatření a místní komunikaci v km 2,690 opatřit příčným štěrbinovým žlabem zachycujícím povrchovou vodu z vozovky a zároveň převádějící vodu z dlážděného žlabu podél vozovky do otevřeného příkopu za místní komunikací, kterým je voda volně odvedena do krajiny.

Na tuto změnu byla vypracována PD (viz. příloha 12), základě které byl vypracován změnový VV. Tímto opatřením bude i do budoucna zabráněno zaplavování pozemků přiléhajícím k místní komunikaci a tím se zabrání vzniku škod na majetku jejíž příčinou by bylo nedostatečné odvodnění komunikace II/272.

Po zaslání Žádosti o vydání pokynu k variaci (příloha č. 08) byl vydán Objednatelem Souhlas se zpracováním ZBV (příloha č. 09), souhlasné vyjádření vydal i AD a TDI (přílohy č. 10 a 11)

Změna se týká následujících položek :

Zvýšení stávajících položek č. 1, 2, 5, 8, 9, 11, 13, 17, 21, 22, 23, 35, 36 a vzniku nových položek č. 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108 a 109

Tato změna zvyšuje smluvní cenu stavby o 193 121,87 Kč.

Jedná se o Změny nepředvídané, které jsou podle § 5, odst. 1, písm. c) Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 01.01.2022) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazený do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná o změnu nepředvídanou.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
0,00	193 121,87	193 121,87	193 121,87

Technická pomoc Objednatele jméno Daniel Löffler podpis

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí): jméno Dušan Mach podpis

Projektant (autorský dozor): jméno Ing Karel Fazekas podpis

Stavební dozor: jméno Petr Burger podpis

Supervize (Regionální dotační kancelář) jméno podpis

Zástupce Objednatele: jméno Jan Zákostelský, DiS podpis

Zástupce objednatel odpovědný za cenové projednání Změny: jméno Ing. Jaroslava Jurková podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou Dokumentací této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 **Obchodních podmínek**. Tento Změnový list představuje **Dodatek Smlouvy o dílo**. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba KSÚS): jméno Ing. Jan Fidler, DiS podpis

Objednatel (Oprávněná osoba Městys Bezno): jméno Mgr. Zděnek Volf podpis

Zhotovitel: jméno Petr Škvařil
Ing Martin Lukas podpis

ZÁPIS**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 2**

Název Stavby:	II/272 Chotětov - Bežno
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	103 / 2
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	Silnice II/272 - Bežno

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
4 086 872,16

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	-2 381 899,05	1 037 724,62	2 742 697,73	-1 344 174,43

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	193 121,87	1 230 846,49	30,12%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-2 381 899,05	2 935 819,60	-1 151 052,56	-28,16%

Rozpis položek a cen Změny ZBV 2														
Název stavby dle SoD: II/272 Chotětov - Bezno Číslo a název SO/PS: SO 103 - Silnice II/272 - Bezno Číslo a název rozpočtu: SO 103 - Silnice II/272 - Bezno								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) SO 103 Skupina změn 3						
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %	Cenová soustava
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	014101.	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	1 257,000	1 263,110	6,110	120,45	151 405,65	0,00	735,95	152 141,60	735,95	0,49%	
2	014102.a	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	480,567	531,107	50,540	201,20	96 690,08	0,00	10 168,65	106 858,73	10 168,65	10,52%	
5	11332.	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO	M3	240,000	264,120	24,120	382,33	91 759,20	0,00	9 221,80	100 981,00	9 221,80	10,05%	
8	113765.	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	22,000	40,000	18,000	39,12	860,64	0,00	704,16	1 564,80	704,16	81,82%	
9	12273.	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I	M3	1 231,000	1 237,110	6,110	104,67	128 848,77	0,00	639,53	129 488,30	639,53	0,50%	
11	17130.	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮV V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM	M3	936,000	947,170	11,170	32,54	30 457,44	0,00	363,47	30 820,91	363,47	1,19%	
13	18110.	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	1 860,000	1 881,920	21,920	18,22	33 889,20	0,00	399,38	34 288,58	399,38	1,18%	
17	56330.	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	543,000	553,240	10,240	1 463,82	794 854,26	0,00	14 989,52	809 843,78	14 989,52	1,89%	
21	572212.	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK ASFALTU DO 0,5KG/M2	M2	1 561,000	1 590,400	29,400	16,99	26 521,39	0,00	499,51	27 020,90	499,51	1,88%	
22	574804.	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S	M3	63,000	63,588	0,588	8 379,00	527 877,00	0,00	4 926,85	532 803,85	4 926,85	0,93%	
23	574E06.	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S	M3	124,000	125,176	1,176	5 598,81	694 252,44	0,00	6 584,20	700 836,64	6 584,20	0,95%	
35	917224.	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	142,000	152,000	10,000	547,66	77 767,72	0,00	5 476,60	83 244,32	5 476,60	7,04%	
36	931315.	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 600MM2	M	22,000	40,000	18,000	44,71	983,62	0,00	804,78	1 788,40	804,78	81,82%	
Nové položky														
103	11318.	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC	M3	0,000	0,158	0,158	1 067,04	0,00	0,00	168,59	168,59	168,59	100,00%	OTSKP 2023
100	11329.	ODSTRANĚNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH, PŘÍKOPU A RIGOLU Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	0,000	0,237	0,237	1 060,02	0,00	0,00	251,22	251,22	251,22	100,00%	OTSKP 2023
101	11352.	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	M	0,000	2,000	2,000	117,00	0,00	0,00	234,00	234,00	234,00	100,00%	OTSKP 2023
105	45131A.	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25	M3	0,000	2,358	2,358	3 893,52	0,00	0,00	9 180,92	9 180,92	9 180,92	100,00%	JC převzata z SO 101
107	451323.	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ŽELEZOBETU DO C16/20	M3	0,000	1,080	1,080	4 126,10	0,00	0,00	4 456,19	4 456,19	4 456,19	100,00%	OTSKP 2023
108	451366.	VÝZTUŽ PODKL VRSTEV Z KARI-SÍTÍ	T	0,000	0,180	0,180	42 560,00	0,00	0,00	7 660,80	7 660,80	7 660,80	100,00%	OTSKP 2023
106	46251.	ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	0,000	0,650	0,650	1 331,00	0,00	0,00	865,15	865,15	865,15	100,00%	OTSKP 2023
102	582611.	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	0,000	0,630	0,630	572,33	0,00	0,00	360,57	360,57	360,57	100,00%	OTSKP 2023
109	819999.R.	Štěrbínový žlab 500/600 mm	M	0,000	9,000	9,000	9 480,00	0,00	0,00	85 320,00	85 320,00	85 320,00	100,00%	Indiv. kalkulace položky
104	935812.	ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 100MM	M2	0,000	19,430	19,430	1 498,20	0,00	0,00	29 110,03	29 110,03	29 110,03	100,00%	JC převzata z SO 104
Celkem									0,00	193 121,87		193 121,87		

Odpovědní zástupce Objednatele i odpovědní zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: jméno, (stavbyvedoucí)

Za Objednatele: jméno, (TDS/TDI)

Podpis:

Podpis:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: II/272 Chotětov - Bezno

1	Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	38 978 200,00
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	37 827 147,44
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	45 770 848,40
3=(2/1)*100	Procento změny Přijáté smluvní částky	97,05%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	-1 151 052,56
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	-2,95%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	11 693 460,00

9=(32A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	9,27%
10=(36A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,00%
10A=32A+36A	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	3 612 745,54
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	19 489 100,00

12=(1)*0,15	Limit	5 846 730,00
13=(39)/(1)	Sledování limitu v %	0,00%
14=ABS(37)+(38)	Hodnota skupiny 5	0,00

SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	- 1 -			- 2 -			- 3 -				- 4 -				- 5 -		
						Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)			Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)				Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)				Změny de minimis (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)		
						Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	limit 15 %
16	17	18	19=23+26+29+33	20=24+27+30+34+37+39	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	32=29+30	32A=ABS(29)+30	33	34	36=33+34	36A=ABS(33)+34	37	38	39=ABS(37)+38
		II/272 Chotětov - Bezno	- 2 381 899,05	1 230 846,49	- 1 151 052,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 2 381 899,05	1 230 846,49	- 1 151 052,56	3 612 745,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	1	Recyklace za studena	- 2 381 899,05	1 037 724,62	- 1 344 174,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 2 381 899,05	1 037 724,62	- 1 344 174,43	3 419 623,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	2	Zřízení štěrbínového žlabu na místní komunikaci	0,00	193 121,87	193 121,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 121,87	193 121,87	193 121,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	2
Název stavby:	II/272 Chotětov - Bezno
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Silnice II/272 - Bezno
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	103 / 2

Doklad	počet listů
07 Soupis prací SO po změnách	3
08 Žádost o vydání pokynu k variaci (Žádost o změnu rozsahu díla)	1
09 Souhlas Objednatele s vypracováním ZBV	1
10 Vyjádření AD	1
11 Vyjádření TDI	1
12 Koordinační situační výkres PD	1
13 Kalkulace JC - pol. č. 50	1
14 Přílohy kalkulace JC	2
Počet listů celkem	11

Soupis prací SO po všech změnách

Název stavby: II/272 Chotětov - Bezno								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: 103 - Silnice II/272 - Bezno								2					
Číslo a název rozpočtu: 103 - Silnice II/272 - Bezno								celkem po všech změnách					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změnách	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změnách v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	014101.	POPLATKY ZA SKLÁDKU <i>dle položky 11130</i> ZBV 1 26-1257=-1 231,000 [A] ZBV 2 napojení dlážděný žlab	M3	1257,000	32,110	-1224,890	120,45	151 405,65	-148 273,95	735,95	3 867,65	-147 538,00	-97,45%
2	014102.a	POPLATKY ZA SKLÁDKU <i>a) dle položky 11332 0m3*2t/m3=0,000 [A]</i> <i>b) dle položky 914127+914137 (5+2)kus*0,03t/kus=0,210 [C]</i> <i>c) dle položky 914527+914983 R (2kus*0,085t/kus+1kus*0,187t/kus)=0,357 [E]</i> ZBV 1: 0*2,0=0,000 [A] <i>(5+2)*0,03=0,210 [B]</i> <i>2*0,085+1*0,187=0,357 [C]</i> <i>a+b+c-480,567=- 480,000 [D]</i> ZBV 2: místní komunikace 14,94 m3 šterbinový žlab 9,01 m3 dlážděný žlab 0,17 m3 <i>(14,94+9,01+0,17)*2,0=48,240 [A]</i> bet obrubníky <i>2*0,5*2,3=2,300 [B]</i> <i>a+b=50,540 [C]</i>	T	480,567	51,107	-429,460	201,20	96 690,08	-96 576,00	10 168,65	10 282,73	-86 407,35	-89,37%
3	014132.	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) ZBV1: <i>dle položky 11343 13m3*2,1t/m3=27,300 [A]</i> <i>13*2,1=27,300 [A]</i> <i>a-336=- 308,700 [B]</i>	T	336,000	27,300	-308,700	243,87	81 940,32	-75 282,67	0,00	6 657,65	-75 282,67	-91,88%
4	11130	SEJMUTÍ DRNU	M2	260,000	260,000	0,000	34,46	8 959,60	0,00	0,00	8 959,60	0,00	0,00%
5	11332.	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO ZBV 1 -240,00 ZBV 2 místní komunikace 14,94 m3 šterbinový žlab 9,01 m3 dlážděný žlab 0,17 m3 <i>14,94+9,01+0,17=24,120 [A]</i>	M3	240,000	24,120	-215,880	382,33	91 759,20	-91 759,20	9 221,80	9 221,80	-82 537,40	-89,95%
6	11343.	ODSTRAN KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU ZBV 1: <i>13-160=- 147,000 [A]</i>	M3	160,000	13,000	-147,000	563,75	90 200,00	-82 871,25	0,00	7 328,75	-82 871,25	-91,88%
7	11372.	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH ZBV 1: <i>a) 117=117,000 [A]</i> <i>b) 8=8,000 [B]</i> <i>117+8-99=26,000 [A]</i>	M3	99,000	125,000	26,000	1042,91	103 248,09	0,00	27 115,66	130 363,75	27 115,66	26,26%
8	113765.	FRÉZOVÁNÍ DŘÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE ZBV 1: <i>34-22=12,000 [A]</i> ZBV 2: <i>u šterbinového žlabu</i> <i>2*9,0=18,00</i>	M	22,000	52,000	30,000	39,12	860,64	0,00	1 173,60	2 034,24	1 173,60	136,36%
9	12273.	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBEČNÉ TŘ. I ZBV 1 -1231,00 ZBV 2 napojení dlážděný žlab 6,11 m3 <i>6,11=6,110 [A]</i>	M3	1231,000	6,110	-1224,890	104,67	128 848,77	-128 848,77	639,53	639,53	-128 209,24	-99,50%
10	12583.a	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. II	M3	936,000	0,000	-936,000	226,42	211 929,12	-211 929,12	0,00	0,00	-211 929,12	-100,00%
11	17130.	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM ZBV 1 -936,00 ZBV 2 místní komunikace 7,7 m3 šterbinový žlab 3,47 m3 <i>17,7+3,47=21,170 [A]</i>	M3	936,000	11,170	-924,830	32,54	30 457,44	-30 457,44	363,47	363,47	-30 093,97	-98,81%
12	17310	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM	M3	6,000	6,000	0,000	173,77	1 042,62	0,00	0,00	1 042,62	0,00	0,00%
13	18110.	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	1860,000	280,920	-1579,080	18,22	33 889,20	-29 170,22	399,38	5 118,36	-28 770,84	-84,90%

103	11318	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC <i>ZBV 2: 0,79*0,2=0,158 JC dle OTSKP 2023</i>	M3	0,000	0,158	0,158	1 067,04	0,00	0,00	168,59	168,59	168,59	100,00%
100	11329	ODSTRANĚNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH, PŘÍKOPU A RIGOLU Z LOMOVÉHO KAMENE <i>ZBV 2: 0,79*0,3=0,237 JC dle OTSKP 2023</i>	M3	0,000	0,237	0,237	1 060,02	0,00	0,00	251,22	251,22	251,22	100,00%
101	11352	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH <i>ZBV 2: 2=2,000 JC dle OTSKP 2023</i>	M	0,000	2,000	2,000	117,00	0,00	0,00	234,00	234,00	234,00	100,00%
105	45131A	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 <i>ZBV 2: dlážděný žlab 19,43*0,25=2,358 [A] JC převzata z SO 101</i>	M3	0,000	2,358	2,358	3 893,52	0,00	0,00	9 180,92	9 180,92	9 180,92	100,00%
107	451323	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C16/20 <i>ZBV 2: štěrbinový žlab 0,15*0,8*9=1,080 [A] JC dle OTSKP 2023</i>	M3	0,000	1,080	1,080	4 126,10	0,00	0,00	4 456,19	4 456,19	4 456,19	100,00%
108	451366	VÝZTUŽ PODKL VRSTEV Z KARI-SÍTÍ <i>ZBV 2: 0,18=0,180 [A] JC dle OTSKP 2023</i>	T	0,000	0,180	0,180	42 560,00	0,00	0,00	7 660,80	7 660,80	7 660,80	100,00%
106	46251	ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE <i>ZBV 2: dlážděný žlab 0,65=0,650 [A] JC dle OTSKP 2023</i>	M3	0,000	0,650	0,650	1 331,00	0,00	0,00	865,15	865,15	865,15	100,00%
102	582611	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM <i>ZBV 2: 0,63=0,630 JC dle OTSKP 2023</i>	M2	0,000	0,630	0,630	572,33	0,00	0,00	360,57	360,57	360,57	100,00%
109	819999.R	Štěrbínový žlab 500/600 mm <i>ZBV 2: JC stanovena na základě indiv. kalkulace</i>	M	0,000	9,000	9,000	9 480,00	0,00	0,00	85 320,00	85 320,00	85 320,00	100,00%
104	935812	ŽLABY A RIGOLY DLAŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 100MM <i>ZBV 2: dlážděný žlab 19,43=19,430 [A] JC převzata z SO 104</i>	M2	0,000	19,430	19,430	1 498,20	0,00	0,00	29 110,03	29 110,03	29 110,03	100,00%

Celkem										4 086 872,16	- 2 381 899,05	1 230 846,49	2 935 819,60	- 1 151 052,56	-28,16%
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	-----------------------	----------------

ZBV 1	- 2 381 899,05	1 037 724,62	- 1 344 174,43
ZBV 2	0,00	193 121,87	193 121,87



PORR a.s., Čechy střed
Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10

KSÚS Středočeského kraje
Zborovská 81/11
150 00 Praha 5

Vaše značka: -
Váš dopis ze dne: -
Naše značka: JKm
Náš dopis: -
Jméno: Ing Jan Karafiát
Telefon:
Mobil:
Email:

Praha, 21.09.2023

Věc: Žádost o vydání pokynu k variaci (Žádost o změnu rozsahu díla)

Akce: II/272 Chotětov - Bezno

Vážení obchodní partneři,

Na základě SOD č. obj. S-2050/00066001/2022, soupisu prací a skutečnosti na stavbě. Vás žádáme o vydání Žádosti o změnu rozsahu díla (pokynu k variaci), (dle čl. 6.7 SOD) na akci II/272 Chotětov - Bezno.

Jedná se o změny během výstavby typu 3 (dle Směrnice R-Sm-36, verze 3.1).

Popis změn:

- 1. Zřízení štěrbinového žlabu s vlivem na cenu díla, bez dopadu na termín dokončení díla.**

V průběhu stavby dle zadávací projektové dokumentace (zpracovatel PRAGOPROJEKT, a.s.) byla zjištěna nutnost převedení povrchových vod zřízením štěrbinového žlabu přes místní komunikaci v km 2,690, tak aby při přívalových deštích nedocházelo k zaplavování pozemků k této komunikaci přiléhajících.

Odhadované smluvní dopady: Zvýšení ceny díla o cca 290 000 Kč bez DPH

- 2. Vyrovnání nevyčerpaných položek z rozdílu PDPS a RDS**

Na základě rozdílu v podrobnosti jednotlivých stupňů projektové dokumentace, došlo po zpřesnění výkazu výměr ve stupni RDS k nedočerpaní některých položek VV.

Odhadované smluvní dopady: Snížení ceny díla o 565 331,94 Kč bez DPH

S pozdravem
Ing Jan Karafiát

Přílohy:

Porr a.s.
Dubečská 3238/36
Strašnice, 100 00 Praha 10
Tel.
Fax
porr

Sídlo: Dubečská 3238/36
Strašnice, 100 00 Praha 10
OR u MS v Praze, Oddíl B, Vložka 1006
IČO 43005560, DIČ CZ43005560

Raiffeisenbank a.s.
IBAN
BIC R

www.porr.cz

**PORR a.s., Čechy střed
Dubečská 3238/36,
100 00 Praha 10**

Vyřizuje / telefon
Jan Zákostelský Dis.

Říčený

Věc: Souhlas s navrženým řešením u akce „II/272 Chotětov - Bezno“

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o. v rámci akce „II/272 Chotětov - Bezno“ po projednání s TDS a AD **souhlasí** s navrženým řešením.

Stručný popis změn včetně návrhu řešení:

- Zřízení šterbinového žlabu

Vzhledem k tomu, že v průběhu stavby byla zjištěna nutnost převedení povrchových vod přes místní komunikaci v km 2,690, tak aby při přivalových deštích nedocházelo k zaplavování pozemků k této komunikaci přiléhající. Dojde k vybudování šterbinového žlabu v daném místě stavby.

- Doměrky

Po zpřesnění výkazu výměr v rámci zpracování dokumentace RDS a zaměření skutečného stavu stavby dojde k narovnání nedočerpání položek.

Tímto žádáme zhotovitele, aby zpracoval dokumentaci ZBV k výše uvedeným změnám v souladu s příslušnou směrnicí KSÚS SK.

Jedná se pouze o souhlas s návrhem technického řešení navrhovaných ZBV. Posouzení správnosti ZBV zajistí supervize a finální schválení spadá do kompetencí vedení KSÚS.

Jan Zákostelský
projektový manažer

IBH spol. s r.o.
Poděbradova 3178
272 01 Kladno

Ing. Miroslav Bureš

DATUM: 17.4.2023

Stavba „II/272 Chotětov - Bezno, vyjádření AD

Zástupce AD byl vyzván, aby se vyjádřil k připravovaným ZBV 2,3,4,5. Podstata ZBV byla průběžně řešena, problematika zachování funkčnosti odvodnění v intravilánu Chotětova byla i několikrát konzultována na místě na KD. Úpravy vychází ze schválené RDS.

S technickým řešením AD souhlasí.

Zástupce AD

Ing. Karel F



Vyřizuje: P. Burger

V Kladně dne: 10.října 2023

KSSÚ Středočeského kraje
Zborovská 11
150 00 Praha 5

Věc: II/272 Chotětov – Bezno

Změny oproti PDPS – ZBV 2

Vyjádření TDS

Předmětem změny je:

1. Zřízení štěrbinového žlabu
2. Doměrky

1. Zřízení štěrbinového žlabu.

V rámci zadávací dokumentace nebylo uvažováno s žádnými opatřeními pro zachycení vod při přívalových deštích a možnosti zaplavování pozemků přiléhajících ke komunikaci.

V průběhu stavby byla zjištěna nutnost převedení povrchových vod přes místní komunikaci v km 2,690 tak, aby vybudováním štěrbinového žlabu bylo zajištěno zachycení povrchových vod z vozovky a zároveň převedení vody z dlážděného žlabu podél vozovky do otevřeného příkopu za místní komunikací, kterým je voda odvedena volně do krajiny.

2. Doměrky.



Po zpřesnění výkazu výměr v rámci zpracování RDS a zaměření skutečného stavu dojde k narovnání nedočerpaných položek.

S ohledem na shora uvedené skutečnosti, technický dozor objednatele s předloženým řešením **souhlasí**, a považuje je za oprávněné.

Předpokládaný výčet a množství měněných položek soupisu prací je přiměřený a odpovídá původnímu zadání.

Za IBH s.r.o.

Petr Burger

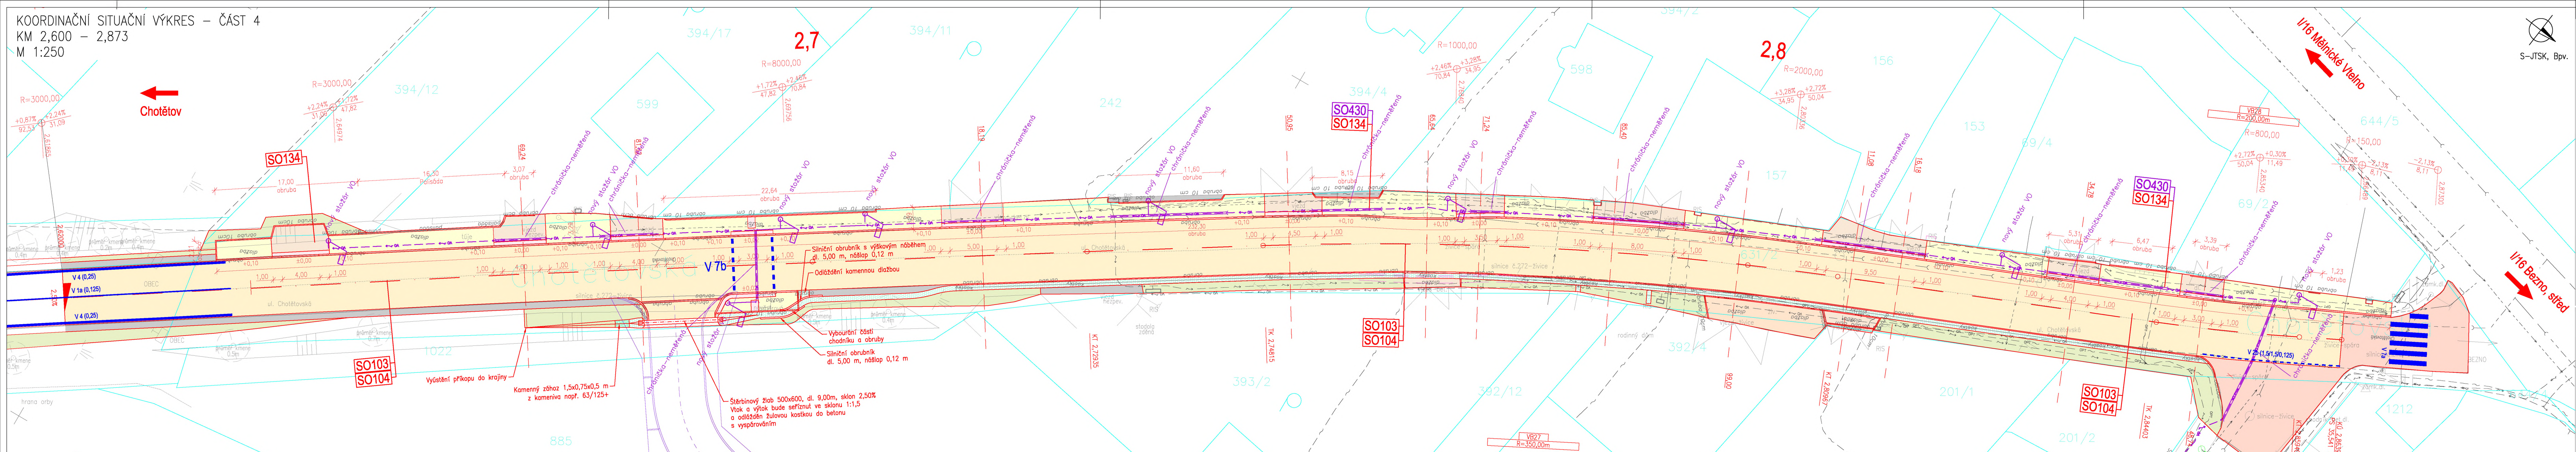

Objednatel stavby:

KSÚS
 Krajská správa a údržba silnic
 Středočeského kraje p.o.
 Zborovská 11, 150 21 Praha 5
 IČ: 000 66 001

Razítko, datum, podpis:

Technický dozor:

IBH
 spol. s r.o.

IBH spol. s r.o.
 Poděbradova 3178
 272 01 Kladno
 IČ: 475 40 966

Razítko, datum, podpis:

Autorský dozor:

PRAGOPROJEKT
 a.s.

PRAGOPROJEKT, a.s.
 K Ryšánce 1668/16
 147 54 Praha 4
 IČ: 452 72 387

Razítko, datum, podpis:

Zhotovitel stavby:

DORR

PORR a.s.
 Dubečská 3238/36
 100 00 Praha 10
 IČ: 430 05 560

Razítko, datum, podpis:

Souřadnicový systém S-JTSK, Výškový systém Bpv

Navrhl/vypracoval: Ing. Štěpán Hlaváč
 Zodpovědný projektant: Ing. Martin Kouba
 Zhotovitel dokumentace: **4roads**
 4roads s.r.o., Slunná 541/27, 162 00 Praha 6, IČ: 063 27 354
 Objednatel dokumentace: **DORR**
 DORR a.s., Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10, IČ: 430 05 560

Technická kontrola: Ing. Jan Lambert
 Hlavní inženýr projektu: Ing. Martin Kouba

Kraj:	Středočeský	Čís.sm.obj.:	4501104770
Katastrální území:	Chotětov, Bežno	Čís.akce:	22046
Akce:	II/272 Chotětov - Bežno	Datum:	06/2023
Část:	Situační výkresy	Formát:	7xA4
Příloha:	Koordináčnı́ situační výkres - část 4	Měřítko:	1:250
		Stupeň:	DSPS
		Číslo přílohy:	C3.4

LEGENDA:

- OSÁ POZEMNÍ KOMUNIKACE
- NOVÉ HRANY
- VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
- ZAMĚŘENÍ POLOHOHOPISU
- HRANICE POZEMKŮ DLE KN
- PODZEMNÍ VEDENÍ - SOUVISEJÍCÍ STAVBY
- ASFALTOVÁ VOZOVKA - RECYKLACE
- ASFALTOVÁ VOZOVKA - VÝMĚNA OBRUSU
- NEZPEVNĚNÁ KRAJNICE, NEZPEVNĚNÉ SJEZDY
- CHODNÍK
- CHODNÍKOVÝ PŘEJEZD
- CHODNÍK - HMATOVÁ ÚPRAVA
- SJEZD - DLÁŽDĚNÝ KRYT
- SJEZD - ASFALTOBETONOVÝ KRYT
- ZELEŇ
- ODVODŇOVACÍ ŽLAB ZE ŽULOVÉ KOSTKY, ODLÁŽDĚNÍ

LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ:

STÁVAJÍCÍ:

- NADZEMNÍ VEDENÍ - VYSOKÉ NAPĚTÍ (ČEZ, a.s.)
- PODZEMNÍ VEDENÍ - VYSOKÉ NAPĚTÍ (ČEZ, a.s.)
- PODZEMNÍ VEDENÍ - NÍZKÉ NAPĚTÍ (ČEZ, a.s.)
- PODZEMNÍ VEDENÍ - SDĚLOVACÍ (CETIN, a.s.)
- PODZEMNÍ VEDENÍ - SDĚLOVACÍ OPTICKÉ (CETIN, a.s.)
- PODZEMNÍ VEDENÍ - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ (obec Bežno)
- PODZEMNÍ VEDENÍ - NEPOUŽÍVANÉ (CETIN, a.s.)
- PODZEMNÍ VEDENÍ - VODOVOD (vodovody a kanalizace MB a.s.)
- PODZEMNÍ VEDENÍ - KANALIZACE (vodovody a kanalizace MB a.s.)

NAVŘZENÉ:

- VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
- STOŽÁR VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

SEZNAM STAVEBNÍCH OBJEKTŮ STAVBY:

- SO 101 - Silnice II/272 - oprava komunikace - km 0,000-2,160
- SO 102 - Silnice II/272 - oprava komunikace - km 2,160-2,620
- SO 103 - Silnice II/272 - oprava komunikace - Bežno
- SO 104 - Silnice II/272 - údržba komunikace
- SO 134 - Chodník
- SO 430 - Veřejné osvětlení

Rozbor ceny položky 109 - 819999.R

Štěrbínový žlab 500/600 mm

TOV

TOV

MJ

1	Přímý materiál	1 946,74
2	Mzdy	118,85
3	Odvody 34 % z mezd	40,41
4	Stroje	1 330,00
5	Ostatní přímé náklady	4 807,48
6	Přímé zpracovací náklady [2] až [5]	6 296,74
7	Nekalkulované náklady :	0,00
Přímé + nekalkulované náklady [1] + [6] + [7]		8 243,48
8	režie výrobní 5,0 % z [1] + [6]	412,17
9	režie správní 5,0 % z [1] + [6]	412,17
Nepřímé náklady [8] + [9]		824,35
Náklady celkem + nekalkulované [1] + [6] + [7] + [8] + [9]		9 067,83
10	Zisk 5,0 % z [1] + [6]	412,17
Celkem [1] + [6] až [10]		9 480,00
Celkem		9 480,00
Přepočet na MJ		9 480,00

Hmotnost	0,000000
Normohodiny	0,0

P.Č.	T	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	Celkem
	H						0,00
	H						0,00
	H						0,00
							0,00
	M	712000240	Dělník (ÚRS 2022/II)	Nh	0,50000	237,70	118,85
	M						0,00
	M						0,00
							118,85
	S	111010011600	Kolový jeřáb (ÚRS 2022/II)	Sh	1,00000	1 330,00	1 330,00
	S						0,00
	S						0,00
							1 330,00
	O		Nabídka firmy CSBeton 3*4m + doprava 37 032 Kč bez DPH, délka žlabu 9m tj. 3m ztratné 37 032/9	M	1,00000	4 114,67	4 114,67
	O	977211114	Řezání stěnovou pilou betonových nebo ŽB kcí s výztuží průměru do 16 mm hl. přes 420 do 520 mm (ÚRS 2022/II) 0,707*2/9	M	0,15710	4 410,00	692,81
	O						0,00
							4 807,48



CENOVÁ NABÍDKA SV 034210

Vystaveno dne: 22.09.2023

Akce: Praha 10 - Strašnice

Vyřizuje: Svítal Ondřej

Telefon:

Email:

PORR a.s.

Dubečská 3238/36

100 00 Praha - Strašnice

k rukám:

Vaše poptávka:

Děkujeme Vám, že jste se obrátili s poptávkou na firmu CS-BETON s.r.o.

Na základě Vaší poptávky Vám zasíláme cenovou nabídku na následující zboží:

Název položky	Množství MJ	Ceníková cena	Cena ze závodu	Cena celkem bez DPH	Měna	Předpokl počet palet
Varianta nabídky č.: 1						
300487 ST3010-440040/40						
III-1 Trouba III s přeř.št. D400 40/40	3 ks	13 020,00	10 416,00	31 248,00	CZK	0,00
Doprava: CS-BETON						
Cena dopravy za 1 ks	5 784,00 CZK	Celkem přeprav:	1,00 ks	Celkem za počet přeprav:	5 784,00 CZK	
Celková cena (položky nabídky nezahrnují dopravné):				31 248,00 CZK		0
Celková hmotnost nabízených výrobků (včetně předpokládaného počtu palet):				5 691,00 kg		
Předpokládaný poplatek za rozbalení palety (vázané na nabídnuté množství):			0,00 ks	0,00 CZK		

Věnujte prosím zvýšenou pozornost obchodním podmínkám a proveďte kontrolu správnosti specifikace zboží obsaženého v této cenové nabídce.

Cena dopravy:

V případě, že nebude dopravní prostředek plně vytížen, ale bude možné zajistit dovytížení vozidla do plné tonáže jinou zakázkou, bude účtován doplatek ve výši 2000,- Kč bez DPH za více vykládku. V případě vozidla, u kterého nebude možné zajistit dovytížení do plné tonáže ani možnou více vykládkou, bude doúčtována cena dopravy tak, jako by byl dopravní prostředek plně vytížen. Cena dopravy za 1 ks je kalkulována na tonáž 24 t.

Cena dopravy či ceny výrobků s dopravou na místo určení jsou garantované při plně vytížené tonáži dopravního prostředku a za předpokladu, že nedojde k dodatečnému navýšení nákladů dopravy (zejména pohonné hmoty, aditiva a daně a poplatky) o více jak 5 % od doby vystavení cenové nabídky. Navýšení ceny PHM se stanovuje rozdílem mezi průměrnou cenou v den podání nabídky a průměrnou cenou v den realizace dopravy dle průměrných cen zveřejňovaných společností CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o. na jejich webovém portálu. Při překročení doby vykládky nad 1 hodinu vám bude účtováno 250,- Kč + DPH za každých započatých 15 min.

Obchodní podmínky:

Obchodní podmínky se řídí touto cenovou nabídkou a platnými Prodejními a dodacími podmínkami CS-BETON s.r.o. Cenová nabídka je tvořena na základě Vámi dodaných podkladů a může být upravena dle aktuálního projektu a kladečského schématu. V případě objednání bude zboží automaticky zaokrouhlo na minimální expediční množství uvedené v Pracovním sešitě.

Nabídka neobsahuje vázací prostředky např. lanové závěsy pro šachtová dna apod.

Dojde-li v době mezi uzavřením smlouvy a realizací zakázky k prokazatelné podstatné změně ceny výrobních surovin či kompletačního materiálu (např. cement, polystyren, železo aj.) o více jak 5 %, je prodávající oprávněna navýšit kupní cenu úměrně tomuto zvýšení. Prodávající bude kupující o zvýšení kupní ceny informovat bez zbytečného odkladu. Kupující má právo změnu kupní ceny akceptovat nebo od smlouvy odstoupit, a to v rozsahu zboží, které dosud nebylo vyrobeno. Výrobky, které byly do doby včasného doručení projevu o odstoupení od smlouvy vyrobeny, budou dodány za původních podmínek bez navýšení ceny. Kupující je oprávněn takto od smlouvy odstoupit nejpozději do 14 dnů ode dne doručení oznámení o navýšení, nebude-li v oznámení určena lhůta delší.

Platnost cenové nabídky činí 1 měsíc ode dne vystavení nebo do doby nabytí platnosti nového ceníku, rozhodující je, která podmínka nastane dříve.

Cenové zvýhodnění pro traťové zakázky je platné pouze v případě dodávky kompletního sortimentu, který je předmětem této nabídky. Pro dodávky realizované na základě cenové nabídky zboží s místem dodání na prodejní sklad kupujícího nebo jeho partnera, je cena dle této cenové nabídky garantována pouze na dodávky expedované ze závodu prodávající nejpozději do 30 dnů ode dne nabytí platnosti nového ceníku, pokud nebude prodávající stanoveno či stranami dohodnuto jinak.

!!! Při odběru zboží je nutno do objednávky uvést číslo této nabídky, jinak nemůže být sleva uplatněna !!!

Zvláštní obch. podmínky: V případě odběru zboží menším, než paleta bude účtován poplatek za rozbalení palety 150,- Kč/paletu.

Při objednání nižšího množství, než je minimální objednávci, vám bude účtován poplatek 3500,- CZK.

Některé produkty jsou z tohoto pravidla vyjmuty – vše se řídí platným pracovním sešitem.

Nabídku vystavil: Kíršnerová Iveta

Datum a čas: 22.09.2023 8:12:25

CS-BETON s.r.o.
Velké Žernoseky 184
CZ - 412 01 Litoměřice

IČO : 47287586
DIČ : CZ47287586
www.csbeton.cz

Banka: Česká spořitelna a.s.
č.úctu CZK:
č.úctu EUR:

v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí n/L oddíl C, vložka 3257

STR. 1

Palety: Kupující prohlašuje, že se seznámil s Prodejními a dodacími podmínkami CS-BETON s.r.o. a v plném rozsahu je akceptuje. Součástí Prodejních a dodacích podmínek jsou také podmínky Paletového hospodářství a jeho pravidla. Prodejní a výkupní ceny přepravních palet se řídí aktuálním ceníkem Paletového hospodářství.

Mimořádné podmínky:**Oceněno orientačně.****Expedice:**

Podmínkou včasné a plynulé expedice dodávek většího rozsahu (více jak 4 kamiony o jednotlivé tonáži 24 t) je včasné oznámení požadavků na realizaci závozů ze strany kupujícího a to s předstihem alespoň 14 dnů. Kupující včas předloží návrh harmonogramu jednotlivých závozů, který musí být prodávajícím odsouhlasen. V případě nedodržení shora uvedených lhůt pro sjednání harmonogramu bude zboží expedováno dle aktuálních výrobních, skladových a přepravních kapacit prodávajícího a dostupné expedice. V případě nakládky zboží jeřábem prodávající neodpovídá za prostoje způsobené nepříznivými povětrnostními podmínkami (zejména vítr), které znemožňují použití manipulační techniky.

S přátelským pozdravem

Svítal Ondřej
Obchodní poradce
