

Krycí list ZBV			
Název a evidenční číslo Stavby: III/6031 Nespeky - Pyšely		Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 101 / 2	Číslo ZBV: 2
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Komunikace			
Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace Zborovská 11, 150 21 Praha 5, Smíchov IČ: 000 66 001			
Zhotovitel: Merit Bau CZ a.s. K Dolíčku 66, 530 02 Pardubice - Nové Jesenčany IČ: 272 59 544			
Rekapitulace ZBV č. 2 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5			
část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.1	0,00	0,00	0,00
část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.2	0,00	0,00	0,00
část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.3	0,00	336 779,50	336 779,50
část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.4	0,00	0,00	0,00
část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.5	0,00	0,00	0,00
Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2	0,00	336 779,50	336 779,50
Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny. Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy a pro Rozpis ocenění změn položek.			
ZBV - krycí list			Číslo paré: 1

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: III/6031 Nespeky - Pyšely		Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 101 / 2	Číslo ZBV: 2																															
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Komunikace																																		
Strany smlouvy o dílo č. 3719/00066001/2017 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 13. 12. 2017 (dále jen Smlouva): Objednatel: Krajská správa a údržba silnic SK, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov Zhotovitel: Merit Bau CZ a.s., se sídkem K Dolíčku 66, 530 02 Pardubice - Nové Jesenčany																																		
<u>Přílohy Změnového listu:</u> <table><tr><td>1. Krycí list</td><td>1</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>2. Změnový list</td><td>1</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací</td><td>1</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>4. Rozpis ocenění Změn položek</td><td>1</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>5. Přehled zařazení změn do skupin</td><td>1</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>6. Přehled dalších dokladů</td><td>1</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>7. Další doklady</td><td>12</td><td>počet listů</td></tr></table>		1. Krycí list	1	počet listů	2. Změnový list	1	počet listů	3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů	4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů	5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů	6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů	7. Další doklady	12	počet listů	<table><tr><td>Paré č.</td><td>Příjemce</td></tr><tr><td>1</td><td>Objednatel</td></tr><tr><td>2</td><td>Zhotovitel</td></tr><tr><td>3</td><td>TDI</td></tr><tr><td>4</td><td>Projektant (AD)</td></tr></table>		Paré č.	Příjemce	1	Objednatel	2	Zhotovitel	3	TDI	4	Projektant (AD)
1. Krycí list	1	počet listů																																
2. Změnový list	1	počet listů																																
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů																																
4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů																																
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů																																
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů																																
7. Další doklady	12	počet listů																																
Paré č.	Příjemce																																	
1	Objednatel																																	
2	Zhotovitel																																	
3	TDI																																	
4	Projektant (AD)																																	
Iniciátor změny: Zhotovitel Popis a zdůvodnění Změny: Změna vyplývá ze skutečnosti, že při podrobném zaměření staveniště bylo zjištěno, že pro řádné provedení opravy silnice je nutné výměru opravované vozovky o 12 % zvětšit. Jedná se zajištění plynulého vedení trasy a potřebné minimální šířky vozovky 4,5 m od začátku úpravy v délce cca 120 m, jejího rozšíření v délce cca 40 m na 5,8 m pro možnost vyhnutí vozidel a úpravu autobusové zastávky včetně napojení dvou místních komunikací. Touto úpravou dojde k určitému zlepšení plynulosti provozu a zejména ke zvýšení jeho bezpečnosti. Z důvodu nálezu inženýrských sítí při opravě betonového propustku, které nebyly v dokumentaci zaneseny, bylo nutné betonový propustek DN 500 o 5 m prodloužit, aby nedošlo ke střetu s těmito sítěmi. Jedná se o Změnu nepodstatnou, nepředvídanou, která je tak podle § 10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29. 05. 2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku, dle § 222, odst. 6) se jedná o změnu nepředvídanou.																																		
Údaje v Kč bez DPH: <table><tr><td>Cena navrhovaných Změn záporných</td><td>Cena navrhovaných Změn kladných</td><td>Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem</td><td>Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných</td></tr><tr><td>0,00</td><td>336 779,50</td><td>336 779,50</td><td>336 779,50</td></tr></table>				Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	0,00	336 779,50	336 779,50	336 779,50																							
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných																															
0,00	336 779,50	336 779,50	336 779,50																															
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:																																		
Zhotovitel (stavbyvedoucí):	jméno	Václav Kuchta	datum	podpis																														
Projektant (autorský dozor):	jméno	Ing. Jiří Sobol	datum	podpis																														
Technický dozor investora	jméno	Ing. Jan Pavlita	datum	podpis																														
Supervize:	jméno	xxx	datum	podpis																														
Zástupce Objednatele:	jméno	Marek Hanuš	datum	podpis																														
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.																																		
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Bc. Zdeněk Dvořák	datum	19. 09. 2018	podpis																													
Zhotovitel	jméno	Petr Veselý	datum		podpis																													
				Číslo paré:	1																													

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 2

Název Stavby: III/6031 Nespeky - Pyšely			
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	101 / 2		
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Komunikace			

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
4 573 546,00

Poznámka:

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV: Údaje v Kč bez DPH				
	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	-647 812,35	667 302,40	4 593 036,05	19 490,05

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV: Údaje v Kč bez DPH				
	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	336 779,50	1 004 081,90	21,95%

Cena SO/PS po této ZBV: Údaje v Kč bez DPH				
	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-647 812,35	4 929 815,55	356 269,55	7,79%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

Václav Kuchta

souhlasím

Projektant (autorský dozor):

Ing. Jiří Sobol

souhlasím

Stavební dozor:

Ing. Jan Pavlita

souhlasím

Zástupce Objednatele:

Marek Hanuš

souhlasím

Zaměstnanec KSÚS SK
odpovědný za cenové
projednání Změny:

Ing. Aleš Čermák,
Ph.D., MBA


souhlasím



.....



.....



.....



.....



.....

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 2													
Evidenční číslo a název stavby: "III/6031 Nespeky - Pyšely"				ZMENA SOUPISU PRACI (SO/PS)									
Číslo a název SO/PS: 101 - Komunikace				č. 2									
Číslo a název rozpočtu: 101 - Komunikace				Skupina Změn: 3									
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9,00	10	11	12	13	14
		Položky smlouvy o dílo											
		PŘÍPOČET											
2	113178	ODSTRAN KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ DO 20KM	M3	210,000	240,000	30,000	514,00	107 940,00	0,00	15 420,00	123 360,00	15 420,00	14,29
3	113328	ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM	M3	230,700	256,200	25,500	429,00	98 970,30	0,00	10 939,50	109 909,80	11,05	
8	122738	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I, ODVOZ DO 20KM	M3	2 062,040	2 079,040	17,000	358,00	738 210,32	0,00	6 086,00	744 296,32	6 086,00	0,82
10	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	13,800	13,500	-0,300	593,00	8 183,40	0,00	-177,90	8 005,50	-177,90	14,29
11	17581	OBSPV POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	126,720	136,920	10,200	711,00	90 097,92	0,00	7 252,20	97 350,12	7 252,20	8,05
12	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	1 536,000	1 716,000	180,000	13,00	19 968,00	0,00	2 340,00	22 308,00	2 340,00	11,72
18	561421	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TR. I TL. DO 100MM	M2	1 375,000	1 540,000	165,000	174,00	239 250,00	0,00	28 710,00	267 960,00	28 710,00	12,00
19	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	1 437,500	1 610,000	172,500	102,00	146 625,00	0,00	17 595,00	164 220,00	17 595,00	12,00
21	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	1 362,500	1 526,000	163,500	17,00	23 162,50	0,00	2 779,50	25 942,00	2 779,50	12,00
22	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	2 612,500	2 926,000	313,500	18,00	47 025,00	0,00	5 643,00	52 668,00	5 643,00	12,00
23	574B34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	1 250,000	1 401,000	151,000	291,20	364 000,00	0,00	43 971,20	407 971,20	43 971,20	12,00
24	574B46	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 16+, 16S TL. 50MM	M2	1 300,000	1 456,000	156,000	344,50	447 850,00	0,00	53 742,00	501 592,00	53 742,00	12,00
25	574D58	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACO 22+, 22S TL. 60MM	M2	1 350,000	1 512,000	162,000	377,00	508 950,00	0,00	61 074,00	570 024,00	61 074,00	12,00
27	81457	POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 500MM	M	8,000	13,000	5,000	3 260,00	26 080,00	0,00	16 300,00	42 380,00	16 300,00	62,50
34	935812	ŽLABY A RIGOLY DLAŽĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 100MM	M2	138,000	135,000	-3,000	1 230,00	169 740,00	0,00	-3 690,00	166 050,00	-3 690,00	14,29
35	014102-1	POPLATKY ZA SKLÁDKU-KRYT DLAŽBA	T	504,000	576,000	72,000	50,00	25 200,00	0,00	3 600,00	28 800,00	3 600,00	14,29
36	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU-PODKLADNÍ VRSTVY	T	548,695	628,595	79,900	50,00	27 434,75	0,00	3 995,00	31 429,75	3 995,00	14,56
		Nové položky - JC dle OTSKP SPK 2018 použito v ZBV 1											
39	56220	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL VÁPNEM	M3	0,000	858,000	90,000	680,00	0,00	0,00	61 200,00	61 200,00	61 200,00	11,72
		Celkem						3 088 687,19	0,00	336 779,50	3 425 466,69	336 779,50	

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: III/6031 Nespeky - Pyšely

1	Přijaté smluvní částka bez rezervy a DPH	4 698 546,00
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby) bez DPH	5 054 815,55
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	6 116 326,82
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	107,58%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%
40=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle čl. 14, odst. (5), písm. b)	-13,79%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	356 269,55
7=(6/1)*100	Sledování limitů 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	7,58%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	1 409 563,80

9=(32A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	35,16%
10=(36A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,00%
10A=32A+36A	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu	1 651 894,25
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	2 349 273,00

12=(37/1)*100	Sledování limitu 15 %	0,00%
13=37	Sledování limitu 149 224 000 Kč	0,00
14=149224000-37		149 224 000,00

[illegible]

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	2	
Název a evidenční číslo stavby:	III/6031 Nespeky - Pyšely	
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Komunikace	
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	101 / 2	

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
Rozpočet s výkazem výměr po všech změnách	4	
Zápis ve SD	1	
Zápis z KD č. 1 ze dne 20. 06. 2018	1	
Žádost objednatele o změnu rozsahu díla	2	
Fotodokumentace	2	
Situace stavby - změna stavby před dokončením	1	
Vzorové řezy - rigol - změna stavby před dokončením	1	
Počet listů celkem	12	

ZMĚNOVÝ SOUPIS PRACÍ SO 101 PO VŠECH ZMĚNÁCH

Stavba: III/6031 Nespeky - Pyšely
Objekt: 101 / 1 Komunikace

Objednatel: KSÚS Středočeského kraje, p.o.
Zhotovitel: Merit Bau CZ a.s. Pardubice
Místo: Nespeky

Zpracoval:
Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV		Práce a dodávky HSV				4 929 815,55	
1		Zemní práce				1 392 574,35	
1	R	111204	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 5KM	M2	260,000	76,00	19 760,00
2	R	113178	ODSTRAN KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ DO 20KM	M3	240,000	514,00	123 360,00
					"odstranění dlažby"(1250-200)*0,2	210,000	
					"rozšíření komunikace"150*0,2	30,000	
					Součet	240,000	
3	R	113328	ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM	M3	256,200	429,00	109 910,00
					"štěrk-cesta"20*0,37	7,400	
					"rozšíření"(1280-1250)*0,36	10,800	
					"podkladní vrstvy"1250*0,17	212,500	
					"rozšíření komunikace"150*0,17	25,500	
					Součet	256,200	
4	R	113338	ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	M3	9,250	682,00	6 309,00
					"asfalt"25*0,37	9,250	
					Součet	9,250	
5	R	113544	ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ, ODVOZ DO 5KM	M	500,000	83,00	41 500,00
					250*2	500,000	
					Součet	500,000	
6	R	113728	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM	M3	40,000	1 430,00	57 200,00
					"živice"200*0,2	40,000	
					Součet	40,000	
7	R	113762	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 200MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	40,000	72,00	2 880,00
					"napojení"4*5	20,000	
					"pracovní spáry"4*5	20,000	
					Součet	40,000	
8	R	122738	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	2 079,040	358,00	744 295,85
					"potrubí"6*1,7*1,2+2*1,7*2	19,040	
					"vpust"1	1,000	
					"zpevnění svahu"140*9,4+40*5	1 516,000	
					"sanace AZ"1280*1,2*0,4	614,400	
					"žebro"(190-35)*0,5*1,1	85,250	
					"drenáž"230*0,2*0,5	23,000	
					Součet	2 258,690	
					"Odpočet"		
					"žebro"-(190-35)*0,5*1,1	-85,250	
					"sanace AZ"-1280*1,2*0,4	-614,400	
					Součet	-699,650	
					"Přípočet"		
					"zpevnění svahu - rozšíření šířky z důvodu zajištění účinnosti geomříže"140*3,0+40*1,5	480,000	
					"drenáž 2. strana"230*0,2*0,5	23,000	
					"prodloužení propustku"5*1,7*2	17,000	
					Součet	520,000	
					2258,69-699,65+503,00+17,00	2 079,040	

Součet				2 079,040		
9	R	17170	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ VRSTEVNATÝCH SE ZHUTNĚNÍM	M3	1 996,000	71,00141 716,00
"zpevnění svahu"140*9,4+40*5				1 516,000		
Součet				1 516,000		
"Připočet"						
"zpevnění svahu - rozšíření šířky z důvodu zajištění účinnosti geomříže"140*3,0+40*1,5				480,000		
Součet				480,000		
1516,00+480,00				1 996,000		
Součet				1 996,000		
10	R	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	13,500	593,008 005,50
"podsyp ŠP pod žlab"230*0,6*0,1				13,800		
odpočet dle SoD				-13,800		
ZBV dle změny stavby před dokončením 135,0*0,1				13,500		
Součet				13,500		
11	R	17581	OBŠYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	136,920	711,0097 350,00
"propustek"8*1,7*1,2				16,320		
"trativod"230*0,4*0,6				55,200		
Součet				71,520		
"Připočty"						
"trativod 2. strana"230*0,4*0,6				55,200		
"prodloužení propustku"5*1,7*1,2				10,200		
Součet				65,400		
71,52+55,20+10,20				136,920		
Součet				136,920		
12	R	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	1 716,000	13,0022 308,00
"plocha vozovky"1280*1,2				1 536,000		
"rozšíření komunikace"150*1,2				180,000		
Součet				1 716,000		
13	R	18223	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,20M	M2	310,000	41,0012 710,00
"vegetační úpravy"310				310,000		
Součet				310,000		
14	R	18242	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI	M2	310,000	17,005 270,00
2 Zakládání				69 659,00		
15	R	21152	SANAČNÍ ŽEBRA Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	0,000	686,000,00
"žebro"(190-35)*0,5*1,1				85,250		
Součet				85,250		
"žebro"-(190-35)*0,5*1,1				-85,250		
Součet				-85,250		
85,25-85,25				0,000		
Součet				0,000		
16	R	27152	POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	0,000	751,000,00
"sanace AZ"1280*1,2*0,4				614,400		
Součet				614,400		
"sanace AZ"-1280*1,2*0,4				-614,400		
Součet				-614,400		
614,40-614,40				0,000		
Součet				0,000		
17	R	28997	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN	M2	1 024,400	68,0069 659,00
"zpevnění svahu"(1,5*1,2+0,9+0,7+3*0,4)*140+40*(1,2+0,9+0,7+2*0,4)				788,000		
Součet				788,000		
"Připočty"						
"zpevnění svahu - rozšíření šířky z důvodu zajištění účinnosti geomříže"(1,5*1,2+0,9+0,7+3*0,4)*0,3*140+40*(1,2+0,9+0,7+2*0,4)*0,3				236,400		
Součet				236,400		
788,00+236,40				1 024,400		
Součet				1 024,400		

5		Komunikace pozemní				2 043 897,20	
18	R	561421	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 100MM	M2	1 540,000	174,00	267 960,00
1250*1,1					1 375,000		
"rozšíření komunikace"150*1,1					165,000		
Součet					1 540,000		
19	R	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	1 610,000	102,00	164 220,00
1250*1,15					1 437,500		
"rozšíření komunikace"150*1,15					172,500		
Součet					1 610,000		
20	R	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL. DO 100MM	M2	105,000	76,00	7 980,00
"nezpevněná krajnice"105					105,000		
Součet					105,000		
21	R	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	1 526,000	17,00	25 942,00
1250*1,09					1 362,500		
"rozšíření komunikace"150*1,09					163,500		
Součet					1 526,000		
22	R	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	2 926,000	18,00	52 668,00
1250*1,06+1250*1,03					2 612,500		
"rozšíření komunikace"150*1,06+150*1,03					313,500		
Součet					2 926,000		
23	R	574B34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	1 401,000	291,20	407 971,20
1250,00					1 250,000		
"rozšíření komunikace"151,00					151,000		
Součet					1 401,000		
24	R	574B46	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 16+, 16S TL. 50MM	M2	1 456,000	344,50	501 592,00
1250*1,04					1 300,000		
"rozšíření komunikace"150*1,04					156,000		
Součet					1 456,000		
25	R	574D58	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S TL. 60MM	M2	1 512,000	377,00	570 024,00
1250*1,08					1 350,000		
"rozšíření komunikace"150*1,08					162,000		
Součet					1 512,000		
26	R	58920	VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	M	220,000	207,00	45 540,00
"žlabovka"180					180,000		
"drážka"40					40,000		
Součet					220,000		
8		Trubní vedení				170 802,00	
27	R	81457	POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 500MM	M	13,000	3 260,00	42 380,00
8,00					8,000		
"prodloužení propustku"5,00					5,000		
Součet					13,000		
28	R	875332	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH	M	460,000	242,00	111 320,00
"trativod"230					230,000		
Součet					230,000		
"Přípočty"							
"trativod 2. strana"230					230,000		
Součet					230,000		
230,00+230,00					460,000		
Součet					460,000		
29	R	89712	VPUŠŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	1,000	15 500,00	15 500,00
30	R	899524	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30)	M3	0,300	5 340,00	1 602,00
"obetonování výústě"1*0,3					0,300		
Součet					0,300		
9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				539 988,00	

31	R	9113C1	SVODIDLO OCEĽ SILNÍČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	185,000	1 790,00	331 150,00
32	R	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	76,000	222,00	16 872,00
					"KŘÍŽOVATKA"10	10,000	
					"125*264*2*0,125	66,000	
					Součet	76,000	
33	R	915221	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	76,000	341,00	25 916,00
					66,000+10	76,000	
					Součet	76,000	
34	R	935812	ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 100MM	M2	135,000	1 230,00	166 050,00
					230*0,6	138,000	
					odpočet -230*0,6	-138,000	
					dle změny stavby před dokončením	135,000	
					Součet	135,000	
N00			VŠEOBECNÉ PODMÍNKY	129 455,00			
35	R	014102-1	POPLATKY ZA SKLÁDKU-KRYT DLAŽBA	T	576,000	50,00	28 800,00
					"DLAŽBA - manipulace"210*2,4	504,000	
					"rozšíření komunikace"30,0*2,4	72,000	
					Součet	576,000	
36	R	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU-PODKLADNÍ VRSTVY	T	628,595	50,00	31 430,00
					"ŠD"230,7*2	461,400	
					"ODKOPÁVKY"(2244-1516)*1,7	1 237,600	
					Součet	1 699,000	
					"Odpočty"		
					"žebro"-85,25*1,7	-144,925	
					"sanace AZ"-614,40*1,7	-1 044,480	
					Součet	-1 189,405	
					"Přípočty"		
					"drenáž 2. strana"23,00*1,7	39,100	
					"rozšíření komunikace"25,5*2+17*1,7	79,900	
					Součet	119,000	
					1699,00-1189,405+39,10+79,90	628,595	
					Součet	628,595	
37	R	014102-3	POPLATKY ZA SKLÁDKU-ASFALTY	T	118,200	500,00	59 100,00
					"odstranění asf. krytu"9,25*2,4	22,200	
					"fréza"40*2,4	96,000	
					Součet	118,200	
38	R	014102-4	POPLATKY ZA SKLÁDKU-KRAJNÍKY	T	20,250	500,00	10 125,00
					"MANIPULACE"500*0,15*0,1*2,7	20,250	
					Součet	20,250	
NP			Nové položky - JC dle OTSKP SPK 2018	583 440,00			
39	SPK	56220	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL VÁPNEM	M3	858,000	680,00	583 440,00
					"sanace AZ půdní frézou"(1280*1,2)*0,50	768,000	
					"rozšíření komunikace"(150*1,2)*0,50	90,000	
					Součet	858,000	

Celkem

4 929 815,55

Datum	Denní záznamy stavby
19.6.18	
01	Počasí: 25°C Pohořany
	Prac. doba: 7 ⁰⁰ - 17 ⁰⁰
	Stav: ŠRIT, PALINSEK, ŠERTÁK, KURKA, SKOROPOLSKÝ
	Mech.: CAT 323, TRAKTORBAGR, T815, PIVIBAGR
	Práce: ODTĚŽENÍ SVAHU
	ODVOZ VÝKOPU NA DEPOU
	ZABEZPEČENÍ STAVENIŠTĚ
20.6.18	
SA	Počasí: 16°C Pohořany
	Prac. doba: 7 ⁰⁰ - 19 ⁰⁰
	Stav: ŠRIT, PALINSEK, ŠERTÁK, KURKA, SKOROPOLSKÝ
	Mech.: CAT 323, TRAKTORBAGR, T815, PIVIBAGR
	Práce:
	2/17 T815
	Práce: Vykládání štěrku z výkopu
	Práce: Vykládání štěrku z výkopu
	Práce: Vykládání štěrku z výkopu
	Práce: Vykládání štěrku z výkopu
	Práce: Vykládání štěrku z výkopu
	Práce: Vykládání štěrku z výkopu
	Práce: Vykládání štěrku z výkopu
	Práce: Vykládání štěrku z výkopu
	Práce: Vykládání štěrku z výkopu
	Práce: Vykládání štěrku z výkopu
	Práce: Vykládání štěrku z výkopu
	Práce: Vykládání štěrku z výkopu
	Práce: Vykládání štěrku z výkopu
	Práce: Vykládání štěrku z výkopu
	Práce: Vykládání štěrku z výkopu
	Práce: Vykládání štěrku z výkopu
	Práce: Vykládání štěrku z výkopu
	Práce: Vykládání štěrku z výkopu
	Práce: Vykládání štěrku z výkopu
	Práce: Vykládání štěrku z výkopu
	Práce: Vykládání štěrku z výkopu
	Práce: Vykládání štěrku z výkopu
	Práce: Vykládání štěrku z výkopu
	Práce: Vykládání štěrku z výkopu
	Práce: Vykládání štěrku z výkopu
	Práce: Vykládání štěrku z výkopu
	Práce: Vykládání štěrku z výkopu

Zápis č. 1 z kontrolního dne stavby

„III/6031 Nespeky - Pyšely“

konaného dne 20. června 2018

Přítomní: viz presenční listina

A. Postup výstavby a kontrola harmonogramu stavby

Stavba provádí práce ve smyslu schváleného harmonogramu

B. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby

Stavba zahájila práce vytýčením podzemních vedení a vytýčením vlastní stavby.

Následně provedla odtěžení dlažby v celé trase stavby včetně podloží až na pláň.

Dlažba byla deponována dle dispozic zástupce KSUS o čemž byl učiněn záznam.

Sanace pláně byla provedena vápněním.

Na dnešním KD byly upřesněny polohy geomříže, stejně tak i napojení komunikace na stávající zastávku autobusu.

Doklady ZBV jsou dokončeny a jsou ve stupni podpisu před podáním závěrečnému schválení

Byl dohodnut postup prací ve styku s optickým kabelem v prostoru u propustku.

Zástupce AD Ing Jedličková seznámila přítomné o případných možnostech úprav šířky komunikace s ohledem na soukromé pozemky.

C. Úkoly vyplývající z problematiky výstavby

1/1 – stavba vyzve správce optokabelu k odsouhlasení provedených úprav

2/1- výsledky kontrolních statických zkoušek budou průběžně zaznamenávány do SD,

D. Kontrola úkolů z minulých kontrolních dnů

Úkoly splněny

E. Zpráva koordinátora BOZP

Koordinátor předal potřebné dokumenty a vzájemně se dohodli o další spolupráci.

Obdrží: všichni přítomní

Příští KD stavby se uskuteční dne: **4. července 2018 v 13:00 hod.**

Zapsal: APIS s.r.o - TDI Ing. Jan Pavlita



Merit Bau CZ, a.s.

Se sídlem: K Dolíčku 66,

530 02 Pardubice- Nové Jesenčany

III/6031 Nespeky – Pyšely

S odvoláním na článek 6 Práva a povinnosti objednatele Smlouvy o dílo 3719/00066001/2017, odst. 6.6.:

Objednatel může požadovat změnu rozsahu Díla či schválit změnu rozsahu Díla navrženou Zhotovitelem, a to při respektování povinností Objednatele dle Zákona o ZVZ a interních předpisů Objednatele, zejména pak Směrnice ředitele Objednatele ke změnám staveb (dále jen „Směrnice“), která tvoří přílohu č. 4 této Smlouvy. Zhotovitel bere obsah Směrnice na vědomí a zavazuje se, že při administraci změn nebude postupovat v rozporu se Směrnicí a že nebude na Objednateli uplatňovat nároky ze změn před schválením těchto změn postupem, který Směrnice stanoví. Zhotovitel je v případě takového rozhodnutí Objednatele o změně rozsahu Díla povinen Objednateli vyhovět a (i) snížit rozsah Díla nebo (ii) bez zbytečného odkladu podat nabídku na zvýšení rozsahu Díla o plnění stejného charakteru jako Dílo sjednané ve Smlouvě s tím, že:

- a) při snížení rozsahu se Cena Díla odpovídajícím způsobem sníží,
- b) při zvýšení rozsahu bude Cena Díla v nabídce Zhotovitele stanovena na základě cen uvedených v Nabídce v Oceněném soupisu prací. V případě, že není možné Cenu Díla stanovit tímto způsobem, bude Cena Díla stanovena na základě expertních cen uvedených např. v Oborovém třídíku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací (OTSKP-SPK) platných pro dané období nebo v cenách nižších. V případě, že není možné Cenu Díla stanovit ani tímto způsobem, bude Cena Díla stanovena ve výši ceny obvyklé v místě a čase, zjištěné na podkladě průzkumu trhu provedeného Zhotovitelem formou získání alespoň tří nezávislých nabídek jiných zhotovitelů. Doklady o provedeném průzkumu trhu a jeho výsledcích je Zhotovitel povinen předat Objednateli,
- c) změny budou administrovány postupem stanoveným ve Směrnici, přičemž snížení či zvýšení rozsahu bude upraveno písemným dodatkem Smlouvy, kterým může být i Změnový list změny stavby podepsaný ze strany osob oprávněných jednat za Objednatele a Zhotovitele,
- d) případná změna termínů plnění bude vždy sjednána formou písemného dodatku k této Smlouvě (tj. nikoliv formou Změnového listu), a to i v případě, pokud by souvisela se změnami sjednanými Změnovým listem. Změna termínů plnění je možná pouze v případě, že taková změna nemá charakter podstatné změny závazku ve smyslu § 222 Zákona o ZVZ,

- e) Zhotovitel se zavazuje vyhotovovat Změnové listy a jejich přílohy a předkládat je
Objednateli výlučně ve formátu, který stanoví Směrnice.

Souhlasíme se změnou rozsahu díla v souladu s návrhem, který spočívá v nepředvídatelných okolnostech. Změna vyplývá ze skutečnosti, že při podrobném zaměření staveniště bylo zjištěno, že pro řádné provedení opravy silnice je nutné výměru opravované vozovky o 12 % zvětšit. Jedná se zajištění plynulého vedení trasy a potřebné minimální šířky vozovky 4,5 m od začátku úpravy v délce cca 120 m, jejího rozšíření v délce cca 40 m na 5,8 m pro možnost vyhnutí vozidel a úpravu autobusové zastávky včetně napojení dvou místních komunikací. Touto úpravou dojde k určitému zlepšení plynulosti provozu a zejména ke zvýšení jeho bezpečnosti. Z důvodu nálezu inženýrských sítí při opravě betonového propustku, které nebyly v dokumentaci zaneseny, bylo nutné betonový propustek DN 500 o 5 m prodloužit, aby nedošlo ke střetu s těmito sítěmi.


Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje
příspěvková organizace
Zborovská 11
150 21 Praha 5
IČO: 00066001


121 Praha 5
Z00066001

Marek Hanuš

Investiční technik



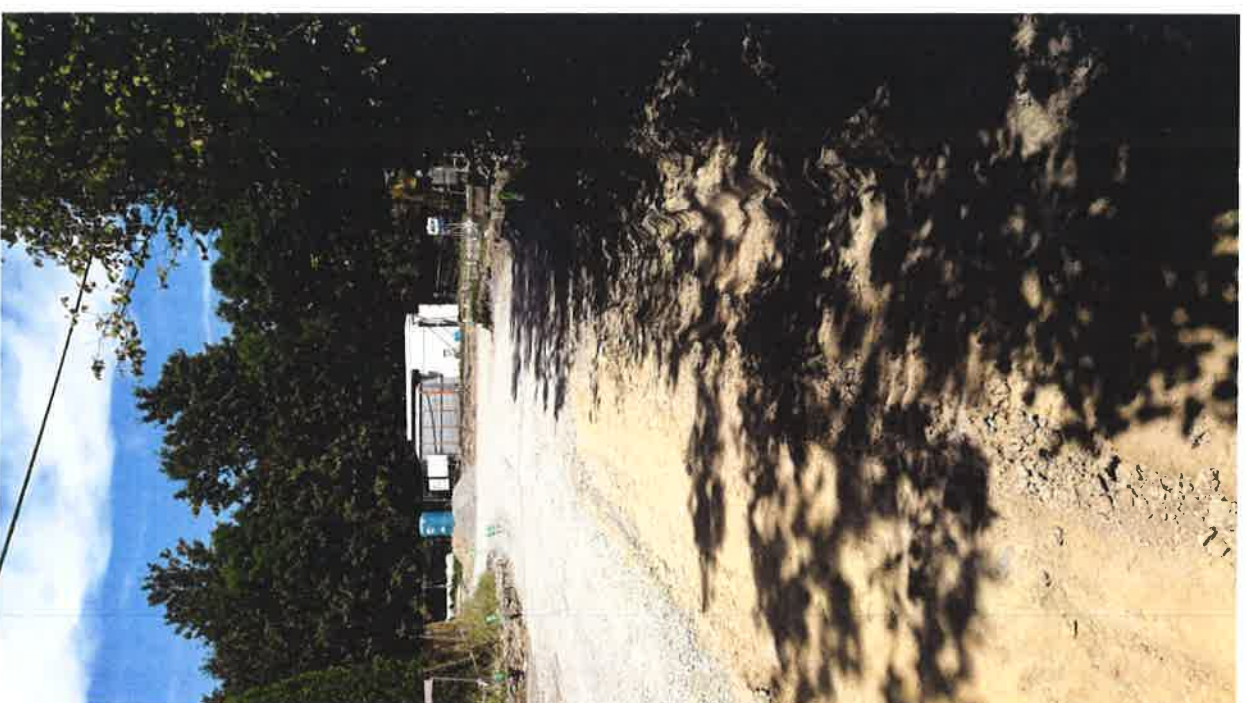

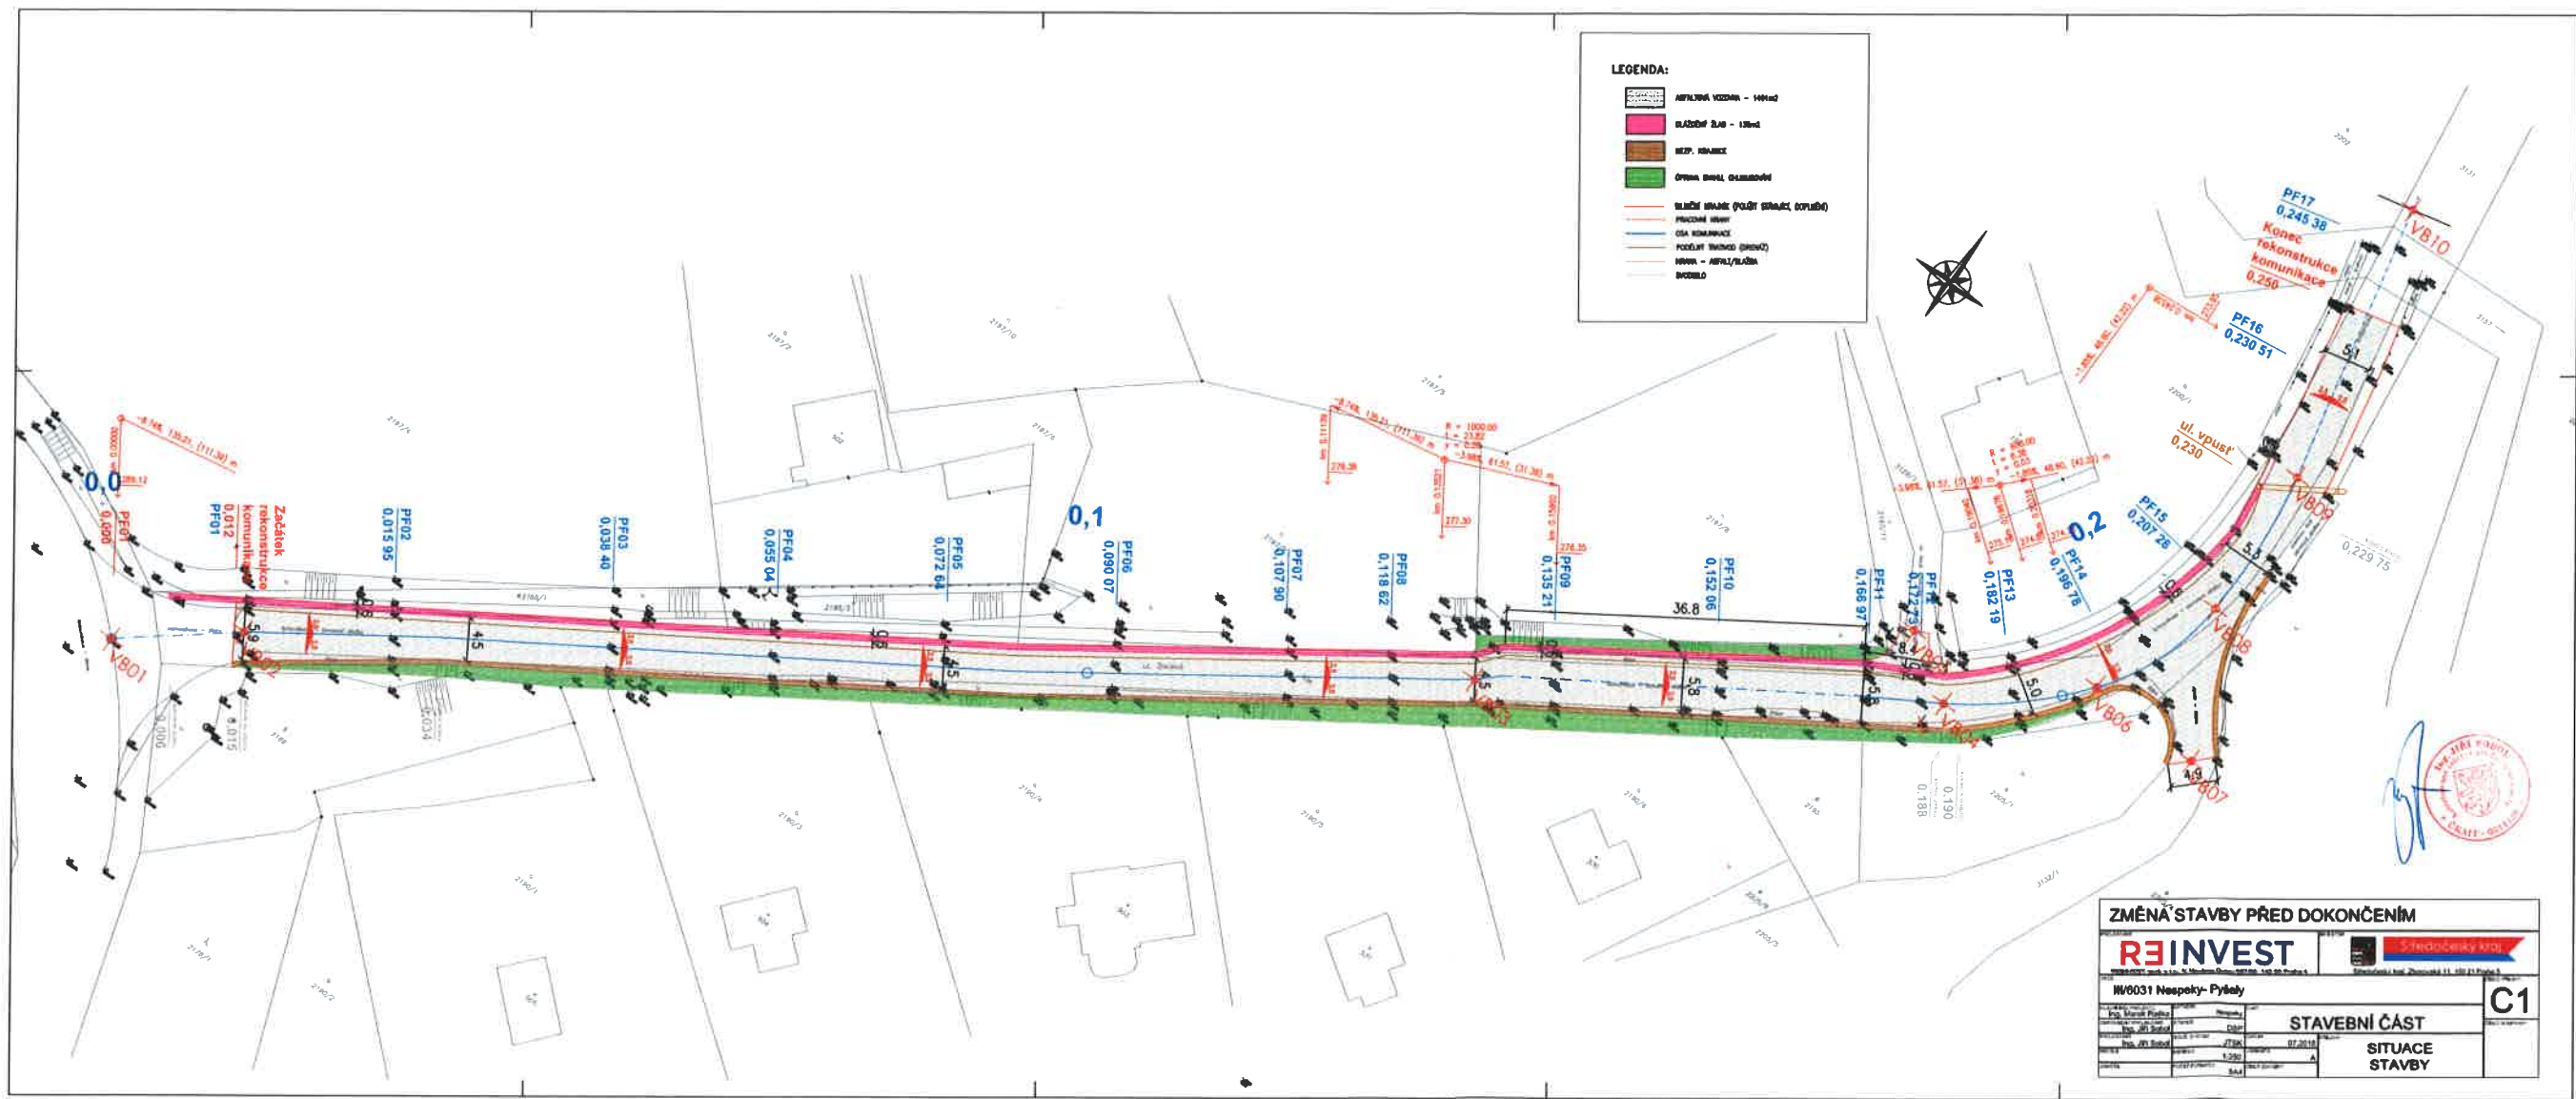

ROZLO	JIZDNI PAS	KR
5.6		
0.6	2.25	2.25 0.5



PŘÍKOL	ROZŠÍŘENÍ	JÍZDNÍ PÁS	KŘ
--------	-----------	------------	----

6.9

0.6 1.3 2.25 2.25 0.5




Diagram showing the layout of a rectangular building with dimensions:

- Top horizontal line: ROD (left), JIZNI PAS (center), KR (right)
- Dimension line below: 6.1 (total length)
- Bottom dimension line: 0.6, 2.50, 2.50, 0.5 (segment lengths)



ZMĚNA STAVBY PŘED DOKONČENÍM

ZMĚNA STAVBY PŘED DOKONČENÍM

DEINVEST

REINVEST

C2

STAVEBNÍ ČAS	
1. STAVBA	2. STAVBA
3. STAVBA	4. STAVBA
5. STAVBA	6. STAVBA
7. STAVBA	8. STAVBA
9. STAVBA	10. STAVBA
11. STAVBA	12. STAVBA
13. STAVBA	14. STAVBA
15. STAVBA	16. STAVBA
17. STAVBA	18. STAVBA
19. STAVBA	20. STAVBA
21. STAVBA	22. STAVBA
23. STAVBA	24. STAVBA
25. STAVBA	26. STAVBA
27. STAVBA	28. STAVBA
29. STAVBA	30. STAVBA
31. STAVBA	32. STAVBA
33. STAVBA	34. STAVBA
35. STAVBA	36. STAVBA
37. STAVBA	38. STAVBA
39. STAVBA	40. STAVBA
41. STAVBA	42. STAVBA
43. STAVBA	44. STAVBA
45. STAVBA	46. STAVBA
47. STAVBA	48. STAVBA
49. STAVBA	50. STAVBA
51. STAVBA	52. STAVBA
53. STAVBA	54. STAVBA
55. STAVBA	56. STAVBA
57. STAVBA	58. STAVBA
59. STAVBA	60. STAVBA
61. STAVBA	62. STAVBA
63. STAVBA	64. STAVBA
65. STAVBA	66. STAVBA
67. STAVBA	68. STAVBA
69. STAVBA	70. STAVBA
71. STAVBA	72. STAVBA
73. STAVBA	74. STAVBA
75. STAVBA	76. STAVBA
77. STAVBA	78. STAVBA
79. STAVBA	80. STAVBA
81. STAVBA	82. STAVBA
83. STAVBA	84. STAVBA
85. STAVBA	86. STAVBA
87. STAVBA	88. STAVBA
89. STAVBA	90. STAVBA
91. STAVBA	92. STAVBA
93. STAVBA	94. STAVBA
95. STAVBA	96. STAVBA
97. STAVBA	98. STAVBA
99. STAVBA	100. STAVBA

	1,00	2
100%	1,00	

**VZOROVÉ
PŘÍČNÉ ŘEZY**
