



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo

číslo Objednatele: S – 3219/DOP/2017

číslo Dodavatele: S 119/2017

„II/603 Radějovice - Babice“

Smluvní strany

Objednatel

se sídlem:

zastoupený:

IČO: 70891095

bankovní spojení:

číslo účtu

Středočeský kraj

Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5

Martinem Hermanem, radním pro oblast investic a veřejných zakázek, na základě usnesení Rady Středočeského kraje č. 036-34/2018/RK ze dne 5.11.2018

DIČ: CZ70891095

PPF banka, a.s.,



dále jen „**Objednatel**“

a

Dodavatel

se sídlem:

zastoupen:

IČO: 43792553

bankovní spojení:

B E S s.r.o.

Sukova 625, 256 01 Benešov

Petrem Váňou, jednatelem

DIČ: CZ43792553



dále jen „**Dodavatel**“

se rozhodly uzavřít níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo



Článek I. Předmět dodatku

1. Tímto Dodatkem č. 1 se mění Smlouva o dílo ze dne 26. 2. 2018 (č. smlouvy o dílo Objednatele: S-3219/DOP/2017, č. smlouvy o dílo Dodavatele: S 119/2017 (dále jen „**Smlouva**“), následovně:

a) **Článek II. Doba zhotovení díla, podmínky pro provádění změn díla**, se dále doplňuje o odst. 2.11 v následujícím znění:

Z důvodu pozdě schválených DIO při zahájení I. etapy, dále z důvodu čekání na schválení odstranění státních nivelačních bodů na SO 120 a SO 121 Zeměměřickým úřadem a také z důvodu nepředvídatelných ZBV na SO 121, kdy při navrtání trnu do kamenné klenby a křídel docházelo k uvolňování kamenů a znemožnění zavrtání kotevních trnů do stávající klenby - nutná sanace metodou TORKRET se zavrtáním zemních kotev, obdobný postup musel být použit i u SO 201. Dále vlivem klimatických podmínek (vysokým teplotám) docházelo k úpravě četnosti přestávek a pracovní doby, včetně úpravy provádění některých prací. Smluvní strany se dohodly, že se prodlužuje doba výstavby dle čl. 2.1 této smlouvy o 3,5 týdne, tedy do 31. 10. 2018. Změna závazku je předkládána v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 písm. a) a písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a v souladu se Směrnicí ředitele KSÚS upřesňující provádění změn závazku dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „Směrnice“).

2. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněny.

Článek II. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv, které provede Objednatel do 30 dnů od jeho podpisu.
2. Zdůvodnění změny termínu díla je uvedeno v příloze „Formulář pro ohlášení změn stavby“.
3. Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě je vyhotoven v 5 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 3 stejnopisy a Dodavatel 2 stejnopisy.
4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 ke Smlouvě, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením Rady Středočeského kraje č. 036-34/2018/RK ze dne 5.11.2018.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

5. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří následující přílohy:

- Příloha č. 1: Formulář pro ohlášení změn stavby
- Příloha č. 2: Harmonogram pro dokončení stavby
- Příloha č. 3: DIO
- Příloha č. 4: Vyjádření Zeměměřického úřadu

V Praze dne: **27-11-2018**

Objednatel
Středočeský kraj



Martin Herman

radní pro oblast investic a veřejných zakázek

V Benešově dne : **22-11-2018**

Dodavatel
B E S s.r.o.

BES s.r.o.
Sukova 625, 256 01 Benešov
www.besbn.cz



Petr Váňa

jednatel společnosti

Usnesení č. 036-34/2018/RK ze dne 5.11.2018

„II/603 Radějovice – Babice“ - Uzavření Dodatku č. 1 na prodloužení termínu ke Smlouvě o dílo č. S-3219/DOP/2017

Rada kraje po projednání

I. s o u h l a s í

a) se změnou závazku, která je předkládána v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 písm. a) a písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a v souladu se Směrnicí ředitele KSÚS upřesňující provádění změn závazku dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „směrnice“)

b) s prodloužením doby zhotovení díla o 3,5 týdne, tedy do 31. 10. 2018

c) s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. S-3219/DOP/2017 ze dne 26. 2. 2018 na akci „II/603 Radějovice - Babice“ dle přílohy č. 2 k Tisku č. 2324(2018)

II. p o v ě ř u j e

Martina Hermana, radního pro oblast investic a veřejných zakázek, podpisem Dodatku č. 1 dle přílohy č. 2 k Tisku č. 2324(2018)

III. u k l á d á

radnímu pro oblast investic a veřejných zakázek Martinu Hermanovi podepsat Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. S-3219/DOP/2017 ze dne 26. 2. 2018, dle přílohy č. 2 k Tisku č. 2324(2018)

Termín: 30. 11. 2018

Odpovídá: Martin Herman, radní pro oblast investic a veřejných zakázek

IV. u k l á d á

Krajskému úřadu Středočeského kraje zajistit zveřejnění uzavřeného Dodatku č. 1 na profilu zadavatele a zajistit odeslání opraveného formuláře do Věstníku veřejných zakázek

Termín: 30. 12. 2018

Odpovídá: Mgr. Ivana Jindřichová, MPA, vedoucí Odboru krajského investora



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY „II/603 Radějovice - Babice“

Určeno: Martin Herman

radní pro oblast investic a veřejných zakázek
(v kopii věcně příslušný odbor, Krajský úřad)

Číslo SoD: S – 3219/DOP/2017

Termín plnění: 7.10.2018

Celková cena díla: 45 243 813,75 Kč bez DPH

Zhotovitel: B E S s.r.o.

IČO: 437 92 553

Oprávněná osoba: Ing. Aleš Sládek

Telefonní spojení: 724 590 151

Popis předmětu informace:

Žádost o prodloužení termínu stavby

Popis problému:

Z důvodu pozdě schváleného DIO při zahájení I. Etapy, která nabylo v platnost 19.3.2018 přičemž podpis smlouvy byl 26.2.2018

Práce byly 28.3.2018 pozastaveny z důvodu čekání na schválení odstranění státních nivelačních bodů na SO 120 a SO 121, které bylo vyřešeno 9.4.2018.

Dále kvůli nepředvídatelným ZBV na SO 121, kdy při navrtání trnu do kamenné klenby a křídel, docházelo k uvolňování kamenu a neumožňuje zavrtání kotevních trnů do stávající klenby. Provedla se sanace křídel metodou TORKRET se zavrtáním zemních kotev a nad stávající kamennou klenbou napříč vozovky, se vybetonovala základová deska, která spojuje čelní zdi. Na SO 201 sanace opěrné zdi se prováděla metodou TORKRET se zavrtáním zemních kotev. Při navrhované sanaci docházelo k uvolňování kamenu a hrozilo rozpadnutí celé opěrné zdi. Tato metoda byla časově náročnější.

Kvůli nepříznivému počasí (vysokým teplotám) se upravovali četnost přestávek a pracovní doby, včetně nutnosti úpravy provádění některých prací s ohledem na vysoké teploty.

Čeho se zhotovitel domáhá:

Žádáme o prodloužení termínu výstavby o 3,5 týdne tj. do 31.10.2018.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla:
2.9.2018

BES s.r.o.
Sukova 625, 256 01 Benešov
www.besbn.cz



Datum, podpis oprávněné osoby

Ing. Aleš Sládek – Vedoucí stavební výroby

Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatelem:





MĚSTSKÝ ÚŘAD V ŘÍČANECH

Městský úřad v Říčanech, Masarykovo náměstí 53/40, 251 01 Říčany, IČ: skjbfwd
tel.: +420 323 618 111, fax: +420 323 618 295, <http://www.ricany.cz>, e-mail: podatelna@ricany.cz

Vaše značka/ze dne: /
Č.ev.: 58819/2018
Č.j.: 7586/2018-MURI/OSAD
Útvar MěÚ: odbor správ. agend a dopravy
Počet stejnopisů: 11
V Říčanech dne: 27.6.2018
Vyřizuje: Ing. Přemysl Douša
Telefon (linka): 274
E-mail: premysl.dousa@ricany.cz
Způsob odeslání: datová schránka

P.T.
BES s.r.o.

Sukova 625
256 17 Benešov

ROZHODNUTÍ

Odbor správních agend a dopravy Městského úřadu v Říčanech, jako příslušný silniční správní úřad ve věcech silnic II. a III. třídy a místních komunikací podle ust. § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů (dále jenom zákon o pozemních komunikacích) stanoviska Policie ČR DI Praha venkov – Jih č.j. KRPS-143544-2/ČJ-2018-011406 ze dne 17.5.2018 rozhodl podle ust. § 24 zákona o pozemních komunikacích takto:

Na základě žádosti žadatele – BES s.r.o., Sukova 625, 256 17 Benešov, IČ: 437 92 553, kterého na základě plné moci zastupují 3K Značky s.r.o., Jiráskova 1519, 251 01 Říčany, IČ: 264 87 985, ze dne 15.6.2018 se

povoluje

částečná uzavírka pozemní komunikace silnice II. třídy č. II/603 (4. etapa) od hranic okresu Praha – západ až za křižovatku s místní komunikací (MK) ulicí Slunečná v obci Hlubočinka z důvodu opravy povrchu komunikace.

Údaje o uzavírací:

úsek uzavírky:

etapa 4a): od hranic okresu Praha – západ včetně křižovatky se silnicí č. III/00318 a MK K Potoku v Hlubočince

etapa 4b): od křižovatky se silnicí č. III/00328 a MK K Potoku až za křižovatku s MK Slunečná v obci Hlubočinka

dobu uzavírky:

etapa 4a): od 9.7.2018 od 20.7.2018

etapa 4b): od 23.7.2018 do 10.8.2018

důvod uzavírky:

oprava povrchu komunikace

žadatel:

BES s.r.o., Sukova 625, 256 17 Benešov

IČ:

437 92 553

investor:

KSÚS Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

IČ:

000 66 001

odpovědný pracovník:

Ing. Lukáš Avenarius, tel.: 725 414 801

stanovená trasa objížd'ky:

uzavřeným úsekem bude umožněn jedním jízdním pruhem řízeným SSZ.

pravidelná autobusová doprava: Po dobu uzavírky v etapě 4a) nebude obsluhována zastávka „Sulice, Hlubočinka, Obchodní centrum“ ve směru Jesenice a v etapě

4b) nebude obsluhována zastávka „Sulice, Hlubočinka, Obchodní centrum“ ve směru Kamenice.

Uzavírka se povoluje za dodržení těchto podmínek:

1. Uzavírka bude řádně označena dopravními značkami, zábranami a informačními tabulemi v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích.
2. Žadatel zodpovídá po celou dobu uzavírky za řádné rozmístění stanoveného dopravního značení a za jeho údržbu.
3. V etapě 4a) bude uzavřen sjezd z komunikace K Potoku na silnici č. II/603 a v etapě 4b) sjezd z ulice Slunečná na silnici II/603.
4. Stavebník ve spolupráci s Obcí Sulice zajistí prokazatelné informování občanů a firem v uzavřeném úseku o částečné uzavírce silnice č. II/603.
5. Přechodná úprava silničního provozu byla stanovena Odborem správních agend a dopravy Městského úřadu v Říčanech pod č.j. 7586/2018-MURI/OSAD, č.ev. 58829/2018 ze dne 27.6.2018.
6. V případě jakýchkoliv změn v harmonogramu stavební činnosti, stavebník neprodává, ale ihned silniční správní úřad MěÚ Říčany o těchto změnách.
7. Po ukončení uzavírky bude ihned odstraněno dopravní značení a všechna dopravní zařízení umístěná v souvislosti s uzavírkou.

Uzavírka a návrh dopravního značení byly odsouhlaseny Policií ČR DI Praha venkov - jih v písemném vyjádření.

Při nesplnění podmínek tohoto rozhodnutí může silniční správní úřad na základě ust. § 24 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích povolení zrušit nebo omezit.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 správního řádu):

- BES s.r.o., Sukova 625, 256 17 Benešov
- Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Odůvodnění:

Po posouzení žádosti žadatele – BES s.r.o., Sukova 625, 256 17 Benešov, kterého na základě plné moci zastupují 3K Značky s.r.o., Jiráskova 1519, 251 01 Říčany a souhlasu Policie ČR DI Praha venkov – Jih, na základě § 24 odst. 1, 2 zákona o pozemních komunikacích byla povolena částečná uzavírka pozemní komunikace tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů od jeho doručení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 00 Praha 5 – Smíchov, prostřednictvím Odboru správních agend a dopravy Městského úřadu v Říčanech.

Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá podle ust. § 24 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích odkladný účinek.

L.S.



*Ing. Přemysl Douša
oprávněná úřední osoba
Odbor správních agend a dopravy
Městského úřadu v Říčanech*


Rozdělovník:

- Obec Sulice
- Obec Radějovice
- KSÚS Středočeského kraje, oblast Kutná Hora
- Policie ČR DI Praha venkov – JIH
- KÚ Středočeského kraje, odbor dopravy
- ROPID
- ARRIVA City, s.r.o.
- ICOM transport a.s., ČSAD Benešov
- 3K Značky s.r.o.
- BES, s.r.o.

Harmonogram k14.9.2018

Stavba: II/603 Radějovice - Babice

Technický záměr
14.9.2018

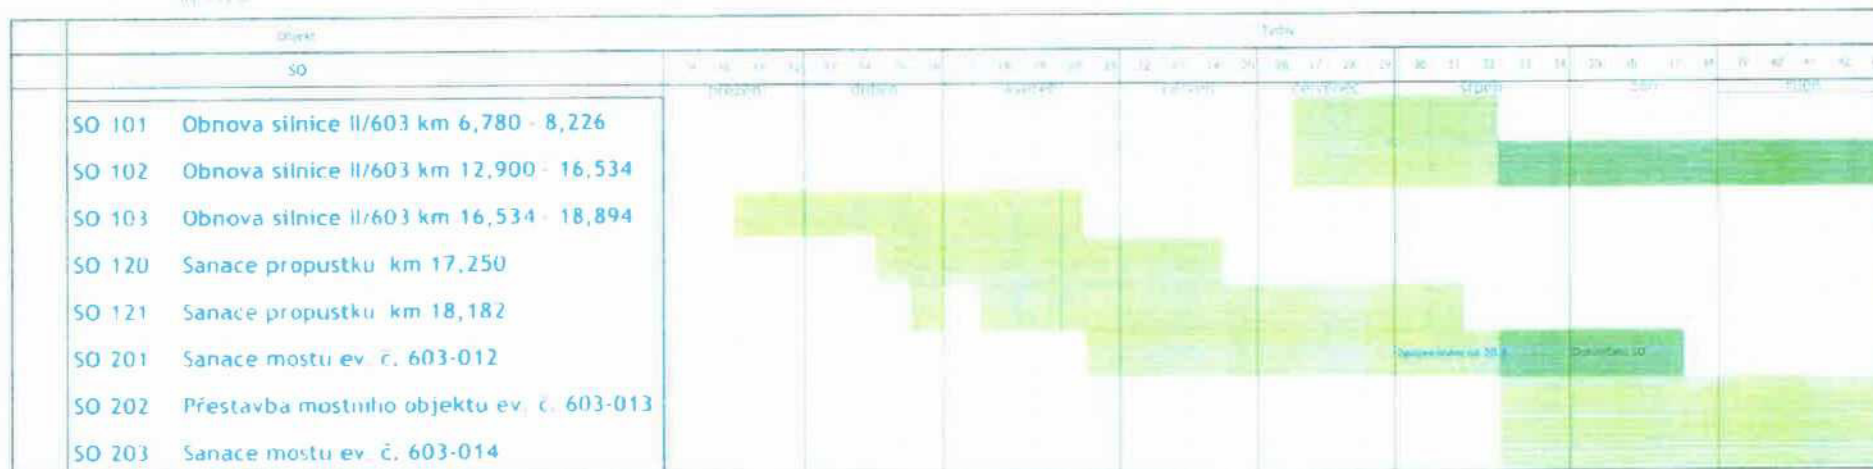

Harmonogram je orientační - bude upraven na základě schválené RDS a DŘS a průběžně aktualizován dle článku 1.5. smlouvy.

ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD

odbor geodetických základů, oddělení zpracování dat a služeb

Pod Sídlištěm 9, 182 11 Praha 5

P. O. Box 21

GeoTEL Rail s.r.o.

Martin Hercík

Radniční 165/54

715 00 Ostrava - Michálkovice

VÁŠ DOPIS ZN. / ZE DNE	NAŠE ZNAČKA	VYŘIZUJE / TELEFON	V PRAZE DNE
e-mail ze dne 29. 3. 2018 martin.hercik@geotel.cz	ZÚ-01264/2018-13200	Kopalová, Ing. Lambert +420 2 8404 1534 petr.lambert@cuzk.cz	9. 4. 2018

Věc: Vyjádření k žádosti o zrušení nivelačních bodů z důvodu demolice mostů, silnice II/603

V návaznosti na Váš e-mail ze dne 29. 3. 2018 sdělujeme následující informace:

Body **IJ-148.1 a IJ-152.1** je součástí pořadu I. řádu Základního výškového bodového pole (dále jen „ZVBP“) a geodetických základů ČR. Měřické značky uvedených bodů geodetických základů jsou chráněny zákonem 200/1994 Sb., o zeměměřictví, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že by při provádění stavebních prací došlo k odstranění či jinému ohrožení značky bodu, je vlastník nebo oprávněný uživatel nemovitosti povinen minimálně 30 dnu před zahájením stavebních prací, oznámit toto Zeměměřickému úřadu, a to formou žádosti o přemístění, nebo odstranění značky geodetického bodu. Zeměměřický úřad žádá, aby se stal účastníkem příslušného stavebního řízení

O zrušení měřických značek bodů geodetických základů rozhoduje Zeměměřický úřad, jako orgán státní správy, podle zákona 359/1992 Sb.

Vzhledem k tomu, že v tomto případě se jedná o méně významné body Základního bodového pole, lze povolit i jejich zrušení bez náhrady, ovšem s podmínkou, že vlastník nemovitosti se písemně zaváže, že povolí stabilizaci nového adekvátního bodu na své nemovitosti, pokud ZÚ o instalaci bodu na této nemovitosti rozhodne, a to v období nejpozději do 10 let od zrušení bodu. Toto osazení může provést v případě potřeby pouze pověřený technik ZÚ, značku prosím znovu neosazujte

Pokud by vlastník nebo oprávněný uživatel nemovitosti trval na odstranění bodů ZVBP, je řešením zrušení bodu, avšak za podmínky, že žadatel poskytne finanční náhradu, vypočtenou ve výši vlastních nákladů Zeměměřického úřadu na zřízení adekvátního nového bodu. V tomto případě se jedná o částku cca **12 500,- Kč za každý jednotlivý bod**. Přesná částka se určí dle stanovených cen na veřejném

Znehodnocení bodu ZVBP bez rozhodnutí o jeho zrušení vydaného Zeměměřickým úřadem by bylo posuzováno jako přestupek, což zakládá důvod k vyvolání správního řízení ve věci porušení pořádku na úseku zeměměřictví.

Ing. Jan Řezníček, Ph.D. v. r.
Ředitel Odboru geodetických základů


Za správnost odpovídá:

Ing. Petr Lambert
Vedoucí Oddělení zpracování dat a služeb

Přílohy: 2 x kopie NÚ

NIVELAČNÍ ÚDAJE

Nivelační pořad: IJ Tábor-Praha

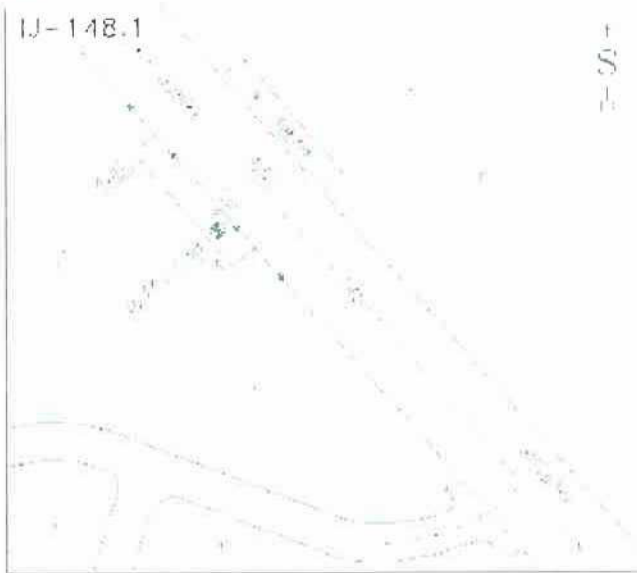Přechodní bod	Nivelační bod	Délka v km		Nadmořská výška Bpv	Výška z roku	
		od řádu	od počátku			
IJ-147.2	IJ-148.1	0.211	71.085	341.737 m	2011	
Místopisný popis Malešín, silniční propustek		Místopis 				
Stav a stáří objektu značka shora betonová stavba z roku 2000 Poznámky:		Úz. jednotka: 320907703 Okres: Praha - východ Obec: ŘEHENICE Kat. území: MALEŠÍN Vlastník/parc. č.: /				
ZN-50	12-44		SMO-5	Benešov 2-4		
Druh zn	Stupeň staž	Stabilizoval	Druh bodu	Souřadnice v S-JTSK		
H III	4	Zúřad		Y	730712 m	dig
	Druh staž	Bartůněk		X	1063959 m	
	J	2010				
Zeměpisná délka		Zeměpisná šířka	Gs	Gn	Ba	
14° 38' 18.1"		49° 52' 18.2"	980981 mgal	981065 mgal	8 mgal	
Datum: 4.4.2018						
