

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

II/508 Mirošovice - Mnichovice, obnova protismykových vlastností a rovnosti krytu, provozní staničení 1,503-3,702

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Stálé dopravní značení

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

193 / 1

Číslo ZBV:

2

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov

IČ: 00066001

Zhotovitel: PORR a.s.

Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

úsek Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Čechy - Střed

Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

IČ: 43005560

Rekapitulace ZBV č. 2 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.3	-202.238,03	0,00	-202.238,03

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2	-202.238,03	0,00	-202.238,03

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.

Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré:

4.

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: II/508 Mirošovice - Mnichovice, obnova protismykových vlastností a rovnosti krytu, provozní staničení 1,503-3,702		Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 193 / 1	Číslo ZBV: 2
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Stálé dopravní značení			
Strany smlouvy o dílo č. 436/00066001/2019 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 1.3.2019 (dále jen Smlouva). Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov Zhotovitel: PORR a.s., Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10			
Přílohy Změnového listu:		Paré č. Příjemce	
1. Krycí list	1 počet listů	1	Objednatel
2. Změnový list	1 počet listů	2	Zhotovitel
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1 počet listů	3	AD
4. Rozpis ocenění Změn položek	1 počet listů	4	TDI
5. Přehled zařazení změn do skupin	1 počet listů		
6. Přehled dalších dokladů	1 počet listů		
Další doklady	10 počet listů		
Iniciátor změny: Zhotovitel Popis a zdůvodnění Změny:			
a) Změnění šířky vodicích čar V rámci PDPS stavby bylo předpokládáno s provedením vodicích čar v šířce 0,25 m. Na základě místního šetření dopravního inspektorátu Policie ČR nastal požadavek na změnění šířky vodicích čar na 0,125 m. Z tohoto důvodu dochází k snížení plochy vodorovného dopravního značení v plastu i v barvě. Jedná se o změnu, která vznikla v rámci místního šetření. Celkově se jedná o Změnu nepodstatnou, nepředvídanou, která je tak podle § 5, odst. 1, písm.c) resp. §10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29. 05. 2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 3 . Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná o změnu nepředvídanou.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Změn záporných -202.238,03	Cena navrhovaných Změn kladných 0,00	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem -202.238,03	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných 202.238,03
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:			
Zhotovitel (stavbyvedoucí)	jméno	Adam Příbyl, DiS.	datum - 6 -01- 2020 podpis
Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Tomáš Roztočil	datum - 6 -01- 2020 podpis
Technický dozor investora	jméno	Ing. Jindra Flanderková	datum - 6 -01- 2020 podpis
Supervize	jméno	xxx	datum podpis
Zástupce Objednatel:	jméno	Ing. Ján Kukura	datum - 6 -01- 2020 podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel)	jméno	Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA	datum podpis
Zhotovitel	jméno	Ing. Pavel Hirsch Ing. František Buršík	datum 7 -01- 2020 podpis
			Číslo paré 4.

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 2

Název Stavby: II/508 Mirošovice - Mnichovice, obnova protismykových vlastností a rovnosti krytu, provozní staničení 1,503-3,702	
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	193 / 1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Stálé dopravní značení	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
552.403,12

Poznámka:

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	552.403,12	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-202.238,03	0,00	0,00	0,00%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-202.238,03	350.165,10	-202.238,03	-36,61%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

		jméno	datum
Zhotovitel (stavbyvedoucí):	souhlasím	Adam Příbyl, DiS.	- 6 -01- 2020
Projektant (autorský dozor):	souhlasím	Ing. Tomáš Roztočil	- 6 -01- 2020
Stavební dozor:	souhlasím	Ing. Jindra Flanderková	- 6 -01- 2020
Zástupce Objednatele:	souhlasím	Ing. Ján Kukura	- 6 -01- 2020
Zaměstnanec KSÚS SK odpovědný za cenové projednání změny:	souhlasím	Petr Heinrich	- 6 -01- 2020

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 2

Ev. č. a název stavby: II/508 Mirošovice - Mnichovice, obnova protismykových vlastností a rovnosti krytu, provozní staničení 1,503-3,702

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

Číslo a název SO/PS: SO 193 Stálé dopravní značení

č. 1

Číslo a název rozpočtu: SO 193 Stálé dopravní značení

Skupina změn: 3

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	915111	VODORÓVNE DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKE - DODAVKA A POKLÁDKA	M2	1.169,281	596,531	-572,750	85,10	99.505,81	-48.741,03	0,00	50.764,79	-48.741,03	-48,98
12	915221	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURALNI NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	1.169,281	596,531	-572,750	268,00	313.367,31	-153.497,00	0,00	159.870,31	-153.497,00	-48,98
Celkem								412.873,12	-202.238,03	0,00	210.635,10	-202.238,03	

Název a evidenční číslo Stavby:

II/508 Mirošovice - Mnichovice, obnova protismykových vlastností a rovnosti krytu, prov

1	Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	35 810 700,00
2=1+18+19	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	36 006 637,63
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	43 668 031,63
3=(2/1)*100	Procento změny Přijáté smluvní částky	100,56%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	Sledování zánětných položek (Skupina 2)	0,00%
40=(19/1)*100	Sledování limitu 30 % pro podstatnou změnu pro změny záporné dle § 4, odst. 5, písm. b)	0,56%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	195.937,63
7=6/100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	0,55%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	10.743.210,00

- 1 -			- 2 -		
Vyhrazené změny (Doměrky)			Změna položek (Započítávání)		
Změny záporné (zadávatel se znečišťování mluve)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávatel se znečišťování mluve)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných
23	24	25=23+24	25	27	28=25+27
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávatel se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (zadávatel se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávatel se znaménkem minus)	Změny kladné	Sum záporných a kladných
16	17	18	19=23+26+29+33	20=24+27+30+34+37+39	21=19+20	23	24	25=23+24	25	27
		II/508 Mirošovice - Mnichovice, obnova protismykových vlastností a rovnosti krytu, provozní stanoviště 1,503-3,702	- 202 238,03	398 175,66	195 937,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VON	1	Vedlejší a ostatní náklady / zvýšení dotčených položek z důvodu prodloužení doby výstavby	0,00	398 175,66	398 175,66					
193	1	Stále dopravní značení/Zmenšení šířky vozíků čar	-202 238,03	0,00	-202 238,03					

ZMĚN DO SKUPIN

ni staničení 1,503-3,702

$9=(32A/1)*100$	Sledování limitu 50 % Skupina 3	1,58%
$10=(36A/1)*100$	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,00%
$10A=32A+36A$	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	600.413,68
$11=1*0,5$	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	17.905.350,00

$12=(37/1)*100$	Sledování limitu 15 %	0,00%
$13=37$	Sledování limitu 149 224 000 Kč	0,00
$14=149224000:37$		149.224.000,00

- 3 -						- 4 -					- 5 -	
Nepředvidanost						Nezbytnost					Změny do minimumu	
Změn ých a rdných	Změny záporné (značeno se znaménkem minus)	Změny kladné	Procentní vyjádření Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (značeno se znaménkem minus)	Změny kladné	Procentní vyjádření Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny do minimumu (15% nebo limit 149 224 000 Kč)	Limit 15 %
27	22	36	$31=(32/1)*100$	$32=20*30$	$32A=ABS(29)*30$	33	34	$35=(34/1)*100$	$36=33*04$	$36A=ABS(33)*34$	37	$38=(37/1)*100$
00	- 202 238,03	398 175,66	1,11%	196 937,63	600 413,68	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0,00	398 175,66	1,11%	398 175,66	398 175,66							
	-202 238,03	0,00	0,00%	-202 238,03	202 238,03							

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	2
Název a evidenční číslo stavby:	II/508 Mirošovice - Mnichovice, obnova protismykových vlastností a rovnosti krytu, provozní staničení 1,503-3,702
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Stálé dopravní značení
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	193 / 1

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
07 Změnový rozpis prací SO 193	2	
08 Situace dopravního značení - 1. díl	1	
09 Situace dopravního značení - 2. díl	1	
10 Vyjádření dopravního inspektorátu	4	
11 Stanovení místní úpravy silničního	1	
12 Žádost o změnu rozsahu díla	1	
Počet listů celkem	10	

Rozpis ocenění Změn SO 193 po ZBV 1

Ev. č. a název stavby:	II/508 Mírošovice - Mnichovice, obnova protismykových vlastností a rovnosti krytu, provozní staničení 1,503-3,702
------------------------	---

Číslo a název SO/PS: SO 193 Stálé dopravní značení

Číslo a název rozpočtu: SO 193 Stálé dopravní značení

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	914131	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZAKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ nové DZ 1 značka + 1 sloupek: 4*1=4,000 [A] 2 značky + 1 sloupek: 6*2=12,000 [B] 4 značky + 1 sloupek: 2*4=8,000 [C] Celkem: A+B+C=24,000 [D]	KUS	24,000	24,000	0,000	2.560,00	61.440,00	0,00	0,00	61.440,00	0,00	0,00
8	914133	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZAKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DEMONTÁŽ věl. likvidace odpadu dle dispozic zhotovitele stávající DZ 1 značka + 1 sloupek: 3*1=3,000 [A] 2 značky + 1 sloupek: 6*2=12,000 [B] 3 značky + 1 sloupek: 3*3=9,000 [C] Celkem: A+B+C=24,000 [D]	KUS	24,000	24,000	0,000	155,00	3.720,00	0,00	0,00	3.720,00	0,00	0,00
9	914911	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MONTÁŽ nové DZ 1 značka + 1 sloupek: 4=4,000 [A] 2 značky + 1 sloupek: 6=6,000 [B] 4 značky + 1 sloupek: 2=2,000 [C] Celkem: A+B+C=12,000 [D]	KUS	12,000	12,000	0,000	1.020,00	12.240,00	0,00	0,00	12.240,00	0,00	0,00
10	914913	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ stávající DZ 1 značka + 1 sloupek: 3=3,000 [A] 2 značky + 1 sloupek: 6=6,000 [B] 3 značky + 1 sloupek: 3=3,000 [C] Celkem: A+B+C=12,000 [D]	KUS	12,000	12,000	0,000	155,00	1.860,00	0,00	0,00	1.860,00	0,00	0,00
11	915111	VODOROVNE DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKE - DODÁVKA A POKLÁDKA 1. fáze VDZ: (4582*0,25)+(119*0,125)+((142,5*0,125)/2)=1 169,281 [A] ZBV1: Změny dle skutečného provedení - Změnšení šířky vodících čar 4582*(-0,125)=-572,750 m2 1 169,281-572,750= 596,531m2	M2	1.169,281	596,531	-572,750	85,10	99.505,81	-48.741,03	0,00	50.764,79	-48.741,02	-48,98


Rozpis ocenění Změn SO 193 po ZBV 1

Ev. č. a název stavby: II/508 Mirošovice - Mnichovice, obnova protismykových vlastností a rovnosti krytu, provozní staničení 1,503-3,702

Číslo a název SO/PS: SO 193 Stálé dopravní značení

Číslo a název rozpočtu: SO 193 Stálé dopravní značení

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	915221	VODOR DOPRAV ZNAC PLASTEM STRUKTURALNI NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	1.169,281	596,531	-572,750	268,00	313.367,31	-153.497,00	0,00	159.870,31	-153.497,00	-48,98
		2. fáze VDZ: $(4582 \cdot 0,25) + (119 \cdot 0,125) + ((142,5 \cdot 0,125)/2) = 1\,169,281$ [A] ZBV1: Změny dle skutečného provedení - Změnění šířky vodicích čar $4582 \cdot (-0,125) = -572,750$ m2 $1\,169,281 - 572,750 = 596,531$ m2											
13	93808	OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM	M2	12.300,000	12.300,000	0,000	4,90	60.270,00	0,00	0,00	60.270,00	0,00	0,00
		před provedením 2. fáze VDZ											
Celkem								562.403,12	-202.238,03	0,00	350.165,10	-202.238,02	-36,61

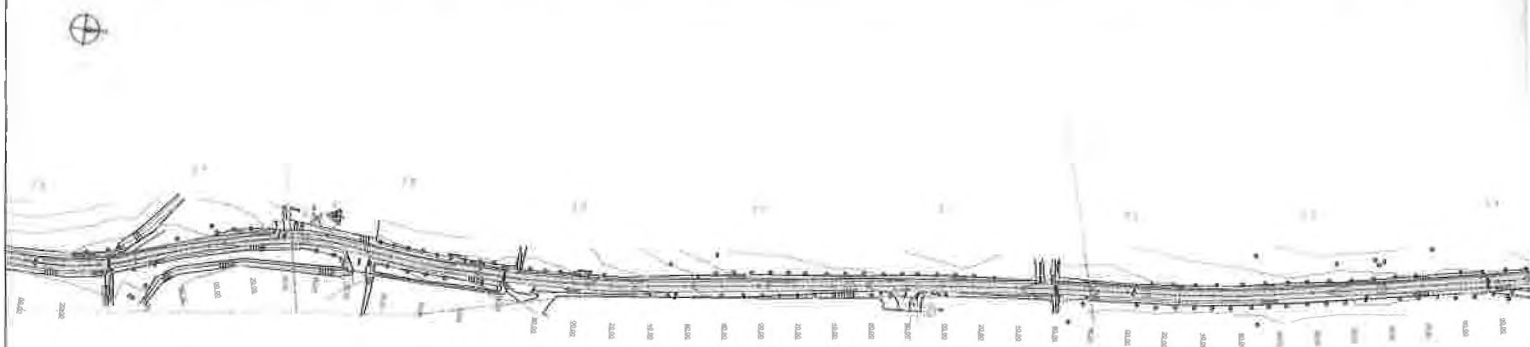

Vesely Tomas

Od: Pribyl Adam
Odesláno: 27. září 2019 12:26
Komu: Vesely Tomas
Předmět: RE: [SUSPICIOUS][EXTERN]FW: II/508 Mirošovice - Mnichovice - úprava DZ a svodidel

Já dík 😊

Adam Přibyl, DiS.

Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Čechy, Provoz Střed
Stavbyvedoucí



PORR a.s.
Kancelář: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10
Sídlo: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

www.porr.cz

Tato elektronická korespondence má pouze informativní povahu a pro PORR a.s. z ní nevznikají žádné právní závazky. K uzavření smlouvy s účastenstvím PORR a.s. může dojít pouze v listinné podobě na základě samostatného dokumentu, přičemž příslušná listina (listiny) musí být vlastnoručně podepsána (podepsány) osobami oprávněnými zastupovat každou ze smluvních stran.

From: Vesely Tomas <[redacted]> :>
Sent: Friday, September 27, 2019 12:26 PM
To: Pribyl Adam <[redacted]> :>
Subject: RE: [SUSPICIOUS][EXTERN]FW: II/508 Mirošovice - Mnichovice - úprava DZ a svodidel

Dík

T.

From: Pribyl Adam
Sent: Friday, September 27, 2019 12:25 PM
To: Vesely Tomas
Subject: FW: [SUSPICIOUS][EXTERN]FW: II/508 Mirošovice - Mnichovice - úprava DZ a svodidel

Adam Přibyl, DiS.

Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Čechy, Provoz Střed
Stavbyvedoucí



PORR a.s.
Kancelář: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10
Sídlo: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

www.porr.cz

Tato elektronická korespondence má pouze informativní povahu a pro PORR a.s. z ní nevznikají žádné právní závazky. K uzavření smlouvy s účastenstvím PORR a.s. může dojít pouze v listinné podobě na základě samostatného dokumentu, přičemž příslušná listina (listiny) musí být vlastnoručně podepsána (podepsány) osobami oprávněnými zastupovat každou ze smluvních stran.

From: KSUS / Petr Holan <_____>
Sent: Friday, September 27, 2019 11:31 AM
To: 'Tomáš Roztočil' <_____>; Pribyl Adam <_____>
Subject: [SUSPICIOUS][EXTERN]FW: II/508 Mirošovice - Mnichovice - úprava DZ a svodidel

Dobrý den,
Posílám doplněné pro použití na ZBV.
Pěkný den přeji
Petr Holan

From: _____ [mailto:_____] }
Sent: Friday, September 27, 2019 10:27 AM
To: KSUS / Petr Holan <_____>
Subject: Re: II/508 Mirošovice - Mnichovice - úprava DZ a svodidel

Dobrý den,

s novou situací souhlasíme. Dále sdělujeme, že v rámci kontrolní prohlídky stavby a bezpečnosti plynulosti silničního provozu bylo dohodnuto, že oproti původnímu stavu se doplní svodidla na silnici II/508. Tento podnět vzešel ze strany P ČR.

por. Ing. Milan Nerad
komisař

ÚZEMNÍ ODBOR PRAHA VENKOV-JIH
Dopravní inspektorát

Masarykovo náměstí 708
251 64 Mnichovice



Pomáhat a chránit

Od: KSUS / Petr Holan <_____>
Odesláno: pátek 27. září 2019 8:04
Komu: NERAD Milan
Kopie: 'Tomáš Roztočil'; 'Pribyl Adam'
Předmět: RE: II/508 Mirošovice - Mnichovice - úprava DZ a svodidel

Dobrý den,
Děkujeme za zaslání vyjádření ke svodidlům.
Kdyby to bylo na hlavičkovém papíře tak asi lepší ale pochopil jsem že jste před dovolenou a s tím jsou spojeny další administrativní kroky , poprosím pokud by bylo možné tento email podepsat formou s logem policie a kontakty, to by mělo pro doložení změn v rámci dokončení stavby být dostačující.
Každopádně děkuji a přeji klidnou dovolenou

Pěkný den
Petr Holan

Petr Holan
Vedoucí TSÚ - oblast Kutná Hora
Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje příspěvková organizace
Zborovská 11. Praha 5

www.ksus.cz

-----Original Message-----

From: Tomáš Roztočil [<mailto:>]]
Sent: Friday, September 27, 2019 7:48 AM
To: Pribyl Adam <
Subject: FW: II/508 Mirošovice - Mnichovice - úprava DZ a svodidel

Dobrý den,
přeposílám e-mail od pana Nerada. Pokud je potřeba více oficiální stanovisko, je nutné to vyřešit ihned, protože pan Nerad má příštích 14 dnů dovolenou.

S pozdravem
Ing. Tomáš Roztočil
hlavní inženýr ateliéru

Atelier PROMIKA s.r.o.
Muchova 9
160 00 Praha 6
Mobil: 732 214 154

Společnost je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001

-----Original Message-----

From:
Sent: Friday, September 27, 2019 7:44 AM
To: Tomáš Roztočil
Subject: Re: II/508 Mirošovice - Mnichovice - úprava DZ a svodidel

Dobrý den,

s novou situací souhlasíme. Dále sdělujeme, že v rámci kontrolní prohlídky stavby a bezpečnosti plynulosti silničního provozu bylo dohodnuto, že oproti původnímu stavu se doplní svodidla na silnici II/508. Tento podnět vzešel ze strany P ČR.

S pozdravem Nerad

Od: Tomáš Roztočil < >
Odesláno: čtvrtek 26. září 2019 16:22
Komu: NERAD Milan
Předmět: FW: II/508 Mirošovice - Mnichovice - úprava DZ a svodidel

Pane inženýre,

podle dohody posílám znovu situace II/508 Mirošovice - Mnichovice. Pro případné upřesnění jsem zítra k dispozici.

Děkuji předem.

S pozdravem

Ing. Tomáš Roztočil
hlavní inženýr ateliéru

Atelier PROMIKA s.r.o.
Muchova 9
160 00 Praha 6

Web: <http://www.promika.cz><<http://www.promika.cz>>
Společnost je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001

[logoAPsamo]

From: Tomáš Roztočil
Sent: Wednesday, September 18, 2019 12:57 PM
To: '
Cc: 'Pribyl Adam';
Subject: II/508 Mirošovice - Mnichovice - úprava DZ a svodidel

Vážený pane inženýre,

posílám k odsouhlasení upravené situace stálého dopravního značení výše uvedené stavby včetně doplněných svodidel.

Děkuji.

S pozdravem

Ing. Tomáš Roztočil
hlavní inženýr ateliéru

Atelier PROMIKA s.r.o.
Muchova 9
160 00 Praha 6

Web: <http://www.promika.cz><<http://www.promika.cz>>
Společnost je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001

[logoAPsamo]



MĚSTSKÝ ÚŘAD V ŘÍČANECH

Masarykovo náměstí 53/40 | 251 01 Říčany

www.ricany.cz

Č.j.: 355204/2019-MURI/OSAD

21.10.2019

Č.ev.: 378682/2019

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Stanovení místní úpravy silničního provozu

Odbor správních agend a dopravy Městského úřadu v Říčanech jako příslušný orgán státní správy ve věcech provozu na pozemních komunikacích dle § 124 odst. 6 zákona č. 361 / 2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu § 77 odst. 1 písm. c), na základě Vašeho požadavku ze dne 3.10.2019, vyjádření Policie ČR DI Praha venkov - JIH ze dne 4.10.2018 č.j. KRPS-287023-1/ČJ-2018-011406

s t a n o v í

místní úpravu silničního provozu na silnici II/508

Dopravní zařízení (svodidla) a Dopravní značení bude provedeno dle zpracování Dopravně inženýrského opatření firmou Atelier PROMIKA s.r.o., Muchova 9/223, 160 00 Praha 6, IČ 260 80 273 z 10/2019 schváleného Policií ČR DI Praha venkov - JIH.

akce: II/508 Mirošovice – Mnichovice, obnova protismykových vlastností a rovnosti krytu – SO 193 stálé dopravní značení
důvod: zajištění bezpečnosti silničního provozu

- dopravní značení a zařízení zajistí žadatel a bude provedeno podle odsouhlasené situace odbornou firmou.
- dopravní značení a zařízení bude instalováno v souladu se zákonem o silničním provozu, vyhláškou č. 294/2015 Sb., v souladu s ČSN EN 12899 – 1 a dle TP 65, dle TP 114 – dopravní svodidla na pozemních komunikacích

Odbor správních agend a dopravy Městského úřadu v Říčanech a Policie ČR Krajské ředitelství Policie Středočeského kraje si vyhrazuje právo toto ustanovení změnit, upravit, doplnit, popřípadě zrušit, pokud si to bude vyžadovat veřejný zájem nebo v případě, že dopravní zařízení bude umístěno v rozporu se stanovenými podmínkami.

Proti tomuto stanovení nejsou přípustné opravné prostředky ve smyslu obecných předpisů o správním řízení.

Jiří Karásek
oprávněná úřední osoba

„otisk úředního razítka“

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

PORR a.s.
Dubečská 3238/36
100 Praha 10
Strašnice

Věc: „II/508 Mirošovice – Mnichovice, obnova protismykových vlastností a rovnosti krytu, provozní staničení km 1,503 - 3,702“

S odvoláním na ust. čl. 6. Práva a povinnosti Objednatele Smlouvy o dílo č. 436/00066001/2019, odst. 6.7. může Objednatel požadovat změnu rozsahu Díla, a to při respektování povinností Objednatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „Zákon o ZVZ“). Zhotovitel je v takovém případě povinen vyhovět požadavku Objednatele a (i) snížit rozsah Díla nebo (ii) bez zbytečného odkladu podat nabídku na zvýšení rozsahu Díla o plnění stejného charakteru jako Dílo sjednané ve smlouvě s tím, že:

- a) při snížení rozsahu se Cena Díla odpovídajícím způsobem sníží,
- b) při zvýšení rozsahu bude Cena Díla v nabídce Zhotovitele stanovena na základě cen uvedených v nabídce v Oceněném soupisu prací,
- c) termín dokončení Díla se ve vhodných případech přiměřeně upraví dohodou smluvních stran,
- d) snížení či zvýšení rozsahu bude upraveno písemným dodatkem Smlouvy, kterým může být i evidenční list změny stavby podepsaný ze strany osob oprávněných jednat za Objednatele a Zhotovitele.

Žádáme o změnu rozsahu díla v souladu s návrhem :

SO 182 – Přejícné dopravní značení:

Zvýšit rozsah ceny díla o:

- Prodloužení DIO o dva měsíce, z důvodu výstavby po polovinách při zachování silničního provozu (odsouhlasený požadavek investorem z uzavírkové komise) – viz. dodatek smlouvy

SO 193 – Stále dopravní značení:

Snížit rozsah ceny díla o:

- VDZ plastu a barvě, z důvodu zmenšení šířky vodících čar z 0,25 m na 0,125 m, požadavek dopravního inspektorátu z místního šetření

SO VON – Vedlejší a ostatní náklady:

Zvýšit rozsah ceny díla o:

- Pomocné práce při regulaci dopravy, fotodokumentaci a provozování zařízení staveniště z důvodu prodloužení doby výstavby o dva měsíce – viz. dodatek smlouvy

Tyto změny rozsahu Díla tedy vznikly z nepředvídatelných důvodů. Změnám nebylo možné v zadávací dokumentaci předejít ani při vynaložení náležitě péče ze strany všech věcně příslušných útvarů odpovědných za zpracování zadávací dokumentace. Položky jsou - podle § 5, odst. 1, písm. c) Směrnice R-Sm-36 (změna č. 2 účinná od 29.5.2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek - zařazeny do Skupiny 3.

V Praze dne:
