

Dodatek č. 2
ke Smlouvě o dílo
ze dne 3.7.2019

číslo sml. objednatele: S-2310/DOP/2019

číslo sml. Dodavatele: 19-STM06

„II/116 Nižbor – Hýskov, bezpečnostní opatření na silnici“

Objednatel

Středočeský kraj

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

zastoupený: Martinem Hermanem, radním pro oblast investic a veřejných zakázek, na základě usnesení Rady Středočeského kraje č. 053-06/2020/RK ze dne 17. 02. 2020

IČO: 70891095 DIČ: CZ70891095

Bankovní spojení: PPF banka, a.s., číslo účtu: 

(dále jen „Objednatel“)

a

Dodavatel

Společnost Nižbor – Hýskov – Starmosty - ROBSTAV

se sídlem: Na čihadle 958/57, Dejvice, 160 00 Praha 6

sestavující ze společností:

vedoucí společník: Starmosty s.r.o.

se sídlem: Na čihadle 958/57, Dejvice, 160 00 Praha 6

IČO: 07122764 DIČ: CZ07122764

zastoupena: Ing. Michalem Tichovským, na základě plné moci

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 295004

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s. číslo účtu 


společník: ROBSTAV k.s.

se sídlem: Mezi vodami 205/29, Modřany, 143 00 Praha 4

IČO: 274 30 774 DIČ: CZ274 30 774

zastoupena: Ing. Radkem Kozákem, jednatelem

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 76014

bankovní spojení: Komerční banka a.s. číslo účtu 

zastoupena vedoucím společníkem, společností Starmosty s.r.o., na základě Smlouvy o společnosti ze dne 3.12.2018, která tvoří Přílohu č. 2 tohoto dodatku

dále jen „**Dodavatel**“

Vzhledem k tomu, že:

- A. Strany uzavřely dne 03. 07. 2019 smlouvu o dílo, spočívající ve stavbě „II/116 Nižbor – Hýskov, bezpečnostní opatření na silnici“, ve znění dodatku č. 1 (dále jen „**Smlouva**“);
- B. Strany si přejí změnit některá ustanovení Smlouvy;

uzavírají strany níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 ke Smlouvě (dále jen „**Dodatek č. 2**“ nebo „**Dodatek**“):

Článek I. Změna ceny díla

1. Při výkopových pracích bylo zjištěno, že rozsah a zatřídění těžené zeminy neodpovídá předpokladům ze zadávací dokumentace stavby. Z důvodu této nepředvídatelné skutečnosti se strany dohodly v dodatku č. 1 Smlouvy na tom, že bude prodloužen termín zprůjezdnění stavby na datum 14. 12. 2019.
2. Z důvodu provedení víceprací souvisejících s nepředvídatelnou skutečností stanovenou v odst. 1 tohoto článku I. došlo ke zvýšení smluvní ceny díla na částku 13.926.006,49 Kč bez DPH. Bližší specifikace víceprací je uvedena ve změnové listu č.1, který tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku.
3. Vícepráce, specifikované v Příloze č. 1 Dodatku, odpovídají změně ceny díla dle odst. 2.8 Smlouvy, ustanovení §222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a Směrnici ředitele Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje upřesňující provádění změn závazků.

4. Cena díla dle SOD:

Cena bez DPH	13 751 109,19 Kč
DPH	2 887 732,93 Kč
Cena včetně DPH	16 638 842,12 Kč

Cena víceprací dle Dodatku č. 2

Cena bez DPH	174 897,30 Kč
DPH	36 728,43 Kč
Cena včetně DPH	211 625,73 Kč

Cena díla dle SOD včetně Dodatku č.2:

Cena bez DPH	13 926 006,49 Kč
--------------	------------------

DPH	2 924 461,36 Kč
Cena včetně DPH	<u>16 850 467,85 Kč</u>

5. S ohledem na výše uvedené se mění Smlouva následovně:

a. Nové znění ceny díla v odst. 3.1:

„3.1 Cena za dílo dle článku I. Smlouvy je sjednána na základě nabídkové ceny dodavatele dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši 13.926.006,49 Kč bez DPH, a to jako cena nevyšší přípustná ve vztahu k Oceněnému výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 8 této Smlouvy. K této ceně za dílo bude dodavatelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále také „zákon o DPH“), DPH ve výši 2.924.461,36 Kč.

Celková cena za dílo včetně DPH činí 16.850.467,85 Kč.“

Změna závazku je předkládána v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 písm. a) a písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a v souladu se Směrnicí ředitele KSÚS upřesňující provádění změn závazku dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. V souladu s § 5 odst. 1 Směrnice se jedná o nepodstatné změny a považují se za změny zařazené do Skupiny č. 3 – Změny z nepředvídatelných důvodů, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu zakázky a hodnota změny nepřevyšuje limit 50% původní hodnoty závazku, pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn této skupiny. Součet sumy Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a 4 stanovené Dodatkem č. 2 činí celkem – 1,27 % závazku a nepřekračuje povolený limit 30 % hodnoty závazku. Absolutní hodnota Změn Skupiny 3 a 4 činí celkem 1,27% závazku a nepřekračuje povolený limit 50 % hodnoty závazku.

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv, které provede Objednatel do 30 dnů od jeho podpisu.
2. Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě je vyhotoven v 5 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží

3 stejnopisy a Dodavatel 2 stejnopisy.

3. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 2 ke Smlouvě řádně přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
4. Uzavření tohoto Dodatku č. 2 bylo schváleno usnesením Rady Středočeského kraje č. 053-06/2020/RK ze dne 17. 02. 2020.
5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku tvoří následující přílohy:

Příloha č. 1: ZBV č. 1

Příloha č. 2: Smlouva o společnosti + Plná moc

V Praze, dne

Dodavatel:
Společnost Nižbor – Hýskov –
Starmosty – ROBSTAV
Zastoupena vedoucím společníkem
Starmosty s.r.o.



Ing. Michal Tichovský
na základě plné moci

V Praze dne 02-03-2020

Objednatel:
Středočeský kraj



Martin Hájman,
radní pro oblast investic a
veřejných zakázek



Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby: II/116 Nižbor - Hýskov, bezpečnostní opatření na silnici Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 01 - Ostatní	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 01 / 1	Číslo ZBV: 1
--	--	------------------------

Objednatel: Středočeský kraj
Zborovská 11, 150 21 Praha 5, Smíchov
IČO: 70891095

Zhotovitel: **Společnost Nižbor – Hýskov – Starmosty - ROBSTAV**
se sídlem Na čihadle 958/57, Dejvice, 160 00 Praha 6

Vedoucí společník: Starmosty s.r.o.
se sídlem Na čihadle 958/57, Dejvice, 160 00 Praha 6
IČO: 07122764

Společník: ROBSTAV k.s.
se sídlem Mezi Vodami 205/29, 143 00 Praha - Modřany
IČO: 27430774

Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.3	0,00	174 897,30	174 897,30

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1	0,00	174 897,30	174 897,30

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: III/116 Nižbor - Hýskov, bezpečnostní opatření na silnici Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 01 - Ostatní	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 01 / 1	Číslo ZBV: 1.3
---	--	--------------------------

Strany smlouvy o dílo objednatel č.: S-2310/DOP/2019 a zhotovitel č.: 19-STM06 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 3.7.2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Středočeský kraj se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: Společnost Nižbor – Hýskov – Starmosty - ROBSTAV se sídlem Na čihadle 958/57, Dejvice, 160 00 Praha 6

Přílohy Změnového listu:		Paré č.	Příjemce
1. Krycí list	1 počet listů	1, 2	Objednatel
2. Změnový list	2 počet listů	3	Zhotovitel
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1 počet listů	4	Projektant
4. Rozpis ocenění Změn položek ZBV 2	1 počet listů	5	Stavební dozor
5. Přehled zařazení změn do skupin	1 počet listů	6	Supervize
6. Přehled dalších dokladů	1 počet listů		
Další doklady dle přehledu dokladů	22 počet listů		

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Prodloužení a rozšíření DIO

Předkládaná změna byla vyvolána jinými podmínkami při realizaci stavby, než bylo uvedeno v Zadávací dokumentaci. Při výkopových pracích byla zastižena jiná třída zeminy (Doklad č.8), než bylo předpokládáno a proto musela být nasazena větší technika, která byla při výkonu práce v kolizi s projíždějícími automobily (Doklad č. 14 - vyjádření BOZP).

Z uvedeného důvodu a na základě požadavku zhotovitele byla od 1.10.2019 úplně uzavřena přílehající komunikace pro dopravu. Dne 27.9.2019 MÚ Beroun vydal rozhodnutí (Doklad č. 9), ve kterém vyhovuje žádosti zhotovitele a povoluje úplnou uzavírku silnice v místě stavby a prodloužení uzavírky do 14.12.2019. V souvislosti s tím vydává MěÚ Opatření obecné povahy ze dne 27.9.2019 (Doklad č.10), kde jsou zobrazeny jednotlivé situace v dotčených křižovatkách a zakresleno doplněné dopravní značení, ze kterého vychází počet dodaných dopravních značek.

Díky celkové uzavírce silnice prováděné práce pokračovaly rychleji a dílo bylo předáno již k 6.12.2019 objednateli.

Změna je vyjádřena rozšířením položky č. 7 o příslušný počet dní prodloužení základního DIO a novými položkami č. 8 - 19. Tato úprava navýšuje smluvní cenu stavby o 174.897,30 CZK.

Výpočet Prodloužení doby DIO:

- základní uzavírka stavby probíhala od 23.7.-31.10.2019 (101 KD)
- povolení úplné uzávěry bylo na období 1.10.- 14.12.2019 (44 KD)
- stavba byla ukončena k 6.12.2019

Z předešlých údajů vyplývá, že úplná uzavírka vozovky probíhala 67 kalendářních dní (1.10. - 6.12. 2019) a výstavba (a tím i základní DIO) bylo prodlouženo o 36 kalendářních dní (1.11. - 6.12.2019). Délka výstavby byla zkrácena o 8 KD.

Změny plynoucí z přetřídění zeminy nebude zhotovitel nárokovat a cena nebude navýšena již žádným dalším ZBV.

Výše popsané změny byly nepředvídatelné, zjištěné při realizaci. Změny jsou podle § 5, odst. 1, písmeno c) resp. § 10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29.5.2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazené do **Skupiny 3**.

Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6 je změnou nepředvídanou.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
0,00	174 897,30	174 897,30	174 897,30

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí): Starmosty s.r.o.	jméno	Tomáš Cseri	datum	podpis
Projektant (autorský dozor): Ing. Jiří Sobol	jméno	Ing. Jiří Sobol	datum	podpis
Stavební dozor: Sdružení SGS - IBH TDI	jméno	Ing. Miroslav Bureš	datum	podpis
Supervize (Regionální dotační kancelář)	jméno	Ing. Václav Chytil	datum	podpis
Zástupce Objednatele: KSÚS SK	jméno	Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, doloženy a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Martin Herman	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	Ing. Michal Tichovský	datum	podpis
				Číslo p...

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 1**

Název Stavby:	II/116 Nižbor - Hýskov, bezpečnostní opatření na silnici
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	01 / 1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	SO 01 - Ostatní

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
538 383,62

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	538 383,62	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	174 897,30	174 897,30	32,49%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	0,00	713 280,92	174 897,30	32,49%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

Starmosty s.r.o.

souhlasím

Tomáš Cseri



Projektant (autorský dozor):

Ing. Jíří Sobol

souhlasím

Ing. Jíří Sobol



Stavební dozor:

Sdružení SGS - IBH TDI

souhlasím

Ing. Miroslav Bureš



Zástupce Objednatelů:

KSÚS SK

souhlasím

Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA



Supervize (RDK)

souhlasím

Ing. Václav Chytil



Zaměstnanec SK

odpovědný za cenové
projednání Změny:

souhlasím

Ing. Jan Fidler



Rozpis ocenění Změn položek - celkem													
Evidenční číslo a název stavby: II/116 Nižbor - Hýskov, bezpečnostní opatření na silnici Číslo a název SO/PS: SO 01 - Ostatní Číslo a název rozpočtu: SO 01 - Ostatní								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								SO 01/1					
								Skupina změn 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady											
7	04900200x	DIO, DIR	---	1,000	1,356	0,356	254 722,76	254 722,76	0,00	90 681,30	345 404,06	90 681,30	35,60%
		Nové položky - JC dle OTSKP 2019											
8	914122	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM IS11 13ks; IP10 3ks; B4 3ks, E 18ks	KUS	0,000	37,000	37,000	272,00	0,00	0,00	10 064,00	10 064,00	10 064,00	100,00%
9	914123	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	0,000	37,000	37,000	159,00	0,00	0,00	5 883,00	5 883,00	5 883,00	100,00%
10	914129	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ	KSDEN	0,000	2 479,000	2 479,000	7,00	0,00	0,00	17 353,00	17 353,00	17 353,00	100,00%
11	914412	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM IP22 11ks	KUS	0,000	11,000	11,000	616,00	0,00	0,00	6 776,00	6 776,00	6 776,00	100,00%
12	914413	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - DEMONTÁŽ	KUS	0,000	11,000	11,000	316,00	0,00	0,00	3 476,00	3 476,00	3 476,00	100,00%
13	914419	DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL - NÁJEMNÉ	KSDEN	0,000	737,000	737,000	22,00	0,00	0,00	16 214,00	16 214,00	16 214,00	100,00%
14	914952	SLOUPKY A STOJKY DZ Z JÁKL PROF PRO OCEL STOJAN MONT S PŘESUN	KUS	0,000	30,000	30,000	222,00	0,00	0,00	6 660,00	6 660,00	6 660,00	100,00%
15	914953	SLOUPKY A STOJKY DZ Z JÁKL PROFILŮ PRO OCEL STOJAN DEMONTÁŽ	KUS	0,000	30,000	30,000	155,00	0,00	0,00	4 650,00	4 650,00	4 650,00	100,00%
16	914959	SLOUP A STOJKY DZ Z JÁKL PRO OCEL STOJAN NÁJEMNÉ	KSDEN	0,000	2 010,000	2 010,000	4,00	0,00	0,00	8 040,00	8 040,00	8 040,00	100,00%
17	916712	UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	0,000	30,000	30,000	113,00	0,00	0,00	3 390,00	3 390,00	3 390,00	100,00%
18	916713	UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - DEMONTÁŽ	KUS	0,000	30,000	30,000	57,00	0,00	0,00	1 710,00	1 710,00	1 710,00	100,00%
Celkem								254 722,76	0,00	174 897,30	429 620,06	174 897,30	

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Tomáš Cseri, stavbyvedoucí

Za Objednatele: Ing. Miroslav Bureš, TDI

Datum:

Datum:

Podpis:



Podpis:



PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: II/116 Nižbor - Hýskov, bezpečnostní opatření na silnici

1	Přijaté smluvní částka bez rezervy a DPH	13 751 109,19
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	13 926 006,49
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	16 680 467,86
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	101,27%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(26/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%
40=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, odst. (6), písm. b)	0,00%

		174 897,30
$7=6/1*100$	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	1,37%
$8=1*0,3$	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	4 126 332,76

$9=(32A/1)*100$	Sledování limitu 80 % Skupina 3	1,27%
$10=(36A/1)*100$	Sledování limitu 60 % Skupina 4	0,00%
$10A=32A+36A$	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	174 897,30
$11=1*0,5$	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	6 875 564,60

$12=38B$	Limit 16 %	2 062 666,38
$13=ABS(37)+38$	Sledování limitu	0,00%
$14=149224000-37$	Hodnota skupiny 5	0,00

SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	- 1 - Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)			- 2 - Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)			- 3 - Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)			- 4 - Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)				- 5 - Změny da mřížka Změny neměnní celkovou povahou veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)				
						Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Limit 16 %	
18	17	18	18=23+26+29+33	20=24+27+30+34+37+39	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	32=29+30	32A=ABS(29)+30	33	34	36=33+34	36A=ABS(33)+34	37	38	39=(ABS(37)+38)/1	
		II/116 Nižbor - Hýskov, bezpečnostní opatření na silnici	0,00	174 897,30	174 897,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 897,30	174 897,30	174 897,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
01	1	Ostatní	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	1
Název a evidenční číslo stavby:	II/116 Nižbor - Hýskov, bezpečnostní opatření na silnici
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 01 - Ostatní
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	SO 01 / 1

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
07 Soupis prací SO po změnách	2	
08 Zpráva Geo Tec s foto přílohou	2	
09 Rozhodnutí MÚ Beroun	4	
10 Opatření obecné povahy	10	
11 Vyjádření objednatele	1	
12 Vyjádření AD	1	
13 Vyjádření TDI	1	
14 Vyjádření koordinátora BOZP	1	
Počet listů celkem	22	

Rozpis ocenění Změn položek - celkem													
Evidenční číslo a název stavby: II/116 Nižbor - Hýskov, bezpečnostní opatření na silnici								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: SO 01 - Ostatní								SO 01					
Číslo a název rozpočtu: SO 01 - Ostatní								celkem					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady											
	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce						248 568,79	0,00	0,00	248 568,79	0,00	
1	010001000	Průzkumné, geodetické a projektové práce	---	1,000	1,000	0,000	2 924,34	2 924,34	0,00	0,00	2 924,34	0,00	0,00%
2	012002000	Geodetické práce	---	1,000	1,000	0,000	70 184,13	70 184,13	0,00	0,00	70 184,13	0,00	0,00%
3	013002000	Projektové práce	---	1,000	1,000	0,000	175 460,32	175 460,32	0,00	0,00	175 460,32	0,00	0,00%
	VRN2	Průzkumné, geodetické a projektové práce						5 848,68	0,00	0,00	5 848,68	0,00	
4	030001000	Zařízení staveniště	---	1,000	1,000	0,000	5 848,68	5 848,68	0,00	0,00	5 848,68	0,00	0,00%
	VRN2	Průzkumné, geodetické a projektové práce						283 966,15	0,00	90 681,30	374 647,45	90 681,30	
5	043002000	Zkoušky a ostatní měření	---	1,000	1,000	0,000	5 848,68	5 848,68	0,00	0,00	5 848,68	0,00	0,00%
6	049002000	Ostatní inženýrská činnost	---	1,000	1,000	0,000	23 394,71	23 394,71	0,00	0,00	23 394,71	0,00	0,00%
7	04900200x	DIO, DIR základní DIO - 101 KD, rozšíření 67 KD základní uzavírka od 23.7.-31.10.2019; rozšíření 1.10.-6.12.2019 výměra DIO: základní rozsah - 101 KD prodloužení - 36 KD výpočet poměru prodloužení: 36/101 = 0.356	---	1,000	1,356	0,356	254 722,76	254 722,76	0,00	90 681,30	345 404,06	90 681,30	35,60%
		Nové položky - JC dle OTSKP 2019						0,00	0,00	84 216,00	84 216,00	84 216,00	
8	914122	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM IS11 13ks; IP10 3ks; B4 3ks, E 18ks počet značek odečten z aktualizované situace DIO - (doklad č. 10)	KUS	0,000	37,000	37,000	272,00	0,00	0,00	10 064,00	10 064,00	10 064,00	100,00%
9	914123	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	0,000	37,000	37,000	159,00	0,00	0,00	5 883,00	5 883,00	5 883,00	100,00%
10	914129	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - NAJEMNÉ nájemné: 37*67=2479 ksden rozšířené DIO dle rozhodnutí (doklad č. 9) od 1.10. do 6.12.2019 (předání stavby), tj. 67 KD	KSDEN	0,000	2 479,000	2 479,000	7,00	0,00	0,00	17 353,00	17 353,00	17 353,00	100,00%
11	914412	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM IP22 11ks výpočet z aktualizované situace DIO - (doklad č. 10)	KUS	0,000	11,000	11,000	616,00	0,00	0,00	6 776,00	6 776,00	6 776,00	100,00%
12	914413	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - DEMONTÁŽ	KUS	0,000	11,000	11,000	316,00	0,00	0,00	3 476,00	3 476,00	3 476,00	100,00%
13	914419	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - NAJEMNÉ nájemné: 11*67=737 ksden rozšířené DIO dle rozhodnutí (doklad č. 9) od 1.10. do 6.12.2019 (předání stavby), tj. 67 KD	KSDEN	0,000	737,000	737,000	22,00	0,00	0,00	16 214,00	16 214,00	16 214,00	100,00%
14	914952	SLOUPKY A STOJKY DZ Z JÁKL PROF PRO OCEL STOJAN MONT S PŘESUN počet 30ks výpočet z aktualizované situace DIO - (doklad č. 10)	KUS	0,000	30,000	30,000	222,00	0,00	0,00	6 660,00	6 660,00	6 660,00	100,00%
15	914953	SLOUPKY A STOJKY DZ Z JÁKL PROFILŮ PRO OCEL STOJAN DEMONTÁŽ	KUS	0,000	30,000	30,000	155,00	0,00	0,00	4 650,00	4 650,00	4 650,00	100,00%
16	914959	SLOUP A STOJKY DZ Z JÁKL PRO OCEL STOJAN NAJEMNÉ nájemné: 30*67=2010 ksden rozšířené DIO dle rozhodnutí (doklad č. 9) od 1.10. do 6.12.2019 (předání stavby), tj. 67 KD	KSDEN	0,000	2 010,000	2 010,000	4,00	0,00	0,00	8 040,00	8 040,00	8 040,00	100,00%
17	916712	UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	0,000	30,000	30,000	113,00	0,00	0,00	3 390,00	3 390,00	3 390,00	100,00%

Rozpis ocenění Změn položek - celkem													
Evidenční číslo a název stavby: II/116 Nižbor - Hýskov, bezpečnostní opatření na silnici Číslo a název SO/PS: SO 01 - Ostatní Číslo a název rozpočtu: SO 01 - Ostatní								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								SO 01					
								celkem					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18	916713	UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - DEMONTÁŽ	KUS	0,000	30,000	30,000	57,00	0,00	0,00	1 710,00	1 710,00	1 710,00	100,00%
Celkem								538 383,62	0,00	174 897,30	713 280,92	174 897,30	32,49%

GeoTec-GS, a.s.
Chmelová 2920/6
106 00 Praha 10

Starmosty s.r.o.

Mezi vodami 205/29
143 00 Praha – Modřany

Váš dopis značky / ze dne

naše značka
19/1389/SM

vyřizuje / telefon
Ing.S.Mikunda / 603 461 543

dne:
1.11.2019

Věc : stavba „II/116 Nižbor-Hýskov, Bezpečnostní opatření na silnici“

Číslo zakázky zhotovitele : 2019-404

Na základě Vašeho vyzvání, byla v místě uvedené stavby provedena prohlídka zemních prací, při přestavbě původní opěrné zdi, která se nachází mezi silnicí II/116 v úseku Nižbor - Hýskov a řekou Berounka. Účelem prohlídky bylo zhodnocení tříd těžitelností zemin a hornin, zastižených při stavbě.

V místě stavby byly po odstranění vozovky, jejich konstrukčních vrstev, a dále stávající konstrukce zdi, zastiženy ve sledovaných úsecích ve staničení 401 - 459, v podloží komunikace a za rubem zdi do úrovně základové spáry, prokřemenělé prachovité břidlice (proterozoikum), pevnostní třídy R3-R2. Horniny jsou po rozpojení rozpadavé na fragmenty velikosti 5 - 30 cm, s velkou až střední hustotou diskontinuit. Fragmenty hornin lze kladivem jen pouze velice těžce rozbít. Horninu při odtěžování lze rozpojovat pouze hydraulickým kladivem.

Na základě výše uvedeného, lze zastižené horniny (mimo konstrukci komunikace a opěrné zdi) zařadit dle ČSN 73 3050 / ČSN 73 6133 do 6./III. třídy těžitelnosti.

V příloze dopisu uvádíme fotodokumentaci z průběhu prováděných prací.

Zpracoval: Ing. Stanislav Mikunda



Přílohy: dle textu - fotodokumentace (1x A4)

S přátelským pozdravem



Mgr. Filip Dudík
ředitel společnosti

GeoTec-GS, a.s.

Chmelová 2920/6, 106 00 Praha 10
IČ: 25103431 DIČ: CZ25103431

(15)

Příloha dopisu č. 19/1389/SM

Fotodokumentace:



Městský úřad Beroun
Odbor dopravy a správních agendDatum:
27.9.2019Číslo jednací:
MBE/66286/2019/DOPR-KuKSpisová značka:
10064/2019/DOPRVyřizuje / telefon:
Karel Kubáň/ 311654324

E-mail:

**ROZHODNUTÍ**

Městský úřad Beroun, odbor dopravy a správních agend, jako silniční správní úřad obce s rozšířenou působností podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) příslušný rozhodovat ve věcech silnic II. a III. třídy a veřejně přístupných účelových komunikací s výjimkou věcí, o kterých rozhoduje Ministerstvo dopravy nebo krajský úřad, **vyhovuje žádosti Starmosty s.r.o.**, Na Čihadle 958/57, 160 00 Praha 6, IČ: 07122764, v zastoupení ADSUM spol. s r.o., Havlíčkova 923, 273 51 Unhošť, IČ: 45144991 (dále jen žadatel), ze dne 25.9.2019, o povolení zvláštního užívání, částečné a úplné uzavírky silnice II/116, v k.ú. Hýskov, Stradonice u Nižboru a Nižbor a nařízení objížďky z důvodu bezpečnostního opatření při stavbě „rekonstrukce opěrné zdi II/116 Nižbor – Hýskov“ a

povoluje

- I. Podle § 25 odst. 6 písm. c bod 2 a 3) zákona o pozemních komunikacích a § 40 vyhlášky č. 104/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se zákon o pozemních komunikacích provádí, (dále jen „prováděcí vyhláška“), zvláštní užívání silnice II/116, v k.ú. Hýskov, Stradonice u Nižboru a Nižbor v km. staničení 17,580 – 19,280, z důvodu záboru silnice pro techniku při stavbě „rekonstrukce opěrné zdi II/116 Nižbor – Hýskov“.
- II. Podle § 24 zákona o pozemních komunikacích a § 39 prováděcí vyhlášky povoluje částečnou uzavírku jednoho jízdního pruhu silnice II/116.
- III. Podle § 24 zákona o pozemních komunikacích a § 39 prováděcí vyhlášky v uvedeném úseku silnice povoluje její úplnou uzavírku a nařizuje objížďku po silnicích III/1163, III/2011, III/1164, III/10134 a II/118 za těchto podmínek:
 1. Odpovědný pracovník : Tomáš Cseri, stavbyvedoucí, tel. 724804846.
 2. Místo zvláštního užívání a uzavírek silnice II/116 je mezi obcemi Hýskov a Nižbor v km. staničení 17,580 – 19,280 a je zakresleno v mapě s názvem schématický plánec DO – celková situace, vypracovanou ADSUM spol. s r.o., která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.
 3. **Zvláštní užívání a uzavírky budou realizovány v době od 1.10.2019 do 14.12.2019.**
 4. **Úplná uzavírka silnice II/116 v km. staničení 17,580 – 19,280 bude v době od 1.10.2019 do 14.12.2019, pondělí – neděle, v době od 08:00 do 18:00 hodin.**
 5. **Částečná uzavírka silnice II/116 v km. staničení 18,740 – 18,930, bude v době od 1.10.2019 do 14.12.2019, pondělí - neděle, v době od 18:00 do 08.00 hodin.**
 6. Objízdná trasa pro vozidla do 12 t byla nařízena z obce Nižbor po silnici III/1163 do křižovatky se silnicí III/2011, dále po této silnici do křižovatky se silnicí III/20110, dále vpravo po této silnici do křižovatky se silnicí III/1164 v obci Chyňava, dále vlevo po této silnici do křižovatky se silnicí III/10134, dále po této silnici do křižovatky se silnicí II/118 a dále vpravo po této

silnici do Berouna. Objízdná trasa je obousměrná.

7. Objízdná trasa pro vozidla do 3,5 t byla nařízena z obce Nižbor po silnici III/1163 do křižovatky se silnicí III/2011, dále po této silnici do křižovatky se silnicí III/20110, dále vpravo po této silnici do křižovatky se silnicí III/1164 v obci Chyňava, dále vpravo po této silnici do obce Hýskov do křižovatky se silnicí II/116. Objízdná trasa je obousměrná.
8. Při částečné uzavírce zůstane průjezdní profil silnice v minimální šířce 3,00 m a provoz zde bude řízen přenosnou světelnou signalizací.
9. Autobusová doprava podle sdělení ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o.: Na základě jednání ze dne 12.9.2019 budou provedeny úpravy JŘ s omezením obslužnosti Nižboru. Nové jízdní řády budou platit od 1.10. 2019 po dobu úplné uzavírky silnice II/116 v úseku Hýskov Nižbor v čase 8-18 hodin.

Průjezd spojů v pracovní den:

- směr Žloutkovice – 13:07, 14:07, 15:07, 15:57, 16:57, 17:57
- směr Beroun – 8:20, 13:34, 14:34, 15:34, 16:20

Průjezd spojů o víkendech:

- směr Žloutkovice – 8:01, 15:48, 17:48
- směr Beroun – 8:25, 16:04

Pro spoje, které nepojedou do Nižboru, bude zastávka Hýskov, u hřbitova přemístěna na parkoviště naproti hřbitovu.

10. Dopravní opatření : dopravní značení bude v souladu se schváleným stanovením přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, vydaným Městským úřadem Beroun, odborem dopravy a správních agend dne 27.9.2019 pod č.j.: MBE/66287/2019/DOPR-MiJ, podle předloženého DIO odsouhlasené souhlasným závazným stanoviskem Policie ČR, DI Beroun, vydaným dne 27.9.2019 pod č.j.KRPS-256307-1/ČJ-2019-010206.
11. Při stavbě nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti chodců ani silničního provozu materiálem nebo stavebními stroji, nebo k znečišťování silnice a přilehlých komunikací.
12. Při zvláštním užívání silnice bude postupováno tak, aby nedošlo k poškození této silnice, jejích součástí a příslušenství. V případě způsobení škody na silničním majetku bude tato škoda odstraněna na náklady zhotovitele.
13. Při ukončení stavby vyzve žadatel zhotovitel pracovníka KSUS k převzetí silnice II/116 v místě zvláštního užívání.

Účastníci řízení :

- Krajská správa a údržba silnic Stř. kraje, p. o., Zborovská 11, 150 21 Praha 5, IČ: 00066001.
- Starmosty s.r.o., Na Čihadle 958/57, 160 00 Praha 6, IČ: 07122764.
- Obec Hýskov, Na Břasích 208, 267 06 Hýskov, 00233307.
- Obec Nižbor, Nižbor 26, 267 05 Nižbor, IČ: 00233641.
- Obec Chyňava, Chyňava 39, 267 07 Chyňava, IČ: 00233358.
- Město Beroun, v zastoupení Městský úřad Beroun, odbor dopravy a správních agend, Politických vězňů 20, 266 43 Beroun, IČ: 00233129.

Odůvodnění

Dne 20.6.2019 podal žadatel na Městský úřad Beroun, odbor dopravy a správních agend, žádost o povolení zvláštního užívání a částečnou uzavírku jednoho jízdního pruhu silnice II/116 v k.ú. Stradonice u Nižboru, v délce cca 190 m, s tím, že šířka průjezdního profilu silnice zůstane nejméně 3,00 m, a provoz bude řízen přenosnou světelnou signalizací v době od 23.7.2019 do 31.10.2019.

Spolu se žádostí žadatel doložil DIO odsouhlasené Policií ČR, DI Beroun, pod č.j.:KRPS-171036-1/ČJ-2019-010206, kopii výpisu z obchodního rejstříku na obchodní firmu Starmosty s r.o. a přehlednou situaci místa záboru. Dodatečně pak dokládal plnou moc, souhlas KSÚS s termínem uzavírky ze dne 8.7.2019 a harmonogram prací. Správní orgán si do spisu opatřil stavební povolení vydané Městským úřadem Beroun, odborem dopravy a správních agend dne 2.5.2018, pod č.j.: MBE/30858/2018/DOPR-SoK.

Dne 25.9.2019 podal žadatel ve výše uvedené věci žádost o vydání nového rozhodnutí o povolení zvláštního užívání, částečnou a úplnou uzavírku a nařízení objížďky pro vozidla do 12 t a do 3,5 t, z důvodu změny technologických podmínek a následné potřeby nasazení těžké techniky, která bude při práci na rekonstrukci opěrné zdi umístěna na silnici, kde bude zasahovat do obou jízdních pruhů a z důvodu bezpečnosti je nezbytně třeba provést úplnou uzavírku silnice II/116 v době od 1.10.2019 do 14.12.2019, od pondělí do pátku, vždy od 08:00 do 18:00 hodin. (Podrobněji uvedeno ve výroku rozhodnutí.)

K žádosti žadatel doložil DIO, zprávu od GeoTec GS, a.s. Chmelová 2920/6, 106 00 Praha 10, IČ: 25103431, o provedení prohlídky prováděných zemních prací a zhodnocení tříd těžitelnosti těžných zemín a hornin v místě stavby a dne 27.9.2019 doložil listinu s názvem Zdůvodnění žádosti o prodloužení termínu a změny DIO na akci „II/116 Nižbor – Hýskov, bezpečnostní opatření na silnici“, vydanou 27.9.2019 jednatelem společnosti Starmosty s.r.o. a souhlasné závazné stanovisko Policie ČR, DI Beroun, vydané dne 27.9.2019 pod č.j.KRPS-256307-1/ČJ-2019-010206.

Okolnosti zvláštního užívání, uzavírek a objížďek byly projednány dne 12.9.2019 na jednání svolaném ASUM spol. s r.o. s kterým všichni přítomni souhlasili.

Po vyhodnocení žádosti, doložených podkladů a schválení Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, Městským úřadem Beroun, odborem dopravy a správních agend, ze dne 27.9.2019 pod č.j.: MBE/66287/2019/DOPR-MiJ bylo rozhodnuto jak je ve výroku rozhodnutí uvedeno, tedy vydání nového rozhodnutí, neboť postup podle § 25 odst. 4) zákona o pozemních komunikacích by nebyl v souladu se zásadou rychlosti a procesní ekonomie. (§ 6 odst. 1,2 správního řádu).

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15-ti dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, podáním u Městského úřadu Beroun, odboru dopravy a správních agend, Politických vězňů 20, 266 43 Beroun. Odvolání proti rozhodnutí o uzavírce a objížďce **nemá** podle § 24 odst. 4) zákona o pozemních komunikacích odkladný účinek.

Za správnost vyhotovení:
Iveta Brůnová

otisk úředního razítka

Mgr. Miroslav Jerling v.r.
vedoucí odboru dopravy
a správních agend

Správní poplatek byl vyměřen podle zákona č. 634/2004 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 500 Kč na dobu 6 měsíců a byl zaplacen převodem na účet Městského úřadu Beroun dne 1.7.2019, variabilní symbol č. 9031006916.

Obdrží : účastníci řízení :

- Krajská správa a údržba silnic Stř. kraje, p. o., Zborovská 11, 150 21 Praha 5, IČ: 00066001.
- Starmosty s.r.o., Na Čihadle 958/57, 160 00 Praha 6, IČ: 07122764, v zastoupení ADSUM spol. s r.o., Havlíčkova 923, 273 51 Unhošť, IČ: 45144991.

Čj.: MBE/66286/2019/DOPR-KuK

- Obec Hýskov, Na Břasích 208, 267 06 Hýskov, 00233307.
- Obec Nižbor, Nižbor 26, 267 05 Nižbor, IČ: 00233641.
- Obec Chyňava, Chyňava 39, 267 07 Chyňava, IČ: 00233358.
- Město Beroun, v zastoupení Městský úřad Beroun, odbor dopravy a správních agend, Politických vězňů 20, 266 43 Beroun, IČ: 00233129.

Dotčené orgány:


- Policie ČR, DI Beroun, Tyršova 1635, 266 50 Beroun - Město, IČ: 75151481.
- Krajský úřad Středočeského kraje, odbor dopravy, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, IČ: 70891095.

Na vědomí :

- Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Beroun, Pod studánkou 1258, 266 01 Beroun 2, IČ: 70885371.
- JESSENIA a.s., Okružová 1135/44, 155 00 Praha 5, IČ: 26752051, dispečink dopravní zdravotní služby, Profesora Veselého 493, 266 01 Beroun 3.
- Územní středisko záchranné služby Středočeského kraje, Vančurova 1544, 272 01 Kladno, IČ: 75030926, stanoviště Beroun, Profesora Veselého 641, 266 56 Beroun.
- ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o., Pod Hájem 97, 267 01 Králův Dvůr, IČ: 25620886.

Schematický plánec DO - celková situace

Uzavírky silnic II/116 „Maté Kyšice“ a II/116 „Hýskov - Nižbor“

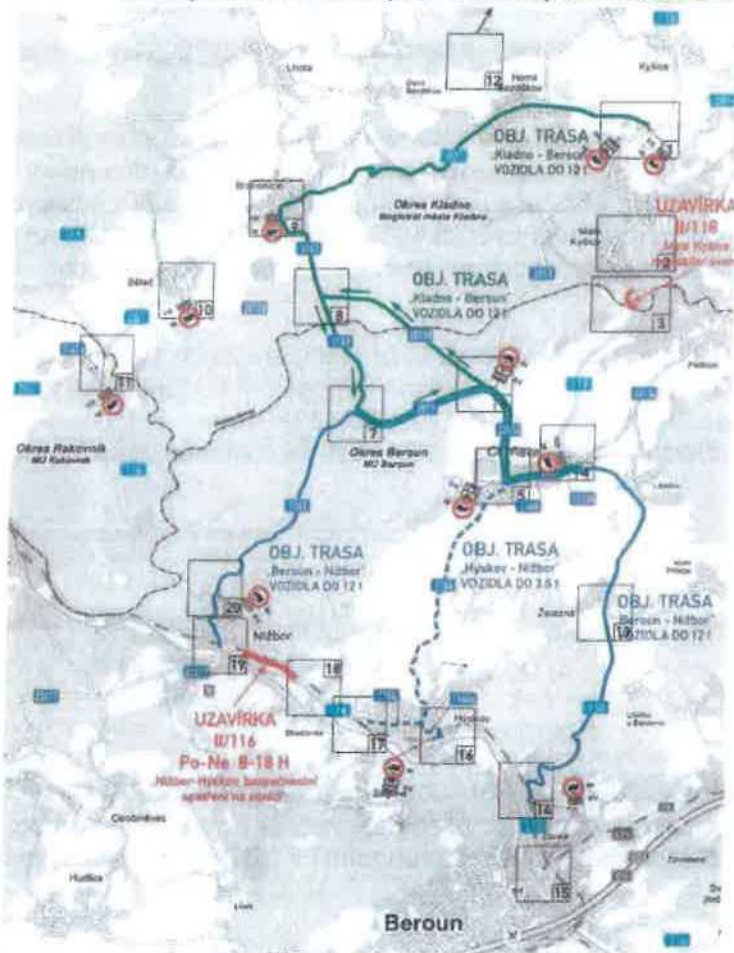

Městský úřad Beroun

Odbor dopravy a správních agend

Datum:
27.9.2019Číslo jednací:
MBE/66287/2019/DOPR-MijSpisová značka:
14808/2019/DOPRVyřizuje / telefon:
Miláček

E-mail:

**VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACI**

Městský úřad Beroun, odbor dopravy a správních agend, jako příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“), na základě žádosti společnosti Starmosty s.r.o., sídlem Na čihadle 958/57, 160 00 Praha 6 - Dejvice, IČ: 07122764 zastoupené na základě plné moci společností ADSUM spol. s.r.o., Lidická 7, 273 51 Unhošť, IČ: 45144991 a po písemném vyjádření příslušného orgánu policie, tj. Policie ČR, Krajského ředitelství Policie Středočeského kraje, územního odboru Beroun, dopravního inspektorátu, pod č.j.: KRPS-256307-1/ČJ-2019-010206

s t a n o v u j e

podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o provozu na pozemních komunikacích opatřením obecné povahy podle § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)

PŘECHODNOU ÚPRAVU PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

z důvodu stavebních prací – rekonstrukce opěrné zdi na silnici II/116 km 18,740 – 18,930 (mezi obcemi Hýskov a Nižbor), v úseku dle grafického znázornění (str. 4) a dále v souvislosti s objízdnou trasou při uzavírci silnice II/118 na území okresu Kladno. Dopravní značení bude upraveno dle předloženého dopravně inženýrského opatření (dále jen DIO), které je součástí tohoto stanovení (str. 4-10).

Toto stanovení přechodné úpravy provozu je s ohledem na místní příslušnost odboru dopravy a správních agend MěÚ Beroun platné pouze na pozemních komunikacích ve správním obvodu SSÚ – ORP Beroun. Stanovení k objízdné trase související s uzavírkou silnice II/118 je platné pouze po dobu uzavření silnice II/116 a po ukončení uzavírky silnice II/116 musí být realizováno odpovídající dopravní značení pro uzavírku silnice II/118, včetně nového stanovení přechodné úpravy provozu.

Komunikace: silnice II/116 mezi obcemi Hýskov – Nižbor v úseku dle DIO

Termín: od 1.10.2019 do 14.12.2019

Podmínky realizace:

V době od 18:00 do 08:00 hodin na silnici II/116 zůstane vždy průjezdný jeden jízdní pruh o šířce min. 3,0m. Délka pracovního místa nepřesáhne 250m. Provoz bude řízen světelným signalizačním zařízením. V době od 8:00 do 18:00 hodin bude silnice II/116 v místě rekonstrukce uzavřena a umožněn pouze průjezd vozidel dle DIO.

Pracovní místa budou zabezpečena před pádem do výkopů zábradlím, plotem nebo svodidlem (viz. čl. 4.5 Ochranná zařízení TP 66)

Podmínky pro provedení přechodné úpravy:

1. Provedení a umístění přechodného dopravního značení, včetně světelných signalizačních zařízení (dále jen SSZ) musí být v souladu s vyhl. č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, v souladu s TP 66 – Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích a normou ČSN EN 12899-1 Stále svíslé dopravní značení. Veškeré svíslé dopravní značky budou základní velikosti podle TP 66 a musí být provedeny jako retroreflexní. Všechny součásti dopravních značek a SSZ (podkladní desky, sloupky, značky, uchycení, kotvící prvky apod.) musí být schváleného typu. SSZ bude osazeno v souladu s čl. 3.6 Světelné signalizační zařízení TP 66.
2. Realizace přechodné úpravy provozu je podmíněna existencí pravomocného rozhodnutí ve věci povolení zvláštního užívání (příp. uzavírky) silnice (místní komunikace) a termín provedení přechodné úpravy bude v souladu s tímto rozhodnutím.
3. Žadatel zajistí pravidelnou kontrolu a údržbu dopravního značení a SSZ.
4. Osazení dopravního značení a SSZ zajistí žadatel. Osazení, kontrolu, údržbu i případné doplnění a změny dopravního značení a SSZ v průběhu uzavírky hradí žadatel. Realizace dopravních opatření může být provedena pouze odbornou firmou. Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu může správní orgán stanovit další doplnění dopravního značení a SSZ, případně stanovené dopravní značení změnit.
5. Trvalé dopravní značení, které je v rozporu s přechodným dopravním značením bude překryto a po ukončení akce uvedeno do původního stavu.

O d ů v o d n ě n í :

Městský úřad Beroun, odbor dopravy a správních agend, stanovil na základě žádosti společnosti Starmosty s.r.o., sídlem Na čihadle 958/57, 160 00 Praha 6 - Dejvice, IČ: 07122764 zastoupené na základě plné moci společností ADSUM spol. s.r.o., Lidická 7, 273 51 Unhošť, IČ: 45144991 přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích z důvodu stavebních prací – rekonstrukce opěrné zdi na silnici II/116 km 18,740 – 18,930 (mezi obcemi Hýskov a Nižbor), v úseku dle grafického znázornění (str. 3) a dále v souvislosti s objízdou trasou při uzavírce silnice II/118 na území okresu Kladno. Dopravní značení bude upraveno dle předloženého dopravně inženýrského opatření (dále jen DIO), které je součástí tohoto stanovení (str. 4-).

Přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích, stanovil obecní úřad s rozšířenou působností po předchozím písemném vyjádření policie, v tomto případě Policie ČR, Krajského ředitelství Policie Středočeského kraje, územního odboru Beroun, dopravního inspektorátu, Tyršova 1635, 266 50 Beroun, která dala k tomuto stanovení přechodné úpravy kladné vyjádření dne 27.9.2019 pod č.j.: KRPS-256307-1/ČJ-2019-010206.

Poučení: Toto stanovení se vydává formou opatření obecné povahy, které se oznamuje veřejnou vyhláškou. Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky. Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek (§ 173 odst. 2 správního řádu)

otisk
úředního razítka

Mgr. Miroslav Jerling, v.r.
vedoucí odboru dopravy a správních agend

Za správnost vyhotovení: Iveta Brůnová

Toto opatření obecné povahy (č.j. MBE/66287/2019/DOPR-MiJ) musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Beroun, Obecního úřadu Chyňava, Obecního úřadu Železná, Obecního úřadu Hýskov a Obecního úřadu Nižbor..

Vývěsní lhůta začíná den následující po dni vyvěšení. Sejmутí vyhlášky je možno následující pracovní den po posledním (patnáctém) dni vývěsní lhůty. Po uplynutí lhůty vyznačení údajů musí být vyhláška neprodleně vrácena zpět odboru dopravy a správních agend. Zároveň žádáme o zveřejnění písemnosti způsobem umožňujícím dálkový přístup a o potvrzení této skutečnosti!

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmутí rozhodnutí.

Obdrží:

Dotčené orgány státní správy (datovou schránkou):

- **Policie ČR**, Krajské ředitelství Policie Středočeského kraje, dopravní inspektorát, Tyršova 1635, 266 01 Beroun

Ostatní:

- **Městský úřad Beroun**, kancelář tajemníka, podatelna MěÚ Beroun, Husovo náměstí 68, 266 01 Beroun (pro zveřejnění na úřední desce na dobu nejméně 15 dnů – podle § 172 odst. 1 správního řádu)

- **Obecní úřad Chyňava**, Velká Strana 39, 267 07 Chyňava (pro zveřejnění na úřední desce na dobu nejméně 15 dnů – podle § 172 odst. 1 správního řádu)

- **Obecní úřad Nižbor**, Křivoklátská 26, 267 05 Nižbor (pro zveřejnění na úřední desce na dobu nejméně 15 dnů – podle § 172 odst. 1 správního řádu)

- **Obecní úřad Hýskov**, Na Břasích 206, 267 06 Hýskov (pro zveřejnění na úřední desce na dobu nejméně 15 dnů – podle § 172 odst. 1 správního řádu)


- **Obecní úřad Železná**, Železná 28, 266 01 Železná (pro zveřejnění na úřední desce na dobu nejméně 15 dnů – podle § 172 odst. 1 správního řádu)

- **KSÚS Středočeského kraje, p.o.**, Zborovská 11, 150 21 Praha 5


- **ADSUM spol. s r.o.**, Havlíčkova 923, 273 51 Unhošť, provozovna: Lidická 7, 273 51 Unhošť, IČ: 45144991



Grafické znázornění a schéma DIO (str. 4-10):


Schematický plánec D0 - celková situace Uzavírky silnic II/118 „Malé Kyšice“ a II/116 „Hýskov - Nižbor“

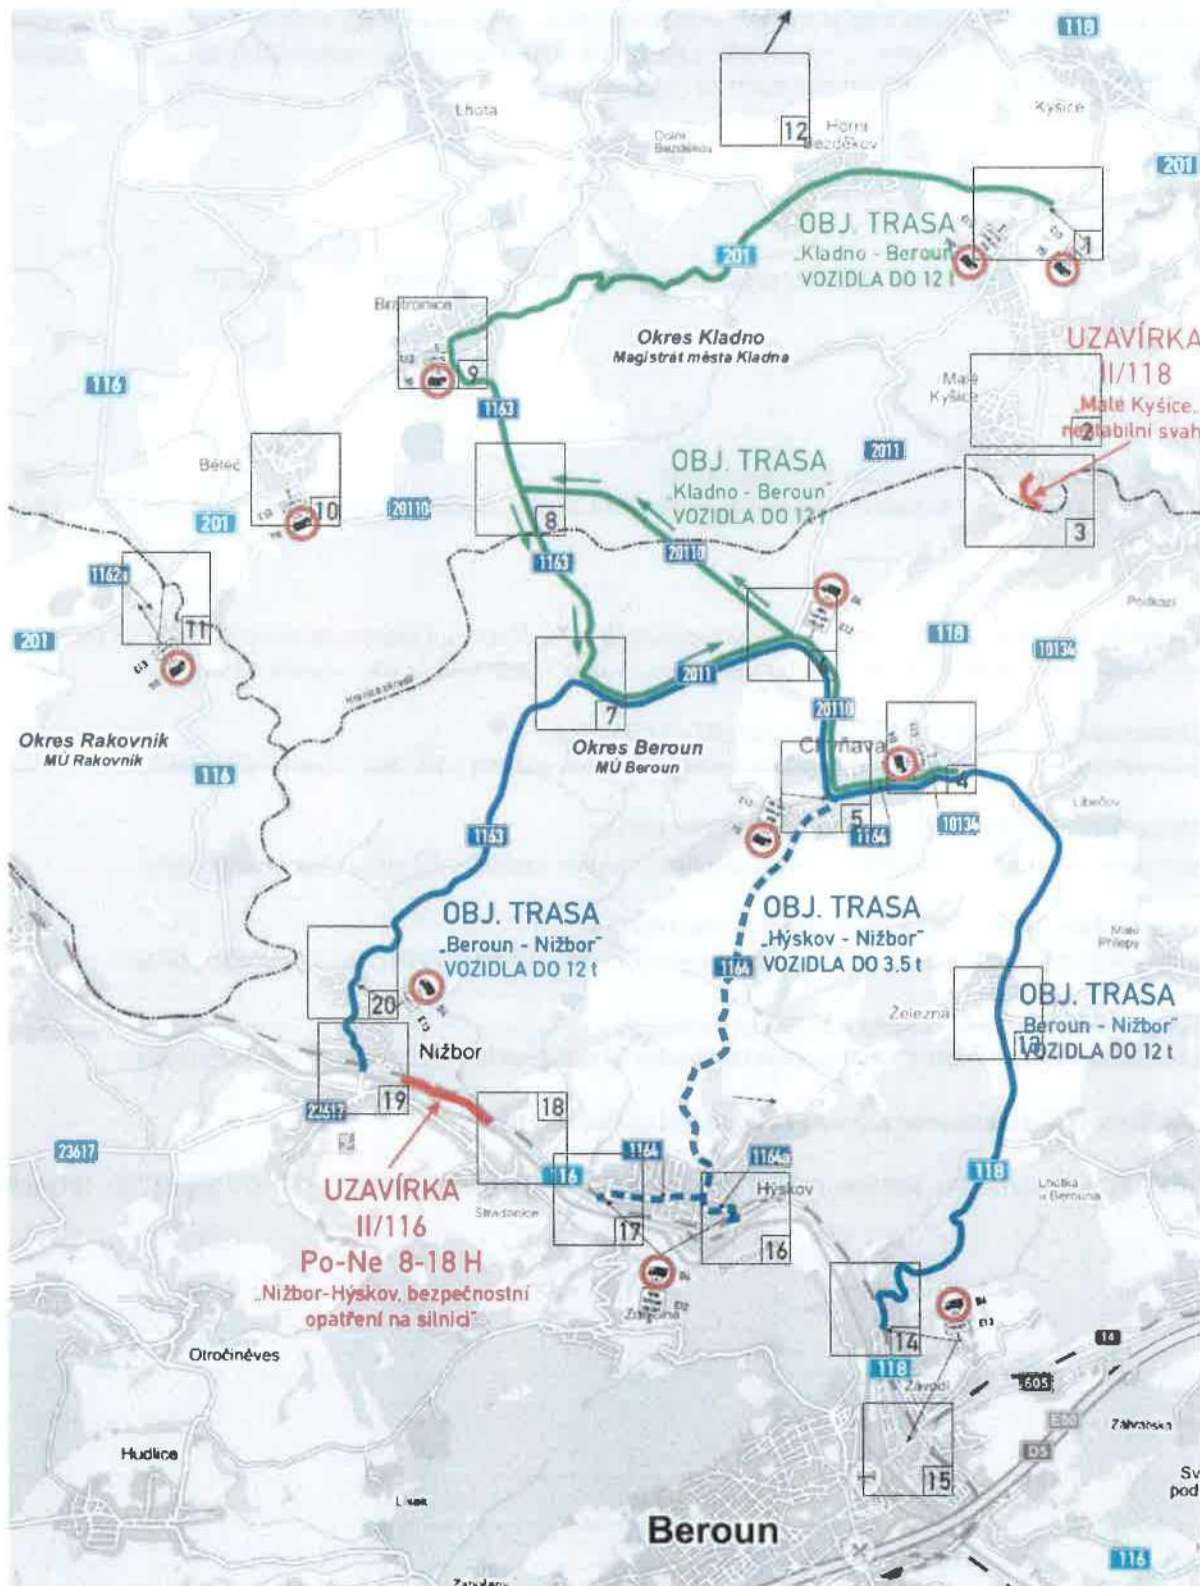




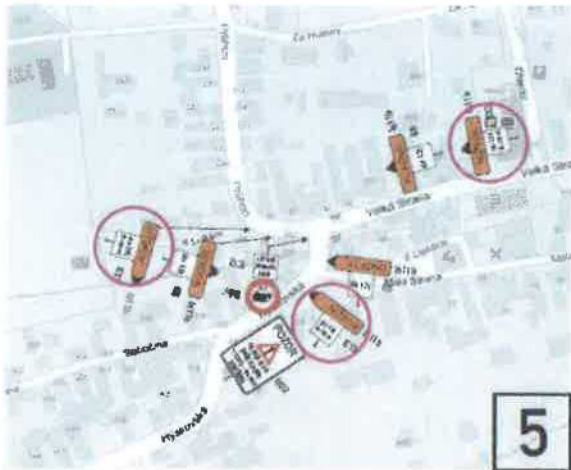

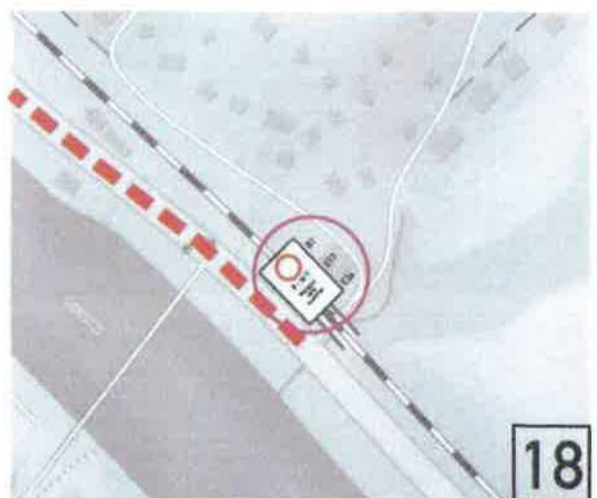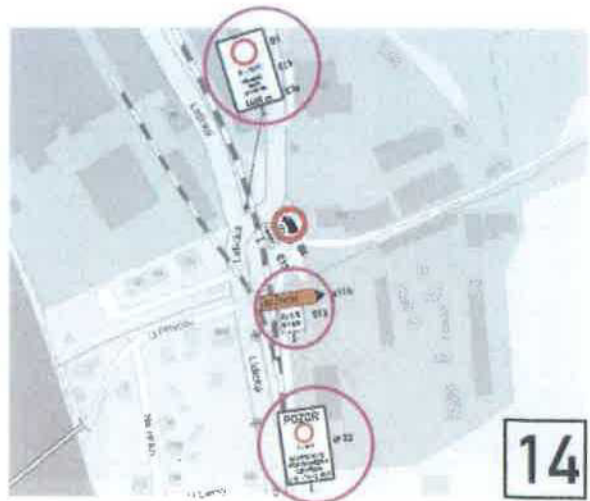

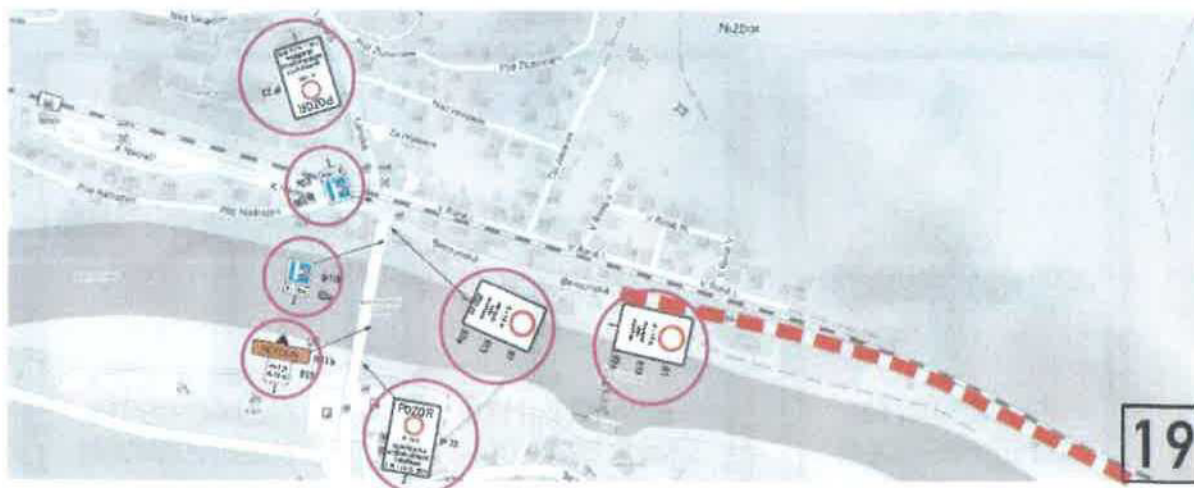

Upravené schema C/5 Silnice II/116 Nižbor - Hýskov

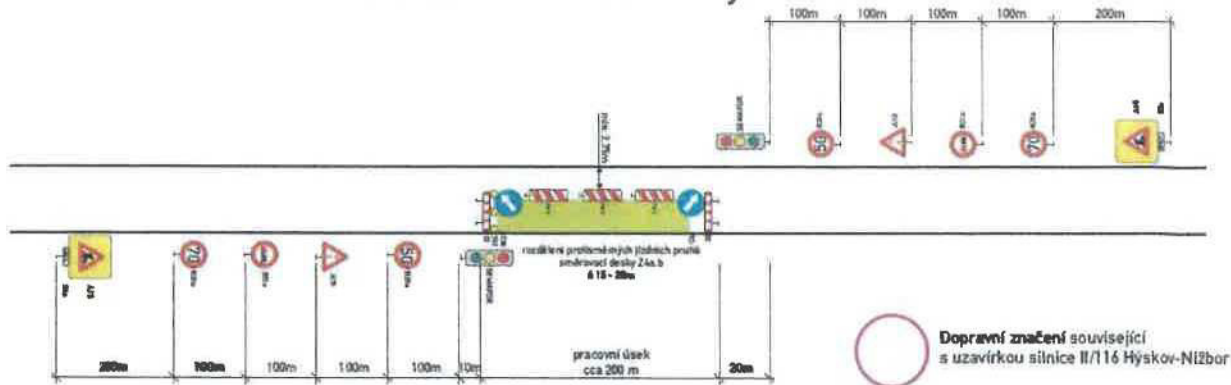

IS11a 1.



IS11a 2.



IS11a 3.



IS11a 4.



Detaily použitých IP 22



B1

E13



B1

E13

E3a



IP 22



IP 22



Ip22



Ip22

Název akce: II/116 Nižbor – Hýskov, bezpečnostní opatření na silnici

Z důvodů změny zatřídění těžené zeminy do tř. III. bylo potřeba změnit technologii výkopových prací a nasadit větší mechanizaci. Za stávajícího dopravního opatření dochází k nebezpečným situacím ohrožujících zdraví a bezpečnost všech účastníků provozu, dochází ke kolizi strojů a projíždějících vozidel. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto o změně DIO. Došlo k úplnému uzavření silnice v obou směrech a byly vyznačeny objízdné trasy, tím došlo k rozšíření DIO o nezbytně nutné dopravní značení. Objednatel této žádosti vyhověl a se změnou DIO souhlasí.

19 -11- 2019

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje
příj.
Zboř.
IČo.

J. Zákostelský

Starmosty s.r.o.

Mezi vodami 205/29,
143 00 Praha – Modřany

Váš dopis zn./ze dne: Naše značka :
59/2019

Vyřizuje :
Ing. Jiří Sobol

Praha :
21.11.2019





Věc : **Vyjádření projektanta k ZBV na akci - „II/116 Nižbor - Hýskov, bezpečnostní opatření na silnici“**

Vyjádření k prodloužení DIO po celém rekonstruovaném úseku:

Vzhledem ke skutečnostem na staveništi, které zapříčinili prodloužení doby realizace a změnu používané techniky na stavbě je nutné prodloužení termínu a změna DIO.

Vyjádření k prodloužení termínu:

Na základě výše uvedeného je prodloužení termínu a změna DIO akceptovatelná.

Případné dotazy zodpoví: Ing. Jiří Sobol
telefon: 
datová schránka: 
email: 
adresa: Ing. Jiří Sobol, 

Ing. Jiří Sobol

Ing. Jiří Sobol
Projektová kancelář
282 01 Český Brod
tel: 774 09 09 00
IČ: 8739652

Vyřizuje : Ing. Bureš

V Kladně dne 12.11.2019

Středočeský kraj
p. Martin Herman
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Věc: Vyjádření TDI k ZBV
Ke stavbě „II/116 Nižbor – Hýskov, bezpečnostní opatření na silnici“

Změna č.1 – Prodloužení DIO po celém rekonstruovaném úseku a doby realizace.

V průběhu prací došlo k událostem, které zapříčinily prodloužení doby realizace. Výsledná doba zpoždění stavebních prací a prodloužení DIO byla stanovena na 51 dní. Zpoždění stavebních prací způsobil zejména výskyt jiné třídy těžitelnosti zeminy než bylo předpokládáno projektovou dokumentací. Při výkopových pracích zhotovitel narazil na prachovité břidlice R3-R2 třídy těžitelnosti III. Bylo zapotřebí změnit technologii výkopových prací a použít těžší stavební mechanizaci.


Stavební práce probíhají za částečné uzavírky komunikace II/116, kdy je doprava v předmětném úseku řízena světelnou dopravní signalizací.

Vzhledem ke skutečnostem na staveništi bylo nutné pracovat s těžkou stavební mechanizací, používat pracovní postupy, které neumožňovaly zajistit průjezdnost komunikace II/116 po celou dobu stavby a zajistit, aby nebyly ohroženy životy pracovníků ani životy účastníků silničního provozu.

Z výše uvedených důvodů neprobíhaly stavební práce dle předpokládaného harmonogramu stavebních prací.

Jedná se o provedení prací nad rámec zadávací dokumentace a vyvolanou změnu během výstavby. Termínový nárok zhotovitele z pohledu TDI je oprávněný.

V Kladně dne 12.11.2019



za IBH spol.s r.o.
Ing. Miroslav Bureš

Vyjádření koordinátora BOZP na staveništi k akci :

"II/116 Nižbor - Hýskov, bezpečnostní opatření na silnici"

Práce na akci "II/116 Nižbor - Hýskov, bezpečnostní opatření na silnici" (oprava opěrné zdi, rozšíření a oprava komunikace) probíhají za částečné uzavírky komunikace II/116, kdy je doprava v předmětném úseku řízena světelnou dopravní signalizací.

Vzhledem k novým skutečnostem na staveništi je nutné pracovat s těžkou stavební mechanizací a používat pracovní postupy, které neumožňují zajistit průjezdnost komunikace II/116 po celou dobu stavby a v této souvislosti je nutné aktualizovat jak Technologické předpisy pro jednotlivé stavební činnosti, tak DIO.

V případě, že práce probíhají za provozu na pozemní komunikaci je zhotovitel povinen přijmout taková opatření, aby nebyly ohroženy životy pracovníků a ani životy účastníků silničního provozu. Na této stavbě toho nelze dosáhnout jinak než vyloučením provozu na pozemní komunikaci II/116 – úplnou uzavírkou komunikace

V Kladně 10.9.2019



Mgr. Roman Macenader

Koordinator BOZP na staveništi
osvědčení č. KARO/042/KOO/2018.

Smlouva o společnosti

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustan. § 2716 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi následujícími smluvními stranami:

Starmosty s.r.o.

se sídlem: Na čihadle 958/57, Dejvice, 160 00 Praha 6

IČO: 07122764

DIČ: CZ07122764

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 295004 zastoupena Ing. Michalem Tichovským, na základě plné moci ze dne 11. 06. 2018 uvedené v příloze č. 2

číslo účtu: [redacted]

tel.: [redacted]

email: [redacted]

(dále také jako „vedoucí společník“)

a

ROBSTAV stavby k.s.

se sídlem: Na Stínadlech 495, Pražské Předměstí, 397 01 Písek

IČO: 274 30 774

DIČ: CZ27430774

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl A, vložka 11191

zastoupena Ing. Radkem Kozákem, jednatelem, zastupujícím společnost Rekoskov s.r.o při výkonu funkce komplementáře společnosti ROBSTAV stavby k.s.

číslo účtu: [redacted]

tel.: [redacted]

email: [redacted]

(dále také jako „společník“)

(vedoucí společník a společník dále společně též jako „společníci“)

1. Předmět a účel smlouvy

- 1.1. Touto smlouvou se její výše uvedení společníci sdružují, aby se společně přičinili o dosažení sjednaného účelu, kterým je získání veřejné zakázky na realizaci stavby označované jako „**II/116 Nižbor – Hýskov, bezpečnostní opatření na silnici**“ (dále jen „**stavba**“), dále uzavření příslušné smlouvy o dílo se zadavatelem veřejné zakázky (dále jen „**smlouva o dílo**“) jakož i vlastní provedení díla. Zadavatelem výše uvedené veřejné zakázky je Středočeský kraj, s adresou Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, IČO: 70891095 (dále jen „**zadavatel**“) a příslušné zadávací řízení pro tuto zakázku bylo zadavatelem zahájeno uveřejněním v informačním systému zadavatele, systémové číslo VZ: P18V00000723, datum zahájení zadávacího řízení: 18.10.2018.
- 1.2. K dosažení sjednaného účelu se společníci zavazují společně vypracovat a zadavateli podat řádně a včas nabídku do výše uvedeného zadávacího řízení s tím, že společná nabídka bude zpracována a podána v souladu se zadávací dokumentací a zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
- 1.3. V případě, že společná nabídka společníků bude zadavatelem vybrána jako nejvhodnější, uzavřou společně společníci se zadavatelem příslušnou smlouvu o dílo, na základě které se zaváží provést sjednané dílo společně a nerozdílně a stejným

způsobem odpovídat i za ostatní závazky ze smlouvy o dílo vyplývající. Na zhotovení díla se jednotliví společníci budou podílet následujícím způsobem a rozsahem:

- 1.3.1. vedoucí společník **Starmosty s.r.o.** provede **51 %** objemu prací podle smlouvy o dílo se zadavatelem; a
- 1.3.2. společník **ROBSTAV stavby k.s.** provede **49 %** objemu prací podle smlouvy o dílo se zadavatelem.
- 1.4. Podrobné vymezení výkonů, dodávek, případně dalších plnění souvisejících s prováděním díla jednotlivými společníky, včetně jejich podrobného ocenění specifikujícího podíl každého společníka na celkové ceně díla, bude provedeno v dodatku k této smlouvě o společnosti. Dodatek bude stranami uzavřen nejpozději do 15 dnů ode dne uzavření smlouvy o dílo se zadavatelem.

2. Název a sídlo společnosti

- 2.1. Společníci se dohodli, že při výkonu práv a plnění povinností podle této smlouvy o společnosti budou společnost označovat názvem:

„Společnost Nižbor – Hýskov – Starmosty - ROBSTAV“

- 2.2. Sídlem společnosti je sídlo vedoucího společníka:

„Na čihadle 958/57, Dejvice, 160 00 Praha 6“

3. Vedoucí společník

- 3.1. Společníci se dohodli, že vedoucím společníkem bude **Starmosty s.r.o.**
- 3.2. Vedoucí společník je mimo jiné:
 - 3.2.1. oprávněn jménem všech společníků k podpisu a podání společné nabídky;
 - 3.2.2. oprávněn k uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky mezi zadavatelem a společníky;
 - 3.2.3. odpovědný za řízení a koordinaci provádění díla;
 - 3.2.4. oprávněn k jednání se zadavatelem ve věcech týkajících se činnosti společníků podle této smlouvy o společnosti a smlouvy o dílo.
- 3.3. Vzhledem k výše uvedenému je vedoucí společník mimo jiné oprávněn jménem jednotlivých společníků uplatňovat vůči zadavateli nároky vyplývající ze smlouvy o dílo, přijímat od zadavatele pokyny týkající se provádění díla, přijímat platby ceny díla od zadavatele a poskytovat takto přijatá plnění v dohodnutém rozsahu a dohodnutým způsobem ostatním společníkům.
- 3.4. **Všichni společníci, kteří podávají společnou nabídku, jsou vůči zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky, i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky. Požadavek na závazek podle věty první, aby dodavatelé byli zavázáni společně a nerozdílně, platí, pokud zvláštní právní předpis nebo zadavatel nestanoví jinak.**

4. Plná moc k zastupování společníků

- 4.1. Společník **ROBSTAV stavby k.s.** tímto výslovně uděluje vedoucímu společníkovi, tj. společnosti **Starmosty s.r.o.**, plnou moc ke všem úkonům vymezeným v článku 3 odst. 3.2 a 3.3 této smlouvy. Plná moc tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Na základě této plné moci je vedoucí společník oprávněn činit jménem ostatních společníků veškeré právní úkony související s činností společníků v rámci společnosti a při provádění smlouvy o dílo.

- 4.2. Vedoucí společník vždy úkony, které jsou předmětem plné moci, předem projedná a odsouhlasí s ostatními společníky. Úkony vedoucího společníka budou vycházet z konsensu všech společníků. Hlasy společníků jsou si při rozhodování rovny.

5. Příprava společné nabídky

- 5.1. V zájmu dosažení sjednaného účelu sdružení se všichni společníci zavazují učinit veškeré právní i faktické kroky nutné k řádnému zpracování kompletní žádosti, nabídky a jejímu včasnému předložení zadavateli, a to v takové podobě, aby mohla být zadavatelem vybrána jako nejvhodnější.
- 5.2. Společníci jsou povinni kvalifikovaně prostudovat a prověřit zadávací dokumentaci a veškeré další dokumenty či podklady, které byly zadavatelem společníkům zpřístupněny nebo od něj převzaty. V případě, že zadávací dokumentace veřejné zakázky nebude správná a úplná, tak jsou společníci povinni veřejného zadavatele na tyto případné nedostatky upozornit.
- 5.3. Dojde-li k vyloučení společníků jako uchazeče z účasti v zadávacím řízení z důvodů ležících prokazatelně a výlučně na straně jednoho ze společníků, vzniká společníkovi, který nezavinil vyloučení, vůči společníkovi, který vyloučení zavinil, nárok na náhradu majetkové či nemajetkové újmy.

6. Hospodaření společníků v rámci společnosti

- 6.1. Části díla zhotovené společníkem a vymezené příslušným zjišťovacím protokolem, které byly v daném kalendářním měsíci schváleny zadavatelem k fakturaci, resp. k proplacení, společník vyfakturuje vedoucímu společníku jako dílčí zdanitelné plnění. Dílčí zdanitelné plnění se v tomto případě považuje za uskutečněné posledním dnem daného kalendářního měsíce.
- 6.2. Vedoucí společník část díla, vyfakturovanou dle předchozího odstavce, zahrne do svého účetnictví jako „subdodávku“ a vyfakturuje zadavateli všechny části díla, které byly zadavatelem schváleny k fakturaci, resp. k proplacení za daný kalendářní měsíc.
- 6.3. Evidenci pro daňové účely dle § 100 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty vede každý společník za svá zdanitelná plnění, uskutečněná v rámci této společnosti, a to odděleně od svých ostatních plnění.
- 6.4. Veškeré platby ve vztahu k zadavateli v souvislosti se stavbou budou prováděny prostřednictvím vedoucího společníka. K přijímání plateb od zadavatele a k provádění finančních operací společnosti vedoucí společník zřídí u banky odděleně od svých ostatních účtů zvláštní běžný účet. Majitelem účtu z hlediska banky bude vedoucí společník a částky na něm obsažené budou ve spoluvlastnictví všech společníků. Každý společník bude mít právo na elektronický pohled na účet společnosti.
- 6.5. Vedoucí společník bude posílat druhému společníku dohodnutým způsobem (fax, e-mail) k odsouhlasení seznam plateb určených k proplacení z účtu společnosti. Na základě příjmů od zadavatele a na základě seznamu plateb odsouhlaseného za každého společníka pověřeným pracovníkem, vystaví vedoucí společník odpovídající platební příkaz k úhradě bance.
- 6.6. Vedoucí společník bude oprávněn dát příkaz k úhradě bance z účtu společnosti pouze na základě seznamu plateb, odsouhlaseného za oba společníky jejich pověřenými pracovníky a nesmí s účtem společnosti disponovat jinak bez předchozího souhlasu ostatních společníků.
- 6.7. Žádný společník nesmí časově znevýhodňovat ostatní společníky, to znamená podepsat platby z jednoho seznamu plateb sobě a s podepsáním seznamu plateb pro ostatní společníky čekat. Společník se zavazuje neodmítnout podepsání seznamu plateb

předloženého vedoucím společníkem s výjimkou případů, kdy písemně uplatní odůvodněné výhrady k jeho správnosti.

7. Rozhodování společnosti

- 7.1. Společníci se v dodatku k této smlouvě dohodnou na vytvoření orgánů, které se budou podílet na koordinaci činností jednotlivých společníků při plnění závazků vyplývajících z této smlouvy o společnosti a ze smlouvy o dílo. Dodatek bude uzavřen nejpozději do 15 dnů ode dne uzavření smlouvy o dílo.

8. Podíly na majetku a odpovědnost společníků

- 8.1. Ze závazků vůči třetím osobám jsou společníci zavázáni společně a nerozdílně ve stejném rozsahu.
- 8.2. Majetek získaný společnou činností společníků v rámci společnosti bude mezi společníky rozdělen v procentuálním poměru určeném v článku 1. odst. 1.3 této smlouvy.
- 8.3. Ve vztahu mezi společníky platí, že každý ze společníků provede veškeré úkony nezbytné k řádnému uskutečnění jemu náležející část díla na své náklady a na svou odpovědnost a že ponese veškerá rizika s tím související.
- 8.4. Každý společník je povinen uzavřít pojištění své odpovědnosti dle podmínek vyžadovaných smlouvou o dílo nebo výzvou či zadávací dokumentací. Pokud ve smlouvě o dílo nebo výzvě nebo zadávací dokumentaci není požadavek na pojištění uveden, pak je každý společník povinen uzavřít pojištění své odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě při výkonu podnikatelské činnosti, a to s pojistným plněním vyplývajícím z takového pojištění minimálně v hodnotě celkové nabídkové ceny stavby bez DPH, pokud se společníci nedohodnou jinak. Toto pojištění je každý společník povinen udržovat po celou dobu trvání společnosti, a to od okamžiku uzavření smlouvy o dílo se zadavatelem. Společníci se mohou dohodnout na společném zajištění pojištění uvedeného výše.

9. Další práva a povinnosti společníků

- 9.1. Společníci jsou povinni jednat tak, aby bylo dosaženo účelu sjednaného touto smlouvou, a současně jsou povinni zdržet se jakéhokoliv jednání či opomenutí, které by dosažení sjednaného účelu znemožňovalo anebo které by vedlo ke vzniku škody na straně ostatních účastníků sdružení. Vzhledem k výše uvedenému jsou společníci zejména povinni chránit dobré jméno ostatních společníků, nesdělovat důvěrné informace týkající se ostatních společníků jakož i činnosti všech společníků v rámci společnosti a řádně plnit veškeré povinnosti vyplývající pro ně z této smlouvy o společnosti a ze smlouvy o dílo, bude-li se zadavatelem uzavřena. Společník nesmí bez souhlasu druhého společníka činit na vlastní nebo cizí účet nic, co má vzhledem ke společnému účelu konkurenční povahu. Stane-li se tak, může se druhý společník domáhat náhrady škody.
- 9.2. Po dobu účinnosti této smlouvy o společnosti není žádný ze společníků oprávněn uzavřít se zadavatelem či třetí osobou žádnou smlouvu nebo dohodu, která by přímo či nepřímo vyloučila nebo omezila možnost kteréhokoliv dalšího společníka na získání nebo plnění veřejné zakázky specifikované výše. Společníci současně prohlašují, že výše uvedenou smlouvu či dohodu se zadavatelem či třetí osobou neuzavřeli ani před podpisem této smlouvy o společnosti.
- 9.3. Společníci se dále zavazují, že v rámci zadávacího řízení uvedeného v této smlouvě nepředloží samostatně anebo ve spojení s třetí osobou další nabídku, že nebudou působit jako subdodavatelé žádného dalšího uchazeče a že zajistí, aby tak neučinila ani

žádná z osob, které jsou ve vztahu k společníkovi ovládanými osobami. Společníci současně prohlašují, že žádná další žádost nebo nabídka specifikovaná v tomto odstavci před podpisem této smlouvy o společnosti nebyla předložena.

- 9.4. Při porušení jakéhokoliv ujednání stanoveného v odst. 9.2 a nebo 9.3 tohoto článku, je ten společník, který závazek porušil, povinen uhradit ostatním společníkům smluvní pokutu ve výši 100.000,-Kč, pro každého jednotlivého společníka, a to do 30-ti dnů ode dne, kdy bude k zaplacení smluvní pokuty vyzván. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo druhého společníka domáhat se náhrady újmy, a to majetkové či nemajetkové, která mu vznikla porušením závazku, a která přesahuje výši zaplacené smluvní pokuty.
- 9.5. V případě výběru společné nabídky jako nejvhodnější se každý ze společníků zavazuje řádně a včas provést dohodnutou část díla a v případě výskytu nedodělků, nebo vad na jím prováděné části díla tyto odstranit v souladu se smlouvou o dílo. Bude-li zadavatel či jiná oprávněná osoba uplatňovat nároky z vad díla vůči společníkovi, který neprováděl část díla, na níž se vady vyskytly, je společník, který dotčenou část díla prováděl po oznámení společníka, jemuž byla vada oznámena, povinen sám nabídnout odstranění vad a tyto řádně a včas odstranit.
- 9.6. V případě výběru společné nabídky jako nejvhodnější se každý ze společníků současně zavazuje provádět jemu určenou část díla takovým způsobem, aby současně neznemožňoval provádění díla ostatním společníkům.

10. Trvání společnosti

- 10.1. Společnost založená touto smlouvou vzniká uzavřením této smlouvy o společnosti a trvá po celou dobu existence závazků vyplývajících ze společně předložené nabídky a v případě výběru společné nabídky jako nejvhodnější též po celou dobu existence závazků ze smlouvy o dílo. K ukončení účinnosti této smlouvy a tím i k zániku společnosti dojde dnem, kdy z jakýchkoliv důvodů dojde k zániku vázanosti společníků společně podanou nabídkou anebo kdy dojde k zániku všech závazků společníků vyplývajících ze smlouvy o dílo. Smlouva však nezanikne dříve, než budou mezi společníky vypořádány náklady společnosti vzniklé za doby trvání této smlouvy.
- 10.2. Společníci tímto berou na vědomí, že vystoupení kteréhokoliv společníka z jakéhokoliv důvodu by znamenalo vážné ohrožení dosažení sjednaného účelu, přičemž za újmu vzniklou ostatním společníkům, kterou by byl společník, který ze společnosti vystoupil, povinen uhradit, by byly považovány též všechny náklady, které zbývající společníci nutně vynaložili nad sjednaný rámec k řádnému splnění smlouvy o dílo.
- 10.3. Poruší-li společník povinnost stanovenou v této smlouvě podstatným způsobem, může být ze společnosti vyloučen. Vyloučen může být rovněž:
 - 10.3.1. bylo-li o jeho majetku zahájeno insolvenční řízení na jeho návrh;
 - 10.3.2. přistoupil-li společník k návrhu na zahájení insolvenčního řízení, ve kterém se řeší jeho úpadek nebo hrozící úpadek, nebo
 - 10.3.3. bylo-li v insolvenčním řízení rozhodnuto o úpadku společníka.

11. Závěrečná ustanovení

- 11.1. Otázky touto smlouvou o společnosti výslovně neupravené se řídí ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména pak občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

- 11.2. Tuto smlouvu o společnosti lze měnit či doplňovat pouze na základě postupně číslovaných dodatků uzavřených v písemné formě. Jiná než písemná forma dodatku se výslovně vylučuje.
- 11.3. Společníci si zvolili pro posuzování závazkových vztahů vyplývajících z této smlouvy jako rozhodné právo české. Všechny spory, které by mohly vzniknout z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou rozhodovány obecnými soudy ČR.
- 11.4. Příloha č. 1 – plná moc a příloha č. 2 tvoří součást této smlouvy.
- 11.5. Společníci se dohodli, že veškerá sdělení předávaná vzájemně v rámci plnění závazků z této smlouvy včetně kopií faxových zpráv budou zasilána na adresy uvedené jako sídla společníků. V případě změny adresy pro doručování písemností je nutné tuto změnu oznámit ostatním společníkům předem. Důležitá sdělení týkající se práv a povinností vyplývajících z této smlouvy musí být zasilána doporučeně a nebude-li prokázán opak, budou považována za doručena nejpozději třetí pracovní den po datu odeslání.
- 11.6. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatným či neúčinným, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Společníci se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením, které bude nejlépe odpovídat původně zamýšlenému hospodářskému účelu neplatného nebo neúčinného ustanovení. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
- 11.7. Tato smlouva o společnosti je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž každý společník obdrží po jednom vyhotovení a jedno vyhotovení bude určeno zadavateli jako součást společné nabídky.
- 11.8. Tato smlouva o společnosti nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu osobami oprávněnými jednat jménem společnosti. Společníci tímto shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem řádně přečetli, jejímu obsahu porozuměli a uzavírají ji podle své pravé vůle, svobodně a vážně.

V Praze, dne 3.12.2018


 St
 Ing. Michal [redacted]ský, na základě plné moci

Starmosty s.r.o.
 Na Čihadle 958/57
 160 00 Praha 6 - Dejvice
 IČO: 071 22 764 DIČ: CZ07122764
 -2-

V Plzni, dne 30.11.2018


 ROBSTAV stav
 Ing. Radek Ko
 komplementáře

ROBSTAV stavby k.s.
 Na Štínadlech 495, 397 01 Plzeň
 IČO: 274 30 774
 DIČ: CZ27430774 (5)

**Příloha č. 1
Plná moc**

ROBSTAV stavby k.s.

se sídlem: Na Stínadlech 495, Pražské Předměstí, 397 01 Písek

IČO: 274 30 774

DIČ: CZ27430774

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl A, vložka 11191

tímto zmocňuje společnost:

Starmosty s.r.o.

se sídlem: Na čihadle 958/57, Dejvice, 160 00 Praha 6

IČO: 07122764

DIČ: CZ07122764

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 295004

**jako vedoucího společníka společnosti
„Společnost Nižbor – Hýskov – Starmosty - ROBSTAV“**

kdy na základě smlouvy o společnosti se všichni výše jmenovaní společně ucházejí o veřejnou zakázku

„II/116 Nižbor – Hýskov, bezpečnostní opatření na silnici“

vyhlášenou podle zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění a uveřejněnou v informačním systému zadavatele pod systérovým číslem VZ: P18V00000723, datum zahájení zadávacího řízení: 18.10.2018.


k tomu, aby:

Starmosty s.r.o., jako vedoucí společník, jednal v ústním i písemném styku za společnost (všechny její společníky). Zejména je oprávněn:

- k podpisu a podání společné nabídky na realizaci předmětné veřejné zakázky,
- k jednání se zadavatelem ve všech věcech týkajících se společné nabídky,
- k zavazování a přejímání instrukcí, závazků a pokynů pro a za kteréhokoliv společníka,
- k uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky mezi zadavatelem a společníky,
- po uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky mezi zadavatelem a společníky, k přijímání závazků a pokynů pro a za každého společníka a všechny potenciální dodavatele,
- k dalším právním jednáním souvisejícím s předmětnou veřejnou zakázkou, zejména k jednáním s kontrolními orgány,

V rámci této plné moci je Starmosty s.r.o. oprávněna zmocnit další osoby **ROBSTAV stavby k.s.**

V Plzni, dne 30.11.2018


ROBSTAV stavby k.s.
Ing. Radek Kozák, jednatel komplementáře

DIČ: CZ27430774 (5)

Tuto plnou moc přijímám

V Praze, dne 3.12.2018


Starmosty s.r.o.
Ing. Michal Tichovský

Starmosty s.r.o.
Na čihadle 958/57
160 00 Praha 6 - Dejvice
IČO:071 22 764 DIČ:CZ07122764

Příloha č. 2

Plná moc

Společnost **Starmosty s.r.o.**, IČ: 071 22 764, se sídlem Na čihadle 958/57, Dejvice, 160 00 Praha 6, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 295004, zastoupená jednatelem Radkem Kozákem a Michalem Kabelou (dále jen „Zmocnitel“),

uděluje tímto plnou moc

panu Ing. Michalu Tichovskému,  (dále jen „Zmocněnec“)


k tomu, aby Zmocnitel zastupoval ve všech jednáních potřebných pro získání a řádné splnění veřejných zakázek dle zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a všech souvisejících právních předpisech. Předpokládaná hodnota každé jednotlivé veřejné zakázky, stanovená zadavatelem, nesmí přesáhnout částku **30.000.000,- Kč** a současně předpokládaná hodnota každého jednotlivého obchodního případu nesmí přesáhnout částku **30.000.000,- Kč**.


Pro naplnění účelu této plné moci je tak Zmocněnec oprávněn zejména, nikoli však výlučně, k následujícímu jednání:

- uzavírání jednotlivých smluv o společnosti, včetně jejich změn či ukončování;
- podávání nabídek v rámci zadávacího řízení, předběžných nabídek, žádostí o účast na veřejné zakázce, včetně podpisu všech souvisejících dokumentů;
- uzavírání smluv o dílo se zadavatelem veřejných zakázek;
- uzavírání poddodavatelských smluv;
- vedení obchodních jednání;
- uzavírání, změně či rušení smluvních vztahů, včetně dodavatelských, odběratelských či bankovních smluv;
- nakládání s finančními prostředky Zmocnitel v hotovosti nebo na bankovních účtech;
- jednání se všemi orgány státní správy a samosprávy;
- přebírání souvisejících dokumentů a odesílání příslušných dokumentů;
- podávání řádných a mimořádných opravných prostředků, vzdávání se práva k opravným prostředkům;
- k dalšímu jednání potřebnému k naplnění účelu této plné moci.

Zmocněnec je oprávněn udělit substituční plnou moc, včetně udělení plné moci vedoucímu společníkovi/správci v rámci jednotlivých smluv o společnosti.

v Praze, dne 11.6.20


Starmosty s.r.o.
Radek Kozák, jednatel


Starmosty s.r.o.
Michal Kabela, jednatel

Tuto plnou moc přijímám v Praze, dne 11.6.2018


Ing. Michal ský

