

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

III/01214 Úvaly u Prahy, průtah - úsek 3

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Přeložky vodovodů

Číslo SO/PS /

313

Číslo ZBV:

4

číslo změny SO/PS:

1

Objednatel:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
 Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
 IČ: 00066001

Zhotovitel:

PORR a.s., odštěpný závod - Čechy
 se sídlem Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10
 IČ: 43005560

Rekapitulace ZBV č. 4 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4.3	0,00	1.131.191,05	1.131.191,05

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4.4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4	0,00	1.131.191,05	1.131.191,05

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
 Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
 a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré:

6

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby:

III/01214 Úvaly u Prahy, průtah - úsek 3

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Přeložky vodovodů

Číslo SO/PS /

313

Číslo ZBV:

číslo změny

1

4

SO/PS:

Strany smlouvy o dílo č.432/00066001/2016 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 11.7.2016 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: PORR a.s., odštěpný závod - Čechy se sídlem Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10

Přílohy Změnového listu:

1. Krycí list	1	počet listů
2. Změnový list	1	počet listů
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů
4. Rozpis ocenění Změn položek	3	počet listů
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů
7. Další doklady	43	počet listů

Paré č.	Příjemce
1	Objednatel
2	Zhotovitel
3	Projektant
4	TDI

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Rozšíření přeložky vodovodu

V rámci zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení na stavbu III/01214 Úvaly u Prahy, průtah - úsek 3 požádal v říjnu 2013 projektant AF-Cityplan správce vodovodu Stavokomplet, spol. s r.o. o vyjádření k projektové dokumentaci SO 313 - Přeložky vodovodů. Požadavky správce byly zpracovány do projektové dokumentace pro PDPS. K zpracování realizační dokumentace stavby v roce 2016 obdržel projektant požadavek současného správce vodovodu Technických služeb města Úvaly, ve kterém současný správce požaduje rozšíření trasy přeložky vodovodu od křižovatky ulic 5. května x Dvořákova až za most SO 231 z důvodu havarijního stavu řadu a s ohledem na hranici životnosti materiálu.

Tato změna vznikla z nepředvídaných důvodů v průběhu provádění stavby z důvodu změny správce vodovodu a jeho nových požadavků na přeložku. Její množství bylo zjištěno měřením. Provedení uvedených prací bylo z důvodu zjištěného stavu nevyhnutelné a technicky i ekonomicky neoddelitelné od realizované stavby. Dotčené položky jsou podle § 10 Směrnice ředitele Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek z 29. 5. 2017 zařazeny do Skupiny 3.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
0,00	1.131.191,05	1.131.191,05	1.131.191,05

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí)	jméno	Ing. Václav Leitemann	datum	20.6.2017	podpis	
Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Jakub Vyhánělek	datum	20.6.2017	podpis	
Technický dozor investora	jméno	Tomáš Kubík	datum	20.6.2017	podpis	
Supervize	jméno	xxx	datum		podpis	
Zástupce Objednatele:	jméno	Vladimír Buchar	datum		podpis	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele) - KSÚS SK, p.o.	jméno	Bc. Zdeněk Dvořák	datum		podpis	
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele) - Město Úvaly	jméno	Mgr. Petr Borecký	datum		podpis	
Zhotovitel	jméno	Ing. Pavel Hirsch	datum	20.6.2017	podpis	
	jméno	Petr Janulík	datum	20.6.2017	podpis	

Číslo paré:

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 4**

Název Stavby: III/01214 Úvaly u Prahy, průtah - úsek 3	
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 313 / 1	
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Přeložky vodovodů	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
317.145,90

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	317.145,90	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	1.131.191,05	1.131.191,05	356,68%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	0,00	1.448.336,96	1.131.191,05	356,68%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):	Ing. Václav Leitemann	souhlasím	20.6.2017
Projektant (autorský dozor):	Ing. Jakub Vyhnálek	souhlasím	20.6.2017
Stavební dozor:	Tomáš Kubík	souhlasím	20.6.2017
Zástupce Objednatele:	Vladimír Buchar	souhlasím	20.6.2017
Zaměstnanec KSÚS SK odpovědný za cenové projednání Změny:	Tomáš Račák	souhlasím	20.6.2017

Evidenční číslo a název stavby: III/01214 Úvaly u Prahy, průtah - úsek 3

Číslo a název SO/PS: SO 313 - Přeložky vodovodů

Číslo a název rozpočtu: SO 313 - Přeložky vodovodů

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Mn. Sr
1	2	3	4	
1	103715099	zemina pro násypy a zásypy, nakupovaná ornice tříděná zahradní	M3	
2	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	M	
3	119001411	Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 200	M	
4	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	M3	
5	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	M3	
6	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	M3	
7	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	M2	
8	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	M2	
9	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	M3	
10	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	M3	
11	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	T	
12	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	M3	
13	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	M3	
14	583312001	šterkopísek netříděný zásypový materiál	T	
15	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	M3	
16	280003216	šoupátko pro domovní přípojky DN 32-5/4"	KUS	
17	286131110	potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 100 m, 40 x 3,7 mm	M	
18	286131180	potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 12 m, 160 x 14,6 mm	M	
19	286530161	elektrospojka PE , d 40 mm	KUS	
20	286530281	elektrospojka PE , d 160 mm	KUS	
21	286530615	elektrokoleno 11 °, WS 11 d 160 mm	KUS	
22	372005416	uzávěr nástavcový k pasům DN 5/4"-6/4"(výst/pas)	KUS	
23	422913541	podkladní deska pro poklop šoupátkový	KUS	
24	422913591	poklop uliční těžký pro domovní šoupátka	KUS	
25	531016064	pas navrtávací uzavírací DN 160-6/4"	KUS	
26	871161281	Demontáž potrubí z PE100 otevřený výkop D 32 x 3,0 mm	M	
27	871171211	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 40 x 3,7 mm	M	
28	871321211	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 160 x 14,6 mm	M	
29	871321281	Demontáž potrubí z PE100 otevřený výkop D 160	M	
30	877321101	Montáž elektrospojek na potrubí z PE trub D 160	KUS	
31	891181113	Montáž vodovodních šoupátek pro domovní přípojky otevřený výkop DN 32	KUS	
32	891319111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 150	KUS	
33	892233121	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	M	
34	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80	M	
35	892351111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	M	
36	892353121	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200	M	
37	898241111	Demontáž vodovodních šoupátek otevřený výkop	KUS	
38	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	KUS	
39	899401812	Demontáž poklopů litinových šoupátkových	KUS	
40	899712111	Orientační tabulky na zdivu	KUS	
41	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC	M	
42	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	M	
43	960103401	souprava zemní teleskopická pro domovní šoupátka DN 3/4"-2" (1,3-1,8m)	KUS	

Evidenční číslo a název stavby: III/01214 Úvaly u Prahy, průtah - úsek 3

Číslo a název SO/PS: SO 313 - Přeložky vodovodů

Číslo a název rozpočtu: SO 313 - Přeložky vodovodů

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	M
1	2	3	4	
44	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	T	
45	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	T	
46	997013512	Odvoz vybouraných hmot kovových konstrukcí na skládku k recyklaci do 1 km s naložením a se složením	T	
47	997013519	Příplatek k odvozu vybouraných hmot kovových konstrukcí na skládku k recyklaci ZKD 1 km přes 1 km	T	
48	997013813	Poplatek za uložení stavebního odpadu z plastických hmot na skládce (skládkovné)	T	
49	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	T	
Název položky				
50	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	M	
51	131201202	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	M3	
52	452313151	Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 20/25 otevřený výkop	m3	
53	452353101	Bednění podkladních bloků otevřený výkop	m2	
54	850315121	Výřez nebo výsek na potrubí z trub plastických tlakových DN 150 vč.uzavření, vypuštění a napuštění vody	kus	
55	851311131	Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním DN 150	m	
56	neobsazeno			
57	552519030	trouba vodovodní litinová DN 150 STD L=6,0m vč.těsnícího kroužku pro spoj	kus	
58	552519150	trouba vodovodní litinová ISOPAM DN 150/250 L= 6m STD + manžeta + izol.kroužek + těsnící gumový kroužek	kus	
59	857311131	Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 150	kus	
60	552000001	WAGA spojka Synoflex hrdlová litinová jištěná proti posunu pro propoj potrubí d160	kus	
61	552000002	Spojka pro spojení 2 hladkých konců trubek ULTRALINK NG	kus	
62	552594850	koleno hrdlové MMQ tvárná litina DN 150-90° vč.těsnícího kroužku	kus	
63	286149390	elektrokoleno 90°, PE 100, PN 16, d 160	kus	
64	286149510	elektrokoleno 45°, PE 100, PN 16, d 160	kus	
65	286149630	elektro T-kus rovnoramenný, PE 100, PN 16, d 160	kus	
66	286000001	Oblouk PE 22°	kus	
67	286000002	Oblouk PE 15°	kus	
68	286000003	Oblouk PE 10°, 6°	kus	
69	879171111	Montáž vodovodní přípojky na potrubí DN 32	kus	
70	891311112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 150 vč.osazení zemní soupravy	kus	
71	422213060	šoupátko pitná voda PN10/16 DN 150	kus	
72	422910740	souprava zemní pro šoupátka DN 150 mm, Rd 1,5 m	kus	
73	899121102	Osazení poklopů šoupátkových	kus	
74	422913520	poklop litinový šoupátkový	kus	
75	422714150	pas navrtávací z tvárné litiny DN 150, rozsah (168-271), odbočky 1",5/4",6/4",2"	kus	
76	422910570	souprava zemní pro navrtávací pas s kohoutem Rd 1,5 m	kus	
77	422914020	poklop litinový ventilový	kus	
78	899914113	Montáž ocelové chráničky D 273 x 10 mm	m	
79	140111100	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353, 273 x 7,0 mm	m	
80	893914115	Montáž ocelové chráničky D 377 x 10 mm	m	
81	140111111	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353, 373 x 10 mm	m	
82	230200120	Nasunutí potrubí DN 150 do ocelové chráničky DN 250 vč.montáže a dodávky objímek	m	
83	899913152	Uzavírací manžeta chráničky potrubí DN 150 x 250	kus	
84	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	
85	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	

Název a evidenční číslo Stavby: III/01214 Úvaly u Prahy, průtah - úsek 3

1	Přijaté smluvní částka bez rezervy a DPH	34 068 000,00
2=1+18+19	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	37.446.321,01
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	109,92%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%
40=(19/1)*100	Sledování limitu 16 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, odst. (6), písm. b)	2,72%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	3.378.321,01
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	9,92%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	10.220.400,00

- 1 -	- 2 -
Vyhrazená změna (Doměrky)	Záměna položek (Započítá

[illegible]

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	4
Název a evidenční číslo stavby:	III/01214 Úvaly u Prahy, průtah - úsek 3
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Přeložky vodovodů
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	313 / 1

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
Technické zdůvodnění změnových položek ZBV	1	
Cenové zdůvodnění nových položek	5	
Individuální kalkulace nových položek	10	
Rozpiska dokumentace RDS SO133	1	
Potvrzený výkaz výměr SO 133	8	
Požadavek správce vodovodu (Stavokomplet)	3	
Požadavek správce vodovodu (Technické služby města Úvaly, p.o.)	3	
Fotodokumentace	2	
26. kontrolní den stavby	5	
Výběrové řízení na nové položky	3	
Žádost o změnu rozsahu díla	2	
Počet listů celkem	43	

Technické zdůvodnění změných položek - pro ZBV číslo: 4				ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS):	313/1
				Skupina	3
Stavba číslo, název:		III/01214 Úvaly u Prahy, průtah - úsek 3			
SO číslo a název:		SO 313 - Přeložky vodovodů			
Číslo ZBV:		SO 313 - Přeložky vodovodů			
Č. Pol.	KÓD	TYP	POPIS		
1	103715099		zemina pro násypy a zásypy, nakupovaná		
3	119001411		Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 200		
4	130001101		Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení		
5	132201202		Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3		
6	132201209		Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3		
7	151101101		Zřízení příloženého pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m		
8	151101111		Odstranění příloženého pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m		
9	161101101		Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m		
10	162701105		Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4		
11	171201211		Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)		
12	174101101		Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním		
13	175151101		Obsypání potrubí strojné sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m		
14	583312001		šterkopisek netříděný zásypový materiál		
15	451672111		Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého		
16	280003216		šoupátko pro domovní přípojky DN 32-5/4"		
17	286131110		potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 100 m, 40 x 3,7 mm		
18	286131180		potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 12 m, 160 x 14,6 mm		
20	286530281		elektrospojka PE, d 160 mm		
27	871171211		Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 40 x 3,7 mm		
28	871321211		Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 160 x 14,6 mm		
30	877321101		Montáž elektrospojek na potrubí z PE trub D 160		
32	891319111		Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 150		
35	892351111		Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200		
36	892353121		Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200		
38	899401112		Osazení poklopů litinových šoupátkových		
41	899721111		Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC		
42	899722113		Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm		
44	997013501		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením		
45	997013509		Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km		
48	997013813		Poplatek za uložení stavebního odpadu z plastických hmot na skládce (skládkovné)		
49	998276101		Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop		
50	119001421	N	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů		
51	131201202	N	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3		
52	452313151	N	Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 20/25 otevřený výkop		
53	452353101	N	Bednění podkladních bloků otevřený výkop		
54	850315121	N	Výřez nebo výsek na potrubí z trub plastických tlakových DN 150 vč. uzavření, vypuštění a napuštění vody		
55	851311131	N	Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním DN 150		
56	neobsazeno				
57	552519030		trouba vodovodní litinová DN 150 STD L=6,0m vč. těsnícího kroužku pro spoj		
58	552519150	N	trouba vodovodní litinová ISOPAM DN 150/250 L= 6m STD + manžeta + izol.kroužek + těsnící gumový kroužek pro spoj		
59	857311131	N	Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 150		
60	552000001	N	WAGA spojka Synoflex hrdlová litinová jistěná proti posunu pro propoj potrubí d160		
61	552000002	N	Spojka pro spojení 2 hladkých konců trubek ULTRALINK NG		
62	552594850	N	koleno hrdlové MMQ tvárná litina DN 150-90° vč. těsnícího kroužku		
63	286149390	N	elektrokoleno 90°, PE 100, PN 16, d 160		
64	286149510	N	elektrokoleno 45°, PE 100, PN 16, d 160		
65	286149630	N	elektro T-kus rovnoramenný, PE 100, PN 16, d 160		
66	286000001	N	Obložek PE 22°		
67	286000002	N	Obložek PE 15°		
68	286000003	N	Obložek PE 10°, 6°		
69	879171111	N	Montáž vodovodní přípojky na potrubí DN 32		
70	891311112	N	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 150 vč. osazení zemní soupravy		
71	422213060	N	šoupátko pitná voda PN10/16 DN 150		
72	422910740	N	souprava zemní pro šoupátka DN 150 mm, Rd 1,5 m		
73	899121102	N	Osazení poklopů šoupátkových		
74	422913520	N	poklop litinový šoupátkový		
75	422714150	N	pas navrtávací z tvárné litiny DN 150, rozsah (168-271), odbočky 1", 5/4", 6/4", 2"		
76	422910570	N	souprava zemní pro navrtávací pas s kohoutem Rd 1,5 m		
77	422914020	N	poklop litinový ventilový		
78	899914113	N	Montáž ocelové chráničky D 273 x 10 mm		
79	140111100	N	troubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353, 273 x 7,0 mm		
80	893914115	N	Montáž ocelové chráničky D 377 x 10 mm		
81	140111111	N	troubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353, 373 x 10 mm		
82	230200120	N	Nasunutí potrubí DN 150 do ocelové chráničky DN 250 vč. montáže a dodávky objímek		
83	899913152	N	Uzavírací manžeta chráničky potrubí DN 150 x 250		
84	892372111	N	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou		
85	899431111	N	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu		
86	8999111R1	N	Ocelová podpěra se sedlem pro vedení litinového potrubí na mostu vč. upevňovací objímky a ochranné kaučukové podložky		
87	8999111R2	N	kompenzátor potrubí litinového DN150		

V rámci zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení na stavbu III/01214 Úvaly u Prahy, průtah - úsek 3 požádal v říjnu 2013 projektant AF-Cityplan správce vododu Stavokomplet spol. s r.o. o vyjádření k projektové dokumentaci SO 313 - Přeložky vodovodů. Požadavky správce byly zpracovány do projektové dokumentace pro PDPS. K zpracování realizační dokumentace stavby v roce 2016 obdržel projektant požadavek současného správce vodovodu Technických služeb města Úvaly, ve kterém současný správce požaduje rozšíření trasy přeložky vodovodu od křižovatky ulic 5. května x Dvořákova až za most SO 231 z důvodu havarijního stavu řadu a hranici životnosti materiálů.

Za zhotovitele: Ing. Václav Leiternann

Datum:

PORR a.s.

-182-

20. 6. 2017

Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 43005560

Zdůvodnění nových položek a jednotkových cen						ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS):		313/I
						Skupina		3
Stavba číslo, název:		III/01214 Úvaly u Prahy, průtah - úsek 3						
SO číslo a název :		SO 313 - Přeložky vodovodů						
Číslo ZBV:		SO 313 - Přeložky vodovodů						
Č. Pol.	KÓD	TYP	POPIS	M.J.	MNOŽSTVÍ	JC		
	60 119001421	N	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	M	6,000	179,68		
- nová položka v soupisu prací SO 313 je shodná s položkou z výskytu položek SOD stavby. Nachází se v soupisu prací SO 103, proto je její JC převzata z této shodné položky.								
SO 103/ 14	119001421		Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	M	4,000	179,68		
	51 131201202	N	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	M3	24,000	358,11		
- nová položka v soupisu prací SO 313 je shodná s položkou z výskytu položek SOD stavby. Nachází se v soupisu prací SO 133, proto je její JC převzata z této shodné položky.								
SO 133/11	131201202		Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	M3	356,272	358,11		
	52 452313151	N	Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 20/25 otevřený výkop	M3	5,000	2.810,00		
- nová položka v soupisu prací SO 313 není shodná s žádnou položkou z výskytu položek SOD stavby. Proto je její JC převzata ze shodné položky z cenové soustavy ÚRS 2016/II pololetí.								
	53 452353101	N	Bednění podkladních bloků otevřený výkop	M2	20,000	364,00		
- nová položka v soupisu prací SO 313 není shodná s žádnou položkou z výskytu položek SOD stavby. Proto je její JC převzata ze shodné položky z cenové soustavy ÚRS 2016/II pololetí.								
	54 850315121	N	Výřez nebo výsek na potrubí z trub plastických tlakových DN 150 vč.uzavření, vypuštění a	KUS	3,000	2.550,00		
- nová položka v soupisu prací SO 313 není shodná s žádnou položkou z výskytu položek SOD stavby. Proto je její JC převzata ze shodné položky z cenové soustavy ÚRS 2016/II pololetí.								
	55 851311131	N	Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním DN 150	M	36,000	187,00		
- nová položka v soupisu prací SO 313 není shodná s žádnou položkou z výskytu položek SOD stavby. Proto je její JC převzata ze shodné položky z cenové soustavy ÚRS 2016/II pololetí.								
	57 552519030	N	trouba vodovodní litinová DN 150 STD L=6,0m vč.těsnícího kroužku pro spoj	KUS	1,000	11.800,00		
- nová položka v soupisu prací SO 313 není shodná s žádnou položkou z výskytu položek SOD stavby. Proto je její JC převzata ze shodné položky z cenové soustavy ÚRS 2016/II pololetí.								
	58 552519150	N	trouba vodovodní litinová ISOPAM DN 150/260 L= 6m STD + manžeta + izol.kroužek + těsnící	KUS	5,000	62.500,00		
- nová položka v soupisu prací SO 313 není shodná s žádnou položkou z výskytu položek SOD stavby. Proto je její JC převzata ze shodné položky z cenové soustavy ÚRS 2016/II pololetí.								
	59 857311131	N	Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 150	KUS	11,000	514,00		
- nová položka v soupisu prací SO 313 není shodná s žádnou položkou z výskytu položek SOD stavby. Proto je její JC převzata ze shodné položky z cenové soustavy ÚRS 2016/II pololetí.								

Zdůvodnění nových položek a jednotkových cen							ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS):	313/1
							Skupina	3
Stavba číslo, název:	III/01214 Úvaly u Prahy, průtah - úsek 3							
SO číslo a název :	SO 313 - Přeložky vodovodů							
Číslo ZBV:	SO 313 - Přeložky vodovodů							
Č. Pol.	KÓD	TYP	POPIS	M.J.	MNOŽSTVÍ	JC		
60	552000001	N	WAGA spojka Synoflex hrdlová litinová jistěná proti posunu pro propoj potrubí d160 - nová položka v soupisu prací SO 313 není shodná s žádnou položkou z výskytu položek SOD stavby ani se nenachází v cenové soustavě ÚRS 2016/II pololetí, proto je její JC stanovena na základě individuální kalkulace položky (výběrovým řízením)	KUS	5,000	8.100,00		
61	552000002	N	Spojka pro spojení 2 hladkých konců trubek ULTRALINK NG - nová položka v soupisu prací SO 313 není shodná s žádnou položkou z výskytu položek SOD stavby ani se nenachází v cenové soustavě ÚRS 2016/II pololetí, proto je její JC stanovena na základě individuální kalkulace položky (výběrovým řízením)	KUS	2,000	1.566,00		
62	552594850	N	koleno hrdlové MMQ tvárná litina DN 150-90° vč. těsnícího kroužku - nová položka v soupisu prací SO 313 není shodná s žádnou položkou z výskytu položek SOD stavby. Proto je její JC převzata ze shodné položky z cenové soustavy ÚRS 2016/II pololetí.	KUS	5,000	4.820,00		
63	286149390	N	elektrokoleno 90°, PE 100, PN 16, d 160 - nová položka v soupisu prací SO 313 není shodná s žádnou položkou z výskytu položek SOD stavby. Proto je její JC převzata ze shodné položky z cenové soustavy ÚRS 2016/II pololetí.	KUS	4,000	3.220,00		
64	286149510	N	elektrokoleno 45°, PE 100, PN 16, d 160 - nová položka v soupisu prací SO 313 není shodná s žádnou položkou z výskytu položek SOD stavby. Proto je její JC převzata ze shodné položky z cenové soustavy ÚRS 2016/II pololetí.	KUS	2,000	3.140,00		
65	286149630	N	elektro T-kus rovnoramenný, PE 100, PN 16, d 160 - nová položka v soupisu prací SO 313 není shodná s žádnou položkou z výskytu položek SOD stavby. Proto je její JC převzata ze shodné položky z cenové soustavy ÚRS 2016/II pololetí.	KUS	1,000	2.880,00		
66	286000001	N	Oblouk PE 22° - nová položka v soupisu prací SO 313 není shodná s žádnou položkou z výskytu položek SOD stavby. Proto je její JC převzata ze shodné položky z cenové soustavy ÚRS 2016/II pololetí.	KUS	1,000	5.184,00		
67	286000002	N	Oblouk PE 15° - nová položka v soupisu prací SO 313 není shodná s žádnou položkou z výskytu položek SOD stavby ani se nenachází v cenové soustavě ÚRS 2016/II pololetí, proto je její JC stanovena na základě individuální kalkulace položky (výběrovým řízením)	KUS	1,000	5.184,00		
68	286000003	N	Oblouk PE 10°, 6° - nová položka v soupisu prací SO 313 není shodná s žádnou položkou z výskytu položek SOD stavby ani se nenachází v cenové soustavě ÚRS 2016/II pololetí, proto je její JC stanovena na základě individuální kalkulace položky (výběrovým řízením)	KUS	2,000	5.184,00		

Zdůvodnění nových položek a jednotkových cen										ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS):		313/1	
										Skupina		3	
Stavba číslo, název:		III/01214 Úvaly u Prahy, průtah - úsek 3											
SO číslo a název :		SO 313 - Přeložky vodovodů											
Číslo ZBV:		SO 313 - Přeložky vodovodů											
Č. Pol.	KÓD	TYP	POPIS	M.J.	MNOŽSTVÍ							JC	
			- nová položka v soupisu prací SO 313 není shodná s žádnou položkou z výskytu položek SOD stavby ani se nenachází v cenové soustavě ÚRS 2016/II pololetí, proto je její JC stanovena na základě individuální kalkulace položky (výběrovým řízením)										
	69	879171111	N	Montáž vodovodní přípojky na potrubí DN 32	KUS	1,000							373,00
			- nová položka v soupisu prací SO 313 není shodná s žádnou položkou z výskytu položek SOD stavby. Proto je její JC převzata ze shodné položky z cenové soustavy ÚRS 2016/II pololetí.										
	70	891311112	N	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 150 vč.osazení zemní soupravy	KUS	3,000							1.210,00
			- nová položka v soupisu prací SO 313 není shodná s žádnou položkou z výskytu položek SOD stavby. Proto je její JC převzata ze shodné položky z cenové soustavy ÚRS 2017/I pololetí.										
	71	422213060	N	šoupátko pitná voda PN10/16 DN 150	KUS	3,000							10.200,00
			- nová položka v soupisu prací SO 313 není shodná s žádnou položkou z výskytu položek SOD stavby. Proto je její JC převzata ze shodné položky z cenové soustavy ÚRS 2016/II pololetí.										
	72	422910740	N	souprava zemní pro šoupátka DN 150 mm, Rd 1,5 m	KUS	3,000							625,00
			- nová položka v soupisu prací SO 313 není shodná s žádnou položkou z výskytu položek SOD stavby. Proto je její JC převzata ze shodné položky z cenové soustavy ÚRS 2016/II pololetí.										
	73	899121102	N	Osazení poklopů šoupátkových	KUS	3,000							244,00
			- nová položka v soupisu prací SO 313 není shodná s žádnou položkou z výskytu položek SOD stavby. Proto je její JC převzata ze shodné položky z cenové soustavy ÚRS 2017/I pololetí.										
	74	422913520	N	poklop litinový šoupátkový	KUS	3,000							1.060,00
			- nová položka v soupisu prací SO 313 není shodná s žádnou položkou z výskytu položek SOD stavby. Proto je její JC převzata ze shodné položky z cenové soustavy ÚRS 2016/II pololetí.										
	75	422714150	N	pas navrtávací z tvárné litiny DN 150, rozsah (168-271), odbočky 1",5/4",6/4",2"	KUS	1,000							906,00
			- nová položka v soupisu prací SO 313 není shodná s žádnou položkou z výskytu položek SOD stavby. Proto je její JC převzata ze shodné položky z cenové soustavy ÚRS 2016/II pololetí.										
	76	422910570	N	souprava zemní pro navrtávací pas s kohoutem Rd 1,5 m	KUS	1,000							490,00
			- nová položka v soupisu prací SO 313 není shodná s žádnou položkou z výskytu položek SOD stavby. Proto je její JC převzata ze shodné položky z cenové soustavy ÚRS 2016/II pololetí.										
	77	422914020	N	poklop litinový ventilový	KUS	1,000							461,00
			- nová položka v soupisu prací SO 313 není shodná s žádnou položkou z výskytu položek SOD stavby. Proto je její JC převzata ze shodné položky z cenové soustavy ÚRS 2016/II pololetí.										
	78	899914113	N	Montáž ocelové chráničky D 273 x 10 mm	M	3,000							1.330,00

Zdůvodnění nových položek a jednotkových cen						ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS):		313/1
						Skupina		3
Stavba číslo, název:								
III/01214 Úvaly u Prahy, průtah - úsek 3								
SO číslo a název :								
SO 313 - Přeložky vodovodů								
Číslo ZBV:								
SO 313 - Přeložky vodovodů								
Č. Pol.	KÓD	TYP	POPIS	M.J.	MNOŽSTVÍ	JC		
- nová položka v soupisu prací SO 313 není shodná s žádnou položkou z výskytu položek SOD stavby. Proto je její JC převzata ze shodné položky z cenové soustavy ÚRS 2016/II pololetí.								
79	140111100	N	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353, 273 x 7,0 mm	M	3,000	1.830,00		
- nová položka v soupisu prací SO 313 není shodná s žádnou položkou z výskytu položek SOD stavby. Proto je její JC převzata ze shodné položky z cenové soustavy ÚRS 2016/II pololetí.								
80	893914115	N	Montáž ocelové chráničky D 377 x 10 mm	M	14,000	1.425,73		
- nová položka v soupisu prací SO 313 není shodná s žádnou položkou z výskytu položek SOD stavby ani se nenachází v cenové soustavě ÚRS 2016/II pololetí, proto je její JC stanovena na základě individuální kalkulace položky (výběrovým řízením)								
81	140111111	N	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353, 373 x 10 mm	M	14,000	1.976,40		
- nová položka v soupisu prací SO 313 není shodná s žádnou položkou z výskytu položek SOD stavby ani se nenachází v cenové soustavě ÚRS 2016/II pololetí, proto je její JC stanovena na základě individuální kalkulace položky (výběrovým řízením)								
82	230200120	N	Nasunutí potrubí DN 150 do ocelové chráničky DN 250 vč.montáže a dodávky objímek	M	17,000	1.504,57		
- nová položka v soupisu prací SO 313 není shodná s žádnou položkou z výskytu položek SOD stavby ani se nenachází v cenové soustavě ÚRS 2016/II pololetí, proto je její JC stanovena na základě individuální kalkulace položky (výběrovým řízením)								
83	899913152	N	Uzavírací manžeta chráničky potrubí DN 150 x 250	KUS	4,000	1.120,00		
- nová položka v soupisu prací SO 313 není shodná s žádnou položkou z výskytu položek SOD stavby. Proto je její JC převzata ze shodné položky z cenové soustavy ÚRS 2016/II pololetí.								
84	892372111	N	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	KUS	3,000	5.930,00		
- nová položka v soupisu prací SO 313 není shodná s žádnou položkou z výskytu položek SOD stavby. Proto je její JC převzata ze shodné položky z cenové soustavy ÚRS 2016/II pololetí.								
85	899431111	N	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	KUS	1,000	908,42		
- nová položka v soupisu prací SO 313 je shodná s položkou z výskytu položek SOD stavby. Nachází se v soupisu prací SO 103, proto je její JC převzata z této shodné položky.								
SO 103/91	899431111		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	KUS	30,000	908,42		
86	8999111R1	N	Ocelová podpěra se sedlem pro vedení litinového potrubí na mostu vč.upevňovací objímky a	kus	5,000	2.700,00		

Zdůvodnění nových položek a jednotkových cen					ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS):	313/1
					Skupina	3
Stavba číslo, název:	III/01214 Úvaly u Prahy, průtah - úsek 3					
SO číslo a název :	SO 313 - Přeložky vodovodů					
Číslo ZBV:	SO 313 - Přeložky vodovodů					
Č. Pol.	KÓD	TYP	POPIS	M.J.	MNOŽSTVÍ	JC
			- nová položka v soupisu prací SO 313 není shodná s žádnou položkou z výskytu položek SOD stavby ani se nenachází v cenové soustavě ÚRS 2016/II pololetí, proto je její JC stanovena na základě individuální kalkulace položky (výběrovým řízením)			
87	8999111R2	N	kompenzátor potrubí litinového DN150	kus	1,000	16.200,00
			- nová položka v soupisu prací SO 313 není shodná s žádnou položkou z výskytu položek SOD stavby ani se nenachází v cenové soustavě ÚRS 2016/II pololetí, proto je její JC stanovena na základě individuální kalkulace položky (výběrovým řízením)			

Za zhotovitele:

Ing. Václav Leitermann

PORR a.s.

-182-

Datum:

20.6.2017

Dubčická 3238/36

100 00 Praha 10, Strašnice

IČO: 43005560

Název a evidenční číslo Stavby: III/01214 Úvaly u Prahy, průtah - úsek 3
 Číslo a název SO/PS: SO 313 - Přeložky vodovodů

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS): SO 313/ZBV1									
Skupina Vícepráci: 3									
rezie 8%									
Č. Pol.	Kód položky	Popis položky	Množství	Měrná jednotka	Jednotková cena (JČ)	Výkon	Materiál	Mzdy	Stroje
								Subdotávky	JČ
								nákladová	JČ odbytová

60	552000001	WAGA spojka Synoflex hrdlová litinová lištěná proti posunu pro propoj potrubí d160	1,000	KUS	8.100,00					7.500,00	8.100,00
		<i>Výběrové řízení</i>									
		POHL cz, a.s.	1,000	KUS						7.500,00	
		Lavimont Overseas, s.r.o.	1,000	KUS						8.000,00	
		JUBOCAR spol. s.r.o.	1,000	KUS						7.710,00	
		WAGA spojka Synoflex hrdlová litinová lištěná proti posunu pro propoj potrubí d160									
		WAGA spojka Synoflex hrdlová litinová lištěná proti posunu pro propoj potrubí d160									
		WAGA spojka Synoflex hrdlová litinová lištěná proti posunu pro propoj potrubí d160									

Název a evidenční číslo Stavby: III/01214 Úvaly u Prahy, průtah - úsek 3
 Číslo a název SO/PS: SO 313 - Přeložky vodovodů

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS): SO 313/ZBY1												
Skupina Vícepráci: 3												
8% režie												
Č. Pol.	Kód položky	Popis položky	Množství	Měrná jednotka	Jednotková cena (JCS)	Výkon	Materiál	Mzdy	Stroje	Subdodávky	JC nákladová	JC odbytová
61	552000002	Spolka pro spojení 2 hladkých konců trubek ULTRALINK NG	1,000	KUS	1,566.00						1,450.00	1,566.00
Výběrové řízení												

61	552000002	Spolka pro spojení 2 hladkých konců trubek ULTRALINK NG Výběrové řízení	1,000	KUS	1.566,00						1.450,00	1.566,00
POHL cz, a.s.												
Lavimont Overseas, s.r.o. Spolka pro spojení 2 hladkých konců trubek ULTRALINK NG												
JUBOCAR spol. s.r.o. Spolka pro spojení 2 hladkých konců trubek ULTRALINK NG												
			1,000	KUS							1.450,00	
			1,000	KUS							1.480,00	
			1,000	KUS							1.489,00	

Název a evidenční číslo Stavby: III/01214 Úvaly u Prahy, průtah - úsek 3
Číslo a název SO/PS: SO 313 - Přeložky vodovodů

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS):	SO 313/ZB1
Skupina Viceprací:	3
režie	8%

Č. Pol.	Kód položky	Popis položky	Množství	Měrná jednotka	Jednotková cena (JC)	Výkon	Materiál	Mzdy	Stroje	Subdávky	JC nákladové	JC odbytová
66	286000001	Oblouk PE 22°	1,000	KUS	5.184,00						4.800,00	5.184,00

Výběrové řízení
POHL cz, a.s. Oblouk PE 22°
Lavimont Overseas, s.r.o. Oblouk PE 22°
JUBOCAR spol. s.r.o. Oblouk PE 22°

1,000 KUS
1,000 KUS
1,000 KUS
4.800,00
4.950,00
4.875,00

Název a evidenční číslo Stavby: III/01214 Úvaly u Prahy, průtah - úsek 3
 Číslo a název SO/PS: SO 313 - Přeložky vodovodů

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS):	SO 313/ZBV1
Skupina Viceprací:	3
režie	8%

Č. Pol.	Kód položky	Popis položky	Množství	Měrná jednotka	Jednotková cena (JC)	Výkon	Materiál	Mzdy	Stroje	Subdodávky	JC nákladové	JC odbytové
67	286000002	Oblouk PE 15°	1,000	KUS	5,184,00						4,800,00	5,184,00

Výpěrové řízení

POHL cz, a.s. Oblouk PE 15°

Lavimont Overseas, s.r.o. Oblouk PE 15°

JUBOCAR spol. s.r.o. Oblouk PE 15°

1,000 KUS 4,800,00
 1,000 KUS 4,900,00
 1,000 KUS 4,875,00

Název a evidenční číslo Stavby: III/01214 Úvaly u Prahy, průtah - úsek 3
Číslo a název SO/PS: SO 313 - Přeložky vodovodů

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS):	SO 313/ZBV1
Skupina Vícepráci:	3
režie	8%

Č. Pol.	Kód položky	Popis položky	Množství	Měrná jednotka	Jednotková cena (JC)	Výkon	Materiál	Mzdy	Stroje	Subdodávky	JC nákladová	JC odbytová
68	286000003	Oblouk PE 10°, 6° Výběrové řízení	1,000	KUS	5.184,00						4.800,00	5.184,00

POHL cz, a.s.
Lavimont Overseas, s.r.o.
JUBOCAR spol. s r.o.

1,000 KUS
1,000 KUS
1,000 KUS

4.800,00
4.850,00
4.820,00

Název a evidenční číslo Stavby: III/01214 Úvaly u Prahy, průtah - úsek 3
Číslo a název SO/PS: SO 313 - Přeložky vodovodu

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS):	SO 313/ZBV1
Skupina Viceprací:	3
režie	8%

Č. Pol.	Kód položky	Popis položky	Množství	Měrná jednotka	Jednotková cena (JC)	Výkon	Materiál	Mzdy	Stroje	Subdodávky	JC nakladová	JC odbytová
80	893914115	Montáž ocelové chráničky D 377 x 10 mm	1,000	m	1.425,73						1.320,12	1.425,73

Výběrové řízení

POHL cz, a.s. Montáž ocelové chráničky D 377 x 10 mm 1,000 m 1.320,12
Lavimont Overseas, s.r.o. Montáž ocelové chráničky D 377 x 10 mm 1,000 m 1.540,00
JUBOCAR spol. s.r.o. Montáž ocelové chráničky D 377 x 10 mm 1,000 m 1.450,00

Název a evidenční číslo Stavby: III/01214 Úvaly u Prahy, průtah - úsek 3
 Číslo a název SO/PS: SO 313 - Přeložky vodovodů

ENA SOUPISU PRACÍ (SO/PS): 313/ZBV1	
Skupina Všepráci:	3
režie 8%	

Č. Pol.	Kod položky	Popis položky	Množství	Měrná jednotka	Jednotková cena (JC)	Výkon	Materiál	Mzdy	Stroje	Subdotě vky	JC nákladov	JC odbytová
81	1401111	trubka ocelová bežešvá hladká jakost 11 353, 373 x 10 mm	1,000	m	1.976,40						1.830,00	1.976,40

Výběrové řízení

POHL cz, a.s. trubka ocelová bežešvá hladká jakost 11 353, 373 x 10 mm 1,000 m 1.830,00
 Lavimont Overseas, s trubka ocelová bežešvá hladká jakost 11 353, 373 x 10 mm 1,000 m 1.980,00
 JUBOCAR spol. s.r.o. trubka ocelová bežešvá hladká jakost 11 353, 373 x 10 mm 1,000 m 1.925,00

Název a evidenční číslo Stavby: III/01214 Úvaly u Prahy, průtah - úsek 3
 Číslo a název SO/PS: SO 313 - Přeložky vodovodů

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS): SO 313/ZBV1												
Skupina Viceprací: 3												
8%												
režie												
Č. Pol.	Kód položky	Popis položky	Množství	Měrná jednotka	Jednotková cena (JC)	Výkon	Materiál	Mzdy	Stroje	Subdotazy	JC nákladová	JC odbytová
82	230200120	Nasunutí potrubí DN 150 do ocelové chráničky DN 250 vč.montáže a dodávky objímek	1,000	m	1,504,57						1,393,12	1,504,57
Výběrové řízení												
POHL cz, a.s.												
Nasunutí potrubí DN 150 do ocelové chráničky DN 250 vč.montáže a dodávky objímek												
Lavimont Overseas, s.l												
Nasunutí potrubí DN 150 do ocelové chráničky DN 250 vč.montáže a dodávky objímek												
JUBOCAR spol. s.r.o.												
Nasunutí potrubí DN 150 do ocelové chráničky DN 250 vč.montáže a dodávky objímek												
											1,393,12	
											1,527,00	
											1,454,00	

Název a evidenční číslo Stavby: III/01214 Úvaly u Prahy, průtah - úsek 3
 Číslo a název SO/PS: SO 313 - Přeložky vodovodů

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS):	SO 313/ZBV1
Skupina Víceprací:	3
režie	8%

Č. Pol.	Kód položky	Popis položky	Množství	Mírná jednotka	Jednotková cena (JC)	Výkon	Mzdy	Stroje	Subdodávky	JC nákladová	JC odbytová
86	8999111R1	Ocelová podpěra se sedlem pro vedení litinového potrubí na mostu vč. upevňovací objímky a ochranné kaučukové podložky - montáž a dodávka vč. dopravy	1,000	KUS	2.700,00					2.500,00	2.700,00

Výběrové řízení

POHL cz, a.s.
 Ocelová podpěra se sedlem pro vedení litinového potrubí na mostu
 vč. upevňovací objímky a ochranné kaučukové podložky - montáž a dodávka
 vč. dopravy

Lavimont Overseas, s.r.o.
 Ocelová podpěra se sedlem pro vedení litinového potrubí na mostu vč. upevňovací
 objímky a ochranné kaučukové podložky - montáž a dodávka vč. dopravy

JUBOCAR spol. s.r.o.
 Ocelová podpěra se sedlem pro vedení litinového potrubí na mostu vč. upevňovací
 objímky a ochranné kaučukové podložky - montáž a dodávka vč. dopravy

1,000 KUS 2.500,00
 1,000 KUS 3.541,00
 1,000 KUS 3.450,00

Název a evidenční číslo Stavby: III/01214 Úvaly u Prahy, průtah - úsek 3
 Číslo a název SO/PS: SO 313 - Přeložky vodovodů

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS):	SO 313/ZBVI
Skupina Víceprací:	3
režie	8%

Č. Pol.	Kód položky	Popis položky	Množství	Měrná jednotka	Jednotková cena (JČ)	Výkon	Materiál	Mzdy	Stroje	Subdodávky	JČ nákladová	JČ odbytová
87	8999111R2	kompenzátor potrubí litinového DN150	1,000	KUS	16.200,00						15.000,00	16.200,00

Výběrové řízení

POHL cz. a.s. kompenzátor potrubí litinového DN150
 Lavimont Overseas, s.r.o. kompenzátor potrubí litinového DN150
 JUBOCAR spol. s.r.o. kompenzátor potrubí litinového DN150

1,000 KUS
 1,000 KUS
 1,000 KUS

15.000,00
 17.418,00
 19.800,00

TABULKA ZMĚN A REVIZÍ

P.Č.	VYPRACOVAL:	POPIS ZMENY/REVIZE:	PODPIS:

OBJEDNATEL


Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
Zborovská 11, 150 21 Praha 5



NEZÁVISLÝ DOZOR



T-KOMPLET s.r.o.
Hatě 523
261 01 Příbram III



Hatě 523, 261 01 Příbram III
IČ: 015 04 398, tel.: 777 284 462

GENERÁLNÍ ZHOTOVITEL STAVBY



Porr a.s., odštěpný závod - Čechy
Dubčeská 3238/36
100 00 Praha 10

Porr a.s.
odštěpný závod - Čechy
Ing. Václav Lehmarmann - stavby, technici
100 00 Praha 10, Dubčeská 3238/36
IČO: 43005560

ZHOTOVITEL STAVBY



POHL cz, a.s.
Nádražní 25
252 63 Roztoky

PROJEKTANT



NOZA s.r.o.
Huťská 229, 272 01 Kladno
Č. ZÁKAZKY: 2016179P

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: ING. PETR FOJT

PROJEKTANT OBJEKTU

NOZA s.r.o.
Huťská 229, 272 01 Kladno

VYPRACOVAL: ING. LOMNICKÝ

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. LOMNICKÝ

SCHVÁLIL: ING. PETR FOJT

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

VÝŠKOVÝ SYSTÉM B.p.v.

KRAJ: STŘEDOČESKÝ

OKRES: PRAHA - VÝCHOD

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ÚVALY U PRAHY



S0-313

III/01214 ÚVALY U PRAHY, PRŮTAH - ÚSEK Č.3		STUPEŇ	RDS
NÁZEV OBJEKTU: S0 313 - PŘELOŽKY VODOVODŮ - ZMĚNA 1.		DATUM	09/2016
NÁZEV PŘÍLOHY: REALIZAČNÍ DOKUMENTACE STAVBY		FORMÁT	-
		MĚŘÍTKO	-
		Č. ZAK.	2016179P
		Č. PAR.	Č. PŘÍLOHY
		8	C

Rozpis ocenění změn položek - pro změnu stavby (ZBV) číslo

III/01214 Úvaly u Prahy, průtah - úsek 3

Rekonstrukce silnice III/01214

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) SO 313, č. 1 vodovod

PČ	TYP	Kód	Popis	MJ	Množství ve smlouvě	Množství ve změně	Množství v rozdílu	J.cena [CZK]	Cena celkem ve smlouvě [CZK]	méně práce ve změně	vícepráce ve změně	Cena ve změně celkem	rozdíl cen celkem [CZK]	rozdíl cen celkem v %
Náklady soupisu celkem														
		1	Zemní práce						37 497,46	0,00	29 327,74	55 651,44	29 327,74	67,38%
1		103715099	zemina pro násypy a zásypy, nakupovaná ornice tříděná zahradní	M3	114,953	314,853	199,900		0,000		0,00	0,00	0,00	#DĚLENÍ_NULOU!
			Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200											
2		119001401	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvážení, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jistovací konstrukce, s opořebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité světlosti DN do 200	M	3,200	3,200	0,000		0,000		0,00	0,00	0,00	#DĚLENÍ_NULOU!
			Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 200											
3		119001411	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvážení, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jistovací konstrukce, s opořebením hmot potrubí betonového, kameninového nebo železobetonového, světlosti DN do 200	M	3,200	13,200	10,000		0,000		0,00	0,00	0,00	#DĚLENÍ_NULOU!
			Příplatek za zřízení výkopů v blízkosti podzemního vedení											
4		130001101	Příplatek k cenám hloubených výkopů za zřízení výkopů v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	M3	9,600	25,600	16,000		0,000		0,00	0,00	0,00	#DĚLENÍ_NULOU!

5	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3	M3	151,681	380,381	228,700			0,000		0,00	0,00	0,00	#DĚLENÍ_NULOU!
6	132201209	Příplatek za lepičnost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepičnost horniny tř. 3	M3	15,168	38,038	22,870			0,000		0,00	0,00	0,00	#DĚLENÍ_NULOU!
7	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeptření stěn rýh hl do 2 m Zřízení pažení a rozeptření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	M2	225,743	696,743	471,000			0,000		0,00	0,00	0,00	#DĚLENÍ_NULOU!
8	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeptření stěn rýh hl do 2 m Odstranění pažení a rozeptření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m	M2	225,743	696,743	471,000			0,000		0,00	0,00	0,00	#DĚLENÍ_NULOU!
9	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	M3	151,681	404,381	252,700			0,000		0,00	0,00	0,00	#DĚLENÍ_NULOU!
10	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	M3	151,681	404,381	252,700			0,000		0,00	0,00	0,00	#DĚLENÍ_NULOU!
11	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovné) Uložení sypání poplatek za uložení sypání na skládce (skládkovné)	T	273,026	727,886	454,860			0,000		0,00	0,00	0,00	#DĚLENÍ_NULOU!
12	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhutněním Zásyp sypáním z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	M3	114,953	314,853	199,900			0,000		0,00	0,00	0,00	#DĚLENÍ_NULOU!

13	175151101	Obsypání potrubí strojné sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	M3	29,992	65,192	35,200		0,000		0,00	0,00	0,00	#DĚLENÍ_NULOU!
14	583312001	Obsypání potrubí strojné sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny											
		šterkopiesek netříděný zásypový materiál											
		kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, šterkopiesky) kamenivo mimo normu šterkopiesek netříděný	T	56,685	128,495	71,810		0,000		0,00	0,00	0,00	#DĚLENÍ_NULOU!
	1	Zemní práce											
	4	Vodorovné konstrukce											
15	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	M3	6,736	24,336	17,600		0,000		0,00	0,00	0,00	#DĚLENÍ_NULOU!
		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm											
	4	Vodorovné konstrukce											
	8	Trubní vedení											
16	280003216	šoupátko pro domovní přípojky DN 32-5/4" šoupátko ISO pro domovní přípojky 2800 DN 32-5/4"	KUS	2,000	3,000	1,000		0,000		0,00	0,00	0,00	#DĚLENÍ_NULOU!
17	286131110	potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 100 m, 40 x 3,7 mm	M	3,045	12,045	9,000		0,000		0,00	0,00	0,00	#DĚLENÍ_NULOU!
		trubky z polyetylénu vodovodní potrubí PE PE100 SDR 11 PN16 tyče 6 m, 12 m, návin 100 m 40 x 3,7 mm, tyče + návin											
18	286131180	potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 12 m, 160 x 14,6 mm	M	80,185	217,185	137,000		0,000		0,00	0,00	0,00	#DĚLENÍ_NULOU!
		trubky z polyetylénu vodovodní potrubí PE PE100 SDR 11 PN16 tyče 6 m, 12 m, návin 100 m 160 x 14,6 mm, tyče											
19	286530161	elektrospojka PE , d 40 mm	KUS	2,030	2,030	0,000		0,000		0,00	0,00	0,00	#DĚLENÍ_NULOU!
		prvky kompletační z polyetylénu pro trubky elektrovarovky PE ke svařování s potrubím PE PE100, SDR 11, voda PN 16, plyn PN 10											
20	286530281	elektrospojka PE , d 160 mm	KUS	4,060	16,060	12,000		0,000		0,00	0,00	0,00	#DĚLENÍ_NULOU!
		prvky kompletační z polyetylénu pro trubky elektrovarovky PE ke svařování s potrubím PE PE100, SDR 11, voda PN 16, plyn PN 10											
		elektrospojky typ LU D 110 mm											

21	286530615	elektrokole 11°, WS 11 d 160 mm Prvky kompletní z polyetylénu pro trubky elektrovarovky PE ke svařování s potrubím PE PE100, SDR 11, voda PN 16, plyn PN 10 elektrokole 90°, typ LU PE100, SDR 11, voda PN 16, plyn PN 10 včetně uchycení pomocí šroubů D 90 mm SDR 11-17/17,6	KUS	8,120	8,120	8,120	0,000			0,000		0,00	0,00	0,00	#DĚLENÍ_NULOU!
22	372005416	uzávěr nástavcový k pasům DN 5/4"-6/4" (výst/pas) PŘISLUŠENSTVÍ: UZÁVĚR NÁSTAVCOVÝ K PASUM DN 5/4"-6/4" (výst/pas)	KUS	2,000	2,000	2,000	0,000			0,000		0,00	0,00	0,00	#DĚLENÍ_NULOU!
23	422913541	podkladní deska pro poklop šoupátkový PODKLADOVÁ DESKA UNIVERZÁLNÍ ŠOUPÁTKOVÁ	KUS	2,000	2,000	2,000	0,000			0,000		0,00	0,00	0,00	#DĚLENÍ_NULOU!
24	422913591	poklop uliční těžký pro domovní šoupátka POKLOPY DOMOVNÍ PŘÍPOJKY ULIČNÍ TÍŽKÝ VODA	KUS	2,000	2,000	2,000	0,000			0,000		0,00	0,00	0,00	#DĚLENÍ_NULOU!
25	531016064	pas navrtávací uzavírací DN 160-6/4" NAVRTÁVACÍ PASY NAVRTÁVACÍ UZAVÍRACÍ HAKU DN 160-6/4"	KUS	2,000	2,000	2,000	0,000			0,000		0,00	0,00	0,00	#DĚLENÍ_NULOU!
26	871161281	Demontáž potrubí z PE100 otevřený výkop D 32 x 3,0 mm Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylénu PE 100 svařovaných elektrovarovkou SDR 11/PN16 D 32 x 3,0 mm	M	3,000	3,000	3,000	0,000			0,000		0,00	0,00	0,00	#DĚLENÍ_NULOU!
27	871171211	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrovarovkou D 40 x 3,7 mm Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylénu PE 100 svařovaných elektrovarovkou SDR 11/PN16 D 40 x 3,7 mm	M	3,000	3,000	12,000	9,000			0,000		0,00	0,00	0,00	#DĚLENÍ_NULOU!
28	871321211	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrovarovkou D 160 x 14,6 mm Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylénu PE 100 svařovaných elektrovarovkou SDR 11/PN16 D 160 x 14,6 mm	M	79,000	214,000	135,000				0,000					
29	871321281	Demontáž potrubí z PE100 otevřený výkop D 160 Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylénu PE 100 svařovaných elektrovarovkou SDR 11/PN16 D 160 x 14,6 mm	M	79,000	79,000		0,000			0,000		0,00	0,00	0,00	#DĚLENÍ_NULOU!
30	877321101	Montáž elektrospojky na potrubí z PE trub D 160 Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylénu PE 100 elektrovarovkou SDR 11/PN16 spojek nebo redukci D 160	KUS	12,000	33,000	21,000				0,000		0,00	0,00	0,00	#DĚLENÍ_NULOU!
31	891181113	Montáž vodovodních šoupátek pro domovní přípojky otevřený výkop DN 32 Montáž vodovodních šoupátek pro domovní přípojky otevřený výkop DN 25	KUS	2,000	2,000		0,000			0,000		0,00	0,00	0,00	#DĚLENÍ_NULOU!

32	891319111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 150 Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 Mpa, na potrubí z trub ošinkocementových, litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 150	KUS	2,000	3,000	1,000		0,000		0,00	0,00	0,00	#DĚLENÍ_NULOU!
33	892233121	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	M	3,000	3,000	0,000		0,000		0,00	0,00	0,00	#DĚLENÍ_NULOU!
34	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	M	3,000	3,000	0,000		0,000					
35	892351111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200	M	79,000	250,000	171,000		0,000		0,00	0,00	0,00	#DĚLENÍ_NULOU!
36	892353121	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200 Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200	M	79,000	250,000	171,000		0,000					
37	898241111	Demontáž vodovodních šoupátek otevřený výkop Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80	KUS	2,000	2,000	0,000		0,000		0,00	0,00	0,00	#DĚLENÍ_NULOU!
38	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových Osazení poklopů litinových šoupátkových	KUS	2,000	3,000	1,000		0,000		0,00	0,00	0,00	#DĚLENÍ_NULOU!
39	899401812	Demontáž poklopů litinových šoupátkových Osazení poklopů litinových šoupátkových	KUS	2,000	2,000	0,000	0,00	0,000		0,00	0,00	0,00	#DĚLENÍ_NULOU!
40	899712111	Orientační tabulky na zdivu Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu	KUS	2,000	2,000	0,000		0,000		0,00	0,00	0,00	#DĚLENÍ_NULOU!
41	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC Signalizační vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	M	85,000	235,000	150,000		0,000		0,00	0,00	0,00	#DĚLENÍ_NULOU!
42	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34cm	M	82,000	232,000	150,000		0,000		0,00	0,00	0,00	#DĚLENÍ_NULOU!
43	960103401	souprava zemní teleskopická pro domovní šoupátka DN 3/4"-2" (1,3-1,8m) souprava zemní teleskopická pro domovní šoupátka 9601 DN 3/4"-2" (1,3-1,8m)	KUS	2,000	2,000	0,000		0,000		0,00	0,00	0,00	#DĚLENÍ_NULOU!
	8	Trubní vedení											
	997	Přesun sutě											

44	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	T	0,525	1,145	0,620		0,000		0,00	0,00	0,00	#DĚLENÍ_NULOU!
45	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	T	9,975	21,755	11,780		0,000		0,00	0,00	0,00	#DĚLENÍ_NULOU!
46	997013512	Odvoz vybouraných hmot kovových konstrukcí na skládku k recyklaci do 1 km s naložením a se složením Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	T	0,054	0,054	0,000		0,000		0,00	0,00	0,00	#DĚLENÍ_NULOU!
47	997013519	Příplatek k odvozu vybouraných hmot kovových konstrukcí na skládku k recyklaci ZKD 1 km přes 1 km Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	T	0,054	0,054	0,000		0,000		0,00	0,00	0,00	#DĚLENÍ_NULOU!
48	997013813	Poplatek za uložení stavebního odpadu z plastických hmot na skládce (skládkovné) Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot	T	0,525	1,145	0,620		0,000		0,00	0,00	0,00	#DĚLENÍ_NULOU!
	997	Přesun sutě											
	998	Přesun hmot											
49	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	T	1,102	18,252	17,150		0,000		0,00	0,00	0,00	#DĚLENÍ_NULOU!
	998	Přesun hmot											
NP		NOVÉ POLOŽKY (JC dle OTSKP, není-li uvedeno jinak)						0	0,00	0,00	0,00	0,00	#DĚLENÍ_NULOU!
	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvážení, příp. s ochranným	M	0,000	6,000	6,000		0,000 0	0,00	0,00	0,00	0,00	#DĚLENÍ_NULOU!
	131201202	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	M3	0,000	24,000	24,000		0,000 0	0,00	0,00	0,00	0,00	#DĚLENÍ_NULOU!

812

893914115	Montáž ocelové chráničky D 377 x 10 mm	m	0,000	14,000	14,000	0,000 0	0,00	0,00	0,00	0,00	#DĚLENÍ_NULOU!
14011111	trubka ocelová bezsešivá hladká jakost 11 353, 373 x 10 mm	m	0,000	14,000	14,000	0,000 0	0,00	0,00	0,00	0,00	#DĚLENÍ_NULOU!
230200120	Nasunutí potrubí DN 150 do ocelové chráničky DN 250 vč. montáže a dodávky objímk	m	0,000	17,000	17,000	0,000 0	0,00	0,00	0,00	0,00	#DĚLENÍ_NULOU!
899913152	Uzavírací manžeta chráničky potrubí DN 150 x 250	kus	0,000	4,000	4,000	0,000 0	0,00	0,00	0,00	0,00	#DĚLENÍ_NULOU!
892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	0,000	3,000	3,000	0,000 0	0,00	0,00	0,00	0,00	#DĚLENÍ_NULOU!
899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	0,000	1,000	1,000	0,000 0	0,00	0,00	0,00	0,00	#DĚLENÍ_NULOU!
8999111R1	Ocelová podpěra se sedlem pro vedení litinového potrubí na mostu vč. upevňovací objímky a ochranné kaučukové podložky - montáž a dodávka vč. dopravy	kus	0,000	5,000	5,000	0,000 0	0,00	0,00	0,00	0,00	#DĚLENÍ_NULOU!
8999111R2	kompenzátor potrubí litinového DN150	kus	0,000	1,000	1,000	0,000 0	0,00	0,00	0,00	0,00	#DĚLENÍ_NULOU!
	Geodetické práce	kpl.	0,000	1,000	1,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zařízení staveniště	kpl.	0,000	1,000	1,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Dokumentace skutečného provedení	kpl.	0,000	1,000	1,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Realizační dokumentace	kpl.	0,000	1,000	1,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	#DĚLENÍ_NULOU!
	Celkem bez DPH					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DĚLENÍ_NULOU!
	DPH 21%					0,00			0,00	0,00	
	Celkem vč. DPH					0,00			0,00	0,00	

Za Zhotovitele:

Datum:

Za Objednatele:

Datum:

PORR a.s.
-182-
Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 43005960

AD: SOUKAŠI SE ZVEŘOU
AF-CITYPLAN s.r.o.
Magistrů 1275/15
140 00 Praha 4
IČ: 47307218
DIČ: CZ47307218

Z4 TD1:
IT-KOMPLET s.r.o.
Háje 523, 261 01 Příbram III
IČ: 015 04 398, tel.: 777 284 462

STAVOKOMPLET

odštěpný závod

Vodovody a kanalizace

AF-CITYPLAN s.r.o.

Praha

datum: 11. 10. 13

č.j.: 3109

přidělen: LÁVIC

AF - CityPlan s.r.o.

Jindřichská 17

110 00 Praha 1

Naše značka
014V/2013/Uv

vyřizuje/lnka
Miroslava Jelínková/37

Brandýs nad Labem, dne
11.10.2013

Věc: Vyjádření k PD - akce „III/01214 Úvaly u Prahy, průtah - úsek č. 3“, ul. Riegrova, Dvořákova, Škvorecká

Dopisem, ze dne 27.9.2013, jste požádali o vydání vyjádření k výše uvedené projektové dokumentaci ke stavebnímu povolení, kterou vypracovala fa AF-CITYPLAN s.r.o., zodpovědný projektant Ing. J. Lávic, č. zak. 12-5-196 z 09.2013.

A. Vodovod a kanalizace – všeobecné požadavky provozovatele na stavbu:

1. Stavba bude navržena a provedena v souladu s příslušnými normami a jejich normovými hodnotami: ČSN 75 5401 Navrhování vodovodního potrubí, ČSN EN 805 Vodárenství – Požadavky na vnější síť a jejich součásti, ČSN 75 5411 Vodovodní přípojky, ČSN 75 6101 Stokové síť a kanalizační přípojky, ČSN EN 752 Venkovní systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek, ČSN EN 1610 Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení, ČSN 75 6909 Zkoušky vodotěsnosti stok. Inženýrské sítě budou uloženy dle ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. Tlakové zkoušky vodovodů budou předepsány a provedeny dle ČSN 75 5911 Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí. Označení armatur bude provedeno dle ČSN 75 5025 Orientační tabulky vodovodů.
2. Při návrhu a realizaci požadujeme dodržet normové hodnoty a řešení příslušných českých norem výše uvedených a navazujících.
3. Vodovod a kanalizace pro veřejnou potřebu budou vedeny v pozemcích trvale volně přístupných pro potřeby provozování a údržby. V případě vedení po soukromých pozemcích musí být zřízeno věcné břemeno pro vstup na pozemky ve prospěch provozovatele vodovodu a kanalizace.
4. Při stavbě dojde ke styku (křížení a souběh s vodovodem a kanalizací pro veřejnou potřebu) se zařízením v naší správě. Před zahájením stavby požádá investor v dostatečném předstihu o vytýčení zařízení v naší správě na tel. 777 167 187, p. Hrbolka.
5. Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je dané „Zákonem o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu“ §23.
6. Napojení na stávající vodovodní řady provede provozovatel, aby nedošlo k ohrožení dodávky vody a její kvality.
7. Vzhledem k provozování vodovodu a kanalizace, požadujeme být přizváni ke kontrolám uložení a obsypu potrubí kanalizace a vodovodu včetně přípojek na veřejném prostranství, dále k tlakovým zkouškám, proplachu a desinfekci, ke zkoušce identifikačního vodiče, ke

Adresa:
Zápy, Královická 251
250 01 Brandýs n.L.

telefon: 326905698, 326906087-8
fax: 326905093
e-mail: stavokomplet@stavokomplet.cz

IČO: 47052945
DIČ: CZ47052945

Bank. spojení
KB - Praha - NONET
č.ú.139 04 201/0100

STAVOKOMPLET spol. s r.o. je zapsán v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 14934

kontrole funkčnosti armatur.

8. Při rekonstrukci komunikace nesmí dojít k poškození zařízení v naší správě. Veškeré poklopy a poklopy armatur na řadech a přípojkách musí být vyzvednuty do nivelety nové vozovky, případně chodníku. V zeleném pásu intravilánu budou poklopy šachet vyzvednuty cca 100 mm nad terén. V extravilánu budou poklopy kanalizačních a armaturních šachet vyvedeny v obsypu 300 až 500 mm nad okolní terén a budou označeny směrovou tyčí. Šoupátkové poklopy budou v nezpevněných komunikacích, zajištěny proti poklesu, obetonovány a odlážděny dvěma řadami žulových kostek o rozměru min. 100/100 mm. Veškeré armatury na řadech včetně uzávěrů domovních přípojek budou osazeny teleskopickými zemními soupřavami, které budou opatřeny pod poklopy armatur podkladními deskami proti poklesu ovládní.
9. Při realizaci výměny armatur a tvarovek na vodovodu a připojování vodovodních přípojek požadujeme s provozovatelem v dostatečném předstihu projednat technické podmínky realizace, odstávky vody a náhradní zásobování pitnou vodou vč. časového harmonogramu (kontakt viz. bod 4.).
10. Před kolaudací stavby je nutno požádat o kontrolu a převzetí provedených úprav na zařízení v naší správě.
11. Stavba bude při pokládce potrubí průběžně výskopisně a polohopisně zaměřována. Na základě tohoto zaměření bude vypracován projekt skutečného provedení. Provozovateli bude předáno jedno paré tohoto projektu včetně el. datového nosiče s digitálním zaměřením (ve formátu *.dwg).
12. Během realizace stavby je zapotřebí se řídit technickými standardy provozovatele, které podrobně upravují zásady a způsob komunikace a součinnosti s provozovatelem.

B. Požadavky na řešení stavby vodovodu a jeho přeložky a ostatní připomínky:

13. Vzhledem k neznámému technickému stavu je nutné na stávajícím vodovodu pro veřejnou potřebu (řadu PVC 160) vyměnit armatury a tvarovky, uzávěry na síti, hydranty.
14. V rámci koordinace projektu s akcí „č.z. 07 178 00, III/101 65 Úvaly, průtah, ul. 5. května“ vypracovanou firmou PONTEX Plzeň s.r.o. (Ing. Petr Vachta, tel. 377 259 512) je nutné v křižovatce ulic 5. května a Dvořákova doplnit armaturní uzel plným počtem šoupat. Dále je nutné provést důslednou koordinaci průběhu kanalizace v této křižovatce s uvedeným projektem, aby nebylo nutné následně nový uliční prostor rozkopávat. Doporučujeme do této akce zahrnout celou křižovatku až po přechod pro chodce v ul. 5. května.
15. Veškeré armatury a tvarovky, to znamená uzávěry na síti, uzávěry přípojek, hydranty apod. požadujeme ve standardu fy Hawle.
16. Ve všech komunikacích, ve kterých jsou plánovány opravy povrchů, je nutné, z důvodu nerozkopávání povrchů během udržitelnosti projektu, provést napojení na vodovod a kanalizaci pro veřejnou potřebu dosud nenapojených nemovitostí, je o tom zapotřebí občany v předstihu informovat.
17. Ve všech komunikacích, ve kterých jsou plánovány opravy povrchů, je nutné provést rekonstrukci navrtávacích pasů a uzávěrů vodovodních přípojek, které jsou součástí vodovodu pro veřejnou potřebu.
18. Nově navržená přeložka vodovodu bude provedena z PE 100, SDR 11, d160 (délka cca 80,0m), spoje požadujeme provádět výhradně na elektrotvarovky.

C. Dešťová kanalizace a odvodnění pozemních komunikací

18. K systému dešťové kanalizace a odvodnění pozemních komunikací se nevyjadřujeme, nejsme provozovatelem dešťové kanalizace.

Závěr:

S vydáním stavebního povolení souhlasíme za předpokladu splnění výše uvedených podmínek a připomínek. Další stupeň projektové dokumentace (Zadávací) požadujeme předložit k vyjádření.

Toto vyjádření má platnost 1 rok.

S pozdravem

STAVOKOMPLET spol. s r.o.
o. z. VODOVODY A KANALIZACE
Zápy, Páralovická 251
250 01 Brandýs n. L.
IČO: 47062945 (4)
DIČ: CZ47062945

M. A. Jelinek
Ing. Martin Aleš
vedoucí oddělení závodu



Technické služby města Úvaly, p. o.

Riegerova 12, 250 82 Úvaly

IČ: 04441869
Telefon: 281 091 522
Web: www.tsuvaly.cz
ID datové schránky: yzzamr5
E-mail: tsu@mestouvaly.cz

Bc. Petr Matura
Odbor investic a dopravy
Město Úvaly
Pražská 276
250 82 Úvaly

Úvaly, 15. 03. 2017
Č. j.: TSMÚ/29/2017

Věc: Informace o stavu vodovodu v ul. Riegerova

Vážený pane Maturo,

dovolte, abych Vás touto cestou informovala o stavu vodovodu v oblasti nyní probíhající stavby - rekonstrukce Průtahu.

Projektant realizační dokumentace nás jako správce vodovodní sítě požádal o vyjádření k RDS mostu SO 231 a SO 232, v rámci kterých se musí provést přeložení vodovodu DN160.

Vzhledem k tomu, že v době tvorby dokumentace pro stavební povolení byla správcem firma STAVOKOMPLET, Technické služby města Úvaly jakožto správce vodovodu od 1. října 2015 nebyly osloveni k vyjádření k DSP. Jako nový správce nesouhlasíme s přeložkou vodovodu DN160 pouze v úseku mostů SO 231 a SO 232, ale v celé délce od křižovatky ulic 5. května x Dvořákova až za most SO 231.

Po prozkoumání stavu stávající trasy vodovodu včetně armaturní komory v křižovatce ulic 5. května x Dvořákova (viz foto) bylo zjištěno, že stávající vodovod je v havarijním stavu. Jelikož nad stávajícím vodovodem bude vybudována nová komunikace a chodníky, je nezbytně nutné a ekonomicky přínosné trasu vodovodu přeložit v celé délce od křižovatky ulic 5. května x Dvořákova až za most SO 231. Životnost materiálu stávajícího vodovodu je nyní na hranici vlastních limitů.

Doporučujeme vlastníkovi, tedy Městu Úvaly, aby se trasa vodovodu přeložila v celé délce, a to od křižovatky ulic 5. května x Dvořákova až za most SO 231 (most přes bezejmenný potok).

Příloha: Fotodokumentace dané lokality

S pozdravem


TECHNICKÉ SLUŽBY
města Úvaly, p. o.
Riegerova 12, 250 82
IČO: 04441869


Mgr. Ing. Pavlína Slavíková
ředitelka

Příloha: Fotodokumentace – vodovodní potrubí v místech přes Výmolu





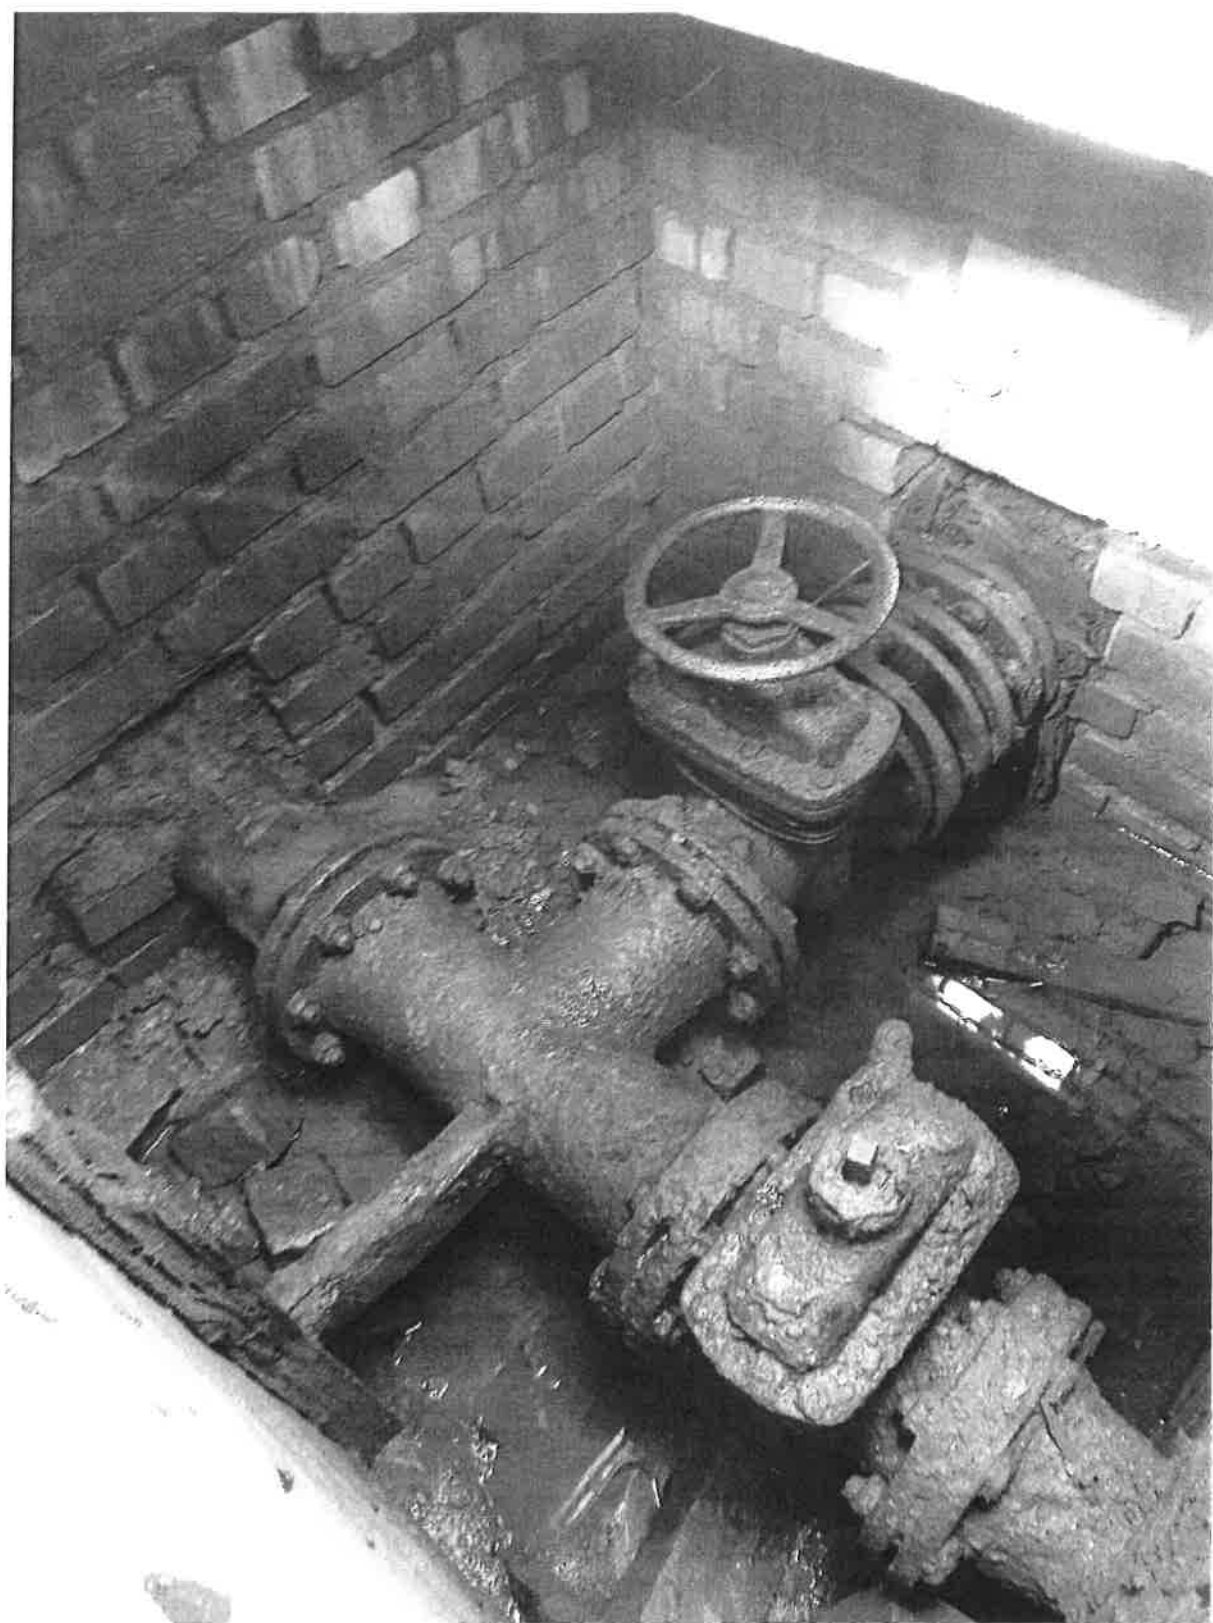

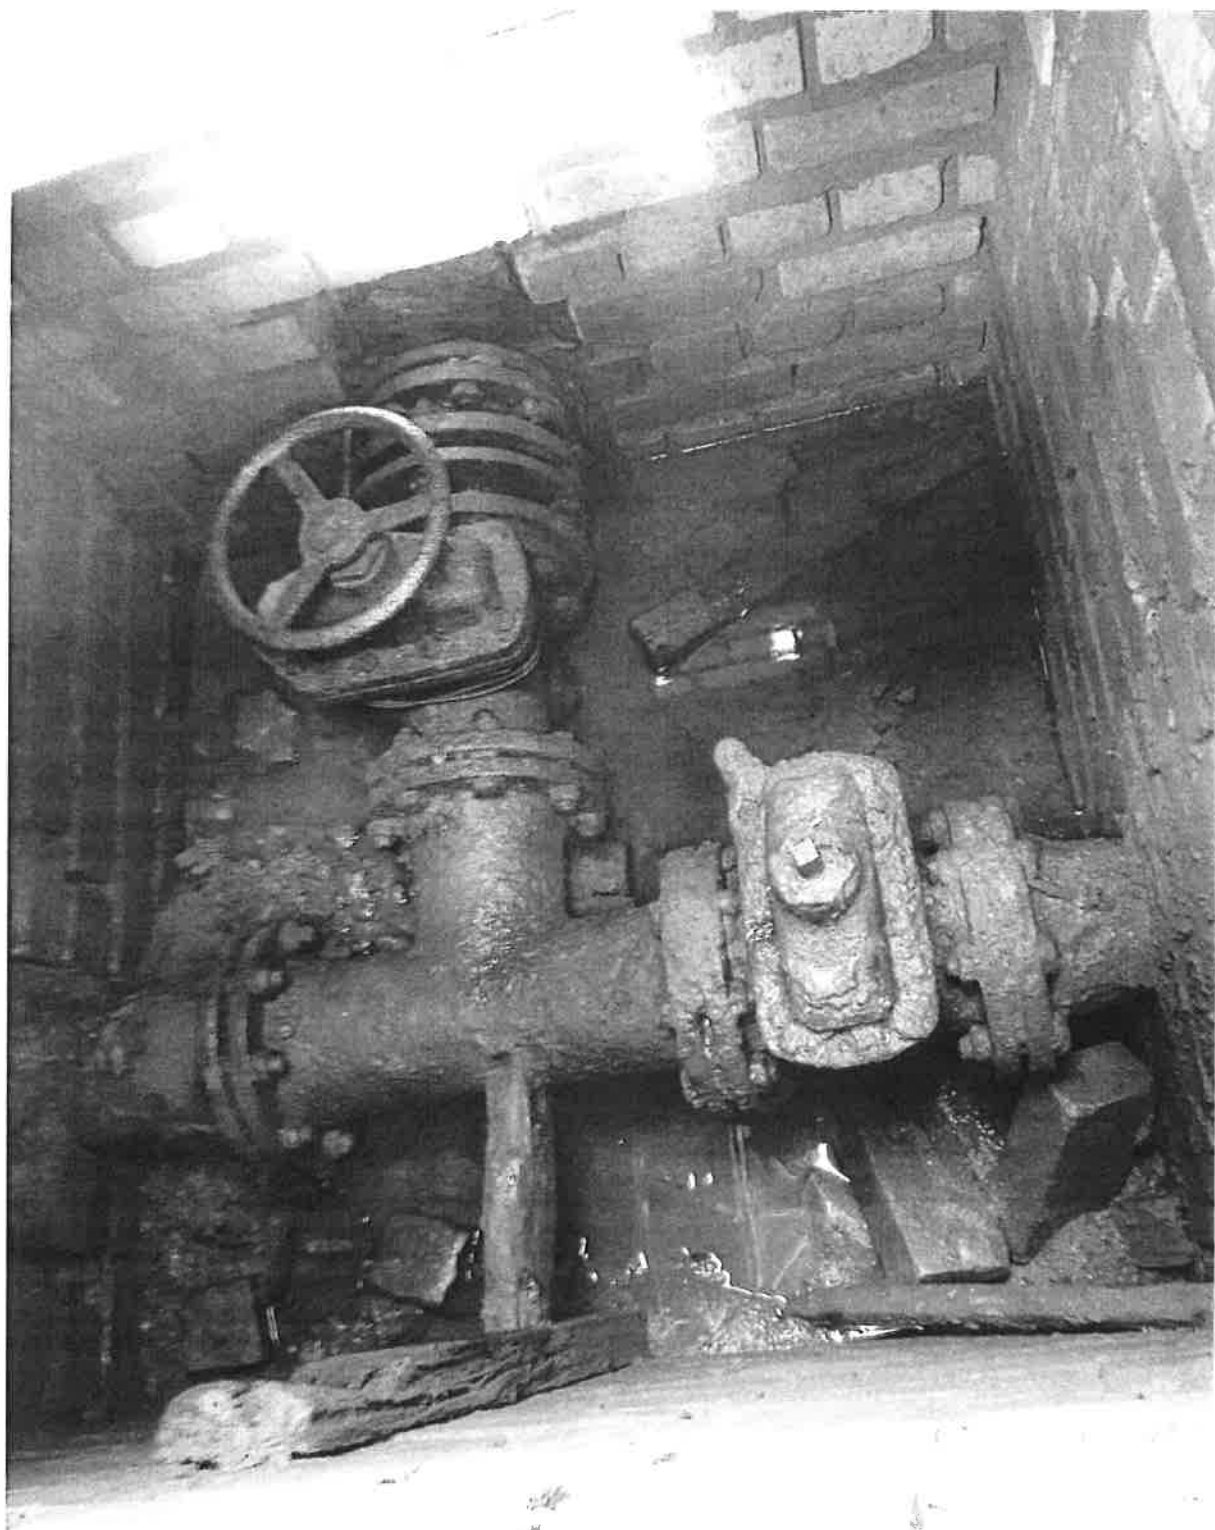

zápis:	26. KONTROLNÍ DEN STAVBY	č. 26/2017
Název stavby:	„III/01214 Úvaly u Prahy, průtah – úsek 3“	
Objednatel:	Správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o., Zborovská 11, 150 21 Praha 5	
Zhotovitel:	PORR a.s – odštěpný závod Čechy, Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10	
Technický dozor:	T-KOMPLET s.r.o., Hatě 523, 261 01 Příbram VII	
Místo konání :	Zasedací místnost –MěÚ Úvaly, Riegerova 897, 250 82 Úvaly	
Datum a čas:	14.03.2017 v 08,30 hod.	
Rozdělovník:	účastníkům dle prezenční listiny	

Dnešního dne byla provedena pochůzka po staveništi a bylo dohodnuto a konstatováno následující:

bod	zápis	odpovídá	termín
1.	Účast na jednání		
	- dle prezenční listiny – viz.příloha		
2.	Kontrola úkolů z předchozího kontrolního dne		
	-		
3.	Postup prací		
3.1.1.	Prováděné práce	zhotovitel	
	- Zhotovitel provedl vyvezení skládky „lom“		
3.1.3.	Organizace a postup práce		
4.	Kontrola plnění úkolů z minulého KD stavby, přijetí závěrů k aktuálním problémům stavby, nové úkoly:		
4.1.5.	- Byl vyvzorkován typ zámkové dlažby pro chodníky – výrobce Semmelrock - Citytop Grande Kombi – č. 64868372 (šedá) - Citytop Grande Kombi – č. 6486834 (žlutá) - Materiál na plotový systém – SemmelrockRivago – písková –č. 64868182, 64866755		
4.5.3.	- Zhotovitel provede odtěžení části vjezdu k MěÚ vzhledem k etapizaci stavby.	Zhotovitel	
4.6.5.	- MěÚ Úvaly provede konzultaci s vodoprávním úřadem ohledně změny dešťové kanalizace.		
4.7.1.	- Vedení Města Úvaly rozhodlo, že VO bude dle výkazu výměr a zadávací dokumentace – viz.email ze dne 23.9.2016.		
4.7.4.	- Zhotovitel zajistí označení průchodu pro pěší přes staveniště (most!)	zhotovitel	
4.8.5.	- Projekce upřesnila počty chrániček v SO – 231. Počet zůstává dle PD (7xvolných). Popř.bude v průběhu výstavby navýšen.		
4.9.1.	- Na základě jednání města Úvaly a KSÚS bylo dohodnuto, že práce na prodloužení propustku a	Objednatel	

	změně dešťové kanalizace musí být realizovány. KSÚS zajistí zasměření dle zákona o zadávání veřejných zakázek.		
4.9.3.	- Zhotovitel zajistí průjezd na stavbu nebo sveze TKO na místo k odvozu.	Zhotovitel	
4.9.4.	- Investor upozorňuje zhotovitele na zakrývání poklopů splaškové kanalizace. V současné době do splaškové kanalizace se splavuje štěr a písek – hrozí její ucpání.	Zhotovitel	
4.10.1.	- Objednatel požaduje po zhotoviteli průběžný úklid přístupové cesty pro pěší.	Zhotovitel	
4.10.3.	- Byla předložena dokumentace přeložky plynu dne 14.10.2016. Zástupci RWE oznámili, že pro přepojení je potřeba předběžné užívání.	Zhotovitel	
4.10.4.	- Objednatel upozorňuje zhotovitele o prověření zda-li ČEZ nemůže požadovat také předběžné užívání.	Zhotovitel	
4.11.1.	- Byla dohodnuta skladba zámkové dlažby vč. Barevnosti. - Ul. Škvorecká – pravá strana směr k Penny – vjezd (šedá), plocha (žlutá). Levá strana barevně opačně.	Zhotovitel	
4.11.2.	- Zhotovitel zajistí vyčištění splaškové kanalizace od splaveného písku a štěrku v průběhu prací. A kompletní vyčištění po dokončení stavby.	Zhotovitel	
4.12.2.	- Byla dohodnuta skladba zámkové dlažby na chodnících (vzor 1 dle katalogu Semmelrock).	Zhotovitel	
4.12.4.	- Zhotovitel oznámil plánované propojení vodovodu a kanalizace na 3.11.2016. Propojení nutno provádět za přítomnosti p. Hiršla a p. Kovaříka.	Zhotovitel	
4.12.5.	- Objednatel upozorňuje zhotovitele, že u SSZ u křižovatky u Penny jsou dvě čidla (smyčky). Nutno při provádění prací zachovat jejich funkčnost.	Zhotovitel	
4.13.1.	- Zhotovitel zajistí výkopové práce pro výměnu šoupat 3ks ve spolupráci s TS Úvaly. 2ks šachet budou zrušeny. 1ks vyčištěn. Dešťová šachta u čp.696 bude vyzděna a osazen plný poklop.	Zhotovitel	
4.13.2.	- Betonové potrubí DN 300 v propustku bude částečně obnaženo a zabetonováno.	Zhotovitel	
4.13.3.	- PVC potrubí nad rámy Beneš propustku bude podbetonováno a zabetonováno.	Zhotovitel	
4.14.1.	- Zhotovitel upozorňuje, že po zaměření stávající splaškové kanalizace v SO-232 dochází k výškové kolizi mezi budoucí kci mostu a touto kanalizací. Vychází cca 40cm nad budoucí dno mostu.	Zhotovitel	
4.14.2.	- Projekt (AD) předá do příštího KD stavby řešení této kolize.	AD	
4.14.3.	- PVC DN 300 nad propustkem bude nahrazena kameninou DN 300. Propojení bude probíhat za přítomnosti p.Kolaříka.	Zhotovitel	
4.15.1.	- Zhotovitel v průběhu týdnu zprovozní průchod pro pěší po již položené zámkové dlažbě. Stávající zámková dlažba bude před zprovozněním průchodu opravena – viz.zápis TDI ze dne 21.11.2016.	zhotovitel	

4.15.2.	- Zástupci Penny Marketu oznámí zhotoviteli termín možné pokládky živice (úsek od SSZ po vjezd do stavebnin tj. pokládka 2 vrstev, omezení vjezdu zákazníků 1 den)	zhotovitel	
4.15.3.	- Po dokončení asfaltových vrstev na chodníků před Penny Marketem bude provedena kontrola stávajícího a původního stavu ploch parkoviště Penny za účasti majitele objektu společnosti CPI.	Zhotovitel objednatel TDI	
4.15.4.	- Do 25.11.2016 projekce předloží na SÚ Úvaly projektovou dokumentaci přeložky plynovodu.	AD	
4.17.2.	- Chodník (pravá strana) bude po zahutnění zkontrolován TDI. Zhotovitel vyzve TDI k této kontrole. Pokud hutněním nedojde ke srovnání zámkové dlažby – bude přeložena.	Zhotovitel	
4.18.1.	- Byl dohodnut předpoklad prací na leden 2017. - Dešťová kanalizace, VO mezi SO-231, SO-232 - Práce na SO-903 - Osazení lávky pro pěší, přeložky SO-503.1, ČEZ a Telefonica O2.	zhotovitel	
4.18.2.	- Zhotovitel ke všem přístupovým cestám na stavenišť osadí cedule s nápisem "POZOR PROCHÁZÍTE STAVBOU, V ZIMĚ SE NEUDRŽUJE"	zhotovitel	
4.18.3.	- Chodník (pravá strana) bude po zahutnění zkontrolován TDI. Zhotovitel vyzve TDI k této kontrole. Pokud hutněním nedojde ke srovnání zámkové dlažby – bude přeložena.	Zhotovitel	
4.18.4.	- AD měl zažádat na SÚ Úvaly o územní souhlas na přeložku plynovodu do 25.11.2016 (bod KD 4.15.4). - Nový termín do 22.12.2016. Po vydání územního souhlasu a předčasného užívání stavby mohou započít další stavební práce (přeložky IS, SO-231, SO-232). Práce jsou dočasně pozastaveny – vliv na termín dokončení stavby.	AD	
4.19.1	- AD zažádal na SÚ Úvaly o územní souhlas na přeložku plynovodu, nutno k žádosti doložit vyjádření DOSS	AD	25.1.17
4.19.2	- Přeložení kabelů ČEZ, vypnutí bude provedeno 14.2.17		
4.19.3	- Případné kácení dřevin zhotovitel projedná s OŽP		
4.19.4	- AD předloží vyjádření k bodu 4.14.1a 4.14.2	AD	25.1.17
4.20.1	- AD upřesní k bodu 4.14.1a 4.14.2 řešení zda-li je možno ŽB rámy nahradit např. potrubím	AD	01.02.17
4.20.2	- Zhotovitel předal zástupci MěÚ Úvaly pasportizaci objektu Technických služeb čp. 12.		
4.20.3	- Zhotovitel zašle emailem aktualizovaný HMG stavby. Předpoklad zahájení prací v zimním období je od 17.2.2017	zhotovitel	
4.20.4	- Do 17.2.2017 zhotovitel provede - osazení lávky pro pěší do finální podoby - vymístění kabelů ČEZ na lávku - vymístění plynovodního potrubí na lávku	zhotovitel	
4.21.1	- Dne 24.2.2017 zhotovitel provede vymístění kabelů		

	O2 a zahájí práce		
4.21.2.	- Projekce prověří na Povodí Labe průtočnost mostu SO-231, vzhledem k plánovanému zatrubnění. Projekce předloží výkresy detailu zatrubnění.	projekce	
4.21.3.	- Materiál kanalizačního potrubí pod SO-231 bude kamenina.	zhotovitel	
4.21.4.	- Zhotovitel zašle AD zaměření dna šachty SO-231.	zhotovitel	
4.22.1.	- Vymístění vodovodu na SO – 231 bude konzultováno s provozovatelem – p. Hyršl	zhotovitel	
4.22.2.	- Zhotovitel urychleně zajistí plnění požadavků OIP Praha a tyto bude dodržovat.	zhotovitel	
4.22.3.	- Zhotovitel bude udržovat přístupovou komunikaci v čistotě, odstranit bahno.	zhotovitel	
4.23.1.	- Zhotovitel oznámil započetí bourání SO – 231 po vyjádření RWE a propojení plynovodního potrubí.	zhotovitel	
4.23.2.	- Zhotovitel započne od 23.2.2017 s vyvážením skládky „Lom“.	zhotovitel	
4.23.3.	- Zhotovitel předložil návrh přeložky vodovodu v SO-231. Technické řešení bude konzultováno se správcem vodovodu a RWE, materiál bude PE.	zhotovitel	
4.24.1.	- Zhotovitel provádí odvoz z depote „lom“. Bylo provedeno vymístění kabelů elektro a sdělovacích kabelů	info	
4.24.2.	- Do 20.4.2017 zhotovitel provede přeložku plynu (příprava a propojení)	zhotovitel	
4.24.3.	- Do 18.3.2017 zhotovitel provede: - Po vývozu zeminy z depote budou započaty práce na SO-903 - Na SO 803 započne ozelenění - Přípravné práce na předčasné užívání části stavby úsek Penny ul. 5.května.	zhotovitel	
4.24.4.	- Po dohodě s provozovatelem vodovodu byl dohodnut materiál vodovodu v místě SO 231 litina, napojení před a za mostem bude z PE. Spojení bude provedeno zámkovými hrdly se zajištěním proti posuvu.	zhotovitel	
4.25.1.	- Zhotovitel provede opravy na SO-903.Svislá výztuž musí být svázána od paty opěrné zdi s dostatečným krytím. Dostatečné krytí platí i pro vodorovnou výztuž. TDI bude vyzván ke kontrole.	zhotovitel	
4.25.2.	- Před prováděním prací na SO – 803 zhotovitel provede úklid zbytků stav.materiálu atd.	zhotovitel	
4.25.3.	- Nejpozději od 17.03.2017 provede doprava z ul. 5.května do ul. Dvořákova a dále do ul. Škvoreckého-Dobročovická. Toto opatření je z důvodu opravy komunikace I/12.	zhotovitel	
4.25.4.	- Zhotovitel oznámil, že dne 14.03.2017 proběhne propojení plynovodního potrubí. Následně započnou stavební práce na bourání mostu.	zhotovitel	
4.26.1.	- Před nasypáním ornice vyzve zhotovitel zástupce investora nebo TDI ke kontrole.	zhotovitel	
4.26.2.	- Investor upozorňuje, že povrchy chodníků a komunikací v části předčasného užívání nepovažuje	zhotovitel	

	za dokončené.		
4.26.3.	- Probíhá přepojení plynovodního potrubí (RWE), dokončeno dne 14.03.2017. Od 15.03.2017 zhotovitel zahájí demoliční práce SO - 231.	zhotovitel	
4.26.4.	- Provozovatel vodovodů a kanalizací předloží vyjádření k technickému stavu vodovodů do 17.03.2017.		
4.26.5.	- TDI bude před betonáží věnce SO-903 vyzván ke kontrole.	zhotovitel	
4.26.6.	- Úpravy, které stavební úřad Úvaly požaduje v rámci předčasného užívání je nutno provést do 19.03.2017.	zhotovitel	
	-		
5.	Harmonogram		
5.21.1.	- Na základě předloženého HMG celé stavby, bylo dohodnuto, že zhotovitel započne s bouráním mostu SO – 232, předpoklad 17.2.2017.	zhotovitel	
6.	Stavba a staveniště		
7.	BOZP		
	- viz. zápisy BOZP a v SD		
8.	Fakturace		
	-		
9.	Změnová řízení		
9.19.1	- je nutno zasmluvnit změnu HMG stavby	INV,zhotovitel	info 25.1.17
10.	Přejímky		
11.	Zjištěné nedostatky		
	- viz.zápisy v SD		

27. KD stavby se bude konat v pondělí 22.03.2017 Setkání všech účastníků je v 12,00 hod v zasedací místnosti MěÚ Úvaly, Riegerova 897, 250 82 Úvaly.

V případě, že účastníci kontrolních dnů budou mít připomínky nebo nejasnosti k textu uvedenému v zápisech z těchto KD, které jsou jim pravidelně zasílány, mohou své námitky písemně rozporovat nebo upravit nejpozději do následujícího kontrolního dne. V opačném případě se má za to, že s uvedeným textem souhlasí.

Cenová nabídka

Zhotovitel: POHL CZ a.s.

SO 313 Vodovod - změna č.1, ul. Riegrova

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství	JC	CC
60	552000001	WAGA spojka Synoflex hrdlová litinová jistěná proti posunu pro propoj potrubí d160	kus	5,000	7.500,00	37.500,00
61	552000002	Spojka pro spojení 2 hladkých konců trubek ULTRALINK NG	kus	2,000	1.450,00	2.900,00
66	286000001	Oblouk PE 22°	kus	1,000	4.800,00	4.800,00
67	286000002	Oblouk PE 15°	kus	1,000	4.800,00	4.800,00
68	286000003	Oblouk PE 10°, 6°	kus	2,000	4.800,00	9.600,00
80	893914115	Montáž ocelové chráničky D 377 x 10 mm	m	14,000	1.320,12	18.481,68
81	14011111	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353, 373 x 10 mm	m	14,000	1.830,00	25.620,00
82	230200120	Nasunutí potrubí DN 150 do ocelové chráničky DN 250 vč. montáže a dodávky objímk	m	17,000	1.393,12	23.683,04
86	8999111R1	Ocelová podpora se sedlem pro vedení litinového potrubí na mostu vč. upevňovací objímky a ochranné kaučukové podložky - montáž a dodávka vč. dopravy	kus	5,000	2.500,00	12.500,00
87	8999111R2	kompensátor potrubí litinového DN150	kus	1,000	15.000,00	15.000,00
Celkem						154.884,72

Ing. Přemysl Kusiak

Vedoucí střediska dopravních staveb

IC: 25606468 • DIČ: CZ25606468
Tel.: 233 080 411

POHL © POHL CZ, a.s.
Nádražní 25
252 63 BOZTOUKY

Cenová nabídka

Zhotovitel : JUBOCAR spol.s.r.o.

Na základě Vaší poptávky ze dne 2.5.2017 Vám zasíláme cenovou nabídku na dodávku a montáž vodovodu v ul. Rierova.

SO 313 Vodovod - změna č.1, ul. Riegrova

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství	JC	CC
60	552000001	WAGA spojka Synoflex hrdlová litinová jistěná proti posunu pro propoj potrubí d160	kus	5,000	7.710,00	38.550,00
61	552000002	Spojka pro spojení 2 hladkých konců trubek ULTRALINK NG	kus	2,000	1.489,00	2.978,00
66	286000001	Oblouk PE 22°	kus	1,000	4.875,00	4.875,00
67	286000002	Oblouk PE 15°	kus	1,000	4.875,00	4.875,00
68	286000003	Oblouk PE 10°, 6°	kus	2,000	4.820,00	9.640,00
80	893914115	Montáž ocelové chráničky D 377 x 10 mm	m	14,000	1.450,00	20.300,00
81	14011111	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353, 373 x 10 mm	m	14,000	1.925,00	26.950,00
82	230200120	Nasunutí potrubí DN 150 do ocelové chráničky DN 250 vč.montáže a dodávky objímk	m	17,000	1.454,00	24.718,00
86	8999111R1	Ocelová podpěra se sedlem pro vedení litinového potrubí na mostu vč.upevňovací objímky a ochranné kaučukové podložky - montáž a dodávka vč.dopravy	kus	5,000	3.450,00	17.250,00
87	8999111R2	kompenzátor potrubí litinového DN150	kus	1,000	19.800,00	19.800,00
					Celkem	169.836,00

V Brně dne 16.5.2017

Ing. Zbyněk Jurečka
ředitel společnosti

JUBOCAR spol.s r.o.
Králova 279/9, 616 00 Brno
IČ: 63492954 DIČ: CZ63492954

Cenová nabídka

Zhotovitel : Lavimont Overseas, s.r.o.

SO 313 Vodovod - změna č.1, ul. Riegrova

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství	JC	CC
60,00	552.000.001,00	WAGA spojka Synoflex hrdlová litinová jištěná proti posunu pro propoj potrubí d160	kus	5,00	8.000,00	40.000,00
61,00	552.000.002,00	Spojka pro spojení 2 hladkých konců trubek ULTRALINK NG	kus	2,00	1.480,00	2.960,00
66,00	286.000.001,00	Oblouk PE 22°	kus	1,00	4.950,00	4.950,00
67,00	286.000.002,00	Oblouk PE 15°	kus	1,00	4.900,00	4.900,00
68,00	2860000003	Oblouk PE 10°, 6°	kus	2,00	4.850,00	9.700,00
80,00	893.914.115,00	Montáž ocelové chráničky D 377 x 10 mm	m	14,00	1.540,00	21.560,00
81,00	14.011.111,00	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353, 373 x 10 mm	m	14,00	1.980,00	27.720,00
82,00	230.200.120,00	Nasunutí potrubí DN 150 do ocelové chráničky DN 250 vč.montáže a dodávky objímk	m	17,00	1.527,00	25.959,00
86,00	8999111R1	Ocelová podpěra se sedlem pro vedení litinového potrubí na mostu vč.upevňovací objímky a ochranné kaučukové podložky - montáž a dodávka vč.dopravy	kus	5,00	3.541,00	17.705,00
87,00	8999111R2	kompenzátor potrubí litinového DN150	kus	1,00	17.418,00	17.418,00
					Celkem	172.872,00

V Brně dne 12.5.2017

Ing. Aleš Przybyla

výrobní ředitel divize Vodohospodářských staveb



 Lavimont Overseas, s.r.o.
 Sečovice 3221/3
 615 00 Brno - Žabovřesky
 IČ: 25441319
 DIČ: CZ25441319

①

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

Porr a.s.
Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10 - Strašnice

Vás dopis značky / ze dne

Naše značka
2860/17/KSUS/MHT/CHME

Vyřizuje/telefon
Chmclová/736 623 720

Praha
10.5.2017

Věc : „III/01214 Úvaly u Prahy, průtah – úsek 3“ - žádost o změnu rozsahu díla (ZBV)

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje jako správce a zároveň zástupce Středočeského kraje jako vlastníka nemovitostí, tj. předmětné komunikace III/01214 v Úvalech Vás tímto žádá o změnu rozsahu díla dle smlouvy o dílo 432/00066001/2016 (článek 6.6), zajištění technického řešení a pokračování výše zmíněné akce i zpracování změn během výstavby na stavebních objektech:

SO 103 - Rekonstrukce silnice III/01214

- na základě požadavku schválení změny ze dne 2.12.2016

SO 133 - Rekonstrukce propustku v km cca 0,290

- na základě zápisu z výrobního výboru č. 1 ze dne 12.9.2016

SO 231 - Most č. ev. 01214-2

- na základě zápisu z kontrolního dne č. 26 ze dne 14.3.2017

SO 232 - Most č. ev. 01214-3

- na základě zápisu z kontrolního dne č. 26 ze dne 14.3.2017

SO 303 - Odvodnění PK

- na základě zápisu z výrobního výboru č. 2 ze dne 19.9.2016

SO 313 - Přeložky vodovodů

- na základě zápisu z kontrolního dne č. 26 ze dne 14.3.2017

Vedlejší rozpočtové náklady KSÚS

- na základě zápisu z výrobního výboru č. 1 ze dne 12.9.2016

- na základě zápisu z výrobního výboru č. 2 ze dne 19.9.2016

- na základě zápisu z kontrolního dne č. 26 ze dne 14.3.2017

Komerční banka a.s.
Č.účet: 7730161/0100
IČ: 00066001
DIC: CZ00066001

Telefon: 736 623 720
e-mail: lenka.chmclova@ksus.cz

Vedlejší rozpočtové náklady MÚ

- na základě zápisu z výrobního výboru č. 1 ze dne 12.9.2016
- na základě zápisu z výrobního výboru č. 2 ze dne 19.9.2016
- na základě zápisu z kontrolního dne č. 26 ze dne 14.3.2017

Rozsah změn během výstavby bude stanoven na základě skutečného zaměření stavby nebo správcem schválené realizační dokumentace.

Cenově musí změnu posoudit cenové oddělení objednatele.

S pozdravem

Kancelář právo a právní služby
Střední škola
Mnichovo Hradiště

Lenka Chmelová

vedoucí TSÚ – oblast Mnichovo Hradiště
