

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na stavební práce

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov

IČO: 00066001

DIČ: CZ00066001

jejímž jménem jedná Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA, ředitel

č. smlouvy: S-2370/00066001/2019

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Společníci společnosti „Společnost Jinočany, PORR - SILNICE GROUP“

založené ve smyslu § 2716 a násl. občanského zákoníku na základě Společenské smlouvy ze dne 01. 07. 2019

1. PORR a.s.

se sídlem: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

IČO: 43005560

DIČ: CZ43005560

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006, jejímž jménem jedná Ing. Pavel Hirsch, ředitel úseku Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Čechy – Střed, a Ing. František Buršík, vedoucí technického úseku Dopravních a inženýrských staveb, Oblast Čechy – Střed, oba společně na základě plných mocí

č. smlouvy: 7-0715A19

- jako **Správce společnosti**

2. SILNICE GROUP a.s.

sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1

IČO: 62242105

DIČ: CZ62242105

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. B, vl. 12069, jejímž jménem jedná Ing. Karel Rypl, předseda představenstva a Ing. Petr Duchek, MBA, místopředseda představenstva (každý samostatně)

- jako **Společník**

dále jen „**Zhotovitel**“ na straně druhé (Objednatel a Zhotovitel společně dále též „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním § 2586 a násl., § 564, § 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“)

I. PREAMBULE

Smluvní strany uzavřely dne 03.09.2019 smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“) na plnění veřejné zakázky s názvem „**III/00516, III/00512 a III/0057 Jinočany, oprava silnic**“.

II. PŘEDMĚT DODATKU

S ohledem na vznik objektivně nepředvídaných okolností v průběhu realizace prací na díle, které nemohl zhotovitel před zahájením prací předpokládat, a které zapříčinili změnu rozsahu prací v podobě méněprací a víceprací, upravuje se po dohodě smluvních stran předmět Smlouvy o dílo.

Změna rozsahu prací v podobě méněprací a víceprací obsahují Objednatel schválené změnové listy, které jsou přílohou tohoto Dodatku č. 1.

Na základě změny předmětu díla se mění i celková cena za dílo uvedená v bodě 8.1. Smlouvy o dílo a tím i tento bod, který celý nově zní:

Smluvní strany se dohodly, že celková Cena Díla je stanovena jako neměnná a konečná a činí:

Původní Cena Díla bez DPH	39.849.910,00 Kč
Nová Cena díla dle Dodatku č. 1 bez DPH	47.027.086,43 Kč
DPH 21%	9.875.688,15 Kč
DPH 15 %	0,- Kč
Cena Díla včetně DPH	56.902.774,58 Kč

Daň z přidané hodnoty (dále též „DPH“) bude na základě výslovné dohody smluvních stran připočtena ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že veškerá množství uvedená v soupise prací k Dílu a jeho jednotlivým částem jsou pouze odhadovaná, a jejich změna neznamená změnu Ceny Díla.

Přílohou tohoto Dodatku č. 1 je Objednatel odsouhlasen Změnový list č. 2 – 5.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smlouva bude uveřejněna dle § 219 zákona o ZVZ na profilu Objednatele, včetně všech jejích změn a dodatků.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Poskytovatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tento Dodatek uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
4. Tento Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze stran obdrží jeho elektronický originál.
5. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

Příloha č. 1 – ZBV č.2

Příloha č. 2 – ZBV č.3

Příloha č. 3 – ZBV č.4

Příloha č. 4 – ZBV č.5

V Říčanech dne _____

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace

Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA, ředitel

V Praze dne _____

Zhotovitel
Společníci společnosti
„Společnost Jinočany, PORR – SILNICE GROUP“

Za PORR a.s.

Ing. Pavel Hirsch ředitel úseku Dopravních a
inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Čechy –
Střed na základě plné moci

Ing. František Buršík vedoucí technického úseku
Dopravních a inženýrských staveb PORR, Oblast
Čechy – Střed na základě plné moci

Za SILNICE GROUP a.s.

Ing. Karel Rypl, předseda představenstva

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

III/00516, III/00516a III/0057 Jinočany, oprava silnic, 7-0715A19

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

III/00516 - km 2,658 - 4,291

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

102 / 2

Číslo ZBV:

2

Objednatel:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov

IČ: 00066001

Zhotovitel:

Společnost Jinočany, PORR - SILNICE GROUP

Správce společností

PORR a.s. Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10, IČ:

Společník

SILNICE GROUP a.s. Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 62242105

Rekapitulace ZBV č. 2 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.3	0,00	2 374 490,36	2 374 490,36

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2	0,00	2 374 490,36	2 374 490,36

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.

Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy

a pro Rozpis ocenění změn položek.

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby III/00516, III/00516a III/00517 Jinočany, oprava silnic, 7-0716A18 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): III/00516 - km 2,658 - 4,291	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 102 / 2	Číslo ZBV: 2
--	--	-----------------

Strany smlouvy o dílo č. 237D/00068001/2019 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 03.09.2019 (dále jen Smlouva)

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvkové organizace se sídlem Zborovská 81/11, 160 21 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: Společnost Jinočany, PORR - SILNICE GROUP

Přílohy Změnového listu:	Paré č.	Příjemce
1. Krycí list	1	Objednatel
2. Změnový list	2, 3	Zhotovitel
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	4	Projektant
4. Rozpis ocenění Změn položek	5	TDI
5. Přehled zařazení změn do skupin		
6. Přehled dalších dokladů		
Další doklady	50	počet listů

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

1) Ve zpracované projektové dokumentaci bylo navrženo ponechání stávajících obrub s návaznou opravou chodníků. Během stavby bylo zjištěno, že jejich stav je nevyhovující a z tohoto důvodu bylo přistoupeno k jejich výměně v plném rozsahu. Zároveň z důvodu zajištění bezpečné šířky přeclázení chodců, byla vlastní vozovka zúžena na průměr šířky cca 7,0 m. Za tímto účelem bylo nutné posunout i silniční obruby včetně betonového lože a pokládky. Při odstranění bylo potřeba získanou stavební suť, obrubníky a betonové lože uložit na skládku, viz Zápis ze 14. kontrolního dne ze dne 7.7.2020 (doklad 10), stanovisko autorského dozoru k ZBV ze dne 24.7.2020 (doklad 11), fotodokumentace (doklad 12) a zápis ve Stavebním deníku str. 2384, 2385. Změna se týká položek: 68, 69, 89, 90 a 102.

2) Při provádění propustku dle PD v km 1047,90 bylo v místě vstupu nainstalováno plynové zařízení, které bránilo v dokončení propustku do délky a zpevnění žela vtoku lomovým kamenem. Trasa plynu se nalézá v místě vstupu do propustku, bez jeho přeložení nelze zcela dokončit vybudovaný propustek. Plynové potrubí vadí i výškově, protože je zhruba v polovině profilu propustku. Je proto nutná jeho přeložka, neboť je v těsné blízkosti vlastní komunikace, viz zápis ve Stavebním deníku str. 2374, 2375. Původně se plynové zařízení považovalo za připojku, ale následně bylo zjištěno, že se jedná o hlavní řád k přílehlým nemovitostem viz Zápis ze 14. kontrolního dne ze dne 7.7.2020, odst. 10/1 (doklad 10). Změna se týká položek: 103.

3) Po vybudování propustku v km 1047,90, odtokového příkopu a odstranění stávajícího porostu u propustku v km 1270,00, bylo na KD konstatováno viz Zápis ze 14. kontrolního dne ze dne 7.7.2020 (doklad 10), že v těchto místech hrozí nebezpečí pádu. Z důvodu zajištění bezpečnosti bylo dohodnuto, že stávající propustky v km 1047,90 a km 1270,00 budou osazeny trubkovým zábradlím dle TP 186, viz výkres zábradlí (doklad 14, 15, 16, 17, 18, 19) a fotodokumentace (doklad 20). Změna se týká položek: 104.

4) Na základě stavu v odtěženém úseku v km 1270,00 - 1120,00, kdy vlivem průsaku vody z blízkého rybníka došlo ke značnému rozbahnění pláně, která se stala neúnosnou, bylo sjednáno s AD, že rozbahněnou část bude nutné vytěžit a nahradit lomovým kamenem v plné mocnosti vytěženého bahna - délka 150 m, šířka 6 m, hloubka 1,4 m. Pod drcené kamenivo je nutné položit geotextilii s přesahem do břehů výkopu. Tento návrh podpořil AD ve Stavebním deníku str. 2367 dne 17. 10. 2019 a str. 2359, 2360, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368. Změna se týká položek: 7, 9, 16, 17, 18, 19, 31, 75, 91, 92.

5) Jedná se o náklady na nezbytné přesuny materiálu na staveništi. Přivezený stavební materiál od dopravce bylo nutno distribuovat, kde je aktuálně zapotřebí. Jedná se o množství všech tun hmot s kterými se na stavbě manipulovalo (dř, štěrky, obruby). Změna se týká položek: 93.

Tyto změny byly odsouhlaseny ve Vyjádření TDI ze dne 30.9.2020 (doklad 22).

Uvedené změny, které vznikly v průběhu provádění prací. Celkově se jedná o Změny nepodstatné, nepředvídané, které jsou tak podle § 5, odst. 1, písm.c), resp. podle § 10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29. 05. 2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazený do Skupiny B. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná o změnu nepředvídanou.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
0,00	2 374 490,36	2 374 490,36	2 374 490,36

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí)	jméno	Ing. Petr Martinek	datum	03. 12. 2020	podpis
Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Pavlína Nykodémová	datum	03. 12. 2020	podpis
Technický dozor Investora	jméno	Ing. Martin Vavřena	datum		podpis
Zástupce Objednatel:	jméno	Karel Motal	datum		podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatních zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitel sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel)	jméno	Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA	datum		podpis
Zhotovitel	jméno	Ing. Pavel Hirsch	datum		podpis
	jméno	Ing. Karel Ryppl	datum	08. 12. 2020	podpis
Číslo paré:					5

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 2**

Název Stavby: III/00516, III/00516a III/0057 Jinočany, oprava silnic	
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	102 / 2
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): III/00516 - km 2,658 - 4,291	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
22 723 584,84

Poznámka:

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

na SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	2 932 463,27	25 656 048,11	2 932 463,27

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	2 374 490,36	5 306 953,63	23,35%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	0,00	28 030 538,47	5 306 953,63	23,35%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): Ing. Petr Martínek 03. 12. 2020

Projektant (autorský dozor): Ing. Pavlína Nykodémová 03. 12. 2020

Stavební dozor: Ing. Martin Vavřena

Zástupce Objednatel: Karel Motal

Zaměstnanec KSÚS SK
odpovědný za cenové
projednání Změny: Petr Heinrich

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV 2

Evidenční číslo a název stavby:

III/00516, III/00516a III/0057 Jinočany, oprava silnic

Číslo a název SO/PS: 102 III/00516 - km 2,658 - 4,291

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

102/2

Číslo a název rozpočtu: 102 III/00516 - km 2,658 - 4,291

Skupina Změn: 3

Poř. č. Položka	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny zpočátku v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	131201202	Obložení stěn i do 2000 mm v kamíně tr. 3 objemu do 1000 m3	m3	84 200	711 840	627 640	449 04	37 809,17	0,00	281 835,48	319 644,65	281 835,48	745,42
9	161101001	Snížení ohraničení výkopu v hornině W 1 až 4 hl výška do 2,5 m	m3	155,000	789 140	627 640	44 90	6 986,44	0,00	28 181,04	35 167,48	28 181,04	403,87
16	162701105	Vodorovná ohraničení do 10000 m výška vykopu v hornině W 1 až 4	m3	71,750	699 390	627 640	323,78	8 757,72	0,00	76 434,04	85 171,76	76 434,04	874,76
17	167101101	Nahledání výkopu v hornině W 1 až 4 do 100 m3	m3	71,750	699 390	627 640	37,75	2 708,56	0,00	23 693,59	26 401,95	23 693,59	874,76
18	171201201	Uložení vykopu na skládce	m3	71,750	699 390	627 640	20,23	1 444,39	0,00	12 634,42	14 078,75	12 634,42	874,76
19	172201211	Pozemek ze uložení přebytečného odpadu - horniny a kamenné na skládce	T	1 338,040	1 338,040	1 338,040	21,81	28 181,04	0,00	28 181,04	28 181,04	28 181,04	999,49
31	164801111	Pozemek ze uložení do 50 tl 200 mm	m2	3 991,200	6 579 400	3 198 200	212,81	721 661,27	0,00	667 840,54	1 589 521,61	667 840,54	92,54
69	059111011	obrubení betonový sádky 100 x 25 x 25 cm	M	245,000	1 067,000	792,000	146,53	35 899,85	0,00	116 051,76	151 951,61	116 051,76	323,27
68	016131213	Ohraničení silničního obrubníku betonového stavebního s kladnou výškou do 10 cm z betonu stavebního	M	745,000	1 037,000	792,000	343,62	84 186,90	0,00	272 147,04	356 333,94	272 147,04	323,27
75	919720122	Geotextilie pro ochrannou, separační a filtrační funkci na dle 300 g/m2	m2	1 338,040	1 338,040	1 338,040	120	60 147,20	0,00	60 147,20	60 147,20	60 147,20	88,83
88	197221611	Nahledání silničního obrubníku z betonu stavebního	T	12 913,604	19 092,004	158,400	19,84	256 607,70	0,00	3 142,66	259 749,36	3 142,66	1,22
90	997221415	Pozemek ze uložení na skládce (skladbové) stavebního odpadu betonového klad odstavu 170 101	T	24 456	172,895	158,400	243,62	3 492,62	0,00	38 272,64	41 765,26	38 272,64	1 095,81
92	997221815	Pozemek ze uložení na skládce (skladbové) zeminy a kamenné klad odstavu 170 504	T	6 426 399	7 744 359	3 318 000	217,46	1 197 484,73	0,00	286 612,28	1 684 097,01	286 612,28	20,51
93	998221511	Převzet hornin z betonového obrubníku z betonu stavebního betonového nebo železného	T	824 984	2 095 953	1 271 009	21,81	17 992,90	0,00	27 720,70	45 713,60	27 720,70	154,06
Název položky													
102	060030005	Výhledy obrub (výhledy) obrubních s ochrannými nebo náložními na dopravní prostředky	M	0,000	773,000	773,000	124,00	0,00	0,00	95 852,00	95 852,00	95 852,00	100,00
103	3 nabídky	Příchodka STK odvodů imořav	TP1	0,000	1,000	1,000	53 878,00	0,00	0,00	53 878,00	53 878,00	53 878,00	100,00
104	3 nabídky	Základní	TP1	0,000	1,000	1,000	62 260,00	0,00	0,00	62 260,00	62 260,00	62 260,00	100,00
Celkem								2 824 759,90	0,00	2 374 490,36	5 199 250,27	2 374 490,36	

Odpovědný zástupce Objednatelů i odpovědný zástupce Zhotovitelů odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu a údržbu silnic.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změn.

Za Zhotovitele: Ing. Petr Martinek (stavbyvedoucí)

Za Objednatelů: Ing. Martin Vavřina (TDI)

Datum:

Datum:

03. 12. 2020

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: III/00516, III/00516a III/0057 Jinočany, oprava silnic, 7-0715A19

1	Příjazy snížený částka bez slevy a DPH	39 849 910,00
2=1*19%	Aktuální snížený částka (cena stavby) bez DPH	46 156 863,63
2*2=1,21	Aktuální snížený částka (cena stavby) včetně DPH	54 639 805,00
3=2/1,21	Přecenění směru Přímá snížení částky	113,32%
4=(251/100)	Síťovací vyřazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(201/100)	Síťovací změn položek (Skupina 2)	0,00%
6=(19/100)	Množství změny 18 % pro prostřednictvím změny pro Změny dva 8 se, ostatní všem b)	0,00%

0-37-38	Suma Zelení kladných a Zelení záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	5 302 951,6
0-37-39	Sledování Rintu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	18 927,0
0-10-3	Záporný Rint 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	11 654 873,0

0=120A+110B	Siedziwoz: limitu 40 % Skupinu 3	13 329
10=120A+110B	Siedziwoz: limitu 50 % Skupinu 3	0,00%
10=120A+30B	Suma absolutnych hodnot 2min skladajicich z 2min zapojenych pro Skupinu 3 a Skupinu 4	5 306 953,6
1=1+0,5	Zsknecni limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	18 324 955,0

12/13/14/15	Sledování limitu 15 %	433
15/16	Sledování limitu 149 254 444 Kč	0 0
16/17/18/19/20/21		149 254 444,0

40 - (19) - (10)		Měsíční úroveň 10 % z celkové hodnoty záznamů pro Změny (včetně dle 8.4. odův. 10. sloupc. b)		0,00%																						
						- 1 -		- 2 -		- 3 -				- 4 -				- 5 -								
						Vyhrazení změny (Doměky)		Změna položek (Započítávání)		Neplnění				Nebyly				Změny celkové								
						Změny záporné (zahrnuje se znaménkem minus)		Změny kladné		Suma Změn záporných a Změn kladných		Změny záporné (zahrnuje se znaménkem minus)		Změny kladné		Procentní výpočet Změn kladných		Suma Změn záporných a Změn kladných		Suma absolutních hodnot Změn záporných a Změn kladných		Změny celkové (10% nebo 1 mil 149 224 CEC Kč)		1 mil 15 %		
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34								

Poznámka: Formulář má informačný charakter a zobrazuje sláv k daní, pričom nie je záväzným nástrojom.

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	2
Název a evidenční číslo stavby:	III/00516, III/00516a III/0057 Jinočany, oprava silnic, 7-0715A19
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	III/00516 - km 2,658 - 4,291
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	102 / 2

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
07 Změnový soupis prací SO 102 po změně 2	2	
08 Kalkulace N položek	2	
09 Cenové nabídky a jejich vyhodnocení	7	
10 Zápis ze 14. kontrolního dne ze dne 7.7.2020	5	
11 Stanovisko autorského dozoru k ZBV ze dne dne 24.7.2020	1	
12 Fotodokumentace obrub	2	
13 Situace obrub	2	
14 Výkres zábradlí propustku - km 1.047,90	1	
15 Výkres zábradlí propustku - km 1.270,00	1	
16 Situace propustku - km 1.047,90	1	
17 Situace propustku - km 1.270,00	1	
18 Vzorový příčný řez	1	
9 Podélný řez propustkem	1	
20 Fotodokumentace zábradlí	3	
21 Zápisy ze stavebního deníku	16	
22 Vyjádření TDI k ZBV 2 ze dne 30.9.2020	1	
23 Oznámení o zjištění skutečnosti	2	
24 Pokyn k realizaci stavebních prací ze dne 30.9.2020	1	
Počet listů celkem	50	

Změnový soupis prací SO 102 po změně 2 - pro ZBV 2

Evidenční číslo a název stavby:				ZMĚNOVÝ SOUPIS PRACÍ (SO/PS)										
III/00516, III/00516a III/0057 Jinočany, oprava silnic, 7-0715A192				102/2										
Číslo a název SO/PS: SO 102 - III/00516 - km 2,658 - 4,291														
Číslo a název rozpočtu: SO 102 - III/00516 - km 2,658 - 4,291														
Por. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdíl	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Podíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	13301101	Odstředivá stromá lisovacího průměru 60 mm do 300 mm	KUS	1 000	1 000	0,000	543,64	543,64	0,00	0,00	543,64	0,00	0,00	
2	13301104	Odstředivá stromá lisovacího průměru 60 mm do 300 mm	KUS	1 000	1 000	0,000	1 087,38	1 087,38	0,00	0,00	1 087,38	0,00	0,00	
3	13307224	Odstředivá lisovacího průměru 60 mm do 300 mm	m2	10 627,200	10 627,200	0,000	71,77	762 794,14	0,00	0,00	762 794,14	0,00	0,00	
4	13315445	Průměrná lisovacího průměru 60 mm do 300 mm	m2	12 476,978	12 476,978	0,000	83,77	1 047 358,89	0,00	0,00	1 047 358,89	0,00	0,00	
5	13320101	Průměrná lisovacího průměru 60 mm do 300 mm	m3	71 400	71 400	0,000	336,78	24 046,08	0,00	0,00	24 046,08	0,00	0,00	
6	13320109	Průměrná lisovacího průměru 60 mm do 300 mm	m3	21 420	21 420	0,000	67,36	1 442,85	0,00	0,00	1 442,85	0,00	0,00	
7	132201202	ZBV 2 Průměrná lisovacího průměru 60 mm do 300 mm	m3	66 380	71 400	627,640	665,04	37 000,17	0,00	37 000,17	37 000,17	281 835,40	745,43	
8	132201209	Průměrná lisovacího průměru 60 mm do 300 mm	m3	25 260	25 260	0,000	89,81	2 268,60	0,00	0,00	2 268,60	0,00	0,00	
9	14033245	Průměrná lisovacího průměru 60 mm do 300 mm	m3	13 450	13 450	0,000	615,01	8 268,85	0,00	0,00	8 268,85	0,00	0,00	
10	163101101	ZBV 2 Průměrná lisovacího průměru 60 mm do 300 mm	m3	153,000	783,340	627,640	64,58	6 196,44	0,00	38 381,84	38 381,84	78 381,84	480,37	
11	163201101	Průměrná lisovacího průměru 60 mm do 300 mm	KUS	1 000	1 000	0,000	31,83	31,83	0,00	0,00	31,83	0,00	0,00	
12	163201111	Průměrná lisovacího průměru 60 mm do 300 mm	KUS	1 000	1 000	0,000	468,74	468,74	0,00	0,00	468,74	0,00	0,00	
13	163201121	Průměrná lisovacího průměru 60 mm do 300 mm	KUS	1 000	1 000	0,000	107,28	107,28	0,00	0,00	107,28	0,00	0,00	
14	163201131	Průměrná lisovacího průměru 60 mm do 300 mm	KUS	1 000	1 000	0,000	132,83	132,83	0,00	0,00	132,83	0,00	0,00	
15	163201141	Průměrná lisovacího průměru 60 mm do 300 mm	KUS	1 000	1 000	0,000	236,75	236,75	0,00	0,00	236,75	0,00	0,00	
16	163201151	Průměrná lisovacího průměru 60 mm do 300 mm	KUS	1 000	1 000	0,000	374,51	374,51	0,00	0,00	374,51	0,00	0,00	
17	163201161	ZBV 2 Průměrná lisovacího průměru 60 mm do 300 mm	m3	71 370	699 390	627,640	123,78	8 732,72	0,00	78 644,94	87 377,66	78 644,94	878,26	
18	163201171	ZBV 2 Průměrná lisovacího průměru 60 mm do 300 mm	m3	71 750	699 390	627,640	97,35	3 708,56	0,00	23 693,39	27 401,95	23 693,39	678,76	
19	171201201	ZBV 2 Průměrná lisovacího průměru 60 mm do 300 mm	m3	21 750	699 390	627,640	36,13	2 444,93	0,00	82 634,42	85 079,35	82 634,42	874,26	
20	171201211	Průměrná lisovacího průměru 60 mm do 300 mm	T	143 580	1 463 546	1 319 966	217,86	31 245,51	0,00	786 676,98	317 822,49	786 676,98	818,45	
21	174010101	Průměrná lisovacího průměru 60 mm do 300 mm	m3	33 350	33 350	0,000	368,39	12 282,05	0,00	0,00	12 282,05	0,00	0,00	
22	175151300	Průměrná lisovacího průměru 60 mm do 300 mm	m3	39 678	39 678	0,000	334,34	13 268,25	0,00	0,00	13 268,25	0,00	0,00	
23	181051102	Průměrná lisovacího průměru 60 mm do 300 mm	m2	12 222 920	12 222 920	0,000	25,79	315 060,29	0,00	0,00	315 060,29	0,00	0,00	
24	182101301	Průměrná lisovacího průměru 60 mm do 300 mm	m2	1 251 000	1 251 000	0,000	23,86	29 879,36	0,00	0,00	29 879,36	0,00	0,00	
25	190011109	Průměrná lisovacího průměru 60 mm do 300 mm	m3	13 450	13 450	0,000	2 174,56	29 150,74	0,00	0,00	29 150,74	0,00	0,00	
26	190011109	Průměrná lisovacího průměru 60 mm do 300 mm	KUS	16 000	16 000	0,000	350,31	5 604,96	0,00	0,00	5 604,96	0,00	0,00	
27	190011109	Průměrná lisovacího průměru 60 mm do 300 mm	m3	72 100	72 100	0,000	942,33	67 940,55	0,00	0,00	67 940,55	0,00	0,00	
28	190011109	Průměrná lisovacího průměru 60 mm do 300 mm	m3	1 900	1 900	0,000	2 503,45	4 756,55	0,00	0,00	4 756,55	0,00	0,00	
29	190011109	Průměrná lisovacího průměru 60 mm do 300 mm	m3	25 200	25 200	0,000	969,82	24 459,46	0,00	0,00	24 459,46	0,00	0,00	
30	190011109	Průměrná lisovacího průměru 60 mm do 300 mm	KUS	9 000	9 000	0,000	1 044,97	9 404,73	0,00	0,00	9 404,73	0,00	0,00	
31	190011109	Průměrná lisovacího průměru 60 mm do 300 mm	KUS	9 000	9 000	0,000	3 004,12	27 037,08	0,00	0,00	27 037,08	0,00	0,00	
32	190011109	Průměrná lisovacího průměru 60 mm do 300 mm	KUS	12 000	12 000	0,000	1 004,12	12 049,44	0,00	0,00	12 049,44	0,00	0,00	
33	190011109	Průměrná lisovacího průměru 60 mm do 300 mm	m2	10 627 200	10 627 200	0,000	852,28	9 058 180,96	0,00	0,00	9 058 180,96	0,00	0,00	
34	190011109	Průměrná lisovacího průměru 60 mm do 300 mm	m2	3 381 200	6 528 400	3 147 200	722,81	2 382 612,17	0,00	647 848,24	3 030 460,41	687 648,14	72,54	
35	190011109	Průměrná lisovacího průměru 60 mm do 300 mm	m2	10 627 200	10 627 200	0,000	374,63	3 982 287,36	0,00	0,00	3 982 287,36	0,00	0,00	
36	190011109	Průměrná lisovacího průměru 60 mm do 300 mm	m2	7 236 000	7 236 000	0,000	215,38	1 558 288,80	0,00	0,00	1 558 288,80	0,00	0,00	
37	190011109	Průměrná lisovacího průměru 60 mm do 300 mm	m2	1 156 475	1 156 475	0,000	1 085,46	1 254 554,04	0,00	0,00	1 254 554,04	0,00	0,00	
38	190011109	Průměrná lisovacího průměru 60 mm do 300 mm	m2	763 500	763 500	0,000	49,83	37 995,30	0,00	0,00	37 995,30	0,00	0,00	
39	190011109	Průměrná lisovacího průměru 60 mm do 300 mm	m2	10 627 200	10 627 200	0,000	16,18	172 054,32	0,00	0,00	172 054,32	0,00	0,00	
40	190011109	Průměrná lisovacího průměru 60 mm do 300 mm	m2	29 304 370	29 304 370	0,000	31,72	929 324,87	0,00	0,00	929 324,87	0,00	0,00	
41	190011109	Průměrná lisovacího průměru 60 mm do 300 mm	m2	12 476 978	12 476 978	0,000	234,49	2 927 622,78	0,00	0,00	2 927 622,78	0,00	0,00	
42	190011109	Průměrná lisovacího průměru 60 mm do 300 mm	m2	12 476 978	12 476 978	0,000	263,79	3 292 297,30	0,00	0,00	3 292 297,30	0,00	0,00	
43	190011109	Průměrná lisovacího průměru 60 mm do 300 mm	T	43 088	43 088	0,000	150,35	6 481,23	0,00	0,00	6 481,23	0,00	0,00	
44	190011109	Průměrná lisovacího průměru 60 mm do 300 mm	T	23 178	23 178	0,000	358,35	8 304,65	0,00	0,00	8 304,65	0,00	0,00	
45	190011109	Průměrná lisovacího průměru 60 mm do 300 mm	m3	245 000	1 057 000	792 000	946,51	35 899,85	0,00	186 051,76	186 051,76	186 051,76	223,27	
46	190011109	Průměrná lisovacího průměru 60 mm do 300 mm	KUS	9 000	9 000	0,000	942,83	8 485,47	0,00	0,00	8 485,47	0,00	0,00	
47	190011109	Průměrná lisovacího průměru 60 mm do 300 mm	KUS	9 000	9 000	0,000	907,40	8 166,60	0,00	0,00	8 166,60	0,00	0,00	

[illegible]

Phiona c 7

0.000	0.000	507.40	4 566.60	0.00	0.00	4 566.60	0.00	0.00
9.000	0.000	277.94	2 500.74	0.00	0.00	2 500.74	0.00	0.00
12.000	0.000	329.87	10 078.44	0.00	0.00	10 078.44	0.00	0.00
9.000	0.000	329.87	7 558.83	0.00	0.00	7 558.83	0.00	0.00
175.600	0.000	515.85	90 583.26	0.00	0.00	90 583.26	0.00	0.00
289.271	0.000	319.47	92 397.43	0.00	0.00	92 397.43	0.00	0.00
283.550	0.000	334.39	94 816.28	0.00	0.00	94 816.28	0.00	0.00
70.000	0.000	183.27	12 684.70	0.00	0.00	12 684.70	0.00	0.00
76.000	0.000	289.99	10 437.84	0.00	0.00	10 437.84	0.00	0.00
70.000	0.000	30.20	2 114.00	0.00	0.00	2 114.00	0.00	0.00
1.000	0.000	10 268.74	10 268.74	0.00	0.00	10 268.74	0.00	0.00
9.000	0.000	1 957.10	17 613.90	0.00	0.00	17 613.90	0.00	0.00
8.000	0.000	664.45	5 315.60	0.00	0.00	5 315.60	0.00	0.00
9.000	0.000	1 510.11	13 590.59	0.00	0.00	13 590.59	0.00	0.00
12.000	0.000	2 190.98	28 691.76	0.00	0.00	28 691.76	0.00	0.00
12.000	0.000	2 443.05	43 316.60	0.00	0.00	43 316.60	0.00	0.00
1 812.580	0.000	12.08	21 895.97	0.00	0.00	21 895.97	0.00	0.00
265.230	0.000	17.08	3 203.98	0.00	0.00	3 203.98	0.00	0.00
70.140	0.000	24.16	1 694.58	0.00	0.00	1 694.58	0.00	0.00
86.640	0.000	24.16	2 093.22	0.00	0.00	2 093.22	0.00	0.00
146.250	0.000	115.98	16 962.08	0.00	0.00	16 962.08	0.00	0.00
138.000	0.000	166.72	23 607.36	0.00	0.00	23 607.36	0.00	0.00
2 234.590	0.000	5.01	6 748.46	0.00	0.00	6 748.46	0.00	0.00
284.250	0.000	6.04	1 716.87	0.00	0.00	1 716.87	0.00	0.00
1 037.000	792.000	343.62	94 186.90	0.00	272 147.04	356 333.94	272 147.04	233.27
2.000	0.000	30 202.17	60 404.34	0.00	0.00	60 404.34	0.00	0.00
2.000	0.000	39 966.96	79 733.72	0.00	0.00	79 733.72	0.00	0.00
2.000	0.000	41 481.12	86 582.24	0.00	0.00	86 582.24	0.00	0.00
13.650	0.000	422.83	5 771.67	0.00	0.00	5 771.67	0.00	0.00
9 604.000	1 369.000	30.20	218 527.20	0.00	31 313.60	259 840.80	41 913.60	18.81
210.500	0.000	66.44	13 985.67	0.00	0.00	13 985.67	0.00	0.00
210.500	0.000	138.93	25 244.77	0.00	0.00	25 244.77	0.00	0.00
75.600	0.000	245.89	6 297.34	0.00	0.00	6 297.34	0.00	0.00
350.000	0.000	494.64	65 196.00	0.00	0.00	65 196.00	0.00	0.00
12.000	0.000	3 563.86	42 768.32	0.00	0.00	42 768.32	0.00	0.00
1 525.000	0.000	72.09	110 547.25	0.00	0.00	110 547.25	0.00	0.00
7.500	0.000	61.63	469.73	0.00	0.00	469.73	0.00	0.00
30.000	0.000	302.82	9 060.60	0.00	0.00	9 060.60	0.00	0.00
3.000	0.000	271.82	271.82	0.00	0.00	271.82	0.00	0.00
5.000	0.000	2 234.86	11 174.80	0.00	0.00	11 174.80	0.00	0.00
14 358.420	1 924.870	6.04	78 118.57	0.00	11 625.91	89 744.48	11 625.91	14.83
241 515.236	125 113.300	6.04	78 118.57	0.00	755 684.19	1 458 755.05	255 684.19	147.48
15 016.824	2 083.210	19.44	256 802.70	0.00	41 381.08	347 933.78	41 931.08	16.11
177.856	158.400	241.62	3 492.62	0.00	38 272.64	41 765.26	38 272.64	1 095.81
6 490.609	0.000	144.93	340 843.51	0.00	0.00	340 843.51	0.00	0.00

Rozbor ceny položky 90010 .N

TOV 000

TOV 000

WJ

1	Přímý materiál		0,00
2	Náklady		0,00
3	Odvody	34 % z mzd	0,00
4	Šroty		0,00
5	Ostatní přímé náklady		56 800,00
6	Přímé zpracovací náklady [2] až [5]		56 800,00
7	Nekalkulované náklady		0,00
	Přímé + nekalkulované náklady [1] + [6] + [7]		56 800,00
8	nář. výrobní	0,0 % z [1] + [6]	0,00
9	nář. oprávnění	5,0 % z [1] + [6]	2 830,00
	Nepřímé náklady [8] + [9]		2 830,00
	Náklady celkem + nekalkulované [1] + [6] + [7] + [8] + [9]		59 630,00
10		5,0 % z [1] + [6]	2 830,00
	Celkem [1] + [6] až [10]		62 460,00
	Jednotková cena		

Hodnota
Normativy

0,000000
0,0

P.Č.	T	Kód položky	Název položky	WJ	Množství	Jednotková cena	Celkem
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
1	0		Jednotková cena	WJ	1,0	56 800,00	56 800,00

56 800,00

Přepočet na c. d. základního období:

Základní datum:

0

Aktuální období:

0 = 0,00000

Výpočet:

Jednotková cena / aktuální index = devaltovaná jednotková cena (položky "DEVAL")

Ostatné položky rozboru ceny (kalkulace) jsou oceněny jednotkovými cenami uvedenými v nabídce, tedy v c. d. odpovídající základnímu datu.

Rozbor ceny položky 90010 .N

STL plynovodu Jinočany - sub NOLSET

TOV 000

TOV 000

MJ KPL

1	Přímé materiálu		0,00
2	Mzdy		0,00
3	Odvody	34 % z mezd	0,00
4	Stručje		0,00
5	Ustálené přímé náklady		48 980,00
6	Přímé zpracovací náklady (2) až (4)		48 980,00
7	Nekalkulované náklady		0,00
	Přímé + nekalkulované náklady (1) + (6) + (7)		48 980,00
8	režie výroby	0,0 % z (1) + (6)	0,00
9	režie správy	5,0 % z (1) + (6)	2 449,00
	Nepřímé náklady (8) + (9)		2 449,00
	Náklady celkem + nekalkulované (1) + (6) + (7) + (8) + (9)		51 429,00
10	Zisk	5,0 % z (1) + (6)	2 449,00
	Celkem (1) + (6) až (10)		53 878,00

Jednotková cena

Hodnota

0,000000

Normohodiny

0,0

P.Č.	T	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	Celkem
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
1	0		Přeložka STL plynovodu Jinočany - sub NOLSET	KPL	1,0	48 980,00	48 980,00

48 980,00

Přepočten na cú dle základního období:

Základní datum: 0

Aktuální období: 0 = 0,00000

Výpočet: jednotková cena / aktuální index = devalvovaná jednotková cena (položky "DEVAL")

Ostatní položky rozboru ceny (kalkulace) jsou oceněny jednotkovými cenami uvedenými v nabídce, tedy v cú odpovídající základnímu datu.

Přeložka STL plynovodu Jinočany

Ing. Petr Martínek

Na Florenci 2116/15 110 00 Praha 1 Czech Republic

E-mail:

Web: www.slnicegroup.com

Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
projekt přeložky STL plynovodu	kpl	1,00	3 500,00	3 500,00
územní souhlas + vyjadřovačky ...	kpl	1,00	2 500,00	2 500,00
Projekt + doklady				6 000,00
revize plynových zařízení	kpl	1,00	1 850,00	1 850,00
tlaková zkouška	kpl	1,00	900,00	900,00
geodetické zaměření	kpl	1,00	5 500,00	5 500,00
přejímka na PPD + doklady	kpl	1,00	2 400,00	2 400,00
Revize, zkoušky, doklady				10 650,00
potrubí PE s ochr. Pláštěm	m	10,00	120,00	1 200,00
přípojkový tkus 40/25	ks	2,00	950,00	1 900,00
elektrospojky	ks	6,00	150,00	900,00
elektrozáslepky PE40	ks	2,00	250,00	500,00
signalizační vodič	m	10,00	12,00	120,00
výstražná folie	m	5,00	12,00	60,00
drobný materiál, tangit	kpl	1,00	150,00	150,00
Materiál				4 830,00
Přeložka PE 40	kpl	1,00	7 500,00	7 500,00
Dvojité stlačení s bypassem	kpl	1,00	9 500,00	9 500,00
Montáž				17 000,00
zemní práce + dovoz písku	kpl	1,00	9 500,00	9 500,00
Zemní práce				9 500,00
doprava	kpl	2,00	500,00	1 000,00
Doprava				1 000,00

Celkem

48 980,00 Kč

Jan Šedivý
NOLSET s.r.o.
Klíčovská 791 / 7
190 00 Praha 9
IČO 28241037
tel:

V Praze 16.4. 2020

CENOVÁ NABÍDKA:**III/00516, III/00512 a III/0057 Jinočany, oprava silnic“
Přeložka STL plynovodu**

<i>Název položky</i>	<i>MJ</i>	<i>množství</i>	<i>cena / MJ</i>	<i>celkem (Kč)</i>
projekt přeložky STL plynovodu	kpl	1,00	5 000,00	5 000,00
územní souhlas + vyjadřovačky	kpl	1,00	3 000,00	3 000,00
Projekt, doklady				8 000,00
revize plynových zařízení	kpl	1,00	3 500,00	3 500,00
tlaková zkouška	kpl	1,00	1 050,00	1 050,00
geodetické zaměření	kpl	1,00	10 000,00	10 000,00
přejímka na PPD + doklady	kpl	1,00	2 500,00	2 500,00
Revize, zkoušky, doklady				17 050,00
potrubí PE s ochr. pláštěm	m	10,00	135,00	1 350,00
přípojkový tkus 40/25	ks	2,00	1 050,00	2 100,00
elektrospojky	ks	6,00	250,00	1 500,00
elektrozáslepky PE40	ks	2,00	350,00	700,00
signalizační vodič	m	10,00	15,00	150,00
výstražná folie	m	5,00	15,00	75,00
drobný materiál, tangit	kpl	1,00	150,00	150,00
Materiál				6 025,00
Přeložka PE 40	kpl	1,00	10 000,00	10 000,00
Ovojité stlačení s bypassem	kpl	1,00	15 000,00	15 000,00
Montáž				25 000,00
zemní práce vč. dovozu písku	kpl	1,00	10 000,00	10 000,00
Zemní práce				10 000,00
doprava	kpl	2,00	2 000,00	4 000,00
Doprava				4 000,00
Celkem v Kč bez DPH				70 075,00

V Žatci, dne 14.04.2020

Martin Janák - DAGA SERVIS



Lacínova 750, 272 01 Kladno

IČO: 43774458

DIČ: CZ43774458

Bank spojení: KB Kladno

Č.úctu:

Tel:

email: ii

CENOVÁ NABÍDKA:

III/00516, III/00512 a III/0057 Jinočany, oprava silnic"
Přeložka STL plynovodu

Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Projekt, doklady				9 050,00
projekt přeložky STL plynovodu	kpl	1,00	5 750,00	5 750,00
územní souhlas + vyjadřovačky	kpl	1,00	3 300,00	3 300,00
Revize, zkoušky, doklady				19 712,50
revize plynových zařízení	kpl	1,00	4 025,00	4 025,00
tlaková zkouška	kpl	1,00	1 312,50	1 312,50
geodetické zaměření	kpl	1,00	11 500,00	11 500,00
přelímkna na PPD + doklady	kpl	1,00	2 875,00	2 875,00
Materiál				7 003,75
potrubí PE s ochr. pláštěm	m	10,00	162,00	1 620,00
přípojkový tkus 40/25	ks	2,00	1 207,50	2 415,00
elektrospojky	ks	6,00	287,50	1 725,00
elektrozáslepky PE40	ks	2,00	402,50	805,00
signalizační vodič	m	10,00	17,25	172,50
výstražná folie	m	5,00	17,25	86,25
drobný materiál, tangit	kpl	1,00	180,00	180,00
Montáž				29 250,00
přeložka PE 40	kpl	1,00	12 000,00	12 000,00
dvojitě stlačení s bypassem	kpl	1,00	17 250,00	17 250,00
Zemní práce				12 000,00
zemní práce vč. dovozu písku	kpl	1,00	12 000,00	12 000,00
Doprava				4 600,00
doprava	kpl	2,00	2 300,00	4 600,00
Celkem v Kč bez DPH				81 616,25

20.04.2020

Luboš Vejvar
jednatel společnosti

Monika Přenosilová

Od: Petr Martínek
Odesláno: 27. dubna 2020 10:50
Komu: Monika Přenosilová
Předmět: FW: cenová nabídka

Příznak pro zpracování: Zpracovat
Stav příznaku: Dokončeno

From: Antonín Ebert [mailto:antonin.ebert@firma.cz]
Sent: Friday, April 17, 2020 5:41 PM
To: Petr Martínek
Subject: cenová nabídka

Dobrý den

posílám cenovou nabídku na zábradlí

cena.....56 600kč

S pozdravem A.Ebert

Zámečnictví –kovářství Jan Willheim

Cenová nabídka

Naše cenová nabídka na výrobu zábradlí na akci Jinočany číní.

Materiál.....16200 Kč

Zinkování.....7350 Kč

Nátěr.....6400 Kč

Práce na výrobu.....32150 Kč

Doprava.....2000 Kč

Celkem.....63800 Kč

Výroba 3 – 4 Týdny

S pozdravem Jan Willheim

Monika Přenosilová

Předmět: RE: zábradlí Jinočany

From: Erka Komárek [i]
Sent: Friday, April 20, 2020 12:13 PM
To: Monika Přenosilová
Subject: RE: zábradlí Jinočany

Dobrý den, bohužel se omlouvám ,ale z kapacitních důvodů se musíme omluvit .
Zakázku nebudeme naceňovat.

Komárek Roman
E R K A Žatec

From: Petr Martínek
Sent: Wednesday, April 14, 2020 9:02 AM
To: 'erkazatec@seznam.cz'
Subject: FW: zábradlí Jinočany

Dobrý den,

Posílám poptávku na výrobu zábradlí, potřeboval bych nacenit dle výkresů v příloze. Děkuji za spolupráci.

Ing. Petr Martínek

vedoucí střediska speciálních technologií

SILNICE GROUP a.s.

Na Florenci 2116/15 | 110 00 Praha 1 | Czech Republic

E-mail: erkazatec@seznam.cz Web: www.silnicegroup.com

OBLAST SEVEROZÁPAD | Lounská 2402 | 438 39 Žatec | Czech Republic |

OBLAST STŘED | Na Florenci 2116/15 | 110 00 Praha 1 | Czech Republic |

Vyhodnocení nabídek - Stavba 1911037 - III/00516, III/00516a III/0057 Jinočany, oprava silnic					
pol.103	Přeložka STL plynovodu Jinočany	kpl	NOLSET s.r.o. Cenová nabídka dne 16.4.2020 48 980,00 Kč	MARTIN JANÁK - DAGA SERVIS Cenová nabídka dne 14.4.2020 70 075,00 Kč	ESTA spol. s.r.o. Cenová nabídka dne 20.4.2020 81 616,25 Kč
pol.104	Zábradlí	kpl	A.Eber e-mail dne 17.4.2020 56 600 Kč	Zámečnictví-kovářství Jan Willheim Cenová nabídka 63 800 Kč	ERKA Žatec e-mail dne 20.4.2020 odmítnuto z kapacitních důvodů

Zápis z 14. kontrolního dne a 14. KD KOO BOZP

III/00516, III/00512 a III/0057 Jinočany, oprava silnic

Kontrolní den

číslo 14. konaný dne 07. 07. 2020

Účastníci

Seznam účastníků je uveden v příloze č. 1 – Prezenční listina

1. Kontrola úkolů z minulého KD

Úkol číslo	Název	Skutečný stav plnění úkolu	Odpovídá	Splněno
0/1		Při projednání/předkládání/schvalování realizační dokumentace stavby bude Zhotovitel postupovat plně v souladu s SOD, zejména bude Zhotovitelem předkládána informace o cenovém dopadu s propočtem ceny včetně uvedení všech položek soupisu prací, kterých se změna dotýká, s vyčíslením rozdílu objemu položky proti ZDS a případně uvedením položek nových, a formulář „Informace o zařazení do režimu ZBV“ dle postupu Směrnice pro Změny staveb v platném znění.	Zhotovitel	T: kontrola na příštím KD
0/4		Zhotovitel předloží vždy do pátku Týdenní plán práce.	Z	Průběžně
10/1	Aktualizace RDS rozdílový soupis prací	Zhotovitel předloží objednateli a TDI aktualizaci PD RDS včetně rozdílového soupisu prací. Výměna rozbahněných vrstev v úseku km 1,270 – 1,120 u hráze rybníka za vrstvu z ŠD 63/125 v tl. 800 mm na vrstvu z geotextílie, včetně odvozu a uložení na skládku (cca 720 m ³) Odstranění stávajících a osazení nových silničních obrub oboustranně komunikace ul. Hlavní v úseku km 0,315 – 0,755, cca 900 bm (dle dodatku k PD) Zábradlí u propustku v km 1,270 oboustranně a v km 1,085 (vnější oblouk) dle dodatku k PD Přeložka plynu ve vloku propustku v km 1,085 – zpracována PD Dopsáno na 11.KD: Úkol trvá.	Zhotovitel	19.05.2020
11/2	Obrubník	Zhotovitel osadí obrubník v místě UV v křižovatce ulic Karlístejská x nám. 5. května v km 0,238 84 v délce cca 15 m, od svislé značky P2 Dopsáno na 14.KD: Splněno. Vypouští se.		
13/1	Objízdné trasy	Zhotovitel provede po uvedení stavby do provozu repaspotřizaci objízdných tras, a provede porovnání s provedenou pasportizací, kterou provedl před zahájením stavebních prací a provede vyhodnocení případného poškození objízdných tras vlivem provozu během provádění prací. AD na základě vyhodnocení provede návrh opravy objízdných tras včetně rozdílového soupisu prací. Dopsáno na 14.KD: Úkol trvá.	Zhotovitel/AD	NT: 15.07.2020

2. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby

plnění věcného
harmonogramu
popis provedených
prací

Práce pokračují v souladu s odevzdaným aktualizovaným HMG

V období od 23.06.2020 do 07.07.2020 byly provedeny práce:

SO102

- provedení VDZ v již hotovém úseku
- osazení sloupků zábradlí
- profíznutí a zalití spár
- vybudování posunutých zastávek BUS pro další etapu
- úklid staveniště
- dne 23.6. zahájení nové etapy – km 0,300 – 0,235
- frézování stávajícího krytu
- odstranění stávajících podkladních vrstev komunikace
- pokládka vrstvy SC 8/10 v tl. 120 mm v km 0,300 – 0,235
- pokládka šterbinového žlabu v dl. 35 m
- pokládka živичných vrstev ACP, ACL v km 0,300 – 0,235
- osazení silničních obrub v zatáčce do ul. 5. Května – 19 m

Viz zpráva Zhotovitele o postupu prací

Za měsíc červen je prostavěno 2 496 967,00 Kč bez DPH. Celkem je fakturováno 40 980 130,06 Kč bez DPH, tj. 95,78 % z celkové ceny za dílo.

Zhotovitel I TDI polizují průběžně fotodokumentaci stavby.

finanční plnění

fotodokumentace



SO 102 – km 0,235-0,300

000

3. Kontrola kvality

a) zpráva o hodnocení
kvality za uplynulé období

b) Podzhotovitelé

Stavební práce probíhají bez připomínek.

K dnešnímu dni jsou odsouhlaseni následující podzhotovitelé a dodavatelé:
Dle SOD

c) Výrobky/materiály/směsi

K dnešnímu dni jsou odsouhlaseny následující výrobky/materiály/směsi:
Dle SOD

KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC
Jihočeský územní úřad
EVIDENČNÍ ČÍSLO
14/2020/KD

ZÁPIS Z 14. KONTROLNÍHO DNE A 14. KD KOO BOZP
DOKUMENTACE STAVBY MR
KLASIFIKACE

JINOČANY
STRANA: 2/5

- d) TePř/KZP K dnešnímu dni jsou odsouhlaseny tyto TePř.
TePř 01 Frézování, sanace podloží, pokládka asfaltových hutněných vrstev
- e) BOZP Zhotovitel bude posílat digitální koncepty TePř také koordinátorovi BOZP.

4. Stav BOZP a PO

Zároveň s kontrolním dnem stavby proběhl také 14. kontrolní den BOZP.

A. ZPRÁVA KOORDINÁTORA BOZP ke dni 07.07.2020

Všeobecně – zjištění, náměty, návrhy opatření

- je nutné bezprostředně zajistit zákaz vstupu na staveniště nepovolaných osob
- při vstupu na staveniště podzhotovitelů resp. pracovníků jiných firem nutno zajistit písemné seznámení s riziky stavby a staveniště
- oznámení nových podzhotovitelů nutno zaslat KOO BOZP minimálně 8 dnů před nástupem
- základní ochranné prostředky pracovníků nutno používat a platí i pro podzhotovitele
- zhotovitel zpracuje jednoduchý plán staveniště s vyznačením dopravních cest, skládky materiálů a mezideponií
- viditelně bude vyvěšeno oznámení o zahájení prací OIP – předáno zhotoviteli

B. Zpráva zhotovitele k BOZP – bez připomínek

C. 1) Plán práce na další období :

- týdenní plány práce budou zasílány TDI a v kopii KOO BOZP průběžně
- práce dle P5 NV 136/2016 Sb. zhotovitel nepředpokládá provádění

2) Úkoly z předchozích KD KOO BOZP :

- 00/01 Zpracované TePř na stavební práce, budou obsahovat část BOZP a podléhají schválení KOO BOZP a TDI
- 00/02 OZO zhotovitele zpracuje plán interních kontrol BOZP na stavbě. Plán zašle elektronicky KOO BOZP. Zápis z kontrol zašle též elektronicky KOO BOZP.
- 00/03 Zhotovitel zajistí pravidelné kontroly zabezpečení staveniště a označení tabulkami a značkami.

3) Úkoly trvalé:

- zajistit a trvale kontrolovat oplocení staveniště s výstražnými tabulkami
- trvale provádět kontrolu dopravního značení vyplývajících z DIO
- kontrolní dny KOO BOZP budou prováděny jedenkrát měsíčně dle plánu KD BOZP

Ze strany KOO BOZP je nutno zhotovit ochranné zábradlí na pomocné konstrukci pod konzolou mostu a zabezpečit staveniště trvalým oplocením.

KOO BOZP seznámil - informoval zhotovitele s aktuálními zdravotními a bezpečnostními riziky na staveništi pro nadcházející stavební období.

Nejvýznamnější riziko - je možný střet s veřejnou dopravou; nebezpečí střetu se stroji, vozidly – viz aktuální DIO (dbát zvýšené opatrnosti při výjezdu a nájezdu do SDP + příjezdových komunikacích ke staveništi a mezideponií, řádně vyznačit vjezdy a výjezdy ze stavby, dodržovat bezpečné vzdálenosti).

5. Různé

Stavební deníky budou vedené v listinné podobě. Bude veden jeden stavební deník. Stavební deník bude uložen v buňce na zařízení staveniště a v průběhu pracovní doby bude zajištěna jeho dostupnost.

Zhotovitel bude informovat NDIC o aktuálním stavu a změnách uzavírek.

6. Nové úkoly

Úkol číslo	Název	Obsah úkolu a požadovaný cílový stav	Odpovídá	Termín
14.1		Dne 15.7. bude provedeno VDZ a následně bude odstraněno DIO.		

7. Závěry z kontrolního dne

Datum konání příštího KD Příští kontrolní den stavby se bude konat dle potřeby objednatele nebo zhotovitele

Zapsal

Ing. Martin Vavřena
Jméno

Podpis

Přílohy

Číslo	Název
1	Prezenční listina

Rozdělovník

Vyhotoveno v 1 výtisku – rozesláno účastníkům dle prezenční listiny elektronicky ve formátu PDF.
Originál je uložen na TDS.

Vyhotoveno ve 5 výtiscích, každý o 5 stranách.

Výtisk číslo	Adresát	Datum	Podpis
1	Krajská správa a údržba silnic Stř. kraje, p. o.		
2	PORR, a.s.		
3	SILNICE GROUP, a.s.		
4	Stalor spol. s r.o.		
5	<u>Pro spis</u>		

KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC
STŘEDOČESKÉHO KRAJE P. O.
EVIDENČNÍ ČÍSLO
14/2020/KD

ZÁPIS Z 14. KONTROLNÍHO DNE A 14. KD KOO BOZP
STAVBY M1
KLASIFIKACE: PRO VNITŘNÍ POTŘEBU

JINOCANY
STRANA: 4/5

Příloha č. 1
K evidenčnímu číslu: 14/2020/KD

Počet stran
Počet výšek
Výšek číslo
Klasifikace PVP

Jinočany

Příloha č. 1 k Zápisu z kontrolního dne stavby
Prezenční listina

Kontrolní den stavby

číslo 14. konaný dne 07.07.2020

Jméno, příjmení, titul	Organizace, funkce	Telefon, e-mail	Podpis
Pavel Špaček	KSUS SK Zástupce objednatele		
Martin Vavřena Ing.	TDI		
Jan Turínek	PORR a.s.		
Petr Martinek, Ing.	SILNICE GROUP a.s.		
<i>Radim Holubář</i>	<i>FOCUS CZ</i>		
<i>Petr Dvořák</i>	<i>INTER JAKOUBEK</i>		
<i>Josef Bunc</i>	<i>Por.</i>		

KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC
STŘEDOČESKÉHO KRAJE P.O.
EVIDENČNÍ ČÍSLO
14/2020/KD

ZÁPIS Z 14. KONTROLNÍHO DNE A 14. KD KOO BOZP

DOKUMENTACE STAVBY MR
KLASIFIKACE: PRO VNITŘNÍ POTŘEBU

JINOČANY
STRANA 5/6

Akce: III/00516, III/00512 a III/0057 Jinočany, oprava silnic

Věc: Stanovisko autorského dozoru k ZBV

V rámci zpracování projektové dokumentace bylo počítáno s ponecháním stávajících obrub a návaznou opravou chodníků. Během stavby bylo zjištěno, že jejich stav je nevyhovující a z tohoto důvodu bylo přistoupeno k jejich výměně v plném rozsahu.

Za Forvia CZ, s.r.o.

Ing. Pavlína Nykodémová

V Praze dne 24. 7. 2020












VÝNĚS ZÁBRADÍ PROPUSTKU - km 1,047 90

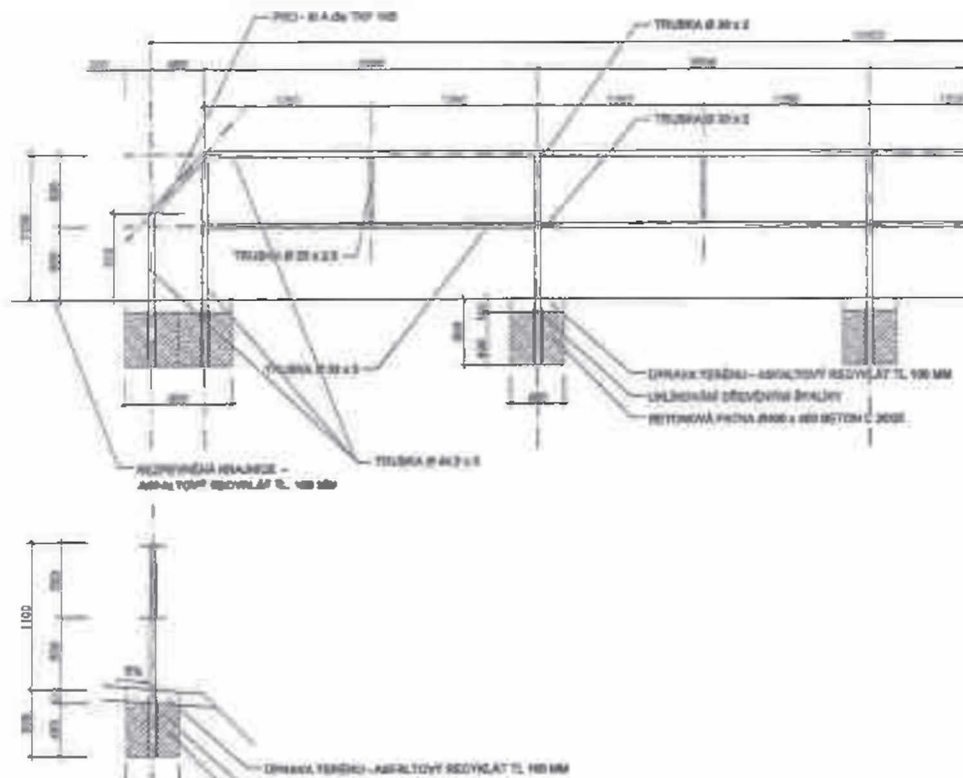

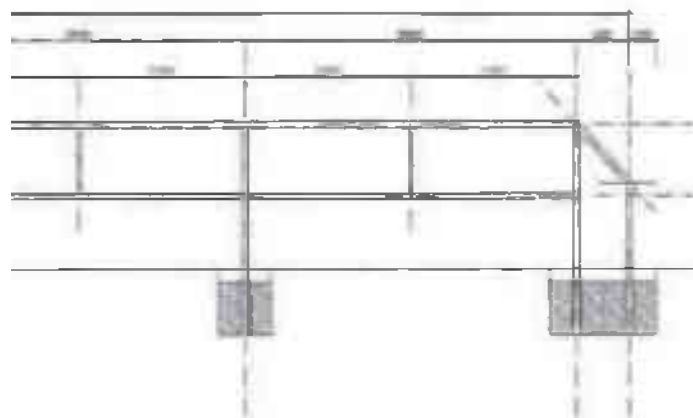

Objekt:	1001	Str. 10/1000
Wzrost:	1001	1001
Stwierdzenie:	1001	1001

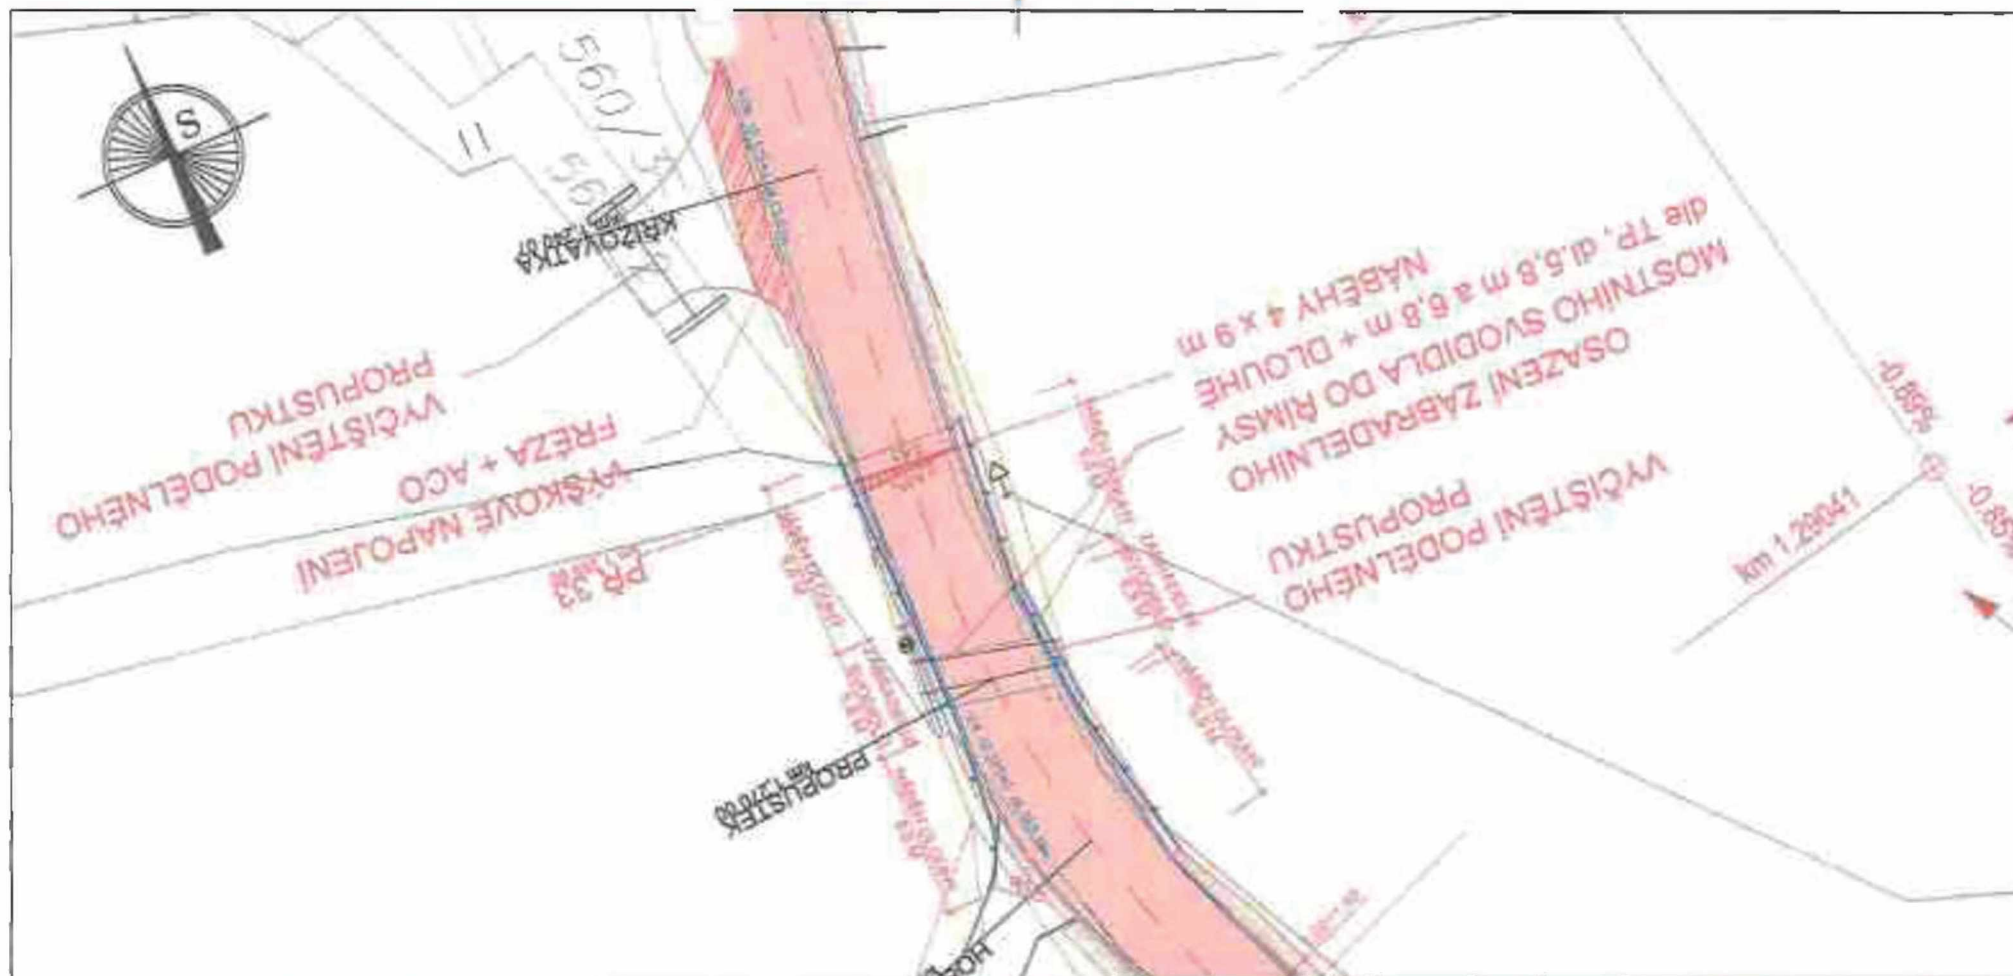


Číslo zakázky:	HIP:	Ing. Jiří Sebeš
Schválil:	Zeda. projektant:	Ing. Jiří Sebeš
Ing. Jiří Sebeš	info@forvia.cz	
Tech. kontrola:	Vypracoval:	Št. Jan Černý
Ing. Pavlína Nykodémová	cerny@forvia.cz	

Objednatel: KSÚS Středočeského kraje		Katastr: Jinočany	Kraj: Středočeský
Akce:	III/00516, III/00512 a III/0057 Jinočany, oprava silnic - PD		
Objekt:	III/00516		
Příloha:	SITUACE PROPUSTKU - km 1,270 00	Měřítko: 1:250	

ForVia.cz
 IČO: 253 62 421
 DIČ: CZ25362421
 Podlipná 1, 250 01 Podlipná - Klat

km 1,15 - km 1,22

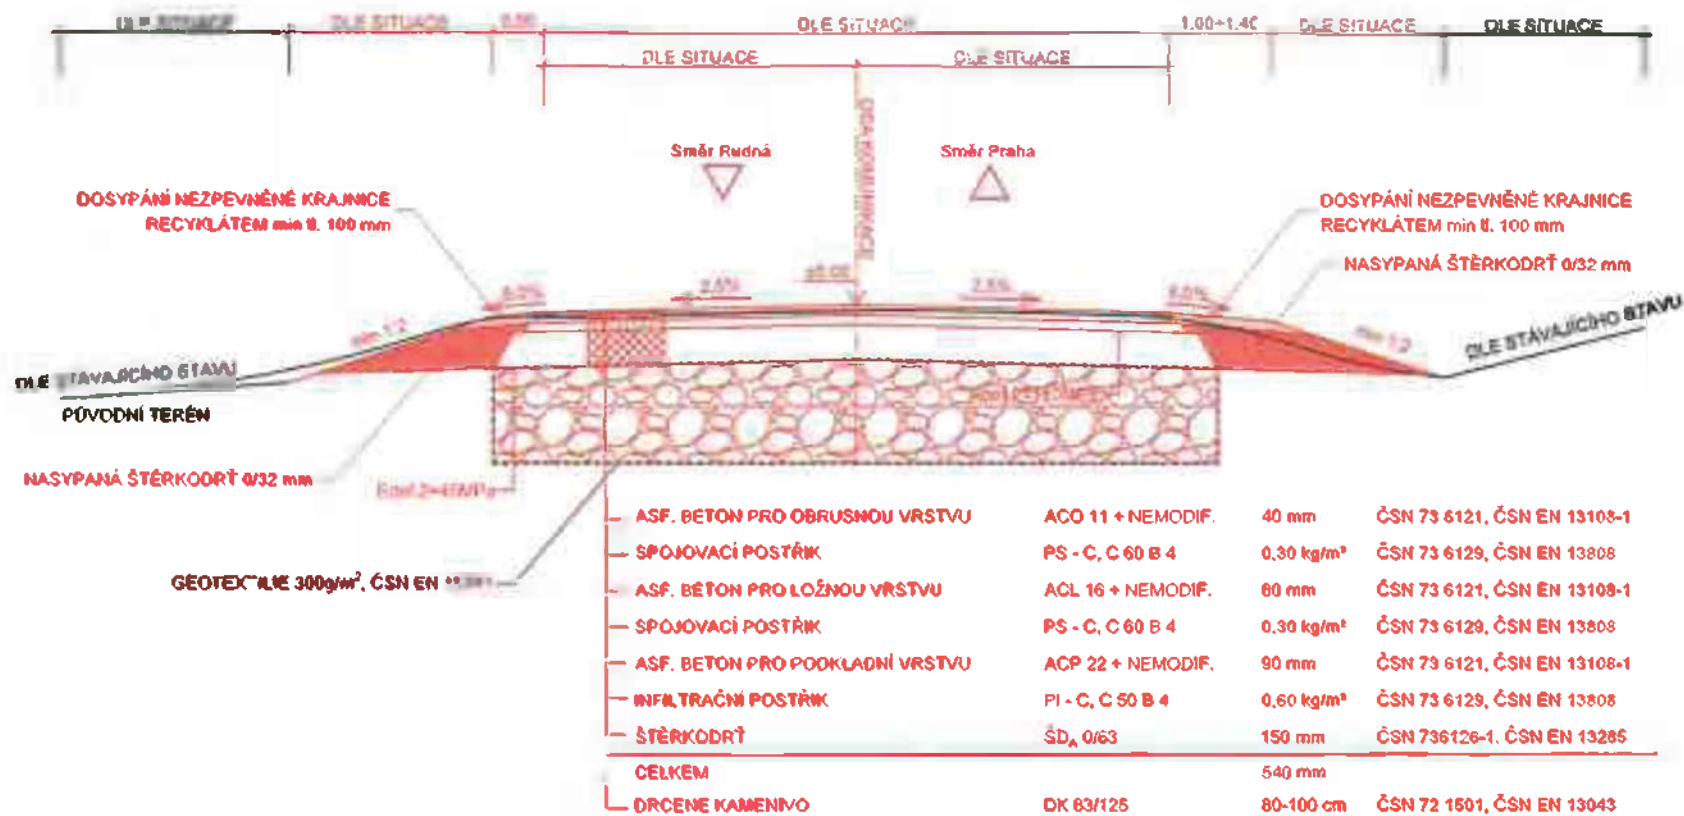

Poznámky:

- PRACOVNÍ SPÁRY V KONSTRUKČNÍCH VRSTVÁCH BUDOU VYSTRÝDÁNY O 0,2 m
- STYČNÁ PLOCHA BUDE OŠETŘENA DLE TP 115 PRŮŘEZOVÁNÍM KORMURKY A ZALUTÍM MODIFIKOVANOU ASFALTOVOU ZALIVKOU


Číslo zakázky	MP:	Ing. Jiří Šobol
201602	—	
Gchevskt	Zodp. projektant:	Ing. Jiří Šobol
Ing. Jiří Šobol	info@forvia.cz	
Techn. kontrola:	Vypracoval:	Bc. Jan Černý
Ing. Pavlína Hrubá	cerny@forvia.cz	



FORVIA CZ, s.r.o.
 IČO: 23902495, DIČ: CZ23902495
 1.29 | Pachtová - Klat

Objednatel:	ICSUS, Středočeského újezd	Kraj:	Středočeský
Adresa:	III/00516, III/00512 a III/0057 Jinočany, oprava silnic - PD	Datum:	11.12.2011
Objekt:	III/00516	Stran:	1
Příloha:	VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ 2.1	Měřítko:	1:50

PODELNY ŘEZ PROPUSTKEM
km 1,047 90

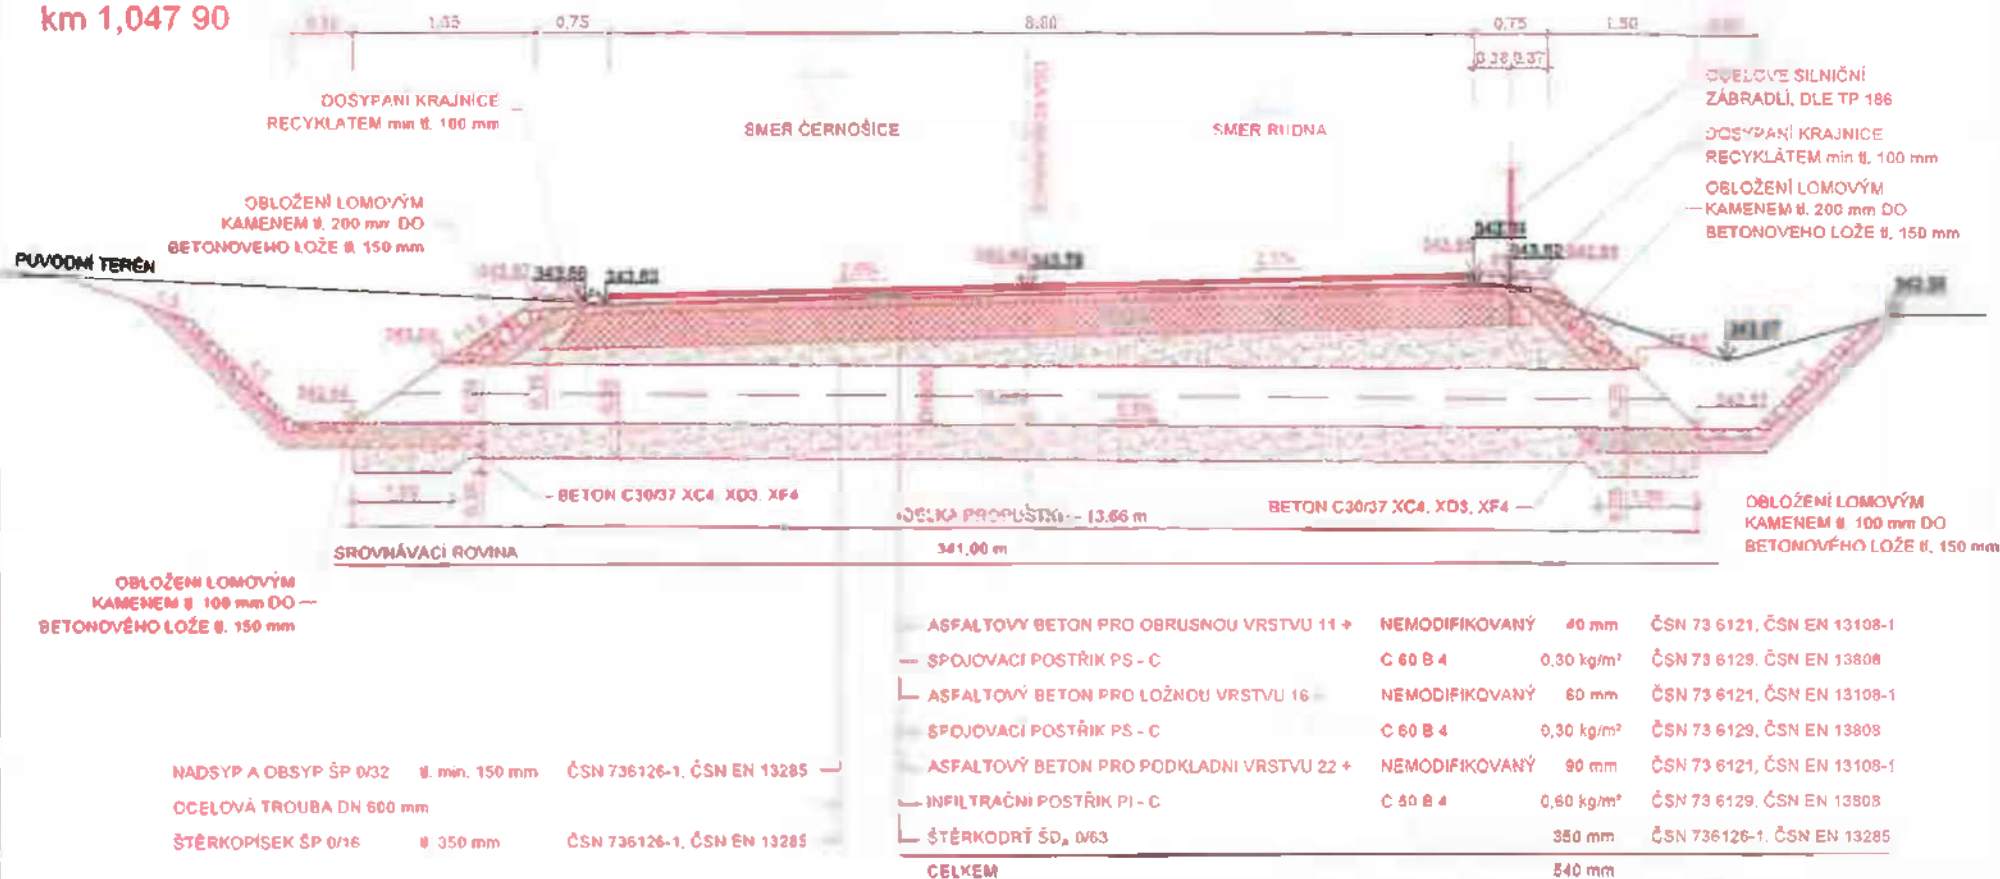

State zaščitky:	1-EP	Ing. J. Šolc	 Ing. J. Šolc Wittels 1, 250 01 Podčetrz - Rých
201002			
Stavba:	Stavba vodohospodárstva	Ing. J. Šolc	
Ing. J. Šolc	Stavba vodohospodárstva		
Tech. kontrola:	Wittels	Be. Jan Černý	
Ing. Pavlína Nylundová	Wittels		

Stavba:	KOPECE (okružní okružní křižovatka)	Kraj:	Jihomoravský	KPS:	526000000000
Abstr:	III/00516, III/00512 a III/00517 Jinočany, oprava silnic - PD	Prac:		Projekt:	
Objekt:	III/00516	Stavba:		Č. 2. dílu:	
Příloha:	PODÉLNÝ ŘEZ PROPUSTCEM - km 1,047 90	Měřítko:	1:50		







ZÁPIS ZMOTIVITELÉ:

Je odřezávací vrstva štěrku v tl. cca 150 mm
byla objevena vrstva z PPM, ze kterého byly odřezány
části dehtu. Po uložení na splodinu bude
musí provést analýzu této vrstvy na PAU,
kde pak bude splodinu poslat k laboratoru tohoto
materiálu a rozhodnout podle toho bude ulo-
žen. Je předpokládat, že by mohlo jít i
o nebezpečný odpad ZAS - T3 nebo ZAS - T4.
Vzhledem k tomu bude nutné provést
zkušební a za uložení materiálu.

Zkouška odebrání vzorky i z vrstvy zeminy,
zkontrola na glny patřícímu po uložení na
splodinu. Odebrání vzorku bude provedeno ve
čtvrtek 12.9.2019.

Za TDI:

POČASÍ: Počasí, 19 - 13°C

PRACOVNÍ DOBA: 7^h - 17^h hod

PRACOVNÍCI: Hříb + Paul, Bráňský, Tesářík

MECHANIZACE: Sam. nakladač, Unifiner, otáčej
bagr.

PROVÁZENÉ PRÁCE:

- odřezávací zeminy z krajnic v nádobě
km 4,633 - 0,920 - první strana
- ukládání vybrané zeminy na umělého m
rybníka.
- odebrání vzorku z podkladních vrstev (PPM +
zemina) a z krajnic na rozběr - glny a
PAU.

ČTVRTEK

12.9.2019

POČASÍ: oblačnost, větrno, 18°C

TRACONIT ZORA: 400 - 1000

Pracovník: Hrob + 2 (Tesarík, Brůha)

eboni' baw CAT

NAV - Notand, Kaplan

U R R Y

2007

17.92.10

NUMBER PRICE:

- odstraniti postelastni slojbovce vrstov
v H. soc. 20 mm v vpliv Ls bin 1,530
92 1,500 m - 80 x 4 x 0,2 =
- odrez vzdržniha materialu na nivo dno
- kontrola 310

Laurel xanthoxanthus:

Medicinas que produzem um estado KD (viz.

- [illegible]

POČASÍ: Průměrná oblačnost, 19°C

PRACOVNÍ DOBA: 7⁰⁰ - 17⁰⁰ hod.

POUDĚL

30.9.2019

PRACOVNÍCI: Hříb + Tesárek, Paul, Bránský
obecní bagr + dr. NA (Kopčan, Šolant)

PROVÁZENÉ PRÁCE:

- odstranění podkladní šetřivé vrstvy v
- vl. 100 cm ve stávající křiž. 1,630 - 1,300 92 m³
- uložení vyčištěného materiálu na uzavřeno
- kontrola k. opava D2

ZÁPIS ZKOTOVITELE:

V průběhu výkonu provedla p.
uložení chomáče v křižnici v ulici křiž. 1,630 - 1,350.

POČASÍ: Polojasno, oblačný déšť, 11°C

PRACOVNÍ DOBA: 7⁰⁰ - 16³⁰ hod.

ÚTERÝ

1.10.2019

PRACOVNÍCI: Hříb + Tesárek, Paul, Bránský
obecní bagr CAT - dr. NA (Kopčan, Šolant)

PROVÁZENÉ PRÁCE:

- odstranění podkladní šetřivé vrstvy v vl. 100 cm
- ve stávající křiž. 1,300 - 1,250
- uložení vyčištěného materiálu na uzavřeno 64 m³
- kontrola D2
- na stávkou práce let. rovin DNGOO - sk. + jízdy

Zápis zhotovitele:

Přiběhl KD. Dávající investora a TDI byli.
informováni že přeběžení výsledky rozboru
zeminy ukazují u šetřivé vrstvy vysoký podíl PAU
⇒ jde o nebezpečný odpad, který by měl být jeho
uložení v ulici. Kvůli TDI zjišťují další info,
jak postupovat. Další bylo upozorněno zhotovitelu
na možnost mít v křiž. 1,360, která je
nutná být s projektováním → bude ve dvrtě.
Investor povolil provedení uzavřené ulice.

POČASÍ: Jatařmo, přeháňka, 18°C
 PRÁČNÍ DOBA: 7^h - 15^h → dešť
 PRÁČNÍCI: Hrib + Tesaril, Paul, Bránský
 Otačín: bagr CAT + LENA (Kaplun, Šeluch)
 PRÁČNÍ PRÁCE:
 - odřezání zemin z podkladní vrstvy ve
 šířce klen 1,450 ÷ 1,300 m 135 m³
 - uklizení zemin na uzavřeno - zatím nejsou
 stále ušlechty rozbom
 - v odřezání stěn po výkopu dle stěn
 voda, nebo k i uzavřeno pískem z prstí -
 lokálního výkopu.
 - prohlídka malované vodovodu B REVIS v
 klen klen 1,050 ÷ 0,920

(Zám)

POČASÍ: Jatařmo, slunce, 11°C
 PRÁČNÍ DOBA: 7^h - 15^h hod.
 PRÁČNÍCI: Hrib - Tesaril, Paul, Bránský
 Otačín: bagr CAT + LENA (Kaplun, Šeluch)
 PRÁČNÍ PRÁCE:
 - odřezání zemin z podkladní vrstvy ve
 šířce klen 1,300 - 1,250 m 45 m³
 - uklizení zemin na uzavřeno
 - odřezání podkladní stěnové vrstvy v
 klen 1,250 - 1,200 m 66 m³
 - uklizení stěnové vrstvy z podkladní
 vrstvy na uzavřeno.
 - kontrola DZ

Účinní zhotovitelé:

Na stavení práce poskytnutá → bylo s
 ukázkou zobrazení klen v klen 1,360,
 navrchu posun - podkladní stěnová
 stěna naproti koncovému, Pauláala i ve
 vodě a výkopu, ale rublo zřetelně, zelní je
 o pískem nebo stěnu podstěbní.

POČASÍ: Jasně, odpolední deště, 12°C

ÚTERÝ

PRACOVNÍ DOBA: 7⁰⁰ - 15³⁰ hod.

8.10.2019

PRACOVNÍCI: Hrib + Tesářík, Raul, Bránský
otčina, brig. CAT + 2x VNA (Karlík, Škvařil)
gryfka, zemní válec - válna

PROVÁDĚNÉ PRÁCE:

- kmenová díra kmenů jehle - přeměnit
gryfku + kmenů
- provedení static. zatěžovací zhouby labo-
ratorů VIA KONTOL
- kontrola DZ
- provedení povrchu nádrží na odstraňování
přehrádky šotů v tunu 1,380 → nádrží
dvo. povrch dráček + kmenová vedlejší
od šotů 10 m - viz. schéma

(Signature)

POČASÍ: ZATAŽENO, OBLAČNO, 14°C

STŘEDA

PRACOVNÍ DOBA: 7⁰⁰ - 17⁰⁰ hod.

9.10.2019

PRACOVNÍCI: Hrib + Raul, Tesářík, Bránský
otčina, brig. CAT +
5x VNA (Bránský,

gryfka, zemní válec - válna

PROVÁDĚNÉ PRÁCE:

- pokládání geotextilu v širší komunikaci
ve stávající 1,630 ÷ 1,590 km
- nasazení SD 0-63 mm + provedení
pokládání šotové vrstvy - nasazení
- odstraňování zeminy vyplavené v kolech po
projezdu bagru (a po vložení při pokládání
obrábkou optik. kabelu -
- provedení nalikové vodovodu B. PEVIS v
km 1,050 - 0,920

19 m³

POČASÍ: velká oblačnost přeháňky, 13°C

PRACOVNÍ DOBA: 7:00 - 16:30 hod.

PRACOVNÍCI: Hříb + Tesářík, Raul, Bránský

občasný bagr CAT -

5x NA (Bartoš),

grejdr, zemní válec - Vávra

PROVÁDĚNÉ PRÁCE:

- pokládka geotextilie v špičkové komunikaci

ve směru 1,570 - 1,490 km

- navážka ŠD 0-63 mm z lomů Brázová

- odřezání zeminy vytlacení koly od bagru

- provedení šárkové prohlubně v rýhách -

nahmbo

- kontrola DŽ

- prořezání suchých větví stromů podle

úřadu 1,630 - 1,350 -> spánek větví.

POČASÍ: Oblačno, 16°C

PRACOVNÍ DOBA: 7:00 - 15:30 hod.

PRACOVNÍCI: Hříb + Tesářík, Raul, Bránský

umělé bagry - občasný bagr

JCB - Podolinský

4x NA (Bartoš)

grejdr, zemní válec - Vávra

PROVÁDĚNÉ PRÁCE:

- pokládka geotextilie v špičkové komunikaci

ve směru 1,490 - 1,420 km

- navážka ŠD 0-63 mm z lomů Brázová

- provedení šárkové prohlubně v rýhách - nahmbo

- navážka ŠD 0-63 na uzavírku

- kontrola DŽ.

ČTÚTEK

10.10.2019

PÁTEK

11.10.2019

JIVOČANY - oprava silnice

Počasí: Jasně, 23°C
 Pracovní doba: 7⁰⁰ - 16⁰⁰ hod.
 Pracovníci: Hlib + Tesářík, Paul, Bráňský
 Otočný bagr VCB - Podolinský
 Provádění práce:
 - položení geotextilie v celé šíři komunikace
 - výška v km 1,420 - 1,350 km
 - naměření Ø 63 mm 2x NA (Bartoš, Kaplan)
 - provedení podkladní vrstvy - naměření
 - provedení vrstvy vápna (Váň) - naměření
 - doplnění štěrku vrstvy - rovnání nivelety
 na požadovanou výšku a kotvení
 - kontrola RL
 - provedení dráhy v km 1,350

Počasí: Jasně, 22°C
 Pracovní doba: 7⁰⁰ - 16³⁰ hod.
 Pracovníci: Hlib + Bráňský, Tesářík, Paul
 Otočný bagr VCB - Podolinský
 5x NA (Bartoš)

CESTNÍ ZEMNÍ VÁLKY - KÁVA

PROVÁDĚNÉ PRÁCE

- DOPLOUČENÍ DRENÁŽÍ V KM 1,350 - POLDŘENÍ
- GEOTEXTILIE A VYTĚŽENÍ ŠD Ø 32 mm - 6 t
- ODRZ VÝKOPU Z TĚLUVY NA HEZIDATO
 $(6 \times 0,85 \times 0,25) \times 2 = 2,55 \text{ m}^3$
- BZO VÝKOPU VŠETĚ VYŠKLOMAT TRÁVU STRANU
- KOMUNIKACE (2x Ø 32), KDE DOKLADELO K ÚVĚTI
- HLUBOKÝCH 10 PRŮJEZDU NA -> SÁNACE
- VYTĚŽENÍ Š - 2,2 m, HL. Ø 8 mm, DL. 12 m A
 21 m²
- VYPŮVNĚNÍ DŘ. 67 - 125 mm
- POŘÁDKA GEOTEXTILIE V PLNĚ ŠÍŘI KOMUNIKACE
- DOVOZ ŠD Ø 63 mm - PROVEDENÍ ŠTĚRK. VRSTVY V
 KM 1,350 - 1,360

- KONTROLA TV
- OSAZENÍ INFORMAČNÍCH TABULÍ - 1ks ŽEL.
- PŘESED BIZBUDAVY - 1ks PĚTICZ DO ŽINOČAN OD KRUPÉ
- PLOŠNÁ REALIZACE VODOVODU FI PEVIS V KM 1,050 - 0,920
- O VÝKENDU PROJEHLA ZOKLEDA OHRADUČKY DO KRAJNÍK V ÚSEKU KM 1,450 - 1,120

Počasí: Polojasno, 19°C

Průměrná doba: 4" - 14" hod.

Pracovníci: Hrb + 3 (Tasovík, Raul, Bránský)
otěm' hrb JCB - Podolínský
5x JNA - Bartoš, Bartošek, Koplant,
Maral, Pampas
grych, volke - Valon

ÚTERÝ

15.10.19

Provedení práce:

- úprava plochy - křesťák, pracovní
- krm 1,350 - 1,270
- navození št 1/63 mm do podkladu vrstvy
- křesťák 1,350 - 1,270
- doplnění a rovnání vrstvy štěrku
- krm 1,350 - 1,530 + křesťák
- odřezání balna v dle 1,270 - 1,250
- + doplnění dk 63/125 mm
- čerpání vody od rybníka
- kontrola DIO

Stavba zhotovitele:

V úseku oca 280 km (za hrato rybníka a v blízkosti obce) se vlivem pnutí hroze obnova voda a došlo k roztavení aluminu. Proto je nutné odřezat a nahradit št 63/125 mm, plocha, sance 800 mm v celí 8/18 ko-munikace. Popisek foto dokumentace.

10x6x7x8x
- 93643

POČASÍ: ZATAŽENO, 15°C
 PRACOVNÍ DOBA: 7⁰⁰ - 16⁰⁰ hod
 PRACOVNÍCI: HRIB + 3 / TESAŘ, RAUL,
 BRÁNSKY /
 OTČINÝ BAGR - PODOLINSKY
 4 NA - BARTON, SELNER, KAPLAN,
 BARTINEK, MARCEL, KAHNKA,
 HOUDA
 GREJDR, VÁLEC - KÁVKA

PROVEDENÉ PRÁCE:

- ODTIŽENÍ BAHNA V ÚSEKU KM 1,250 - 1,200 - HLoubKA 1,30 - 1,50 CM - 420 m³
- ODVOZ BAHNA NA MELITEPO
- VYPLNĚNÍ SANKCE DK 63/125
- ÚPRAVA KOLETY PODLAŽNÍ ŠTERKOVÉ VRSTVY V ÚSEKU 1,350 - 1,650 km
- ODVOZ ZEHINY NA SKLADKU -> DOVOZ 50 0/63 MM NA MELITEPO

Počasí: Plojato, 14°C
 Pracovní doba: 4⁰⁰
 Pracovníci: Hrib + 3 (Tesar, Raul, Bransky)
 otčinný bagr JCB - Podolinsky,
 2x otčinný bagr JCB + CAT 315
 4x NA - Barton, Bartisek, Rancus,
 Kaplan, Selner, Marcel, Kouda
 grejdr, válec - Kávka

Provedené práce:

- v úseku km 1,190 zapadl bagr JCB do bahna, bylo nutné vyvolat šperníkovou odšť. z DK 63/125, aby bylo možné do bahna odšťapat a odšť. bahna bylo už a pokusili se ho vytrhnout
- odšť. bahna na melitepo - 180 m³
- dovoz DK 63/125 mm a vybudování příjezdu

- k zapadnutí krovu - 1,130 ÷ 1,130
- pokládka geotextilie pod DK 63/125 cm
- vyčištění zapadlého krovu z bahna
- odprázdňování z podhledového dříví
- rovnání podhledu šetrným způsobem
- do konce celkové výšky - 190 mm v dříví
- ku 1,630 ÷ 1,380 + Průběh

Zápis zhotovitele:

Na základě strom v odřezání v úseku
v ku 1,270 ÷ 1,130, kdy vlivem prázdné
rody z blízko vyhořel. Dostalo k rozbití
přelů, zhotovitel konstatoval vzniklý strom
s 40 m bylo zjednodušeno, že je uvnitř rozbí-
nůva část uvnitř a uvnitř krovu
krovu a plně možnosti vyčištění
dříví - dl: 150 m, 5 ÷ 6 m, tl. 1,4 m
Pod DK pokládka geotextilie s prázdnou do
bránu vykopu.

Stavba v úseku 1,630 ÷ 1,380

Podání: Občas, zatím, 170C

PÁTEK

Pracovní doba: 4⁰⁰ - 16⁰⁰ hod

18.10.19

Pracovníci: Hříb + 3 (Těmák, Paul, Bráňský)

1x otvácí krov RB - v prázdné po vyčištění

1x otvácí krov CAT - Průběh

4x NA - Křepel, Šechel, Věděl,

Bartoš, Bartošek, Marek,

Rampr

grych, včel - Káma

Dodání práce

- krov krovu z rozbití přelů v úseku
- ku 1,130 ÷ 1,270 - odraz na uvnitř
- pokládka geotextilie do vyčištěného úseku
- s prázdnou do bránu
- odprázdňování z dříví v úseku

10003

- postupně doplňování DK 63/125 do odštěpeného úseku - dnový 2 lomen
- oprava mřížky prosklená SD vrstvy v úseku 1,380 ÷ 1,630 km x 1m šířka
- střed komunikace - nový 17 kypiček před č.p. 303 - nově vložen požadavek přeměny.
- kontrola D10 - doplnění odštěpené zmrzliny

Počasí: Oblačno, zatíženo, T°C

SOBOTA

Průměr deště: 7.00 ÷ 16.00 hod

19.10.19

Pracovníci: 4 lidé + 2 (Tomin, Bránský)

1x obecní káry CAT - Valera

2x NA - Morav, Pardon

Provedené práce:

- dnový rozšíření odštěpení v úseku 1,120 - 1,270
- odvoz kamna na navič
- položení geotextilie do odštěpeného úseku s příměsí do kotvení
- doplňování DK 63/125 - dnový 2 mřížky

Zápis zhotovitele: - výprava kalkulace.

Shledání mrazů před na rozšíření odštěpení komunikace:

- úsek 1,123 ÷ 1,265 m v celkové komunikaci 6,5 m. $\Rightarrow 142 \times 6,5 = 923 \text{ m}^2$
- položení geotextilie s příměsí do stran $(142 + 5 + 5) \times 9,0 \text{ m} = 1,368 \text{ m}^2$
- hloubka odštěpení vrstvy Ø 0,680 m $\Rightarrow 923 \times 0,68 = 627,64 \text{ m}^3$
- naložení a odvoz na skladiště (OH 1/1 m³)
- ~~627,64 m³ ÷ 1,1 = 570,58 t~~
- 627,64 x 2,1 = 1318,04 t

Počasí: Jasně, 15°C
Pracovní doba: 7⁰⁰ - 16³⁰ hod
Pracovníci: Hříb + Tvarůžek, Raul, Bránský
1x otoč. bagr CAT - Kasper
1x otoč. bagr JCB - Podolinský
7x NA - Barton, Bartošek, Rákos, Marek,
Houda, Kaplan, Šeluck
grejdr, válec - Vávra

Průběh práce
- těžení stávajících podkladních vrstev v úseku
1,120 - 1,060 km + odvoz na skládku Hlaven
- dovoz ŠD 0/63 mm a DK 63/125 mm na mezi-
dopu + odvoz zemin na skládku z mezidopu
- úprava plochy v rámci průběhu 1,110 - 1,060 km
- provedení podkladních vrstev ŠD 0/63 mm v
úseku 1,350 - 1,120 km
- svazení kotveního míst, kde došlo k
vstupu betonu nad DK 63/125
- vyložení groteritky pod DK v km 1,320 - 1,120

Počasí: Jasně, 22°C
Pracovní doba: 7⁰⁰ - 16⁰⁰ hod
Pracovníci: Hříb + Raul, Tvarůžek, Bránský
1x otoč. bagr JCB - Kasper
1x otoč. bagr CAT - Podolinský
7x NA - Barton, Bartošek, Kaplan, Houda
Rákos, Marek, Šeluck
grejdr, válec - Vávra

Průběh práce
- těžení stávajících podkladních vrstev v
úseku 1,120 - 1,060 km
- dovoz ŠD 0/63 mm a DK 63/125 mm na mezi-
dopu + odvoz zemin na skládku z mezidopu
- úprava plochy v rámci průběhu
- provedení podkladních vrstev ŠD 0/63 mm

POČASÍ: POLOVASNO, 7°C

PÁTEK

PRACOVNÍ DOBA: 7^h - 16^h hod

1.11.2019

PRACOVNÍČI: HRIB + TESAŘIK, PAUL, BRAUSKY

1x OTOČ. BAGR JCB - KASPAR

1x OTOČ. BAGR CAT - PODOLINSKY

5x NA - VANA, KAPLAN, KROB,

MARCEL, ŠELMEK

ZEMNÍ VALEC -

PROVÁDĚNÉ PRÁCE:- odvoz ušlapanu z mazičny na skládku
Hořínal- dovoz ŠD Ø 63 a ŠD Ø 32 mm - uložení
na mazičny- výkop mly v km 1,047 pro propustku
DN 600

- odvoz ušlapanu na skládku Hořínal

- příkop dle na příkopku DN 600

- příkop pro propustku DN 600
napojeníPŘÍST:

SOBOTA

UŠPIS ZKOTOVITEL:

2.11.2019

Při výkopu mly pro propustku byla v místě výkopu nalezena plynovodní přípojka. Vodašto k jímání plynovodu, ale nemohli prověřit jeho výkonu z bno-veho kamene dle PD. o této situaci byl informován ředitel správy sítě. Přesla plynovodní p. Brož - 602 281 791, který bude ve vědomí a posíláje návrh na přestavbu předložit od majitelů služby k jejich vyřízení. Na základě jejich bude provedena příloha podobná příloha vodom. AD informovali, že dle ušlapanu kontakt u. g. Brož - Ing. Wjltovč.

POČASÍ: Oblačno, zataženo, 10°C
 PRACOVNÍ DOBA: 4³⁰ ÷ 15⁰⁰ hod.
 POČET PRACOVNÍKŮ: Hříb + Raul, Tesařík
 1x otoč. bagr - Kášpar
 1x NA - Havel

POBOTA
 2.11.17

PROVÁDĚNÉ PRÁCE:

- příprava dvou výkopů vytyč pro propustky
- betonáž dvou k omezení šířky výkopů pro
 pro možnost výkopu DN 600
- umístění dvou od výkopu po příkopu
 propustek v délce 11 km.
- odměrování výkopu + objemu SD 0/32 mm
- spořádací práce v km 1,080 - 1,330

POČASÍ: Oblačno, 12°C
 PRACOVNÍ DOBA: 4³⁰ ÷ 16⁰⁰ hod.
 POČET PRACOVNÍKŮ: Hříb + Raul, Tesařík, Bědinský
 1x otoč. bagr KR - Kášpar
 1x otoč. bagr CAT - Tědlovský
 Zeman - Valík - Valík
 Růžička VOŠKA + 2x výkop. (KAPPA)
 1x otoč. bagr - Kášpar
 1x NA - Havel, Havel, Kášpar
 Valík, Kášpar, Hříb, Bědinský
 Bědinský

POBOTA
 4.11.17

1x kontejner - Rampa
 Provádění práce
 - pokládka nové podkladové ACP 125 SD/70
 H. 90 mm v km 1,070 ÷ 1,330 - 8005 t
 - práce na propustkách v km 1,047 - úprava
 ig. koberce výkopu + příprava na pokládání
 cel. propustky z betonového kamene
 - dovoz betonového kamene z km
 - zosyp potrubí v kótě zlaté
 - kontejner D2

JINČEŘANY - STAVBA KOTVENICE

POČASÍ : ZATÁŽENO, TĚŽKÝ - 4°C

25. 11. 2019

TEPLOTY : 7°C - 16°C

POVĚTRÍ

STAV PRACOVNÍKŮ : 2x THP - KORDING, MARTINEK

2x STROJNÍK - TADOLINSKÝ, DUDRÁK

4x ŘÍDÍCÍ - KLOB, RAJTHAS, LOUČEK, VÁŇA

JEŘÁK, FELMEK

4x STAV. DĚLNÍK - HRIB, TESÁŘEK, RAJL, BRÁNSKÝ

BRÁNSKÝ

8x POKLÁDEK

MECHANIZACE : 2x KOLOVÉ RYPADLO, 6x NA VOLVO, 2x UV HAMR

1x FINÍZER, 1x VÍZE DESKA

POSTUP PRACÍ : - NÁVOZ A POKLÁDEKA VESTIT DO 8/10 SE

PŘIMKNUTÍ - ČÁST ÚSTRAJ 1 LM 0,670 - 0,900

KORDING

- OČISTIT TĚŽKÝ A ŽELEZNÝ KAMENEC SE

ZAHYTNUTÍM KM 1,050 - 1,655

POČASÍ : POKLÁDEK 7°C

26. 11. 2019

TEPLOTY : 7°C - 16°C

POVĚTRÍ

STAV PRACOVNÍKŮ : 2x THP - MARTINEK, KORDING

1x STROJNÍK - DUDRÁK

1x ŘÍDÍCÍ - KLOB

4x STAV. DĚLNÍK - HRIB, TESÁŘEK, RAJL, BRÁNSKÝ

MECHANIZACE : 1x TRAKTORŠACE, 1x NA VOLVO

KORDING

POSTUP PRACÍ : - TĚKADLA SILNĚ OBLIŽNUTÁ DO ŽLTON LOŽE

1 OBLIŽ V LM 0,670 - 0,750 PŘI JEZDĚ

POČASÍ : OBLIŽNUT 7°C

27. 11. 2019

TEPLOTY : 7°C - 16°C

POVĚTRÍ

STAV PRACOVNÍKŮ : 2x THP - MARTINEK, KORDING

2x STROJNÍK - TADOLINSKÝ, DUDRÁK

4x ŘÍDÍCÍ - KLOB, RAJTHAS, LOUČEK, VÁŇA

4x STAV. DĚLNÍK - HRIB, TESÁŘEK, BRÁNSKÝ, RAJL

MECHANIZACE : 2x KOLOVÉ RYPADLO, 4x NA VOLVO

TĚŽKOS

JINOČANY - STŘAVA KOMUNIKACE

POSTUP PRÁCE: - NAKLÁDKA 2 DVOU VÝKOTKŮ Z HEZIDETONIE
POVLE NA SKLÁDKU S ULOŽENÍM (MOBILNA)
- POKLÁDKA SILNICE OBEJDNÍKŮ DO BETON. LOŽE KORDINA
S OTŘESEM V KM 0,670 - 0,750 TS + LS
- VÝKONOVÁ STŘAVA VIMSTI

TEMPERATURA: - 8°C

21. 11. 2019

PRAC. DOBA: 4 - 16

ČTVRTEK

STAV PRACOVNÍKŮ: 1x THT - MARTINEK, KORDINA

2x STROVNÍK - DOBOLINSKY, DVOŘÁK

4x HÍDČ - KLOB, KAWAN, ZLTRAČ

4x STAV. OBLAŽ - HZB, ZLTRAČ, ZLTRAČ

BRANISLAV

MECHANIZACE: 1x KOMPAKT. B770800, 4x KIA VOLVO

POSTUP PRÁCE: - NAKLÁDKA 2 DVOU VÝKOTKŮ Z HEZIDETONIE

NA SKLÁDKU S ULOŽENÍM (MOBILNA)

- POKLÁDKA SILNICE OBEJDNÍKŮ DO BETON.
LOŽE S OTŘESEM V KM 0,670 - 0,750 LS

KORDINA

TEMPERATURA: - 7°C

19. 11. 2019

PRAC. DOBA: 7 - 16

PÁTEK

STAV PRACOVNÍKŮ: 2x THT - MARTINEK, KORDINA

1x STROVNÍK - DVOŘÁK

3x HÍDČ - KLOB, KAWAN, ZLTRAČ

4x STAV. OBLAŽ - HZB, ZLTRAČ, ZLTRAČ

RADL

MECHANIZACE: 1x TRAKTOR, 1x KROTIČKA, 1x SAMOSBĚR

1x KIA VOLVO

POSTUP PRÁCE: - POKLÁDKA SILNICE OBEJDNÍKŮ DO BETON. LOŽE S OTŘESEM

ZAMĚTENÍ A VÝKON V PRSTU 808110 V

KM 0,670 - 0,900 (KAT. HZB) - 7x STŘAVA

PŘED PRACÍ STAV. PRACOVNÍKŮ

KORDINA

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, p. o.
Pavel Špaček
Zborovská 81/11
150 00 Praha 5 – Smíchov

Čj : ST 201.01/2020
V Praze : 30. září 2020
Vyřizuje: Ing. Martin Vavřena

tel.:

Věc: III/00516, III/00512 a III/0057 Jinočany, oprava silnic

Sdělení č. 1

Vyřádkování TDI k ZBV2 – Oprava chodníků, přeložka plynovodu, trubkové zábradlí, sanace podloží

Na základě nevyhovujícího stavu obrubníků, jejichž nevyhovující stav se ukázal během provádění stavebních prací, byla provedena jejich výměna v celém rozsahu.

Při provádění propustky dle PD v km 1047,90 bylo v místě vtoku nalezeno plynové zařízení, které bránilo v dokončení propustky do délky a zpevnění čela vtoku lomovým kamenem. Je tedy nutná jeho přeložka, neboť je v těsné blízkosti vlastní komunikace.

Z důvodu bezpečnosti provozu je nutno osadit na stávající propustky v km 1047,90 a km 1270,00 trubkové zábradlí dle TP 186.

Na základě stavu v odtěženém úseku v km 1270,00 - 1120,00, kdy vlivem průsaku vody z blízkého rybníka došlo k rozbahnění pláň, byla provedena výměna neúrodných a nevhodných zemín, které byly nahrazeny lomovým kamenem v plné mocnosti vytěženého bahna, včetně osazení geotextilie s přesahem do břehů výkopu.

Za TDI souhlasím se změnami řešenými ZBV2. Tyto změny vedou ke zvýšení kvality celého díla. TDI současně souhlasí se související úpravou výměr dotčených položek v soupisu prací a tím se změnou ceny díla.

S pozdravem

Ing. Martin Vavřena

Vedoucí TDS

18.10.2020 10:02:00

KSÚS Středočeského kraje
Karel Motal
Oprávněný zástupce objednatele
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Váš dopis zn./ re dne:

Naše zn.:

1911037/2019

Vytiskuje:

Telefon:

F. moř:

Věc: Oznámení o zjištění zkušenosti

Stavba: III/00516, III/00512 a III/0057 Jinočany, oprava silnic

Vážený pane Motale,

jako Zhotovitel stavby „III/00516, III/00512 a III/0057 Jinočany, oprava silnic“, realizované na základě Smlouvy o dílo č. Objednatel 2370/00066001/2019 uzavřené dne 3.9.2019 mezi smluvními stranami Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 – Smíchov a společností „Společnost Jinočany, PORR - SILNICE GROUP“, kde správcem společnosti je společnost PORR a.s., se sídlem Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10, tímto oznamujeme níže uvedené skutečnosti:

1) V zpracované projektové dokumentaci bylo navrženo ponechání stávajících obrub s návaznou opravou chodníků. Během stavby bylo zjištěno, že jejich stav je nevyhovující a z tohoto důvodu bylo přistoupeno k jejich výměně v plném rozsahu. Zároveň z důvodu zajištění bezpečné šířky přecházení chodců, byla vlastní komunikace zúžena na průměr šířky cca 7,0m. Za tímto účelem bylo nutné posunout i silniční obruby včetně betonového lože a pokládky. Při odstranění bylo potřeba získanou stavební suť, obrubníky a betonové lože uložit na skládku. Změna se týká položek: 68, 69, 89, 90 a 102.

2) Při provádění propustku dle PD v km 1047,90 bylo v místě vtoku nalezeno plynové zařízení, které bránilo v dokončení propustku do délky a zpevnění čela vtoku lomovým kamenem. Trasa plynu se nalézá v místě vtoku do propustku, bez jeho přeložení nelze zcela dokončit vybudovaný propustek. Plyn vadí i výškově, kdy je zhruba v polovině profilu propustku. Je tedy nutná jeho přeložka, neboť je v těsné blízkosti vlastní komunikace. Původně se plynové zařízení považovalo za přípojku, ale následně bylo zjištěno, že se jedná o hlavní řád k přilehlým nemovitostem. Změna se týká položek: 103.

3) Po vybudování propustku v km 1047,90, odtokového příkopu a odstranění stávajícího porostu u propustku v km 1270,00, bylo na KD dne 7.7.2020 konstatováno, že v těchto místech hrozí nebezpečí pádu. Z důvodu zajištění bezpečnosti bylo dohodnuto, že stávající propustky v km 1047,90 a km 1270,00 budou osazeny trubkovým zábradlím dle TP 186. Změna se týká položek: 104.

4) Na základě stavu v odtěženém úseku v km 1270,00 - 1120,00, kdy vlivem průsaku vody z blízkého rybníka došlo ke značnému rozbahnění pláně, která se stala neúnosnou, bylo sjednáno s AD, že rozbahněnou část bude nutné vytěžit a nahradit lomovým kamenem v plné mocnosti vytěženého bahna - délka 150m, šířka 6m, hloubka 1,4m. Pod drčené kamenivo položit geotextílie s přesahem do břehů výkopu. Změna se týká položek: 7,9,16,17,18,19,31,75,91,92.

5) Jedná se o náklady na nezbytné přesuny materiálu na staveništi. Přivezený stavební materiál od dopravce bylo nutno distribuovat, kde je aktuálně potřeba. Jedná se tedy o množství všech tun hmot s kterými se na stavbě manipulovalo (drť, šterky, obruby). Změna se týká položek: 93.

Tyto změny byly odsouhlaseny ve Vyjádření TDI ze dne 30.9.2020.

Jedná se o změny, které vznikly v průběhu provádění prací. Celkově se jedná o Změny nepodstatné, nepředvídané, které jsou tak podle § 5, odst. 1, písm.c), resp. podle §10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29. 05. 2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazený do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Společnost Jinočany, PORR – SILNICE GROUP

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná o změnu nepředvídanou.

Zhotovitel žádá Oprávněného zástupce objednatele o vydání pokynu k provedení Variace.

S pozdravem

Jan Turnek
Stavbyvedoucí



Přílohy:

- Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 2

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

PORR a.s.
Dubešská 3288/36
100 00 Praha 10, Strašnice

Vás dopis značky/ze dne
1911037/ZON 2

Vytiskuje/telefon
Motal / 723500384

Praha
30.9.2020

Věc: III/00516, III/00512 a III/0057 Jinočany, oprava silnice - pokyn k realizaci stavebních prací

Dle oznámení o zjištěné skutečnosti, stavba „III/00516, III/00512 a III/0057 Jinočany, oprava silnice“ se jedná o následující změny v rozsahu a technologii oprav:

- 1) Ve zpracované PD bylo navrženo ponechání stávajících obrub. Během stavby byl zjištěn jejich nevyhovující stav a dále bylo třeba zajistit normovou šířku komunikace pro bezpečné přecházení chodců. Z tohoto důvodu je navržena výměna obrub v celém rozsahu a dále dojde k jejich posunutí.
- 2) Při provádění propustku v km 1047,90 bylo v místě vtoku nalezeno plynovodní zařízení, které bránilo v dokončení propustku do délky a zpevnění čela vtoku lomovým kamenem. Plyn vadí i výškově a bez úpravy plynovodního zařízení nelze propustek dokončit. Zhotovitel navrhuje přeložku plynovodního zařízení v místě propustku.
- 3) Po vybudování propustků k km 1047,90, odtokového příkopu a odstranění stávajícího propustku v km 1270 bylo na KD 7.7.2020 konstatováno, že v tomto úseku hrozí nebezpečí pádu. Z důvodu zajištění bezpečnosti bude osazeno trubkové zábradlí v souladu s TP 186.
- 4) Po odtěžení stávajících konstrukčních vrstev v úseku km 1120,00 – km 1270,00 došlo k průsaku vody z blízkého rybníka a tím k rozbahnění zemní pláně, která se stala neúnosnou. Bylo navrženo vytěžení rozbahněné zemní pláně a vytěžené bahno nahradit lomovým kamenem. Pod kamenivo budou položeny geotextilie s přesahem do břehů výkopů.
- 5) Přesuny materiálů na staveništi - přivezený materiál od dopravce bylo třeba distribuovat v rámci stavby na úseky, kde je aktuálně potřeba.

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje jako správce a zároveň zástupce Středočeského kraje jako vlastníka nemovitostí, tj. předmětných silnic III/00516, III/00512 a III/0057 a jako zadavatel opravy tímto vydává pokyn k realizaci díla dle navrženého řešení a zároveň žádá zhotovitele ke zpracování ZBV k této změně stavby a to v souladu se zákonem o zadávání VŘ a příslušnou směrnicí KSÚS SK.

Přílohy: Oznámení zhotovitele stavby

Karel Motal
vedoucí TSÚ-oblast Kladno

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby: III/00516, III/00516a III/0057 Jinočany, oprava silnic, 7-0715A19 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): III/0057 - km 0,000 - 0,491	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 103 /1	Číslo ZBV 3
---	---	--------------------

Objednatel: **Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001

Zhotovitel: **Společnost Jinočany, PORR - SILNICE GROUP**
Správce společnosti
PORR a.s. Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10, IČ:

Společník
SILNICE GROUP a.s. Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 62242105

Rekapitulace ZBV č. 3 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3.3	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3.4	-167 261,24	96 358,94	-70 902,30

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3	-167 261,24	96 358,94	-70 902,30

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré:

5

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby III/00518, III/00516a III/0057 Jinočany, oprava silnic, 7-0715A19 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): III/0057 - km 0,000 - 0,491	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 103 / 1	Číslo ZBV: 3
--	--	-----------------

Strany smlouvy o dílo č. 2370/00086001/2018 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 03.09.2019 (dále jen Smlouva)

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: Společnost Jinočany, POŘ - SILNICE GROUP

Přílohy Změnového listu:

1. Krycí list	1	počet listů
2. Změnový list	1	počet listů
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů
4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů
Další doklady	12	počet listů

Paré č. Příjemce

1	Objednatel
2, 3	Zhotovitel
4	Projektant
5	TDI

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

1) V průběhu stavby byl zjištěn skutečný průběh navazujícího terénu podél komunikace, který v rozsahu 164,9 km znemožňuje odvodnění silnice za pomoci původně navrženo prefabrikovaného betonového žlabu. Z tohoto důvodu bylo na KD č. 8 stavby dne 14. 4. 2020 (doklad č. 08) rozhodnuto o záměně tohoto žlabu za osazení betonového silničního obrubníku v délce 130 bm, který svede vodu do UV. Zároveň bylo, po vizuální kontrole, upuštěno od tlakové zkoušky propustku. Změna se týká položek: 40, 41, 48, 49, 55 a 56.

2) Na základě požadavku správce silnice ze dne 7.10. 2020 (doklad č. 11) bylo provedeno VDZ v plastu. Jedná se o provedení definitivního VDZ, které nahrazuje původní VDZ provedené barvou po jeho obnově do původního stavu při jednotlivých stavebních etapách. Změna se týká položek: 105 a 106.

Tyto změny byly odsouhlaseny ve vyjádření TDI ze dne 30.9.2020 (doklad č. 10).

Jedná se o Změny nezbytné k dokončení díla, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jsou podle § 5, odst. 1, písm.d), resp. podle § 11 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29.5.2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazené do Skupiny 4.

Z hlediska zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. dle § 222 odst. (5) se jedná o nezbytnou změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Údaje v Kč bez DPH

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-167 261,24	96 358,94	-70 902,30	263 620,18

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí)	jméno	Jan Turínek	datum	11-12-2020	podpis
Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Pavlína Nykodémová	datum		podpis
Technický dozor investora	jméno	Ing. Martin Vavřena	datum		podpis
Zástupce Objednatel	jméno	Karel Motal	datum		podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitelé sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel)	jméno	Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA	datum		podpis
Zhotovitel	jméno	Ing. Pavel Hirsch	datum	11-12-2020	podpis
	jméno	Ing. Karel Rypl	datum		podpis

Číslo paré

5

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 3

Název Stavby: III/00516, III/00516a III/0057 Jinočany, oprava silnic	
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	103 / 1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): III/0057 - km 0,000 - 0,491	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
4 634 061,44

Poznámka

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	4 634 061,44	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-167 261,24	96 358,94	96 358,94	2,08%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-167 261,24	4 563 159,14	-70 902,30	-1,53%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): Jan Turínek

Projektant (autorský dozor) Ing. Pavlína Nykodémová

Stavební dozor: Ing. Martin Vavřena

Zástupce Objednatele: Karel Motal

Zaměstnanec KSÚS SK

odpovědný za cenové

projednání Změny:

Petr Heinrich

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 3													
Evidenční číslo a název stavby: III/00516, III/00516a III/0057 Jinočany, oprava silnic								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: III/0057 - km 0,000 - 0,491								103/1					
Číslo a název rozpočtu: 103 III/0057 - km 0,000 - 0,491								Skupina Změn: 4					
Por. č. pol.	Kód položky	Název položky	M.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny súborné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
40	891351111	Vložení hrubého vodního potrubí Ø11 130 nebo 200	m	8,500	0,000	8,500	30,20	256,70	-256,70	0,00	0,00	256,70	100,00
41	882372111	Zabudování betonové potrubní Ø11 130 do stávajících regulačních vodov.	m	1,000	0,000	1,000	10 768,70	10 768,70	-10 768,70	0,00	0,00	10 768,70	100,00
42	916131213	Odsazení stávajícího betonového potrubního stojatého s boční ošetrovou do láže z betonu prostého	m	67,000	197,000	130,000	363,63	24 372,54	0,00	44 670,60	67 052,14	44 670,60	194,03
43	99212051	obrubník betonový silnicí 100 x 15 x 25 cm	m	87,000	187,000	100,000	106,58	9 272,51	0,00	19 048,90	28 321,41	19 048,90	194,03
44	995112213	Odsazení příkopového řábu do betonu tl 100 mm z betonových cvičnic 6 800 mm	m	0,000	0,000	-164,900	434,64	71 673,14	-71 673,14	0,00	0,00	71 673,14	-100,00
58	99227019	Řábavky betonové s lamou mm uloženy příkopové 300x100x30mm	m	164,900	0,000	-164,900	515,85	85 063,87	-85 063,87	0,00	0,00	85 063,87	-100,00
Název položky													
105	915711112	Vodoravné dopravní značení dělicí čáry souběžné s 125 mm retroreflezní bílý	m	0,000	885,800	885,800	36,40	0,00	0,00	30 787,12	30 787,12	30 787,12	100,00
106	915211122	Vodoravné dopravní značení dělicí čáry přerušované s 125 mm retroreflezní bílý	m	0,000	196,700	196,700	13,60	0,00	0,00	1 852,32	1 852,32	1 852,32	100,00
Celkem								200 101,15	-167 811,34	96 258,94	129 190,99	-70 902,20	

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: III/00516, III/00516a III/0057 Jinočany, oprava silnic, 7-0715A19

	Příjatek smlouvy (částka bez rezervy a DPH)	30 849 810,00
2=1+16+19	Aktualizace smlouvy (částka bez DPH)	45 085 061,33
2a=2+1+21	Aktualizace smlouvy (částka bez DPH)	54 684 013,31
3=(2a)/100	Procento změny Příjatek smlouvy	113,14%
4=(25a)/100	Srovnání vyhlášených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(26a)/100	Srovnání změn polítek (Skupina 2)	0,00%
6=(27a)/100	Srovnání změn 10 % pro skupinu 3 a 4 (Skupina 3)	0,00%

0=1+16+19	Srovnání změn 10 % pro skupinu 3 a 4 (Skupina 3)	0,00%
10=1+16+19	Srovnání změn 10 % pro skupinu 3 a 4 (Skupina 3)	0,00%
10a=1+16+19	Srovnání změn 10 % pro skupinu 3 a 4 (Skupina 3)	0,00%

0=1+16+19	Srovnání změn 10 % pro skupinu 3 a 4 (Skupina 3)	0,00%
10=1+16+19	Srovnání změn 10 % pro skupinu 3 a 4 (Skupina 3)	0,00%
10a=1+16+19	Srovnání změn 10 % pro skupinu 3 a 4 (Skupina 3)	0,00%
11=1+16+19	Srovnání změn 10 % pro skupinu 3 a 4 (Skupina 3)	0,00%

11=1+16+19	Srovnání změn 10 % pro skupinu 3 a 4 (Skupina 3)	0,00%
12=1+16+19	Srovnání změn 10 % pro skupinu 3 a 4 (Skupina 3)	0,00%
13=1+16+19	Srovnání změn 10 % pro skupinu 3 a 4 (Skupina 3)	0,00%

		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -
		Vyhodnocení změn (částka)	Změna polítek (částka)	Napředvidanost	Nazbytost	Změny do celkové
ZBV	Název SÚPK / předměti Změny	Změny záporné (částka bez rezervy a DPH)	Změny kladné (částka bez rezervy a DPH)	Procento změny (částka bez rezervy a DPH)	Srovnání změn (částka bez rezervy a DPH)	Srovnání změn (částka bez rezervy a DPH)
00	00	00	00	00	00	00
102	102	102	102	102	102	102
103	103	103	103	103	103	103
104	104	104	104	104	104	104
105	105	105	105	105	105	105
106	106	106	106	106	106	106
107	107	107	107	107	107	107
108	108	108	108	108	108	108
109	109	109	109	109	109	109
110	110	110	110	110	110	110
111	111	111	111	111	111	111
112	112	112	112	112	112	112
113	113	113	113	113	113	113
114	114	114	114	114	114	114
115	115	115	115	115	115	115
116	116	116	116	116	116	116
117	117	117	117	117	117	117
118	118	118	118	118	118	118
119	119	119	119	119	119	119
120	120	120	120	120	120	120
121	121	121	121	121	121	121
122	122	122	122	122	122	122
123	123	123	123	123	123	123
124	124	124	124	124	124	124
125	125	125	125	125	125	125
126	126	126	126	126	126	126
127	127	127	127	127	127	127
128	128	128	128	128	128	128
129	129	129	129	129	129	129
130	130	130	130	130	130	130
131	131	131	131	131	131	131
132	132	132	132	132	132	132
133	133	133	133	133	133	133
134	134	134	134	134	134	134
135	135	135	135	135	135	135
136	136	136	136	136	136	136
137	137	137	137	137	137	137
138	138	138	138	138	138	138
139	139	139	139	139	139	139
140	140	140	140	140	140	140
141	141	141	141	141	141	141
142	142	142	142	142	142	142
143	143	143	143	143	143	143
144	144	144	144	144	144	144
145	145	145	145	145	145	145
146	146	146	146	146	146	146
147	147	147	147	147	147	147
148	148	148	148	148	148	148
149	149	149	149	149	149	149
150	150	150	150	150	150	150
151	151	151	151	151	151	151
152	152	152	152	152	152	152
153	153	153	153	153	153	153
154	154	154	154	154	154	154
155	155	155	155	155	155	155
156	156	156	156	156	156	156
157	157	157	157	157	157	157
158	158	158	158	158	158	158
159	159	159	159	159	159	159
160	160	160	160	160	160	160
161	161	161	161	161	161	161
162	162	162	162	162	162	162
163	163	163	163	163	163	163
164	164	164	164	164	164	164
165	165	165	165	165	165	165
166	166	166	166	166	166	166
167	167	167	167	167	167	167
168	168	168	168	168	168	168
169	169	169	169	169	169	169
170	170	170	170	170	170	170
171	171	171	171	171	171	171
172	172	172	172	172	172	172
173	173	173	173	173	173	173
174	174	174	174	174	174	174
175	175	175	175	175	175	175
176	176	176	176	176	176	176
177	177	177	177	177	177	177
178	178	178	178	178	178	178
179	179	179	179	179	179	179
180	180	180	180	180	180	180
181	181	181	181	181	181	181
182	182	182	182	182	182	182
183	183	183	183	183	183	183
184	184	184	184	184	184	184
185	185	185	185	185	185	185
186	186	186	186	186	186	186
187	187	187	187	187	187	187
188	188	188	188	188	188	188
189	189	189	189	189	189	189
190	190	190	190	190	190	190
191	191	191	191	191	191	191
192	192	192	192	192	192	192
193	193	193	193	193	193	193
194	194	194	194	194	194	194
195	195	195	195	195	195	195
196	196	196	196	196	196	196
197	197	197	197	197	197	197
198	198	198	198	198	198	198
199	199	199	199	199	199	199
200	200	200	200	200	200	200

Poznámka: Formátováno podle charakteru a obsahu stavby a datu předání změny do skupiny.

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	3
Název a evidenční číslo stavby:	III/00516, III/00516a III/0057 Jinočany, oprava silnic, 7-0715A19
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	III/0057 - km - 0,000 - 0,491
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	103 /1

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
07 Změnový soupis prací SO 103	2	
08 Zápis z KD 08 dne 14.4.2020	6	
09 Oznámení Zhotovitele o zjištění skutečnosti	2	
10 Vyjádření TDI k ZBV 3	1	
11 Pokyn k realizaci stav. prací a zprac.ZBV	1	
Počet listů celkem	12	

Zápis z 8. kontrolního dne a 8. KD KOO BOZP III/00516, III/00512 a III/0057 Jinočany, oprava silnic

Kontrolní den

číslo: 08. konaný dne: 14. 04. 2020

Účastníci

Seznam účastníků je uveden v příloze č. 1 – Prezenční listina

1. Kontrola úkolů z minulého KD

Úkol číslo	Název	Skutečný stav plnění úkolu	Odpovídá	Splněno
0/1		Při projednání/předkládání/schvalování realizační dokumentace stavby bude Zhotovitel postupovat plně v souladu s SOD, zejména bude Zhotovitelem předkládána informace o cenovém dopadu s propočtem ceny včetně uvedení všech položek soupisu prací, kterých se změna dotýká, s vyčíslením rozdílu objemu položky proti ZDS a případně uvedením položek nových, a formulář „Informace o zařazení do režimu ZBV“ dle postupu Směrnice pro Změny staveb v platném znění.	Zhotovitel	T: kontrola na příštím KD
0/4		Zhotovitel předloží vždy do patku Týdenní plán práce.	Z	Průběžně
5/1	ZBV 102	Zhotovitel předložil objednateli a TDI k odsouhlasení ZBV 1 pro SO102/1 týkající se poplatku za skládku nebezpečného odpadu penetračního makadamu. Dopsáno na 06.KD: Zhotovitel doplnil chybějící údaje a předložil ZBV ke schválení na Pragoprojekt a.s. Dopsáno na 07.KD: ZBV schváleno. Dopsáno na 08.KD: ZBV fakturováno zhotovitelem za v měsíci březnu. Vypouští se.	O	11.12.2019 NT: 19.12.2019
7/1	Stezka	Obec Jinočany zašle doklady o projednání s úřady o možnosti zachování stezky směrem na Zbuzany. Dopsáno na 08.KD: Obec Jinočany nezastala KSÚS Stanovisko o projednání nepovolených úprav u silnice (krajnice) ve směru od Zbuzan se stavebním úřadem (silničním správním úřadem Černošice). Po provedené konzultaci o změně stavby se silničně správním úřadem investor nařizuje zhotoviteli upravit tuto část projektu dle projektové dokumentace (krajnice dle projektu a příkop), aby odpovídala podkladům ke kolaudaci. Za příkopem může následně Obec řešit chodník a KSÚS nebude bránit její výstavbě při dodržení všech právních stavebních podmínek	Obec Jinočany	Příští KD

2. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby

plnění věcného harmonogramu: Práce pokračují v souladu s odevzdaným aktualizovaným HMG

popis
provedených
prací

V období od 31.03.2020 do 14.04.2020 byly provedeny práce:

SO102

Odstranění podkladu komunikace u ulici Hornická po Křižovatku nám. 5. Května
Pokládka konstrukční vrstvy ŠD 0-63 + netkaná geotextilie
Statické zkouška pláně.

SO103

Frézování vozovky tl. 10 cm v místě sanace pravá strana
Odtěžení pokladu vozovky v místě sanace pravá strana
Pokládka vrstvy SC v místě sanace pravá strana
Statické zkoušky v místě sanace pravá strana
Pokládka ACP v místech sanace
Pokládka vyrovnávky ACP a ACL – od ul. Za Devítkou po KÚ
Pokládka ACO – od ul. Za Devítkou po KÚ
Odvoz vyfrézovaného a vybouraného materiálu na skládku

finanční plnění

Viz zpráva Zhotovitele o postupu prací


Za měsíc březen je prostavěno 4 821 892,38 Kč bez DPH. Celkem je fakturováno 29 467 164,53 Kč Kč bez DPH, tj. 68,87 % z celkové ceny za dílo

fotodokumentace

Zhotovitel i TDI pořizují průběžně fotodokumentaci stavby.



SO 103 – ul. Karištejská x ul. Hornická

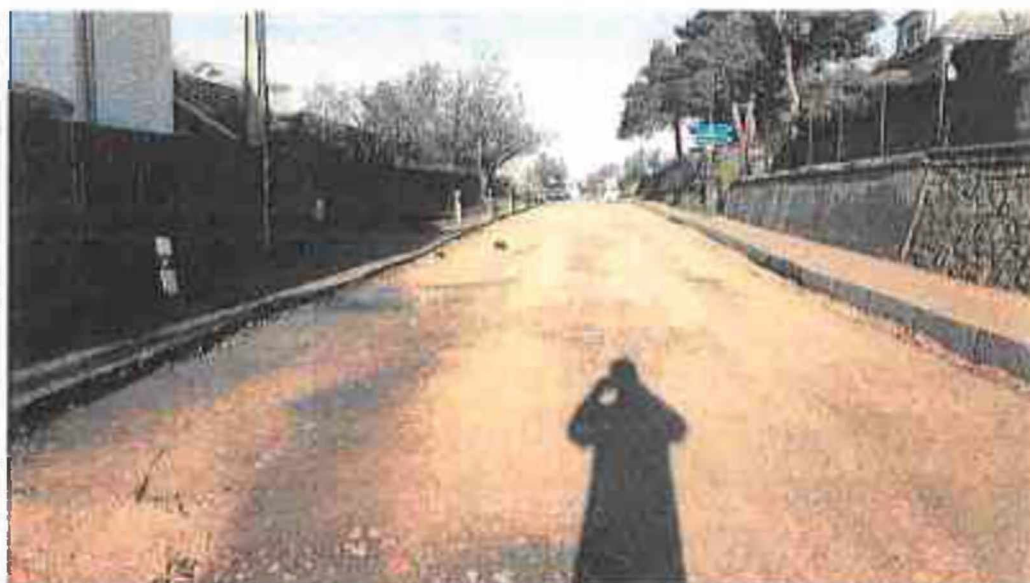

SO103 - UT 1 - 10.4.2020

3. Kontrola kvality

a) zpráva o hodnocení kvality za uplynulé období	Stavební práce probíhají bez připomínek
b) Podzhotovitelé	K dnešnímu dni jsou odsouhlaseni následující podzhotovitelé a dodavatelé: <i>Dle SOD</i>
c) Výrobky/materiály/směsi	K dnešnímu dni jsou odsouhlaseny následující výrobky/materiály/směsi: <i>Dle SOD</i>
d) TePř/KZP	K dnešnímu dni jsou odsouhlaseny tyto TePř. <i>TePř 01 Frézování, sanace podloží, pokládka asfaltových hutněných vrstev</i>
e) BOZP	Zhotovitel bude posílat digitální koncepty TePř také koordinátorovi BOZP

4. Stav BOZP a PO

Zároveň s kontrolním dnem stavby proběhl také 0. kontrolní den BOZP

A. ZPRÁVA KOORDINÁTORA BOZP ke dni 14.04.2020

Všeobecně – zjištění, náměty, návrhy opatření

- je nutné bezprostředně zajistit zákaz vstupu na staveniště nepovolaných osob
- při vstupu na staveniště podzhotovitelů resp. pracovníků jiných firem nutno zajistit písemné seznámení s riziky stavby a staveniště
- oznámení nových podzhotovitelů nutno zasílat KOO BOZP minimálně 8 dnů před nástupem
- základní ochranné prostředky pracovníků nutno používat a platí i pro podzhotovitele
- zhotovitel zpracuje jednoduchý plán staveniště s vyznačením dopravních cest, skládky materiálů a mezideponií
- viditelně bude vyvěšeno oznámení o zahájení prací OIP – předáno zhotoviteli

B. Zpráva zhotovitele k BOZP – bez připomínek

C. 1) Plán práce na další období :

týdenní plány práce budou zasílány TDI a v kopii KOO BOZP průběžně

práce dle P5 NV 136/2016 Sb. zhotovitel nepředpokládá provádění

2) Úkoly z 0.KD KOO BOZP :

- 00/01 Zpracované TePř na stavební práce, budou obsahovat část BOZP a podléhají schválení KOO BOZP a TDI
- 00/02 OZO zhotovitele zpracuje plán interních kontrol BOZP na stavbě. Plán zašle elektronicky KOO BOZP. Zápisy z kontrol zašle též elektronicky KOO BOZP.
- 00/03 Zhotovitel zajistí pravidelné kontroly zabezpečení staveniště a označení tabulkami a značkami.

3) Úkoly trvalé:

- zajistit a trvale kontrolovat oplocení staveniště s výstražnými tabulkami
- trvale provádět kontrolu dopravního značení vyplývajících z DIO
- kontrolní dny KOO BOZP budou prováděny jedenkrát měsíčně dle plánu KD BOZP

Ze strany KOO BOZP je nutno zhotovit ochranné zábradlí na pomocné konstrukci pod konzolou mostu a zabezpečit staveniště trvalým oplocením.

KOO BOZP seznámil - informoval zhotovitele s aktuálními zdravotními a bezpečnostními riziky na staveništi pro nadcházející stavební období.

Nejvýznamnější riziko - je možný střet s veřejnou dopravou; nebezpečí střetu se stroji, vozidly – viz aktuální DIO (dbát zvýšené opatrnosti při výjezdu a nájezdu do SDP + příjezdových komunikacích ke staveništi a meziděponii, řádně vyznačit vjezdy a výjezdy ze stavby, dodržovat bezpečné vzdálenosti). .

5. Různé

Stavební deníky budou vedené v listinné podobě. Bude veden jeden stavební deník. Stavební deník bude uložen v buňce na zařízení staveniště a v průběhu pracovní doby bude zajištěna jeho dostupnost.

Zhotovitel bude informovat NDIC o aktuálním stavu a změnách uzavírek.

Z důvodu velmi strmého svahu při komunikaci není možné osadit příkopové žlabovky v délce 164,9 b

Namísto žlabovky bude osazen betonový silniční obrubník v délce 130bm, který svede dešťovou vodu do UV. Po vizuální kontrole propustku není nutné dělat tlakovou zkoušku.

6. Nové úkoly

Úkol číslo	Název	Obsah úkolu a požadovaný cílový stav	Odpovídá	Termín
8.1		Nebyly uloženy.		

7. Závěry z kontrolního dne

Datum konání příštího KD Příští kontrolní den stavby se bude konat v úterý 28. 04. 2020 v 13,00 hodin

Zapsal

Ing. Martin Vavřena
Jméno

Podpis

Přílohy

Číslo	Název
1	Prezenční listina

Rozdělovník

Vyhotoveno v 1 výtisku – rozesláno účastníkům dle prezenční listiny elektronicky ve formátu PDF.
Originál je uložen na TDS.

Vyhotoveno ve 5 výtiscích, každý o 5 stranách.

Výtisk číslo	Adresát	Datum	Podpis
1	Krajská správa a údržba silnic Stř. kraje, p. o		
2	PORR, a.s.		
3	SILNICE GROUP, a.s.		
4	Stalcr spol. s r.o.		
5	Pro spis		

Příloha č. 1

K evidenčnímu číslu: 08/2020/KD

Počet stran

Počet výtisků

Výtisk číslo

Klasifikace

PVP

Jinočany

Příloha č. 1 k Zápisu z kontrolního dne stavby
Prezenční listina

Kontrolní den stavby

číslo 08. konaný dne 14.04.2020

Jméno, příjmení, titul	Organizace, funkce	Telefon, e-mail	Podpis
Ladislav Bak, Ing.	KSUS SK Zástupce objednatele		
Pavel Špaček	KSUS SK Zástupce objednatele		
Martin Vavřena Ing.	TDI		
Jan Turínek	PORR a.s.		
Petr Martínek, Ing.	SILNICE GROUP a.s.		

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, p. o.
Pavel Špaček
Zborovská 81/11
150 00 Praha 5 – Smíchov

Čj : ST 201.03/2020
V Praze : 30. září 2020
Vyřizuje: Ing. Martin Vavřena

tel.:
e-mail:

Věc: III/00516, III/00512 a III/0057 Jinočany, oprava silnic

Sdělení č. 3

Vyjádření TDI k ZBV 3 a 5 – VDZ v plastu, odvodnění komunikace, tlaková zk. propustku

Na základě požadavku Správce komunikace je nutno definitivní vodorovné značení z důvodu vyšší životnosti provést v plastu. V zadávací dokumentaci je VDZ pouze v barvě, které bylo provedeno následně po pokládce obrusných vrstev, před uvedením komunikací do předčasného užívání.

V zadávací projektové dokumentaci bylo navrženo odvodnění komunikace SO 103 - III/0057 - km - 0,000 - 0,491 do příkopových žlabů a následně svedeno do UV. Z důvodu malého prostoru mezi komunikací a přilehlým příkrým terénem podél komunikace nebylo možné příkopové žlaby osadit. V rámci dopracování PD, AD navrhl vodu z komunikace svést do UV pomocí betonové obruby namísto příkopové žlabovky.

Po vizuální prohlídce propustku pod komunikací bylo odsouhlaseno objednatelem a TDI, že nebude provedena tlaková zkouška propustku.

Za TDI souhlasím se změnami řešenými ZBV 3 pro SO103 a ZBV 5 pro SO101. Tyto změny vedou ke zvýšení kvality celého díla. TDI současně souhlasí se související úpravou výměr dotčených položek v soupisu prací a tím se změnou ceny díla.

S pozdravem

Ing. Martin Vavřena

Vedoucí TDS

KSÚS Středočeského kraje
Karel Motál
Oprávněný zástupce objednatele
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Vas dopis m./ze dne:

Naše m.

1711037/24v3

Vyřizuje:

Telefon:

E-mail:

Věc: Oznámení o zjištění zkušenosti

Stavba: III/00516, III/00512 a III/0057 Jinočany, oprava silnic - SO 103 - III/0057 - km - 0,000 - 0,491

Vážený pane Motále,

jako Zhotovitel stavby „III/00516, III/00512 a III/0057 Jinočany, oprava silnic“, realizované na základě Smlouvy o dílo č. Objednatele 2370/00066001/2019 uzavřené dne 3.9.2019 mezi smluvními stranami Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 – Smíchov a společností „Společnost Jinočany, PORR - SILNICE GROUP“, kde správcem společnosti je společnost PORR a.s., se sídlem Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10, tímto oznamujeme níže uvedené skutečnosti:

1) V zadávací projektové dokumentaci bylo navrženo vodorovné značení pouze v barvě. Vzhledem ke skutečnosti, že VDZ provedené barvou nemá požadovanou životnost (vyšisuje), požaduje správce komunikace provedení VDZ v plastu. Změna se týká položek: 105 a 106.

2) V zadávací projektové dokumentaci bylo navrženo odvodnění komunikace do příkopových žlabů a následně svedeno do UV. Z důvodu malého prostoru mezi komunikací a přilehlým příkrým terénem podél komunikace AD navrhl vodu z komunikace svést do UV pomocí betonové obruby namísto příkopové žlabovky. Změna se týká položek: 48, 49, 55 a 56.

3) Po vizuální prohlídce propustku pod komunikací TDI nepožaduje tlakovou zkoušku propustku. Změna se týká položek 40 a 41.

Tyto změny byly odsouhlaseny ve Vyjádření TDI ze dne 30.9.2020.

Jedná se o změny, které vznikly v průběhu provádění prací. Celkově se jedná o Změny nepodstatné, nepředvídané, které jsou tak podle § 5, odst. 1, písm.c), resp. podle §10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29. 05. 2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazených do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Společnost Jinočany, PORR – SILNICE GROUP

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná o změnu nepředvídanou.

Zhotovitel žádá Oprávněného zástupce objednatele o vydání pokynu k provedení Variace.

S pozdravem

Jan Turínek
Stavbyvedoucí

Přílohy

- Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 3

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

PORR a.s.
Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice

Číslo oznámení: ZBV
1911037/ZBV3

Telefon
Motal / 723500384

Praha
07.10.2020

Věc: III/00516, III/00512 a III/0057 Jinočany, oprava silnice - SO 103 - III/0057 - km - 0,000 - 0,491 - pokyn k realizaci stavebních prací

Dle oznámení o zjištěné skutečnosti, stavba „III/00516, III/00512 a III/0057 Jinočany, oprava silnic“ SO 103 - III/0057 - km - 0,000 - 0,491, se jedná o následující změny v rozsahu a technologii oprav:

- 1) Ve zpracované PD bylo navrženo vodorovné dopravní značení pouze v barvě. Protože takto provedené VDZ nemá požadovanou životnost (vyšisuje) a hrozilo by zhoršení bezpečnosti silničního provozu, proto, jako správce silnice, požadujeme provedení VDZ v plastu.
- 2) Ve zpracované PD bylo navrženo odvodnění komunikace do příkopových žlabů a následně svedeno do UV. Z důvodu malého prostoru mezi komunikací a přilehlým příkrým terénem podél komunikace, AD navrhl vodu z komunikace svést do UV pomocí betonové obruby namísto příkopové žlabovky. Toto řešení, vzhledem k prostorovým poměrům, považujeme za vhodnější.
- 3) Po vizuální prohlídce propustky pod komunikací TDI nepožaduje tlakovou zkoušku propustku, s čímž se, jako správce komunikace, ztotožňujeme.

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje jako správce a zároveň zástupce Středočeského kraje jako vlastníka nemovitostí, tj. předmětných silnic III/00516, III/00512 a III/0057 a jako zadavatel opravy tímto vydává pokyn k realizaci díla dle navrženého řešení a zároveň žádá zhotovitele ke zpracování ZBV k této změně stavby a to v souladu se zákonem o zadávání VŘ a příslušnou směrnicí KSÚS SK.

Přílohy: Oznámení zhotovitele stavby

Karel Motal
vedoucí ISU-oblast Kladno

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

III/00516, III/00516a III/0057 Jinočany, oprava silnic, 7-0715A19

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

III/00516 - km 2,658 - 4,291

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

102 / 3

Číslo ZBV:

4

Objednatel:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov

IČ: 00066001

Zhotovitel:

Společnost Jinočany, PORR - SILNICE GROUP

Správce společností

PORR a.s. Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10, IČ:

Společník

SILNICE GROUP a.s. Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 62242105

Rekapitulace ZBV č. 4 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4.3	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4.4	0,00	1 796 753,10	1 796 753,10

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4	0,00	1 796 753,10	1 796 753,10

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré:

5

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: III/00516, III/00516a III/0057 Jinočany, oprava silnic, 7-0715A19	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 102 / 3	Číslo ZBV: 4
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): III/00516 - km 2,858 - 4,291		

Strany smlouvy o dílo č. 2370/00088001/2019 na realizaci uvedené Stavby uzavřeny dne 03.09.2019 (dále jen Smlouva)

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: Společnost Jinočany, PORR - SILNICE GROUP

Přehled Změnového listu:

1. Krycí list	1	počet listů
2. Změnový list	2	počet listů
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů
4. Rozpis ocenění Změn položek	2	počet listů
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů
Další doklady	40	počet listů

Paré č. Příjemce

1	Objednatel
2, 3	Zhotovitel
4	Projektant
5	TDI

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Pasportizace/repasportizace objízdných tras:

V zadávací projektové dokumentaci byla navržena celková uzavěra komunikace. Na základě požadavků místní samosprávy na dopravní obslužnost (zachování provozu na stávajících linkách BUS MHD) bylo upraveno DIO tak, aby byl zachován provoz BUS MHD. Z tohoto důvodu bylo nutné využívat místní komunikace jako objízdné trasy pro BUS MHD a místní dopravu. Proto bylo nutné udělat pasportizaci a následnou repasportizaci objízdných tras (doklad č. 11,12,13,14,15,16,17). Změna se týká položek: 111,112.

Vodorovné dopravní značení:

V zadávací projektové dokumentaci bylo navrženo vodorovné značení pouze v barvě. Vzhledem ke skutečnosti, že VDZ provedené barvou nemá požadovanou životnost (vyčísuje), požaduje správce komunikace provedení VDZ v plastu (doklad č. 10,16). Změna se týká položek: 113,114,115,116,117,118.

Oprava objízdných tras:

Z výsledků repasportizace vyplývá, že zvýšením provozem došlo k degradaci povrchů vozovek na objízdných trasách. Dle návrhu AD je nutné provést opravu objízdných komunikací přetažením stávajících vozovek vrstvou ACO 11+ v tl. 4 cm a lokálně vyspravit vozovky i v podkladní vrstvě (doklad č. 11,12,13). Změna se týká položek: 119,120,121,122,123,124.

Uvedené skutečnosti byly projednány a odsouhlaseny TDI, projektantem a zástupcem objednatele (viz doklad č. 10, 12, 16, 19)

Jedná se o Změny nezbytné k dokončení díla, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jsou podle § 5, odst. 1, písm.d), resp. podle § 11 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29.5.2017) uplňující provádění změn závažků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazené do Skupiny 4.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. dle § 222 odst. (5) se jedná o nezbytnou změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
0,00	1 796 753,10	1 796 753,10	1 796 753,10

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí)	Jméno	Ing. Petr Matlíněk	datum	11. 12. 2020	podpis
Projektant (autorský dozor)	Jméno	Ing. Pavlína Nykodémová	datum	11. 12. 2020	podpis
Technický dozor investora	Jméno	Ing. Martin Vavřena	datum		podpis
Zástupce Objednatel:	Jméno	Karel Motal	datum		podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.					
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel)	Jméno	Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA	datum		podpis
Zhotovitel	Jméno	Ing. Pavel Hirsch	datum		podpis
	Jméno	Ing. Karel Rypl	datum	11. 12. 2020	podpis
					Číslo paré

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 4

Název Stavby: III/00516, III/00516a III/0057 Jinočany, oprava silnic	
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	102 / 3
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): III/00516 - km 2,658 - 4,291	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
22 723 584,84

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	5 306 953,63	28 030 538,47	5 306 953,63

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	1 796 753,10	7 103 706,73	31,26%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	0,00	29 827 291,57	7 103 706,73	31,26%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): Ing. Petr Martínek 11.12. 2020

Projektant (autorský dozor): Ing. Pavlína Nykodémová 11.12. 2020

Stavební dozor: Ing. Martin Vavřena

Zástupce Objednatele: Karel Motal

Zaměstnanec KSÚS SK
odpovědný za cenové
projednání Změny: Petr Heinrich

Rozpis ocenění Změn položek - pro ŽBV číslo: 4

Evidenční číslo a název stavby:

M/00516, M/00516a M/0057 Jinočany, oprava silnic

Číslo a název SO/PS: 102 M/00516 - km 2,658 - 4,291

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

102/3

Číslo a název rozpočtu: 102 M/00516 - km 2,658 - 4,291

Skupina Změn: 4

Pol. č. M	Kód položky	Název položky	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Nové položky										
111	2 020400	Práce na odstranění staré	0,000	1,000	1,000	69 800,00	0,00	0,00	69 800,00	69 800,00	69 800,00	100,00
112	2 020400	Práce na odstranění staré	0,000	1,000	1,000	69 300,00	0,00	0,00	69 300,00	69 300,00	69 300,00	100,00
113	105211112	Vodotěsnění podlahy v místnosti 1125 mm vodorovně a 1125 mm svisle	0,000	1 822 580	1 822 580	34,40	0,00	0,00	62 977,92	62 977,92	62 977,92	100,00
114	105211112	Vodotěsnění podlahy v místnosti 1125 mm vodorovně a 1125 mm svisle	0,000	265 230	265 230	13,60	0,00	0,00	3 607,13	3 607,13	3 607,13	100,00
115	105211113	Vodotěsnění podlahy v místnosti 1125 mm vodorovně a 1125 mm svisle	0,000	70 340	70 340	70,70	0,00	0,00	4 950,90	4 950,90	4 950,90	100,00
116	105211113	Vodotěsnění podlahy v místnosti 1125 mm vodorovně a 1125 mm svisle	0,000	86 640	86 640	38,30	0,00	0,00	3 318,31	3 318,31	3 318,31	100,00
117	105211113	Vodotěsnění podlahy v místnosti 1125 mm vodorovně a 1125 mm svisle	0,000	146 250	146 250	328,00	0,00	0,00	47 970,00	47 970,00	47 970,00	100,00
118	105211116	Vodotěsnění podlahy v místnosti 1125 mm vodorovně a 1125 mm svisle	0,000	138 000	138 000	444,00	0,00	0,00	61 272,00	61 272,00	61 272,00	100,00
119	105211116	Vodotěsnění podlahy v místnosti 1125 mm vodorovně a 1125 mm svisle	0,000	1 848 000	1 848 000	56,30	0,00	0,00	104 042,40	104 042,40	104 042,40	100,00
120	105211116	Vodotěsnění podlahy v místnosti 1125 mm vodorovně a 1125 mm svisle	0,000	232 000	232 000	42,30	0,00	0,00	9 725,10	9 725,10	9 725,10	100,00
121	105211116	Vodotěsnění podlahy v místnosti 1125 mm vodorovně a 1125 mm svisle	0,000	1 135 000	1 135 000	8,30	0,00	0,00	10 810,80	10 810,80	10 810,80	100,00
122	105211116	Vodotěsnění podlahy v místnosti 1125 mm vodorovně a 1125 mm svisle	0,000	3 250 000	3 250 000	269,00	0,00	0,00	874 750,00	874 750,00	874 750,00	100,00
123	105211116	Vodotěsnění podlahy v místnosti 1125 mm vodorovně a 1125 mm svisle	0,000	1 335 333	1 335 333	353,00	0,00	0,00	470 646,55	470 646,55	470 646,55	100,00
124	105211116	Vodotěsnění podlahy v místnosti 1125 mm vodorovně a 1125 mm svisle	0,000	2 550 000	2 550 000	7,48	0,00	0,00	19 074,00	19 074,00	19 074,00	100,00
		Celkem					0,00	0,00	1 796 753,10	1 796 753,10	1 796 753,10	

Odpovědný zástupce Objednatel: , stádku měřících položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu

Potvrzují zároveň skutečně:

Za Zhotovitele: Ing. Petr

Za Objednatel: Ing. Marie Vavřina (TDI)

Datum:

11. 12.

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	4
Název a evidenční číslo stavby:	III/00516, III/00516a III/0057 Jinočany, oprava silnic, 7-0715A19
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	III/00516 - km 2,658 - 4,291
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	102 / 3

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
07 Změnový soupis prací SO 102 po změně 3	3	
08 Cenové nabídky a jejich vyhodnocení	5	
09 Oznamení o zjištění skutečnosti	2	
10 Pokyn k realizaci stavebních prací ze dne 08.10.2020	1	
11 Vyjádření obce Jinočany ze dne 20.11.2020	1	
12 Vzorové příčné řezy	1	
13 Situace - oprava objízdných tras	1	
14 Pasport Dobříčská	5	
15 Pasport Pražská Lidická	5	
16 Repasport Dobříčská	5	
17 Repasport Pražská Lidická	5	
18 Vyjádření TDI	1	
9 Zápis ze 14. kontrolního dne	5	
Počet listů celkem	40	

Změnový soupis prací SO 102 po změně 3 - pro ZBV 4

Evidenční číslo a název stavby:

III/00516, III/00516a III/0057 Jinočany, oprava silnic, 7-0715A192

Číslo a název SO/PS: SO 102 - III/00516 - km 2,658 - 4,291

Číslo a název rozpočtu: SO 102 - III/00516 - km 2,658 - 4,291

Pol. č. pal.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě
1	2	3	4	5
1	1313C1101	Odstřepování stromů stěžených průměru kmenů do 300 mm	m3	1,030
2	1313C1101	Odstřepování stromů do 300 mm	m3	1,404
3	1313C1101	Odstřepování stromů z kmenů stěžených průměru kmenů do 300 mm	m3	10,627,200
4	1313C1101	Střezba stromů stěžených průměru kmenů do 300 mm	m3	12,676,970
5	1313C1101	Střezba stromů stěžených průměru kmenů do 300 mm	m3	79,400
6	1313C1101	Střezba stromů stěžených průměru kmenů do 300 mm	m3	21,420
7	1313C1101	Střezba stromů stěžených průměru kmenů do 300 mm	m3	10,627,200
8	1313C1101	Střezba stromů stěžených průměru kmenů do 300 mm	m3	25,260
9	1313C1101	Střezba stromů stěžených průměru kmenů do 300 mm	m3	13,650
10	1313C1101	Střezba stromů stěžených průměru kmenů do 300 mm	m3	155,600
11	1313C1101	Střezba stromů stěžených průměru kmenů do 300 mm	m3	9,000
12	1313C1101	Střezba stromů stěžených průměru kmenů do 300 mm	m3	1,000
13	1313C1101	Střezba stromů stěžených průměru kmenů do 300 mm	m3	1,000
14	1313C1101	Střezba stromů stěžených průměru kmenů do 300 mm	m3	1,000
15	1313C1101	Střezba stromů stěžených průměru kmenů do 300 mm	m3	1,000
16	1313C1101	Střezba stromů stěžených průměru kmenů do 300 mm	m3	71,750
17	1313C1101	Střezba stromů stěžených průměru kmenů do 300 mm	m3	71,750
18	1313C1101	Střezba stromů stěžených průměru kmenů do 300 mm	m3	71,750
19	1313C1101	Střezba stromů stěžených průměru kmenů do 300 mm	m3	141,500
20	1313C1101	Střezba stromů stěžených průměru kmenů do 300 mm	m3	83,850
21	1313C1101	Střezba stromů stěžených průměru kmenů do 300 mm	m3	59,678
22	1313C1101	Střezba stromů stěžených průměru kmenů do 300 mm	m3	12,127,970
23	1313C1101	Střezba stromů stěžených průměru kmenů do 300 mm	m3	1,957,400
24	1313C1101	Střezba stromů stěžených průměru kmenů do 300 mm	m3	13,650
25	1313C1101	Střezba stromů stěžených průměru kmenů do 300 mm	m3	96,000
26	1313C1101	Střezba stromů stěžených průměru kmenů do 300 mm	m3	71,750
27	1313C1101	Střezba stromů stěžených průměru kmenů do 300 mm	m3	1,900
28	1313C1101	Střezba stromů stěžených průměru kmenů do 300 mm	m3	25,260
29	1313C1101	Střezba stromů stěžených průměru kmenů do 300 mm	m3	7,000
30	1313C1101	Střezba stromů stěžených průměru kmenů do 300 mm	m3	5,000
31	1313C1101	Střezba stromů stěžených průměru kmenů do 300 mm	m3	17,400
32	1313C1101	Střezba stromů stěžených průměru kmenů do 300 mm	m3	10,627,200
33	1313C1101	Střezba stromů stěžených průměru kmenů do 300 mm	m3	2,291,308

ZMĚNOVÝ SOUPIS PRACÍ (SO/PS)									
102/3									
Množství ve změně	Množství sazdic	Cena za m. j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny hospodně v Kč	Změny hladné v Kč	Cena celkem ve změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl změn celkem v %	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.000	0.000	543.64	543.64	0.00	0.00	543.64	0.00	0.00	0.00
1.000	0.000	1 087.28	1 087.28	0.00	0.00	1 087.28	0.00	0.00	0.00
10 627.200	0.000	27.77	767 714.14	0.00	0.00	767 714.14	0.00	0.00	0.00
12 676.970	0.000	113.77	1 442 258.89	0.00	0.00	1 442 258.89	0.00	0.00	0.00
71.400	0.000	336.78	24 046.09	0.00	0.00	24 046.09	0.00	0.00	0.00
21.420	0.000	67.36	1 442.85	0.00	0.00	1 442.85	0.00	0.00	0.00
777.840	627.640	449.04	37 209.12	0.00	281 825.46	319 034.58	281 825.46	245.42	
25.280	0.000	89.83	2 268.60	0.00	0.00	2 268.60	0.00	0.00	0.00
13.650	0.000	691.03	9 446.89	0.00	0.00	9 446.89	0.00	0.00	0.00
781.240	627.640	44.90	6 536.44	0.00	28 282.04	35 147.48	28 181.04	402.37	
1.000	0.000	33.83	33.83	0.00	0.00	33.83	0.00	0.00	0.00
1.000	0.000	468.74	468.74	0.00	0.00	468.74	0.00	0.00	0.00
1.000	0.000	107.28	107.28	0.00	0.00	107.28	0.00	0.00	0.00
1.000	0.000	132.89	132.89	0.00	0.00	132.89	0.00	0.00	0.00
1.000	0.000	236.79	236.79	0.00	0.00	236.79	0.00	0.00	0.00
1.000	0.000	274.51	274.51	0.00	0.00	274.51	0.00	0.00	0.00
699.390	627.640	323.78	8 237.72	0.00	26 434.04	34 171.76	26 434.04	874.76	
899.190	627.640	37.75	2 708.56	0.00	28 642.28	36 401.84	28 692.28	874.76	
629.390	627.640	20.13	1 244.30	0.00	17 634.42	14 076.75	12 434.42	874.76	
1 461.540	1 318.040	217.46	31 205.51	0.00	286 620.36	317 825.87	286 620.36	578.45	
83.850	0.000	269.78	22 621.05	0.00	0.00	22 621.05	0.00	0.00	0.00
13.678	0.000	314.74	12 488.25	0.00	0.00	12 488.25	0.00	0.00	0.00
12 222.970	0.000	19.71	250 968.30	0.00	0.00	250 968.30	0.00	0.00	0.00
1 000.000	0.000	22.16	22 160.00	0.00	0.00	22 160.00	0.00	0.00	0.00
13.680	0.000	2 124.56	29 082.74	0.00	0.00	29 082.74	0.00	0.00	0.00
36.000	0.000	250.25	9 009.00	0.00	0.00	9 009.00	0.00	0.00	0.00
72.100	0.000	942.81	67 940.55	0.00	0.00	67 940.55	0.00	0.00	0.00
1.000	0.000	4 656.56	4 656.56	0.00	0.00	4 656.56	0.00	0.00	0.00
25.290	0.000	869.87	21 928.45	0.00	0.00	21 928.45	0.00	0.00	0.00
9.000	0.000	144.97	1 304.73	0.00	0.00	1 304.73	0.00	0.00	0.00

[illegible]

12.000	0.000	839.87	10 078.44	0.00	0.00	10 078.44	0.00	0.00
9.000	0.000	839.87	7 558.83	0.00	0.00	7 558.83	0.00	0.00
175.000	0.000	515.85	90 588.28	0.00	0.00	90 588.28	0.00	0.00
289.221	0.000	319.47	82 197.49	0.00	0.00	82 197.49	0.00	0.00
282.550	0.000	339.39	94 816.28	0.00	0.00	94 816.28	0.00	0.00
70.000	0.000	181.21	12 684.70	0.00	0.00	12 684.70	0.00	0.00
26.000	0.000	299.94	10 437.34	0.00	0.00	10 437.34	0.00	0.00
70.000	0.000	30.20	2 114.00	0.00	0.00	2 114.00	0.00	0.00
1.000	0.000	10 268.74	10 268.74	0.00	0.00	10 268.74	0.00	0.00
9.000	0.000	1 957.10	17 613.80	0.00	0.00	17 613.80	0.00	0.00
8.000	0.000	664.45	5 115.60	0.00	0.00	5 115.60	0.00	0.00
9.000	0.000	1 510.11	13 590.95	0.00	0.00	13 590.95	0.00	0.00
12.000	0.000	2 350.98	28 691.76	0.00	0.00	28 691.76	0.00	0.00
12.000	0.000	3 445.06	41 216.60	0.00	0.00	41 216.60	0.00	0.00
1 812.580	0.000	17.00	21 895.97	0.00	0.00	21 895.97	0.00	0.00
268.230	0.000	12.00	3 203.98	0.00	0.00	3 203.98	0.00	0.00
70.140	0.000	24.16	1 694.58	0.00	0.00	1 694.58	0.00	0.00
84.640	0.000	24.16	2 093.22	0.00	0.00	2 093.22	0.00	0.00
146.750	0.000	115.96	16 957.09	0.00	0.00	16 957.09	0.00	0.00
138.000	0.000	166.72	23 007.86	0.00	0.00	23 007.86	0.00	0.00
2 234.590	0.000	3.00	6 748.46	0.00	0.00	6 748.46	0.00	0.00
284.250	0.000	6.00	1 216.87	0.00	0.00	1 216.87	0.00	0.00
1 027.000	792.000	343.62	84 186.90	0.00	172 147.04	856 333.94	772 147.04	223 227
2.000	0.000	30 202.17	60 404.34	0.00	0.00	60 404.34	0.00	0.00
2.000	0.000	29 066.86	79 733.72	0.00	0.00	79 733.72	0.00	0.00
2.000	0.000	43 491.12	86 982.24	0.00	0.00	86 982.24	0.00	0.00
12.650	0.000	472.81	5 721.63	0.00	0.00	5 721.63	0.00	0.00
6 604.000	1 369.000	30.20	219 527.20	0.00	41 313.60	759 840.80	41 313.60	24 336
210.500	0.000	66.40	12 985.62	0.00	0.00	12 985.62	0.00	0.00
210.500	0.000	138.82	29 244.77	0.00	0.00	29 244.77	0.00	0.00
75.600	0.000	246.99	6 297.34	0.00	0.00	6 297.34	0.00	0.00
150.000	0.000	434.64	65 396.00	0.00	0.00	65 396.00	0.00	0.00
12.000	0.000	3 563.86	42 766.32	0.00	0.00	42 766.32	0.00	0.00
1 524.000	0.000	73.49	110 547.28	0.00	0.00	110 547.28	0.00	0.00
7.500	0.000	42.63	448.73	0.00	0.00	448.73	0.00	0.00
10.000	0.000	889.07	9 080.80	0.00	0.00	9 080.80	0.00	0.00
1.000	0.000	271.87	271.87	0.00	0.00	271.87	0.00	0.00
5.000	0.000	2 274.96	11 174.80	0.00	0.00	11 174.80	0.00	0.00
14 014.870	1 924.820	6.00	1 188.87	0.00	13 625.31	89 744.84	11 625.31	14 488
241 515.730	125 513.300	6.00	263 070.71	0.00	755 684.32	1 458 759.05	755 684.33	487 440
15 016.870	2 083.220	19.84	236 602.20	0.00	41 313.60	297 933.20	41 313.60	14 111
172.866	158.400	241.42	3 492.62	0.00	38 277.64	41 765.26	38 277.64	1 095.81
6 490.000	0.000	344.40	540 541.59	0.00	0.00	540 541.59	0.00	0.00
1 744.190	1 318.000	217.46	1 357 484.73	0.00	286 617.28	1 634 097.01	286 617.26	20 311
2 095.990	1 271.000	21.81	17 992.90	0.00	17 720.70	45 213.60	17 720.70	154 06

Nabídka pasportizace komunikací

Nabídka č. 91.2020

Dodavatel:		Odběratel:	
Název:	SONUM Czech s.r.o.	Název:	PORR a.s.
Adresa:	Kludských 2752/28 Praha 9 Horní Počernice PSČ: 193 00	Adresa:	Dubečská 3238/36 Praha 10 Strašnice PSČ: 100 00
IČ:	27416252	IČ:	43005580
Kontakt:	Pavel Král	Kontakt:	pan Jan Turínek
Název zakázky:	Pasportizace Jinočany	Datum vystavení:	01.03.2020
Adres místa stavby:	Dobříšská Jinočany	Vyřizuje:	Pavel Král
		Telefon:	
		E-mail:	
		Celková cena díla:	58 000,-Kč bez DPH
		Termín dokončení:	Dle požadavků stavby

Předmět a specifikace nabídky:

Provedení podrobné fotografické pasportizace komunikací a souvisejícího inventáře

Rozsah pasportizace dle zaslaných podkladů

Zpracování pasportizace v tištěné zprávě z použitím reprezentativních fotografií

Dodání 3 výtisků zprávy + v pdf

Předání kompletní fotodokumentace na datovém nosiči

Podmínky zakázky:

Bude provedena pasportizace komunikace Dobříšská mezi ulicemi Hornická a Karlštejská

Za dodavatele: _____

Dodavatel souhlasí se zveřejněním celého obsahu nabídky a prohlašuje, že nabídky neobsahuje obchodní tajemství ani údaje, které by neměly být zveřejněny.

Tato cena nabídky je konečná a nemůže být překročena. Pokud je uveden termín dodání, je tento termín závazný.

Nabídka pasportizace a repassportizace komunikací

Nabídka č. 103.2020

Dodavatel:		Odběratel:	
Název:	SONUM Czech s.r.o.	Název:	PORR a.s.
Adresa:	Kludských 2752/28 Praha 9 Horní Počernice PSČ: 193 00	Adresa:	Dubečská 3238/36 Praha 10 Strašnice PSČ: 100 00
IČ:	27415252	IČ:	43005560
Kontakt:	Pavel Král	Kontakt:	pan Jan Turínek
Název zakázky:		Datum	
Pasportizace Jinočany		25.05.2020	
Adres místa stavby:		Vyřizuje:	
Pražská Jinočany Dobříšská Jinočany		Pavel Král	
		Telefon:	
		E-mail:	
		Celková cena	
		63 000,-Kč bez DPH	
		Termín	
		Dle požadavků stavby	

Předmět a specifikace nabídky:

Provedení podrobné fotografické pasportizace a repasportizace komunikace ulice Pražská a souvisejícího inventáře

Provedení podrobné fotografické repasportizace komunikace ulice Dobříšská a souvisejícího inventáře

Rozsah pasportizace a repasportizace dle zaslaných podkladů

Zpracování pasportizace a repasportizace v tištěných zprávách z použitím reprezentativních fotografií

Dodání 3 výtisků zprávy + v pdf z pasportizace komunikace ulice Pražská

Dodání 3 výtisků zprávy + v pdf z repasportizace komunikace ulice Pražská

Dodání 3 výtisků zprávy + v pdf z pasportizace komunikace ulice Dobříšská

Předání kompletní fotodokumentace na datovém nosiči

Podmínky zakázky:

Bude provedena pasportizace a repasportizace komunikace ulice Pražská a repasportizace komunikace ulice Dobříšská mezi ulicemi Hornická a Karlštejnská

Za dodavatele: _____

Dodavatel souhlasí se zveřejněním celého obsahu nabídky a prohlašuje, že nabídky neobsahuje obchodní tajemství ani údaje, které by neměly být zveřejněny.

Tato cena nabídky je konečná a nemůže být překročena. Pokud je uveden termín dodání, je tento termín závazný.

**KB Investment s.r.o.
Roháčova 145/14
130 00 Praha 3 Žižkov**

**Nabídkový list na pasportizaci pro odběratele PORR a.s.,
Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10:
na zakázku
"komunikace ulice Dobříšská Jinočany"**

Místo realizace: ulice Dobříšská Jinočany

**Předmět nabídky: provedení podrobné pasportizace silničního svršku komunikace
ulice Dobříšská v rozsahu mezi ulicemi Hornická a Karlštejská**

**Způsob realizace: provedení fotografické pasportizace se staničením po sto
metrech a vyhotovením zprávy z pasportizace**

Předání díla: dodání tří tištěných zpráv z pasportizace

Nabídnutá celková cena bez DPH: 63 000,- Kč

Předpokládaný termínový plán:

- 1) Provedení termín realizace terénních prací terénních prací – do 15.3.2020**
- 2) Zpracování a předání finálních zpráv – do 27.4.2020**

Platnost cenové nabídky 1 měsíc od jejího vystavení

V Praze dne 6.3.2020

Nabídku zpracoval:

**KB Investment s.r.o.
Tel: 77
Email:**

**Roháčova 145/14, 130 00 Praha 3 Žižkov
IČ: 24702919
DIČ: CZ 24702919**

**KB Investment s.r.o.
Roháčova 145/14
130 00 Praha 3 Žižkov**

**Nabídkový list na pasportizaci a repasportizaci komunikací pro
odběratele PORR a.s.,
Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10:
na zakázku
"komunikace ulice Pražská a ulice Dobříšská Jinočany"**

Místo realizace:

1. ulice Pražská Jinočany
2. ulice Dobříšská Jinočany

Předmět nabídky:

1. provedení podrobné pasportizace stíníčního svršku komunikace ulice Pražská
2. provedení podrobné repasportizace stíníčního svršku komunikace ulice Pražská
3. provedení podrobné repasportizace stíníčního svršku komunikace ulice Dobříšská

Způsob realizace: provedení fotografické pasportizace a repasportizace se staničením po sto metrech a vyhotovením zprávy z pasportizace

Předání díla: dodání tří tištěných zpráv z pasportizace na každou část zakázky

Nabídnutá celková cena bez DPH: 68 000,- Kč

Předpokládaný termínový plán:

- 1) Provedení termín realizace terénních prací terénních prací – do 15.6.2020
- 2) Zpracování a předání finálních zpráv – do 3.8.2020

Platnost cenové nabídky 1 měsíc od jejího vystavení

V Praze dne 27.5.2020

Nabídku zpracovat:

**KB Investment s.r.o.
Tel: 7
Email:**

Ing. Aleš Kyšák

**Roháčova 145/14, 130 00 Praha 3 Žižkov
IČ: 24702919
DIČ: CZ 24702919**

Vyhodnocení nabídek - Stavba 1911037 - III/00516, III/00516a III/0057 Jinočany, oprava silnic

pol.111	Pasportizace objízdných tras	kpl	SONUM Czech s.r.o. Cenová nabídka dne 01.03.2020 58 000,00 Kč	KB Investment s.r.o. Cenová nabídka dne 06.03.2020 63 000,00 Kč	
pol.112	Repasportizace objízdných tras	kpl	SONUM Czech s.r.o. Cenová nabídka dne 05.05.2020 69 000,00 Kč	KB Investment s.r.o. Cenová nabídka dne 27.05.2020 68 000,00 Kč	

**KSÚS Středočeského kraje
Karel Motál
Oprávněný zástupce objednatele
Zborovská 11
150 21 Praha 5**

Váš dopis zn./ ze dne

Naše zn.:

1911037/Z8V4

Vyřizuje:

Telefon:

E-mail:

Věc: Oznámení o zjištění zkušenosti

Stavba: III/00516, III/00512 a III/0057 Jinočany, oprava silnic - SO 102 III/00516 - km 2,858 - 4,291

Vážený pane Motále,

jako Zhotovitel stavby „III/00516, III/00512 a III/0057 Jinočany, oprava silnic“, realizované na základě Smlouvy o dílo č. Objednatel 2370/00066001/2019 uzavřené dne 3.9.2019 mezi smluvními stranami Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 – Smíchov a společností „Společnost Jinočany, PORR - SILNICE GROUP“, kde správcem společnosti je společnost PORR a s., se sídlem Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10, tímto oznamujeme níže uvedené skutečnosti:

1) V zadávací projektové dokumentaci bylo navrženo vodorovné značení pouze v barvě. Vzhledem ke skutečnosti, že VDZ provedené barvou nemá požadovanou životnost (vyšisuje), požaduje správce komunikace provedení VDZ v plastu. Změna se týká položek: 113, 114, 115, 116, 117 a 118.

2) V zadávací projektové dokumentaci byla navržena celková uzávěra komunikace. Na základě požadavků místní samosprávy na dopravní obslužnost (zachování provozu na stávajících linkách BUS MHD) bylo upraveno DIO tak aby byl zachován provoz BUS MHD. Z tohoto důvodu bylo nutné využívat místní komunikace jako objízdné trasy pro BUS MHD a místní dopravu. Proto bylo nutné udělat pasportizaci a následnou repasportizaci objízdných tras. Změna se týká položek: 111 a 112

3) V návaznosti na bod 2) došlo provozem k degradaci povrchů vozovek na objízdných trasách. Dle návrhu AD je nutné provést opravu objízdných komunikací přetažením stávajících komunikací vrstvou ACO 11+ v tl. 4cm a lokálně vyspravit komunikaci i v podkladní vrstvě. Změna se týká položek: 119, 120, 121 a 122

Jedná se o změny, které vznikly v průběhu provádění prací. Celkově se jedná o Změny nepodstatné, nepředvídané, které jsou tak podle § 5, odst. 1, písm.c), resp. podle §10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29. 05. 2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazený do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Společnost Jinočany, PORR – SILNICE GROUP

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná o změnu nepředvídanou.

Zhotovitel žádá Oprávněného zástupce objednatele o vydání pokynu k provedení variace.

S pozdravem

**Jan Turínek
Stavbyvedoucí**

Přílohy:

- ♦ **Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 4**

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11**

**PORR a.s.
Dubčská 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice**

Vás dopis značí/ze dne
19/1037/ZBV4

Vyřizuje/telefon
Motal

Praha
08.10.2020

**Věc: III/00516, III/00512 a III/0057 Jinočany, oprava silnice - SO 102 III/00516 – km 2,658
– 4,294 - pokyn k realizaci stavebních prací**

Dle oznámení o zjištěné skutečnosti, stavba „III/00516, III/00512 a III/0057 Jinočany, oprava silnic“ - SO 102 III/00516 – km 2,658 – 4,294, se jedná o následující změny v rozsahu a technologii oprav:

- 1) Ve zpracované PD bylo navrženo vodorovné dopravní značení pouze v barvě. Protože takto provedené VDZ nemá požadovanou životnost (vyčísuje) a hrozilo by zhoršení bezpečnosti silničního provozu, proto, jako správce silnice, požadujeme provedení VDZ v plastu.
- 2) Ve zpracované PD byla navržena celková uzavěrka komunikace. Na základě požadavků dotčené obce na dopravní obslužnost – zachování provozu na stávajících linkách BUS MHD, bylo upraveno DIO tak, aby byl zachován provoz BUS MHD. Z toho důvodu bylo nutné využívat místní komunikace jako objízdné trasy pro BUS MHD a místní dopravu. Bylo nutné provést pasportizaci a následně repasportizaci objízdných tras.
- 3) V návaznosti na bod 2) došlo provozem BUS MHD na místních komunikacích, určených pro objízdné trasy, k degradaci jejich povrchů. Dle návrhu AD je nutné lokálně provést opravu u těchto komunikací přetažením vrstvou ACO 11+ v tl. 4 cm a dále lokálně provést výspravu komunikací i v podkladní vrstvě.

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje jako správce a zároveň zástupce Středočeského kraje jako vlastníka nemovitostí, tj. předmětných silnic III/00516, III/00512 a III/0057 a jako zadavatel opravy tímto vydává pokyn k realizaci díla dle navrženého řešení a zároveň žádá zhotovitele ke zpracování ZBV k této změně stavby a to v souladu se zákonem o zadávání VŘ a příslušnou směrnicí KSÚS SK.

Přílohy: Oznámení zhotovitele stavby

Bank:

(700066001)

Telefon
E-mail



Obec Jinočany

Náměstí 5. května 19, 252 25 Jinočany

KSÚS Středočeského kraje
Zborovská 11
15000 Praha

Vaše značka:

Naše značka:

Vyřizuje:

V Jinočanech dne:

0002928/20/OUJIN/PDo

Ing. Petr Dorazil

20.11.2020

Věc:

Oprava místní komunikace Pražská

Během opravy silnice III/00516 byla svedena veškerá doprava na místní komunikaci ulici Pražskou.

Obec požaduje opravu této komunikace.

Na základě místního šetření za účasti zástupců obce, investora (KSUS) a zhotovitele (PORR a.s., Silnice Group s.r.o.) byl stanoven rozsah oprav této komunikace.


S ohledem na současný stav je nutno řešit opravu do konce letošního roku.

S pozdravem




Ing. Petr Dorazil
Stavební technik obce


I. USEK - ZPŮSOB OPRAVY 1

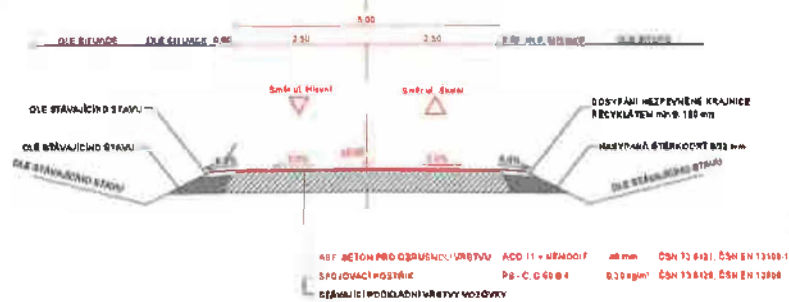


II. ÚSEK - ZPUSOB OPRAVY 2

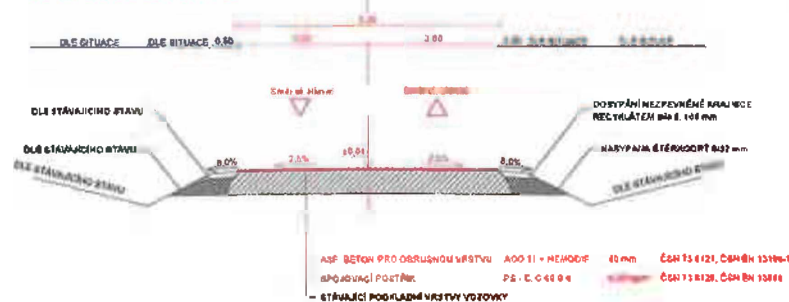


III. USEK - ZPUSOB OPRAVY 3

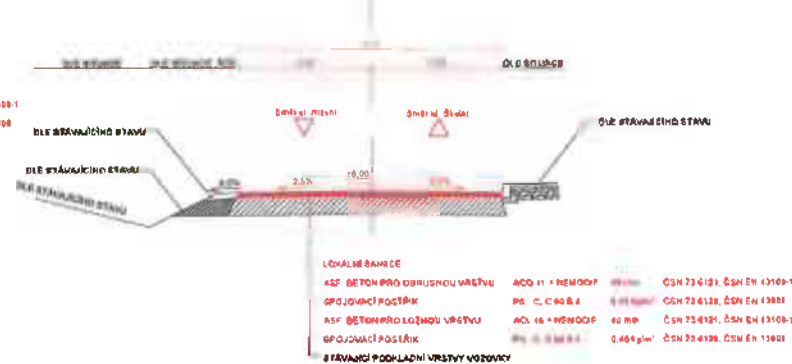

1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			
41			
42			
43			
44			
45			
46			
47			
48			
49			
50			
51			
52			
53			
54			
55			
56			
57			
58			
59			
60			
61			
62			
63			
64			
65			
66			
67			
68			
69			
70			
71			
72			
73			
74			
75			
76			
77			
78			
79			
80			
81			
82			
83			
84			
85			
86			
87			
88			
89			
90			
91			
92			
93			
94			
95			
96			
97			
98			
99			
100			

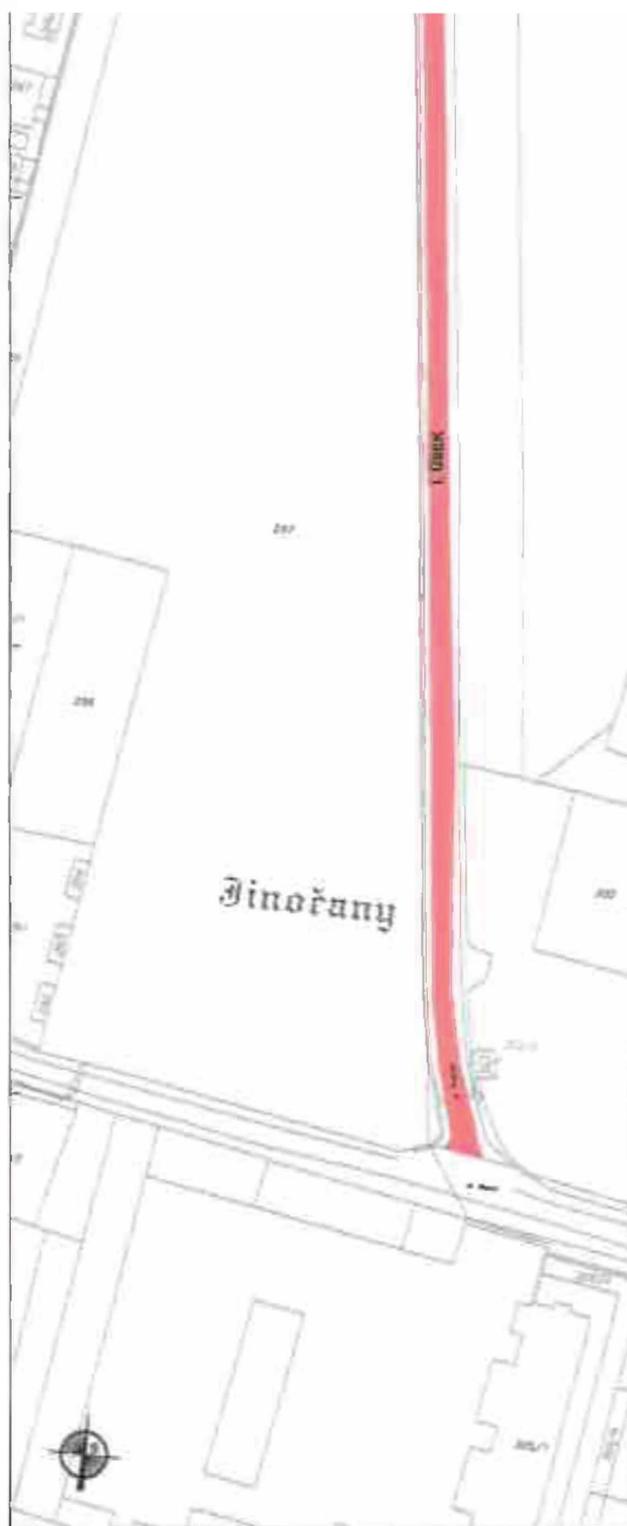

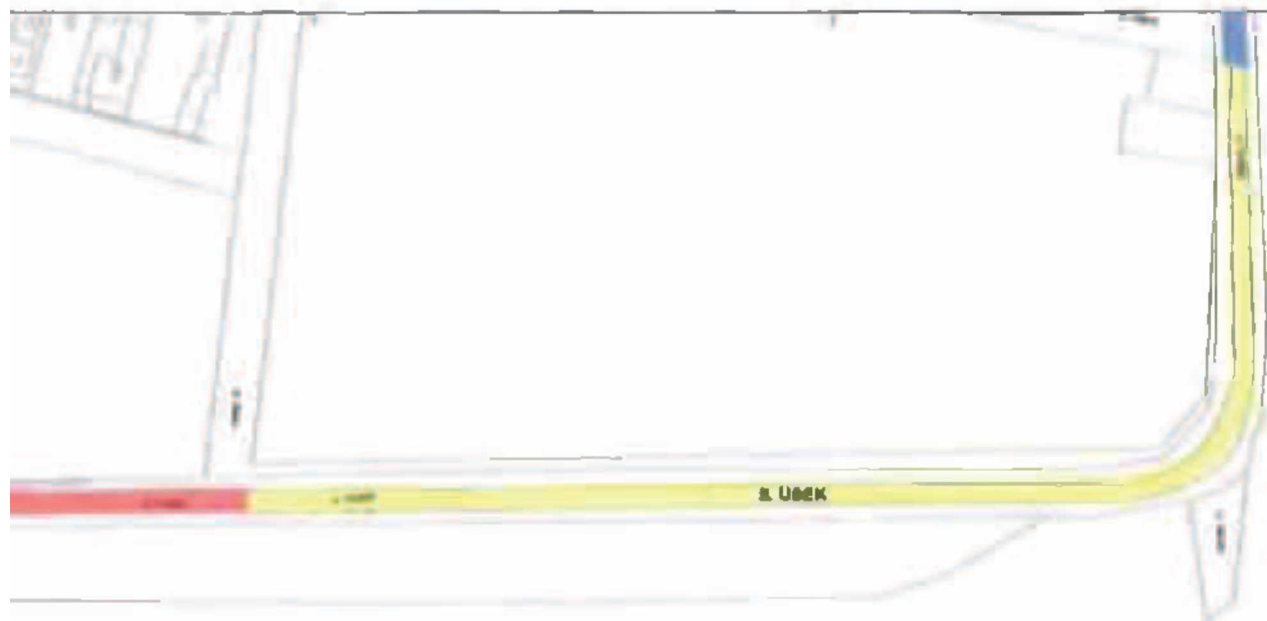

LEGENDA PLOCH.

- 1. UDEK - 1. UDEK
- 2. UDEK - 2. UDEK
- 3. UDEK - 3. UDEK

ZPRÁVA Z PASPORTIZACE

ulice Dobruška, obec Imřovice, okres Praha-západ


Objednatel :

PORR a.s.

Dubečská 3238/36

100 00 Praha 10 - Strašnice

1

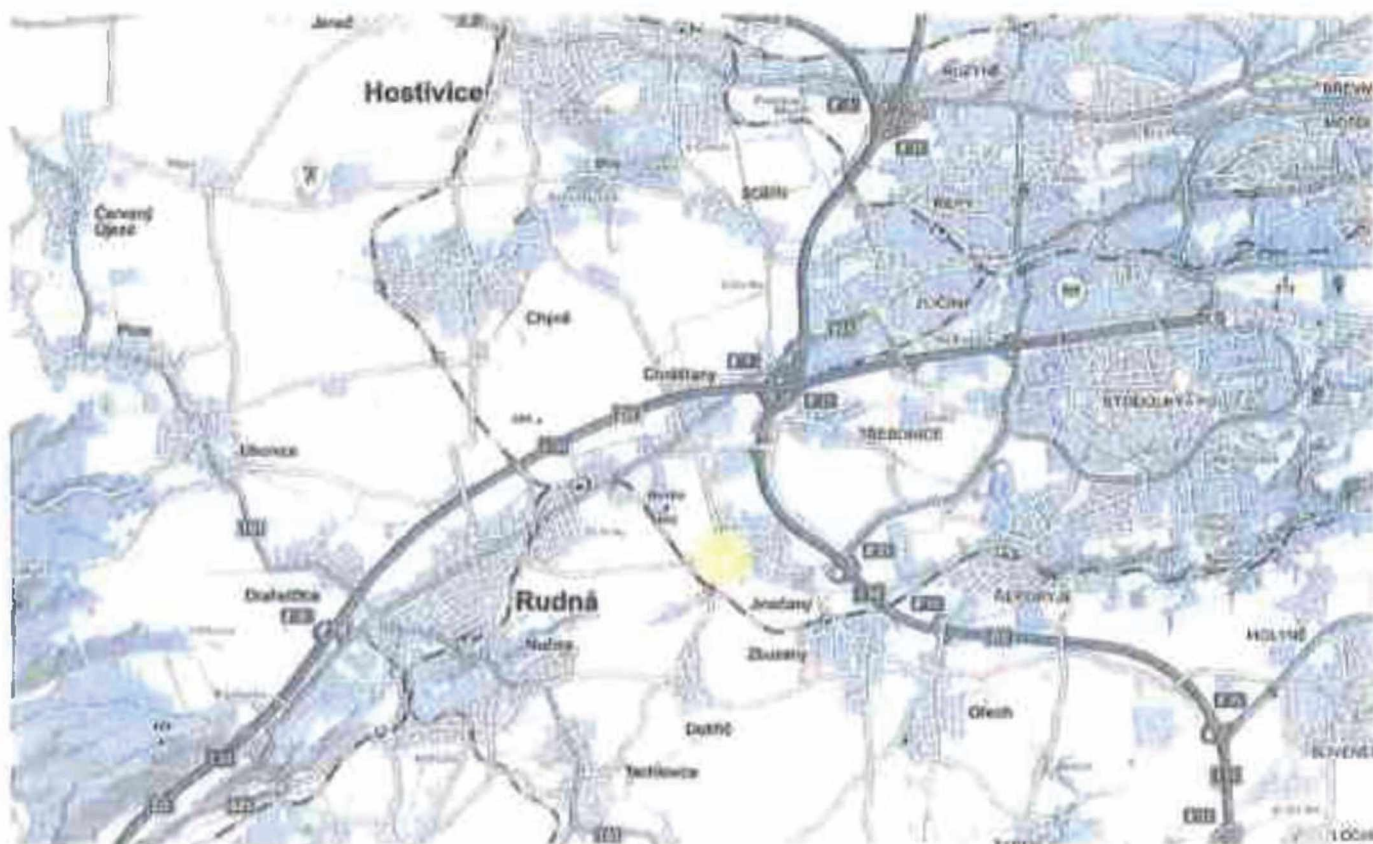

Praha, duben 2020

Číslo mapy: 1/2020
Měřítko: 1:10 000
Datum: 1. duben 2020
Vydání: 1. vydání

Objednatel: PORR a.s.
Místo: Praha 10
Datum: 1. duben 2020
Vydání: 1. vydání

Na základě objednávky od společnosti PORR a.s., Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 - Strašnice, jsme provedli pasportizaci obrusné vrstvy ulice Dobříčská, obec Jinočany. Veškeré terénní práce byly dokončeny do 18. března 2020.

1.1. Identifikační údaje

ZADÁNÍ:

Dokumentace současného stavu obrusné vrstvy ulice Dobříčská, obec Jinočany.

CÍL PASPORTIZACE:

Zadokumentování současného technického stavu obrusné vrstvy ulice Dobříčská, obec Jinočany. Pořízená fotodokumentace slouží jako podklad pro porovnání případné změny stavu z důvodu stavebních prací.

LOKALITA STAVBY:

ulice Dobříčská, obec Jinočany, okres Praha-západ

OBJEDNATEL:

Společnost PORR a.s., Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 - Strašnice

2.1. Účel pasportizace

Pasportizace je prováděna za účelem zadokumentování současného technického stavu obrusné vrstvy ulice Dobříčská, kdy lze předpokládat možné ovlivnění stavebními postupy nebo stavební činností, které jsou nezbytné pro provádění výstavby. Pasportizace je prováděna v časovém předstihu a to tak, aby z fotodokumentace bylo možné vyloučit co nejvíce vedlejších vlivů. Fotodokumentaci je možno použít jako podklad pro sledování chování prostorů v průběhu provádění stavebních prací. Případně se provede tzv. repasportizace a to v případě vypočítaných změn stavu prostoru v průběhu výstavby, či po dokončení stavebních prací.

2.2. Metodika pasportizace

Pro zahájení pasportizace bylo provedeno místní šetření se zápisem do terénních listů. Proběhla komunikace se zástupci společnosti PORR a.s. a následné pořízení fotodokumentace.

2.3. Pracovní postup pasportizace

Přípravné práce a pořízení potřebných dostupných informací ohledně řešeného území. Prvotní navštívení daného území a prvotní komunikace se zástupci společnosti PORR a.s.

Následující pasportizační práce spočívají v pořízení fotodokumentace. Zpracování dat a fotodokumentace do závěrečné zprávy pro objednatele spolu s kompletní fotodokumentací předanou na HDD.

2.4. Použité přístroje

Pro fotografickou dokumentaci byl použit digitální fotoaparát SONY Alfa 58. Pro délková měření byly použity standardní délkové nástroje.

© 1995 by John Wiley & Sons, Inc.

3.1. Popis pasportizované oblasti, komunikace

Jedná se o ulici Dobříčská v obci Jinočany, okres Praha-západ. Začátek úseku je v místě křižení ulic Dobříčská a Karlštejská. Konec úseku je v místě křižení ulic Dobříčská a Hornická. Délka pasportizovaného úseku je 150 metrů. Úsek je rozdělen do šesti úseků po 25 metrech.

Ulice: Dobříčská

Úsek: 0-25m

Datum pasportizace: 18.03.2020

Celková délka úseku: 150 m

Popis místnosti, specifikace a zjištěné poruchy:

- mozaikové praskliny v obrusné vrstvě pozemní komunikace
- příčná prasklina, výtluky mozaikové praskliny
- četné praskliny v obrusné vrstvě pozemní komunikace
- vysprávký obrusné vrstvy, chybějící víko uzávěru vody

Poznámka:

Popis fotografií:

- 1) pohled na obrusnou vrstvu pozemní komunikace ulice Karlštejská, mozaikové praskliny
- 2) mozaikové praskliny v obrusné vrstvě pozemní komunikace
- 3) mozaikové praskliny v obrusné vrstvě pozemní komunikace
- 4) mozaikové praskliny v obrusné vrstvě pozemní komunikace
- 5) příčná prasklina, výtluky mozaikové praskliny
- 6) příčná prasklina, výtluky mozaikové praskliny
- 7) příčná prasklina, výtluky mozaikové praskliny
- 8) pohled na obrusnou vrstvu pozemní komunikace ulice Karlštejská
- 9) vysprávký obrusné vrstvy v místě krajnice
- 10) vysprávký obrusné vrstvy v místě krajnice
- 11) četné praskliny v obrusné vrstvě pozemní komunikace
- 12) četné praskliny v obrusné vrstvě pozemní komunikace
- 13) četné praskliny v obrusné vrstvě pozemní komunikace
- 14) četné praskliny v obrusné vrstvě pozemní komunikace
- 15) četné praskliny v obrusné vrstvě pozemní komunikace
- 16) droící se asfaltová vrstva v místě krajnice
- 17) pohled na vjezd do ulice Dobříčská
- 18) pohled na vjezd do ulice Dobříčská
- 19) pohled na vjezd do ulice Dobříčská
- 20) pohled na vjezd do ulice Dobříčská
- 21) pohled na vjezd do ulice Dobříčská
- 22) pohled na vjezd do ulice Dobříčská
- 23) pohled na vjezd do ulice Dobříčská
- 24) pohled na vjezd do ulice Dobříčská
- 25) pohled na vjezd do ulice Dobříčská
- 26) pohled na vjezd do ulice Dobříčská
- 27) vysprávký obrusné vrstvy, chybějící víko uzávěru vody
- 28) pohled na vjezd do ulice Dobříčská
- 29) pohled na vjezd do ulice Dobříčská
- 30) pohled na vjezd do ulice Dobříčská



ZPRÁVA Z PASPORTIZACE

územní plán obce Strašnice, část území, která je v územní působnosti ÚP

Objednatel:

PORR a.s.

Dubečská 3238/36

100 00 Praha 10 - Strašnice



Praha, duben 2020

Mapa a plán obce
Městský úřad Praha 10
Městský úřad Praha 10
Městský úřad Praha 10
Městský úřad Praha 10

Městský úřad Praha 10
Městský úřad Praha 10
Městský úřad Praha 10
Městský úřad Praha 10

Na základě objednávky od společnosti PORR a.s., Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 - Strašnice, jsme provedli pasportizaci obrusné vrstvy ulic Lidická a Pražská, obec Jinočany. Veškeré terénní práce byly dokončeny do 29. dubna 2020.

1.1. Identifikační údaje

ZADÁNÍ:

Dokumentace současného stavu obrusné vrstvy ulic Lidická a Pražská, obec Jinočany.

CÍL PASPORTIZACE:

Zadokumentování současného technického stavu obrusné vrstvy ulic Lidická a Pražská, obec Jinočany. Pořízená fotodokumentace slouží jako podklad pro porovnání případné změny stavu z důvodu stavebních prací.

LOKALITA STAVBY:

ulice Lidická a Pražská, obec Jinočany, okres Praha-západ

OBJEDNATEL:

Společnost PORR a.s., Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 - Strašnice

2. METODIKA PRÁCE

2.1. Účel pasportizace

Pasportizace je prováděna za účelem zadokumentování současného technického stavu obrusné vrstvy ulic Lidická a Pražská, kdy lze předpokládat možné ovlivnění stavebními postupy nebo stavební činností, které jsou nezbytné pro provádění výstavby. Pasportizace je prováděna v časovém předstihu a to tak, aby z fotodokumentace bylo možné vyloučit co nejvíce vedlejších vlivů. Fotodokumentaci je možno použít jako podklad pro sledování chování prostorů v průběhu provádění stavebních prací. Případně se provede tzv. repasportizace a to v případě vyzorovaných změn stavu prostoru v průběhu výstavby, či po dokončení stavebních prací.

2.2. Metodika pasportizace

Pro zahájení pasportizace bylo provedeno místní šetření se zápisem do terénních listů. Proběhla komunikace se zástupci společnosti PORR a.s. a následné pořízení fotodokumentace.

2.3. Pracovní postup pasportizace

Přípravné práce a pořízení potřebných dostupných informací ohledně řešeného území. Prvotní navštívení daného území a prvotní komunikace se zástupci společnosti PORR a.s.

Následující pasportizační práce spočívají v pořízení fotodokumentace. Zpracování dat a fotodokumentace do závěrečné zprávy pro objednatele spolu s kompletní fotodokumentací předanou na HDD.

2.4. Použité přístroje

Pro fotografickou dokumentaci byl použit digitální fotoaparát SONY Alfa 58. Pro délková měření byly použity standardní délkové nástroje.

3.1. Popis pasportizované oblasti, komunikace

Jedná se o ulice Lidická a Pražská v obci Jinočany, okres Praha-západ. Ulice Lidická činí 437 metrů. Začátek úseku se nachází v místě křížení ulic Lidická a Hlavní. Ulice Lidická se pasportizována v celé délce a končí v místě křížení s ulicí Pražská. Ulice Pražská je rozdělena do dvou částí. Začátek části č. 1 se nachází v místě křížení ulic Pražská a Lidická. Konec úseku části č. 1 je v místě křížení s ulicí Hlavní. Začátek části č. 2 se nachází v místě křížení ulic Pražská a Lidická. Konec úseku části č. 2 je v místě křížení s ulicí Hlavní. Pro přehlednost vizte mapu pasportizované oblasti. Délka ulice Pražská je 1 004 metry.

Ulice: Pražská

Úsek: 0 - 99 m

Datum pasportizace: 29.04.2020

Celková délka úseku: 600 m

Popis místnosti, specifikace a zjištěné poruchy:

- praskliny v ohrusné vrstvě pozemní komunikace, odlomení víko uzávěru vody
- četné praskliny a výtlučky v ohrusné vrstvě pozemní komunikace

Poznámka:

Popis fotografií:

- 1) praskliny v ohrusné vrstvě pozemní komunikace, odlomení víko uzávěru vody
- 2) četné praskliny v ohrusné vrstvě pozemní komunikace
- 3) četné praskliny v ohrusné vrstvě pozemní komunikace
- 4) četné praskliny v ohrusné vrstvě pozemní komunikace
- 5) četné praskliny v ohrusné vrstvě pozemní komunikace
- 6) četné praskliny v ohrusné vrstvě pozemní komunikace
- 7) četné praskliny v ohrusné vrstvě pozemní komunikace
- 8) četné praskliny v ohrusné vrstvě pozemní komunikace
- 9) četné praskliny v ohrusné vrstvě pozemní komunikace
- 10) četné praskliny v ohrusné vrstvě pozemní komunikace
- 11) četné praskliny v ohrusné vrstvě pozemní komunikace
- 12) četné praskliny v ohrusné vrstvě pozemní komunikace
- 13) četné praskliny a výtlučky v ohrusné vrstvě pozemní komunikace
- 14) četné praskliny a výtlučky v ohrusné vrstvě pozemní komunikace
- 15) četné praskliny a výtlučky v ohrusné vrstvě pozemní komunikace
- 16) četné praskliny a výtlučky v ohrusné vrstvě pozemní komunikace
- 17) četné praskliny v ohrusné vrstvě pozemní komunikace
- 18) četné praskliny v ohrusné vrstvě pozemní komunikace
- 19) četné praskliny v ohrusné vrstvě pozemní komunikace
- 20) četné praskliny v ohrusné vrstvě pozemní komunikace
- 21) četné praskliny v ohrusné vrstvě pozemní komunikace
- 22) četné praskliny v ohrusné vrstvě pozemní komunikace
- 23) četné praskliny v ohrusné vrstvě pozemní komunikace
- 24) četné praskliny v ohrusné vrstvě pozemní komunikace
- 25) četné praskliny v ohrusné vrstvě pozemní komunikace
- 26) pohled na ohrusnou vrstvu pozemní komunikace
- 27) pohled na ohrusnou vrstvu pozemní komunikace
- 28) pohled na ohrusnou vrstvu pozemní komunikace
- 29) pohled na ohrusnou vrstvu pozemní komunikace
- 30) pohled na ohrusnou vrstvu pozemní komunikace
- 31) pohled na ohrusnou vrstvu pozemní komunikace
- 32) pohled na ohrusnou vrstvu pozemní komunikace






ZPRÁVA Z REPASPORTIZACE

(dle přílohy 3a, 3b, 3c, 3d, 3e, 3f, 3g, 3h, 3i, 3j, 3k, 3l, 3m, 3n, 3o, 3p, 3q, 3r, 3s, 3t, 3u, 3v, 3w, 3x, 3y, 3z, 3aa, 3ab, 3ac, 3ad, 3ae, 3af, 3ag, 3ah, 3ai, 3aj, 3ak, 3al, 3am, 3an, 3ao, 3ap, 3aq, 3ar, 3as, 3at, 3au, 3av, 3aw, 3ax, 3ay, 3az, 3ba, 3bb, 3bc, 3bd, 3be, 3bf, 3bg, 3bh, 3bi, 3bj, 3bk, 3bl, 3bm, 3bn, 3bo, 3bp, 3bq, 3br, 3bs, 3bt, 3bu, 3bv, 3bw, 3bx, 3by, 3bz, 3ca, 3cb, 3cc, 3cd, 3ce, 3cf, 3cg, 3ch, 3ci, 3cj, 3ck, 3cl, 3cm, 3cn, 3co, 3cp, 3cq, 3cr, 3cs, 3ct, 3cu, 3cv, 3cw, 3cx, 3cy, 3cz, 3da, 3db, 3dc, 3dd, 3de, 3df, 3dg, 3dh, 3di, 3dj, 3dk, 3dl, 3dm, 3dn, 3do, 3dp, 3dq, 3dr, 3ds, 3dt, 3du, 3dv, 3dw, 3dx, 3dy, 3dz, 3ea, 3eb, 3ec, 3ed, 3ee, 3ef, 3eg, 3eh, 3ei, 3ej, 3ek, 3el, 3em, 3en, 3eo, 3ep, 3eq, 3er, 3es, 3et, 3eu, 3ev, 3ew, 3ex, 3ey, 3ez, 3fa, 3fb, 3fc, 3fd, 3fe, 3ff, 3fg, 3fh, 3fi, 3fj, 3fk, 3fl, 3fm, 3fn, 3fo, 3fp, 3fq, 3fr, 3fs, 3ft, 3fu, 3fv, 3fw, 3fx, 3fy, 3fz, 3ga, 3gb, 3gc, 3gd, 3ge, 3gf, 3gg, 3gh, 3gi, 3gj, 3gk, 3gl, 3gm, 3gn, 3go, 3gp, 3gq, 3gr, 3gs, 3gt, 3gu, 3gv, 3gw, 3gx, 3gy, 3gz, 3ha, 3hb, 3hc, 3hd, 3he, 3hf, 3hg, 3hh, 3hi, 3hj, 3hk, 3hl, 3hm, 3hn, 3ho, 3hp, 3hq, 3hr, 3hs, 3ht, 3hu, 3hv, 3hw, 3hx, 3hy, 3hz, 3ia, 3ib, 3ic, 3id, 3ie, 3if, 3ig, 3ih, 3ii, 3ij, 3ik, 3il, 3im, 3in, 3io, 3ip, 3iq, 3ir, 3is, 3it, 3iu, 3iv, 3iw, 3ix, 3iy, 3iz, 3ja, 3jb, 3jc, 3jd, 3je, 3jf, 3jg, 3jh, 3ji, 3jj, 3jk, 3jl, 3jm, 3jn, 3jo, 3jp, 3jq, 3jr, 3js, 3jt, 3ju, 3jv, 3jw, 3jx, 3jy, 3jz, 3ka, 3kb, 3kc, 3kd, 3ke, 3kf, 3kg, 3kh, 3ki, 3kj, 3kk, 3kl, 3km, 3kn, 3ko, 3kp, 3kq, 3kr, 3ks, 3kt, 3ku, 3kv, 3kw, 3kx, 3ky, 3kz, 3la, 3lb, 3lc, 3ld, 3le, 3lf, 3lg, 3lh, 3li, 3lj, 3lk, 3ll, 3lm, 3ln, 3lo, 3lp, 3lq, 3lr, 3ls, 3lt, 3lu, 3lv, 3lw, 3lx, 3ly, 3lz, 3ma, 3mb, 3mc, 3md, 3me, 3mf, 3mg, 3mh, 3mi, 3mj, 3mk, 3ml, 3mm, 3mn, 3mo, 3mp, 3mq, 3mr, 3ms, 3mt, 3mu, 3mv, 3mw, 3mx, 3my, 3mz, 3na, 3nb, 3nc, 3nd, 3ne, 3nf, 3ng, 3nh, 3ni, 3nj, 3nk, 3nl, 3nm, 3nn, 3no, 3np, 3nq, 3nr, 3ns, 3nt, 3nu, 3nv, 3nw, 3nx, 3ny, 3nz, 3oa, 3ob, 3oc, 3od, 3oe, 3of, 3og, 3oh, 3oi, 3oj, 3ok, 3ol, 3om, 3on, 3oo, 3op, 3oq, 3or, 3os, 3ot, 3ou, 3ov, 3ow, 3ox, 3oy, 3oz, 3pa, 3pb, 3pc, 3pd, 3pe, 3pf, 3pg, 3ph, 3pi, 3pj, 3pk, 3pl, 3pm, 3pn, 3po, 3pp, 3pq, 3pr, 3ps, 3pt, 3pu, 3pv, 3pw, 3px, 3py, 3pz, 3qa, 3qb, 3qc, 3qd, 3qe, 3qf, 3qg, 3qh, 3qi, 3qj, 3qk, 3ql, 3qm, 3qn, 3qo, 3qp, 3qq, 3qr, 3qs, 3qt, 3qu, 3qv, 3qw, 3qx, 3qy, 3qz, 3ra, 3rb, 3rc, 3rd, 3re, 3rf, 3rg, 3rh, 3ri, 3rj, 3rk, 3rl, 3rm, 3rn, 3ro, 3rp, 3rq, 3rr, 3rs, 3rt, 3ru, 3rv, 3rw, 3rx, 3ry, 3rz, 3sa, 3sb, 3sc, 3sd, 3se, 3sf, 3sg, 3sh, 3si, 3sj, 3sk, 3sl, 3sm, 3sn, 3so, 3sp, 3sq, 3sr, 3ss, 3st, 3su, 3sv, 3sw, 3sx, 3sy, 3sz, 3ta, 3tb, 3tc, 3td, 3te, 3tf, 3tg, 3th, 3ti, 3tj, 3tk, 3tl, 3tm, 3tn, 3to, 3tp, 3tq, 3tr, 3ts, 3tt, 3tu, 3tv, 3tw, 3tx, 3ty, 3tz, 3ua, 3ub, 3uc, 3ud, 3ue, 3uf, 3ug, 3uh, 3ui, 3uj, 3uk, 3ul, 3um, 3un, 3uo, 3up, 3uq, 3ur, 3us, 3ut, 3uu, 3uv, 3uw, 3ux, 3uy, 3uz, 3va, 3vb, 3vc, 3vd, 3ve, 3vf, 3vg, 3vh, 3vi, 3vj, 3vk, 3vl, 3vm, 3vn, 3vo, 3vp, 3vq, 3vr, 3vs, 3vt, 3vu, 3vv, 3vw, 3vx, 3vy, 3vz, 3wa, 3wb, 3wc, 3wd, 3we, 3wf, 3wg, 3wh, 3wi, 3wj, 3wk, 3wl, 3wm, 3wn, 3wo, 3wp, 3wq, 3wr, 3ws, 3wt, 3wu, 3wv, 3ww, 3wx, 3wy, 3wz, 3xa, 3xb, 3xc, 3xd, 3xe, 3xf, 3xg, 3xh, 3xi, 3xj, 3xk, 3xl, 3xm, 3xn, 3xo, 3xp, 3xq, 3xr, 3xs, 3xt, 3xu, 3xv, 3xw, 3xx, 3xy, 3xz, 3ya, 3yb, 3yc, 3yd, 3ye, 3yf, 3yg, 3yh, 3yi, 3yj, 3yk, 3yl, 3ym, 3yn, 3yo, 3yp, 3yq, 3yr, 3ys, 3yt, 3yu, 3yv, 3yw, 3yx, 3yy, 3yz, 3za, 3zb, 3zc, 3zd, 3ze, 3zf, 3zg, 3zh, 3zi, 3zj, 3zk, 3zl, 3zm, 3zn, 3zo, 3zp, 3zq, 3zr, 3zs, 3zt, 3zu, 3zv, 3zw, 3zx, 3zy, 3zz)

Objednatel:

PORR a.s.
Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10 - Strašnice

1

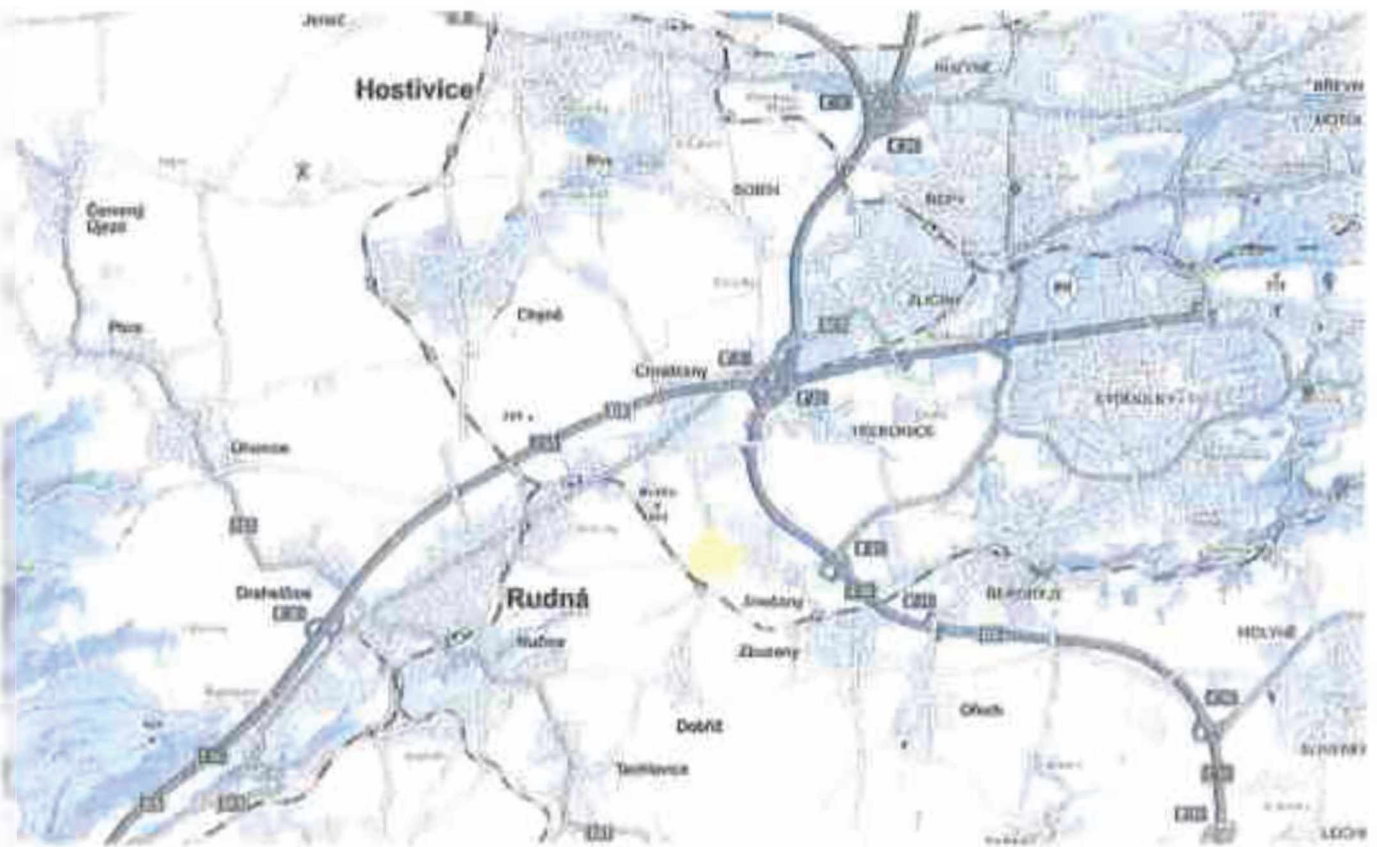

Praha, červenec 2020

Vydání: 1. vydání
Město: Praha
Datum: 2020
Strana: 1 z 1

Podpis: [Podpis]
Město: Praha
Datum: 2020
Strana: 1 z 1

1. ÚVOD

Na základě objednávky od společnosti PORR a.s., Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 - Strašnice, jsme provedli repasportizaci obrusné vrstvy ulice Dobříčská, obec Jinočany. Veškeré terénní práce byly dokončeny do 08. července 2020.

1.1. Identifikační údaje

ZADÁNÍ:

Dokumentace současného stavu obrusné vrstvy ulice Dobříčská, obec Jinočany.

CÍL REPASPORTIZACE:

Zadokumentování současného technického stavu obrusné vrstvy ulice Dobříčská, obec Jinočany. Pořízená fotodokumentace slouží jako podklad pro porovnání případné změny stavu z důvodu stavebních prací.

LOKALITA STAVBY:

ulice Dobříčská, obec Jinočany, okres Praha-západ

OBJEDNATEL:

Společnost PORR a.s., Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 - Strašnice

2. METODIKA PRACÍ

2.1. Účel repasportizace

Repasportizace je prováděna za účelem zadokumentování současného technického stavu obrusné vrstvy ulice Dobříčská, kdy lze předpokládat možné ovlivnění stavebními postupy nebo stavební činností, které jsou nezbytné pro provádění výstavby. Repasportizace je prováděna tak, aby z fotodokumentace bylo možné vyloučit co nejvíce vedlejších vlivů. Fotodokumentaci je možno použít jako podklad pro sledování chování prostorů v průběhu provádění stavebních prací.

2.2. Metodika repasportizace

Pro zahájení repasportizace bylo provedeno místní šetření se zápisem do terénních listů. Proběhla komunikace se zástupci společnosti PORR a.s. a následné pořízení fotodokumentace.

2.3. Pracovní postup repasportizace

Přípravné práce a pořízení potřebných dostupných informací ohledně řešeného území. Prvotní navštívení daného území a prvotní komunikace se zástupci společnosti PORR a.s.

Následující repasportizační práce spočívají v pořízení fotodokumentace. Zpracování dat a fotodokumentace do závěrečné zprávy pro objednatele spolu s kompletní fotodokumentací předanou na HDD.

2.4. Použité přístroje

Pro fotografickou dokumentaci byl použit digitální fotoaparát SONY Alfa 58. Pro délková měření byly použity standardní délkové nástroje.

3.1. Popis repasportizované oblasti, komunikace

Jedná se o ulice Dobříčská v obci Jinočany, okres Praha-západ. Začátek úseku je v místě křížení ulic Dobříčská a Karlštejská. Konec úseku je v místě křížení ulic Dobříčská a Hornická. Délka repasportizovaného úseku je 150 metrů. Úsek je rozdělen do šesti úseků po 25 metrech.

Ulice: Dobříčská
Úsek: 0 25

Datum repasportizace: 08.07.2020
Celková délka úseku: 150 m

Popis místnosti, specifikace a zjištěné poruchy:

- vysprávký v obrušné vrstvě pozemní komunikace

Poznámka:

Popis fotografií:

- 1) pohled na obrušnou vrstvu pozemní komunikace ulice Karlštejnská
- 2) pohled na obrušnou vrstvu pozemní komunikace ulice Karlštejnská
- 3) pohled na obrušnou vrstvu pozemní komunikace ulice Karlštejnská
- 4) pohled na obrušnou vrstvu pozemní komunikace ulice Karlštejnská
- 5) pohled na obrušnou vrstvu pozemní komunikace ulice Karlštejnská
- 6) pohled na obrušnou vrstvu pozemní komunikace ulice Karlštejnská
- 7) pohled na obrušnou vrstvu pozemní komunikace ulice Dobříčská
- 8) vysprávký v obrušné vrstvě pozemní komunikace
- 9) vysprávký v obrušné vrstvě pozemní komunikace
- 10) pohled na obrušnou vrstvu pozemní komunikace ulice Dobříčská
- 11) pohled na obrušnou vrstvu pozemní komunikace ulice Dobříčská
- 12) pohled na obrušnou vrstvu pozemní komunikace ulice Dobříčská
- 13) pohled na obrušnou vrstvu pozemní komunikace ulice Dobříčská
- 14) pohled na obrušnou vrstvu pozemní komunikace ulice Dobříčská
- 15) pohled na obrušnou vrstvu pozemní komunikace ulice Dobříčská
- 16) pohled na obrušnou vrstvu pozemní komunikace ulice Dobříčská



ZPRÁVA Z REKAPORTIZACE

objektu: Úprava a rekaportizace kanalizačního systému v ulici Dubečská v Praze

Objednatel :

PORR a.s.

Dubečská 3238/36

100 00 Praha 10 - Strašnice

1



Praha, červenec 2020

Seznam příloh
Příloha 1: Úvodní list
Příloha 2: Úvodní list
Příloha 3: Úvodní list
Příloha 4: Úvodní list

Seznam příloh
Příloha 1: Úvodní list
Příloha 2: Úvodní list
Příloha 3: Úvodní list
Příloha 4: Úvodní list

Na základě objednávky od společnosti PORR a.s., Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 - Strašnice, jsme provedli repasportizaci ohrusné vrstvy ulic Lidická a Pražská, obec Jinočany. Veškeré terénní práce byly dokončeny do 08. července 2020.

1.1. Identifikační údaje

ZADÁNÍ:

Dokumentace současného stavu ohrusné vrstvy ulic Lidická a Pražská, obec Jinočany.

CÍL REPASPORTIZACE:

Zadokumentování současného technického stavu ohrusné vrstvy ulic Lidická a Pražská, obec Jinočany. Pořízená fotodokumentace slouží jako podklad pro porovnání případné změny stavu z důvodu stavebních prací.

LOKALITA STAVBY:

ulice Lidická a Pražská, obec Jinočany, okres Praha-západ

OBJEDNATEL:

Společnost PORR a.s., Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 - Strašnice

2. METODIKA PRÁCE

2.1. Účel repasportizace

Repasportizace je prováděna za účelem zadokumentování současného technického stavu ohrusné vrstvy ulic Lidická a Pražská, kdy lze předpokládat možné ovlivnění stavebními postupy nebo stavební činností, které jsou nezbytné pro provádění výstavby. Repasportizace je prováděna tak, aby z fotodokumentace bylo možné vyloučit co nejvíce vedlejších vlivů. Fotodokumentaci je možno použít jako podklad pro sledování chování prostorů v průběhu provádění stavebních prací.

2.2. Metodika repasportizace

Pro zahájení repasportizace bylo provedeno místní šetření se zápisem do terénních listů. Proběhla komunikace se zástupci společnosti PORR a.s. a následné pořízení fotodokumentace.

2.3. Pracovní postup repasportizace

Přípravné práce a pořízení potřebných dostupných informací ohledně řešeného území. Prvotní navštívení daného území a prvotní komunikace se zástupci společnosti PORR a.s.

Následující pasportizační práce spočívají v pořízení fotodokumentace. Zpracování dat a fotodokumentace do závěrečné zprávy pro objednatele spolu s kompletní fotodokumentací předanou na HDD.

2.4. Použité přístroje

Pro fotografickou dokumentaci byl použit digitální fotoaparát SONY Alfa 58. Pro délková měření byly použity standardní délkové nástroje.

3.1. Popis repasportizované oblasti, komunikace

Jedná se o ulice Lidická a Pražská v obci Jinočany, okres Praha-západ. Ulice Lidická činí 437 metrů. Začátek úseku se nachází v místě křížení ulic Lidická a Hlavní. Ulice Lidická se repasportizována v celé délce a končí v místě křížení s ulicí Pražská. Ulice Pražská je rozdělena do dvou částí. Začátek části č.1 se nachází v místě křížení ulic Pražská a Lidická. Konec úseku části č.1 je v místě křížení s ulicí Hlavní. Začátek části č.2 se nachází v místě křížení ulic Pražská a Lidická. Konec úseku části č.2 je v místě křížení s ulicí Hlavní. Pro přehlednost vizte mapu repasportizované oblasti. Délka ulice Pražská je 1 004 metry.

Ulice: Pražská
Úsek: 0 - 99

Datum repasportizace: 08.07.2020
Celková délka úseku: 600 m

Popis místnosti, specifikace a zjištěné poruchy:

- vysprávký v obrušné vrstvě pozemní komunikace
- síťové praskliny v obrušné vrstvě pozemní komunikace

Poznámka:

Popis fotografií:

- 1) pohled na obrušnou vrstvu pozemní komunikace
- 2) pohled na obrušnou vrstvu pozemní komunikace
- 3) pohled na obrušnou vrstvu pozemní komunikace
- 4) vysprávký v obrušné vrstvě pozemní komunikace
- 5) pohled na obrušnou vrstvu pozemní komunikace
- 6) pohled na obrušnou vrstvu pozemní komunikace
- 7) síťové praskliny v obrušné vrstvě pozemní komunikace
- 8) pohled na obrušnou vrstvu pozemní komunikace
- 9) pohled na obrušnou vrstvu pozemní komunikace
- 10) pohled na obrušnou vrstvu pozemní komunikace
- 11) pohled na obrušnou vrstvu pozemní komunikace
- 12) pohled na obrušnou vrstvu pozemní komunikace
- 13) pohled na obrušnou vrstvu pozemní komunikace
- 14) pohled na obrušnou vrstvu pozemní komunikace
- 15) pohled na obrušnou vrstvu pozemní komunikace
- 16) pohled na obrušnou vrstvu pozemní komunikace
- 17) pohled na obrušnou vrstvu pozemní komunikace
- 18) pohled na obrušnou vrstvu pozemní komunikace
- 19) pohled na obrušnou vrstvu pozemní komunikace
- 20) pohled na obrušnou vrstvu pozemní komunikace
- 21) pohled na obrušnou vrstvu pozemní komunikace
- 22) pohled na obrušnou vrstvu pozemní komunikace
- 23) pohled na obrušnou vrstvu pozemní komunikace
- 24) pohled na obrušnou vrstvu pozemní komunikace



Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, p. o.
Pavel Špaček
Zborovská 81/11
150 00 Praha 5 – Smíchov

Čj : ST 201.02/2020
V Praze : 23. listopadu 2020
Vyřizuje: Ing. Martin Vavřena

tel.:
e-mail:

Věc: III/00516, III/00512 a III/0057 Jinočany, oprava silnic

Sdělení č. 2
Vyjádření TDI k ZBV SO102/3 – VDZ v plastu, oprava povrchů vozovek na objízdných tras

Na základě požadavku Správce komunikace je nutno definitivní vodorovné značení z důvodu vyšší životnosti provést v plastu. V zadávací dokumentaci je VDZ pouze v barvě, které bylo provedeno následně po pokládce obrusných, před uvedením komunikací do předčasného užívání.

Na základě požadavku Obce Jinočany bylo nutno zachovat dopravní obslužnost na stávajících linkách MHD. V PD ZDS bylo navržena oprava komunikací za celkové uzávěry. Z tohoto důvodu, byla před zahájením stavebních prací provedena pasportizace objízdných tras a po ukončení stavebních prací repasportizace objízdných tras. Na základě výsledků z repasportizace objízdných tras bylo konstatováno, že došlo k poškození MK vlivem provozu.

Vzhledem poškození místních komunikací v intravilánu obce Jinočany způsobené převedením dopravy jako objízdné trasy pro BUS MHD a místní dopravu, je nutno provést opravu objízdných tras položením obrusné vrstvy ACO11+ v tl. 40mm a provést lokální opravy v podkladní vrstvě.

Za TDI souhlasím se změnami řešenými ZBV pro SO102/3. Tyto změny vedou ke zvýšení kvality celého díla. TDI současně souhlasí se související úpravou výměr dotčených položek v soupisu prací a tím se změnou ceny díla.

S pozdravem

Ing. Martin Vavřena

Vedoucí TDS

Evidenční číslo: 14/2020/KD

Počet stran 5

Počet výtisků

Výtisk číslo

Klasifikace PVP

JINOČANY

Zápis z 14. kontrolního dne a 14. KD KOO BOZP

III/00516, III/00512 a III/0057 Jinočany, oprava silnic

Kontrolní den				
číslo	14.	konaný dne	07. 07. 2020	
Účastníci				
Seznam účastníků je uveden v příloze č. 1 – Prezenční listina				

1. Kontrola úkolů z minulého KD

Úkol číslo	Název	Skutečný stav plnění úkolu	Odpovídá	Splněno
0/1		Při projednání/předkládání/schvalování realizační dokumentace stavby bude Zhotovitel postupovat plně v souladu s SOD, zejména bude Zhotovitelem předkládána informace o cenovém dopadu s propočtem ceny včetně uvedení všech položek soupisu prací, kterých se změna dotýká, s vyčíslením rozdílu objemu položky proti ZDS a případně uvedením položek nových, a formulář „Informace o zařazení do režimu ZBV“ dle postupu Směrnice pro Změny staveb v platném znění.	Zhotovitel	T: kontrola na příštím KD
0/4 10/1	Aktualizace RDS rozdílový soupis prací	Zhotovitel předloží vždy do pátku Týdenní plán práce. Zhotovitel předloží objednateli a TDI aktualizaci PD RDS včetně rozdílového soupisu prací. Výměna rozbahněných vrstev v úseku km 1,270 – 1,120 u hráze rybníka za vrstvu z ŠD 63/125 v tl. 800 mm na vrstvu z geotextilie, včetně odvozu a uložení na skládku (cca 720 m ³) Odstranění stávajících a osazení nových silničních obrub oboustranně komunikace ul. Hlavní v úseku km 0,315 – 0,755 , cca 900 bm (dle dodatku k PD) Zábradlí u propustku v km 1,270 oboustranně a v km 1,085 (vnější oblouk) dle dodatku k PD Přeložka plynu ve vtoku propustku v km 1,085 – zpracována PD Dopsáno na 11.KD: Úkol trvá.	Z Zhotovitel	Průběžně 19.05.2020
11/2	Obrubník	Zhotovitel osadí obrubník v místě UV v křižovatce ulic Karlštejnská x nám. 5. května v km 0,238 84 v délce cca 15 m, od svislé značky P2 Dopsáno na 14.KD: Splněno. Vypouští se.		
13/1	Objízdné trasy	Zhotovitel provede po uvedení stavby do provozu repasportizaci objízdných tras, a provede porovnání s provedenou pasportizací, kterou provedl před zahájením stavebních prací a provede vyhodnocení případného poškození objízdných tras vlivem provozu během provádění prací. AD na základě vyhodnocení provede návrh opravy objízdných tras včetně rozdílového soupisu prací. Dopsáno na 14.KD: Úkol trvá.	Zhotovitel/AD	NT: 15.07.2020

KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC STŘEDOČESKÉHO KRAJE P.O.	ZÁPIS Z 14. KONTROLNÍHO DNE A 14. KD KOO BOZP	
EVIDENČNÍ ČÍSLO 14/2020/KD	DOKUMENTACE STAVBY MR KLASIFIKACE: PRO VNITŘNÍ POTŘEBU	JINOČANY STRANA: 1/5

2. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby

plnění věcného
harmonogramu
popis provedených
prací

Práce pokračují v souladu s odevzdaným aktualizovaným HMG

V období od 23.06.2020 do 07.07.2020 byly provedeny práce:

SO102

- provedení VDZ v již hotovém úseku
- osazení sloupků zábradlí
- profíznutí a zalití spár
- vybudování posunutých zastávek BUS pro další etapu
- úklid staveniště
- dne 23.6. zahájení nové etapy – km 0,300 – 0,235
- frézování stávajícího krytu
- odstranění stávajících podkladních vrstev komunikace
- pokládka vrstvy SC 8/10 v tl. 120 mm v km 0,300 – 0,235
- pokládka štěrbinového žlabu v dl. 35 m
- pokládka živých vrstev ACP, ACL v km 0,300 – 0,235
- osazení silničních obrub v zatáčce do ul. 5. Května – 19 m

Viz zpráva Zhotovitele o postupu prací

finanční plnění

Za měsíc červen je prostavěno 2 496 967,00 Kč bez DPH. Celkem je fakturováno 40 980 130,06 Kč bez DPH, tj. 95,78 % z celkové ceny za dílo.

fotodokumentace

Zhotovitel i TDI pořizují průběžně fotodokumentaci stavby.



SO 102 – km 0,235-0,300

000

3. Kontrola kvality

a) zpráva o hodnocení
kvality za uplynulé období

Stavební práce probíhají bez připomínek.

b) Podzhotovitelé

K dnešnímu dni jsou odsouhlaseni následující podzhotovitelé a dodavatelé:
Dle SOD

c) Výrobky/materiály/směsi

K dnešnímu dni jsou odsouhlaseny následující výrobky/materiály/směsi:
Dle SOD

KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC
STŘEDOČESKÉHO KRAJE P.O.

ZÁPIS Z 14. KONTROLNÍHO DNE A 14. KD KOO BOZP

EVIDENČNÍ ČÍSLO
14/2020/KD

DOKUMENTACE STAVBY MR
KLASIFIKACE: PRO VNITŘNÍ POTŘEBU

JINOČANY
STRANA: 2/5

d) TePř/KZP	K dnešnímu dni jsou odsouhlaseny tyto TePř: <i>TePř 01 Frézování, sanace podloží, pokládka asfaltových hutněných vrstev</i>
e) BOZP	Zhotovitel bude posílat digitálně koncepty TePř také koordinátorovi BOZP.

4. Stav BOZP a PO

Zároveň s kontrolním dnem stavby proběhl také 14. kontrolní den BOZP.

A. ZPRÁVA KOORDINÁTORA BOZP ke dni 07.07.2020

Všeobecné – zjištění, náměty, návrhy opatření

- je nutné bezprostředně zajistit zákaz vstupu na staveniště nepovolaných osob
- při vstupu na staveniště podzhotovitelů resp. pracovníků jiných firem nutno zajistit písemné seznámení s riziky stavby a staveniště
- oznámení nových podzhotovitelů nutno zasílat KOO BOZP minimálně 8 dnů před nástupem
- základní ochranné prostředky pracovníků nutno používat a platí i pro podzhotovitele
- zhotovitel zpracuje jednoduchý plán staveniště s vyznačením dopravních cest, skládky materiálů a mezideponii
- viditelně bude vyvěšeno oznámení o zahájení prací OIP – předáno zhotoviteli

B. Zpráva zhotovitele k BOZP – bez připomínek

C. 1) Plán práce na další období :

- týdenní plány práce budou zasílány TDI a v kopii KOO BOZP průběžně
- práce dle P5 NV 136/2016 Sb. zhotovitel nepředpokládá provádění

2) Úkoly z předchozích KD KOO BOZP :

- 00/01 Zpracované TePř na stavební práce, budou obsahovat část BOZP a podléhají schválení KOO BOZP a TDI
- 00/02 OZO zhotovitele zpracuje plán interních kontrol BOZP na stavbě. Plán zašle elektronicky KOO BOZP. Zápis z kontrol zašle též elektronicky KOO BOZP.
- 00/03 Zhotovitel zajistí pravidelné kontroly zabezpečení staveniště a označení tabulkami a značkami.

3) Úkoly trvalé:

- zajistit a trvale kontrolovat oplocení staveniště s výstražnými tabulkami
- trvale provádět kontrolu dopravního značení vyplývajících z DIO
- kontrolní dny KOO BOZP budou prováděny jedenkrát měsíčně dle plánu KD BOZP

Ze strany KOO BOZP je nutno zhotovit ochranné zábradlí na pomocné konstrukci pod konzolou mostu a zabezpečit staveniště trvalým oplocením.

KOO BOZP seznámil - informoval zhotovitele s aktuálními zdravotními a bezpečnostními riziky na staveništi pro nadcházející stavební období.

Nejvýznamnější riziko - je možný střet s veřejnou dopravou; nebezpečí střetu se stroji, vozidly – viz aktuální DIO (dbát zvýšené opatrnosti při výjezdu a nájezdu do SDP + příjezdových komunikacích ke staveništi a mezideponii, řádně vyznačit vjezdy a výjezdy ze stavby, dodržovat bezpečné vzdálenosti). .

5. Různé

Stavební deníky budou vedené v listinné podobě. Bude veden jeden stavební deník. Stavební deník bude uložen v buňce na zařízení staveniště a v průběhu pracovní doby bude zajištěna jeho dostupnost.

Zhotovitel bude informovat NDIC o aktuálním stavu a změnách uzavírek.

KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC STŘEDOČESKÉHO KRAJE P.O.	ZÁPIS Z 14. KONTROLNÍHO DNE A 14. KD KOO BOZP	
EVIDENČNÍ ČÍSLO 14/2020/KD	DOKUMENTACE STAVBY MR	JINOČANY
	KLASIFIKACE: PRO VNITŘNÍ POTŘEBU	STRANA: 3/5

6. Nové úkoly				
Úkol číslo	Název	Obsah úkolu a požadovaný cílový stav	Odpovídá	Termín
14.1		Dne 15.7. bude provedeno VDZ a následně bude odstraněno DIO.		

7. Závěry z kontrolního dne

Datum konání příštího KD Příští kontrolní den stavby se bude konat dle potřeby objednatele nebo zhotovitele

Zapsal Ing. Martin Vavřena
Jméno

Podpis

Přílohy

Číslo	Název
1	Prezenční listina

Rozdělovník

Vyhotoveno v 1 výtisku – rozesláno účastníkům dle prezenční listiny elektronicky ve formátu PDF. Originál je uložen na TDS.

Vyhotoveno ve 5 výtiscích, každý o 5 stranách.

Výtisk číslo	Adresát	Datum	Podpis
1	Krajská správa a údržba silnic Stř. kraje, p. o.		
2	PORR. a.s.		
3	SILNICE GROUP, a.s.		
4	Stalor spol. s r.o.		
5	Pro spis		

KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC STŘEDOČESKÉHO KRAJE P. O.	ZÁPIS Z 14. KONTROLNÍHO DNE A 14. KD KOO BOZP	
EVIDENČNÍ ČÍSLO	DOKUMENTACE STAVBY MR	JINOČANY
14/2020/KD	KLASIFIKACE: PRO VNITŘNÍ POTŘEBU	STRANA: 4/5

číslo 14. konaný dne 07.07.2020

Jméno, příjmení, titul	Organizace, funkce	Telefon, e-mail	Podpis
Pavel Špaček	KSUS SK Zástupce objednatele		
Martin Vavřena Ing.	TDI		
Jan Turínek	PORR a.s.		
Petr Martínek, Ing.	SILNICE GROUP a.s.		
Petr Hlaváček	FORUM CZ		
Petr Hlaváček	FORUM CZ		
Jiří Benet	FORUM CZ		

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby: III/00516, III/00516a III/0057 Jinočany, oprava silnic, 7-0715A19 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): III/00512 - km - 0,000 - 1,127	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 101 /1	Číslo ZBV: 5
--	--	------------------------

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001

Zhotovitel: Společnost Jinočany, PORR - SILNICE GROUP
Správce společnosti
PORR a.s. Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10, IČ:
Společník
SILNICE GROUP a.s. Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 62242105

Rekapitulace ZBV č. 5 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5.3	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5.4	0,00	144 372,00	144 372,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5	0,00	144 372,00	144 372,00

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: III/00516, III/00516a III/0057 Jinočany, oprava silnic, 7-0715A19 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): III/00512 - km - 0,000 - 1,127	Číslo SO/PS / Číslo Změny SO/PS 101 / 1	Číslo ZBV 5
--	---	----------------

Strany smlouvy o dílo č. 2370/00066001/2019 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 03.06.2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovské 61/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: Společnost Jinočany, PORR - SILNICE GROUP

Přílohy Změnového listu:				Paré č	Příjemce
1	Krycí list	1	počet listů	1	Objednatel
2	Změnový list	1	počet listů	2, 3	Zhotovitel
3	Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů	4	Projektant
4	Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů	5	TDI
5	Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů		
6	Přehled dalších dokladů	1	počet listů		
	Další doklady	5	počet listů		

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Na základě požadavku správce silnice ze dne 8.10. 2020 (doklad č. 09) bylo provedeno VDZ v plastu. Jedná se o provedení definitivního VDZ, které nahrazuje původní VDZ provedené barvou po jeho obnově do původního stavu při jednotlivých stavebních etapách. Změna se týká položek: 113, 114 a 115.

Tyto změny byly odsouhlaseny ve Vyjádření TDI ze dne 30.9.2020 (doklad č. 08)

Jedná se o Změny nezbytné k dokončení díla, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jsou podle § 5, odst. 1, písm.d), resp. podle § 11 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29.5.2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazených do Skupiny 4

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. dle § 222 odst. (5) se jedná o nezbytnou změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Údaje v Kč bez DPH

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
0,00	144 372,00	144 372,00	144 372,00

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí)	Jméno	Jen Turinek	datum	11-12-2020	podpis
Projektant (autorský dozor)	Jméno	Ing. Pavlína Nykodémová	datum	11-12-2020	podpis
Technický dozor investora	Jméno	Ing. Martin Vavřina	datum		podpis
Zástupce Objednatel:	Jméno	Karel Motál	datum		podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13 z Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitel sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy					
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel)	Jméno	Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA	datum		podpis
Zhotovitel	Jméno	Ing. Pavel Hirsch	datum	11-12-2020	podpis
	Jméno	Ing. Karel Rypí	datum		podpis
				Číslo paré:	5

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 3

Název Stavby: III/00516, III/00516a III/0057 Jinočany, oprava silnic	
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 101 / 1	
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): III/0087 - km 0,000 - 0,491	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
10 103 004,81

Poznámka:

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-)

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	10 103 004,81	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	144 372,00	144 372,00	1,43%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	0,00	10 247 376,81	144 372,00	1,43%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): Jan Turínek

Projektant (autorský dozor): Ing. Pavlína Nykodémová

Stavební dozor: Ing. Martin Vavřena

Zástupce Objednatele: Karel Motal

Zaměstnanec KSÚS SK
odpovědný za cenové
projednání Změny:

Petr Heinrich

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 5

Evidenční číslo a název stavby:

IM/00516, IM/00516a IM/0057 kmočany, oprava silnic

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

Číslo a název SO/PS: SO 101 - IM/00512 - km - 0,000 - 1,127

101/1

Číslo a název rozpočtu: SO 101 - IM/00512 - km - 0,000 - 1,127

Skupina Změn: 4

Por. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny zapomén v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Nové položky													
114	915211112	Vodotěsné dopravní zařízení: dílci betonové tloušťky 1125 mm s výztuží z oceli, bílý písek	m ²	0,000	2 260,000	2 260,000	36,40	0,00	0,00	87 764,00	87 764,00	87 764,00	100,00
115	915211122	Vodotěsné dopravní zařízení: dílci betonové tloušťky 1125 mm s výztuží z oceli, bílý písek	m ²	0,000	105,000	105,000	83,60	0,00	0,00	1 428,00	1 428,00	1 428,00	100,00
115	915211113	Vodotěsné dopravní zařízení: dílci betonové tloušťky 1125 mm s výztuží z oceli, bílý písek	m ²	0,000	185,000	185,000	338,00	0,00	0,00	60 680,00	60 680,00	60 680,00	100,00
CELKOVÝ								0,00	0,00	149 672,00	149 672,00	149 672,00	

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	5
Název a evidenční číslo stavby:	III/00516, III/00516a III/0057 Jinočany, oprava silnic, 7-0715A19
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	III/00512 - km - 0,000 - 1,127
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	101 / 1

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
07 Změnový soupis prací SO 101 po změně 1	2	
08 Vyjádření TDI k ZBV 5	1	
09 Žádost zhotovitele o změnu	1	
09 Pokyn objednatele k realizaci stavebních prací a zpracování ZBV	1	
Počet listů celkem	5	

Změnový soupis prací SO 101 po změně 1 - pro ZBV číslo: 5

Evidenční číslo a název stavby:

M/00516, M/00516a M/0057 Jinočany, oprava silnic, 7-0715A192

Číslo a název SO/PS: SO 101 - M/00512 - km - 0,000 - 1,127

Číslo a název rozpočtu: SO 101 - M/00512 - km - 0,000 - 1,127

ZMĚNOVÝ SOUPIS PRACÍ (SO/PS)

101/1

Por. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1310011	Rozebrání dílů betonových ze zpevněné dlažby chodní v křižovatce na křižovatce	m ²	40 500	0,000	0,000	26,59	1 069,47	0,00	0,00	1 069,47	0,00	0,00
2	1310022	Odstavení podkladu z kamenného dlažby 100 mm tloušťky a 200 mm	m ²	2 706,000	2 706,000	0,000	34,47	93 070,82	0,00	0,00	93 070,82	0,00	0,00
3	1310033	Odstavení podkladu z kamenného dlažby 100 mm tloušťky a 200 mm	m ²	2 706,000	2 706,000	0,000	50,83	137 666,38	0,00	0,00	137 666,38	0,00	0,00
4	1310044	Odstavení podkladu z kamenného dlažby 100 mm tloušťky a 200 mm	m ²	40 500	40 500	0,000	45,89	1 859,67	0,00	0,00	1 859,67	0,00	0,00
5	1310055	Odstavení podkladu z kamenného dlažby 100 mm tloušťky a 200 mm	m ²	2 706,000	2 706,000	0,000	56,32	152 555,02	0,00	0,00	152 555,02	0,00	0,00
6	1310066	Odstavení podkladu z kamenného dlažby 100 mm tloušťky a 200 mm	m ²	2 706,000	2 706,000	0,000	15,72	42 540,22	0,00	0,00	42 540,22	0,00	0,00
7	1310077	Odstavení podkladu z kamenného dlažby 100 mm tloušťky a 200 mm	m ²	40 500	40 500	0,000	230,42	9 332,17	0,00	0,00	9 332,17	0,00	0,00
8	1310088	Odstavení podkladu z kamenného dlažby 100 mm tloušťky a 200 mm	m ²	2 706,000	2 706,000	0,000	235,89	637 646,31	0,00	0,00	637 646,31	0,00	0,00
9	1310099	Odstavení podkladu z kamenného dlažby 100 mm tloušťky a 200 mm	m ²	2 706,000	2 706,000	0,000	415,23	1 122 041,96	0,00	0,00	1 122 041,96	0,00	0,00
10	1310100	Odstavení podkladu z kamenného dlažby 100 mm tloušťky a 200 mm	m ²	2 706,000	2 706,000	0,000	478,58	1 292 747,48	0,00	0,00	1 292 747,48	0,00	0,00
11	1310111	Odstavení podkladu z kamenného dlažby 100 mm tloušťky a 200 mm	m ²	2 706,000	2 706,000	0,000	185,46	500 111,71	0,00	0,00	500 111,71	0,00	0,00
12	1310122	Odstavení podkladu z kamenného dlažby 100 mm tloušťky a 200 mm	m ²	2 706,000	2 706,000	0,000	43 725,83	1 182 725,83	0,00	0,00	1 182 725,83	0,00	0,00
13	1310133	Odstavení podkladu z kamenného dlažby 100 mm tloušťky a 200 mm	m ²	2 706,000	2 706,000	0,000	28,08	76 100,30	0,00	0,00	76 100,30	0,00	0,00
14	1310144	Odstavení podkladu z kamenného dlažby 100 mm tloušťky a 200 mm	m ²	2 706,000	2 706,000	0,000	11,72	31 671,10	0,00	0,00	31 671,10	0,00	0,00
15	1310155	Odstavení podkladu z kamenného dlažby 100 mm tloušťky a 200 mm	m ²	2 706,000	2 706,000	0,000	13,17	35 680,19	0,00	0,00	35 680,19	0,00	0,00
16	1310166	Odstavení podkladu z kamenného dlažby 100 mm tloušťky a 200 mm	m ²	2 706,000	2 706,000	0,000	238,11	643 475,10	0,00	0,00	643 475,10	0,00	0,00
17	1310177	Odstavení podkladu z kamenného dlažby 100 mm tloušťky a 200 mm	m ²	2 706,000	2 706,000	0,000	342,15	926 314,63	0,00	0,00	926 314,63	0,00	0,00
18	1310188	Odstavení podkladu z kamenného dlažby 100 mm tloušťky a 200 mm	m ²	40 500	40 500	0,000	147,67	5 980 915,57	0,00	0,00	5 980 915,57	0,00	0,00
19	1310199	Odstavení podkladu z kamenného dlažby 100 mm tloušťky a 200 mm	m ²	2 706,000	2 706,000	0,000	2 128,94	5 761 274,94	0,00	0,00	5 761 274,94	0,00	0,00
20	1310200	Odstavení podkladu z kamenného dlažby 100 mm tloušťky a 200 mm	m ²	3 000	3 000	0,000	3 412,98	10 238,94	0,00	0,00	10 238,94	0,00	0,00
21	1310211	Odstavení podkladu z kamenného dlažby 100 mm tloušťky a 200 mm	m ²	2 706,000	2 706,000	0,000	439,87	1 190 724,94	0,00	0,00	1 190 724,94	0,00	0,00
22	1310222	Odstavení podkladu z kamenného dlažby 100 mm tloušťky a 200 mm	m ²	2 706,000	2 706,000	0,000	12,00	33 078,00	0,00	0,00	33 078,00	0,00	0,00
23	1310233	Odstavení podkladu z kamenného dlažby 100 mm tloušťky a 200 mm	m ²	105 000	105 000	0,000	13,08	1 373 400,00	0,00	0,00	1 373 400,00	0,00	0,00
24	1310244	Odstavení podkladu z kamenného dlažby 100 mm tloušťky a 200 mm	m ²	2 706,000	2 706,000	0,000	125,10	338 570,00	0,00	0,00	338 570,00	0,00	0,00
25	1310255	Odstavení podkladu z kamenného dlažby 100 mm tloušťky a 200 mm	m ²	75 000	75 000	0,000	166,72	12 504,00	0,00	0,00	12 504,00	0,00	0,00
26	1310266	Odstavení podkladu z kamenného dlažby 100 mm tloušťky a 200 mm	m ²	2 706,000	2 706,000	0,000	3,92	10 628,00	0,00	0,00	10 628,00	0,00	0,00
27	1310277	Odstavení podkladu z kamenného dlažby 100 mm tloušťky a 200 mm	m ²	185 000	185 000	0,000	6,04	1 117,40	0,00	0,00	1 117,40	0,00	0,00
28	1310288	Odstavení podkladu z kamenného dlažby 100 mm tloušťky a 200 mm	m ²	205 000	205 000	0,000	343,62	70 442,10	0,00	0,00	70 442,10	0,00	0,00
29	1310299	Odstavení podkladu z kamenného dlažby 100 mm tloušťky a 200 mm	m ²	205 000	205 000	0,000	346,53	70 938,65	0,00	0,00	70 938,65	0,00	0,00
30	1310300	Odstavení podkladu z kamenného dlažby 100 mm tloušťky a 200 mm	m ²	2 706,000	2 706,000	0,000	334,77	905 079,31	0,00	0,00	905 079,31	0,00	0,00
31	1310311	Odstavení podkladu z kamenného dlažby 100 mm tloušťky a 200 mm	m ²	136 000	136 000	0,000	66,44	9 026,32	0,00	0,00	9 026,32	0,00	0,00
32	1310322	Odstavení podkladu z kamenného dlažby 100 mm tloušťky a 200 mm	m ²	136 000	136 000	0,000	78,53	10 680,08	0,00	0,00	10 680,08	0,00	0,00
33	1310333	Odstavení podkladu z kamenného dlažby 100 mm tloušťky a 200 mm	m ²	22 500	22 500	0,000	515,85	11 606,63	0,00	0,00	11 606,63	0,00	0,00
34	1310344	Odstavení podkladu z kamenného dlažby 100 mm tloušťky a 200 mm	m ²	50 000	50 000	0,000	2 562,86	1 281 430,00	0,00	0,00	1 281 430,00	0,00	0,00
35	1310355	Odstavení podkladu z kamenného dlažby 100 mm tloušťky a 200 mm	m ²	1 755 000	1 755 000	0,000	72,49	127 219,95	0,00	0,00	127 219,95	0,00	0,00
36	1310366	Odstavení podkladu z kamenného dlažby 100 mm tloušťky a 200 mm	m ²	4 000	4 000	0,000	62,63	250,52	0,00	0,00	250,52	0,00	0,00
37	1310377	Odstavení podkladu z kamenného dlažby 100 mm tloušťky a 200 mm	m ²	1 000	1 000	0,000	271,82	271,82	0,00	0,00	271,82	0,00	0,00
38	1310388	Odstavení podkladu z kamenného dlažby 100 mm tloušťky a 200 mm	m ²	40 500	40 500	0,000	70,66	2 861,93	0,00	0,00	2 861,93	0,00	0,00
39	1310399	Odstavení podkladu z kamenného dlažby 100 mm tloušťky a 200 mm	m ²	3 749,532	3 749,532	0,000	6,04	22 647,54	0,00	0,00	22 647,54	0,00	0,00
40	1310400	Odstavení podkladu z kamenného dlažby 100 mm tloušťky a 200 mm	m ²	3 749,532	3 749,532	0,000	6,04	22 647,54	0,00	0,00	22 647,54	0,00	0,00
41	1310411	Odstavení podkladu z kamenného dlažby 100 mm tloušťky a 200 mm	m ²	3 749,532	3 749,532	0,000	14,84	55 611,88	0,00	0,00	55 611,88	0,00	0,00
42	1310422	Odstavení podkladu z kamenného dlažby 100 mm tloušťky a 200 mm	m ²	3 749,532	3 749,532	0,000	14,84	55 611,88	0,00	0,00	55 611,88	0,00	0,00
43	1310433	Odstavení podkladu z kamenného dlažby 100 mm tloušťky a 200 mm	m ²	3 749,532	3 749,532	0,000	14,84	55 611,88	0,00	0,00	55 611,88	0,00	0,00
44	1310444	Odstavení podkladu z kamenného dlažby 100 mm tloušťky a 200 mm	m ²	3 749,532	3 749,532	0,000	14,84	55 611,88	0,00	0,00	55 611,88	0,00	0,00
45	1310455	Odstavení podkladu z kamenného dlažby 100 mm tloušťky a 200 mm	m ²	3 749,532	3 749,532	0,000	14,84	55 611,88	0,00	0,00	55 611,88	0,00	0,00
46	1310466	Odstavení podkladu z kamenného dlažby 100 mm tloušťky a 200 mm	m ²	3 749,532	3 749,532	0,000	14,84	55 611,88	0,00	0,00	55 611,88	0,00	0,00
47	1310477	Odstavení podkladu z kamenného dlažby 100 mm tloušťky a 200 mm	m ²	3 749,532	3 749,532	0,000	14,84	55 611,88	0,00	0,00	55 611,88	0,00	0,00
48	1310488	Odstavení podkladu z kamenného dlažby 100 mm tloušťky a 200 mm	m ²	3 749,532	3 749,532	0,000	14,84	55 611,88	0,00	0,00	55 611,88	0,00	0,00
49	1310499	Odstavení podkladu z kamenného dlažby 100 mm tloušťky a 200 mm	m ²	3 749,532	3 749,532	0,000	14,84	55 611,88	0,00	0,00	55 611,88	0,00	0,00
50	1310500	Odstavení podkladu z kamenného dlažby 100 mm tloušťky a 200 mm	m ²	3 749,532	3 749,532	0,000	14,84	55 611,88	0,00	0,00	55 611,88	0,00	0,00
51	1310511	Odstavení podkladu z kamenného dlažby 100 mm tloušťky a 200 mm	m ²	3 749,532	3 749,532	0,000	14,84	55 611,88	0,00	0,00	55 611,88	0,00	0,00
52	1310522	Odstavení podkladu z kamenného dlažby 100 mm tloušťky a 200 mm	m ²	3 749,532	3 749,532	0,000	14,84	55 611,88	0,00	0,00	55 611,88	0,00	0,00
53	1310533	Odstavení podkladu z kamenného dlažby 100 mm tloušťky a 200 mm	m ²	3 749,532	3 749,532	0,000	14,84	55 611,88	0,00	0,00	55 611,88	0,00	0,00
54	1310544	Odstavení podkladu z kamenného dlažby 100 mm tloušťky a 200 mm	m ²	3 749,532	3 749,532	0,000	14,84	55 611,88	0,00	0,00	55 611,88	0,00	0,00
55	1310555	Odstavení podkladu z kamenného dlažby 100 mm tloušťky a 200 mm	m ²	3 749,532	3 749,532	0,000	14,84	55 611,88	0,00	0,00	55 611,88	0,00	0,00
56	1310566	Odstavení podkladu z kamenného dlažby 100 mm tloušťky a 200 mm	m ²	3 749,532	3 749,532	0,000	14,84	55 611,88	0,00	0,00	55 611,88	0,00	0,00
57	1310577	Odstavení podkladu z kamenného dlažby 100 mm tloušťky a 200 mm	m ²	3 749,532	3 749,532	0,000	14,84	55 611,88	0,00	0,00	55 611,88	0,0	

Pozadavek KS05 - JC nadle IRS 2020(VI)									
Celkem ZBV \$			0,00	144 372,00	144 372,00	144 372,00			
Celkem ve změně ZBV \$	10 103 004,81		0,00	144 372,00	10 247 376,81	144 372,00			
Všechny změny celkem SO 101	10 103 004,81		0,00	144 372,00	10 247 376,81	144 372,00			1,43%

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, p. o.
Pavel Špaček
Zborovská 81/11
150 00 Praha 5 – Smíchov

Čj : ST 201.03/2020
V Praze : 30. září 2020
Vyřizuje: Ing. Martin Vavřena

tel.: 602 161 668
e-mail: martin.vavrena@seznam.cz

Věc: III/00516, III/00512 a III/0057 Jinočany, oprava silnic

Sdělení č. 3
Vyjádření TDI k ZBV 3 a 5 – VDZ v plastu, odvodnění komunikace, tlaková zk. propustku

Na základě požadavku Správce komunikace je nutno definitivní vodorovné značení z důvodu vyšší životnosti provést v plastu. V zadávací dokumentaci je VDZ pouze v barvě, které bylo provedeno následně po pokládce obrusných vrstev, před uvedením komunikací do předčasného užívání.

V zadávací projektové dokumentaci bylo navrženo odvodnění komunikace SO 103 - III/0057 - km - 0,000 - 0,491 do příkopových žlabů a následně svedeno do UV. Z důvodu malého prostoru mezi komunikací a přilehlým příkrým terénem podél komunikace nebylo možné příkopové žlaby osadit. V rámci dopracování PD, AD navrhl vodu z komunikace svést do UV pomocí betonové obruby namísto příkopové žlabovky.

Po vizuální prohlídce propustku pod komunikací bylo odsouhlaseno objednatelem a TDI, že nebude provedena tlaková zkouška propustku.

Za TDI souhlasím se změnami řešenými ZBV 3 pro SO103 a ZBV 5 pro SO101. Tyto změny vedou ke zvýšení kvality celého díla. TDI současně souhlasí se související úpravou výměr dotčených položek v soupisu prací a tím se změnou ceny díla.

S pozdravem

Ing. Martin Vavřena

Vedoucí TDS

KSÚS Středočeského kraje
Karel Motál
Oprávněný zástupce objednatele
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Věc: Oznámení o zjištění zkušenosti

Stavba: III/00516, III/00512 a III/0057 Jinočany, oprava silnic – SO 101 III/00512 - km - 0,000 - 1,127

Vážený pane Motále,

jako Zhotovitel stavby „III/00516, III/00512 a III/0057 Jinočany, oprava silnic“, realizované na základě Smlouvy o dílo č. Objednatele 2370/00066001/2019 uzavřené dne 3.9.2019 mezi smluvními stranami Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 – Smíchov a společností „Společnost Jinočany, PORR – SILNICE GROUP“, kde správcem společnosti je společnost PORR a s., se sídlem Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10,

tímto oznamujeme níže uvedené skutečnosti:

1) V zadávací projektové dokumentaci bylo navrženo vodorovné značení pouze v barvě. Vzhledem ke skutečnosti, že VDZ provedené barvou nemá požadovanou životnost (vyšisuje), požaduje správce komunikace provedení VDZ v plastu. Změna se týká položek: 113, 114, 117 a 118.

Tyto změny byly odsouhlaseny ve Vyjádření TDI ze dne 30.9.2020.

Jedná se o změny, které vznikly v průběhu provádění prací. Celkově se jedná o Změny nepodstatné, nepředvídané, které jsou tak podle § 5, odst. 1, písm.c), resp. podle §10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29.05.2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazených do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná o změnu nepředvídanou.

Zhotovitel žádá Oprávněného zástupce objednatele o vydání pokynu k provedení Variace.

S pozdravem

Jan Turínek
Stavbyvedoucí

Přílohy

- Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 5



Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská II

PORR a.s.
Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice

Ex. dopis značkový dne
1911037/ZBV5

Vyřizuje/telefon
Motal /

Praha
08.10.2020

Věc: III/00516, III/00512 a III/0057 Jinočany, oprava silnice - SO 101 III/00512 – km 0,000
– 1,127 - pokyn k realizaci stavebních prací

Dle oznámení o zjištěné skutečnosti, stavba „III/00516, III/00512 a III/0057 Jinočany, oprava silnic“ - SO 101 III/00512 – km 0,000 – 1,127, se jedná o následující změny v rozsahu a technologii oprav:

- 1) Ve zpracované PD bylo navrženo vodorovné dopravní značení pouze v barvě. Protože takto provedené VDZ nemá požadovanou životnost (vyšisuje) a hrozilo by zhoršení bezpečnosti silničního provozu, proto, jako správce silnice, požadujeme provedení VDZ v plastu.

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje jako správce a zároveň zástupce Středočeského kraje jako vlastníka nemovitostí, tj. předmětných silnic III/00516, III/00512 a III/0057 a jako zadavatel opravy tímto vydává pokyn k realizaci díla dle navrženého řešení a zároveň žádá zhotovitele ke zpracování ZBV k této změně stavby a to v souladu se zákonem o zadávání VŘ a příslušnou směrnicí KSÚS SK.

Přílohy: Oznámení zhotovitele stavby
