



Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále též „**občanský zákoník**“) mezi:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, Praha 5, Smíchov PSČ: 150 00

IČO: 00066001

DIČ: CZ00066001

jejímž jménem jedná Ing. Jan Lichtneger, ředitel

č. smlouvy: S-2789/00066001/2020

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby STŘED

se sídlem: Sokolovská 192/79, 180 00 Praha 8

korespondenční adresa: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby
STŘED, oblast Kolín

Klejnarská 92, 280 02 Kolín IV

IČO: 480 35 599

DIČ: CZ48035599

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C,
vložka 8032

zastoupená Ing. Milanem Štěrbou, ředitelem oblasti Kolín a Janou Balšánkovou, vedoucí
oddělení kalkulací oblasti Kolín – *oprávněni jednat za společnost na základě plné moci*

dále jen „**Zhotovitel**“ na straně jedné

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „**smluvní strany**“)

Preambule:

Smluvní strany tímto prohlašují, že dne 16.12.2020 uzavřeli smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na veřejné zakázce s názvem: „**III/3305 – Klučov – Žhery - Skramníky**“ (dál jen „**Smlouva o dílo**“). Na základě dohody smluvních stran a ve vazbě na čl. XV. odst. 14.1 Smlouvy o dílo, uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jen „**Dodatek č. 1**“).

I. Předmět Dodatku č. 1

S ohledem na vznik objektivně nepředvídaných okolností v průběhu realizace prací na díle, které nemohl zhotovitel před zahájením prací předpokládat, a které zapříčinili změnu rozsahu prací v podobě méněprací a víceprací, upravuje se po dohodě smluvních stran předmět Smlouvy o dílo. Změna rozsahu prací v podobě méněprací a víceprací obsahují Objednatel schválené změnové listy, které jsou přílohou tohoto Dodatku č. 1. Na základě změny předmětu díla se mění i celková cena za dílo uvedená v bodě 8.1. Smlouvy o dílo.

8.1. Smluvní strany se dohodly, že celková Cena Díla je stanovena jako neměnná a konečná a činí:

Původní Cena Díla bez DPH	6.989.793,86Kč
Nová Cena díla dle Dodatku č. 1 bez DPH	7.460.648,26 Kč
DPH 21%	1.566.736,13 Kč
DPH 15 %	0,- Kč
Cena Díla včetně DPH	9.027.384,39 Kč

Daň z přidané hodnoty (dále též „DPH“) bude na základě výslovné dohody smluvních stran připočtena ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že veškerá množství uvedená v soupise prací k Dílu a jeho jednotlivým částem jsou pouze odhadovaná, a jejich změna neznamena změnu Ceny Díla.

Přílohou tohoto Dodatku č. 1 jsou Objednatelem odsouhlaseny Změnové listy 1

II. Závěrečná ustanovení

1. Smlouva bude uveřejněna dle § 219 zákona o ZVZ na profilu Objednatele, včetně všech jejích změn a dodatků.
2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tuto Smlouvu uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy o dílo. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, která nejsou tímto Dodatkem č. 1 výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze smluvních stran obdrží její elektronický originál.
5. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento Dodatek č. 1 uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto Dodatku č. 1 za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku č. 1 rozhodující.

V Říčanech dne _____

V Kolíně dne _____

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace
Ing. Jan Lichtneger, ředitel

SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný
závod Dopravní stavby STŘED
Ing. Milan Štěrbá, ředitel oblasti Kolín a
Jana Balšánková, vedoucí oddělení
kalkulací oblasti Kolín
na základě plné moci ze dne 6.1.2020

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

„III/3305 Klučov - Žhery - Skramníky“

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Silnice III/3305 - KSÚS

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

01 / 1

Číslo ZBV:

1

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
 Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
 IČ: 000 66 001

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.
 Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby STŘED
 Sokolovská 79/192, 186 00 Praha 8 - Karlín
 IČ: 480 35 599

Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.3	0,00	470 854,40	470 854,40

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1	0,00	470 854,40	470 854,40

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
 Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
 a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré:

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby:

„III/3305 Klučov - Žhery - Skramníky“

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

Číslo ZBV:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Silnice III/3305 - KSÚS

01 / 1

1

Strany smlouvy o dílo č. obj.: 2848/00066001/2018 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 31. 10. 2018 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
a Městys Plaňany, Tyršova 72, 281 04 Plaňany

Zhotovitel: SWIETELSKÝ stavební s.r.o., Sokolovská 79/192, 186 00 Praha 8 - Karlín

Přílohy Změnového listu:

1. Krycí list	1	počet listů
2. Změnový list	1	počet listů
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů
4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů
Další doklady dle přehledu dokladů	21	počet listů

Paré č.

Příjemce

1,2

Objednatel KSÚS

3,4

Zhotovitel

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Při převzetí staveniště bylo zjištěno, že v důsledku dlouho trvajícího zimního období s velmi nízkými teplotami a velkým počtem srážek, došlo k výraznému zhoršení stavu komunikace ve větší než původně předpokládané ploše. Povrch komunikace vykazuje plošné deformace, hloubkové koroze, síťové, mozaikové, příčné a podélné trhliny, velké množství výtluků, odlámané kraje. Při převzetí staveniště byl za přítomnosti zástupce objednatele proveden pasport stávajícího stavu komunikace a byla stanovena místa nutných oprav způsobem recyklace za studena (sanace) - doloženo přílohou č.2 a přílohou č.3, fotodokumentací a zápisem ve stavebním deníku (příloha č. 5 a č.6). V místech rozpadlých a ulámaných krajů vozovky a v místech chybějících krajnic plochy, kde bude nutné doplnit konstrukci vozovky vrstvou ze šterkodrtě - doloženo přílohou č.4, fotodokumentací a zápisem ve stavebním deníku (příloha č. 5 a č.6)

Jedná se o změnu, které vznikla v průběhu provádění prací. Celkově se jedná o Změnu nepodstatnou, nepředvídanou, která je tak podle § 5 odst. (1) písm. c), resp. podle § 10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29. 05. 2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná o změnu nepředvídanou.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
0,00	470 854,40	470 854,40	470 854,40

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí)	jméno	Jan Tománek	datum
Projektant (AD)	jméno	-	datum
Stavební dozor	jméno	Miroslav Trpišovský	datum
Zástupce Objednatele:	jméno	Ing. Ján Kukura	datum

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel KSÚS (Oprávněná osoba
Objednatele)

jméno

Ing. Jan Lichneger, ředitel

19. 05.

Zhotovitel

jméno

Ing. Milan Štěrba

datum

Jana Balšánková

Číslo paré:

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 1**

Název Stavby: „III/3305 Klučov - Žhery - Skramníky“	
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	01 / 1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Silnice III/3305 - KSÚS	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
6 989 793,86

Poznámka:

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	6 989 793,86	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	470 854,40	470 854,40	6,74%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	0,00	7 460 648,26	470 854,40	6,74%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): Jan Tománek

Projektant (AD): -

Stavební dozor: Miroslav Trpišovský

Zástupce Objednatele: Ing. Ján Kukura

Zaměstnanec KSÚS SK
odpovědný za cenové
projednání Změny:

Ing. Jaroslava Jurková

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 1

Evidenční číslo a název stavby: „III/3305 Klučov - Zhery - Skramníky“

Číslo a název SO/PS: Silnice -III/3305 - KSÚS

Číslo a název rozpočtu: Silnice III/3305 - KSÚS

ZMENA SOUPISU PRACI (SO/PS)

č. 1

Skupina Změn: 3

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Rozpočet 1. část st. 1,250 - 3,050 km											
	R položka	Sanace konstrukčních vrstev od 500 do 3.000 m2 - 25 cm (rozrytí původní konstrukce pomocí frézy na stanovenou hloubku, urovnání podkladu a promíchání včetně doplnění materiálu-10% kamenivo, zřízení podkladu stabilizovaného pojivem-4% cement,-1% emulze, zhutnění)	m2	1 836,00	2 745,00	909,00	270,58	496 784,88 Kč	0,00 Kč	245 957,22 Kč	742 742,10 Kč	245 957,22 Kč	49,51%
		Rozpočet 2. část st. 3,396 - 4,316 km											
	R položka	Sanace konstrukčních vrstev od 500 do 3.000 m2 - 25 cm (rozrytí původní konstrukce pomocí frézy na stanovenou hloubku, urovnání podkladu a promíchání včetně doplnění materiálu-10% kamenivo, zřízení podkladu stabilizovaného pojivem-4% cement,-1% emulze, zhutnění)	m2	920,00	1 366,00	446,00	270,58	248 933,60 Kč	0,00 Kč	120 678,68 Kč	369 612,28 Kč	120 678,68 Kč	48,48%
		Nové položky - JC dle ÚRS 2020/I											
	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	0,00	518,50	518,50	201,00	0,00 Kč	0,00 Kč	104 218,50 Kč	104 218,50 Kč	104 218,50 Kč	100%
		Celkem						745 718,48 Kč	0,00 Kč	470 854,40 Kč	1 216 572,88 Kč	470 854,40 Kč	63%

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: „III/3305 Klučov - Žhery - Skramníky“

1	Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	6 989 793,86
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	7 460 648,26
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	9 027 384,39
3=(2/1)*100	Procento změny Přijáté smluvní částky	106,74%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%
40=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, odst. (5), písm. b)	0,00%

$6 = 32 + 36$	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	470 854,40
$7 = (6 \cdot 1) : 100$	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	6,74%
$8 = 1 \cdot 100$	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	2 096 838,16

9=(32A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	6,74%
10=(36A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,00%
10A=32A+36A	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	470 854,40
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	3 494 896,93

12=(37/1)*100	Sledování limitu 15 %	0,00%
13=37	Sledování limitu 1 048 469 Kč	0,00
14=149224000:37	Sledování limitu 149 224 000 Kč (u nadlimitní veřejné zakázky)	0,00

[illegible]

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	1
Název a evidenční číslo stavby:	„III/3305 Klučov - Žhery - Skramníky“
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Silnice -III/3305 - KSÚS
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
Příloha č. 1 - Změnový soupis prací	3	
Příloha č.2 - Protokol z pasportu sanací - 1. část komunikace ze dne 7.4.2021	2	
Příloha č.3 - Protokol z pasportu sanací - 2. část komunikace ze dne 7.4.2021	2	
Příloha č.4 - Protokol z pasportu doplnění štěrkodrtě - 2. část komunikace ze dne 7.4.2021	2	
Příloha č. 5 - Fotodokumentace	10	
Příloha č. 6 - Zápis ze stavebního deníku 7.4.2021 - dohoda o zvýšení objemu prováděných prací	2	
Počet listů celkem	21	

Nový soupis prací pro Oprava komunikace - rozpočet 1.část a rozpočet 2.část dle ZBV č. 1

Číslo a název stavby: „III/3305 Klučov - Žhery - Skramníky“

Změna soupisu prací (SO/PS)

Číslo a název SO/PS: Silnice III/3305 - KSÚS

1

Číslo a název rozpočtu: rozpočet 1.část a rozpočet 2.část


Číslo položky	Kód položky	Název položky	MJ	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné	Změny kladné	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	5	5	6	7	8	8	8	8	8
1		rozpočet 1. část						4 593 712,08	0,00	245 957,22	4 839 669,30	245 957,22	5,35%
	14102	poplatky za skládku (čištění krajnic + čištění příkopů)	t	1 336,000	1 336,000	0,000	112,74	150 620,64	0,00	0,00	150 620,64	0,00	0,00%
	12922	čištění krajnic od nánosů do tl.100mm	m2	1 800,000	1 800,000	0,000	39,31	70 758,00	0,00	0,00	70 758,00	0,00	0,00%
	12931	čištění příkopů od nánosů do 0,25m3/m	m	3 600,000	3 600,000	0,000	59,20	213 120,00	0,00	0,00	213 120,00	0,00	0,00%
	113762	frézování drážky průřezu do 200mm2 v asf. vozovce	m	15,000	15,000	0,000	72,09	1 081,35	0,00	0,00	1 081,35	0,00	0,00%
	113721	frézování zpev. asf. ploch. odvoz do 1 km (zápich 150m2)	m3	11,250	11,250	0,000	2 505,32	28 184,85	0,00	0,00	28 184,85	0,00	0,00%
	11372B	frézování asf. ploch - odvoz (skládka Benátky n. Jizerou 50 km)	tkm	1 350,000	1 350,000	0,000	6,46	8 721,00	0,00	0,00	8 721,00	0,00	0,00%
	14132	poplatky za skládku typ S- NO (nebezpečný odpad)	t	27,000	27,000	0,000	2 254,79	60 879,33	0,00	0,00	60 879,33	0,00	0,00%
	572223	spojovací postřik ze sil. emulze do 1,0 kg/m2 (2x)	m2	18 360,000	18 360,000	0,000	10,71	196 635,60	0,00	0,00	196 635,60	0,00	0,00%
	574C06	asfalt. vrstvy pro ložní vrstvy ACL 16+, 16S (tl. 50mm)	m3	459,000	459,000	0,000	3 267,06	1 499 580,54	0,00	0,00	1 499 580,54	0,00	0,00%
	574A44	asfalt.beton pro obrusný ACO 11+ (tl.50mm)	m2	9 180,000	9 180,000	0,000	170,98	1 569 596,40	0,00	0,00	1 569 596,40	0,00	0,00%
	56932	zpevnění krajnic ze štěrkodrtě do 100mm	m2	1 800,000	1 800,000	0,000	93,62	168 516,00	0,00	0,00	168 516,00	0,00	0,00%
	93818	očištění asf.vozovek zametením	m2	9 180,000	9 180,000	0,000	1,60	14 688,00	0,00	0,00	14 688,00	0,00	0,00%
	919111	řezání asf. krytu do 50mm	m	15,000	15,000	0,000	338,22	5 073,30	0,00	0,00	5 073,30	0,00	0,00%

Číslo položky	Kód položky	Název položky	MJ	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné	Změny kladné	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
	915111	VDZ barva hladká-dodávka+ pokládka (V4-125mm)	m2	450,000	450,000	0,000	101,47	45 661,50	0,00	0,00	45 661,50	0,00	0,00%
	931312	těsnění dilat. spár asf. závloukou průř. 200mm2	m	15,000	15,000	0,000	270,58	4 058,70	0,00	0,00	4 058,70	0,00	0,00%
	R položka	Sanace konstrukčních vrstev od 500 do 3.000 m2 - 25 cm (rozrytí původní konstrukce pomocí frézy na stanovenou hloubku, urovnání podkladu a promíchání včetně doplnění materiálu-10% kamenivo, zřízení podkladu stabilizovaného pojivem-4% cement,-1% emulze, zhutnění)	m2	1 836,000	2 745,000	909,000	270,58	496 784,88	0,00	245 957,22	742 742,10	245 957,22	49,51%
	R položka	DIO vč. zajištění, zjištění a vytyčení inž. sítí, geodetické zaměření stavby	kpl	1,000	1,000	0,000	41 713,65	41 713,65	0,00	0,00	41 713,65	0,00	0,00%
	02520	zkoušení nezávislou zkušebnou	kpl	1,000	1,000	0,000	18 038,34	18 038,34	0,00	0,00	18 038,34	0,00	0,00%
2		rozpočet 2. část						2 396 081,78	0,00	120 678,68	2 516 760,46	120 678,68	5,04%
	14102	poplatky za skládku (čištění krajnic + čištění příkopů)	t	683,000	683,000	0,000	112,74	77 001,42	0,00	0,00	77 001,42	0,00	0,00%
	12922	čištění krajnic od nánosů do tl.100mm	m2	920,000	920,000	0,000	53,69	49 394,80	0,00	0,00	49 394,80	0,00	0,00%
	12931	čištění příkopů od nánosů do 0,25m3/m	m	1 840,000	1 840,000	0,000	59,20	108 928,00	0,00	0,00	108 928,00	0,00	0,00%
	113762	frézování drážky průřezu do 200mm2 v asf. vozovce	m	10,000	10,000	0,000	72,09	720,90	0,00	0,00	720,90	0,00	0,00%
	113721	frézování zpev. asf. ploch, odvoz do 1 km (zápich 150m2)	m3	7,500	7,500	0,000	3 757,98	28 184,85	0,00	0,00	28 184,85	0,00	0,00%
	11372B	frézování asf. ploch - odvoz (skládka Benátky n. Jizerou 50 km)	tkm	900,000	900,000	0,000	6,46	5 814,00	0,00	0,00	5 814,00	0,00	0,00%
	14132	poplatky za skládku typ S- NO (nebezpečný odpad)	t	18,000	18,000	0,000	2 254,79	40 586,22	0,00	0,00	40 586,22	0,00	0,00%
	572223	spojovací postřik ze sil. emulze do 1,0 kg/m2 (2x)	m2	9 200,000	9 200,000	0,000	10,71	98 532,00	0,00	0,00	98 532,00	0,00	0,00%
	574C06	asfalt. vrstvy pro ložní vrstvy ACL 16+, 16S (tl. 50mm)	m3	230,000	230,000	0,000	3 279,29	754 236,70	0,00	0,00	754 236,70	0,00	0,00%
	574A44	asfalt.beton pro obrusný ACO 11+ (tl.50mm)	m2	4 600,000	4 600,000	0,000	171,60	789 360,00	0,00	0,00	789 360,00	0,00	0,00%
	56932	zpevnění krajnic ze šterkodrtě do 100mm	m2	920,000	920,000	0,000	98,41	90 537,20	0,00	0,00	90 537,20	0,00	0,00%

Číslo položky	Kód položky	Název položky	MJ	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné	Změny kladné	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
	93818	očištění asf.vozovek zametením	m2	4 600,000	4 600,000	0,000	3,19	14 674,00	0,00	0,00	14 674,00	0,00	0,00%
	919111	řezání asf. krytu do 50mm	m	10,000	10,000	0,000	338,22	3 382,20	0,00	0,00	3 382,20	0,00	0,00%
	915111	VDZ barva hladká-dodávka+ pokládka (V4-125mm)	m2	230,000	230,000	0,000	101,47	23 338,10	0,00	0,00	23 338,10	0,00	0,00%
	931312	těsnění dilat. spár asf. zálivkou průř. 200mm2	m	10,000	10,000	0,000	270,58	2 705,80	0,00	0,00	2 705,80	0,00	0,00%
	R položka	Sanace konstrukčních vrstev od 500 do 3 000 m2 - 25 cm (rozrytí původní konstrukce pomocí frézy na stanovenou hloubku, urovnání podkladu a promíchání včetně doplnění materiálu-10% kamenivo, zřízení podkladu stabilizovaného pojivem-4% cement,-1% emulze, zhutnění)	m2	920,000	1 366,000	446,000	270,58	248 933,60	0,00	120 678,68	369 612,28	120 678,68	48,48%
	R položka	DIO vč. zajištění, zjištění a vytyčení inž. sítí, geodetické zaměření stavby	kpl	1,000	1,000	0,000	41 713,65	41 713,65	0,00	0,00	41 713,65	0,00	0,00%
	02520	zkoušení nezávislou zkušebnou	kpl	1,000	1,000	0,000	18 038,34	18 038,34	0,00	0,00	18 038,34	0,00	0,00%
		Nové položky - JC dle ÚRS 2020/I						0,00	0,00	104 218,50	104 218,50	104 218,50	100,00%
	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	0,000	518,500	518,500	201,00	0,00	0,00	104 218,50	104 218,50	104 218,50	100,00%
Celkem za stavbu								6 989 793,86	0,00	470 854,40	7 460 648,26	470 854,40	6,74%

„III/3305 – Klučov – Žhery - Skramníky“

Rozpočet část 1. - st. 1,250 - 3,050 km, Sanace konstrukčních vrstev od 500 do 3.000 m² - 25 cm

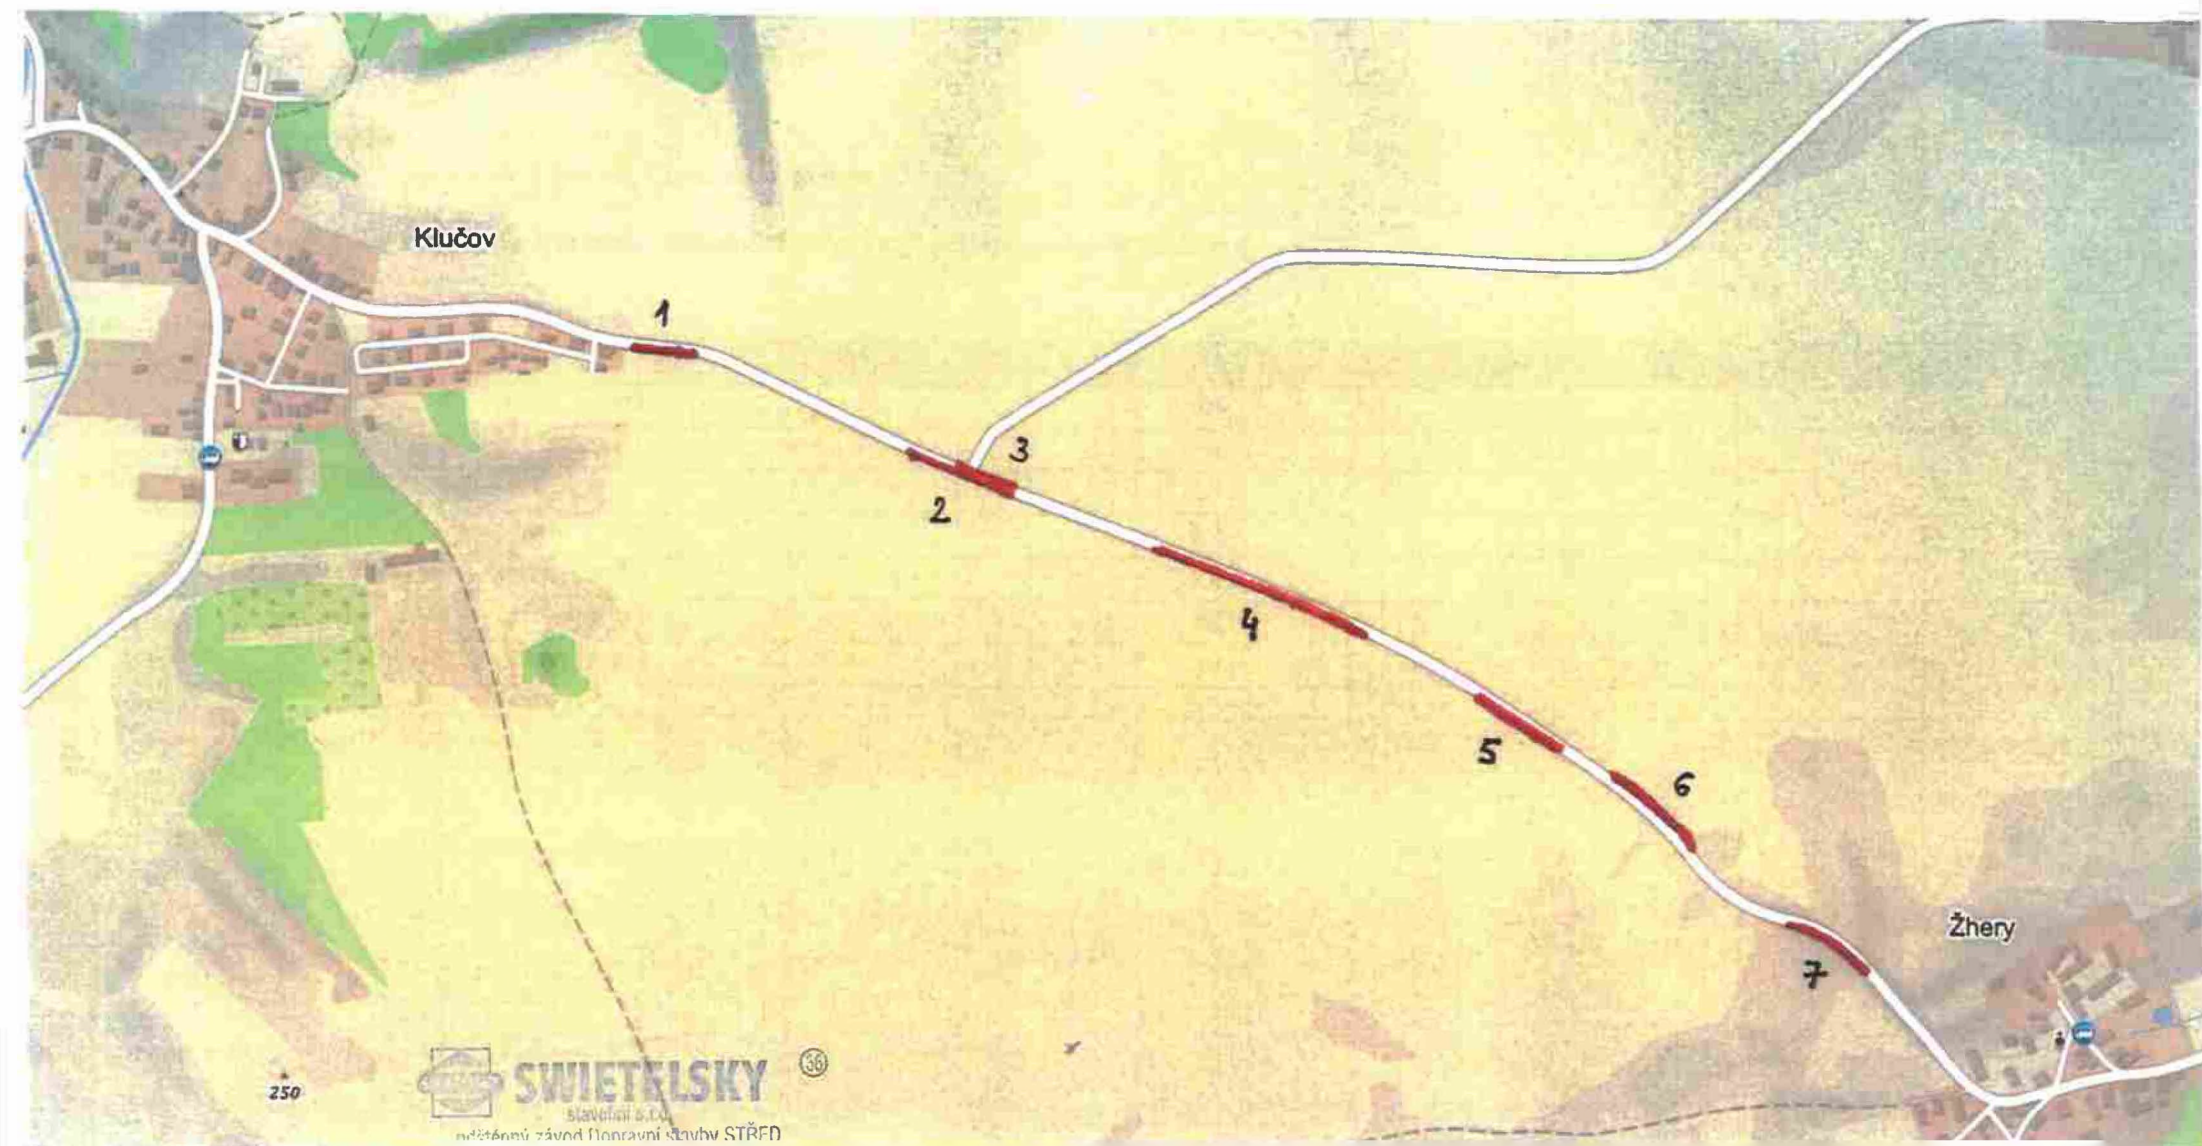

Navrhl:

**Sanace konstrukčních vrstev od 500 do 3.000 m² - 25 cm
specifikace rozsahu - rozpočet 1. část**

Stavba: III/3305 - Klučov - Žhery
Objekt: silnice III/ 3305 st. 1,250 - 3,050 km
 délka úseku 1,800 km, průměrná šířka je 5,1m, plocha 9.180 m²

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Číslo úseku	Staničení	Délka opravy m	Šířka opravy m	Výměra m ²
1	km 1,255 - 1,355 - pravá strana	100	3	300,00
2	km 1,605 - 1,715 - pravá strana	110	3	330,00
3	km 1,655 - 1,715 - levá strana	60	3	180,00
4	km 1,826 - 2,176 - pravá strana	350	3	1 050,00
5	km 2,476 - 2,576 - pravá strana	100	3	300,00
6	km 2,666 - 2,801 - levá strana	135	3	405,00
7	km 2,855 - 2,915 - pravá strana	60	3	180,00

SANACE CELKEM

2 745,00

Zpracoval: Jan Tománek, stavbyvedoucí
 Datum:

Schválil: Miroslav Trpišovský, provozní cestmistr

Datum:

„III/3305 – Klučov – Žhery - Skramníky“

Rozpočet část 2. - st. 3,396 - 4,316 km, Sanace konstrukčních vrstev od 500 do 3.000 m² - 25 cm



Navrhl:

Schválil:

**Sanace konstrukčních vrstev od 500 do 3.000 m² - 25 cm
specifikace rozsahu - rozpočet 2. část**

Stavba: III/3305 - Klučov - Žhery

Objekt: silnice III/ 3305 st. 3,396 - 4,316 km

délka úseku 0,920 km, průměrná šířka je 5,0m, plocha 4.600 m²

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Zhotovitel: SWIETELSKÝ stavební s.r.o.

Císlo úseku	Staničení	Délka opravy m	Šířka opravy m	Výměra m ²
1	km 3,449 - 3,479 - levá strana	30	2	60,00
2	km 3,449 - 3,500 - pravá strana	51	2	102,00
3	km 3,620 - 3,762 - pravá strana	142	2	284,00
4	km 3,782 - 4,242 - levá strana	460	2	920,00


SANACE CELKEM	1 366,00
----------------------	-----------------

Zpracoval: Jan Tománek, stavbyvedoucí
Datum.

Schválil: Miroslav Trpišovský, provozní cestmistr

„III/3305 – Klučov – Žhery - Skramníky“

Rozpočet část 2. - st. 3,396 - 4,316 km, doplnění šterkodrtě do konstrukčních vrstev tl. 20 cm

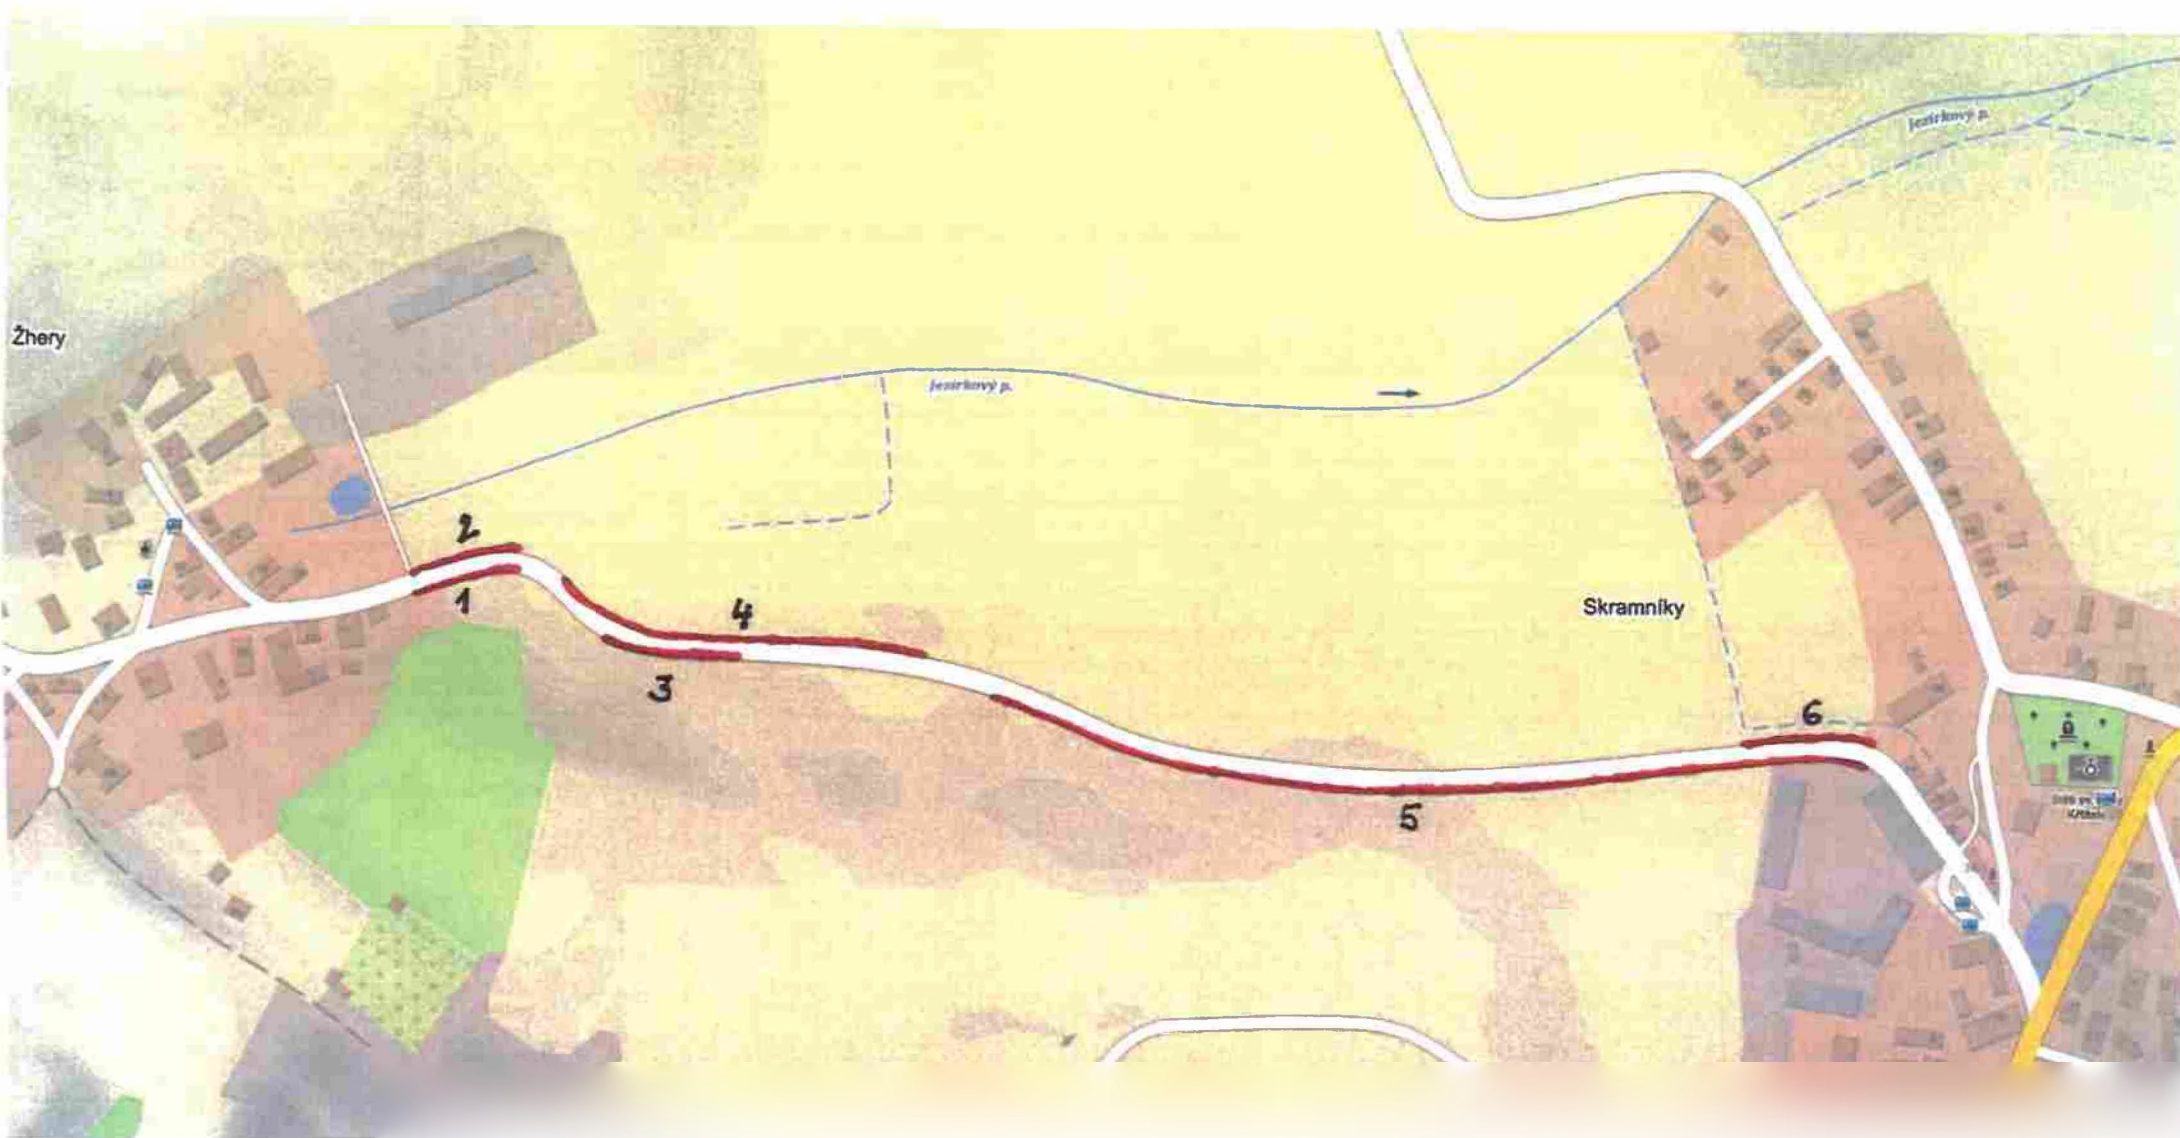

Navrhl:

.....

**Doplnění šterkodrtě do konstrukčních vrstev v tl. 20 cm
specifikace rozsahu - rozpočet 2. část**

Stavba: III/3305 - Klučov - Žhery

Objekt: silnice III/ 3305 st. 3,396 - 4,316 km

délka úseku 0,920 km, průměrná šířka je 5,0m, plocha 4.600 m2

Objednatel: **Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**

Zhotovitel: **SWIETELSKY stavebni s.r.o.**

Číslo úseku	Staničení	Délka opravy m	Šířka opravy m	Výměra m2
1	km 3,396 - 3,449 - pravá strana	53	0,5	26,50
2	km 3,396 - 3,449 - levá strana	53	0,5	26,50
3	km 3,500 - 3,620 - pravá strana	120	0,5	60,00
4	km 3,479 - 3,692 - levá strana	213	0,5	106,50
5	km 3,782 - 4,316 - pravá strana	534	0,5	267,00
6	km 4,252 - 4,316 - pravá strana	64	0,5	32,00
SANACE CELKEM				518,50

Zpracoval: Jan Tománek, stavbyvedoucí

Datum:

Schválil: Miroslav Trpišovský, provozní cestmistr





















Identifikační údaje stavby podle projektové dokumentace

STAVBA: III/3305 - KLUCOV - ŽHECH - SKRAMNÍKY

(objekt)

úsek

Okres KOUV

obec KLUCOV, ŽHECH, SKRAMNÍKY

Místo III/3305

Zúčastněné strany

OBJEDNAVATEL:

Jména, adresy, telef. odpov. zástupců

KRUIS STŘEDOCESKÝHO KRAJE
ZBOROVSKÁ 91/II, 150 21 PRAHA 5 - SMICHOV

• RADEK PÁLTO

• MIROSLAV TRPÍŇVSKÝ

Technický (stavební dozor) objednavatele:

• JAN KUKULA

Stálý: MIROSLAV TRPÍŇVSKÝ

údržba silnic

Občas

ZHOTOVITEL:

Hlavní stavbyve

Stavbyvedoucí: JAN TOMÁNEK +42

PROJEKTANT:

Autorský dozor

Změny a doplňky

- | | |
|--|----------|
| - PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ STAVBY VIZ. JAKOSTATNÍ | 4.4.2021 |
| PŘEDÁVACÍ PROTOKOL | STŘEDA |
| - ZAVIŠTĚNÍ DIO (A16) | |
| - OŠTĚNÍ KRAJNÍ A PĚKOPY • KOMATĚN - NOPOE (KÖERL) | |
| - LODKOVNA' PŘEPLAVA • DAF BX4 - EGERT (KÖERL) | |
| • WLV 6X4 - ČAP (ČAP) | |
| - PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ BYLY PŘEVZEMY ZKOUŠKY | |
| PRO REVIZI (TEPLIČKA) | |

Při převzetí stavby bylo zjištěno, že v
 důsledku dlouho trvajícího zimního období
 s velmi nízkými teplotami a velkým
 počtem srážek, došlo k měrnému zhrubnutí
 stávk komunikace v většině až původně
 předpokládané ploše povrch komunikace ukazující
 plošné deformace, hloubkové koroze, štěrby, roztrhání
 povrchu a podélné trhliny, velké množství
 výtoku, odlamání krasů. Za přítomnosti zájemců
 objednatel provedl pasport stávajícího stavu
 komunikace a byla stanovena místa místních
 ohran zrušením povrchu za štěrby (pavky)
 a v místech rozpadů a odlamání krasů
 vložkou plochy, kde bude nutné doplnit
 konstrukci vložky chybějící vstoupit se štěrky.
 Zhotovitel zpracuje "ZBV 1" a předloží k
 schválení.
