

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále též „**občanský zákoník**“) mezi:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, Praha 5, Smíchov PSČ: 150 00

IČO: 00066001

DIČ: CZ00066001

jejímž jménem jedná Ing. Jan Lichtneger, ředitel

č. smlouvy: S-3419/00066001/2020

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

„Společnost STRABAG – PORR – Kolín, most“

Správce společnosti: **STRABAG a.s.**

se sídlem: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

IČO: 60838744

DIČ: CZ60838744

bankovní spojení:

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634

jejímž jménem jedná Ing. Tomáš Hajič – prokurista a Ing. Renata Hamrská - prokurista

č. smlouvy: STRABAG a.s., SDI/ZOGX/841/TC/ZO/2020/003

Druhý společník: **PORR a.s.**

se sídlem: Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10

IČO: 43005560

DIČ: CZ43005560

bankovní spojení:

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006

jejímž jménem jedná Ing. Antonín Daňa – člen představenstva a Martin Hanáček - člen představenstva

č. smlouvy: PORR a.s., 7-1244A19

dále jen „**Zhotovitel**“ na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „**smluvní strany**“)

Preambule:

Smluvní strany tímto prohlašují, že dne 27.11.2020 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na veřejné zakázce s názvem: „**II/125 Kolín, most ev.č. 125-034 přes Labe**“ (dál jen „**Smlouva o dílo**“). Na základě dohody smluvních stran a ve vazbě na čl. 6. odst. 6.7 Smlouvy o dílo, uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jen „**Dodatek č. 1**“).

I. Předmět Dodatku č. 1

Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je změna Smlouvy o dílo s ohledem na vznik objektivně nepředvídaných okolností v průběhu realizace prací na díle, které nemohl zhotovitel před zahájením prací předpokládat a které zapříčinily změnu doby plnění. Změna rozsahu prací bude v podobě víceprací specifikována v Objednatelem schváleném Změnovém listu.

Na základě uvedených změn se mění článek 4. Doba a místo plnění, odst. 4.1. Objednatel nezajistil pravomocné stavební povolení pro realizaci díla v celém rozsahu Smlouvy o dílo a dílo zatím bude realizováno v mírně omezeném rozsahu vymezeném v rozhodnutí Městského úřadu v Kolíně sp. zn. OD 5150/2021 ze dne 6.4.2021. Smluvní strany se dohodly, že pokud nejpozději do **10** měsíců od převzetí staveniště neposkytne Objednatel Zhotoviteli pravomocné doklady opravňující dokončení díla v plném rozsahu, tak bude mezi smluvními stranami upravena Doba plnění postupem podle článku 6 odst. 6.7 Smlouvy o dílo.

V souvislosti s prodloužením termínu dokončení díla v návaznosti na objektivně nepředvídatelné okolnosti v průběhu realizace prací smluvní strany musely provést aktualizaci postupu prací a nahrazují Přílohu č. 5 Smlouvy o dílo – Časový plán výstavby – časový harmonogram.

II. Doba a termín díla

2.1. Na základě nepředvídatelných okolností, dochází ke změně termínu díla, a to následovně:

Původní článek 4, odst. 4.1. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

4.1. Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 10 dnů od převzetí Staveniště a Dílo dokončit a předat Objednateli **do 17,5 měsíce** od předání Staveniště Zhotoviteli.

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento dodatek č. 1 bude uveřejněn dle § 219 zákona o ZVZ na profilu Objednatele.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tento Dodatek č. 1 uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

3.2 Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy o dílo. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, která nejsou tímto Dodatkem č. 1 výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.

3.3 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze smluvních stran obdrží její originál.

3.4 Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento Dodatek č. 1 uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto Dodatku č. 1 za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku č. 1 rozhodující.

Přílohy: Příloha č. 5 – Časový plán výstavby – časový harmonogram

V Říčanech dne _____

V Praze dne


Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace
Ing. Jan Lichtneger, ředitel

STRABAG a.s.
Ing. Tomáš Hajič a Ing. Renata Hamrská
Prokuristé

PORR a.s.
Ing. Antonín Daňa a Ing. Martin Hanáček
členové představenstva

HARMONOGRAM

II/125 Kolín, most ev.č.125-034 přes Labe

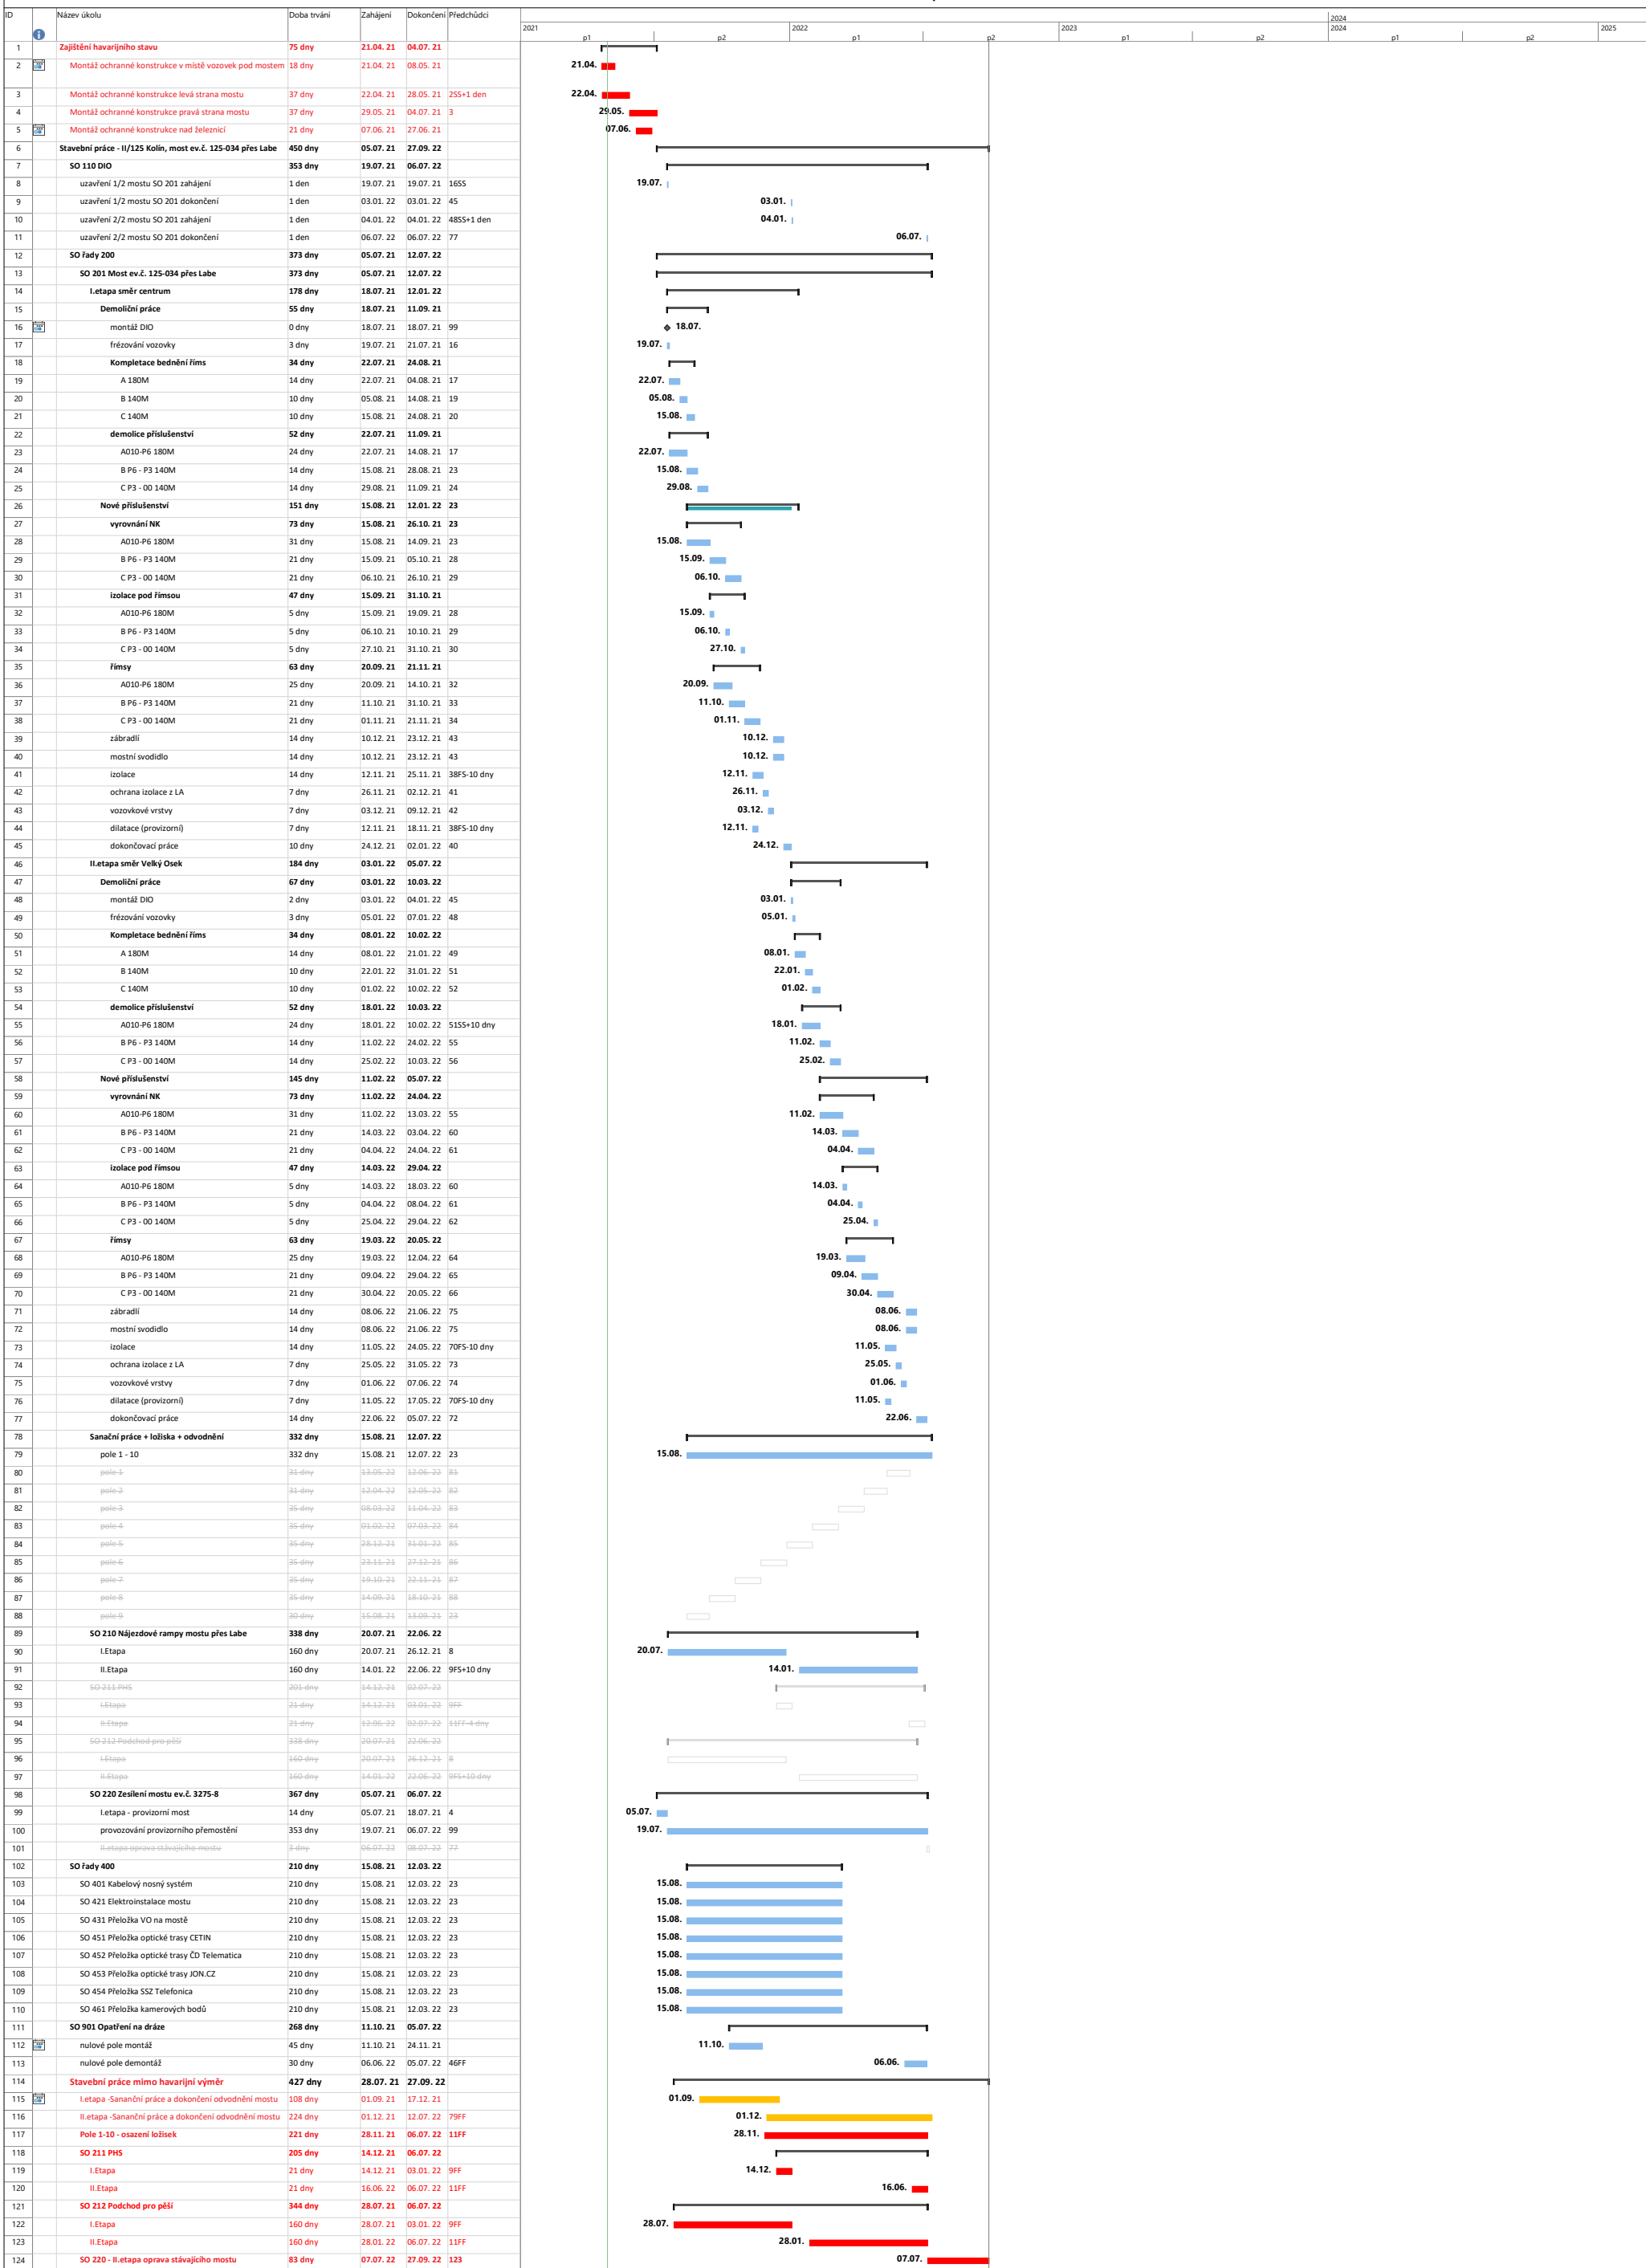

Projekt: Harmonogram Kolín ko
 Datum: 29.04.21
 Úkol: Rozdělení Mílník
 Souhrnný: Souhrn projektu
 Neaktivní mílník: Neaktivní souhrn
 Ruční úkol: Ruční úkol
 Pouze s dobou trvání: Pouze zahájení
 Ruční úkol zahrnuté v souhrnném úkolu: Pouze s datem dokončení
 Ruční souhrn: Vnější úkoly
 Vnější mílník: Konečný termín
 Průběh: Průběh ručně zadaného úkolu

V harmonogramu nejsou zohledněny měsíce s klimaticky nevhodnými podmínkami
