

DENNÍ ZÁZNAMY

Číslo deníku: _____





1

Série

BINU

č. listu

* 007654

Datum zápisu	Text zápisu (včetně jmen a podpisů odpovědných osob)
13.2.20	<p><u>Zápis Zpracování</u></p> <p>DNES DOŠLO K PŘÍJÍMÍ PRACOVNÍHO MĚSÍ SKANSKA ZA A FIRMU PAVEL ŠVESTKA S.R.O. - DETALIE 1000. PRACOVNÍ ROVNĚŽ PRODĚLO SKANSKA S KIZIKY DLU ODĚM ZHODNUTÍ - NĚ JE UVEDENO V SANKCIONÁŘI ZÁPISU - TV. PŘESKALOVACÍ.</p>  
13.2.20	<p><u>Zápis Zpracování</u></p> <p>PŘI PŘÍJÍMÍ SKANSKA MĚSÍ VÝŠK V L₁ 1,450 + L₂ 1,690 DLU OPĚR ZHODNUTÍ VĚŠÍ PLOŠEJ TOČEN VÝŠK (AŽ 180 mm) - VÝŠKOVÍ KONTROLA DÍL ZHODNUTÍ PO GEOMETRIČNÍ ZAMĚŘENÍ.</p>  
13.3.20 PA	<p>POČASÍ: +5°C + 10°C POLWASHO PRAC. DOBA: 7⁰⁰ - 18⁰⁰</p> <p>STAV: 2 THP SKANSKA, 4 SD SK, 1x ŘIDIČ VALNÍK HR, 4x SK GVOZDILKA SUB: 1x SD JOTEK, 1x ŘIDIČ, 1x STROJNÍK DVOČAK, 1x STROJNÍK ČAPEK</p> <p>STROJE: VALNÍK HR SKANSKA, 2x TRANSIT SUB: 1x TRAKTORBAGR, SKLOPKA DVOČAK - TRAKTORBAGR ČAPEK</p>



Adresát:

Středočeský kraj
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Věc: Vyjádření TDS k ZBV 1

Na stavbě „II/610 Benátky n/J, most ev.č. 610-021 a přes D10“ na stavebním objektu SO 101 „Silnice II/610“ bylo prováděno frézování zpevněných asfaltových ploch. V průběhu realizace stavebních prací objektu SO 101 proběhlo doměření kubatur.

Za technický dozor konstatuji:

Navržený objem prací rozsahem odpovídá. Jednotkové ceny odpovídají položkám ze smlouvy, respektive soupisu prací. **Doporučuji ZBV 1 k odsouhlasení.**

V Liberci dne 24. září 2020

IB
XR



Petr Jiřímský
TDS



**Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, p.o.**
Zborovská 11
Praha, 150 00

Čj : **PX5546/2020**
V Praze : 9. října 2020
Vyřizuje: Ing. Pavel Hrdina

tel.
e-n

Akce: II/610 Benátky n/J, most ev.č. 610-021a před D10 před obcí Benátky n/J a oprava přilehlé komunikace ve staničení 22,353 km – 24,853 km - PD
Věc: Vyjádření AD k ZBV 1

Vážení,

elektronicky jsme dne 25. 9. 2020 obdrželi návrh ZBV č. 1, který řeší úpravu rozsahu frézování stávající vozovky.

V rámci PDPS bylo frézování rozděleno do 3 úseků:

- 1) Úsek ZÚ – km 2,03 (s výjimkou mostu ev.č. 610-021a) v soupisu prací označeno jako úsek před mostem
- 2) Úsek km 2,03 – KÚ (s výjimkou propustku v km 2,440) v soupisu prací označeno jako úsek za mostem
- 3) Úsek rámového propustku v km 2,44 v soupisu prací označeno jako propustek

Pro úseky 2) a 3) návrh frézování vychází z návrhu úpravy konstrukce vozovky. Návrh frézování úseku 1) vychází z diagnostického průzkumu vozovky, a sice z jádrových vývrtů v provozním staničení km 22,550 (projektové staničení km 0,400), km 22,950 (km 0,800), km 23,150 (km 1,000), km 23,450 (km 1,300), km 23,750 (km 1,600) a km 24,100 (km 1,950). Průměrná tloušťka z uvedených vývrtů byla pro soupis prací určena jako 90mm.

Zhotovitel při frézování zjistil, že v úseku km 1,450 – 1,690 (projektového staničení) je tloušťka stávající asfaltových hutněných vrstev do 180mm, v úseku km 1,690 – 1,830 je tloušťka stávající asfaltových hutněných vrstev 180 – 260 mm a v úseku km 1,900 – 2,030 je tloušťka stávající asfaltových hutněných vrstev průměrně 150 mm.

Přestože diagnostický průzkum vozovky byl proveden dle TP 87, nebyly zhotovitelem zjištěné tloušťky vozovky v rámci diagnostického průzkumu vozovky zastíženy z důvodu, že diagnostický průzkum vozovky je bodový průzkum (zatímco frézování je průzkum plošný). Po zjištění této skutečnosti zhotovitelem provedl AD místní šetření, kterým uvedené tloušťky vozovky zkontroloval.

Na základě výše uvedených skutečností AD souhlasí s návrhem ZBV č. 1.

S pozdravem za Pontex s.r.o.

Ing. Jan Bažil

PONTEX spol. s r.o.
Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4



IČO: DIČ: CZ40763439
Bankovní ČSOB, a.s., č. účtu: 474022543/0300
MONETA Money Bank, a.s., č. účtu: 82306504/0600
Sídlo: Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4, IDDS: nrpt3sn
Firma je zapsána v OR MS v Praze, oddíl C, vložka 2994 ze dne 17.7.1991

jedna-
sekre-

Ing. Václav Hvizdal
Ing. Milan Kalný
Ing. Martin Havlík
tel.: +420-244 462

tel.: +420-244 462
tel.: +420-244 462
e-mail: pon-

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

II/610 Benátky n/J, most ev.č. 610-021 a přes D10

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Silnice II/610

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

SO 101/002

Číslo ZBV:

2

Objednatel: Středočeský kraj
Zborovská 11, 150 21 Praha 5
IČ: 70891095 DIČ:CZ70891095

Zhotovitel: Skanska, a.s.
Křižikova 682/34a, Karlín, 186 00 Praha 8
IČ: 26271303 DIČ: CZ699004845

Rekapitulace ZBV č. 2 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.1	0,00	197 276,00	197 276,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.3	-25 855,00	0,00	-25 855,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.4	-21 780,00	125 000,25	103 220,25

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2	-47 635,00	322 276,25	274 641,25

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré:

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: II/610 Benátky n/J, most ev.č. 610-021 a přes D10 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Silnice II/610	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: SO 101/002	Číslo ZBV: 2.1
--	--	--------------------------

Strany smlouvy o dílo objednatele č.: S-4722/DOP/2019 a zhotovitele č.: 10000144722 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 12.12.2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Středočeský kraj se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha

Zhotovitel: Skanska, a.s. se sídlem Křížkova 682/34a, 186 00 Praha 8 - Karlín

Přílohy Změnového listu:			Paré č.	Příjemce
1. Krycí list	1	počet listů	1, 2	Objednatel
2. Změnový list ZBV 02	3	počet listů	3	Zhotovitel
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů	4	Projektant
4. Rozpis ocenění Změn položek ZBV	3	počet listů	5	Stavební dozor
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů	6	Supervize
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů		
Další doklady dle přehledu dokladů	42	počet listů		

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny: **Plocha povrchu vrchní vrstvy vozovky dle skutečného zaměření**

Plocha povrchu vrchní vrstvy vozovky dle skutečného zaměření

Na základě geodetického zaměření (viz příloha č. 09 - Geodetické zaměření plochy povrchu vozovky) dochází ke stanovení přesné plochy vozovky Silnice II/610 v rámci obrusné vrstvy. Vzhledem k této skutečnosti dochází ke změně množství položky č. 574B34

Celková cena změny je 197.276,00 Kč bez DPH.

Na základě skutečně provedených prací je tato změna zařazena podle §100 odst. 1 ZZVZ do Skupiny 1 – Vyhrazené změny (Doměrky).

Jedná se o Změnu nepodstatnou, která je podle § 5, odst. 1, písm. a), resp. podle § 7 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29. 05. 2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 1. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tyto změny nepředstavují vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 2) se jedná o změnu vyhrazenou.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
0,00	197 276,00	197 276,00	197 276,00

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí): Skanska, a.s.	jméno	Ing. Jaroslav Svoboda	datum	podpis
Projektant (autorský dozor): Pontex, spol. s.r.o.	jméno	Ing. Pavel Hrdina	datum	podpis
Stavební dozor: IBR Consulting, s.r.o.	jméno	Petr Jiřimský	datum	podpis
Supervize (Regionální dotační kancelář)	jméno	Ing. Václav Chytil	datum	podpis
Zástupce Objednatele: KSÚS SK	jméno	Ing. Jan Lichtneger	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Libor Lesák	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	Jiří Červenka	datum	podpis

Číslo paré:

Rozpis ocenění Změn položek - celkem													
Evidenční číslo a název stavby: II/610 Benátky n/J, most ev.č. 610-021 a přes D10 Číslo a název SO/PS: SO 101 - Silnice II/610 Číslo a název rozpočtu: SO 101 - Silnice II/610								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								SO 101/002					
								Skupina změn 1					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	5	Komunikace						4 888 392,00	0,00	197 276,00	5 085 668,00	197 276,00	4,04%
50	574B34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL 40MM	M2	16 404,000	17 066,000	662,000	298,00	4 888 392,00	0,00	197 276,00	5 085 668,00	197 276,00	4,04%
Celkem								4 888 392,00	0,00	197 276,00	5 085 668,00	197 276,00	4,04%

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Jaroslav Svoboda , stavbyvedoucí

Za Objednatele: Petr Jiřimský , stavební dozor

Datum:

Datum:

Podpis:

Podpis:

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: II/610 Benátky n/J, most ev.č. 610-021 a přes D10 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Silnice II/610	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: SO 101/002	Číslo ZBV: 2.3
--	--	--------------------------

Strany smlouvy o dílo objednatele č.: S-4722/DOP/2019 a zhotovitele č.: 10000144722 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 12.12.2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Středočeský kraj se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha

Zhotovitel: Skanska, a.s. se sídlem Křížkova 682/34a, 186 00 Praha 8 - Karlín

Přílohy Změnového listu:			Paré č.	Příjemce
1. Krycí list	0	počet listů	1, 2	Objednatel
2. Změnový list ZBV 02	0	počet listů	3	Zhotovitel
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	0	počet listů	4	Projektant
4. Rozpis ocenění Změn položek ZBV	0	počet listů	5	Stavební dozor
5. Přehled zařazení změn do skupin	0	počet listů	6	Supervize
6. Přehled dalších dokladů	0	počet listů		
Další doklady dle přehledu dokladů	0	počet listů		

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Dílčí změna č. 1: Dopravní značení

Na základě požadavku Dopravního inspektorátu Policie ČR došlo během realizace ke změně rozsahu dopravního značení (viz příloha č. 16 - Situace dopravního značení). V rámci této změny bylo odstraněno nadbytečné svíslé dopravní značení.

Změna má vliv na množství položky č. 914131.

Celková cena změny je - 11.755,00 Kč bez DPH.

Tato změna vznikla v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, vznikla na základě požadavku třetí osoby, který vznikl v průběhu realizace stavby. Tato změna splňuje podmínky stanovené v §222 odst. 6 ZZVZ a je tak zařazena do Skupiny 3.

Jedná se o Změnu nepodstatnou, která je podle § 5, odst. 1, písm. c), resp. podle § 10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29. 05. 2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 3.

Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná o změnu nepředvídanou.

Dílčí změna č. 2: Kanalizační šachty (drenáže)

V rámci PDPS bylo uvažováno celkem 6 úseků drenáží, kterým s ohledem na délku jednotlivých úseků drenáží odpovídalo celkem 29 šachet.

V RDS došlo k upřesnění návrhu drenáží, který způsobil zmenšení počtu úseků drenáží při jejich stejné délce. Na základě skutečně provedených prací dochází tedy k odečtu 4 ks kanalizačních šachet.

Změna má vliv na množství položky č. 894846

Celková cena změny je - 14.100,00 Kč bez DPH.

Tato změna vznikla na základě upřesnění RSD v průběhu realizace stavby, a proto je zařazena dle §222 odst. 6 ZZVZ do Skupiny 3.

Jedná se o Změnu nepodstatnou, která je tak podle § 5, odst. 1 písm. c), resp. podle § 10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29. 05. 2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 3.

Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná o změnu nepředvídanou.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-25 855,00	0,00	-25 855,00	25 855,00

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí): Skanska, a.s.	jméno	Ing. Jaroslav Svoboda	datum	podpis
Projektant (autorský dozor): Pontex, spol. s.r.o.	jméno	Ing. Pavel Hrdina	datum	podpis
Stavební dozor: IBR Consulting, s.r.o.	jméno	Petr Jiřímský	datum	podpis
Supervize (Regionální dotační kancelář)	jméno	Ing. Václav Chytil	datum	podpis
Zástupce Objednatele: KSÚS SK	jméno	Ing. Jan Lichtneger	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Libor Lesák	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	Jiří Červenka	datum	podpis

Číslo paré:

Rozpis ocenění Změn položek - celkem													
Evidenční číslo a název stavby: II/610 Benátky n/J, most ev.č. 610-021 a přes D10							ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)						
Číslo a název SO/PS: SO 101 - Silnice II/610							SO 101/002						
Číslo a název rozpočtu: SO 101 - Silnice II/610							Skupina změn 3						
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	8	Potrubí						102 225,00	-14 100,00	0,00	88 125,00	-14 100,00	-13,79%
60	894846R	ŠACHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ D 400MM	KUS	29,000	25,000	-4,000	3 525,00	102 225,00	-14 100,00	0,00	88 125,00	-14 100,00	-13,79%
	9	Ostatní konstrukce a práce						63 477,00	- 11 755,00	0,00	51 722,00	- 11 755,00	-18,52%
71	914131	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	27,000	22,000	-5,000	2 351,00	63 477,00	-11 755,00	0,00	51 722,00	-11 755,00	-18,52%
Celkem								165 702,00	- 25 855,00	0,00	139 847,00	- 25 855,00	-15,60%

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Jaroslav Svoboda , stavbyvedoucí

Za Objednatele: Petr Jiřimský , stavební dozor

Datum:

Datum:

Podpis:

Podpis:

Rozpis ocenění Změn položek - celkem													
Evidenční číslo a název stavby: II/610 Benátky n/J, most ev.č. 610-021 a přes D10 Číslo a název SO/PS: SO 101 - Silnice II/610 Číslo a název rozpočtu: SO 101 - Silnice II/610								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								SO 101/002					
								Skupina změn 4					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	7	Přidružená stavební výroba						21 780,00	- 21 780,00	0,00	0,00	- 21 780,00	-100,00%
57	751911R	DEMONTÁŽ SLOUPŮ DŘEVĚNÝCH JEDNODUCHÝCH	KUS	7,000	0,000	-7,000	1 533,00	10 731,00	-10 731,00	0,00	0,00	-10 731,00	-100,00%
58	751912R	DEMONTÁŽ SLOUPŮ DŘEVĚNÝCH DVOJITÝCH	KUS	1,000	0,000	-1,000	1 769,00	1 769,00	-1 769,00	0,00	0,00	-1 769,00	-100,00%
59	75291R	DEMONTÁŽ KABELŮ MÍSTNÍCH	M	320,000	0,000	-320,000	29,00	9 280,00	-9 280,00	0,00	0,00	-9 280,00	-100,00%
		Nové položky											
	1	Zemní práce						0,00	0,00	125 000,25	125 000,25	125 000,25	100,00%
87	184B1R	VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH (MANDLONĚ) + 5 LET PÉČE	KUS	0,000	25,000	25,000	5 000,01	0,00	0,00	125 000,25	125 000,25	125 000,25	100,00%
Celkem								21 780,00	- 21 780,00	125 000,25	125 000,25	103 220,25	473,92%

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Jaroslav Svoboda, stavbyvedoucí

Za Objednatele: Petr Jiřímský, stavební dozor

Datum:

Datum:

Podpis:

Podpis:

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: II/610 Benátky n/J, most ev.č. 610-021 a přes D10 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Silnice II/610	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: SO 101/002	Číslo ZBV: 2.4
--	--	--------------------------

Strany smlouvy o dílo objednatele č.: S-4722/DOP/2019 a zhotovitele č.: 10000144722 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 12.12.2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Středočeský kraj se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha

Zhotovitel: Skanska, a.s. se sídlem Křížkova 682/34a, 186 00 Praha 8 - Karlín

Přílohy Změnového listu:		Paré č.	Příjemce
1. Krycí list	0 počet listů	1, 2	Objednatel
2. Změnový list ZBV 02	0 počet listů	3	Zhotovitel
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	0 počet listů	4	Projektant
4. Rozpis ocenění Změn položek ZBV	0 počet listů	5	Stavební dozor
5. Přehled zařazení změn do skupin	0 počet listů	6	Supervize
6. Přehled dalších dokladů	0 počet listů		
Další doklady dle přehledu dokladů	0 počet listů		

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Dílčí změna č. 1: Náhradní výsadba dřevin

Náhradní výsadba dřevin s následnou péčí nebyla uvedena v soupisu prací v rámci soutěže o Dílo ani specifikována v projektové dokumentaci. Na základě požadavku rozhodnutí MěÚ BnJ (viz příloha č. 15 - MěÚ BnJ - Rozhodnutí o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les) bylo požadováno po pokácení stávajících dřevin provést náhradní výsadbu mandloní v počtu 25 ks s následnou pěstební péčí o vysazené dřeviny po dobu 5 let.

Nová položka: 184B1R

Celková cena změny je 125.000,25 Kč bez DPH.

Jedná se o Změnu nepodstatnou, která je podle § 5, odst.1 písm.d), resp.podle § 11 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29. 05. 2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 4 jako nezbytná. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 5) se jedná o změnu nezbytnou.

Dílčí změna č. 2: Odstranění sloupků a vedení

PDPS předpokládala souběžně s realizací stavby „II/610 Benátky n/J, most ev.č. 610-021 a přes D10“ také realizace přeložky sdělovacího vedení společností CETIN. Vzhledem ke skutečnosti, že realizace přeložky sdělovacího vedení CETIN nebyla nezbytná pro dokončení Díla a její provedení nebylo možné s ohledem na aktuální stav majetkoprávního vypořádání s vlastníky dotčených pozemků, rozhodl Objednatel o nerealizaci této přeložky a také o neprovedení demontáže původních dřevěných sloupků a kabelů (viz příloha č. 17 - Prohlášení Objednatele).

Změna má vliv na množství položek č. 751911R, 751912R, 75291R

Celková cena změny je - 21.780,00 Kč bez DPH.

Jedná se o Změnu nepodstatnou, která je podle § 5, odst.1 písm.d), resp.podle § 11 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29. 05. 2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 4 jako nezbytná. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 5) se jedná o změnu nezbytnou.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-21 780,00	125 000,25	103 220,25	146 780,25

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí): Skanska, a.s.	jméno	Ing. Jaroslav Svoboda	datum	podpis
Projektant (autorský dozor): Pontex, spol. s.r.o.	jméno	Ing. Pavel Hrdina	datum	podpis
Stavební dozor: IBR Consulting, s.r.o.	jméno	Petr Jiřímský	datum	podpis
Supervize (Regionální dotační kancelář)	jméno	Ing. Václav Chytil	datum	podpis
Zástupce Objednatele: KSÚS SK	jméno	Ing. Jan Lichtneger	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Libor Lesák	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	Jiří Červenka	datum	podpis
				Číslo paré:

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 2**

Název Stavby:	II/610 Benátky n/J, most ev.č. 610-021 a přes D10
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	101/002
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	Silnice II/610

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
38 514 173,09

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	572 375,47	39 086 548,56	572 375,47

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-47 635,00	322 276,25	894 651,72	2,32%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-47 635,00	39 361 189,81	847 016,72	2,20%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

Skanska a.s.

souhlasím

Ing. Jaroslav Svoboda

Projektant (autorský dozor):

Pontex spol. s.r.o.

souhlasím

Ing. Pavel Hrdina

Stavební dozor:

IBR Consulting, s.r.o.

souhlasím

Petr Jiřímský

Zástupce Objednatele:

KSÚS SK

souhlasím

Ing. Jan Lichtneger

Supervize (RDK)

souhlasím

Ing. Václav Chytil

Zaměstnanec KSÚS SK

odpovědný za cenové
projednání Změny:

souhlasím

Ing. Milan Peška

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: **II/610 Benátky n/J, most ev.č. 610-021 a přes D10**

1	Přijaté smluvní částka bez rezervy a DPH	71 463 942,89
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	72 310 959,41
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	87 496 260,89
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	101,19%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,28%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%
40=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, odst. (5), písm. b)	-0,07%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	649 740,72
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	0,91%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	21 439 182,81

9=(32A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	0,84%
10=(36A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,21%
10A=32A+36A	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	745 010,72
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	35 731 971,35

12=(39)	Sledování limitu 15 %	0,00%
13=ABS(37)+38	Sledování limitu v %	0,00%
14=137366000-37	Hodnota skupiny 5	0,00

- 1 -																											
- 2 -																											
- 3 -																											
- 4 -																											
- 5 -																											
Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)						Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)						Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)						Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)						Změny de minimis Změny neměnicí celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)			
SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	limit 15 %					
16	17	18	19=23+26+29+33	20=24+27+30+34+37+39	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	32=29+30	32A=ABS(29)+30	33	34	36=33+34	36A=ABS(33)+34	37	38	39=(ABS(37)+38)/1					
		II/610 Benátky n/J, most ev.č. 610-021 a přes D10	- 47 635,00	894 651,72	847 016,72	0,00	197 276,00	197 276,00	0,00	0,00	0,00	- 25 855,00	572 375,47	546 520,47	598 230,47	- 21 780,00	125 000,25	103 220,25	146 780,25	0,00	0,00	0,00%					
101	1	Sílnice II/610 / Změna mocnosti asfaltových vrstev - frézování	0,00	572 375,47	572 375,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 375,47	572 375,47	572 375,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
101	2	Sílnice II/610	- 47 635,00	322 276,25	274 641,25	0,00	197 276,00	197 276,00	0,00	0,00	0,00	- 25 855,00	0,00	-25 855,00	25 855,00	- 21 780,00	125 000,25	103 220,25	146 780,25	0,00	0,00	0,00%					

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	2
Název a evidenční číslo stavby:	II/610 Benátky n/J, most ev.č. 610-021 a přes D10
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Silnice II/610
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	101/002

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
07 - Rozpis celého SO po změnách	17	
08 - Zápis z KD č. 11 - Plocha vozovky	3	
09 - Geodetické zaměření plochy povrchu	3	
10 - Vyjádření AD k ploše vozovky	1	
11 - Přehled nových položek	1	
12 - Kalkulace položky č. 184B1R	1	
13 - Cenové nabídky - Náhradní výsadba	4	
14 - Zápis z KD č. 1 - Náhradní výsadba	3	
15 - MěÚ BnJ - Rozhodnutí o povolení kácení a náhradní výsadby dřevin	3	
16 - Situace dopravní značení	2	
17 - Prohlášení Objednatele	1	
18 - Vyjádření AD - Kanalizační šachty (drenáže)	1	
19 - Vyjádření TDS - ZBV č. 2	2	
20 - RDS	0	pouze na CD u objednatele
Počet listů celkem	42	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: II/610 Benátky n/J, most ev.č. 610-021a přes D10 před obcí Benátky n/J a opr.kom.22,353-24,853 km

Objekt: SO101 Silnice II/610

Rozpočet: SO101 Silnice II/610

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Skanska a.s.

Základní cena: 38 514 173,09 Kč

Cena celková: 39 361 189,81 Kč

DPH: 8 265 849,86 Kč

Cena s daní: 47 627 039,67 Kč

Popis:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/610 Benátky n/J, most ev.č. 610-021a přes D10 před obcí Benátky n/J a opr.kom.22,353-24,853 km
 Objekt: SO101 Silnice II/610
 Rozpočet: SO101 Silnice II/610

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1	014102.A		N	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina, kamenivo, kameny	T	17 663,580	12,00	211 962,96
2	014102.C		N	POPLATKY ZA SKLÁDKU železobeton "odstranění bet. sjezdu (pol. č. 1131A8) "2,5*4,8	T	12,000	295,00	3 540,00
3	014102.D		N	POPLATKY ZA SKLÁDKU živice	T	1 642,520	24,00	39 420,48
4	014102.E		N	POPLATKY ZA SKLÁDKU dřevo "keře "0,03*260 "nepotřebné z kácení (odhad 25%) "0,9*34"(ks)"*1,5"(m3) "Celkem: "A55+B55	T	53,700	808,00	43 389,60
5	014201		N	POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA nákup ornice	M3	1 723,100	668,00	1 151 030,80
6	111208		N	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 20KM ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 20KM "odhad plochy keřů "(60,0+70,0)*2*1,0	M2	260,000	42,00	10 920,00
7	11130		N	SEJMUTÍ DRNU SEJMUTÍ DRNU "úsek před mostem" "(v tl. 0,2m) "10195,81 "úsek před mostem (v tl. 0,3m) "4250,52 "Celkem: "A32+B32	M2	14 446,330	42,00	606 745,86



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/610 Benátky n/J, most ev.č. 610-021a přes D10 před obcí Benátky n/J a opr.kom.22,353-24,853 km
 Objekt: SO101 Silnice II/610
 Rozpočet: SO101 Silnice II/610

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
8	11201		N	KÁČENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ vč. odvozu na místo určené investorem 45	KUS	45,000	1 132,00	50 940,00
9	11202		N	KÁČENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ vč. odvozu na místo určené investorem 45	KUS	45,000	1 721,00	77 445,00
10	11204		N	KÁČENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,3M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ vč. odvozu na místo určené investorem 44	KUS	44,000	755,00	33 220,00
11	113188		N	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 20KM vč. očištění a uložení na místo určené investorem	M3	0,640	1 203,00	769,92
12	1131A8		N	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU VYZTUŽENÉHO, ODVOZ DO 20KM ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU VYZTUŽENÉHO, ODVOZ DO 20KM 24*0,2	M3	4,800	4 115,00	19 752,00
13	113328		N	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM	M3	1 399,180	323,00	451 935,14



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/610 Benátky n/J, most ev.č. 610-021a přes D10 před obcí Benátky n/J a opr.kom.22,353-24,853 km
Objekt: SO101 Silnice II/610
Rozpočet: SO101 Silnice II/610

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
				(3413.11+1508*1.25*2)*0.1+1837.29*(0.55-0.09-0,1) "odstranění kameniva pod dlažbou A37 zpevněnými sjezdy "50,85*0,25+11,49*0,29 "překopy "2*2*8,5*0,1 "Celkem: "A37+B37+C37				
14	113338	N		ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM (3413.11+1508*0,5*2)*0.1+1837.29*0,1 "překopy "2*3,0*8,5*0,1 "rekultivace "332,0*0,1 "Celkem: "A50+B50+C50	M3	714,140	335,00	239 236,90
15	113524	N		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 5KM vč. poplatku za skládku 40,0	M	40,000	159,00	6 360,00
16	113534	N		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ DO 5KM vč. očištění a uložení na místo určené investorem 25,0	M	25,000	217,00	5 425,00
17	113554	N		ODSTRANĚNÍ OBRUB Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK JEDNODUCHÝCH, ODVOZ DO 5KM vč. očištění a odvozu na místo určené investorem 2*1508	M	3 016,000	237,00	714 792,00
18	113728	N		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM	M3	1 614,370	1 909,00	3 081 832,33



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/610 Benátky n/J, most ev.č. 610-021a přes D10 před obcí Benátky n/J a opr.kom.22,353-24,853 km
 Objekt: SO101 Silnice II/610
 Rozpočet: SO101 Silnice II/610

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	ZBV:							
	01			Změna mocnosti frézování asfaltových vrstev 1914,2-1614,37=299,830 [A]		299,830		572 375,47
				aktuální množství		1 914,200		3 654 207,80
19	113764	N		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE 6.68+8.78+3.28+8.08+8.37+8.38+8.07+3.29+7.24+37,7+54,75+26,14+6,99+7,85+2,94+32,0 "sanace úzkých trhlin "614*6.5/10 "Celkem: "A47+B47	M	629,640	51,00	32 111,64
20	113765	N		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE "sanace širokých trhlin "614*6.5/100	M	39,910	928,00	37 036,48
21	123738	N		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM "výkop dle planimetrie "1710.28 "aktivní zóna - 50% plochy " (3413.11+1508*1.5*2+1837.29+223*(0.04+0.05+0.06+0.05+0.05+0.1+0.3+0.1+0.3))*0.3*0.5 "vsak. příkop "600*1,2*1,0 "propustky "45,14*2,21+8,9*2,52 "překopy "2*1,0*8,5*0,6 "Celkem: "A38+B38+C38+D38+E38	M3	4 063,950	203,00	824 981,85
22	125738	N		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 20KM VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	1 723,100	159,00	273 972,90



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/610 Benátky n/J, most ev.č. 610-021a přes D10 před obcí Benátky n/J a opr.kom.22,353-24,853 km
 Objekt: SO101 Silnice II/610
 Rozpočet: SO101 Silnice II/610

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
23	12924		N	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 200MM tl. 150mm (2422*2-503.59-60*2-8*2)*0.5+503.59*1.5	M2	2 857,590	156,00	445 784,04
24	17120		N	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ "výkop (pol. č. 123738) "1710,28 "aktivní zóna (pol. č. 123738) "1501,283 "vsak příkop "600*1,2*1,0 "propustky "45,14*2,21+8,9*2,52 "překopy "2*1,0*8,5*0,6 "Celkem: "A39+B39+C39+D39+E39	M3	4 063,950	19,00	77 215,05
25	17180.a		N	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	653,680	483,00	315 727,44
26	17180.b		N	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	1 501,280	659,00	989 343,52
27	17380		N	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ "dosypávky "0.05*(2345*2-581)+0.3*581	M3	379,750	1 394,00	529 371,50
28	18110		N	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	19 389,830	29,00	562 305,07
29	18222		N	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M	M2	11 487,310	17,00	195 284,27



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/610 Benátky n/J, most ev.č. 610-021a přes D10 před obcí Benátky n/J a opr.kom.22,353-24,853 km
 Objekt: SO101 Silnice II/610
 Rozpočet: SO101 Silnice II/610

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
30	18242		N	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI	M2	10 947,310	22,00	240 840,82
31	18245		N	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU ZATRAVŇOVACÍ TEXTILÍ (ROHOŽÍ) protierozní ochrana svahů georochoží vč. vysetí trávníku, zalití a prvního pokosení 260+280	M2	540,000	538,00	290 520,00
32	184C1		N	VYSAZOVÁNÍ KEŘŮ JEHLIČNATÝCH S BALEM VČETNĚ VÝKOPU JAMKY VYSAZOVÁNÍ KEŘŮ JEHLIČNATÝCH S BALEM VČETNĚ VÝKOPU JAMKY "obnova živ. plotu 10.28/0.6+1=18.133 "18	KUS	18,000	101,00	1 818,00
33	21197		N	OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE "trativody "2,5*1109,0 "vsak. žebro "600,0*2*(1,0+1,2+0,25) "Celkem: "A83+B83	M2	5 712,500	21,00	119 962,50
34	212635		N	TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ I TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ I 433+256+160+101+105+54	M	1 109,000	450,00	499 050,00
35	451314		N	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	9,160	3 207,00	29 376,12
36	45152		N	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	720,000	936,00	673 920,00



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/610 Benátky n/J, most ev.č. 610-021a přes D10 před obcí Benátky n/J a opr.kom.22,353-24,853 km
 Objekt: SO101 Silnice II/610
 Rozpočet: SO101 Silnice II/610

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
				"ŠD do vsak. příkopů "600*1,0*1,2				
37	45157	N		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	26,270	849,00	22 303,23
38	461314	N		PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 C25/30 XF3	M3	1,010	9 762,00	9 859,62
39	465512	N		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC tl. 300mm	M3	18,330	5 875,00	107 688,75
40	56333	N		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM "sjezdy "272.88	M2	272,880	121,00	33 018,48
41	56335	N		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM tl. min. 200mm	M2	12 223,790	179,00	2 188 058,41
42	56336	N		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 300MM tl. min. 250mm 11.49+26.85+24	M2	62,340	423,00	26 369,82
43	567534	N		VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 150MM RS CA vč. materiálu nutného k doplnění křivky zrnitosti a pojiva 6486.78+3413.11+2*1508*(0.04+0.05+0.06+0.05+0.05+0.15)	M2	11 106,290	360,00	3 998 264,40



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/610 Benátky n/J, most ev.č. 610-021a přes D10 před obcí Benátky n/J a opr.kom.22,353-24,853 km
 Objekt: SO101 Silnice II/610
 Rozpočet: SO101 Silnice II/610

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
44	56933		N	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM (2345*2-581-8*2)*0.5+581*1.5	M2	2 918,000	112,00	326 816,00
45	572123		N	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 0,6kg/m2 (6486.78+3413.11+1837.29+26.85+24)+2*(1508+223)*(0.04+0.05+0.06+0.05+0.05+0.15)	M2	13 172,830	24,00	316 147,92
46	572212		N	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK ASFALTU DO 0,5KG/M2 0,35kg/m2	M2	33 570,290	15,00	503 554,35
47	572222		N	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK ASFALTU DO 1,0KG/M2 0,6kg/m2 (179.68+4342.49)+2*614*(0.04+0.05+0.06+0.05+0,05+0,05)	M2	4 890,570	24,00	117 373,68
48	5740E6		N	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S	M3	220,380	4 834,00	1 065 316,92
49	57475		N	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY "sanace širokých trhlin " 2,0*(614*6,5/100)	M2	79,820	556,00	44 379,92
50	574B34		N	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM ACO 11+ modif. (179.68+4342.49+6486.78+3413.11+1837.29+26.85+24.0)+2*2345*0.02	M2	16 404,000	298,00	4 888 392,00

ZBV:



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/610 Benátky n/J, most ev.č. 610-021a přes D10 před obcí Benátky n/J a opr.kom.22,353-24,853 km
 Objekt: SO101 Silnice II/610
 Rozpočet: SO101 Silnice II/610

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	02			ZBV č. 2		662,000		197 276,00
				aktuální množství		17 066,000		5 085 668,00
51	574D56		N	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM ACL 16+, modif. (4342.49+6486.78+3413.11+1837.29)+2*2345*(0.04+0.05+0.03)	M2	16 642,470	311,00	5 175 808,17
52	574E46		N	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM ACP16+ (4342.49+6486.78+3413.11+1837.29)+2*2345*(0.04+0.05+0.06+0.05+0.025)	M2	17 134,920	242,00	4 146 650,64
53	574E56		N	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM 26.85+24	M2	50,850	290,00	14 746,50
54	58221		N	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA 18,75	M2	18,750	1 114,00	20 887,50
55	582611		N	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM 11.49-2*0,4*1,25	M2	10,490	619,00	6 493,31



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/610 Benátky n/J, most ev.č. 610-021a přes D10 před obcí Benátky n/J a opr.kom.22,353-24,853 km
 Objekt: SO101 Silnice II/610
 Rozpočet: SO101 Silnice II/610

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
56	58261A		N	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM 2*0,4*1,25	M2	1,000	918,00	918,00
57	751911R		N	DEMONTÁŽ SLOUPŮ DŘEVĚNÝCH JEDNODUCHÝCH vč. odvozu a ekologické likvidace 7	KUS	7,000	1 533,00	10 731,00
	ZBV:		02	ZBV č. 2		-7,000		-10 731,00
				aktuální množství		0,000		0,00
58	751912R		N	DEMONTÁŽ SLOUPŮ DŘEVĚNÝCH DVOJITÝCH vč. odvozu a ekologické likvidace 1	KUS	1,000	1 769,00	1 769,00
	ZBV:		02	ZBV č. 2		-1,000		-1 769,00
				aktuální množství		0,000		0,00
59	75291R		N	DEMONTÁŽ KABELŮ MÍSTNÍCH vč. odvozu a ekologické likvidace 320	M	320,000	29,00	9 280,00
	ZBV:							



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/610 Benátky n/J, most ev.č. 610-021a přes D10 před obcí Benátky n/J a opr.kom.22,353-24,853 km
 Objekt: SO101 Silnice II/610
 Rozpočet: SO101 Silnice II/610

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		02		ZBV č. 2		-320,000		-9 280,00
				aktuální množství		0,000		0,00
60	894846R		N	ŠACHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ D 400MM kontrolní drenážní šachta vč. rámu a poklopu "1109/50+6=28.180 29	KUS	29,000	3 525,00	102 225,00
	ZBV:							
		02		ZBV č. 2		-4,000		-14 100,00
				aktuální množství		25,000		88 125,00
61	899524		N	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 C25/30 XF3 vč. nátěru proti zemní vlhkosti	M3	37,540	3 591,00	134 806,14
62	9113A1		N	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ 68+81+68+102+68+68+68+58	M	581,000	909,00	528 129,00
63	9113A3		N	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM 28.2+102.64+91.48+99.81+135.37+12.38+11.93+10.32+11.46	M	503,590	354,00	178 270,86



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/610 Benátky n/J, most ev.č. 610-021a přes D10 před obcí Benátky n/J a opr.kom.22,353-24,853 km
 Objekt: SO101 Silnice II/610
 Rozpočet: SO101 Silnice II/610

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
64	912151		N	SVODNICE SAMOSTATNÁ - DODÁVKA A MONTÁŽ vč. distančních. prvků 4"ks(délka svodnice 4m)	KUS	4,000	4 575,00	18 300,00
65	912153		N	SVODNICE SAMOSTATNÁ - DEMONTÁŽ A ODVOZ SVODNICE SAMOSTATNÁ - DEMONTÁŽ A ODVOZ "výměna nad propustkem "4"ks(4m)	KUS	4,000	1 061,00	4 244,00
66	91228.a		N	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU bílé 2*80	KUS	160,000	330,00	52 800,00
67	91228.b		N	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU modré 2*12	KUS	24,000	330,00	7 920,00
68	91228.c		N	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU červené 17*2	KUS	34,000	330,00	11 220,00
69	91238.a		N	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU bílé 2*15	KUS	30,000	330,00	9 900,00
70	91238.b		N	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	30,000	330,00	9 900,00



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/610 Benátky n/J, most ev.č. 610-021a přes D10 před obcí Benátky n/J a opr.kom.22,353-24,853 km
 Objekt: SO101 Silnice II/610
 Rozpočet: SO101 Silnice II/610

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
				modré 2*15				
71	914131		N	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ kompletní vč. sloupku 4+6+2+2+4+3+2+2+1+1	KUS	27,000	2 351,00	63 477,00
	ZBV:		02	ZBV č. 2		-5,000		-11 755,00
				aktuální množství		22,000		51 722,00
72	914133		N	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ 23"ks	KUS	23,000	118,00	2 714,00
73	914421		N	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ 1+1	KUS	2,000	7 289,00	14 578,00
74	914433		N	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ 2	KUS	2,000	118,00	236,00



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/610 Benátky n/J, most ev.č. 610-021a přes D10 před obcí Benátky n/J a opr.kom.22,353-24,853 km
 Objekt: SO101 Silnice II/610
 Rozpočet: SO101 Silnice II/610

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
75	915111		N	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	1 497,130	94,00	140 730,22
76	915211		N	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA "V11a" 2*10 "V13a (0.5/1.0)" 12/3 "Celkem: "A23+B23	M2	24,000	377,00	9 048,00
77	915231		N	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - DOD A POKLÁDKA VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - DOD A POKLÁDKA	M2	1 473,130	336,00	494 971,68
78	917212		N	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM 11,0	M	11,000	278,00	3 058,00
79	917224		N	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM 61+54+32	M	147,000	387,00	56 889,00
80	91743		N	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH KRAJNÍKŮ KS3 25.56	M	25,560	617,00	15 770,52
81	9183B2		N	PROPUSTY Z TRUB DN 400MM ŽELEZOBETONOVÝCH	M	45,140	2 149,00	97 005,86



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/610 Benátky n/J, most ev.č. 610-021a přes D10 před obcí Benátky n/J a opr.kom.22,353-24,853 km
 Objekt: SO101 Silnice II/610
 Rozpočet: SO101 Silnice II/610

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
				PROPUSTY Z TRUB DN 400MM ŽELEZOBETONOVÝCH 11.42+14.59+10.59+8.54				
82	9183C2		N	PROPUSTY Z TRUB DN 500MM ŽELEZOBETONOVÝCH PROPUSTY Z TRUB DN 500MM ŽELEZOBETONOVÝCH 8,9	M	8,900	3 124,00	27 803,60
83	919113		N	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM 6.68+61.01+57.59+8.78+3.28+7.67+8.27+3.29+7.24+4*8,5	M	197,810	141,00	27 891,21
84	931324		N	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 400MM2 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 400MM2 6.68+8.78+3.28+8.08+8.37+8.38+8.07+3.29+7.24+37,7+54,75+26,14+6,99+7,85+2,94+32,0 "sanace úzkých trhlin "614*6.5/10 "Celkem: "A2+B2	M	629,640	46,00	28 963,44
85	931325		N	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2 "sanace širokých trhlin "614*6.5/100	M	39,910	525,00	20 952,75
86	935412		N	ŽLABY A RIGOLY Z BETONOVÝCH ŽLABOVEK ŠÍŘKY DO 600 MM DO BETONU ŽLABY A RIGOLY Z BETONOVÝCH ŽLABOVEK ŠÍŘKY DO 600 MM DO BETONU 430+341+140	M	911,000	582,00	530 202,00



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/610 Benátky n/J, most ev.č. 610-021a přes D10 před obcí Benátky n/J a opr.kom.22,353-24,853 km
Objekt: SO101 Silnice II/610
Rozpočet: SO101 Silnice II/610

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
87	184B1R		N	VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH (MANDLONĚ) + 5 LET PÉČE	KUS	0,000	5 000,01	0,00
	ZBV:							
		02		ZBV č. 2		25,000		125 000,25
				Jednotková cena stanovena podle nejnižší z příložených cenových nabídek (viz příloha č. 13 - Cenové nabídky - Náhradní výsadba)				
				aktuální množství		25,000		125 000,25
Celkem:								39 361 189,81

Zápis z kontrolního dne

II/610 Benátky nad Jizerou, most ev. č. 610-021a přes D10

Kontrolní den	
číslo	11 konaný dne 20.5.2020
Účastníci	
Seznam účastníků je uveden v příloze č.1	
Zpráva o průběhu výstavby	
plnění věcného harmonogramu	Počáteční HMG předložen, bude průběžně aktualizován.
popis provedených prací	Osazeno DIO, práce na SO 101 – odstraňování krytů, krajníků, demolice mostu 610-021a, kácení dřevin, dmtž svodidel, demolice SS mostu, strhávání krajnic, bourání krajnikových kostek, pilotáž a zápory na benátecké straně, odkopání a bourání hlav pilot O4, zahájeny sanace SO 101 – odkopy. Pilotáž pilot O1, zápory pro pažení P2, hloubení jámy pro mikropiloty (P3), vázání výztuže základu O4, betonáž základu O4, betonáž dřívku O4, O1: podkladní beton, vázání výztuže základu. Betonáž obou dřívků opěr, vrtání mikropilot na P3+P2, drenáže SO 101, betonáž základu P2+P3, doplňování materiálu do krajnic, betonáž pilířů P3, doplňování materiálu do vozovky, betonáž pilířů P2, spádové betony P3, příprava na recyklaci SO 101, zhotovení vrstvy RS CA v 1. úseku, betonáž 2 nosníků, pokládka obrub
finanční plnění	měsíční fakturace – uvádět registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/0009173, ADA 4860
fotodokumentace	Pořizována průběžně
Kontrola kvality	
Plnění Technické specifikace (TP, TKP, ZTKP, normy, TePř, atd.) a Kontrolního a zkušebního plánu	
Průběžně, v případě potřeby zápisem ve SD.	
Vyhodnocení výsledků geodetického měření	
Geodetické zaměření upraveno na místní systém.	
Požadavky na zkoušky (kontrolní, průkazné)	
Viz. KZP	
Stav BOZP a PO	
DIO a informační tabule rozmístěny, oznámení OIP vyvěšeno na vjezdech a vstupech do stavby, dočasné značení průběžně udržováno. Více viz. zápisy v SD. KooBOZP požaduje pravidelnou kontrolu přechodného dopravního značení DIO.	
Různé	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Staveniště bylo předáno dne 9.3.2020. 2. Termín dokončení stavby je dle SOD do 9 měsíců ode dne doručení výzvy (4.12.2020). 3. Dílčí části RDS budou předkládány (koncepty) elektronicky v dostatečném předstihu. 4. Obyvatelé sousedící se stavbou a další dotčené subjekty budou v dostatečném předstihu informováni o technologických procesech, které neumožňují příjezd k „hájojně“. 5. TDS provede přípravu k vypořádání dočasných záborů. 6. TDS požaduje pravidelný úklid staveniště a zejména přilehlých ploch od zbytků materiálů a komunálního odpadu. 	

Kontrola kvality provedených (dokončených) stavebních prací

Průběžně, odsouhlasení zápisem ve SD, připomínky zápisem ve SD.

Vyhodnocení provedených zkoušek

TDS požaduje bezodkladné předávání protokolů z kontrolních zkoušek.

Kontrola úkolů z minulého KD


Úkol číslo	Název	Skutečný stav plnění úkolu	Splněno
1.2	ZBV	TDS upozorňuje na možná ZBV: náhradní výsadba, doměrky (frézování). TDS upozorňuje na včasné oznamování a procesování ZBV. Zht oznámil pravděpodobné ZBV – změna kalkulace dopravy odkupovaného materiálu (toto ZBV nebude realizováno)	trvá
1.3	Odkupy vytěžených materiálů	K odkupu jsou: svodidla (ks), dřevní hmota (m3), vyfrézovaná živice (zaměření kubatury + přepočet 2,3t/m3 – viz. položka 3, SO 101 v soupisu prací). Ostatní použije KSÚS. Pro odkup je nutno doložit vážní lístky apod. Bude řešeno formou kupní smlouvy. Zbytek vytěžených, odkupovaných materiálů požaduje objednatel odvézt na mezideponii fa. Skanska.	trvá
5.1	Odkup kovových odpadů	TDS požaduje předložení vážních lístků na odkup kovových odpadů (mimo svodidel), následně bude zpracován odkup zhotovitelem od objednatele. Bude řešeno s odkupy ostatních vytěžených materiálů.	trvá
9.1	TePř+KZP – NK a SO101	TDS požaduje předložení TePř a KZP na: a) SO 240 – NK (do 22.5.2020); b) SO101 – úprava hydraulickými pojivy a konstrukční vrstvy – předloženo, vypouští se	9.1 a trvá
10.1	Napojení asf. krytů v počátku úseku	Zhotovitel upozornil na napojení na stavbu jiného zhotovitele živičných krytů v počátku úseku (křižovatka 610x2729a; uzl. bod1311A021). K propojení krytů chybí cca 10 bm ve dvou vrstvách (ACO+ACL). Zhotovitel žádá objednatele o objasnění nesrovnalosti. Bude provedeno dopojení ke stávajícím krytům – provede fa Skanska.	doplněno

Nové úkoly

Úkol číslo	Název	Obsah úkolu a požadovaný cílový stav	Odpovídá	Termín

Datum konání příštího KD 27.5.2020, 10:30 na zařízení staveniště

V případě, že máte k tomuto zápisu připomínky, sdělte je prosím do 2 dnů od vydání. V opačném případě se má za to, že jste zápis odsouhlasili.



Zapsal

Petr Jiřímský, TDS

Podpis



Přílohy

Číslo	Název
1	Prezenční listina

Příloha č. 1

K evidenčnímu číslu: II610-021a/2005/2020/PEJ

Prezenční listina


Kontrolní den stavby			
číslo	11	konaný dne	20.5.2020
Jméno, příjmení, titul	Organizace, funkce	Telefon, e-mail	Podpis
Tomáš Zikmund	TDS, IBR Consulting		
Petr Jiřímský	TDS, IBR Consulting		
Ing. Milan Peška	vedoucí investic, KSÚS		
Jan Bažil	AD, Pontex		
Jaroslav Svoboda	stavbyvedoucí, Skanska		
Jiří Červenka	hl. stavbyvedoucí, Skanska		
Petr Hofmann	Koo BOZP		

PROTOKOL – PLOCHA POVRCHU A TLOUŠŤKA VRCHNÍ VRSTVY VOZOVKY

Název akce: **Benátky nad Jizerou – oprava komunikace II/610**
- kontrolní zaměření povrchu a tloušťky vrchní vrstvy vozovky

Zak.č.: 20-20
Lokalita: k.ú. Staré Benátky, pozemek pč. 916/3, 918/2, 1162 a 1222
 k.ú. Předměřice nad Jizerou, pozemek pč. 881/1

Objednatel: Skanska a.s. – divize Inženýrské stavitelství, závod Čechy
 K Betonárně 303, 155 00 Praha 5 – Řeporyje

Zaměřil: Ing. Jindřich Majer - geodetické práce (IČ 44351585)


Odpovědný geodet: Ing. Jindřich Majer (č.oprávnění 1375/95)

Datum zaměření: 10.9.2020 (před pokládkou), 1.- 8.10.2020 (po pokládce)
Souřadnicový systém: S-JTSK
Výškový systém: Balt p.v.

Na základě zadání objednatele byl zaměřen tvar a tloušťka vrchní vrstvy komunikace. Plocha povrchu vozovky byla převzata ze zaměření skutečného provedení stavby. Pro určení tloušťky vrchní vrstvy byla komunikace měřena třemi body před a po pokládce této vrstvy v příčných profilech ve vzdálenostech cca po 200 m.

Polohové a výškové připojení: na měřické body zhotovené v průběhu stavby č. 5204, 5302, 5305, 5308, 6001-6004, 6409 a trigonometrický bod ZPBP č. 14 (TL 1408, věž zámeckého kostela Benátky n. J.). Souřadnice nových měřických bodů č. 5206, 5208, 5210, 5211, 5409-5415 byly určeny polygonovými pořady a bod č 5212 rajonem.

Určení plochy povrchu a tloušťky vrchní vrstvy vozovky:

Zaměření bylo provedeno tachymetricky přístrojem Trimble C5 a Trimble S5, měření metodou GNSS aparaturou Trimble R2. Relativní (vzájemná) polohová přesnost zaměření podrobných bodů = 0,015 m, přesnost určení výšek bodů zaměřených tachymetricky = 0,007 m. Absolutní přesnost podrobných bodů odpovídá kódu kvality 3 podle příl. 13.9 vyhl.č. 357/2013 Sb. v platném znění.

Pro určení tloušťky vrchní vrstvy byla komunikace měřena třemi body před a po pokládce této vrstvy v příčných profilech ve vzdálenostech cca po 200 m. Tloušťky vrchní vrstvy vozovky v jednotlivých profilech ve třech bodech jsou uvedeny v tabulce, která je součástí této zprávy.

Kraj vozovky byl převzat z dokumentace skutečného provedení stavby a následně byly z 2D CAD výkresu odečteny výsledná plocha vozovky. Plocha vozovky je rozdělena na tři dílčí části: komunikace směr Předměřice, most (povrch ohraničený římsami), komunikace směr Benátky.

Digitální výkres plochy vozovky a umístění profilů ve formátu *.dgn a *.dwg je součástí dokumentace.

Schematické znázornění umístění profilů a jednotlivých ploch je součástí této zprávy.

VÝSLEDNÁ PLOCHA POVRCHU VOZOVKY:

	Plocha
A – komunikace směr Předměřice	11 723 m ²
B – most	507 m ²
C – komunikace směr Benátky	5 268 m ²
celkem	17 498 m ²

V Praze dne 9.10.2020

Vypracoval : Ing. Jindřich Majer,





Benátky nad Jizerou - oprava komunikace II/610
TLOUŠŤKY VRCHNÍ VRSTVY VOZOVKY

Profil		Bod profilu	Y [m]	X [m]	H ₁ [m]	H ₂ [m]	ΔH = H ₂ - H ₁ [mm]
P1	L	3052	713148,02	1026844,93	206,796	206,843	47
	S	3053	713150,21	1026847,45	206,716	206,752	36
	P	3054	713152,43	1026849,98	206,620	206,652	32
P2	L	3049	713070,77	1026914,98	209,450	209,491	41
	S	3050	713073,26	1026917,24	209,518	209,557	39
	P	3051	713075,57	1026919,53	209,480	209,517	37
P3	L	3046	712966,98	1026998,70	213,334	213,367	33
	S	3047	712968,80	1027001,71	213,422	213,462	40
	P	3048	712970,52	1027004,29	213,428	213,465	37
P4	L	3043	712790,95	1027087,93	215,863	215,902	39
	S	3044	712791,66	1027092,26	216,156	216,202	46
	P	3045	712792,32	1027096,01	216,337	216,381	44
P5	L	3040	712773,64	1027113,48	216,454	216,486	32
	S	3041	712768,07	1027112,93	216,538	216,587	49
	P	3042	712762,89	1027112,78	216,598	216,642	44
P6	L	3037	712748,86	1027083,86	216,100	216,137	37
	S	3038	712747,91	1027087,66	216,374	216,409	35
	P	3039	712746,97	1027091,07	216,576	216,616	40
P7	L	3034	712637,01	1026974,62	215,959	216,007	48
	S	3035	712634,63	1026976,68	215,908	215,954	46
	P	3036	712632,09	1026979,00	215,863	215,904	41
P8	L	3031	712490,13	1026839,28	212,994	213,035	41
	S	3032	712488,05	1026841,83	213,078	213,114	36
	P	3033	712485,89	1026844,24	213,001	213,037	36
P9	L	3028	712341,64	1026709,03	209,109	209,141	32
	S	3029	712339,59	1026711,57	209,185	209,225	40
	P	3030	712337,42	1026714,06	209,104	209,138	34
P10	L	3025	712195,18	1026579,94	207,112	207,149	37
	S	3026	712192,80	1026582,24	207,188	207,233	45
	P	3027	712190,65	1026584,68	207,183	207,217	34
P11	L	3022	712077,29	1026429,10	203,479	203,518	39
	S	3023	712074,51	1026430,95	203,559	203,592	33
	P	3024	712072,00	1026432,74	203,485	203,524	39
P12	L	3019	712018,29	1026268,16	203,079	203,119	40
	S	3020	712014,49	1026268,33	203,196	203,236	40
	P	3021	712010,88	1026268,47	203,277	203,32	43
P13	L	3016	712020,84	1026188,90	201,881	201,925	44
	S	3017	712017,06	1026189,10	201,892	201,944	52
	P	3018	712013,24	1026189,03	201,872	201,924	52
P14	L	3013	711984,10	1026075,66	196,287	196,33	43
	S	3014	711981,54	1026077,80	196,360	196,398	38
	P	3015	711978,74	1026079,90	196,302	196,341	39
P15	L	3010	711976,47	1026065,77	196,163	196,207	44
	S	3011	711973,87	1026067,98	196,238	196,277	39
	P	3012	711971,29	1026070,18	196,179	196,219	40
P16	L	3007	711850,11	1025915,60	195,774	195,815	41
	S	3008	711847,68	1025917,97	195,832	195,873	41
	P	3009	711845,18	1025920,27	195,771	195,81	39
P17	L	3004	711721,03	1025760,57	195,980	196,039	59
	S	3005	711717,83	1025763,53	196,064	196,121	57
	P	3006	711714,23	1025766,70	196,011	196,071	60
P18	L	3001	711592,79	1025609,67	195,237	195,297	60
	S	3002	711589,99	1025612,56	195,300	195,356	56
	P	3003	711587,36	1025615,20	195,269	195,326	57

L - levý kraj, S - střed, P - pravý kraj

BENÁTKY NAD JIZEROU - PLOCHA POVRCHU A TLOUŠŤKA VRCHNÍ VRSTVY VOZOVKY
SCHEMATICKE ZNÁZORNĚNÍ PLOCH A MĚŘENÝCH PROFILŮ

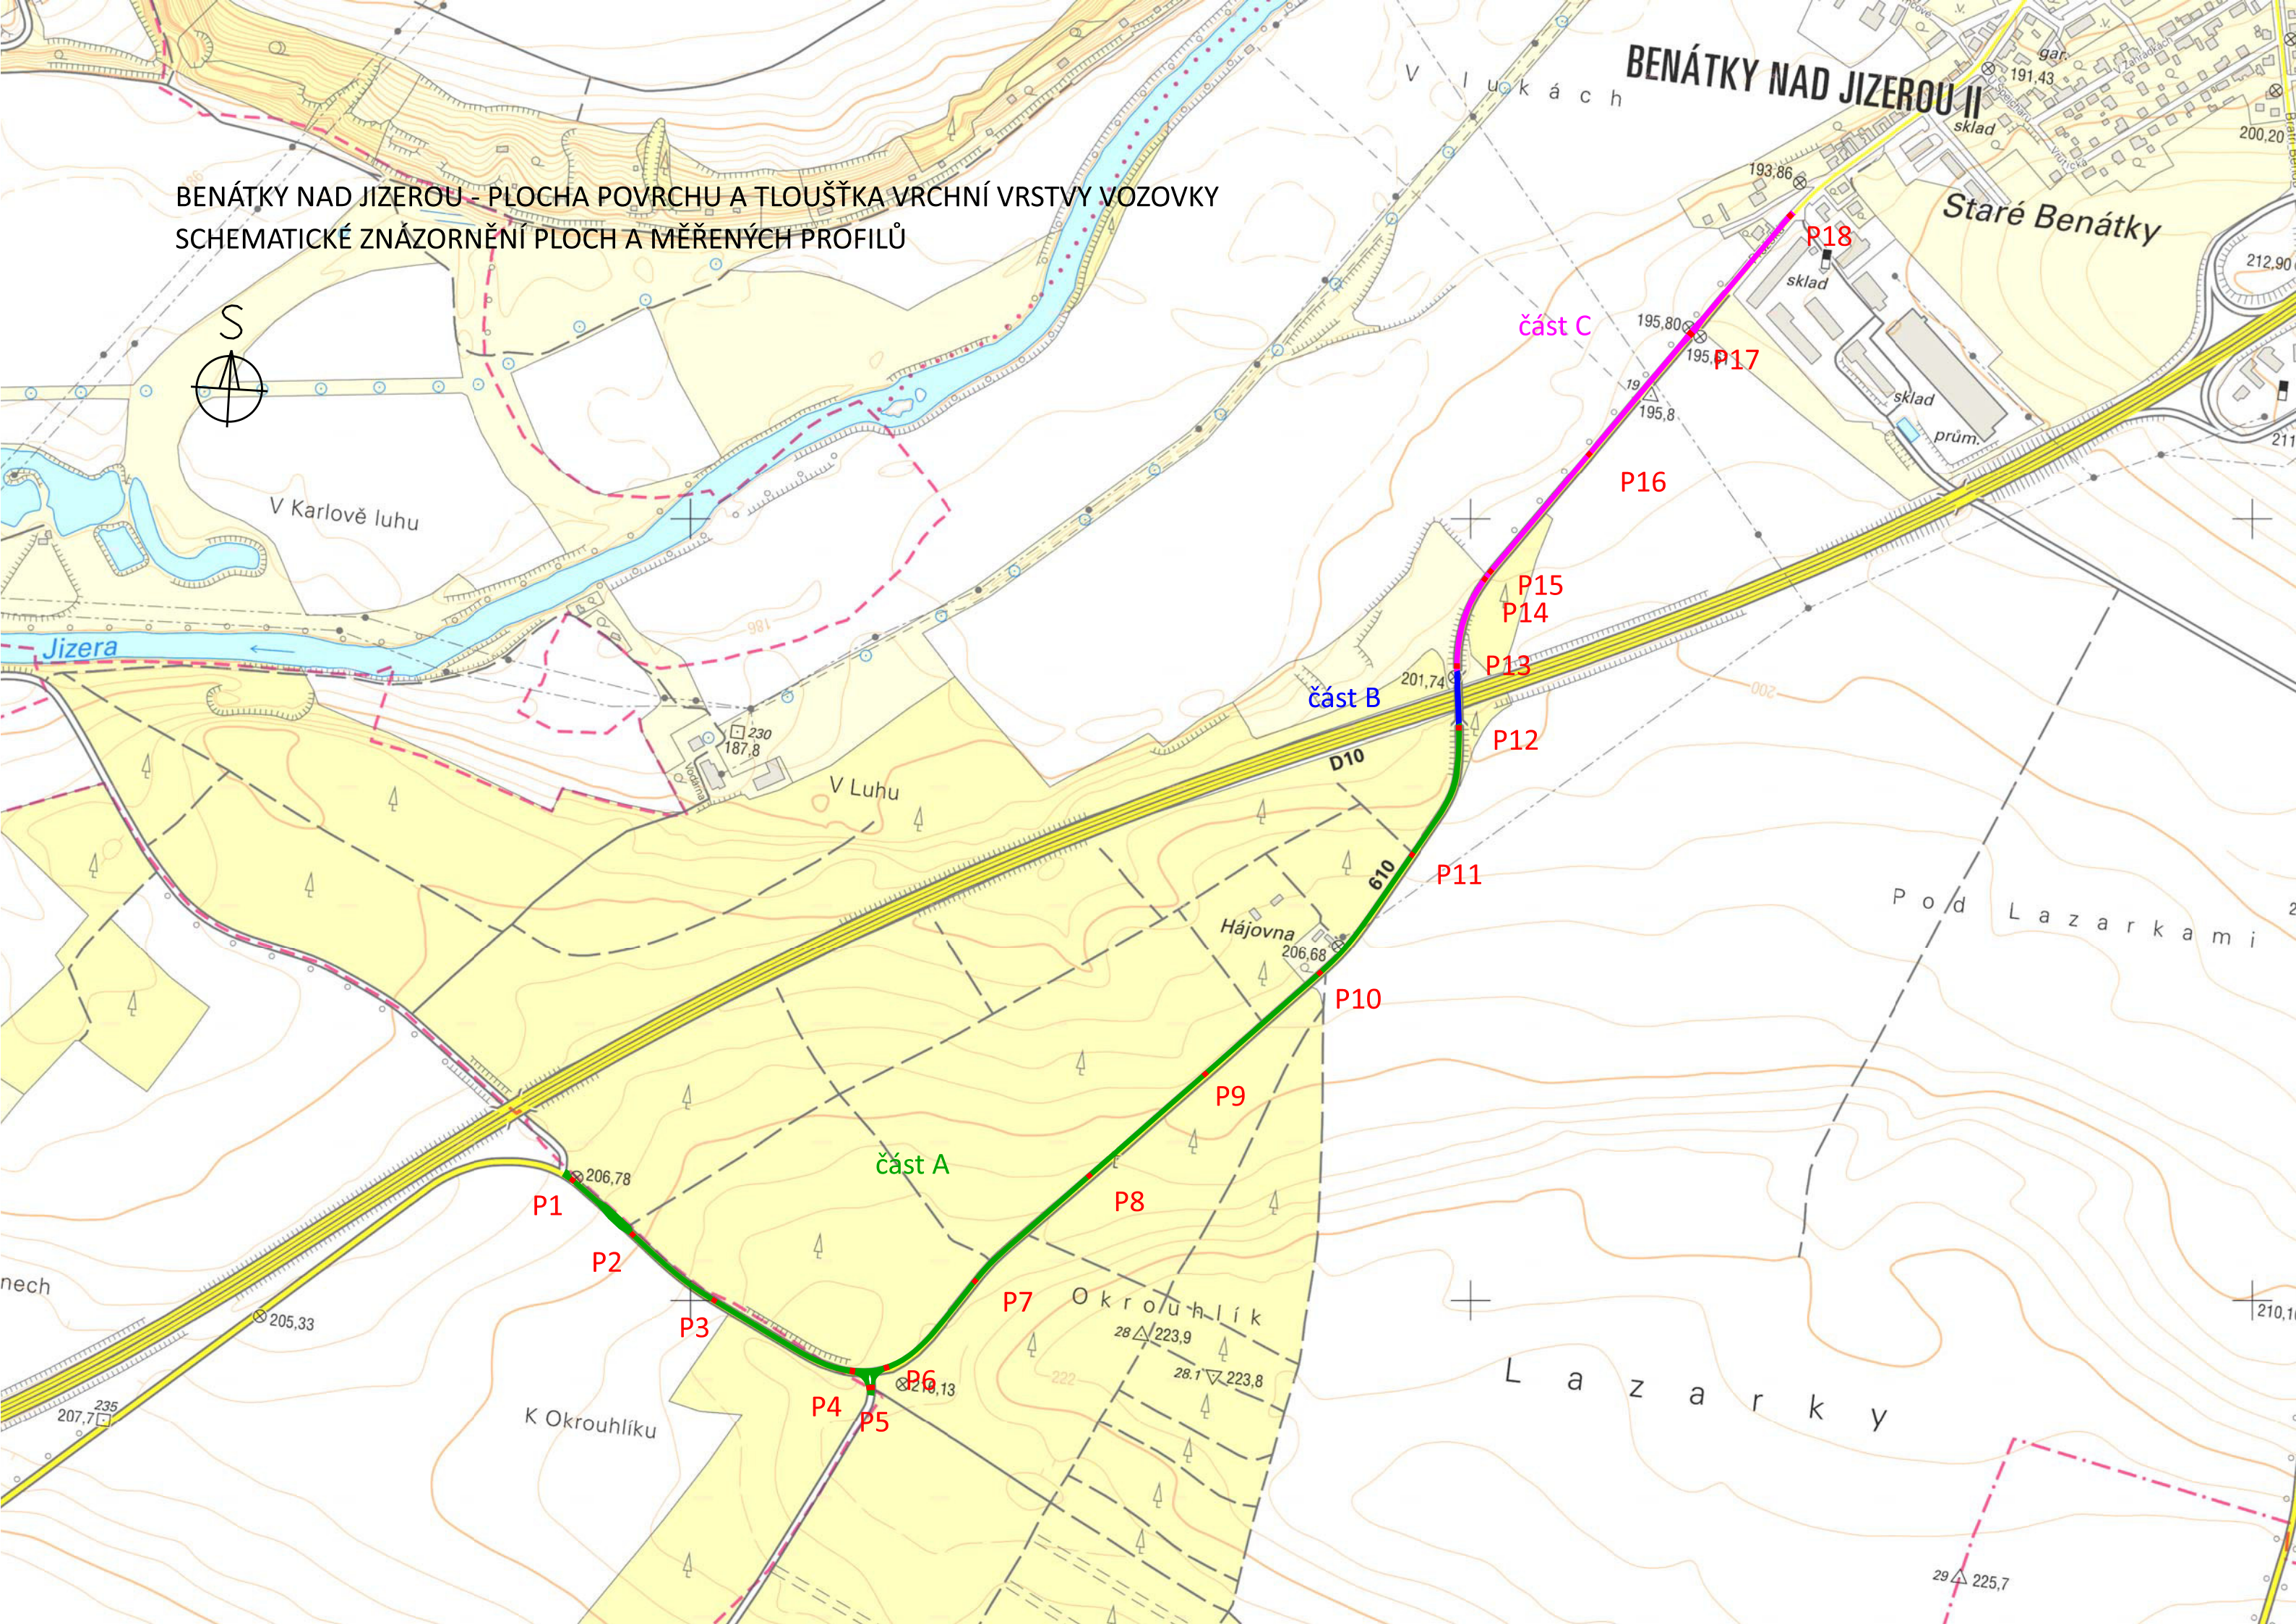

**Krajské správy a údržby silnic
Středočeského kraje, p.o.**Zborovská 11
Praha, 150 00Čj : PX6345/2020
V Praze : 18. listopadu 2020
Vyřizuje: Ing. Pavel Hrdinatel.:
e-m:**Akce: II/610 Benátky n/J, most ev.č. 610-021a před D10 před obcí Benátky n/J a oprava přílehlé komunikace ve staničení 22,353 km – 24,853 km - PD**
Věc: Vyjádření AD k ploše vozovky

Vážení,

elektronicky jsme dne 16. 10. 2020 obdrželi informaci od zhotovitele stavby o podstatném rozdílu plochy vozovky od plochy uvažované v PDPS v rámci SO 101. Na základě této skutečnosti jsme si vyžádali od zhotovitele grafickou verzi geodetického zaměření skutečného provedení stavby (dále ZSPS), na jehož základě konstatujeme následující skutečnosti:

- Plocha obrusné vrstvy ACO 11+ ze ZSPS je větší oproti PDPS SO 101 o 662m²
- Plocha obrusné vrstvy ACO 11+ ze ZSPS je stejná jako v PDPS SO 240

Na základě srovnání ZSPS s obvodem vozovky v PDPS v grafické softwaru dále konstatujeme, že důvody změny plochy obrusné vrstvy lze rozdělit na dvě skupiny:

- 1) Přesahy ZSPS za konci úpravy ve směru silnice II/610 a silnice III/2727 uvažované v PDPS, které činí 150m².
- 2) Přesahy ZSPS přes šířku vozovky v PDPS, které jsou podstatné zejména v úseku km 2,03 – KÚ, zřejmě z důvodu šířky stávající vozovky a celkově činí 512m².

S ohledem na velikost rozdílu plochy vozovky ZSPS oproti PDPS AD předpokládá, že tyto změny budou řešeny jako doměrky.

S pozdravem za Pontex s.r.o.

PONTEx spol. s r.o.
Bezová 1658, 147 14 Praha 4

Ing. Jan Bažil, autorský dozor

Zdůvodnění nových položek a jednotkových cen

Stavba číslo, název:		II/610 Benátky n/J, most ev.č. 610-021 a přes D10					
SO číslo a název :		SO 101 - Silnice II/610					
Číslo ZBV:		02					
Č. pol.	kód	typ	popis	m.j.	množství	JC	zdůvodnění jednotkových cen
87	184B1R		VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH (MANDLONĚ) + 5 LET PÉČE	KUS	25,00	5 000,01 Kč	Cena je stanovena na základě kalkulace a skutečných nákladů - daňový doklad (viz příloha č. 12 - Kalkulace položky 184B1R a příloha č. 13 - Cenové nabídky)

Za zhotovitele:

Datum:

Kalkulace položky

ZBV č. 2 SO 101 - Pol. č. 87 - 184B1R - VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH
(MANDLONĚ) + 5 LET PÉČE

1	Přímý materiál		0,00 Kč
2	Mzdy		0,00 Kč
3	Odvody	33,8% z mezd	0,00 Kč
4	Stroje		0,00 Kč
5	Ostatní přímé náklady		4 347,84 Kč
6	Přímé zpracovací náklady (1) až (5)		4 347,84 Kč
7	Nekalkulované náklady		0,00 Kč
	Přímé + nekalkulované náklady (6) + (7)		4 347,84 Kč
8	Režie výrobní	5,0 % z (6)	217,39 Kč
9	Režie správní (oslovení subdodavatelů, poptávací řízení, výběrové řízení, administrativa se zpracováním CN)	5,0 % z (6)	217,39 Kč
	Nepřímé náklady (8) + (9)		434,78 Kč
	Náklady celkem + nekalkulované (6) + (7) + (8) + (9)		4 782,62 Kč
10	Zisk	5,0 % (6)	217,39 Kč
	Celkem		5 000,01 Kč

Lesáček s.r.o.

PRÁCE A SLUŽBY V LESNICTVÍ

Světická 6/1114, 100 00 Praha 10

IČO 25768042 DIČ CZ25768042

Náhradní výsadby - ROZŠÍŘENÍ MANDLOŇOVÉHO SADU

Benátky nad Jizerou

SADOVÉ ÚPRAVY

VÝKAZ VYMĚR

Odrostky listnaté - ovocné stromy	ks	25
-----------------------------------	----	----

KONTROLNÍ ROZPOČET

Ocenění navržených krajinářských úprav bylo stanoveno na základě Katalogu popisů a směrných cen stavebních prací (823-1 ÚRS Praha), dle Nákladů obvyklých opatření pro posuzování v OP ŽP, dle ceníků okrasných a lesních školek, případně na základě znalostí cen v čase a místě obvyklých.

	Výsadba odrostků / ovocných stromů				
1	Příprava půdy pro sadovnické úpravy vč.pomístné modelace terénu, odplevelení, obdělání	m2	942,00	15,00	14130,00
2	Rozměření plochy a vytýčení výsadeb	ks	25,00	10,00	250,00
3	hloubení jamek s výměnou půdy 50% v rovině do 0,125 m3	ks	25,00	190,00	4 750,00
4	zapravení půdního kondicionéru do výsadbových jam	ks	25,00	5,00	125,00
5	výsadba odrostků s balem do 40 cm, se zalitím v rovině	ks	25,00	140,00	3 500,00
6	osazení kůlu k dřevině s uvázáním, délka kůlů do 2 m	ks	25,00	80,00	2 000,00
7	instalace chráničky kmene tubus	ks	25,00	30,00	750,00
8	zalití po výsadbě 3x 30 lt včetně dovozu a dodávky vody	m3	3,00	600,00	1 800,00
9	přihnojení rostlin pomalurozpustným tabletovým hnojivem	ks	25,00	10,00	250,00
10	Zřízení a namulčování zálivkové kořenové mísy odrostků	m2	25,00	55,00	1 375,00
	Další práce				
1	ošetření a řez odrostků po výsadbě	ks	25,00	60,00	1 500,00
2	hnízdová aplikace selektivního herbicidu proti zaplevelení závlahových mís odrostků 2x	m2	50,00	9,00	450,00
3	Přesun hmot pro SÚ	t	9,00	350,00	3 150,00
	Rostlinný materiál				
	Ovocné stromy PK				
1	Prunus dulcis (mandloň obecná) PK, Zb,	150/200	25,00	850,00	21 250,00
	ztratiné 5%	ks	1,25	850,00	1 062,50
	ostatní materiály				
1	Kůly pro kůlování odrostků do 2 m, průměr 0,06 m včetně spojovacího materiálu	ks	25,00	89,00	2 225,00
2	Úvazek bavlněný	ks	25,00	45,00	1 125,00
3	Selektivní herbicid pro udržení černého úhoru	lt	1,00	1 650,00	1 650,00
4	Borka mulčovací	m3	2,50	720,00	1 800,00

5	Tabletové pomalurozpustné hnojivo pro rostliny	kg	2,50	95,00	237,50
6	Půdní kondicionér	kg	5,00	345,00	1 725,00
7	Zahradnická zemina + kompost pro výměnu v jámách	m3	2,50	450,00	1 125,00
8	Chránička TUBUS proti okusu a vytloukání PVC	ks	25,00	82,00	2 050,00
Celkem výsadby					68 280,00 Kč

	1.Rok				
	<i>zálivka včetně dopravy vody, běžně 6x ročně, výchovný řez, kontrola, doplnění nebo odstranění kotvících a ochranných prvků, hnojení, kypření výsadbové mísy, vyžínání porostu, odplevelování, ochrana proti chorobám, doplnění mulče</i>				
1	Jednotlivé ovocné stromy	ks	25,00	340,00	8 500,00
	2.Rok				
	<i>zálivka včetně dopravy vody, běžně 6x ročně, výchovný řez, kontrola, doplnění nebo odstranění kotvících a ochranných prvků, hnojení, kypření výsadbové mísy, vyžínání porostu, odplevelování, ochrana proti chorobám, doplnění mulče</i>				
1	Jednotlivé ovocné stromy	ks	25,00	320,00	8 000,00
	3.Rok				
	<i>zálivka včetně dopravy vody, běžně 6x ročně, výchovný řez, kontrola, doplnění nebo odstranění kotvících a ochranných prvků, hnojení, kypření výsadbové mísy, vyžínání porostu, odplevelování, ochrana proti chorobám, doplnění mulče</i>				
1	Jednotlivé ovocné stromy	ks	25,00	300,00	7 500,00
	4.Rok				
	<i>zálivka včetně dopravy vody, běžně 6x ročně, výchovný řez, kontrola, doplnění nebo odstranění kotvících a ochranných prvků, hnojení, kypření výsadbové mísy, vyžínání porostu, odplevelování, ochrana proti chorobám, doplnění mulče</i>				
1	Jednotlivé ovocné stromy	ks	25,00	280,00	7 000,00
	5.Rok				
	<i>zálivka včetně dopravy vody, běžně 6x ročně, výchovný řez, kontrola, doplnění nebo odstranění kotvících a ochranných prvků, hnojení, kypření výsadbové mísy, vyžínání porostu, odplevelování, ochrana proti chorobám, doplnění mulče</i>				
1	Jednotlivé ovocné stromy	ks	25,00	250,00	6 250,00
Celkem rozvojová péče způsobilá					37 250,00 Kč

Vedlejší rozpočtové náklady VRN	%	3	105530,00	3 165,90 Kč
---------------------------------	---	---	-----------	-------------

CELKEM BEZ DPH	108 695,90 Kč
DPH	22 826,14 Kč
CELKEM VČETNÉ DPH	131 522,04 Kč

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

SO 101 - Silnice II/610

Soupis:

SO101 - Silnice II/610

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje

Projektant:

Pontex s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem**373 148,00**

D	1		Zemní práce				373 148,00
32	K	184C1	VYSAZOVÁNÍ KEŘŮ JEHLIČNATÝCH S BALEM VČETNĚ VÝKOPU JAMKY	KUS	18,000	4 536,00	81 648,00
		PP	VYSAZOVÁNÍ KEŘŮ JEHLIČNATÝCH S BALEM VČETNĚ VÝKOPU JAMKY				
		P	<i>Poznámka k položce: Položka vysazování keřů zahrnuje dodávku projektem předepsaných keřů, hloubení jamek (min. rozměry pro keře 30/30/30cm) s event. výměnou půdy, s hnojením anorganickým hnojivem a přídavkem organického hnojiva min. 2kg pro keře, zálivku, kůly, a pod. položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením</i>				
		VV	A48 "obnova živ. plotu 10.28/0.6+1=18.133 "18			0,000	
		VCP	VYSAZOVÁNÍ MANDLONÍ	KUS	25,000	11 660,00	291 500,00
		PP	viz. ROZHODNUTÍ o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les - podmínky a,b,c,d				

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

SO 101 - Silnice II/610

Soupis:

SO101 - Silnice II/610

Místo:

Datum:

27.07.2020

Zadavatel:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje

Projektant:

Pontex s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

REVIOS s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem**170 120,00**

D	1		Zemní práce				170 120,00
32	K	184C1	VYSAZOVÁNÍ KEŘŮ JEHLIČNATÝCH S BALEM VČETNĚ VÝKOPU JAMKY	KUS	18,000	840,00	15 120,00
		PP	VYSAZOVÁNÍ KEŘŮ JEHLIČNATÝCH S BALEM VČETNĚ VÝKOPU JAMKY				
		P	<i>Poznámka k položce: Položka vysazování keřů zahrnuje dodávku projektem předepsaných keřů, hloubení jamek (min. rozměry pro keře 30/30/30cm) s event. výměnou půdy, s hnojením anorganickým hnojivem a přidavkem organického hnojiva min. 2kg pro keře, závluku, kůly, a pod. položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení</i>				
		VV	A48 "obnova živ. plotu 10.28/0.6+1=18.133 "18			0,000	
		VCP	VYSAZOVÁNÍ MANDLONÍ	KUS	25,000	6 200,00	155 000,00
		PP	viz. ROZHODNUTÍ o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les - podmínky a,b,c,d				

Zápis z kontrolního dne

II/610 Benátky nad Jizerou, most ev. č. 610-021a přes D10

Kontrolní den			
číslo	1	konaný dne	11.3.2020
Účastníci			
Seznam účastníků je uveden v příloze č.1			

Zpráva o průběhu výstavby	
plnění věcného harmonogramu	Počáteční HMG předložen, bude průběžně aktualizován.
popis provedených prací	Osazeno DIO, práce na SO 101 – odstraňování krytů, krajníků
finanční plnění	měsíční fakturace – uvádět registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/0009173, ADA 4860
fotodokumentace	Požizována průběžně

Kontrola kvality
Plnění Technické specifikace (TP, TKP, ZTKP, normy, TePř, atd.) a Kontrolního a zkušebního plánu
Průběžně, v případě potřeby zápisem ve SD.

Kontrola kvality provedených (dokončených) stavebních prací
Průběžně, odsouhlasení zápisem ve SD, připomínky zápisem ve SD.

Vyhodnocení provedených zkoušek
TDS požaduje bezodkladné předávání protokolů z kontrolních zkoušek.

Vyhodnocení výsledků geodetického měření
-

Požadavky na zkoušky (kontrolní, průkazné)
Viz. KZP

Stav BOZP a PO
DIO a informační tabule rozmístěny, oznámení OIP vyvěšeno na vjezdech do stavby, dočasné značení průběžně udržováno.

Různé
1. Staveniště bylo předáno dne 9.3.2020.
2. Termín dokončení stavby je dle SOD do 9 měsíců ode dne doručení výzvy (4.12.2020).
3. Dílčí části RDS budou předkládány (koncepty) elektronicky v dostatečném předstihu.

Kontrola úkolů z minulého KD

Úkol číslo	Název	Skutečný stav plnění úkolu	Splněno

Nové úkoly

Úkol číslo	Název	Obsah úkolu a požadovaný cílový stav	Odpovídá	Termín
1.1	Info pro dotčenou veřejnost	Obyvatelé sousedící se stavbou a další dotčené subjekty budou v dostatečném předstihu informovány o technologických procesech, které neumožňují příjezd k „hájojně“.	Zht	v dostatečném předstihu
1.2	ZBV	TDS upozorňuje na možná ZBV: náhradní výsadba, doměrky (frézování). TDS upozorňuje na včasné oznamování a procesování ZBV. Zht oznámil pravděpodobné ZBV – změna kalkulace dopravy odkupovaného materiálu.		
1.3	Odkupy vytěžených materiálů	K odkupu jsou: svodidla (ks), dřevní hmota (m3), vyfrézovaná živice (zaměření kubatury + přepočít 2,4t/m3, příp. AZL). Ostatní použije KSÚS. Pro odkup je nutno doložit vážní lístky apod.	Zht	po vytěžení
1.4	Dočasné zábery	Majitelé pozemků v dočasném záboru budou informováni o počátku stavby (provede AD), TDS provede přípravu k vypořádání po konci dočasného záboru.	AD/Zht	
1.5	Pasportizace	TDS požaduje předložení pasportizace přilehlých nemovitostí a konstrukcí: a) SO 101 (ihned) b) SO 240 před a po demolici mostu.	Zht	a) ihned b) před a po demolici

Datum konání příštího KD 18.3.2020, 10:30 na zařízení staveniště

**V případě, že máte k tomuto zápisu připomínky, sdělte je prosím do 2 dnů od zaslání.
V opačném případě se má za to, že jste zápis odsouhlasili.**


 Zapsal Petr Jiřímský, TDS

Podpis

Přílohy

Číslo	Název
1	Prezenční listina

Příloha č. 1 k Zápisu z kontrolního dne stavby
Prezenční listina

Kontrolní den stavby			
číslo 1	konaný dne 11.3.2020		
Jméno, příjmení, titul	Organizace, funkce	Telefon, e-mail	Podpis
Tomáš Zikmund	TDS, IBR Consulting		
Petr Jiřímský	TDS, IBR Consulting		
Ing. Milan Peška	vedoucí investic, KSÚS		
JAN BAŽEIL	FONTEX, AD		
JAROMÍR SVOBODA	SHANŠKA z.s.		
JIŘÍ BERUŠKA	-/-		



MĚSTSKÝ ÚŘAD BENÁTKY NAD JIZEROU

Zámek 49, 294 71 Benátky nad Jizerou

Odbor správy majetku a rozvoje města

PONTEX spol. s.r.o.
Bezová 1658
147 14 Praha 4
v zastoupení pro
Ředitelství silnic a dálnic
státní příspěvková organizace
Na Pankráci 549/56
145 05 Praha 4

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

MěÚ BnJ/07728/2018/SM

VYŘIZUJE/ODBOR

Kochman/SMRM

BENÁTKY N. JIZ. DNE

11. 12. 2018

ROZHODNUTÍ

o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les

Městský úřad Benátky nad Jizerou, jako příslušný orgán ochrany přírody ve smyslu ust. § 76 odst. 1) písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, posoudil žádost společnosti Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o., se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5, zastoupené na základě plné moci společností PONTEX spol. s.r.o., Bezová 1658, 147 14 Praha 4 (dále jen „žadatel“) ze dne 18. 9. 2018 o vydání povolení k pokácení 8 ks soliterních dřevin na pozemcích p.č. 1122 a 1162 v k. ú. Staré Benátky a obci Benátky nad Jizerou, a po provedeném správním řízení

A. podle ust. § 8 odst. 1) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin

p o v o l u j e ž a d a t e l i

kácení 2 ks *Javor jasanolistý*, 4 ks *Dub letní*, 1 ks *Třešeň*, 3 ks *Švestka domácí* na pozemcích p. č. 1122 a 1162 v k. ú. Staré Benátky a obci Benátky nad Jizerou, a to za splnění následujících podmínek:

- výška pařezu nepřesáhne 10 cm
- kácení bude provedeno v období vegetačního klidu tj. od 1. 10. do 31. 3. běžného roku
- kácení provede žadatel na vlastní náklady a na vlastní nebezpečí
- kácení bude provedeno tak, aby nedošlo k ohrožení nebo poškození majetku jiných osob či zdraví osob
- místo kácení bude zabezpečeno tak, aby nedošlo k ohrožení nebo poškození majetku jiných osob či zdraví osob
- platnost tohoto rozhodnutí končí dnem 31. 12. 2021
- kácení nesmí být provedeno, dokud toto rozhodnutí nenabude právní moci
- kácení bude provedeno tak, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti provozu na přilehlé pozemní komunikaci; toto rozhodnutí nenahrazuje rozhodnutí, povolení či jiná opatření příslušného silničního správního úřadu, bude-li jich v souvislosti s prováděným kácením třeba

B. podle ust. § 9 odst. 1) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů,

u k l á d á ž a d a t e l i

ke kompenzaci ekologické újmy vzniklé pokácením dřevin náhradní výsadbu v počtu 25 ks dřevin (druh mandloně) na pozemku p.č. 1199 v k.ú. Kbel a obci Benátky nad Jizerou, který je ve vlastnictví Města Benátky nad Jizerou, Zámek 49, 294 71 Benátky nad Jizerou, s tím, že:

- náhradní výsadba bude provedena v nejbližším vegetačně příhodném období po provedeném kácení, nejpozději do 31. 12. 2021

- b) způsob rozmístění a přesný typ sadby bude minimálně 14 dní před realizací konzultován se zástupcem vlastníka pozemku, kterým je Odbor správy majetku a rozvoje města, oddělení životního prostředí,
- c) náhradní výsadba bude provedena odborným způsobem - sazenice stromů budou standardní školkařský kontejnerovaný materiál, o výšce cca 150 - 200 cm, sazenice budou ukotveny kůlem,
- d) žadatel zajistí následnou péči o vysazené dřeviny po dobu 5 let - pravidelnou závlahu (cca 80 litrů/1 strom), kontrolu úvazků kotvení dřevin, po ujetí (5 let od výsadby) odstranění kotvicích kůlů, ochranu proti škůdcům a mechanickému poškození, náhradu uhynulých kusů, výchovné řezy, ožínání a sekání vysázených ploch a závěrečný úklid vysázených ploch od chrániček, kůlů a uhynulých kusů,
- e) provedení náhradní výsadby oznámí žadatel Městskému úřadu Benátky nad Jizerou, odbor SMRM, oddělení ŽP, Zámek 49, 294 71 Benátky nad Jizerou nejpozději do 14 dnů od její realizace.

Účastníci řízení podle ust. § 27 odst. 1) správního řádu:

- Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o., se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5, zastoupené na základě plné moci společností PONTEX spol. s.r.o., Bezová 1658, 147 14 Praha 4
- Město Benátky nad Jizerou, Zámek 49, 294 71 Benátky nad Jizerou

Odůvodnění:

Městský úřad Benátky nad Jizerou obdržel dne 20. 9. 2018 žádost Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o., se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5, zastoupené na základě plné moci společností PONTEX spol. s.r.o., Bezová 1658, 147 14 Praha 4 ze dne 18. 9. 2018 o povolení pokácení dřevin rostoucích mimo les *2 ks Javor jasanolistý, 4 ks Dub letní, 1ks Třešeň, 3 ks Švestka domácí* rostoucích na pozemcích p. č. 1122 a 1162 v k. ú. Staré Benátky a obci Benátky nad Jizerou, které jsou ve vlastnictví Středočeský kraj Zborovská 11, 160 21 Praha 5 s právem hospodaření pro KSUS p.o., Zborovská 11, 160 21 Praha 5

Souhlas vlastníka pozemku p.č. 1199 v k.ú. Kbel a obci Benátky nad Jizerou, kterým je Město Benátky nad Jizerou, Zámek 49, 294 71 Benátky nad Jizerou je přiložen ve spise jako součást oznámení o zahájení řízení.

Při místním šetření provedeném dne 4. 10. 2018 bylo zjištěno, že dřeviny nejsou součástí významného krajinného prvku dle ust. § 3 odst. 1) písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

Na základě místního šetření bylo žadateli dne 5. 10. 2018 a 8. 10. 2018 doručeno oznámení o zahájení správního řízení pod čj. MěÚ BnJ/06065/2018/SM. V souladu s ustanovením § 51 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., zákon správní řád v platném znění tímto orgán ochrany přírody seznámil účastníky správního řízení s obsahem správního spisu. Ve stanovené lhůtě 10-ti dní správní orgán neobdržel žádná další vyjádření.

Jedná se o dřeviny bezprostřední blízkosti frekventované silnice, kde není předpokládáno hnízdění ptactva výskyt další fauny, která by mohla být kácením nevratně znehodnocena. Po vyhodnocení situace na místě došel orgán ochrany přírody k závěru, že kácení může být provedeno v období vegetačního klidu.

Po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin se kácení dřevin povoluje z důvodu realizace stavby „II/610 Benátky nad Jizerou, most ev. č. 610-021 a přes D10 před obcí Benátky n/J a oprava přilehlé komunikace ve staničení 22,353 km – 24,853 km“ a současně se žadateli ukládá přiměřená náhradní výsadba ke kompenzaci ekologické újmy vzniklé pokácením dřevin a následná péče o dřeviny po nezbytně nutnou dobu.

Na základě výše uvedených skutečností bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení o odvolání:





Proti tomuto rozhodnutí je možno podat ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto rozhodnutí odvolání (lhůta se počítá ode dne následujícího po doručení rozhodnutí) ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, odbor vnitřních věcí a krajský živnostenský úřad, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, prostřednictvím Městského úřadu Benátky nad Jizerou.


Miroslav Kochman
referent životního prostředí

Obdrží:

- Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o., se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5,
- PONTEX spol. s.r.o., Bezová 1658, 147 14 Praha 4,
- Město Benátky nad Jizerou, Zámek 49, 294 71 Benátky nad Jizerou.

LEGENDA DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ:

-  **V4 0.125m**
NOVÉ VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
-  **P4**
STÁVAJÍCÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PONECHÁNO
-  **P4**
STÁVAJÍCÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ ODSTRANĚNO
-  **P4**
NOVÉ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

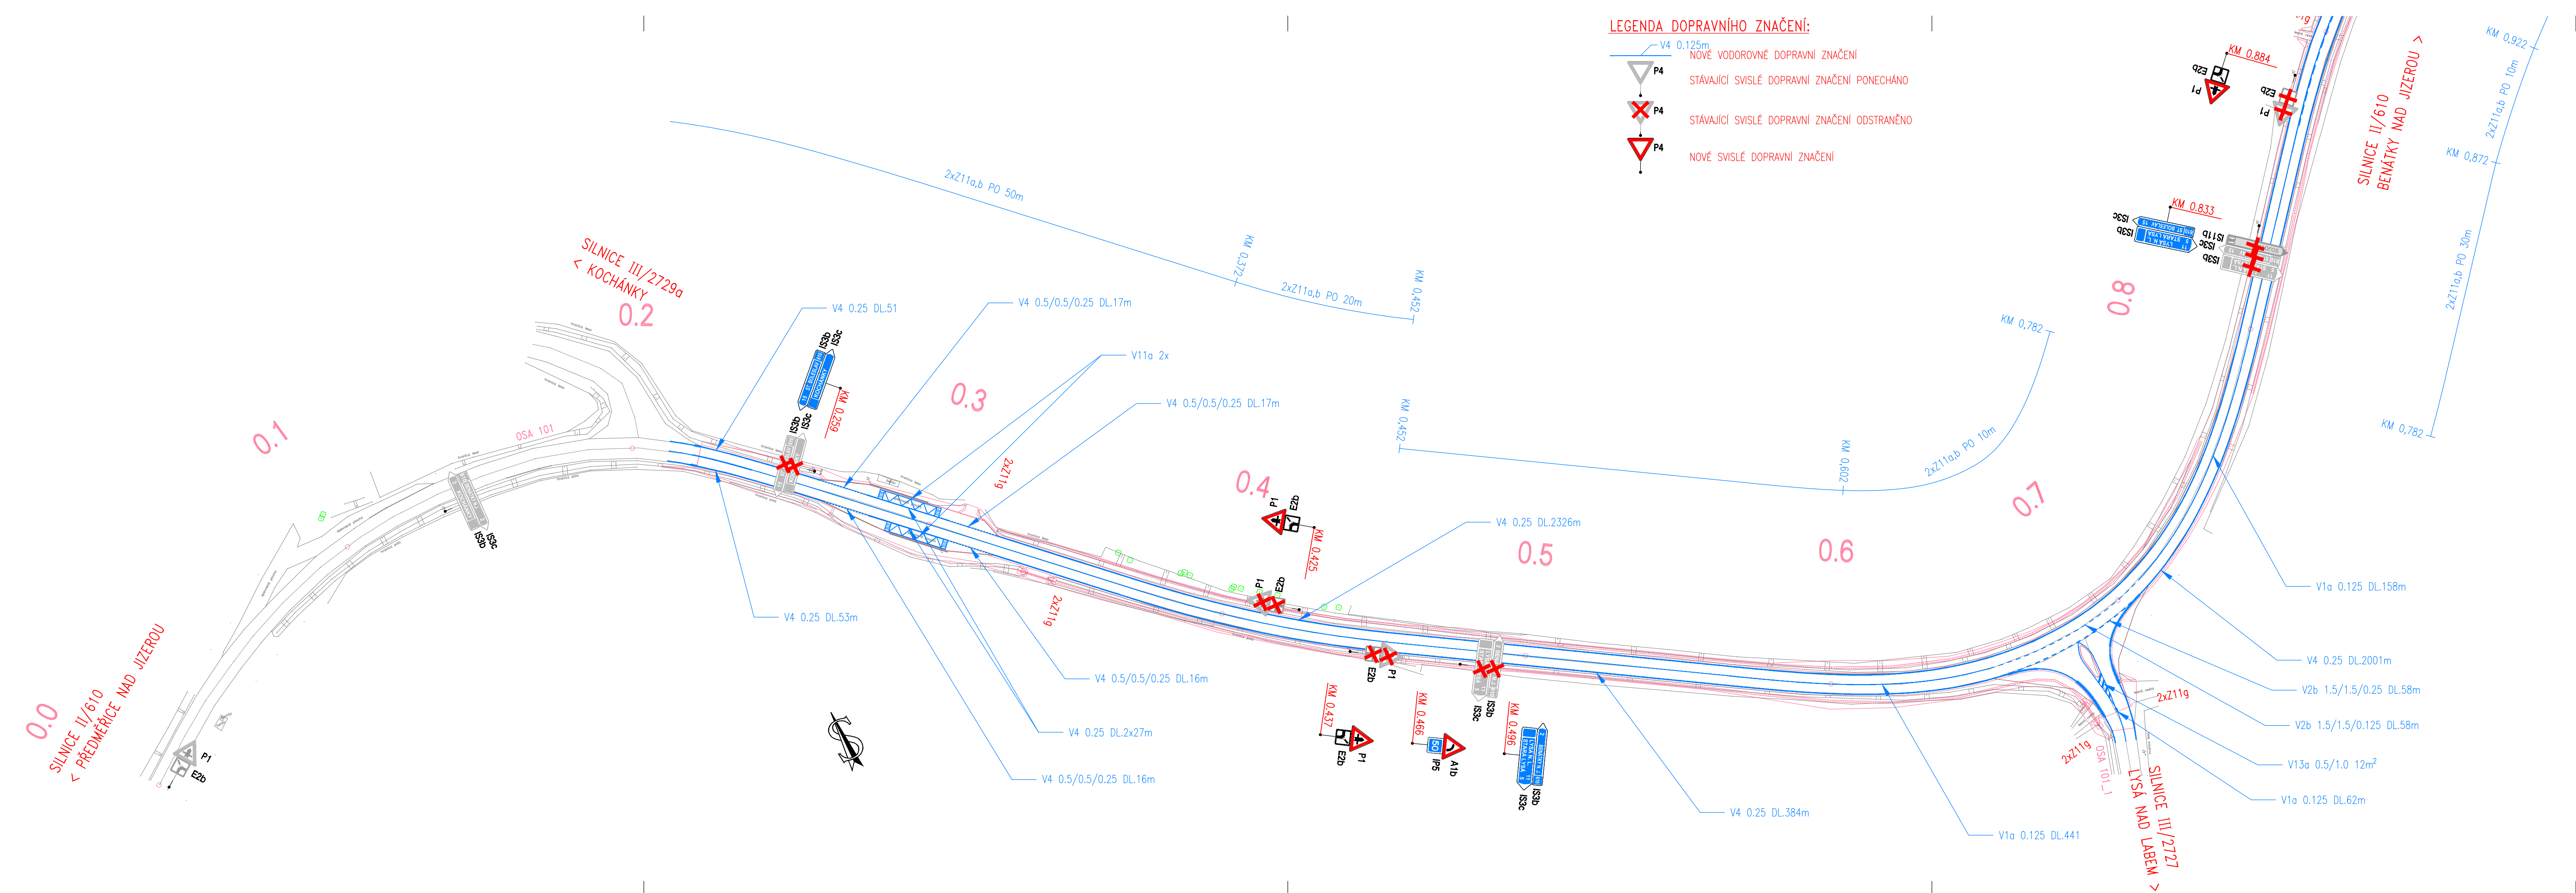


Objednatel stavby:	KSÚS KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC Středočeského kraje	Razítko, datum, podpis:
--------------------	--	-------------------------

Technický dozor:	IBR IBR Consulting, s.r.o. Sokolovská 352/215 190 00 Praha 9 IČ: 250 23 446	Razítko, datum, podpis:
------------------	--	-------------------------


Autorský dozor:	PONEX S.R.O. Pontex, spol. s r.o. Bezová 1658/1 147 00 Praha 4-Braník	Razítko, datum, podpis:
-----------------	---	-------------------------

Zhotovitel:	SKANSKA Skanska, a.s. Křížkova 682/34a 186 00 Praha 8 IČ: 262 71 303	Razítko, datum, podpis:
-------------	---	-------------------------

Souřadnicový systém: S-JTSK
Výškový systém: Bpv

HP:	Ing. Milan Míra milan.mira@bml.cz	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Ing. J. Čamrová +420 724 011 007	 100 00 PRAHA 10, TŘEBHOŠTICKÁ 14 TEL: 226 209 172(171)
VYPRACOVAL:	Ing. Jakub Dvořák +420 608 622 008	KONTROLOVAL:	Ing. Jan Luxemburk	
INVESTOR:	KSÚS Středočeského kraje, p.o.	Č. ZAKÁZKY:		
AKCE:	II/610 Benátky n/J, most ev.č. 610-021a přes D10 před obcí Benátky n/J a oprava přilehlé komunikace ve staničení 22,353 km - 24,853 km - PD			

OBSAH:	SO 101 - SILNICE II/610	STUPEŇ:	RDS	SOUPRAVA:
	SITUACE DOPR. ZN. - ČÁST 1/2	DATUM:	03/2020	
	1:1000	Č. PŘÍLOHY:	6.1	



a			
b			
c			
c	text změny – odůvodnění	datum	podpis

Objednatel stavby:	KSÚS KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC Středočeský územní úřad	Razisko, datum, podpis:
--------------------	--	-------------------------

Technický dozor:	IB XR IBR Consulting, s.r.o. Sokolovská 352/215 190 00 Praha 9 IČ: 250 23 446	Razisko, datum, podpis:
------------------	--	-------------------------

Autorský dozor:	PONEX S.R.O. Pontex, spol. s r.o. Bozovná 1668/1 147 00 Praha 4-Braník	Razisko, datum, podpis: <i>Hedvika</i>
-----------------	--	---

Zhotovitel:	SKANSKA Skanska, a.s. Křížkova 682/34a 186 00 Praha 8 IČ: 262 71 303	Razisko, datum, podpis:
-------------	---	-------------------------

Souřadnicový systém: S-JTSK
Výškový systém: Bpv

HP:	Ing. Milan Mimra	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Ing. J. Čamrová	ML
milan.mimra@uml.cz		+420 724 011 007		
VYPRACOVAL:	Ing. Jakub Dvořák	KONTROLOVAL:	Ing. Jan Luxemburk	100 00 PRAHA 10, TŘEBCHOSTICKÁ 14 TEL: 226 209 172(171)
#420 608 622 008				Č. ZAKÁZKY:

INVESTOR: KSÚS Středočeského kraje, p.o.
MACE: II/610 Benátky n.J., most ev.č. 610-021a přes D10 před obcí Benátky n.J a oprava přilehlé komunikace ve staničení 22,353 km - 24,853 km - PD

OBSAH:	SO 101 - SILNICE II/610	STUPĚNÍ:	RDS	SOUPRAVA:
	SITUACE DOPR. ZN. - ČÁST 2/2	DATAUM:	03/2020	
	1:1000	C. PRÍLOHY:	6.2	

V Říčanech dne 5. 10. 2020

Ing. Jaroslav Svoboda, stavbyvedoucí
SKANSKA, a.s.
Křižíkova 682/34a
186 00 Praha 8 – Karlín

Stavba: II/610 Benátky n/J, most ev.č. 610-021 a přes D10

Věc: Nerealizace souběžné stavby „Přeložka sdělovacího vedení CETIN“

Souběžně s realizací stavby „II/610 Benátky n/J, most ev.č. 610-021 a přes D10“ byla plánována realizace přeložky sdělovacího vedení společností CETIN. Vzhledem k tomu, že nedošlo k realizaci této přeložky společností CETIN, objednatel souhlasí s neprovedením demontáže původních dřevěných sloupů a demontáže kabelů. Na základě těchto skutečností žádáme o vypracování změny rozsahu díla dle Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek.

S pozdravením

Ing. M.

Krajská správa a údržba silnic
Středočeský kraj
vedoucí investic EU
příspěvková organizace

Zborovská 11
IČO: 00066001

150 21 Praha 5
DIČ: CZ00066001

**Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, p.o.**

Zborovská 11
Praha, 150 00

Čj : PX1343/2021
V Praze : 8. března 2021
Vyřizuje: Ing. Pavel Hrdina

tel.:

e-m:

Akce: II/610 Benátky n/J, most ev.č. 610-021a před D10 před obcí Benátky n/J a oprava přilehlé komunikace ve staničení 22,353 km – 24,853 km - PD
Věc: Vyjádření AD k ZBV 2

Vážený,

elektronicky jsme obdrželi návrh ZBV č. 2, který mimo jiné řeší zmenšení počtu šachet na drenážích.

V rámci PDPS bylo uvažováno celkem 6 úseků drenáží, kterým s ohledem na délku jednotlivých úseků drenáží odpovídalo celkem 29 šachet.

V RDS došlo k upřesnění návrhu drenáží, který způsobil zmenšení počtu úseků drenáží na 4 při stejné délce drenáží. Vzhledem ke zmenšení počtu úseků drenáží o vypadávají 2x vrcholová a 2x údolnicová šachta, což je i předmětem ZBV č. 2 v této věci.

Na základě výše uvedených skutečností AD souhlasí s návrhem ZBV č. 2 ve věci snížení počtu drenážních šachet souhlasí.

S pozdravem za Pontex s.r.o.

PONTEX spol. s r.o.
Bezová 1658, 147 14 Praha 4

Ing. Jan Bažil, autorský dozor

**Adresát:**

Středočeský kraj
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Věc: Vyjádření TDS k ZBV 2

Na stavbě „**II/610 Benátky n/J, most ev.č. 610-021 a přes D10**“ na stavebním objektu SO 101 „Silnice II/610“ navrhnul zhotovitel následující změny během výstavby:

Plocha povrchu vrchní vrstvy vozovky dle skutečného zaměření

Po provedení kontroly geodetického zaměření a s přihlédnutím k „Vyjádření AD k ploše vozovky“ za technický dozor stavebníka doporučuji ke schválení.

Náhradní výsadba dřevin

Náhradní výsadba dřevin byla provedena dle podmínek stavebního povolení. Za technický dozor stavebníka doporučuji ke schválení.

Dopravní značení

Značky SDZ byly upraveny dle požadavku DI PČR, za technický dozor stavebníka doporučuji ke schválení.

Odstranění sloupků a vedení

Na základě požadavku objednatele nebyly provedeny některé z prací na přeložce sdělovacího vedení. Za technický dozor stavebníka doporučuji ke schválení.





Kanalizační šachty (drenáže)

Poloha drenáže a počet šachet byl upraven a odsouhlasen AD. Za technický dozor stavebníka doporučuji ke schválení.

Za technický dozor konstatuji, že navržený objem prací rozsahem odpovídá skutečně provedeným pracím. Jednotkové ceny jsou stanoveny vhodným oceněním. **Doporučuji ZBV 2 k odsouhlasení.**

V Liberci dne 8. ledna 2021



Petr Jiřímský
TDS



PLNÁ MOC PM/7181/2020

Skanska a.s., IČ: 262 71 303, sídlem Křížíkova 682/34a, 186 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15904, zastoupená prokuristou Ing. Alešem Krupkou, tímto

z m o c ň u j e

zaměstnance společnosti Skanska a.s.

Michala Pfafa,

bytem: 

datum narození: 

funkce: ředitel závodu

a

Ing. Jana Lintnera,

bytem: 

datum narození: 

funkce: vedoucí střediska

- a) aby společně jednali jménem společnosti Skanska a.s. ve všech zadávacích řízeních podle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), jakož i v zadávacích řízeních mimo režim ZZVZ, a činili veškerá právní jednání s tím související, zejména aby jejím jménem podávali a podepisovali žádosti o účast a nabídky s nabídkovou cenou do výše 50 mil.Kč (bez DPH) v každém jednotlivém případě, podávali námítky a návrhy na přezkoumání úkonů zadavatele. V souvislosti s účastí společnosti Skanska a.s. v zadávacích řízeních jsou jmenovaní rovněž oprávněni k uzavření smlouvy o dílo se zadavatelem v případě výběru nabídky společnosti Skanska a.s. jako nejvhodnější a rovněž k uzavírání smluv o dílo, jakož i dalších typů smluv se subdodavateli směřujících ke splnění závazků společnosti Skanska a.s. souvisejících s příslušnou veřejnou zakázkou, a dále
- b) aby společně jednali jménem společnosti Skanska a.s. v zadávacích řízeních podle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jakož i v zadávacích řízeních mimo režim ZZVZ, s uchazečem, který má zájem zúčastnit se jako dodavatel zadávacího řízení na veřejnou zakázku, o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí, jejímž obsahem bude závazek společnosti Skanska a.s. podílet se na plnění veřejné zakázky a/nebo prokázání části chybějící kvalifikace podle ZZVZ s nabídkovou cenou do výše 50 mil.Kč (bez DPH) a v případě výběru nabídky uchazeče ve veřejné zakázce jako nejvýhodnější jsou uvedené osoby oprávněny za společnost Skanska a.s. uzavřít s uchazečem i realizační smlouvu o dílo a rovněž k uzavírání smluv o dílo, jakož i dalších typů smluv se subdodavateli směřujících ke splnění závazků společnosti Skanska a.s. souvisejících s příslušnou veřejnou zakázkou.

Platnost této plné moci je do 31.12.2021

V Olomouci dne 20.12.2020

Ing. Aleš Krupka

Plnou moc přijímám:

Michal Pfaf, ředitel závodu

Ing. Jan Lintner, vedoucí střediska

Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod poradovým číslem **134737222-14963-210105093859**, skládající se z **1** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: **IVANA CILEČKOVÁ**

Vystavil: **Městská část Praha-Řeporyje**
Pracoviště: **Městská část Praha-Řeporyje**
Praha 5-Řeporyje dne **05.01.2021**



134737222-14963-210105093859
