

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále též „**občanský zákoník**“) mezi:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, Praha 5, Smíchov PSČ: 150 00

IČO: 00066001

DIČ: CZ00066001

zastoupená: Ing. Janem Lichtnegerem, ředitelem

č. smlouvy: S-3823/00066001/2020

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

EKOSTAVBY Louny s.r.o.

se sídlem: Václava Majera 573, 440 01 Louny

IČO: 104 42 481

DIČ: CZ10442481

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 19455

zastoupená Ing. Jiřím Bendou, jednatelem, a Ing. Janem Egermayerem, jednatelem

č. smlouvy: 2100132

dále jen „**Zhotovitel**“ na straně jedné

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „**smluvní strany**“)

Preamble:

Smluvní strany tímto prohlašují, že dne 20. 1. 2021 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na veřejné zakázce s názvem: „**III/00724 Slaný-průtah**“ (dál jen „**Smlouva o dílo**“). Na základě dohody smluvních stran a ve vazbě na čl. XIV. odst. 14.14 Smlouvy o dílo uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jen „**Dodatek č. 1**“).

I. Předmět Dodatku č. 1

1. S ohledem na vznik objektivně nepředvídaných okolností v průběhu realizace prací na díle, které nemohl zhotovitel před zahájením prací předpokládat, a které zapříčinily změnu rozsahu prací v podobě méněprací a víceprací, upravuje se po dohodě smluvních stran předmět Smlouvy o dílo. Změna rozsahu prací v podobě méněprací a víceprací obsahují Objednatel schválené změnové listy, které jsou přílohou tohoto Dodatku č. 1. Na základě změny předmětu díla se mění i celková cena za dílo uvedená v bodě 8.1. Smlouvy o dílo takto:

Původní Cena Díla bez DPH	6.384.900,00 Kč
Nová Cena díla dle Dodatku č. 1 bez DPH	6.664.517,98 Kč
DPH 21%	1.399.548,78 Kč
DPH 15 %	0,- Kč
Cena Díla včetně DPH	8.064.066,76 Kč

2. Daň z přidané hodnoty (dále též „DPH“) bude na základě výslovné dohody smluvních stran připočtena ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že veškerá množství uvedená v soupise prací k Dílu a jeho jednotlivým částem jsou pouze odhadovaná, a jejich změna neznamená změnu Ceny Díla.
3. Přílohou tohoto Dodatku č. 1 je Objednatelem odsouhlasený Změnový list 1.

II. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 1 bude uveřejněn dle § 219 zákona o ZVZ na profilu Objednatele, včetně všech jejích změn a dodatků.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tuto Smlouvu uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy o dílo. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, která nejsou tímto Dodatkem č. 1 výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze smluvních stran obdrží její elektronický originál.
5. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento Dodatek č. 1 uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto Dodatku č. 1 za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku č. 1 rozhodující.

V Říčanech dne _____

V Lounech dne _____

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Ing. Jan Lichtneger, ředitel

EKOSTAVBY Louny s.r.o.
Ing. Jiří Benda, Ing. Jan Egermayer, jednatele

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

III/00724 Slaný-průtah, S-3823/00066001/2020

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

Číslo ZBV:

1

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Komunikace Pražská

SO 02 / 01

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov
IČO: 00066001

Zhotovitel:

EKOSTAVBY Louny s.r.o.
Václava Majera 573, 440 01 Louny
IČ: 10442481

Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.3	0,00	279 617,98	279 617,98

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1	0,00	279 617,98	279 617,98

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré:

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby:

III/00724 Slaný-průtah, S-3823/00066001/2020

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Komunikace Pražská

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

SO 02

Číslo ZBV:

1.3

Strany smlouvy o dílo č. S-3823/00066001/2020 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 20.01.2021 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: EKOSTAVBY Louny s.r.o., Václava Majera 573, 440 01 Louny

Přílohy Změnového listu:

1. Krycí list	1	počet listů
2. Změnový list	1	počet listů
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů
4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů
Další doklady	8	počet listů

Paré č.

Příjemce

2

Objednatel

1

Zhotovitel

1

Projektant

1

Stavební dozor

Iniciátor změny: Objednatel

Popis a zdůvodnění Změny:

Změna rozsahu díla z důvodu navýšení opravovaného úseku:

Předmětem změny jsou úpravy množství jednotlivých položek (viz. příloha) v důsledku navýšení rozsahu oprav nově poškozeného, nevyhovujícího úseku komunikace navazujícího na dotčenou stavbu, zjištěného a určeného při pochůzce stavby dne 14.4.2021 viz. pokyn k provedení variace ze dne 15.4.2021.

- 1) V původním návrhu PD nebyl řešený úsek opravy uvažován, neboť nebyl v havarijním stavu.
- 2) Přilehlou komunikaci bylo nutné opravit, neboť byla v havarijním stavu (vyjeté koleje) viz. fotodokumentace
- 3) V daném případě dochází k navýšení asfaltové plochy (obrus, ložná vrstva) viz. geodetické zaměření (569 m2).
- 4) Změna rozsahu oprav byla iniciována objednatelem na základě podnětu od zhotovitele o nevyhovujícím stavu komunikace plynule navazující na rekonstruovaný úsek dle SoD.
- 5) Navýšení celkové ceny, se promítlo do stávajícího soupisu prací prostřednictvím pěti položek rozpočtu použitých z SoD, a to položek: č.2, č.3, č.5, č.31, č.32

Uvedené měněné položky jsou zařazeny do Skupiny 3, protože důvod těchto změn naplňuje § 7 odst. 2, písm. b) Směrnice upřesňující provádění změn dle zákona č.135/2016 o zadávání veřejných zakázek.

Tato změna („ZBV“) proběhla na základě oznámení o vzniku variace zhotovitele (příloha číslo 10). S navrhovanými změnami souhlasil stavební dozor (příloha číslo 9).

Na základě výše uvedených skutečností lze konstatovat, že tuto změnu nemohl objednatel jednat s náležitou péčí v rámci ZD předpokládat. Jedná se o změny, které vznikly v průběhu provádění prací. Celkově se jedná o Změny nepodstatné, nepředvídané, které jsou tak podle § 5, odst. 1, písm.c), resp. podle §10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29.05.2017) upřesňující provádění změn závazku dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazeny do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná o změnu nepředvídanou.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
0,00	279 617,98	279 617,98	279 617,98

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí)

jméno

p. Miroslav Pokorný

datum

30-07-2021

podpis

Projektant (autorský dozor)

jméno

Ing. Sobol

datum

podpis

Stavební dozor	jméno	datum	podpis
Zástupce Objednatele	jméno	datum	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Ing. Jan Lichtneger	datum
Zhotovitel	jméno	Ing. Jiří Benda	datum
			30-07-2021
			podpis
			Číslo par

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 1**

Název Stavby: III/00724 Slaný-průtah, S-3823/00066001/2020	1.3
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 02/1	
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Komunikace Pražská	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
5 621 800,53

Poznámka:

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	5 621 800,53	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	279 617,98	279 617,98	4,97%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	0,00	5 901 418,51	279 617,98	4,97%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

Projektant (autorský dozor):

Stavební dozor:

Zástupce Objednatele:

Zaměstnanec KSÚS SK
odpovědný za cenové
projednání Změny:

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 1.3													
Evidenční číslo a název stavby: S-3823/00066001/2020, III/00724 Slaný-průtah Číslo a název SO/PS: SO 02 Komunikace Pražská Číslo a název rozpočtu: SO 02 Komunikace Pražská									ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)				
									SO 02/1				
									Skupina změn: 3				
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny zaporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31	113154264	Frézování živичného krytu tl 90 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 s překážkami v trase	m2	10 050	10 619	569	52,78	530 439,00	0,00	30 031,82	560 470,82	30 031,82	5,66%
2	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulze v množství 1 kg/m2	m2	10 050	10 619	569	12,81	128 740,50	0,00	7 288,89	136 029,39	7 288,89	5,66%
3	573231108	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	10 050	10 619	569	11,63	116 881,50	0,00	6 617,47	123 498,97	6 617,47	5,66%
32	577134131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z mod. asfaltu	m2	10 050	10 619	569	192,42	1 933 821,00	0,00	109 486,98	2 043 307,98	109 486,98	5,66%
5	577145132	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z mod. asfaltu	m2	10 050	10 619	569	221,78	2 228 889,00	0,00	126 192,82	2 355 081,82	126 192,82	5,66%
		Celkem						4 938 771,00	0,00	279 617,98	5 218 388,98	279 617,98	5,66%

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: p. Miroslav Pokorný

Za Objednatele: pi. Šárka Balážová

Datum:

Datum:

30-07-2021

PREHLED ZARAZENI ZMEN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: S-3823/00086001/2020, III/00724 Slaný-průtah

2-1-1-1-1-1	Příjaty úrokovi částka bez rezervy a DPH	8 304 900,00
2-1-1-1-1-2	Skutkový úrokovi částka bez rezervy a DPH	5 004 517,30
2-1-1-1-1-3	Skutkový úrokovi částka přesně stanovit v úř. DPH	8 004 409,70
2-1-1-1-1-4	Převádění zůstatků příjaty úrokovi částky	168,38%
4-1-2-1-1-1-1	Skutkový výnosový zůstatok (Skutkový vý)	0,88%
4-1-2-1-1-1-2	Skutkový výnosový zůstatok (Skutkový vý)	0,88%
4-1-2-1-1-1-3	Skutkový výnosový zůstatok (Skutkový vý)	0,88%
4-1-2-1-1-1-4	Skutkový výnosový zůstatok (Skutkový vý)	0,88%

do 12.2	Baza Zrnek Kiseljcih i Zrnek Agnostjeh Kiseljci 3 i Kiseljci 4	170 0 1/2 00
do 12.2	Kiseljcih Zrnek 10 1/2 - Kiseljci Kiseljci 3 i Kiseljci 4	170 0 1/2 00
do 12.2	Zrnek Zrnek 10 1/2 - Zrnek Kiseljci 3 i Kiseljci 4	170 0 1/2 00

0-0317P01	Opisovanje funkcije 05 % Skupina 1	4,100
0-0317P02	Opisivanje funkcije 05 % Skupina 4	3,000
0-0317P03	Opisivanje funkcije 05 % Skupina 3 i Skupina 4	279 617,00
0-0317P04	Opisivanje funkcije 05 % Skupina 3 i Skupina 4	1 101 600,00

Quantidade	Eletrônica para 10 %	0,20%
120 000	Eletrônica para 143 843 889 R\$	0,08
1 por 12/2000 a 29	Eletrônica para 143 843 889 R\$	137 389 894,00

[illegible][illegible]

Poznámka: Formulár má informatívni charakter a robí sa s ním do dňa predloženia Zmenového listu

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	1.3
Název a evidenční číslo stavby:	III/00724 Slaný-prutah, S-3823/00066001/2020
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 02 Komunikace Pražská
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	SO 02/1


Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
07 - Změnový soupis prací	1	
08 - Geodetické zaměření	1	
09 - Vyjádření TDS k výměrám provedených prací	1	
10 - Oznámení o vzniku variace	1	
11 - Souhlas KSUS s ZBV	1	
12 - fotodokumentace	3	
Počet listů celkem:	8	

III/00724 Slaný-průtah													
Evidenční číslo a název stavby: S-3823/00066001/2020, III/00724 Slaný-průtah									ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)				
Číslo a název SO/PS: SO 02 Komunikace Pražská									000/1				
Číslo a název rozpočtu: SO 02 Komunikace Pražská									Skupina Změn: 3				
Pol. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Položky dle SO													
31	113154264	Frezování živičného krytu tl 90 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 s překážkami v trase	m2	10 050,000	10 619,000	569,000	52,78	530 439,00	0,00	30 031,82	560 470,82	30 031,82	5,66%
2	573191111	Postříkání infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	10 050,000	10 619,000	569,000	12,81	128 740,50	0,00	7 288,89	136 029,39	7 288,89	5,66%
3	573231108	Postříkání živičným spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	10 050,000	10 619,000	569,000	11,63	116 881,50	0,00	6 617,47	123 498,97	6 617,47	5,66%
32	577134131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z mod. asfaltu	m2	10 050,000	10 619,000	569,000	192,42	1 933 821,00	0,00	109 486,98	2 043 307,98	109 486,98	5,66%
5	577145132	Asfaltový beton vrstva ložní AQL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z mod. asfaltu	m2	10 050,000	10 619,000	569,000	221,78	2 228 889,00	0,00	126 192,82	2 355 081,82	126 192,82	5,66%
6	R-001	Sanace širokých trhlin dle TP115	m	100,000	100,000	0,000	75,28	7 528,00	0,00	0,00	7 528,00	0,00	0,00%
7	R-002	Sanace úzkých trhlin dle TP115	m	100,000	100,000	0,000	75,28	7 528,00	0,00	0,00	7 528,00	0,00	0,00%
8	R-003	Sanace úzkých trhlin s překrytím geo. dle TP115	m	100,000	100,000	0,000	188,19	18 819,00	0,00	0,00	18 819,00	0,00	0,00%
30	895941311	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců	ks	1,000	1,000	0,000	3 505,02	3 505,02	0,00	0,00	3 505,02	0,00	0,00%
23	BTL0006310.URS	skruž betonová pro uliční vpust středová TBV-Q 450/295/6a 45x29,5x5 cm	ks	1,000	1,000	0,000	219,65	219,65	0,00	0,00	219,65	0,00	0,00%
24	BTL0006303.URS	dno betonové pro uliční vpust s výtokovým otvorem TBV-Q 450/330/1a 45x33x5 cm	ks	1,000	1,000	0,000	324,70	324,70	0,00	0,00	324,70	0,00	0,00%
25	BTL0006306.URS	skruž betonová pro uliční vpust horní TBV-Q 450/195/5c 45x19,5x5 cm	ks	1,000	1,000	0,000	191,00	191,00	0,00	0,00	191,00	0,00	0,00%
26	BTL0006307.URS	skruž betonová pro uliční vpust horní TBV-Q 450/295/5b 45x29,5x5 cm	ks	1,000	1,000	0,000	219,65	219,65	0,00	0,00	219,65	0,00	0,00%
27	BTL0006311.URS	prstenec betonový pro uliční vpust vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a 39x6x13 cm	ks	1,000	1,000	0,000	200,55	200,55	0,00	0,00	200,55	0,00	0,00%
28	BTL0019427.URS	koš pozink. A4 DIN 4052, vysoký, pro ram 500/500	ks	1,000	1,000	0,000	503,33	503,33	0,00	0,00	503,33	0,00	0,00%
29	55242320	mříž vtoková litinová plocha 500x500mm	ks	1,000	1,000	0,000	2 202,09	2 202,09	0,00	0,00	2 202,09	0,00	0,00%
9	899231111/1	Výšková úprava horní části vpustí / poklopu a do hl. cca 0,5 m vč. dodávky	ks	54,000	54,000	0,000	3 718,84	200 817,36	0,00	0,00	200 817,36	0,00	0,00%
10	899431111	výšková úprava krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu do 200 mm	ks	40,000	40,000	0,000	952,74	38 109,60	0,00	0,00	38 109,60	0,00	0,00%
11	915221101	Obnova VDZ ve strukturačním plásti s předznačením v rozsahu obnovy stávajícího VDZ	m2	300,000	300,000	0,000	202,23	60 669,00	0,00	0,00	60 669,00	0,00	0,00%
33	915221000	Výměna stávajícího SDZ	ks	5,000	5,000	0,000	5 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00%
12	919112212	Úprava styčných a pracovních spár obrusné vrstvy - Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 20 mm pro těsnící závluku v živičném krytu	m	100,000	100,000	0,000	30,11	3 011,00	0,00	0,00	3 011,00	0,00	0,00%
13	919122111	Úprava styčných a pracovních spár obrusné vrstvy - Těsnění spár závlukou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 20 mm s těsnícím profilem	m	100,000	100,000	0,000	37,64	3 764,00	0,00	0,00	3 764,00	0,00	0,00%
14	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu	m	100,000	100,000	0,000	50,96	5 096,00	0,00	0,00	5 096,00	0,00	0,00%
15	919735112-1	Úprava styčných a pracovních spár ložní vrstvy - Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	100,000	100,000	0,000	68,16	6 816,00	0,00	0,00	6 816,00	0,00	0,00%
16	938908411	Očištění povrchu krytu nebo podkladu živičného, betonového nebo dlaždeného vodou	m2	10 050,000	10 050,000	0,000	4,49	45 124,50	0,00	0,00	45 124,50	0,00	0,00%
18	997211511	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km	t	2 773,800	2 773,800	0,000	35,55	98 608,59	0,00	0,00	98 608,59	0,00	0,00%
19	997211519	Připlátek ZKD 19 km u vodorovné dopravy suti	t	52 702,200	52 702,200	0,000	2,88	151 782,34	0,00	0,00	151 782,34	0,00	0,00%
20	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	37,612	37,612	0,000	65,20	2 452,30	0,00	0,00	2 452,30	0,00	0,00%
21	998225192	Připlátek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 2000 m	t	37,612	37,612	0,000	14,30	537,85	0,00	0,00	537,85	0,00	0,00%
Cena celkem:								5 621 800,53	0,00	279 617,96	5 901 418,51	279 617,96	4,97%

Slaný, Pražská ul.

Zaměření výměr opravy vozovky

výměra: 569 m²

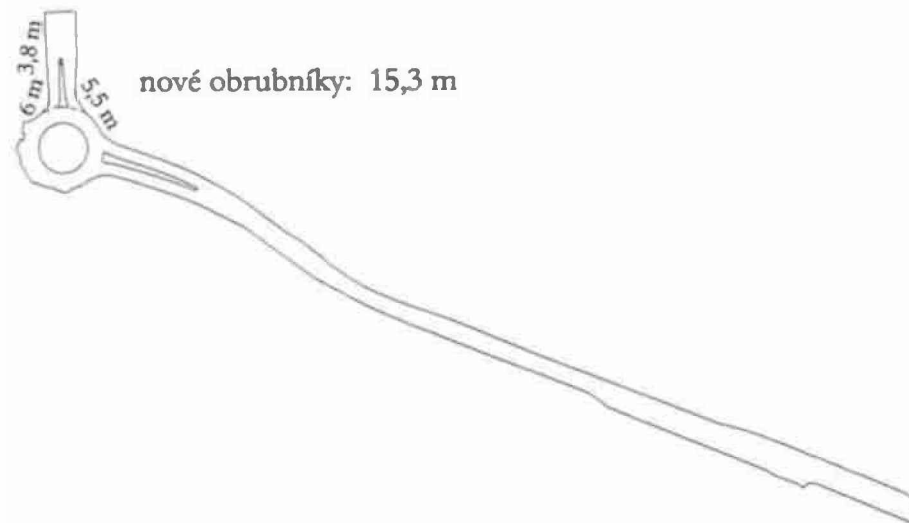



Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 1.3													
Evidenční číslo a název stavby: S-3823/00066001/2020, III/00724 Slaný-průtah								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: SO 02 Komunikace Pražská								SO 02/1					
Číslo a název rozpočtu: SO 02 Komunikace Pražská								Skupina Změn: 3					
Pol. č. poř.	číslo položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31	113154264	Frézování živičného ložtu tl 90 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 s překážkami v trase	m2	10 050	10 619	569		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	573191111	Postřik infiltrační kationtové emulze v množství 1 kg/m2	m2	10 050	10 619	569		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	573231108	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	10 050	10 619	569		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	577134131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tl 1 tl 40 mm š do 3 m z mod. asfaltu	m2	10 050	10 619	569		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	577145132	Asfaltový beton vrstva kořní ACL 16 (ABM) tl 50 mm š do 3 m z mod. asfaltu	m2	10 050	10 619	569		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Celkem						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Odpovědný zástupce Objednatel a odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují obsah měnitelných položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předpokládanou změnu. Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: p. Miroslav Polomský

Datum:

Za Objednatel:

Datum:

EKOSTAVBY Louny s.r.o.
Václava Majera 573
440 01 Louny

Zborovská 81/11,
150 21 Praha 5 - Smíchov
IČO: 00066001 DIČ: CZ00066001
Vedoucí Kladno: Karel Motál

Váš dopis zn./ze dne	naše zn.	vyřizuje/rel.	Louny dne:
	2100132-1	Miroslav Pokorný	14.04.2021

(S-3823/00066001/2020) III/00724 Planý-průtah – Oznámení o vzniku variace

Vážený pane Motale,

dovoluji si Vás oslovit z důvodu vzniku variace na výše zmíněné stavbě.

POPIS VARIACE: Při kontrolním dnu a pochůzce stavby dne 14.4.2021, byl zjištěn nevyhovující stav stávajícího povrchu komunikace v ulici U Brodu ve výměře cca 650m², plynule navazující na prováděnou stavbu, jejíž součástí je ostrůvek přechodu pro chodce kde jsou nevyhovující a provozem značně poškozené silniční betonové obruby cca 12kusů. Při úkonech KD byla navržena oprava toho úseku stejnou formou oprav živičného krytu jako na naší stavbě.

Žádám o schválení této změny a pokynu k provedení variace.

Miroslav Pokorný
EKOSTAVBY Louny s.r.o.



Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

EKOSTAVBY Louny s.r.o.

Václava Majera 573

440 01 Louny

Vás dopis značky ze dne
14.4.2021

Naše značka
č.j. 2911/21/KSÚS/KLT/MOT
ev.č. 19970/2021-KSÚS

Vyřizuje telefon
Motal /

Praha
15.4.2021

Věc: Vyjádření ke změnám stavby „III/00724 Slaný-průtah“

Dle oznámení zhotovitele ze dne 14.4.2021 se jedná o následující změny u realizované stavby „III/00724 Slaný – průtah“ :

Byl zjištěn nevyhovující stav živičného povrchu komunikace „U Brodu“, silnice II/118 bezprostředně navazující na rekonstruovanou kruhovou křižovatku, jedná se o nevyhovující úsek komunikace o výměře cca 650m². Dále byly zjištěny poškozené silniční betonové obruby v počtu cca 12 kusů.

Zhotovitel stavby, společnost EKOSTAVBY Louny s.r.o. navrhuje rozšířit stavbu o opravu předmětného úseku silnice II/118 a dále vyměnit nevyhovující silniční betonové obruby.

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace jako správce silnic II. a III. třídy a zároveň zástupce Středočeského kraje jako vlastníka nemovitostí, tj. dotčené silnice III/00724 ve Slaném a jako zadavatel opravy tímto **souhlasí** s navrženým řešením a vydává pokyn k realizaci díla dle navrženého řešení a zároveň žádá zhotovitele ke zpracování ZBV k této změně stavby a to v souladu se zákonem o zadávání VŘ a příslušnou směrnicí KSÚS SK.

S pozdravem

Karel Motal
vedoucí TSÚ-oblast Kladno

