

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov
IČO: 00066001
DIČ: CZ00066001
zastoupená: Ing. Janem Lichtnegerem, ředitelem
č. smlouvy: S-1923/00066001/2020
(dále jen „**Objednatel**“)

a

PORR a.s.

se sídlem: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00, Praha 10
IČO: 43005560
DIČ: CZ43005560

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006

zastoupená: **Ing. Pavlem Hirschem**, ředitelem úseku Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Čechy (na základě plné moci),

Ing. Ing. Františkem Buršíkem, vedoucím technického úseku Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Čechy – Střed (na základě plné moci),

Ing. Miroslavem Moudrým, vedoucím provozu mostních staveb úseku Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Čechy – Střed (na základě plné moci)

č. smlouvy: 7-0654A/20

dále jen „**Zhotovitel**“ na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním § 2586 a násl., § 564, §§ 1758 - 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek (dále jen „**Dodatek č. 1**“).

I. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 07. 07. 2020 smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“) na plnění veřejné zakázky s názvem „**II/610 Tuřice, most ev.č. 610-019 přes Jizeru v Tuřicích**“, jejíž předmětem je provedení a dokončení zejm. stavebních prací v rozsahu čl. 1 Smlouvy.
2. S ohledem na vznik objektivně nepředvídaných okolností v průběhu realizace prací na díle, které nemohl zhotovitel před zahájením prací předpokládat, a které zapříčinili změnu rozsahu prací v podobě méněprací a víceprací, upravuje se po dohodě smluvních stran předmět Smlouvy o dílo.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Změna rozsahu prací v podobě méněprací a víceprací obsahují Objednatel schválené změnové listy, které jsou přílohou tohoto Dodatku č. 1. Na základě změny předmětu díla se mění i celková cena za dílo uvedená v odst. 8.1. Smlouvy, který nově zní takto:

Smluvní strany se dohodly, že celková Cena Díla je stanovena jako neměnná a konečná a činí:

Původní Cena Díla bez DPH	15.892.789,92 Kč
Nová Cena díle dle Dodatku č. 1 bez DPH	16.021.041,90 Kč
DPH 21%	3.364.418,80 Kč
DPH 15 %	0,- Kč
Cena Díla včetně DPH	19.385.460,70 Kč

Daň z přidané hodnoty (dále též „DPH“) bude na základě výslovné dohody Smluvních stran připočtena ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že veškerá množství uvedená v soupise prací k Dílu a jeho jednotlivým částem jsou pouze odhadovaná, a jejich změna neznamena změnu Ceny Díla.

Přílohou tohoto Dodatku č. 1 jsou Objednatelem odsouhlaseny Změnové listy č. 1 a 2.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smlouva bude uveřejněna dle § 219 zákona o ZVZ na profilu Objednatele, včetně všech jejích změn a dodatků.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Poskytovatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tento Dodatek č. 1 uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem č. 1 zůstávají beze změny.
4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze stran obdrží jeho elektronický originál.
5. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 1 uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku č. 1 vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek č. 1 podepisují.

Příloha č. 1 – ZBV č. 1-2

V Říčanech dne _____

V Praze dne _____

**Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, p.o.**

Ing. Jan Lichtneger, ředitel

Ing. Pavel Hirsch,

ředitel úseku Dopravních a inženýrských staveb

PORR a.s., Oblast Čechy - Střed

(na základě plné moci)

V Praze dne

Ing. František Buršík,
vedoucí technického úseku Dopravních a
inženýrských staveb **PORR a.s.**, Oblast
Čechy – Střed (na základě plné moci)

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

II/610 Tuřice, most ev.č. 610-019 přes Jizeru v Tuřicích

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 102 Dopravně inženýrská opatření

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

102 /1

Číslo ZBV:

1

Objednatel: **Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**
 Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov
 IČ: 00066001

Zhotovitel: **PORR a.s.**

Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

IČ: 43005560

Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.3	-43 334,40	181 597,12	138 262,72

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1	-43 334,40	181 597,12	138 262,72

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
 Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
 a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré:

1

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: II/610 Tuřice, most ev.č. 610-019 přes Jizeru v Tuřicích Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 102 Dopravní inženýrská opatření	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 102 / 1	Číslo ZBV: 1.3																																	
Strany smlouvy o dílo č. S-1923/00066001/2020 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 25.06.2020 (dále jen Smlouva): Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov Zhotovitel: PORR a.s., Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10, Strašnice																																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> Přílohy Změnového listu: <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">1. Krycí list</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">1</td> <td style="width: 60%;">počet listů</td> </tr> <tr> <td>2. Změnový list</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>4. Rozpis ocenění Změn položek</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>5. Přehled zařazení změn do skupin</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>6. Přehled dalších dokladů</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>Další doklady</td> <td style="text-align: center;">25</td> <td>počet listů</td> </tr> </table> </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 20%;">Paré č.</td> <td style="width: 80%;">Příjemce</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td>2, 3</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Projektant</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>TDI</td> </tr> </table> </td> </tr> </table>			Přílohy Změnového listu: <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">1. Krycí list</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">1</td> <td style="width: 60%;">počet listů</td> </tr> <tr> <td>2. Změnový list</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>4. Rozpis ocenění Změn položek</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>5. Přehled zařazení změn do skupin</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>6. Přehled dalších dokladů</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>Další doklady</td> <td style="text-align: center;">25</td> <td>počet listů</td> </tr> </table>	1. Krycí list	1	počet listů	2. Změnový list	1	počet listů	3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů	4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů	5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů	6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů	Další doklady	25	počet listů	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 20%;">Paré č.</td> <td style="width: 80%;">Příjemce</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td>2, 3</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Projektant</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>TDI</td> </tr> </table>	Paré č.	Příjemce	1	Objednatel	2, 3	Zhotovitel	4	Projektant	5	TDI
Přílohy Změnového listu: <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">1. Krycí list</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">1</td> <td style="width: 60%;">počet listů</td> </tr> <tr> <td>2. Změnový list</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>4. Rozpis ocenění Změn položek</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>5. Přehled zařazení změn do skupin</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>6. Přehled dalších dokladů</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>Další doklady</td> <td style="text-align: center;">25</td> <td>počet listů</td> </tr> </table>	1. Krycí list	1	počet listů	2. Změnový list	1	počet listů	3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů	4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů	5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů	6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů	Další doklady	25	počet listů	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 20%;">Paré č.</td> <td style="width: 80%;">Příjemce</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td>2, 3</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Projektant</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>TDI</td> </tr> </table>	Paré č.	Příjemce	1	Objednatel	2, 3	Zhotovitel	4	Projektant	5	TDI			
1. Krycí list	1	počet listů																																	
2. Změnový list	1	počet listů																																	
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů																																	
4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů																																	
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů																																	
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů																																	
Další doklady	25	počet listů																																	
Paré č.	Příjemce																																		
1	Objednatel																																		
2, 3	Zhotovitel																																		
4	Projektant																																		
5	TDI																																		
Iniciátor změny: Zhotovitel Popis a zdůvodnění Změny:																																			
Změna objízdných tras Po zpracování návrhu DIO v souladu se zadávací dokumentací (viz doklad č. 10 - Situace původní objízdné trasy) obdržel zhotovitel záporná stanoviska od KSÚS, Magistrátu města Mladá Boleslav, Odboru dopravy Magistrátu města Mladá Boleslav (viz doklady č. 11-13). Důvodem zamítavých stanovisek bylo vedení objízdné trasy přes uzavřený úsek II/272 v Lysé nad Labem (souběžně probíhající stavba). Z tohoto důvodu bylo nutné zpracovat změnu DIO s alternativním návrhem nové objízdné trasy (viz doklad č. 14 - Situace nové objízdné trasy). Tento návrh byl odsouhlasen Dopravním inspektorátem a Odborem dopravy Magistrátu města Mladá Boleslav (viz doklady č. 15-18). Nově navržená objízdná trasa je oproti původnímu návrhu DIO vedena po silnicích nižšího řádu a z tohoto důvodu je návrh komplikovanější a vyžaduje použití vyššího počtu svislého dopravního značení. Změna se týká následujících položek : Zvýšení stávajících položek č. 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 66, 72 a 74 a nových položek č. 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 a 87. Tato změna zvyšuje smluvní cenu stavby o 138 262,72 Kč. Tyto změny („ZBV“) proběhly na základě žádosti zhotovitele o změnu rozsahu díla (viz doklad č. 08) a pokynu objednatele ke změně (viz doklad č. 09). Navrhované řešení bylo odsouhlaseno autorským dozorem (viz doklad č. 19 - Vyjádření AD) a stavebním dozorem (viz doklad č. 20 - Vyjádření TDI). Jedná se o změny, které vznikly v průběhu provádění prací. Celkově se jedná o změny nepodstatné, nepředvídané, které jsou tak podle § 5, odst. 1, písm.c), resp. podle §10 Směrnice R- SM-36 Krajské právy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29. 05. 2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazených do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná o změnu nepředvídanou.																																			
Údaje v Kč bez DPH:																																			
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných																																
-43 334,40	181 597,12	138 262,72	224 931,52																																
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:																																			
Zhotovitel (stavbyvedoucí)	jméno	Pavel Slavík	datum <u>7.10.2021</u> podpis _____																																
Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing Josef Jírotka	datum <u>7.10.2021</u> podpis _____																																
Technický dozor investora	jméno	Ing Michal Kňážko	datum <u>7.10.2021</u> podpis _____																																
Zástupce Objednatel:	jméno	Jan Boček	datum <u>7.10.2021</u> podpis _____																																
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitel sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.																																			
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel)	jméno	Ing Jan Lichtneger	datum _____ podpis _____																																
Zhotovitel	jméno	Ing Pavel Hirsch	datum <u>6.10.2021</u> podpis _____																																
	jméno	Ing František Buršík	datum <u>7.10.2021</u> podpis _____																																
			Číslo paré: _____																																

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 1

Název Stavby: II/610 Tuřice, most ev.č. 610-019 přes Jizeru v Tuřicích	
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	102 / 1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 102 Dopravně inženýrská opatření	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
4 611 483,45

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	4 611 483,45	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-43 334,40	181 597,12	181 597,12	3,94%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-43 334,40	4 749 746,17	138 262,72	3,00%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): Pavel Slávik 7.10.2021

Projektant (autorský dozor): Ing Josef Jírotka 7.10.2021

Stavební dozor: Ing Michal Křažko 7.10.2021

Zástupce Objednatele: Jan Boček

Zaměstnanec KSÚS SK
odpovědný za cenové
projednání Změny:

Ing Jaroslava Jurková

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 1														
Evidenční číslo a název stavby: II/610 Tuřice, most ev.č. 610-019 přes Jizeru v Tuřicích									ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: SO 102 Dopravně inženýrská opatření									102/1					
Číslo a název rozpočtu: SO 102 Dopravně inženýrská opatření									Skupina Změn: 3					
Poř. č. pol.	Kód položky		Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
39	914162	ZBV 1	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TR 1 MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	27,000	44,000	17,000	55,50	1 498,50	0,00	943,50	2 442,00	943,50	62,96
72	914163	ZBV 1	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TR 1 DEMONTÁŽ	KUS	27,000	44,000	17,000	44,40	1 198,80	0,00	754,80	1 953,60	754,80	62,96
40	914169	ZBV 1	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKL. VEL. HLINÍK FÓLIE TR 1 NÁJEMNÉ	KSDEN	3 240,000	5 676,000	2 436,000	11,10	35 964,00	0,00	27 039,60	63 003,60	27 039,60	75,19
42	914461	ZBV 1	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM HLINÍKOVÉ FÓLIE TR 1 DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	10,000	14,000	4,000	166,50	1 665,00	0,00	666,00	2 331,00	666,00	40,00
43	914463	ZBV 1	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM HLINÍKOVÉ FÓLIE TR 1 DEMONTÁŽ	KUS	10,000	14,000	4,000	88,80	888,00	0,00	355,20	1 243,20	355,20	40,00
44	914952	ZBV 1	SLOUPKY A STOJKY DZ Z JÁKL PROF PRO OCEL STOJAN MONT S PŘESUN	KUS	35,000	48,000	13,000	11,10	388,50	0,00	144,30	532,80	144,30	37,14
45	914953	ZBV 1	SLOUPKY A STOJKY DZ Z JÁKL PROFILU PRO OCEL STOJAN DEMONTÁŽ	KUS	35,000	48,000	13,000	8,88	310,80	0,00	115,44	426,24	115,44	37,14
46	914959	ZBV 1	SLOUP A STOJKY DZ Z JÁKL PRO OCEL STOJAN NÁJEMNÉ	KSDEN	4 200,000	6 192,000	1 992,000	4,44	18 648,00	0,00	8 844,48	27 492,48	8 844,48	47,43
47	916132	ZBV 1	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA SKS MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	2,000	0,000	-2,000	555,00	1 110,00	-1 110,00	0,00	0,00	-1 110,00	-100,00
48	916133	ZBV 1	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA SKS DEMONTÁŽ	KUS	2,000	0,000	-2,000	333,00	666,00	-666,00	0,00	0,00	-666,00	-100,00
74	916139	ZBV 1	DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÉ SOUPRAVA 5 KUSŮ NÁJEMNÉ	KSDEN	240,000	0,000	-240,000	173,16	41 558,40	-41 558,40	0,00	0,00	-41 558,40	-100,00
66	916319	ZBV 1	DOPRAVNÍ ŽÁBRANY Z2 NÁJEMNÉ	KSDEN	240,000	258,000	18,000	11,10	2 664,00	0,00	199,80	2 863,80	199,80	7,50
Nové položky - dle OTSKP 2020														
79	914362.N	ZBV 1	DOPRAV ZNAČKY ZMĚNŠ VEL HLINÍK FÓLIE TR 1 MONT S PŘESUNEM	KUS	0,000	6,000	6,000	310,00	0,00	0,00	1 860,00	1 860,00	1 860,00	100,00
80	914363.N	ZBV 1	DOPRAV ZNAČKY ZMĚNŠ VEL HLINÍK FÓLIE TR 1 DEMONTÁŽ	KUS	0,000	6,000	6,000	181,00	0,00	0,00	1 086,00	1 086,00	1 086,00	100,00
81	914369.N	ZBV 1	DOPRAV ZNAČ ZMĚNŠ VEL HLINÍK FÓLIE TR 1 NÁJEMNÉ	KSDEN	0,000	774,000	774,000	6,00	0,00	0,00	4 644,00	4 644,00	4 644,00	100,00
78	914469.N	ZBV 1	DOPRAV ZNAČ 100X150CM HLINÍK FÓLIE TR 1 NÁJEMNÉ	KSDEN	0,000	1 806,000	1 806,000	25,00	0,00	0,00	45 150,00	45 150,00	45 150,00	100,00
85	916112.N	ZBV 1	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	0,000	3,000	3,000	810,00	0,00	0,00	2 430,00	2 430,00	2 430,00	100,00
86	916113.N	ZBV 1	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ DEMONTÁŽ	KUS	0,000	3,000	3,000	374,00	0,00	0,00	1 122,00	1 122,00	1 122,00	100,00
87	916119.N	ZBV 1	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ NÁJEMNÉ	KSDEN	0,000	387,000	387,000	94,00	0,00	0,00	36 378,00	36 378,00	36 378,00	100,00
82	916122.N	ZBV 1	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	0,000	2,000	2,000	1 220,00	0,00	0,00	2 440,00	2 440,00	2 440,00	100,00
83	916123.N	ZBV 1	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS DEMONTÁŽ	KUS	0,000	2,000	2,000	621,00	0,00	0,00	1 242,00	1 242,00	1 242,00	100,00
84	916129.N	ZBV 1	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS NÁJEMNÉ	KSDEN	0,000	258,000	258,000	179,00	0,00	0,00	46 182,00	46 182,00	46 182,00	100,00
Celkem									106 560,00	-43 334,40	181 597,12	244 822,72	138 262,72	

Odpovědný zástupce Objednatel i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Pavel Slavík (stavbyvedoucí)

Datum: 7.10.2021

Podpis:

Za Objednatel: Ing Michal Kňážík (TDI)

Datum: 7.10.2021

Podpis:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: II/610 Tuřice, most ev.č. 610-019 přes Jizeru v Tuřicích

1	Přijaté smluvní částka bez rezervy a DPH	15 892 789,92
2=1+18+19	Aktuální smluvní částka (cena stavby) bez DPH	16 031 052,64
2a=2*1,21	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	19 397 573,69
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	100,87%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%
40=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, odst. (6), písm. b)	0,27%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	138 262,72
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	0,87%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	4 767 836,98

9=(32A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	1,42%
10=(36A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,00%
10A=32A+36A	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	224 931,52
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	7 946 394,96

12=(1)*0,15	Limit	2 383 916,49
13=(39)/(1)	Sledování limitu (15%)	0,00%
14=(ABS(37)+(38))	Hodnota skupiny 5	0,00

40=(19/1)*100		Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, odst. (6), písm. b)				0,27%															

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	1
Název a evidenční číslo stavby:	II/610 Tuřice, most ev.č. 610-019 přes Jizeru v Tuřicích
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 102 Dopravně inženýrská opatření
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	102 / 1

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
07 Změnový soupis prací SO 101	2	
08 Žádost zhotovitele o změnu rozsahu	1	
09 Pokyn Objednatele ke změně	2	
10 Situace objízdné trasy - původní	1	
11 Nesouhlasné stanovisko - Magistrát MB	2	
12 Nesouhlasné stanovisko - PČR	1	
13 Nesouhlasné stanovisko - KSUS	1	
14 Situace objízdné trasy - nová	2	
15 Souhlasné stanovisko DI MB	1	
16 Závazné stanovisko DI PČR Nymburk	1	
17 Rozhodnutí Odboru dopravy MB	5	
18 Prodloužení rozhodnutí Odboru dopravy MB	4	
19 Vyjádření AD k ZBV 1	1	
20 Vyjádření TDI k ZBV 1	1	
Počet listů celkem	25	

Rozpis ocenění položek - pro ZBV číslo: 1

Evidenční číslo a název stavby: II/610 Tuřice, most ev.č. 610-019 přes Jizeru v Tuřicích Číslo a název SO/PS: SO 102 Dopravně inženýrská opatření Číslo a název rozpočtu: SO 102 Dopravně inženýrská opatření									ZMĚNOVÝ SOUPIS PRACÍ (SO/PS) 102/1					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0 Všeobecné konstrukce a práce														
26	02943	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDŠ	KPL	1,000	1,000	0,000	21 090,00	21 090,00	0,00	0,00	21 090,00	0,00	0,00	
		Všeobecné konstrukce a práce celkem						21 090,00	0,00	0,00	21 090,00	0,00		
5 Komunikace														
75	577202	VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - SPOJ POŠTRÍK oprava objízdné trasy, 20% povrchu	M2	19 580,000	19 580,000	0,000	15,10	295 658,00	0,00	0,00	295 658,00	0,00	0,00	
76	5774AE	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 11+, 115 pro opravy objízdné trasy na 20% plochy	M3	979,000	979,000	0,000	4 199,35	4 111 163,65	0,00	0,00	4 111 163,65	0,00	0,00	
		Komunikace celkem						4 406 821,65	0,00	0,00	4 406 821,65	0,00		
9 Ostatní konstrukce a práce														
39	914162	ZBV 1 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FOLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM B1 2ks, IP6 2ks, IS11b 14ks, IS11c 9ks B1 7ks; IP10a 6ks; IP10b 1ks; IS11b 20ks, IS11c 10ks 7+6+1+20+10=44,00000 [A] -27=-27,00000 [B] b+a=17,00000 [C]	KUS	27,000	44,000	17,000	55,50	1 498,50	0,00	943,50	2 442,00	943,50	62,96	
72	914163	ZBV 1 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FOLIE TR 1 - DEMONTÁŽ dle pol. 39-914162 17=17,00	KUS	27,000	44,000	17,000	44,40	1 198,80	0,00	754,80	1 953,60	754,80	62,96	
40	914169	ZBV 1 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKL. VEL. HLINÍK FOLIE TR 1 - NÁJEMNÉ 44*122+44*7-3240=2 436,00	KSDEN	3 240,000	5 676,000	2 436,000	11,10	35 964,00	0,00	27 039,60	63 003,60	27 039,60	75,19	
42	914461	ZBV 1 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM HLINÍKOVÉ FOLIE TR 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ IP 22 14-10=4,00000 [A]	KUS	10,000	14,000	4,000	166,50	1 665,00	0,00	666,00	2 331,00	666,00	40,00	
43	914463	ZBV 1 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM HLINÍKOVÉ FOLIE TR 1 - DEMONTÁŽ IP 22 dle pol 42-914461 4=4,00000 [A]	KUS	10,000	14,000	4,000	88,80	888,00	0,00	355,20	1 243,20	355,20	40,00	
44	914952	ZBV 1 SLOUPKY A STOJKY DZ Z JÁKL PROF PRO OCEL STOJAN MONT S PŘESUN 2*2+14+7+23-35=13,00000 [A]	KUS	35,000	48,000	13,000	11,10	388,50	0,00	144,30	532,80	144,30	37,14	
45	914953	ZBV 1 SLOUPKY A STOJKY DZ Z JÁKL PROFILŮ PRO OCEL STOJAN DEMONTÁŽ dle pol 44-914952 13=13,00000 [A]	KUS	35,000	48,000	13,000	8,88	310,80	0,00	115,44	426,24	115,44	37,14	
46	914959	ZBV 1 SLOUP A STOJKY DZ Z JÁKL PRO OCEL STOJAN NÁJEMNÉ 48*122+48*7-4200=1 992,00000 [A]	KSDEN	4 200,000	6 192,000	1 992,000	4,44	18 648,00	0,00	8 844,48	27 492,48	8 844,48	47,43	
57	915321	VODOR DOPRAV ZNAČ Z FOLIE DOČAS ODSTRANITEL - DOD A POKLÁDKA značky V5 a V7	M2	24,000	24,000	0,000	1 332,00	31 968,00	0,00	0,00	31 968,00	0,00	0,00	
58	915322	VODOR DOPRAV ZNAČ Z FOLIE DOČAS ODSTRANITEL - ODSTRANĚNÍ	M2	24,000	24,000	0,000	222,00	5 328,00	0,00	0,00	5 328,00	0,00	0,00	
47	916132	ZBV 1 DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA SKS - MONTÁŽ S PŘESUNEM -2=-2,00000 [A]	KUS	2,000	0,000	-2,000	555,00	1 110,00	-1 110,00	0,00	0,00	-1 110,00	-100,00	
48	916133	ZBV 1 DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA SKS - DEMONTÁŽ -2=-2,00000 [A]	KUS	2,000	0,000	-2,000	333,00	666,00	-666,00	0,00	0,00	-666,00	-100,00	
74	916139	ZBV 1 DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÉ SOUPRAVA S KUSŮ - NÁJEMNÉ -240=- 240,00000 [A]	KSDEN	240,000	0,000	-240,000	173,16	41 558,40	-41 558,40	0,00	0,00	-41 558,40	-100,00	
64	916312	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FOLII TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	2,000	2,000	0,000	55,50	111,00	0,00	0,00	111,00	0,00	0,00	
73	916313	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FOLII TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	2,000	2,000	0,000	44,40	88,80	0,00	0,00	88,80	0,00	0,00	
66	916319	ZBV 1 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ 2*122+2*7-240=18,00000 [A]	KSDEN	240,000	258,000	18,000	11,10	2 664,00	0,00	199,80	2 863,80	199,80	7,50	
77	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVKY TL DO 50MM pro opravy objízdné trasy - zařízení hran opravovaných míst vozovky	M	7 120,000	7 120,000	0,000	5,55	39 516,00	0,00	0,00	39 516,00	0,00	0,00	
		Ostatní konstrukce a práce celkem						183 571,80	-43 334,40	39 063,12	179 300,52	-4 271,28		

			Nové položky											
79	914362.	ZBV 1	DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL HLINÍK FÓLIE TR 1 - MONT S PŘESUNEM E13 2ks; E3a 4ks 2+4=6,00000 [A] JC dle OTSKP 2020 Expertní ceny	KUS	0,000	6,000	6,000	310,00	0,00	0,00	1 860,00	1 860,00	1 860,00	100,00
80	914363.	ZBV 1	DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL HLINÍK FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ dle pol 79-914362 6=6,00000 [A] JC dle OTSKP 2020 Expertní ceny	KUS	0,000	6,000	6,000	181,00	0,00	0,00	1 086,00	1 086,00	1 086,00	100,00
81	914369.	ZBV 1	DOPRAV ZNAČ ZMENŠ VEL HLINÍK FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ 6*122+6*7=774,00000 [A] JC dle OTSKP 2020 Expertní ceny	KSDEN	0,000	774,000	774,000	6,00	0,00	0,00	4 644,00	4 644,00	4 644,00	100,00
78	914469.	ZBV 1	DOPRAV ZNAČ 100X150CM HLINÍK FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ dle pol 42-914461 14*122+14*7=1 806,00000 [A] JC dle OTSKP 2020 Expertní ceny	KSDEN	0,000	1 806,000	1 806,000	25,00	0,00	0,00	45 150,00	45 150,00	45 150,00	100,00
85	916112.	ZBV 1	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM 3=3,00000 [A] JC dle OTSKP 2020 Expertní ceny	KUS	0,000	3,000	3,000	810,00	0,00	0,00	2 430,00	2 430,00	2 430,00	100,00
86	916113.	ZBV 1	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ 3=3,00000 [A] JC dle OTSKP 2020 Expertní ceny	KUS	0,000	3,000	3,000	374,00	0,00	0,00	1 122,00	1 122,00	1 122,00	100,00
87	916119.	ZBV 1	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ 3*122+3*7=387,00000 [A] JC dle OTSKP 2020 Expertní ceny	KSDEN	0,000	387,000	387,000	94,00	0,00	0,00	36 378,00	36 378,00	36 378,00	100,00
82	916122.	ZBV 1	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM 2=2,00000 [A] JC dle OTSKP 2020 Expertní ceny	KUS	0,000	2,000	2,000	1 220,00	0,00	0,00	2 440,00	2 440,00	2 440,00	100,00
83	916123.	ZBV 1	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ 2=2,00000 [A] JC dle OTSKP 2020 Expertní ceny	KUS	0,000	2,000	2,000	621,00	0,00	0,00	1 242,00	1 242,00	1 242,00	100,00
84	916129.	ZBV 1	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ 2*122+2*7=258,00000 [A] JC dle OTSKP 2020 Expertní ceny	KSDEN	0,000	258,000	258,000	179,00	0,00	0,00	46 182,00	46 182,00	46 182,00	100,00
			Nové položky celkem						0,00	0,00	142 534,00	142 534,00	142 534,00	
			Celkem ZBV 1							-43 334,40	181 597,12	4 749 746,17	138 262,72	
			Celkem ve změně ZBV 1					4 611 483,45	-43 334,40	181 597,12	4 749 746,17	138 262,72		
			Všechny změny celkem SO 102					4 611 483,45	-43 334,40	181 597,12	4 749 746,17	138 262,72		



PORR a.s., Čechy/Stavby mostů
Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10

KSÚS Středočeského kraje
Zborovská 81/11
150 00 Praha 5

Vaše značka: .
Váš dopis ze dne: .
Naše značka: .
Náš dopis: .
Jméno: .
Telefon: .
Mobil: .
Email: .

Praha, dle č. 151/2000 Sb. Zák. o
elektronické komunikaci

Věc: Žádost o vydání pokynu k variaci (Žádost o změnu rozsahu díla)

Akce: II/610 Tuřice, most ev. č. 610-019 přes Jizeru v Tuřicích

Vážení obchodní partneři,
Na základě SOD č. S-1923/00066001/2020, soupisu prací SO 201 a SO 102 Most ev.č. 610-019 a skutečnosti na stavbě.
Vás žádáme o vydání Žádosti o změnu rozsahu díla (pokynu k variaci), (dle čl. 2 SOD) na akci II/610 Tuřice, most ev.č. 610-019 přes Jizeru v Tuřicích.

Jedná se o změnu během výstavby typu 3 (dle Směrnice R-Sm-36).

Popis změny: Zvýšení rozsahu díla s vlivem na cenu a termín dokončení díla.

V průběhu zajišťování DIO pro výše uvedenou stavbu proběhlo řízení kde došlo k zamítnutí původně navrženého DIO stavby. Z těchto důvodů musel zhotovitel vyprojektovat DIO v nové trase rozšířené oproti původnímu DIO dle zadávací dokumentace stavby.

Po odbourání stávajících závěrných zdí na OP 1 a OP 2 a skutečnému zaměření došlo k přepočtu pohybu mostu za účasti autorského dozoru a následně byla navržena nová dilatace (EMZ) oproti původně navržené povrchové dilataci dle zadávací dokumentaci stavby.

Odhadované smluvní dopady: Navýšení ceny díla o cca 120 000 Kč bez DPH

S pozdravem
Pavel Slavík

Porr a.s.
Dubečská 3238/36
Strašnice, 100 00 Praha 10
Tel. +420 267 226 111
Fax +420 267 226 801
porras@porr.cz

Sídlo: Dubečská 3238/36
Strašnice, 100 00 Praha 10
OR u MS v Praze, Oddíl B, Vložka 1006
IČO 43005560, DIČ CZ43005560

Raiffeisenbank a.s.
IBAN CZ975500001091107720
BIC RZBCCZPP

www.porr.cz

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

PORR a.s.
Dubečská 3238/36
110 00 Strašnice
Praha 10

Vás dopis značky/ze dne

Naše značka

Vyřizuje/telefon
J. Boček/

Praha

Věc: Žádost, o změnu rozsahu díla – stavby „II/610 Tuřice, most ev.č. 610-019 přes Jizeru v Tuřicích“ ZBV č.1

S odvoláním na článek 6 Práva a povinnosti objednatele Smlouvy o dílo S-1923/00066001/2020, odst. 6.9:

Objednatel může požadovat změnu rozsahu Díla či schválit změnu rozsahu Díla navrženou zhotovitelem, a to při respektování povinností Objednatele dle Zákona o ZVZ a interních předpisů objednatele, zejména pak Směrnice ředitele Objednatele ke změnám staveb (dále jen „Směrnice“, která tvoří přílohu č. 4 této Smlouvy). Zhotovitel bere obsah Směrnice na vědomí a zavazuje se, že při administraci změn nebude postupovat v rozporu se Směrnicí a že nebude na Objednateli uplatňovat nároky ze změn před schválením těchto změn postupem, který Směrnice stanoví.

Zhotovitel je v případě takového rozhodnutí Objednatele o změně rozsahu Díla povinen Objednateli vyhovět a (i) snížit rozsah Díla nebo (ii) bez zbytečného odkladu podat nabídku na zvýšení rozsahu Díla o plnění stejného charakteru jako Dílo sjednané ve smlouvě s tím, že:

- a) při snížení rozsahu se Cena Díla odpovídajícím způsobem sníží,
- b) při zvýšení rozsahu bude Cena Díla v nabídce Zhotovitele stanovena na základě cen uvedených v Nabídce v Oceněném soupisu prací. V případě, že není možné Cenu Díla stanovit tímto způsobem, bude Cena Díla stanovena na základě expertních cen uvedených v Oborovém třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací (OTSKP-SPK) platných pro dané období nebo v cenách nižších. V případě, že není možné cenu Díla stanovit ani tímto způsobem, bude Cena Díla stanovena ve výši ceny obvyklé v místě a čase, zjištěné na podkladě průzkumu trhu provedeného Zhotovitelem formou získání alespoň tří nezávislých nabídek jiných zhotovitelů. Doklady o provedeném průzkumu trhu a jeho výsledcích je Zhotovitel povinen předat Objednateli.
- c) změny budou administrovány postupem stanoveným ve směrnici, přičemž snížení či zvýšení rozsahu bude upraveno písemným dodatkem Smlouvy, kterým může být i Změnový list změny stavby podepsaný ze strany osob oprávněných jednat za Objednatele a Zhotovitele,

1/2

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

- d) případná změna termínů plnění bude vždy sjednána formou písemného dodatku k této Smlouvě (tj. nikoliv formou Změnového listu), a to i v případě, pokud by souvisela se změnami sjednanými změnovým listem. Změna termínů plnění je možná pouze v případě, že taková změna nemá charakter podstatné změny závazku ve smyslu § 222 Zákona o ZVZ,
- e) Zhotovitel se zavazuje vyhotovovat Změnové listy a jejich přílohy a předkládat je objednateli výlučně ve formátu, který stanoví Směrnice.


Žádáme o změnu rozsahu díla v souladu s těmito zjištěnými skutečnostmi:

Po zpracování návrhu DIO v souladu se zadávací dokumentací obdržel zhotovitel k žádosti k rozhodnutí o úplné uzavírce komunikace II/610 v místě mostu ev.č. 610-019 v Tuřicích, záporná stanoviska od KSÚS, Odboru dopravy MB a také PČR, a to z důvodu vedení objízdné trasy přes uzavřený úsek II/272 v Lysé nad Labem (souběžně probíhající stavba).

Z tohoto důvodu je nutné zpracovat změnu DIO s návrhem nové objízdné trasy, která bude však oproti původnímu návrhu DIO vedena po silnicích nižšího řádu a z tohoto důvodu bude komplikovanější, což bude pravděpodobně vyžadovat použití vyššího počtu svislého dopravního značení.

2/2

Jan Boček
Mostní technik, KSÚS SK
Oblast Mnichovo Hradiště

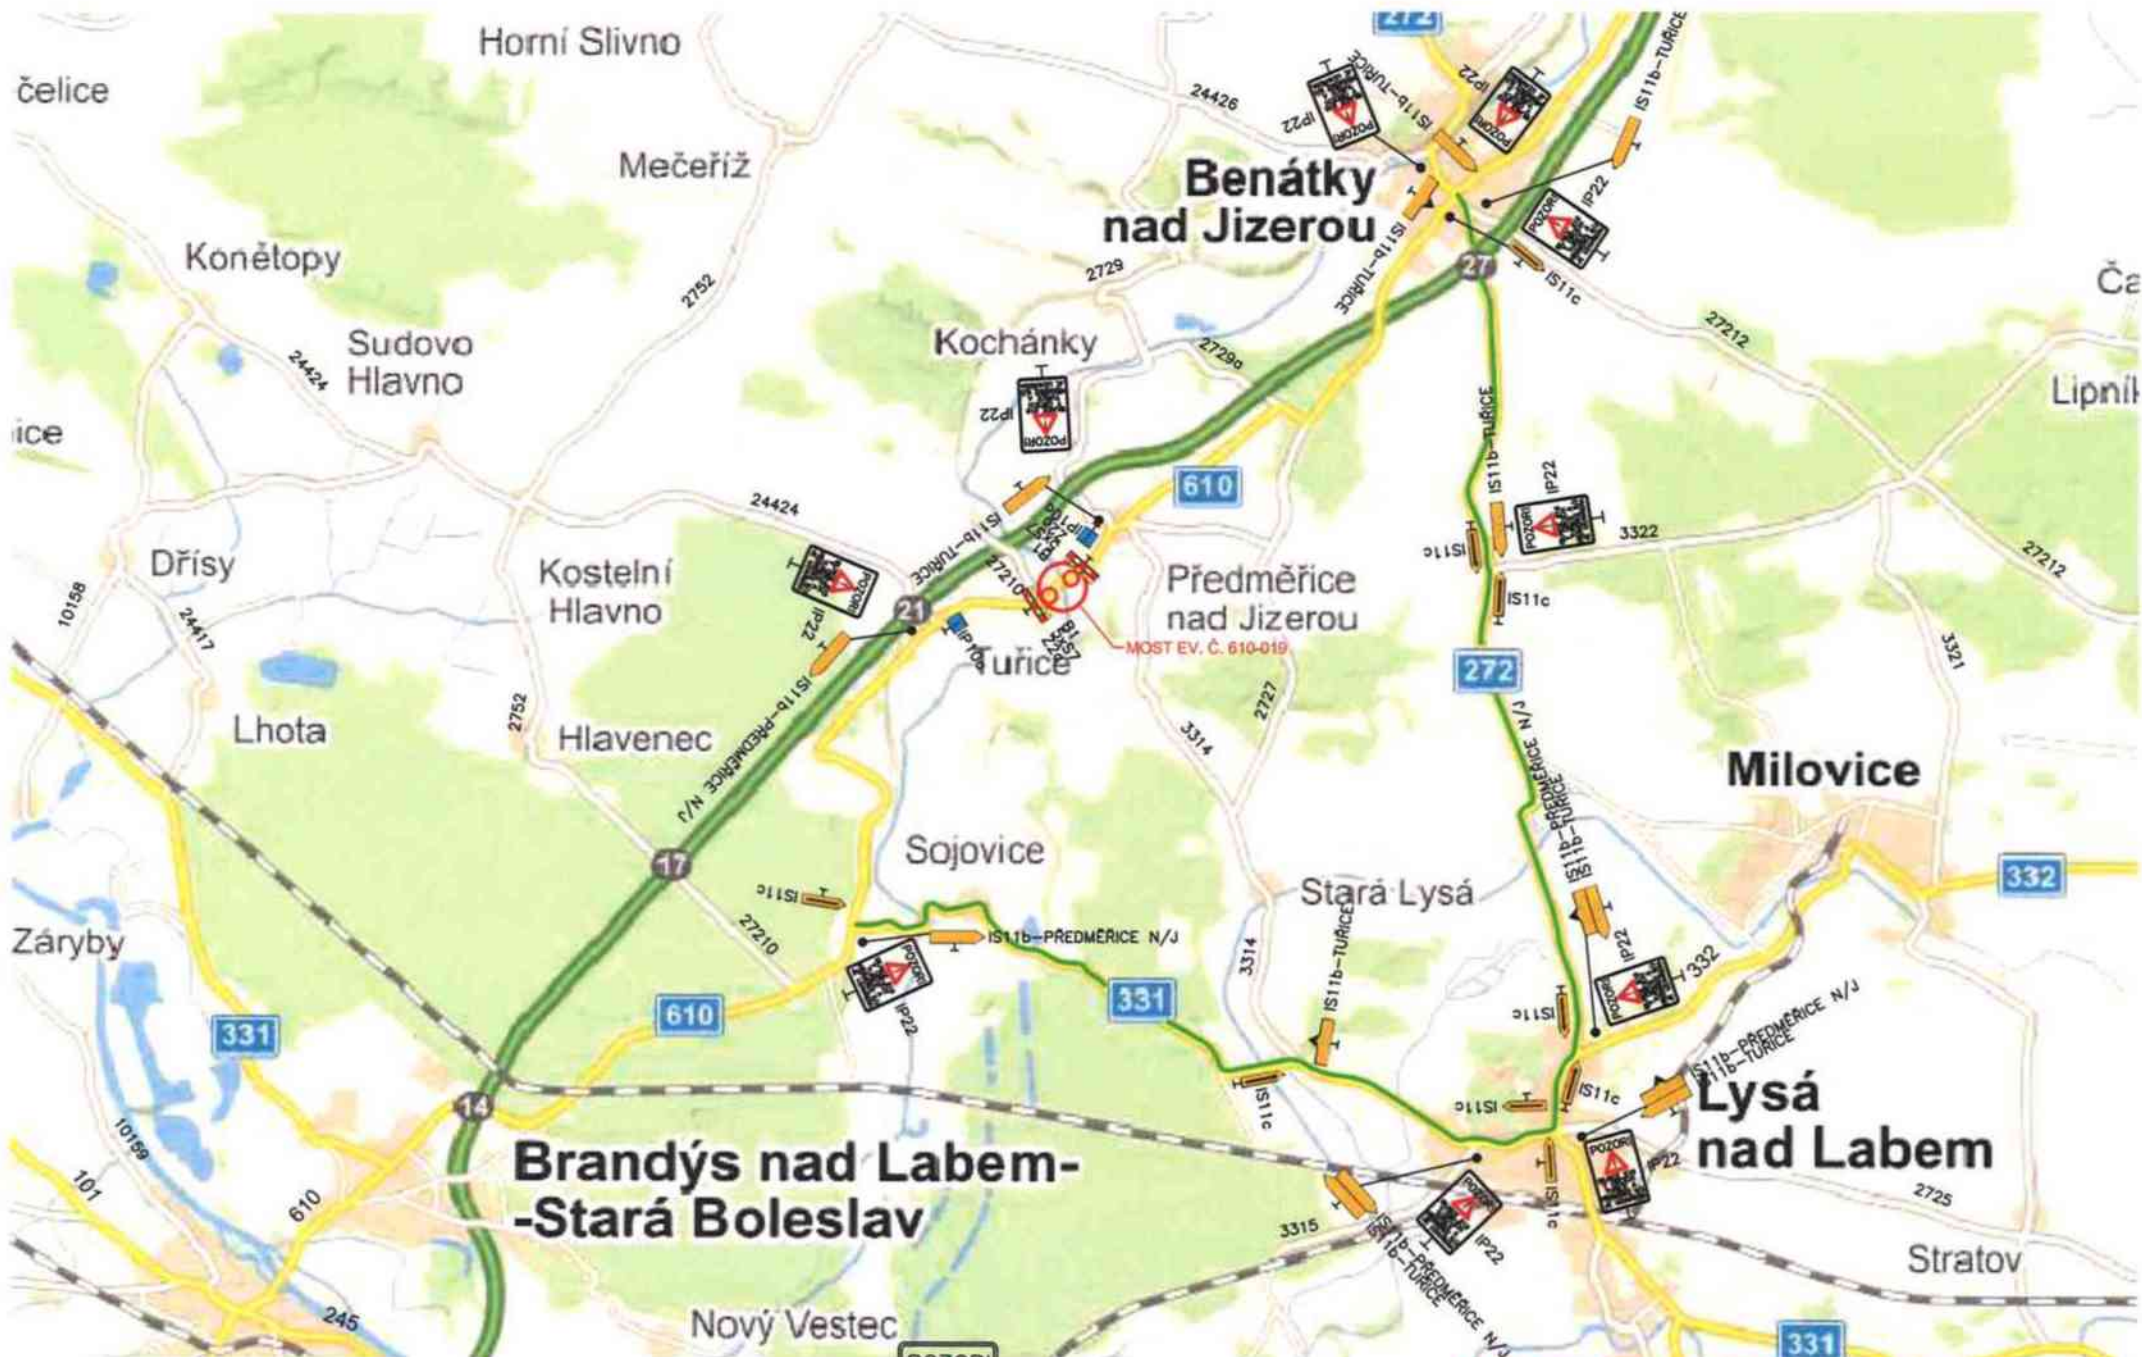

LEGENDA: — OBJÍZDNÁ TRASA



IP22

II/610 TUŘICE, MOST EV.Č. 610-019
PŘES JIZERU V TUŘICÍCH
SITUACE OBJÍZDNÉ TRASY

M 1:15 000



Magistrát města Mladá Boleslav

Odbor dopravy a silničního hospodářství

Havlíčková 1307, 293 01 Mladá Boleslav

tel./fax.: 326716333/326716344, e-mail: pec@mb-net.cz



NAŠE ZN.: ODSH 253-280/2020-24/203

VYŘIZUJE: Pelc Jiří

TEL.:

E-MAIL:

DATUM 18.08.2020

PORR a.s.

IČ 43005560

Dubečská 3238/36

100 00 PRAHA 10

v zastoupení:

SEDOZ DZ s.r.o.

IČ 24218537

Primátorská 296/38

186 03 PRAHA 8

U s n e s e n í

Magistrát města Mladá Boleslav, odbor dopravy a silničního hospodářství jako speciální stavební úřad dle § 40 odst.4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, podle § 66 odst. 1 písm. g) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,

z a s t a v u j e ř í z e n í

o žádosti na vydání **stanovení přechodné úpravy provozu**, které má být užito v souvislosti s úplnou uzavírkou silnice č. II/610, z důvodu opravy mostu při akci: „II/610 Tuřice - most ev.č. 610-019“, kterou žadatel: PORR a.s., IČ 43005560, se sídlem Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10, podal na Magistrát města Mladá Boleslav - odbor dopravy a silničního hospodářství, dne 10. srpna 2020.

O d ů v o d n ě n í:

Žadatel: PORR a.s., IČ 43005560, se sídlem Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10, podal dne 10. srpna 2020, na Magistrát města Mladá Boleslav, odbor dopravy a silničního hospodářství, žádost o vydání **stanovení přechodné úpravy provozu**, které má být užito v souvislosti s úplnou uzavírkou silnice č. II/610, z důvodu opravy mostu při akci: „II/610 Tuřice - most ev.č. 610-019“.

S přihlédnutím k zápornému vyjádření Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 (zn. 5068/20/KSUS/MTH/GEIS, ze dne 15. července 2020) a zápornému vyjádření Policie ČR Krajské ředitelství Středočeského kraje, Územní odbor Mladá Boleslav, Dopravní inspektorát - Štefánikova čp. 1304, 293 01 Mladá Boleslav (čj. KRPS 175944/ČJ-2020-010706-KOM, ze dne 13. srpna 2020), dospěl správní orgán k závěru, že stanovení přechodné úpravy provozu, které mělo být užito v souvislosti s úplnou uzavírkou silnice č. II/610, z důvodu opravy mostu při akci: „II/610 Tuřice - most ev.č. 610-019“, **nelze vydat.**

Uvedené záporná stanoviska Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 a Policie ČR Krajské ředitelství Středočeského kraje, Územní odbor Mladá Boleslav, Dopravní inspektorát - Štefánikova čp. 1304, 293 01 Mladá Boleslav, neumožňují pokračování v řízení o vydání **stanovení přechodné úpravy provozu**, které mělo být užito v souvislosti s úplnou uzavírkou silnice č. II/610, z důvodu opravy mostu při akci: „II/610 Tuřice - most ev.č. 610-019“, a proto nezbylo než řízení v dané věci pod § 66 odst. 1, písm. g) zákona č. 500/2004 Sb., **zastavit**.

Poučení:

Proti tomuto usnesení je možno se odvolat prostřednictvím Magistrátu města Mladá Boleslav, odbor dopravy a silničního hospodářství, ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, a to do 15 dnů ode dne oznámení usnesení. Podané odvolání nemá odkladný účinek.

Referent odboru dopravy :

Jiří Pelc

Rozdělovník:

PORR a.s. , IČ 43005560, se sídlem Dubečská 3238/36, Praha 10 - Strašnice (v zastoupení SEDOZ DZ s.r.o., IČ 24218537, se sídlem Primátorská 296/38, 186 03 Praha 8)

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5
Policie ČR Krajské ředitelství Středočeského kraje, Územní odbor Mladá Boleslav, Dopravní inspektorát - Štefánikova čp. 1304, 293 01 Mladá Boleslav



Pomáhat a chránit

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE

Územní odbor Mladá Boleslav
Dopravní inspektorát
Štefánikova 1304
293 01 Mladá Boleslav



PCR01ETRpo137338141

KRPS-263402/ČJ-2020-010706-KOM

Mladá Boleslav 3. listopadu 2020

Počet stran: 1

Přílohy:

SEDOZ DZ s. r. o.
Primátorská 296/38
180 00 Praha 8 – Libeň

Věc: Stanovisko k dopravnímu opatření
Návrh přechodného dopravního značení, zvláštní užívání

K Vaší žádosti ze dne 20. 10. 2020 o stanovisko k návrhu přechodného dopravního značení, viz přeložená situace, které by mělo být užito v souvislosti s úplnou uzavírkou silnice II/610 v obci Tuřice, z důvodu opravy mostu ev. č. 610-019 v termínu od 1. 4. 2021 do 31. 7. 2021, Vám sděluji, že Policie České republiky Dopravní inspektorát Mladá Boleslav, jako dotčený orgán podle ustanovení § 77 odst. 2 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů v platném znění, s předloženým návrhem přechodné úpravy provozu **n e s o u h l a s í** z důvodu vedení objízdné trasy přes uzavřený úsek II/272 v Lysé nad Labem. Stavba „Lysá nad Labem II/272 – oprava povrchu komunikace“ má probíhat do 15. 8. 2021.

Zpracoval:
komisař por. PhDr. Jaroslav Palaczuk

komisař npor. Mgr. Tomáš Nermut'
vedoucí DI Mladá Boleslav
pověřen zastupováním
podepsáno elektronicky

SEDOZ DZ s.r.o.
Poděbradova 1751
289 22 Lysá nad Labem

Váš dopis značky/ze dne

Naše značka

5068/20/KSUS/MHT/GEIS

Vyřizuje/telefon

Geisslerová/

Praha


15.7.2020

Věc : Vyjádření k návrhu DIO – „II/610 Tuřice – most ev. č. 610-019“

Na základě předloženého návrhu DIO na výše uvedenou stavbu Vám sdělujeme, že s výše uvedeným návrhem **nesouhlasíme** z důvodu vedením objízdné trasy pro stavbu „II/610 Benátky nad Jizerou – most ev. č. 610-021a přes D10“.

S pozdravem

Lenka Chmelová
vedoucí TSÚ - oblast Mnichovo Hradiště

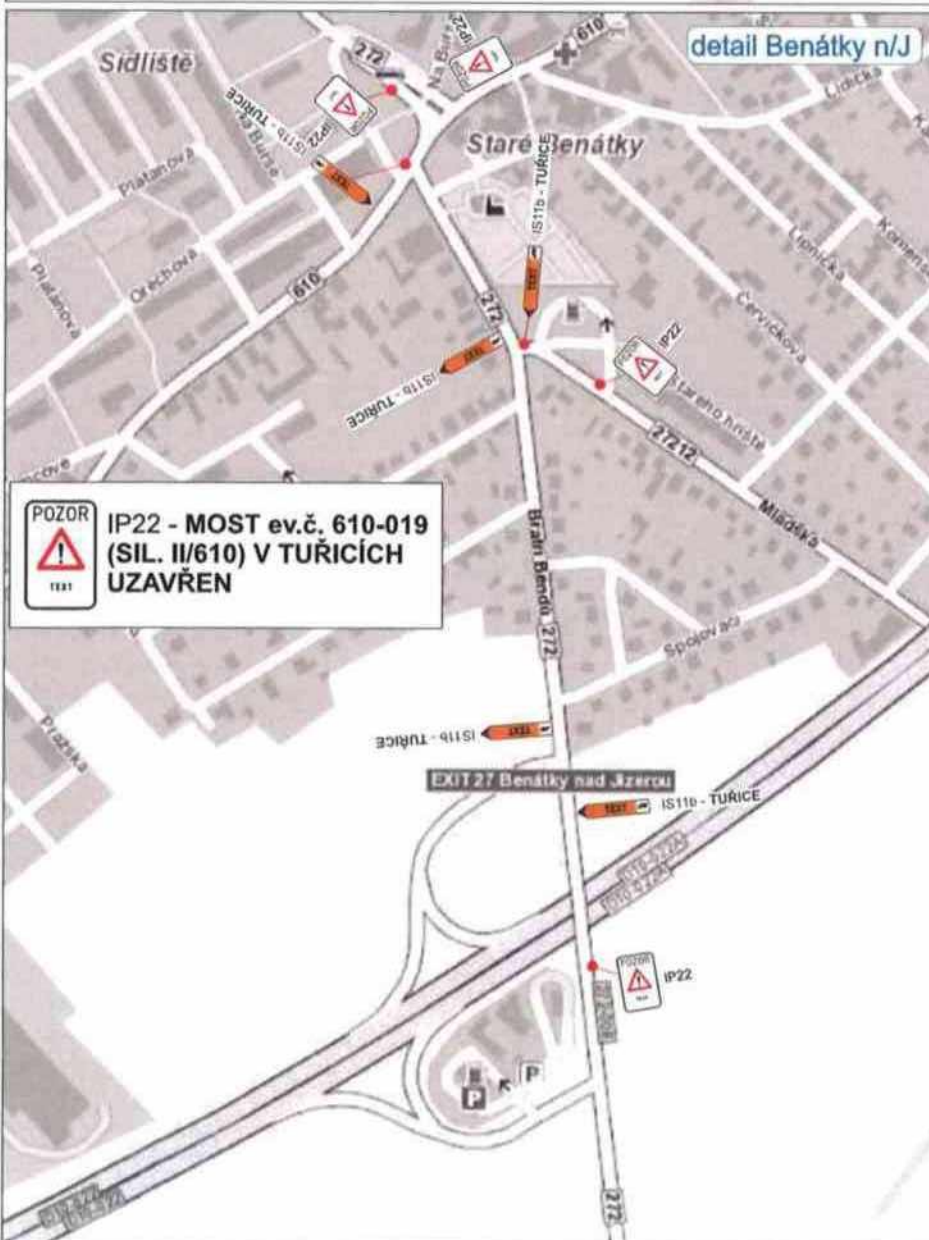


Stávající dopravní značení, které bude
v kolizi s DZ přechodným nutno zakrýt!

Při umístění dopravního značení musí
být dodrženy podmínky dané
v TP66 - OZNAČENÍ PRACOVNÍCH MÍST
NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH III.VYDÁNÍ,
zák.č.361/2000 Sb. v platném znění
a zák.č. 13/1997 Sb. v platném znění.

Projednával: Turice-Březno	Objednatel: Turice Vyká	Kvalita: Sada 100%
Stavba: FOTR a.s.		
Název: TUŘICE (II/610) - uzavírka mostu ev.č. 610-019		
Dělník: Návrh DIO		
SEDOZ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ		
Forma: A2	Adresa: Hradec	Číslo: 10000
Stav: 610	Číslo: 610	Číslo: 610
Číslo: 610	Číslo: 610	Číslo: 610



POZOR
IP22 - MOST ev.č. 610-019
(SIL. II/610) V TUŘICÍCH
UZAVŘEN

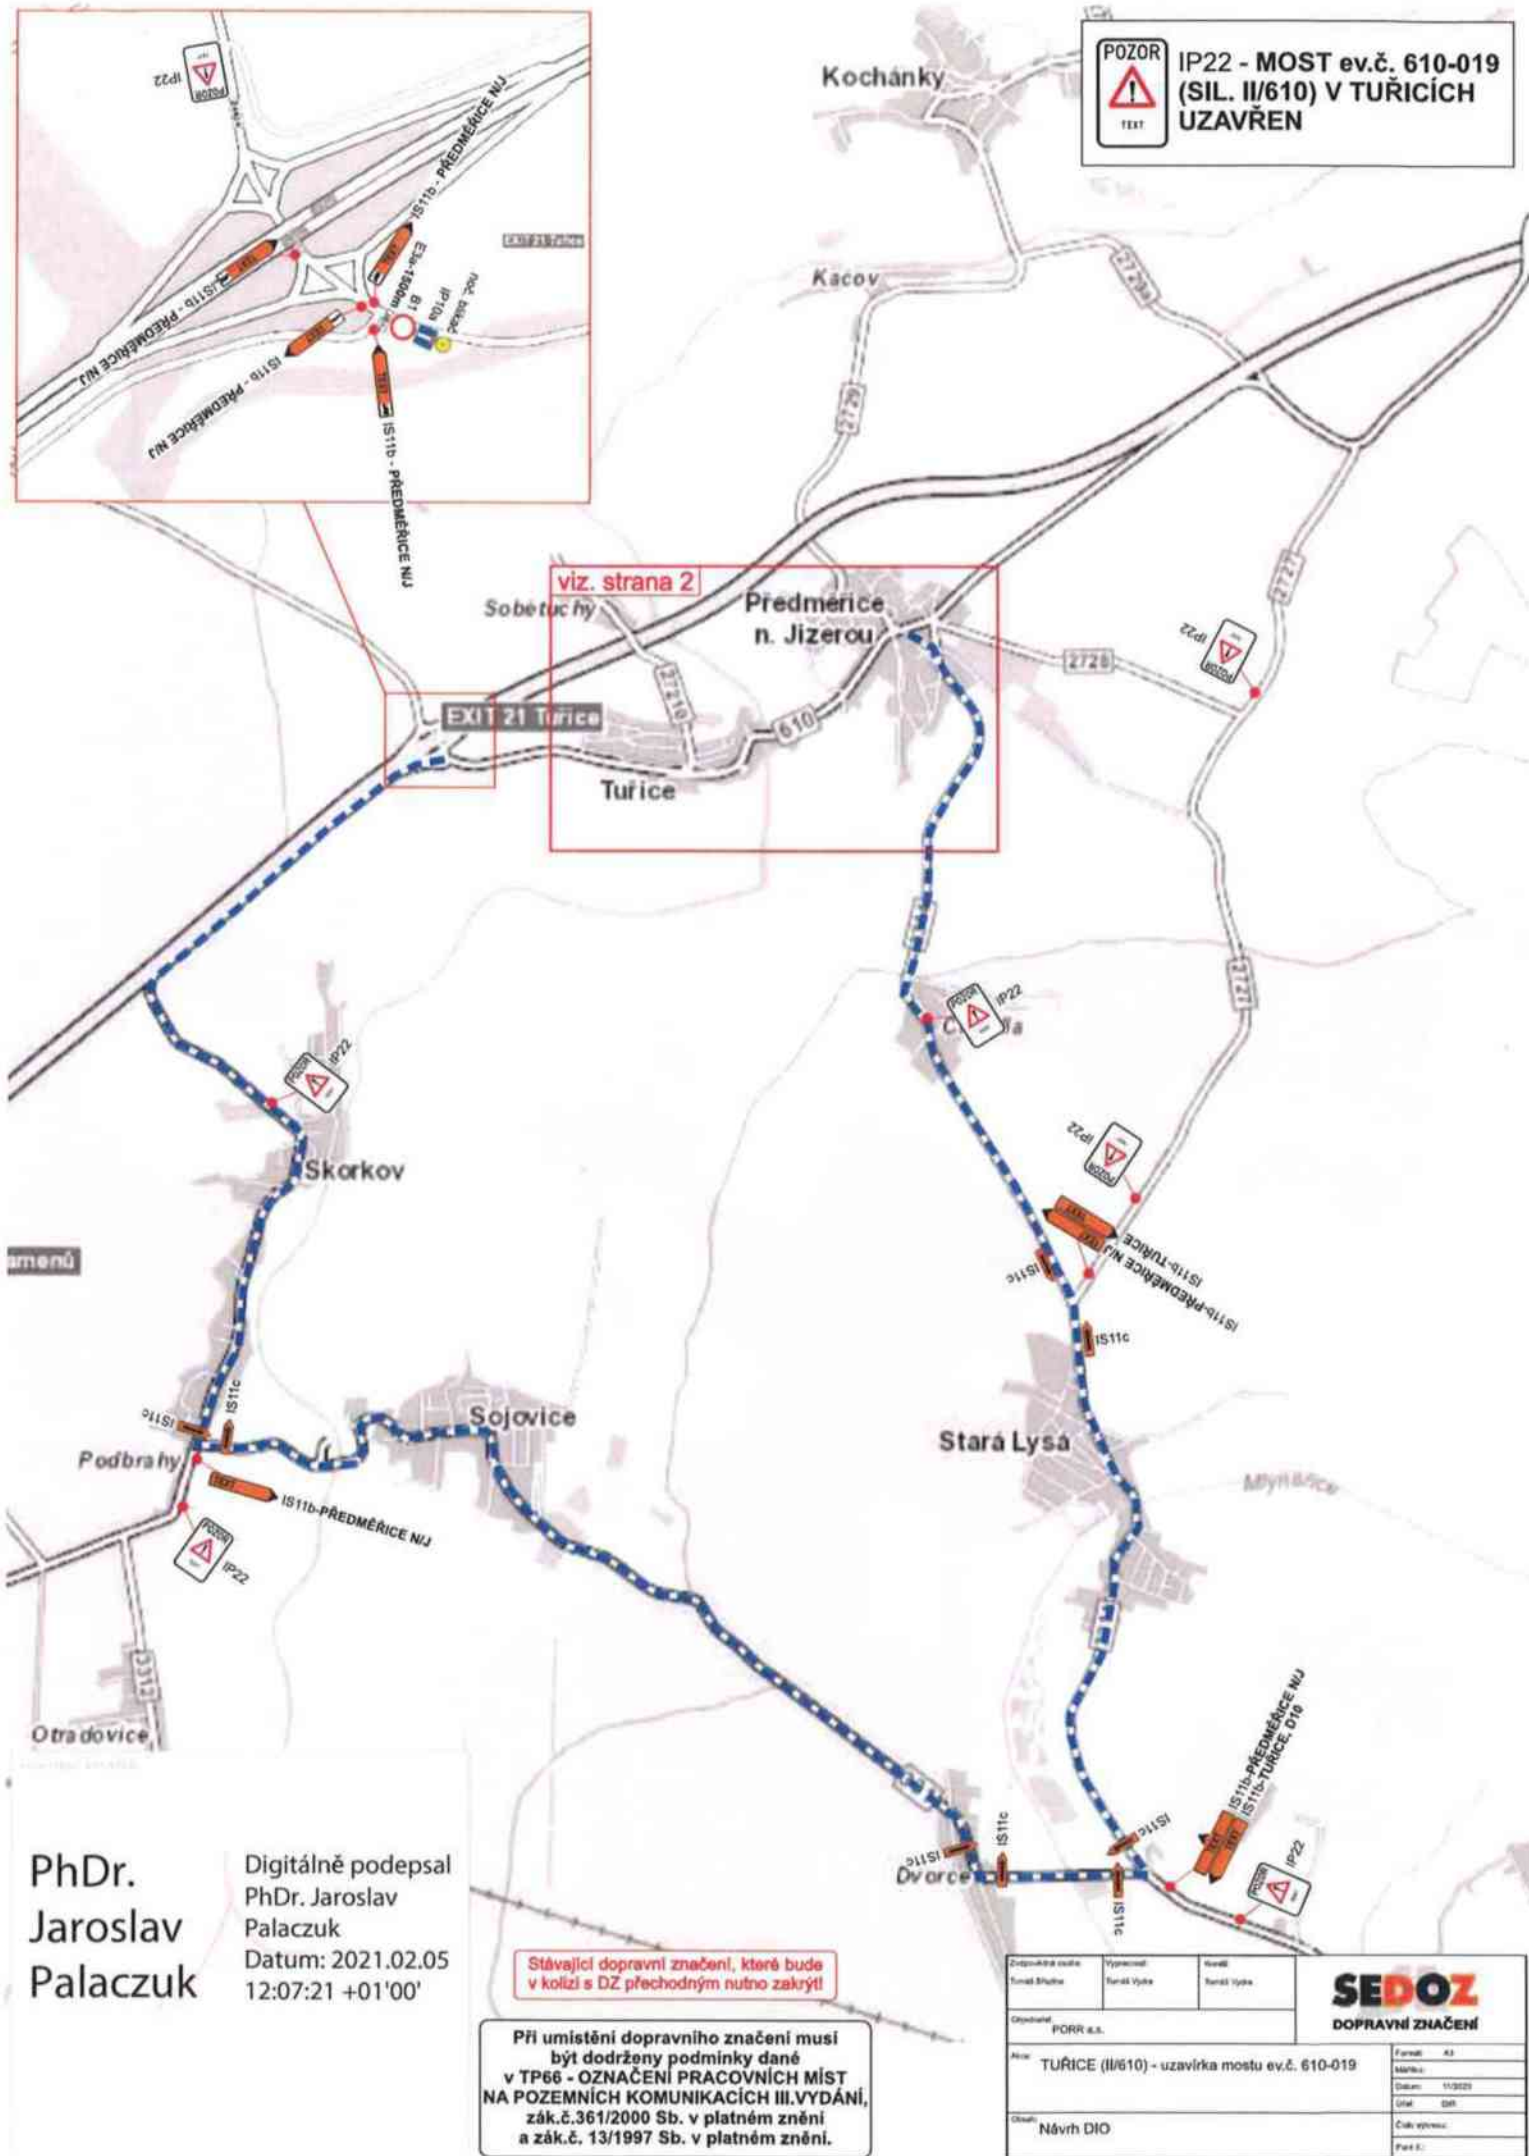

PhDr.
Jaroslav
Palaczuk

Digitálně podepsal
PhDr. Jaroslav
Palaczuk
Datum: 2021.02.05
12:07:21 +01'00'

Stávající dopravní značení, které bude
v kolizi s DZ přechodným nutno zakrýt!

Při umístění dopravního značení musí
být dodrženy podmínky dané
v TP66 - OZNAČENÍ PRACOVNÍCH MÍST
NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH III. VYDÁNÍ,
zák.č.361/2000 Sb. v platném znění
a zák.č. 13/1997 Sb. v platném znění.

Dopravní značení		Vypracoval	Revizní
Tunel Štáhlav		Revizní výkres	Revizní výkres
Opracoval: PORR a.s.			
Název: TUŘICE (II/610) - uzavírka mostu ev.č. 610-019			Formát: A3
Datum: 11/2020			Verze: 001
Upraveno: DIO			Číslo výkresu:
Návrh DIO			Podpis:

SEDOZ
DOPRAVNÍ ZNAČENÍ



Pomáhat a chránit

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE

Územní odbor Mladá Boleslav
Dopravní inspektorát
Štefánikova 1304
293 01 Mladá Boleslav



PCR01ETRpo137858407

KRPS-10037/ČJ-2021-010706-KOM

Mladá Boleslav 5. února 2021

Počet stran: 1

Přílohy: 2

SEDOZ DZ s. r. o.
Primátorská 296/38
180 00 Praha 8 - Libeň

Věc: Stanovisko k dopravnímu opatření
Návrh přechodného dopravního značení, zvláštní užívání

K Vaší žádosti ze dne 3. 2. 2021 o stanovisko k návrhu přechodného dopravního značení, viz příložené situace, které bude užito v souvislosti s úplnou uzavírkou silnice II/610 v obci Tuřice, z důvodu rekonstrukce mostu ev. č. 610-019 v termínu od 15. 4. 2021 do 15. 8. 2021, Vám sděluji, že Policie České republiky Dopravní inspektorát Mladá Boleslav, jako dotčený orgán podle ustanovení § 77 odst. 2 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů v platném znění, s předloženým návrhem přechodné úpravy provozu na silnicích II. a III. třídy v okrese Mladá Boleslav **s o u h l a s í**, neboť odpovídá obecným požadavkům na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.

Dopravní značení musí být provedeno v souladu s platnými právními předpisy a normami. Pracovní místa musí být řádně označena a zabezpečena zábranami. Zvláštní pozornost je třeba věnovat i bezpečnosti chodců – bezpečné lávky, zábrany kolem výkopů a jejich osvětlení.

Zároveň zdejší dopravní inspektorát dle ustanovení § 25 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění, **s o u h l a s í** se zvláštním užíváním dotčené komunikace ve smyslu § 25 odst. 6 písm. c) bodu 3 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění.

Dopravní inspektorát PČR Mladá Boleslav si vyhrazuje možnost stanovit další podmínky, které si vyžádají naléhavé okolnosti při zajišťování bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.

O stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích požádejte Magistrát města Mladá Boleslav, odbor dopravy a SH.

Zpracoval:
komisař por. PhDr. Jaroslav Palaczuk

komisař npor. Mgr. Tomáš Nermut'
vedoucí DI Mladá Boleslav

Tel.: +4
Email:
ID DS:

1

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Středočeského kraje
Územní odbor Nymburk
Dopravní inspektorát
Boleslavská 1831, 288 02 Nymburk

Č. j. KRPS-10421-2/ČJ-2021-010806

Nymburk 25. ledna 2021
Počet stran: 1

SEDOZ DZ s.r.o.
Poděbradova 1751
289 22 Lysá nad Labem

Tuřice – uzavírka mostu ev.č. 610-019 – závazné stanovisko DI PČR Nymburk.

Dopravní inspektorát PČR Nymburk na základě Vaší žádosti ve věci předloženého návrhu přechodné úpravy provozu k shora uvedené akci, Vám po prostudování a provedeném šetření sděluje následující stanovisko.

Dopravní inspektorát PČR Nymburk jako dotčený orgán podle § 77 odst. 2 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,

S O U H L A S Í

s předloženým návrhem přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích.

Dopravní značení, které je v rozporu s přechodnou úpravou provozu, bude zakryto.

Dopravní značky musí být rozměrem a barevným provedením v souladu s vyhl. č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích.

Provedení a umístění dopravních značek musí být v souladu s ČSN EN 12 899. Dopravní značky užívané k přechodnému dopravnímu značení musí být provedeny výhradně jako reflexní.

Dopravní inspektorát PČR Nymburk si vyhrazuje možnost stanovit další podmínky, které si vyžádají naléhavé okolnosti při zajišťování bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.

Dopravní inspektorát PČR Nymburk vydává toto stanovisko pouze pro návrh dopravního značení místě příslušnému územnímu odboru Nymburk a dále se k návrhu dopravního značení vyjádří dopravní inspektorát PČR Mladá Boleslav.

Zpracoval:

por. Bc. Jan Šťastný
komisař

Bc. Jan Šťastný

25.01.2021 16:54:41

Digitálně podepsal:

Bc. Jan Šťastný
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

Důvod:

70.4645.128653257



Magistrát města Mladá Boleslav

Odbor dopravy a silničního hospodářství

Havlíčková 1307, 293 01 Mladá Boleslav

tel./fax.: 326716333/326716344, e-mail: pelc@mb-net.cz



NAŠE ZN.: ODSH 253-280/2021-24/021

VYŘIZUJE: Pelc Jiří

TEL.: 326 716 333

E-MAIL: Pelc@mb-net.cz

DATUM 06.04.2021

ROZHODNUTÍ

Magistrát města Mladá Boleslav odbor dopravy a silničního hospodářství, jako silniční správní úřad podle § 40 odst 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, na základě předchozího souhlasu Policie ČR Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Mladá Boleslav, Dopravní inspektorát ul. Štefánikova 1304 Mladá Boleslav (*dále jen Policie ČR - DI Mladá Boleslav*), Krajské správy a údržby silnic, příspěvková organizace Praha 5, Zborovská 11 (*dále jen KSÚS*), oblast Mnichovo Hradiště a po projednání s dotčenými orgány a subjekty, ve smyslu § 24 zákona č. 13/1997 Sb., a § 39 vyhlášky č. 104/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích,

p o v o l u j e

žadateli: **PORR a.s.**, IČ 43005560, se sídlem Dubečská 3238/36, Praha 10 - Strašnice,

úplnou uzavírku:

silnice č. II/610 - most ev.č. 610-019 v k.ú. Tuřice

Údaje o uzavírce:

Úsek uzavírky: silnice č. II/610 v k.ú. Tuřice - most ev.č. 610-019

Doba uzavírky: od 15. dubna 2021 do 15. srpna 2021

Celková délka uzavírky: cca 100 m

Důvod uzavírky: oprava mostu ev.č. 610-019 v k.ú. Tuřice

Druh uzavírky: úplná

Objízdná trasa: po stanovené objízdné trase podle přiloženého plánu

Pravidelná autobusová doprava: ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o., Pod Hájem 97, Králův Dvůr

- Autobusová zastávka „Tuřice“, bude po dobu uzavírky zrušena. Náhradní zastávka bude zřízena na silnici III/27210 u „hospody“.
- Standardní autobusy využijí pro otočení v obci prostor pro otáčení u náhradní autobusové zastávky
- kapacitní a kloubové autobusy po obslužení náhradní zastávky „Tuřice“ pojedou dále po silnici č. III/27210 a po místních komunikacích v nové zastavbě.

- autobusová zastávka „Předměřice n. Jizerou" bude zrušena, všechny linky budou zastavovat náhradou ve stanici Předměřice n. Jizerou „u kostela"
- autobusy využijí pro otočení silnici III/2729 a místní komunikaci U hřiště
- vybrané autobusy přijíždějící ze směru od Kocháněk, využijí k otáčení místní komunikace, včetně komunikace podél hřbitova

Uzavírka se povoluje za těchto podmínek:

1/

Uzavírka bude řádně označena dopravními značkami, zábranami a informačními tabulemi podle dopravního značení odsouhlaseného v předloženém návrhu, který je součástí vyjádření Policie ČR DI Mladá Boleslav č.j.: KRPS-10037/ČJ-2021-010706-KOM, ze dne 5. února 2021, na základě kterého Magistrát města Mladá Boleslav odbor dopravy a silničního hospodářství podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., zákon o provozu na pozemních komunikacích v úplném znění novel, tímto **stanovuje přechodnou úpravu provozu**, které bude užito v souvislosti s úplnou uzavírkou silnice č. II/610 v obci Tuřice, z důvodu rekonstrukce mostu ev.č. 610-019, v termínu od 15. dubna 2021 do 15. srpna 2021.

Umístění přechodného dopravního značení bude provedeno podle přiloženého návrhu dopravního opatření (včetně doplňujících požadavků Policie ČR - DI Ml. Boleslav), který je nedílnou součástí povolení úplné uzavírky. Za snížené viditelnosti bude provedeno osvětlení.

2/

Budou splněny podmínky provozovatele autobusové dopravy ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o., uvedené ve vyjádření vydaném dne 30. března 2021

- objízdné trasy budou realizovány převážně po dálnici D10, v případě dopravních komplikací na dálnici D10, bude objízdná trasa realizována přes Starou Lysou a Sojovice

- v obci Tuřice, bude zajištěno dopravního značení tak, aby bylo zajištěno bezproblémové otáčení autobusů

- v lokalitě nové zástavby bude dopravní značení provedeno tak, aby byl zajištěn bezproblémový průjezd kapacitních autobusů

v obci Předměřice nad Jizerou, na místní komunikaci U Hřiště, bude takové dopravní značení, které zajistí bezproblémový průjezd autobusů

- na místní komunikaci podél hřbitova bude dopravní značení doplněno dodatkovou tabulkou "MIMO BUS"

3/

Žadatel je povinen učinit taková opatření, aby doba uzavírky byla dodržena případně zkrácena. Nebude-li akce ukončena v daném časovém termínu, bude přikročeno k použití sankcí podle ustanovení § 42b zákona č. 13/1997 Sb.

4/

Žadatel **zodpovídá** po celou dobu uzavírky za řádné rozmístění dopravních značek stanovených odborem dopravy a silničního hospodářství Magistrátu města Mladá Boleslav.

5/

Po ukončení uzavírky budou **ihned** odstraněna všechna zařízení umístěná v souvislosti s uzavírkou. Ukončení nebo zkrácení doby uzavírky bude oznámeno odboru dopravy a silničního hospodářství Magistrátu města Mladá Boleslav.

6/

Magistrát města Mladá Boleslav odbor dopravy a silničního hospodářství a Policie ČR DI Mladá Boleslav si vyhrazuje právo změnit nebo doplnit podmínky tohoto rozhodnutí, pokud si to vyžádá veřejný zájem nebo bezpečnost a plynulost silničního provozu.

Uzavírka a návrh dopravního značení byly odsouhlaseny Policií ČR - DI Mladá Boleslav v písemném stanovisku ze dne 5. února 2021, č.j.: KRPS-10037/2021-010706-KOM.

Za organizaci a zabezpečení akce, jakož i instalaci a stav přechodné úpravy - dopravního značení je odpovědný pan Pavel Slavík, tel. 734369116, z PORR a.s., IČ 43005560, se sídlem Dubečská 3238/36, Praha 10.

O d ů v o d n ě n í:

Žadatel: PORR a.s., IČ 43005560, se sídlem Dubečská 3238/36, Praha 10 - Strašnice, okres Hlavní město Praha, podal dne 3. února 2021, na Magistrát města Mladá Boleslav, odbor dopravy a silničního hospodářství žádost na povolení výše uvedeného dopravního omezení na silnici č. II/610 v k.ú. Tuřice.

Vzhledem k tomu, že žádost o povolení výše uvedené úplné uzavírky silnice č. II/610 v k.ú. Tuřice, byla doložena souhlasem účastníků řízení a dotčených orgánů státní správy a uzavírka neohrožuje bezpečnost sil. provozu, rozhodl odbor dopravy a silničního hospodářství Magistrátu města Mladá Boleslav tak, jak je ve výroku tohoto rozhodnutí uvedeno.

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat dle §81 a 83 zák. č. 500/2004 Sb., do 15 dnů ode dne doručení ke Krajskému úřadu-Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 00 Praha 5 podáním u odboru dopravy a silničního hospodářství Magistrátu města Mladá Boleslav. Ve smyslu § 24 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb., nemá odvolání proti tomuto rozhodnutí odkladný účinek.

Proti stanovení přechodné úpravy provozu nejsou přípustné opravné prostředky ve smyslu obecných předpisů o správním řízení.

Referent odboru dopravy

Jiří P e l c



IP22 - MOST ev.č. 610-019
(SIL. II/610) V TUŘICÍCH
UZAVŘEN



06. 04. 2021

PhDr.
Jaroslav
Palaczuk

Digitálně podepsal
PhDr. Jaroslav
Palaczuk
Datum: 2021.02.05
12:07:21 +01'00'

Stávající dopravní značení, které bude
v kolizi s DZ přechodným nutno zakrýt!

Při umístění dopravního značení musí
být dodrženy podmínky dané
v TP66 - OZNAČENÍ PRACOVNÍCH MÍST
NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH III. VYDÁNÍ,
zák.č.361/2000 Sb. v platném znění
a zák.č. 13/1997 Sb. v platném znění.

Zpracoval:	Podpis:	Podpis:	SEDOZ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
POŘÍ a.s.			
Adresa:	TUŘICE (II/610) - uzavírka mostu ev.č. 610-019		
Objekt:	Návrh DIO		
Funkce:	Stav:	Stav:	Stav:
Stav:	Stav:	Stav:	Stav:
Stav:	Stav:	Stav:	Stav:
Stav:	Stav:	Stav:	Stav:



Magistrát města Mladá Boleslav



Odbor dopravy a silničního hospodářství



Komenského náměstí 61, 293 01 Mladá Boleslav

Telefon.: 326 716 331, Fax: 326 716 336, 326 716 344, e-mail: machacek@mb-net.cz

Sp.zn.: ODSH 253-280/2021-23/161

Č.j.: 67493/2021/ODSD/MaMa

Ev.č.: 83634

Mladá Boleslav 28.7.2021

Oprávněná úřední osoba: Martin Macháček

PORR a. s.

IČO 430 05 560

Dubečská 3238/36

100 00 Praha 10 - Strašnice

ROZHODNUTÍ

Odbor dopravy a silničního hospodářství Magistrátu města Mladá Boleslav, jako věcně příslušný silniční správní úřad ve věcech silnic, dle ustanovení § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, na základě předchozího souhlasu Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, příspěvkové organizace, Policie ČR Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, územní odbor, dopravní inspektorát Mladá Boleslav a po projednání s dotčenými úřady a subjekty

p o v o l u j e

ve smyslu ustanovení § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a ve smyslu § 39 vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, **dopravní omezení – úplnou uzavírku mostního objektu v k. ú. Tuřice, ev. č. 610-019, převádějícího silnici č. II/610, , dle předložené situace dopravního značení, z důvodu opravy mostu, prodloužení termínu původní uzavírky: od 16.8.2021 - do 22.8.2021.**

Žadatel: **spol. PORR a. s., IČO 430 05 560, Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 – Strašnice, v. z. spol. SEDOZ DZ s. r. o., Primátorská 296/38, 180 00 Praha 8 – Libeň.**

Údaje o uzavírci:

- 1) Úsek uzavírky: mostní objekt v k. ú. Tuřice, ev. č. 610-019, cca v silničním km 19,500
- 2) Důvod uzavírky: oprava mostu
- 3) Druh uzavírky: úplná, dle DIO v příloze
- 4) Termín uzavírky: **od 16.8.2021 - do 22.8.2021**
- 5) Délka uzavírky: cca 100 m; mostní objekt cca v silničním km 19,500
- 6) Trasa objížďky: dle stanoveného dopravního značení po silnici č. II/610 směr Skorkov, Podbrahy, č. II/331, Sojovice, č. III/3314 Stará Lysá, Předměřice nad Jizerou. Objížďka bude ohousměrná.

Uzavírka je povolena za těchto podmínek :

- 1) Žadatel zodpovídá po celou dobu uzavírky za řádné rozmístění stanoveného dopravního značení a jeho údržbu tak, jak bylo odsouhlaseno. Žadatel je povinen učinit taková opatření, aby doba uzavírky byla dodržena, případně zkrácena.
- 2) Uzavírka bude řádně označena dopravními značkami, zábranami a informačními tabulemi v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (PK) a změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Dopravní značení musí provedením odpovídat vyhl. č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ČSN 01 8020, ČS EN12899-1 a musí být v souladu se zásadami pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích TP 66, zásady pro označování pracovních míst.
- 3) Místní úprava provozu, která je v rozporu s přechodnou úpravou provozu, bude zakryta.
- 4) Bude užito DZ v reflexním provedení v základní velikosti. DZ bude zajištěno proti posunutí, otočení nebo pádu vlivem povětrnostních podmínek. Dopravní značky budou osazeny na červeno-bílých pruhovaných sloupcích, spodní hrana dopravních značek bude min. 60 cm nad vozovkou v jednotné výšce v rámci pracovního místa, příp. budou osazeny jako trvalé DZ.
- 5) **Dopravní značení bude užito dle rozhodnutí o povolení uzavírky vydaného dne 6.4.2021 sp.zn.: ODSH 253-280/2021-24/021 a stanoviska Policie ČR KŘP SK ÚO – DI Mladá Boleslav ze dne 5. února 2021 č.j.: KRPS-10037/ČJ-2021-010706-KOM, souhlasu ze dne 27.7.2021, vč. schválené situace dopravního značení.**

- 6) Budou dodrženy podmínky výše uvedeného stanoviska - souhlasu Policie ČR Krajské ředitelství policie SK ÚO-DI Mladá Boleslav a Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, p.o. zn.: 1150/21/KSUS/MHT/GEIS ze dne 27.7.2021.
- 7) Autobusy veřejné hromadné přepravy osob, ARRIVA Střední Čechy s.r.o. budou provozovány ve smyslu podmínek rozhodnutí ze dne 6.4.2021 sp.zn.: ODSH 253-280/2021-24/021, vč. souhlasu spol. ARRIVA Střední Čechy s.r.o. ze dne 27.7.2021.
- 8) Po skončení uzavírky budou ihned odstraněna všechna zařízení umístěná v souvislosti s povolenou uzavírkou.
- 7) Nebudou-li dodrženy podmínky tohoto rozhodnutí bude postupováno dle přísl. ustanovení zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
- 8) Magistrát města Mladá Boleslav, odbor dopravy a SH a Policie ČR KŘP SK ÚO-DI Ml. Boleslav si vyhrazují právo změnit nebo doplnit podmínky tohoto rozhodnutí, pokud si to vyžádá veřejný zájem nebo bezpečnost a plynulost silničního provozu.

Odpovědná osoba:

Za organizaci, zabezpečení akce, instalaci a stav přechodné úpravy provozu – dopravního značení zodpovídá za žadatele: pan Pavel Slavík, tel.: 734 369 116.

O d ů v o d n ě n í :

Spol. PORR a. s., IČO 430 05 560, Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 – Strašnice, v. z. spol. SEDOZ DZ s. r. o., Primátorská 296/38, 180 00 Praha 8 - Libeň podala žádost o povolení dopravního omezení – úplnou uzavírku mostního objektu v k. ú. Tuřice, ev. č. 610-019, převádějícího silnici č. II/610, z důvodu opravy mostu a zajištění bezpečnosti silničního provozu v tomto úseku silnice. Pro zajištění bezpečnosti silničního provozu při provádění prací rozhodl odbor dopravy a SH Magistrátu města Mladá Boleslav, jako příslušný silniční správní úřad, tak, jak je ve výroku tohoto rozhodnutí uvedeno.

Poučení o odvolání :

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení ke Krajskému úřadu středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 - Smíchov, podáním u odboru dopravy a silničního hospodářství magistrátu města Mladá Boleslav.

Dle ustanovení § 24 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, nemá případné odvolání proti tomuto rozhodnutí odkladný účinek.

Martin Macháček
Vedoucí oddělení dopravy správy dopravy

Dále obdrží :

SEDOZ DZ s. r. o., Primátorská 296/38, 180 00 Praha 8 - Libeň
Korespondenční adresa: Poděbradova 1751, 289 22 Lysá nad Labem
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěv. org.
PČR KŘP SK ÚO-DI Ml. Boleslav
ARRIVA s.r.o., DP Mladá Boleslav s.r.o.; idsk@idsk.cz
Obec Tuřice
Obec Předměřice n. Jiz.
Obec Skorkov
Obec Sojovice
Obec Kochánky
Obec Stará Lysá
Město Lysá nad Labem
Město Benátky nad Jizerou
MěÚ Stará Boleslav – Brandýs nad Labem
IZS
Compag, s.r.o.

Příloha:

DIO



P22 - MOST ev.č. 610-019
(SIL. II/610) V TUŘICÍCH
UZAVŘEN



06. 04. 2021

MAGISTRÁT MĚSTA

Mladá Boleslav
odbor dopravy
v silnicích

PhDr.
Jaroslav
Palaczuk

Digitálně podepsal
PhDr. Jaroslav
Palaczuk
Datum: 2021.02.05
12:07:21 +01'00'


Stávající dopravní značení, které bude
v kolizi s DÚZ přechodným nutno zakrýt

Při umístění dopravního značení musí
být dodrženy podmínky dané
v TP 86 - OZNAČENÍ PRACOVNÍCH MÍST
NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH III. VYDÁNÍ,
zák.č.361/2000 Sb. v platném znění
a zák.č. 13/1997 Sb. v platném znění.

Podpis: _____	Stav: _____	Seznam: _____
SEDOZ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ		
NAZEV: TUŘICE (I/610) - uzavírka mostu ev.č. 610-019		
Návrh DÚO		



IP22 - MOST ev.č. 610-019
(SIL. II/610) V TUŘICÍCH
UZAVŘEN

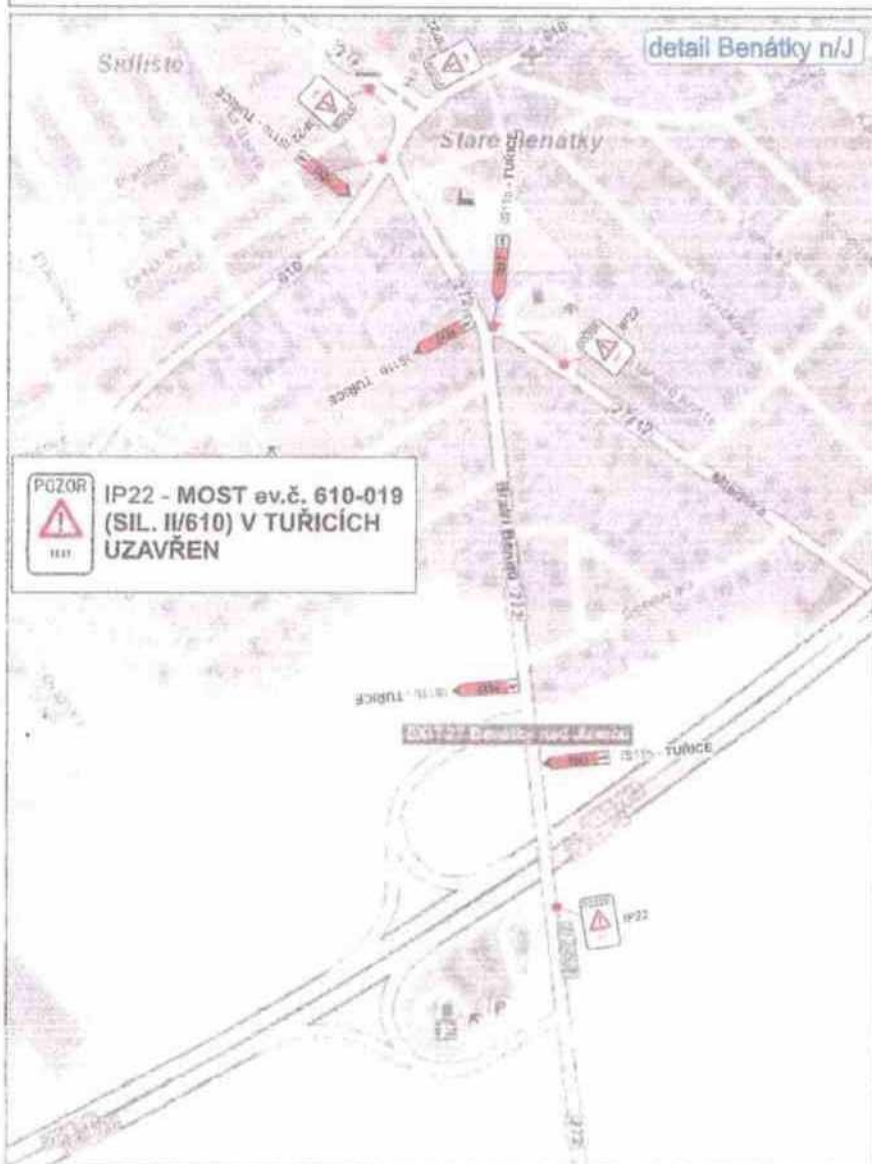

IP22 - MOST ev.č. 610-019
(SIL. II/610) V TUŘICÍCH
UZAVŘEN

PhDr.
Jaroslav
Palaczuk

Digitálně
podepsal PhDr.
Jaroslav Palaczuk
Datum: 2021.02.05
12:05:27 +01'00'

Stávající dopravní značení, které bude
v kolizi s DZ přechodného režimu zakazují

Při umístění dopravního značení musí
být dodrženy podmínky dané
v TP66 - OZNAČENÍ PRACOVNÍCH MÍST
NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH III. VYDÁNÍ,
zák. č. 361/2000 Sb. v platném znění
a zák. č. 13/1997 Sb. v platném znění.

06. 04. 2021

Stavba/úprava	Objekt	Kód	SEDOZ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
Objekt	Objekt	Objekt	
TURICE RIVIC - uzavření mostu ev.č. 610 019			Pracovní
Název DZ			Pracovní
			Pracovní
			Pracovní
			Pracovní



**ATELIER PROJEKTOVÁNÍ
INŽENÝRSKÝCH STAVEB s.r.o.**
Ohradní 24b
140 00 Praha 4 - Michle

Firma je registrována v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze – oddíl C, vložka 31260

Váš dopis zn.:

Ze dne: -

Naše zn.: APIS-0199/2021

Vyřizuje: Ing. Josef Jírotka

Tel: +

E-ma

PORR a.s.

Závod Čechy - výroba

Pan Pavel Slavík

Dubečská 3238/36

100 00 Praha 10 Strašnice

Datum: 26.7. 2021

Věc: II/610 Tuřice, most ev.č. 610-019 přes Jizeru v Tuřicích Vyjádření AD ke změně DIO

Ve druhé polovině loňského roku byla zhotovitelem výše uvedené stavby podána žádost o stanovení přechodné úpravy provozu, která se týkala objízdných tras pro realizaci opravy mostu ev.č. 610-019. K této žádosti ovšem byla vydána zamítavá stanoviska z toho důvodu, že v období uvažované uzavírky silnice II/610 na mostě ev.č. 610-019 byla touto silnicí vedená objízdná trasa přes uzavřenou část silnice II/272, kde probíhá akce " Lysá nad Labem II/272 – oprava povrchu komunikace".

Z těchto důvodů bylo nutné změnit původně uvažované DIO a v něm stanovené objízdné trasy.

S pozdravem

Ing. Josef Jírotka

Hlavní inženýr projektu

PORR a.s.

Stav. Pavel Slavík

Dubečská 36, 100 00 Praha10

Čj: 2021/016/MK

V Praze dne 19.8.2021

Věc: **Vyjádření TDI k návrhu ZBV ke změně DIO stavby II/610 Tuřice,
most ev.č. 610-019**

Dle zadávací dokumentace stavby mostu II/601 Tuřice projektant RDS požádal o stanovení přechodné úpravy provozu objížděných tras opravy mostu II/610 Tuřice ev.č. 610-019. Rozhodnutí správního úřadu bylo nepředpokládaně zamítnuto. Důvodem zamítnutí uvažované uzavírky silnice II/610 v Tuřicích byla uzavírka silnice II/272 uvažovaná jako objížděná trasa opravy mostu. Z tohoto důvodu bylo nevyhnutelně změněno původně uvažované DIO a vněm stanovení nové objížděné trasy. Jakožto odpovědný zástupce Objednatele odsouhlasuji skladbu měněných položek a nových položek včetně jejich výměr, vyjadřujících předpokládanou změnu. Potvrzuji zároveň skutečné provedení prací.



Ing. Michal Kňážko

TDI - asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi

Tel.:

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby: II/610 Tuřice, most ev.č. 610-019 přes Jizeru v Tuřicích Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 201 Oprava mostu	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 201 /1	Číslo ZBV: 2
Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov IČ: 00066001		
Zhotovitel: PORR a.s. Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10 IČ: 43005560		

Rekapitulace ZBV č. 2 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.1	0,00	0,00	0,00
část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.2	-187 083,16	104 960,00	-82 123,16
část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.3	0,00	72 112,43	72 112,43
část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.4	0,00	0,00	0,00
část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.5	0,00	0,00	0,00
Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2	-187 083,16	177 072,43	-10 010,74

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré: 

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: II/610 Tuřice, most ev.č. 610-019 přes Jizeru v Tuřicích Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 201 Oprava mostu	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 201 / 1	Číslo ZBV: 2.2
--	--	---

Strany smlouvy o dílo č. S-1923/00066001/2020 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 25.06.2020 (dále jen Smlouva):
 Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
 Zhotovitel: PORR a.s., Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10, Strašnice

Přílohy Změnového listu: <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">1. Krycí list</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">1</td> <td style="width: 60%;">počet listů</td> </tr> <tr> <td>2. Změnový list</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>4. Rozpis ocenění Změn položek</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>5. Přehled zařazení změn do skupin</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>6. Přehled dalších dokladů</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>Další doklady</td> <td style="text-align: center;">12</td> <td>počet listů</td> </tr> </table>	1. Krycí list	1	počet listů	2. Změnový list	1	počet listů	3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů	4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů	5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů	6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů	Další doklady	12	počet listů	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">Paré č.:</td> <td style="width: 70%;">Příjemce</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td>2, 3</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Projektant</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>TDI</td> </tr> </table>	Paré č.:	Příjemce	1	Objednatel	2, 3	Zhotovitel	4	Projektant	5	TDI
1. Krycí list	1	počet listů																														
2. Změnový list	1	počet listů																														
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů																														
4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů																														
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů																														
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů																														
Další doklady	12	počet listů																														
Paré č.:	Příjemce																															
1	Objednatel																															
2, 3	Zhotovitel																															
4	Projektant																															
5	TDI																															

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Výměna povrchového dilatačního závěru za EMZ

V zadávací dokumentaci bylo v rámci opravy mostu navrženo provedení nových dilatačních závěrů pomocí povrchového mostního závěru pro posuny do 60 mm.

Po odkrytí dilatačního styku mostovky a předpolí mostu byl zjištěn skutečný tvar dilatační spáry, který byl odlišný oproti předpokladům ze zadávací dokumentace a který z konstrukčních důvodů neumožňoval instalaci původně uvažovaného typu dilatace (viz doklad č. 08 - Zápis ve SD ze dne 26.7.2021).

Z tohoto důvodu bylo navrženo alternativní řešení v podobě elastického mostního závěru (EMZ). Nový typ dilatace byl technicky posouzen autorským dozorem, který toto řešení odsouhlasil (viz doklad č. 11 - Vyjádření AD). Souhlas stavebního dozoru s výše uvedenými změnami je přiložen jako doklad č. 12 (Vyjádření TDI).

Tyto změny („ZBV“) proběhly na základě žádosti zhotovitele o změnu rozsahu díla (viz doklad č. 09) a pokynu objednatele ke změně (viz doklad č. 10).

Jedná se o rovnocennou (technicky i kvalitativně) náhradu původně navržené položky a zároveň dochází k úspoře ceny.

Změna se týká položky č. 74 (nová položka) a položky č. 49 (zrušená stávající položky). Tato změna snižuje smluvní cenu díla o 82 123,16 Kč.

Jedná se o změnu vzniklou záměnou položek. Celkově se jedná o Změnu nepodstatnou, kterou lze dle § 9 Směrnice R-SM-36 Krajské právy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29. 05. 2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařadit do **Skupiny 2**. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 7) se jedná o změnu Záměna položek.

Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-187 083,16	104 960,00	-82 123,16	292 043,16

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí)	jméno	Pavel Slavík	datum 7.10.2021	podpis	✓
Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Josef Jírotka	datum 4.10.2021	podpis	
Technický dozor investora	jméno	Ing. Michal Kňážko	datum 7.10.2021	podpis	
Zástupce Objednatel:	jméno	Jan Boček	datum 7.10.2021	podpis	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitel sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel)	jméno	Ing. Jan Lichtneger	datum	podpis	
Zhotovitel	jméno	Ing. Pavel Hirsch	datum 6.10.2021	podpis	✓
	jméno	Ing. František Buršík	datum 7.10.2021	podpis	

	Číslo paré:
--	-------------

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: II/610 Tuřice, most ev.č. 610-019 přes Jizeru v Tuřicích Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 201 Oprava mostu		Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 201 / 1	Číslo ZBV: 2.3																																						
Strany smlouvy o dílo č. S-1923/00066001/2020 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 25.06.2020 (dále jen Smlouva): Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov Zhotovitel: PORR a.s., Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10, Strašnice																																									
Přílohy Změnového listu: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">1. Krycí list</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">1</td> <td style="width: 20%;">počet listů</td> <td style="width: 40%;"></td> </tr> <tr> <td>2. Změnový list</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>počet listů</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>počet listů</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4. Rozpis ocenění Změn položek</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>počet listů</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5. Přehled zařazení změn do skupin</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>počet listů</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6. Přehled dalších dokladů</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>počet listů</td> <td></td> </tr> <tr> <td> Další doklady</td> <td style="text-align: center;">12</td> <td>počet listů</td> <td></td> </tr> </table>		1. Krycí list	1	počet listů		2. Změnový list	1	počet listů		3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů		4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů		5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů		6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů		Další doklady	12	počet listů		<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%; text-align: center;">Paré č.</td> <td style="width: 70%;">Příjemce</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2, 3</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4</td> <td>Projektant</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">5</td> <td>TDI</td> </tr> </table>		Paré č.	Příjemce	1	Objednatel	2, 3	Zhotovitel	4	Projektant	5	TDI
1. Krycí list	1	počet listů																																							
2. Změnový list	1	počet listů																																							
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů																																							
4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů																																							
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů																																							
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů																																							
Další doklady	12	počet listů																																							
Paré č.	Příjemce																																								
1	Objednatel																																								
2, 3	Zhotovitel																																								
4	Projektant																																								
5	TDI																																								
Iniciátor změny: Zhotovitel Popis a zdůvodnění Změny:																																									
Doplnění zábradlí na předpoli Po odstranění náletových křovin v předpolí mostu došlo k odkrytí skutečných terénních poměrů v okolí mostu. Bylo zjištěno, že u pravého křídla mostu na straně u Tuřic se nachází vyústění odvodnění komunikace v podobě otevřeného výkopu, jehož spodní úroveň byla v hloubce cca 1,7 m pod úrovní chodníku (viz doklad č. 08 - Zápis ve SD ze dne 27.7.2021). Z důvodu zajištění bezpečnosti chodců na předpolí mostu a na chodníku na pravé straně u křídla mostu bylo nutné prodloužit mostní zábradlí o 14,2 m tak, aby bylo zamezeno případnému pádu chodců do tohoto volného prostoru. Fotodokumentace změny je obsahem dokladu č. 13. Změna byla odsouhlasena autorským dozorem (viz doklad č. 11 - Vyjádření AD). Souhlas stavebního dozoru s výše uvedenými změnami je přiložen jako doklad č. 12 (Vyjádření TDI). Tyto změny („ZBV“) proběhly na základě pokynu objednatele ke změně (viz doklad č. 10). Změna se týká stávajících položek položek č. 43 a 44 (navýšení výměr) a zvyšuje smluvní cenu díla o 72 112,43 Kč. Jedná se o změny, které vznikly v průběhu provádění prací. Celkově se jedná o Změny nepodstatné, nepředvídané, které jsou tak podle § 5, odst. 1, písm.c), resp. podle §10 Směrnice R-SM-36 Krajské právy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29. 05. 2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek: zařazený do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná o změnu nepředvídanou.																																									
Údaje v Kč bez DPH:																																									
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných																																						
0,00	72 112,43	72 112,43	72 112,43																																						
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:																																									
Zhotovitel (stavbyvedoucí)	jméno	Pavel Slavík	datum <u>7.10.2021</u> podpis <u>/</u>																																						
Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing Josef Jírotka	datum <u>7.10.2021</u> podpis <u>/</u>																																						
Technický dozor investora	jméno	Ing Michal Kňážko	datum <u>7.10.2021</u> podpis <u>/</u>																																						
Zástupce Objednatel:	jméno	Jan Boček	datum <u>7. 10. 2021</u> podpis <u>/</u>																																						
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitel sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.																																									
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel)	jméno	Ing Jan Lichneger	datum <u>6.10.2021</u> podpis <u>/</u>																																						
Zhotovitel	jméno	Ing Pavel Hirsch	datum <u>7.10.2021</u> podpis <u>/</u>																																						
	jméno	Ing František Buršík	datum <u>7.10.2021</u> podpis <u>/</u>																																						
			Číslo paré:																																						

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 2

Název Stavby: II/610 Tuřice, most ev.č. 610-019 přes Jizeru v Tuřicích	
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	201 / 1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 201 Oprava mostu	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
10 881 872,13

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	10 881 872,13	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-187 083,16	177 072,43	177 072,43	1,63%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-187 083,16	10 871 861,39	-10 010,74	-0,09%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): Pavel Slavík 7.10.2021

Projektant (autorský dozor): Ing Josef Jírotka 7.10.2021

Stavební dozor: Ing Michal Kňážko 7.10.2021

Zástupce Objednatele: Jan Boček - 7. 10. 2021

Zaměstnanec KSÚS SK
odpovědný za cenové
projednání Změny:

Ing Jaroslava Jurková

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 2														
Evidenční číslo a název stavby: II/610 Tuřice, most ev.č. 610-019 přes Jizeru v Tuřicích										ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)				
Číslo a název SO/PS: SO 201 Oprava mostu										201/1				
Číslo a název rozpočtu: SO 201 Oprava mostu										Skupina Změn: 2				
Poř. č. pol.	Kód položky		Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
49	93151	ZBV 1	MOSTNÍ ZAVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 60MM	M	8,200	0,000	-8,200	22 815,02	187 083,16	-187 083,16	0,00	0,00	-187 083,16	-100,00
			Nové položky - JC dle OTSKP 2020											
74	93165.N	ZBV 1	MOSTNÍ ZAVĚRY ELASTICKÉ PRŮŘEZU DO 0,044M2	M	0,000	8,200	8,200	12 800,00	0,00	0,00	104 960,00	104 960,00	104 960,00	100,00
			Celkem						187 083,16	-187 083,16	104 960,00	104 960,00	-82 123,16	

Odpovědný zástupce Objednatelů i odpovědný zástupce Zhotovitelů odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Pavel Šlavič (stavbyvedoucí)

Datum: 7.10.2021

Podpis:

Za Objednatelů: Ing. Michal Křáčko (TDI)

Datum: 7.10.2021

Podpis:

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 2

Evidenční číslo a název stavby:
II/610 Tuřice, most ev.č. 610-019 přes Jizeru v Tuřicích

Číslo a název SO/PS: SO 201 Oprava mostu

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

201/1

Číslo a název rozpočtu: SO 201 Oprava mostu

Skupina Změn: 3

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
44	9111B3.	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	82,800	97,000	14,200	476,06	39 417,77	0,00	6 760,05	46 177,82	6 760,05	17,15
45	9112B1.	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	82,800	97,000	14,200	4 602,28	381 068,78	0,00	65 352,38	446 421,16	65 352,38	17,15
		Nové položky											
		Celkem						420 486,55	0,00	72 112,43	492 598,98	72 112,43	

Odpovědný zástupce Objednatelů i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu. Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Pavel Slavík (stavbyvedoucí)

Datum: 7.10.2021

Podpis:

Za Objednatele: Ing. Michal Kňažko (TDI)

Datum: 2.10.2022

Podpis:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo Stavby: II/610 Tuřice, most ev.č. 610-019 přes Jizeru v Tuřicích

1	Přijaté smluvní částka bez rezervy a DPH	15 892 789,92
2=1+18+19	Aktuální smluvní částka (cena stavby) bez DPH	16 021 041,90
2a=2*1,21	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	19 385 460,70
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	100,81%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	-0,52%
40=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, odst. (5), písm. b)	1,44%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	210 375,15
7=(8/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	1,32%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	4 767 836,98

9=(32A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	1,87%
10=(36A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,00%
10A=32A+36A	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	297 043,95
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	7 946 394,96

12=(1/0,15)	Limit	2 383 918,49
13=(39)/(1)	Sledování limitu (15%)	0,00%
14=(ABS(37)+(38))	Hodnota skupiny 5	0,00

						- 1 -			- 2 -			- 3 -					- 4 -					- 5 -	
						Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)			Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)					Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)					Změny de minimis (Změny nemající celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)	
SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (žadavat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (žadavat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadavat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadavat se znaménkem minus)	Změny kladné	Procentní vyjádření Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (žadavat se znaménkem minus)	Změny kladné	Procentní vyjádření Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny de minimis (15% nebo limit 149 224 000 Kč)	limit 15 %
16	17	18	19=23+26+29+33	20=24+27+30+34+37+39	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	31=(30/1)*100	32=29+30	32A=ABS(29)+30	33	34	35=(34/1)*100	36=33+34	36A=ABS(33)+34	37	38=(37/1)*100
			- 230 417,56	358 669,55	128 251,99	0,00	0,00	0,00	- 187 083,16	104 960,00	- 82 123,16	- 43 334,40	163 709,55	1,60%	210 375,15	297 043,95	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
101.1	1	DIO / změna trasy objížďky	- 43 334,40	181 597,12	138 262,72			0,00			0,00	- 43 334,40	181 597,12	1,14%	138 262,72	224 931,52			0,00%	0,00	0,00		0,00%
201	2	Oprava mostu / EMZ, doplnění mostního zábradlí	- 187 083,16	177 072,43	- 10 010,74			0,00	- 187 083,16	104 960,00	- 82 123,16	0,00	72 112,43	0,45%	72 112,43	72 112,43			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	2
Název a evidenční číslo stavby:	II/610 Tuřice, most ev.č. 610-019 přes Jizeru v Tuřicích
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 201 Oprava mostu
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	201 / 1

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
07 Změnový soupis prací SO 101	2	
08 Zápis ve SD	1	
09 Žádost Zhotovitele o změnu	1	
10 Pokyn Objednatele	2	
11 Vyjádření AD	2	
12 Vyjádření TDI	2	
13 Fotodokumentace (změny doplnění zábradlí)	2	
Počet listů celkem	12	

Rozpis ocenění položek - pro ZBV číslo: 2									ZMĚNOVÝ SOUPIS PRACÍ (SO/PS)					
Evidenční číslo a název stavby: II/610 Tuřice, most ev.č. 610-019 přes Jizeru v Tuřicích									201/1					
Číslo a název SO/PS: SO 201 Oprava mostu														
Číslo a název rozpočtu: SO 201 Oprava mostu														
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0 Všeobecné konstrukce a práce														
1	014112.	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPADEK)	T	264,108	264,108	0,000	238,03	62 865,63	0,00	0,00	62 865,63	0,00	0,00	
2	014122.	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPADEK)	T	24,840	24,840	0,000	238,03	5 912,67	0,00	0,00	5 912,67	0,00	0,00	
3	02520.	ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKOUŠEBNOU	KPL	1,000	1,000	0,000	53 556,39	53 556,39	0,00	0,00	53 556,39	0,00	0,00	
5	02720.	POMOC PRÁCE ZŘÍČ NEBO ZAJIŠTĚNÍ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL	1,000	1,000	0,000	101 162,07	101 162,07	0,00	0,00	101 162,07	0,00	0,00	
6	029111.	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - DÉLKOVÉ	HM	0,550	0,550	0,000	178 521,30	98 186,72	0,00	0,00	98 186,72	0,00	0,00	
4	02920.	OSTATNÍ POŽADAVKY - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	KPL	1,000	1,000	0,000	53 556,39	53 556,39	0,00	0,00	53 556,39	0,00	0,00	
8	029412.	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU	KUS	1,000	1,000	0,000	14 281,70	14 281,70	0,00	0,00	14 281,70	0,00	0,00	
7	02943.	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KPL	1,000	1,000	0,000	135 676,19	135 676,19	0,00	0,00	135 676,19	0,00	0,00	
9	02944.	OSTATNÍ POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ	KPL	1,000	1,000	0,000	47 605,68	47 605,68	0,00	0,00	47 605,68	0,00	0,00	
10	02945.	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN	HM	0,900	0,900	0,000	30 943,69	27 849,32	0,00	0,00	27 849,32	0,00	0,00	
11	02953.	OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA	KUS	1,000	1,000	0,000	17 852,13	17 852,13	0,00	0,00	17 852,13	0,00	0,00	
12	02990.	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE	KPL	2,000	2,000	0,000	5 950,71	11 901,42	0,00	0,00	11 901,42	0,00	0,00	
Všeobecné konstrukce a práce celkem								630 406,31	0,00	0,00	630 406,31	0,00		
1 Zemní práce														
13	11120.	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN	M2	93,750	93,750	0,000	46,42	4 351,88	0,00	0,00	4 351,88	0,00	0,00	
16	113136.	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM, ODVOZ DO 12KM	M3	10,872	10,872	0,000	884,28	9 613,89	0,00	0,00	9 613,89	0,00	0,00	
15	11354.	ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJINIKŮ	M	19,300	19,300	0,000	98,78	1 906,45	0,00	0,00	1 906,45	0,00	0,00	
14	113726.	FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM	M3	25,025	25,025	0,000	1 559,09	39 016,23	0,00	0,00	39 016,23	0,00	0,00	
17	12930.	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU	M3	1,383	1,383	0,000	346,33	478,97	0,00	0,00	478,97	0,00	0,00	
18	131736.	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽÍ NEPAŽÍ TR. I, ODVOZ DO 12KM	M3	81,111	81,111	0,000	535,54	43 439,81	0,00	0,00	43 439,81	0,00	0,00	
19	17511.	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM	M3	30,360	30,360	0,000	952,11	28 906,06	0,00	0,00	28 906,06	0,00	0,00	
Zemní práce celkem								127 713,29	0,00	0,00	127 713,29	0,00		
2 Základy														
20	21262.	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 100MM	M	21,300	21,300	0,000	416,55	8 872,52	0,00	0,00	8 872,52	0,00	0,00	
Základy celkem								8 872,52	0,00	0,00	8 872,52	0,00		
3 Svislé konstrukce														
21	333324.	MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C25/30	M3	35,128	35,128	0,000	10 827,91	380 362,82	0,00	0,00	380 362,82	0,00	0,00	
22	333365.	VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, 85008	T	6,181	6,181	0,000	28 563,41	176 550,44	0,00	0,00	176 550,44	0,00	0,00	
Svislé konstrukce celkem								556 913,26	0,00	0,00	556 913,26	0,00		
4 Vodorovné konstrukce														
23	428400.	MOSTNÍ LOŽISKA Z OCELI (OCELOVITIN) - ÚDRŽBA	KUS	4,000	4,000	0,000	17 852,13	71 408,52	0,00	0,00	71 408,52	0,00	0,00	
24	451312.	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	25,733	25,733	0,000	2 749,23	70 745,94	0,00	0,00	70 745,94	0,00	0,00	
28	457314.	VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ PROSTÝ BETON C25/30	M3	16,698	16,698	0,000	5 117,61	85 453,85	0,00	0,00	85 453,85	0,00	0,00	
25	457325.	VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ ŽELEZOBETON C30/37	M3	31,152	31,152	0,000	8 235,78	256 561,02	0,00	0,00	256 561,02	0,00	0,00	
26	457365.	VÝZTUŽ VÝROV A SPÁD BETONU Z OCELI 10505, 85008	T	8,286	8,286	0,000	30 943,69	256 399,42	0,00	0,00	256 399,42	0,00	0,00	
27	45747.	VYROVNÁVACÍ A SPÁD VRSTVY Z MALTY ZVLÁŠTNÍ (PLASTMALTA)	M3	0,844	0,844	0,000	91 997,98	77 646,30	0,00	0,00	77 646,30	0,00	0,00	
71	46131.	PATKY Z PROSTÉHO BETONU	M3	7,600	7,600	0,000	5 950,71	45 225,40	0,00	0,00	45 225,40	0,00	0,00	
70	465512.	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	39,615	39,615	0,000	8 330,99	330 032,17	0,00	0,00	330 032,17	0,00	0,00	
Vodorovné konstrukce celkem								1 193 472,62	0,00	0,00	1 193 472,62	0,00		
5 Komunikace														
31	572213.	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	247,975	247,975	0,000	23,92	5 931,56	0,00	0,00	5 931,56	0,00	0,00	
29	574444.	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 115 TL, 50MM	M2	247,975	247,975	0,000	775,02	192 185,58	0,00	0,00	192 185,58	0,00	0,00	
30	575C53.	LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ ZOLACE) 11 TL, 40MM	M2	465,643	465,643	0,000	565,32	263 237,30	0,00	0,00	263 237,30	0,00	0,00	
Komunikace celkem								461 354,44	0,00	0,00	461 354,44	0,00		

Datum	Denní záznamy stavby
26.7.21 PO	Počasí: +12°C; +25°C, jasno Pracovní doba: 7 - 19⁰⁰ hod Pracovníci: 1xTHP, + 9xDO PRÁCE: BEDNĚNÍ DRŽELU OP TURICE ČISTĚNÍ MONTÁŽNÍ
	ZÁKLADY DNE 27.7.21 PROJEKTOVÁ KÓ. M. KONTROLA PROJEKTU PŘÍKON, KOTVENÍ PRO KLOUBNÍ ARMATURY MONTÁŽNÍ N.L. PO VYKŘÍSTĚNÍ PLATKOVÍ SPÁRY NA TURICE STRANOU A KONTAKTOVÁNÍ MOST MEDIATIVNÍ NE PROJEKTU NUTNO PŘEJÍT PLATKOVÍ SPÁRY N.L.
27.7.21 ÚT	Počasí: +15°C; +29°C, jasno Pracovní doba: 7 - 19⁰⁰ hod Pracovníci: 1xTHP, + 11xDO MECHANIZACE: BAGER, DROBNÁ FL. MONTÁŽNÍ PRÁCE: - MONTÁŽ BEDNĚNÍ OP1 - BETONÁŽ PODKLADNÍHO BETONU OP2 - MONTÁŽ ARMATURNÍ ZÁKLADU OP2 - VRTÁNÍ KOTVIČEK DO NOSNÉ ŽCE - MONTÁŽ BEDNĚNÍ ZÁKLADU OP1 - ČISTĚNÍ ROZACE Z CHODNÍK - ÚČLID STAVBY
27.7.21 ÚT	ZÁPIS ZHOTOVITELE: PŘÍKON ZÁSTUPCE INVESTORA THP O KONTROLU ARMATURNÍ A BEDNĚNÍ ZÁVĚRNO ZDI OP1 A POKROUČNÍ BETONÁŽE.
	ZÁKLADY PROJEKTOVÁ KONTROLA ARMATURNÍ ZÁVĚRNO ZÚBES V OP1 SCHVÁLENÍ A BETONÁŽ ZÚ. ZÚBES V OP1 PO OSTRANĚNÍ NĚKOTÝCH PŘEVN PŘÍKON TURICE PŘÍKON BYL OSTRANĚN STAVKOU ODPOVĚDNÍKOVÝM PŘESTOUPNÍM STAVU KLOUBNÍ 1,5 A 3M NUTNO PROJEKTOVÉ MONTÁŽ



PORR a.s., Čechy/Stavby mostů
Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10

KSÚS Středočeského kraje
Zborovská 81/11
150 00 Praha 5

Vaše značka:
Váš dopis ze dne:
Naše značka:
Náš dopis:
Jméno:
Telefon:
Mobil:
Email:

Praha, (dátum) 5. října 2020
an Datum antragestellung

Věc: Žádost o vydání pokynu k variaci (Žádost o změnu rozsahu díla)

Akce: II/610 Tuřice, most ev. č. 610-019 přes Jizeru v Tuřicích

Vážení obchodní partneři,

Na základě SOD č. S-1923/00066001/2020, soupisu prací SO 201 a SO 102 Most ev.č. 610-019 a skutečnosti na stavbě. Vás žádáme o vydání Žádosti o změnu rozsahu díla (pokynu k variaci), (dle čl. 2 SOD) na akci II/610 Tuřice, most ev.č. 610-019 přes Jizeru v Tuřicích.

Jedná se o změnu během výstavby typu 3 (dle Směrnice R-Sm-36).

Popis změny: Zvýšení rozsahu díla s vlivem na cenu a termín dokončení díla.

V průběhu zajišťování DIO pro výše uvedenou stavbu proběhlo řízení kde došlo k zamítnutí původně navrženého DIO stavby. Z těchto důvodů musel zhotovitel vyprojektovat DIO v nové trase rozšířené oproti původnímu DIO dle zadávací dokumentace stavby.

Po odbourání stávajících závěrných zdí na OP 1 a OP 2 a skutečnému zaměření došlo k přepočtu pohybu mostu za účasti autorského dozoru a následně byla navržena nová dilatace (EMZ) oproti původně navržené povrchové dilataci dle zadávací dokumentaci stavby.

Odhadované smluvní dopady: Navýšení ceny díla o cca 120 000 Kč bez DPH

S pozdravem
Pavel Slavík

Porr a.s.
Dubečská 3238/36
Strašnice, 100 00 Praha 10
Tel. +420 267 226 111
Fax +420 267 226 801
porras@porr.cz

Sídlo: Dubečská 3238/36
Strašnice, 100 00 Praha 10
OR u MS v Praze, Oddíl B, Vložka: 1006
IČO 43005560, DIČ CZ43005560

Raiffeisenbank a.s.
IBAN CZ295500001091107720
BIC RZBCCZPP

www.porr.cz

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

PORR a.s.
Dubečská 3238/36
110 00 Strašnice
Praha 10

Vás dopis značky/ze dne

Naše značka

Vyřizuje/telefon
J. Boček/

Praha

Věc: Žádost, o změnu rozsahu díla – stavby „II/610 Tuřice, most ev.č. 610-019 přes Jizeru v Tuřicích“ ZBV č.2

S odvoláním na článek 6 Práva a povinnosti objednatele Smlouvy o dílo S-1923/00066001/2020, odst. 6.9:

Objednatel může požadovat změnu rozsahu Díla či schválit změnu rozsahu Díla navrženou zhotovitelem, a to při respektování povinností Objednatele dle Zákona o ZVZ a interních předpisů objednatele, zejména pak Směrnice ředitele Objednatele ke změnám staveb (dále jen „Směrnice“, která tvoří přílohu č. 4 této Smlouvy). Zhotovitel bere obsah Směrnice na vědomí a zavazuje se, že při administraci změn nebude postupovat v rozporu se Směrnicí a že nebude na Objednateli uplatňovat nároky ze změn před schválením těchto změn postupem, který Směrnice stanoví.

Zhotovitel je v případě takového rozhodnutí Objednatele o změně rozsahu Díla povinen Objednateli vyhovět a (i) snížit rozsah Díla nebo (ii) bez zbytečného odkladu podat nabídku na zvýšení rozsahu Díla o plnění stejného charakteru jako Dílo sjednané ve smlouvě s tím, že:

- a) při snížení rozsahu se Cena Díla odpovídajícím způsobem sníží,
- b) při zvýšení rozsahu bude Cena Díla v nabídce Zhotovitele stanovena na základě cen uvedených v Nabídce v Oceněném soupisu prací. V případě, že není možné Cenu Díla stanovit tímto způsobem, bude Cena Díla stanovena na základě expertních cen uvedených v Oborovém třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací (OTSKP-SPK) platných pro dané období nebo v cenách nižších. V případě, že není možné cenu Díla stanovit ani tímto způsobem, bude Cena Díla stanovena ve výši ceny obvyklé v místě a čase, zjištěné na podkladě průzkumu trhu provedeného Zhotovitelem formou získání alespoň tří nezávislých nabídek jiných zhotovitelů. Doklady o provedeném průzkumu trhu a jeho výsledcích je Zhotovitel povinen předat Objednateli.
- c) změny budou administrovány postupem stanoveným ve směrnici, přičemž snížení či zvýšení rozsahu bude upraveno písemným dodatkem Smlouvy, kterým může být i Změnový list změny stavby podepsaný ze strany osob oprávněných jednat za Objednatele a Zhotovitele,

1/2

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

- d) případná změna termínů plnění bude vždy sjednána formou písemného dodatku k této Smlouvě (tj. nikoliv formou Změnového listu), a to i v případě, pokud by souvisela se změnami sjednanými změnovým listem. Změna termínů plnění je možná pouze v případě, že taková změna nemá charakter podstatné změny závazku ve smyslu § 222 Zákona o ZVZ,
- e) Zhotovitel se zavazuje vyhotovovat Změnové listy a jejich přílohy a předkládat je objednateli výlučně ve formátu, který stanoví Směrnice.

Žádáme o změnu rozsahu díla v souladu s těmito zjištěnými skutečnostmi:

Výměna povrchového dilatačního závěru za EMZ

V zadávací dokumentaci bylo v rámci opravy mostu navrženo provedení nových dilatačních závěrů pomocí povrchového mostního závěru pro posuny do 60 mm.

Po odkrytí dilatačního styku mostovky a předpolí mostu byl zjištěn skutečný tvar dilatační spáry, který je odlišný oproti předpokladům ze zadávací dokumentace a který z konstrukčních důvodů neumožňuje instalaci původně uvažovaného typu dilatace.

Z tohoto důvodu je navrženo alternativní řešení v podobě elastického mostního závěru (EMZ).

Doplnění zábradlí na předpolí

Po odstranění náletových křovin v předpolí mostu došlo k odkrytí skutečných terénních poměrů v okolí mostu.

Bylo zjištěno, že u pravého křídla mostu na straně u Tuřic se nachází vyústění odvodnění komunikace v podobě otevřeného výkopu, jehož spodní úroveň byla v hloubce cca 1,7 m pod úrovní chodníku. Z důvodu zajištění bezpečnosti chodců na předpolí mostu a na chodníku na pravé straně u křídla mostu je nutné prodloužit mostní zábradlí tak, aby bylo zamezeno případnému pádu chodců do tohoto volného prostoru.

2/2

Jan Boček
Mostní technik, KSÚS SK
Oblast Mnichovo Hradiště





**ATELIER PROJEKTOVÁNÍ
INŽENÝRSKÝCH STAVEB s.r.o.**
Ohradní 24b
140 00 Praha 4 - Michle

Firma je registrována v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze – oddíl C, vložka 31260

Váš dopis zn.:

Ze dne: -

Naše zn.: APIS-0278/2021

Vyřizuje: Ing. Josef Jírotka

Tel: +

E-mai

PORR a.s.

Závod Čechy - výroba

Pan Pavel Slavík

Dubečská 3238/36

100 00 Praha 10 Strašnice

Datum: 12. 8. 2021

Věc: II/610 Tuřice, most ev.č. 610-019 přes Jizeru v Tuřicích Vyjádření AD ke změně dilatace mostu

Po provedení bouracích prací a zjištění skutečného tvaru dilatační spáry byl z konstrukčních důvodů povrchový závěr nahrazen dilatací EMZ. Tato změna byla vyvolána skutečnostmi zjištěnými až po odkrytí konstrukce mostu, takže nemohla být dříve předpokládána. Z těchto uvedených důvodů se změnou dilatací z položky 93151 - Mostní závěry povrchové posun do 60 mm na položku 93165N – Mostní závěry elastické průřezu do 0,044 m2 vyslovuji za autorský dozor souhlas.

S pozdravem

Ing. Josef Jírotka

Hlavní inženýr projektu



**ATELIER PROJEKTOVÁNÍ
INŽENÝRSKÝCH STAVEB s.r.o.**
Ohradní 24b
140 00 Praha 4 - Michle

Firma je registrována v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze – oddíl C, vložka 31260

Váš dopis zn.:

Ze dne: -

Naše zn.: APIS-0238/2021

Vyřizuje: Ing. Josef Jiročka

Tel: +

E-mai

PORR a.s.

Závod Čechy - výroba

pan Pavel Slavík

Dubečská 3238/36

100 00 Praha 10 Strašnice

Datum: 27. 8. 2021

Věc: II/610 Tuřice, most ev.č. 610-019 přes Jizeru v Tuřicích
Vyjádření AD ke změně délky zábradlí mostu

Po odstranění náletových dřevin na předpolí mostu a tím po odkrytí skutečných teréních poměrů v okolí mostu se ukázala nutnost prodloužit zábradlí mostu na jeho pravém křídle na straně Tuřic. Jde se o prodloužení mostního zábradlí o délku 14,2 m oproti zadávací dokumentaci. Toto je provedeno z důvodu bezpečnosti chodců pohybujících se na stávajícím chodníku, protože vně pravého tuřického křídla mostu je odvodnění komunikace v hloubce cca 1,7m pod úroveň tohoto chodníku.

Z těchto uvedených důvodů s touto změnou jako autorský dozor souhlasíme.

S pozdravem

Ing. Josef Jiročka
hlavní inženýr projektu

PORR a.s.

Stav. Pavel Slavík

Dubečská 36, 100 00 Praha10

Čj: 2021/017/MK

V Praze dne 19.8.2021

Věc: **Vyjádření TDI k návrhu ZBV ke změně Mostního stavby II/610 Tuřice,
most ev.č. 610-019**

Po odkrytí konstrukce dilatačního styku mostovky a předpolí mostu a po posouzení skutečných dilatačních pohybů konstrukce po zpřístupnění ložisek mostu. Byla nahrazena původně navržená povrchová dilatace dilatací EMZ. Povrchová dilatace je pro pohyby konstrukce ± 40 mm. Navržená podpovrchová dilatace je pro pohyby konstrukce ± 20 mm. Pohyb mostní konstrukce v Tuřicích nedosahuje těchto hodnot. Jedná se o technicky i kvalitativně rovnocennou náhradu původně navržené povrchové dilatace a zároveň dochází k úspoře ceny díla. Použitý dilatační závěr EMZ odpovídá TKP 23 a TP 80.

Jakožto odpovědný zástupce Objednatele odsouhlasuji skladbu měněných položek včetně jejich výměr. Potvrzuji zároveň skutečné provedení prací.

Ing. Michal Kňážko

TDI - asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi

Tel.:

PORR a.s.

Stav. Pavel Slavík

Dubečská 36, 100 00 Praha10

Čj: 2021/019/MK

V Praze dne 19.8.2021

Věc: **Vyjádření TDI k návrhu ZBV ke změně mostního záradlí stavby II/610
Tuřice, most ev.č. 610-019**

Po úklidu a odstranění náletových dřevin předpolí mostu a po posouzení skutečných poměrů okolí mostu. Byla nevyhnutelná nutnost prodloužit zábradlí pravého křídla mostu strany Tuřic. Jedná se o prodloužení mostního zábradlí z důvodu bezpečnosti stávajícího chodníku. Vně pravého Tuřického křídla mostu je odvodnění komunikace – příkopu v hloubce cca 1,7m.

Jakožto odpovědný zástupce Objednatele odsouhlasuji skladbu měněných položek včetně jejich výměr. Potvrzuji zároveň skutečné provedení prací.

Ing. Michal Křásko

TDI - asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi

Tel.:

FOTODOKUMENTACE K ZBV 2

II/610 Tuřice, most ev.č. 610-019 přes Jizeru v Tuřicích

Změna: Doplnění zábradlí na předpolí

