



Středočeský kraj

Evidenční číslo přidělené z evidence smluv:
S-1298/REG/2014



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

**DODATEK Č. 7
KE SMLOUVĚ O DÍLO**

„Rekonstrukce a dostavba regionálního muzea v Kolíně“



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

TENTO DODATEK Č. 7 (dále jen „Dodatek“) KE SMLOUVĚ O DÍLO akce „Rekonstrukce a dostavba regionálního muzea v Kolíně“ uzavřené dne 16. 7. 2014, evidenční číslo přidělené z evidence smluv S-1298/REG/2014, ve znění jejích dodatků (dále jen „Smlouva“) je uzavřen

MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI, KTERÝMI JSOU:

Středočeský kraj

sídlo: Zborovská 11, Praha 5, PSČ 150 21
zastoupený: Ing. Zuzanou Moravčíkovou – náměstkyní hejtmána pro oblast investic a veřejných zakázek
IČ: 70891095
bankovní spojení: PPF banka, a.s.
číslo účtu: 4440000248/6000

**DÁLE JEN „Objednatel“
NA STRANĚ JEDNÉ,**

a

**Společníci společnosti GEOSAN + PLS Muzeum Kolín
GEOSAN GROUP a.s.**

se sídlem Kolín III, U Nemocnice 430, PSČ 280 02
IČO: 28169522
DIČ: CZ28169522
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12459

a

První litomyšlská stavební a.s.

se sídlem Litomyšl, Havlíčkova 1118, PSČ 570 01
IČO: 150 34 682
DIČ: CZ150 46 824

zastoupení na základě plné moci vedoucím společníkem GEOSAN GROUP a.s.
zastoupeným na základě plné moci Ivanem Havlem, výkonným ředitelem, a Ing. Kamilem Vykydalem, výrobním ředitelem
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., číslo účtu: 420 340 319/0800

**DÁLE JEN „Zhotovitel“
NA STRANĚ DRUHÉ,**

**OBJEDNATEL A ZHOTOVITEL SPOLEČNĚ JEN „Smluvní strany“
NEBO JEDNOTLIVĚ „Smluvní strana“.**



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

Článek I. Předmět Dodatku

1. Tento Dodatek je uzavírán z důvodu změny termínu dokončení, který byl způsoben přerušením stavebních prací a vypsáním výběrového řízení nové veřejné zakázky na „dokončovací stavební práce a z důvodu změny oprávněného zástupce Objednatele. Smluvní strany se proto dohodly na následujících změnách smlouvy:

- a) Původní znění článku II odst. 2.1. Smlouvy se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:
„Zhotovitel provede dílo specifikované v článku I. bodě 1.1 Smlouvy v souladu s aktualizovaným harmonogramem, který tvoří přílohu č. 1 dodatku č. 7 Smlouvy, v následujících termínech:
- *dokončení stavebních prací, které jsou součástí předmětu díla, do 30. 10. 2016;*
 - *dokončení provozních a funkčních zařízení, které jsou součástí předmětu díla, včetně odstranění vad a nedodělků, do 25. 11. 2016;*

Smluvní strany se dále dohodly, že dílo musí být bez ohledu na výše uvedené dokončeno a předáno nejpozději do 25. 11. 2016.“

- b) Původní znění článku VII odst. 7.1. Smlouvy se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:
„Oprávněnými zástupci Objednatele při provádění a převzetí díla a ve věcech technických (dále jen „oprávnění zástupci objednatel““) jsou:

za Odbor krajského investora Středočeského kraje Bc. Jaroslav Postl, vedoucí oddělení investic, ☎ 257 280 833, ✉ postl@kr-s.cz

za Regionální muzeum v Kolíně, p. o. Mgr. Vladimír Rišlink, ředitel, tel. +420 321 722 988, mobil +420 603 548 225, e-mail: reditel@muzeumkolin.cz.

Oprávnění zástupci objednatel jsou oprávněni jednat za objednatel ve věcech technických a ve věcech, které tato smlouva výslovně stanoví. Není-li touto smlouvou o dílo stanoveno jinak, nejsou oprávnění zástupci Objednatele oprávněni činit jménem objednatel právní úkony.

Ve věcech smluvních zastupuje Objednatel Ing. Zuzana Moravčíková, náměstkyně hejtmana pro oblast investic a veřejných zakázek.

V souladu s ustanovením § 46d ZVZ nesmí technický dozor u díla provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud technický dozor provádí sám Objednatel.



ROP
STŘEDNÍ
ČECHY



INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Oprávněnými zástupci Zhotovitele jsou ve věcech smluvních Ivan Havel, výkonný ředitel a Ing. Kamil Vykydal, výrobní ředitel, tel.: 246 006 660, e-mail: vedeni@ggcz.eu, ve věcech technických Pavel Prokůpek, ředitel závodu pozemních staveb, tel.: 246 006 600, e-mail: zps@ggcz.eu.

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti pozdějším dnem jeho podpisu kteroukoliv ze Smluvních stran.
2. Tento Dodatek se uzavírá ve třech (3) stejnopisech, přičemž Objednatel obdrží po dvou po dvou vyhotoveních a Zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Předmět tohoto Dodatku byl schválený usnesením Rady Středočeského kraje č. 077-20/2016/RK ze dne 30. 5. 2016.

Přílohy:

Příloha č. 1: Aktualizovaný harmonogram

Příloha č. 2: Plná moc společnosti GEOSAN GROUP a. s.

30-05-2016

V Praze dne

OBJEDNATEL

Středočeský kraj
Ing. Zuzana Moravčíková, náměstkyně hejtmána
pro oblast investic a veřejných zakázek



31-05-2016

V dne

ZHOTOVITEL

GEOSAN GROUP a. s.
Ivan Havel, výkonný ředitel na základě PM

Ing. Kamil Vykydal, výrobní ředitel na
základě PM

geosan
GROUP

GEOSAN GROUP a.s.
U Průhonu 1516/32
170 00 Praha 7
DIČ: CZ28169522

ID	Režim úkolu	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	6. Ú	4. IV. 16	25. IV. 16	16. V. 16	6. VI. 16	27. VI. 16	18. VII. 16	8. VIII. 16	29. VIII. 16	19. IX. 16	10. X. 16	31. X. 16	21. XI. 16
24	★	hrubé rozvody slaboproud	17 dny	1. 7. 16													
25	★	hrubé rozvody ZTI	9 dny	1. 7. 16													
26	★	hrubé rozvody ÚT	4 dny	11. 7. 16													
27	★	hrubé rozvody VZT	17 dny	1. 7. 16													
28	🚧	Podlahové kce	19 dny	22. 8. 16													
29	★	tepelná izolace	11 dny	22. 8. 16													
30	★	betonová mazanina	13 dny	30. 8. 16													
31	🚧	Povrchové úpravy	66 dny	25. 7. 16													
32	★	omítky	26 dny	25. 7. 16													
33	★	obklady	10 dny	30. 8. 16													
34	★	dlažby	8 dny	16. 9. 16													
35	★	dřevěná dub. kantovka	11 dny	28. 9. 16													
36	★	malby	21 dny	26. 9. 16													
37	★	SDK podhledy	18 dny	30. 8. 16													
38	🚧	Zámečnické kce	7 dny	3. 10. 16													
39	★	zábradlí	7 dny	3. 10. 16													
40	★	Truhlářské kce	10 dny	19. 9. 16													
41	🚧	Výtah	26 dny	19. 9. 16													
42	★	ocelová kce výtahové šachty	16 dny	19. 9. 16													
43	★	montáž výtahu	11 dny	10. 10. 16													
44	🚧	Kompletace	26 dny	23. 9. 16													
45	★	elektro	14 dny	11. 10. 16													
46	★	slaboproud	14 dny	11. 10. 16													


Projekt: Muzeum Kolín Datum: 31.5. 16	Úkol	Neaktivní úkol	Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu	Vnější milník
	Rozdělení	Neaktivní milník	Ruční souhrn	Konečný termín
	Milník	Neaktivní souhrn	Pouze zahájení	Průběh
	Souhrnný	Ruční úkol	Pouze s datem dokončení	Průběh ručně zadávaného úkolu
	Souhrn projektu	Pouze s dobou trvání	Vnější úkoly	

Stránka 2


ID	Režim úkolu	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	16	Ú	4.IV 16	25.IV 16	16.V 16	6.VI 16	27.VI 16	18.VII 16	8.VIII 16	29.VIII 16	19.IX 16	10.X 16	31.X 16	21.XI 16
47		ZTI	14 dny	11.10. 16														
48		ÚT	14 dny	11.10. 16														
49		VZT	15 dny	23.9. 16														
50		Vnitřní výpně otvorů	8 dny	13.10. 16														
51		Úklid	4 dny	26.10. 16														
52																		
53		Nádvoří	66 dny	11.7. 16														
54		monolit kce schody, opěrná zeď	11 dny	11.7. 16														
55		anglický dvorek	6 dny	26.7. 16														
56		zmní práce	21 dny	3.8. 16														
57		finální povrchy	11 dny	16.9. 16														
58		fasáda	11 dny	1.9. 16														
59		výpně otvorů	6 dny	3.10. 16														
60		Dodatečné stavební práce	87 dny	1.6. 16														
61		Předání staveniště	0 dny	1.6. 16														
62		Zařízení staveniště	3 dny	1.6. 16														
63		Anglický dvorek	31 dny	3.6. 16														
64		vytyčení sítí	1 den	3.6. 16														
65		zemní práce	9 dny	6.6. 16														
66		monolit	11 dny	17.6. 16														
67		zásypy	1 den	4.7. 16														
68		stavební práce	6 dny	5.7. 16														
69		zadlaždění podloubí	3 dny	13.7. 16														

Projekt: Muzeum Kolín Datum: 31.5. 16	Úkol	Neaktivní úkol	Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu	Vnější milník
	Rozdělení	Neaktivní milník	Ruční souhrn	Konečný termín
	Milník	Neaktivní souhrn	Pouze zahájení	Průběh
	Souhrnný	Ruční úkol	Pouze s datem dokončení	Průběh ručně zadaného úkolu
	Souhrn projektu	Pouze s dobou trvání	Vnější úkoly	

Stránka 3

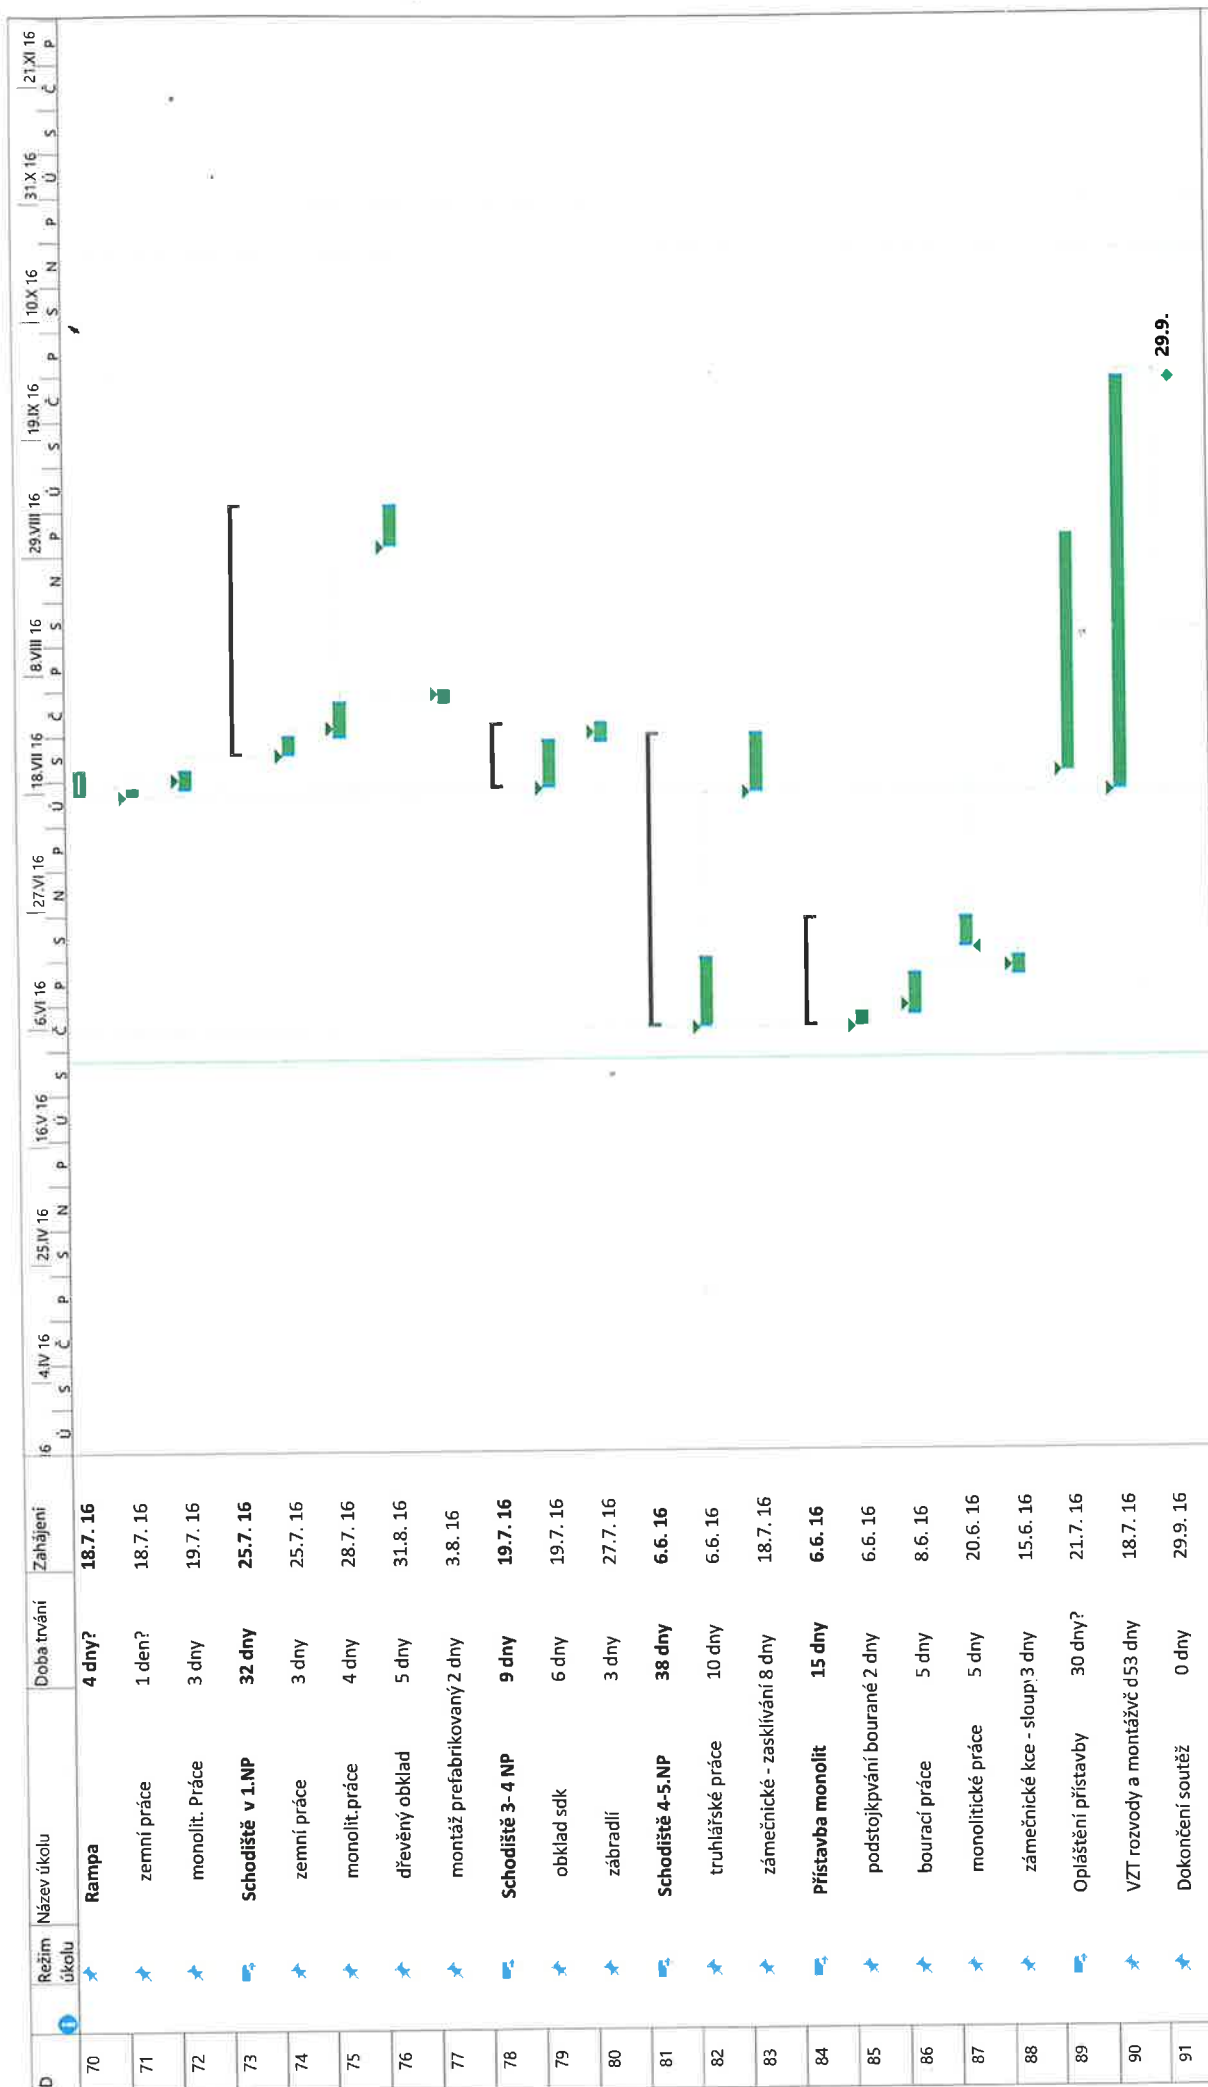

Projekt: Muzeum Kolin Datum: 31.5. 16	Úkol	Neaktivní úkol	Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu	Vnější mříšník
	Rozdělení	Neaktivní mříšník	Ruční souhrn	Konečný termín
	Mříšník	Neaktivní souhrn	Pouze zahájení	Průběh
	Souhrmný	Ruční úkol	Pouze s datem dokončení	Průběh ručně zadávaného úkolu
	Souhrn projektu	Pouze s dobou trvání	Vnější úkoly	

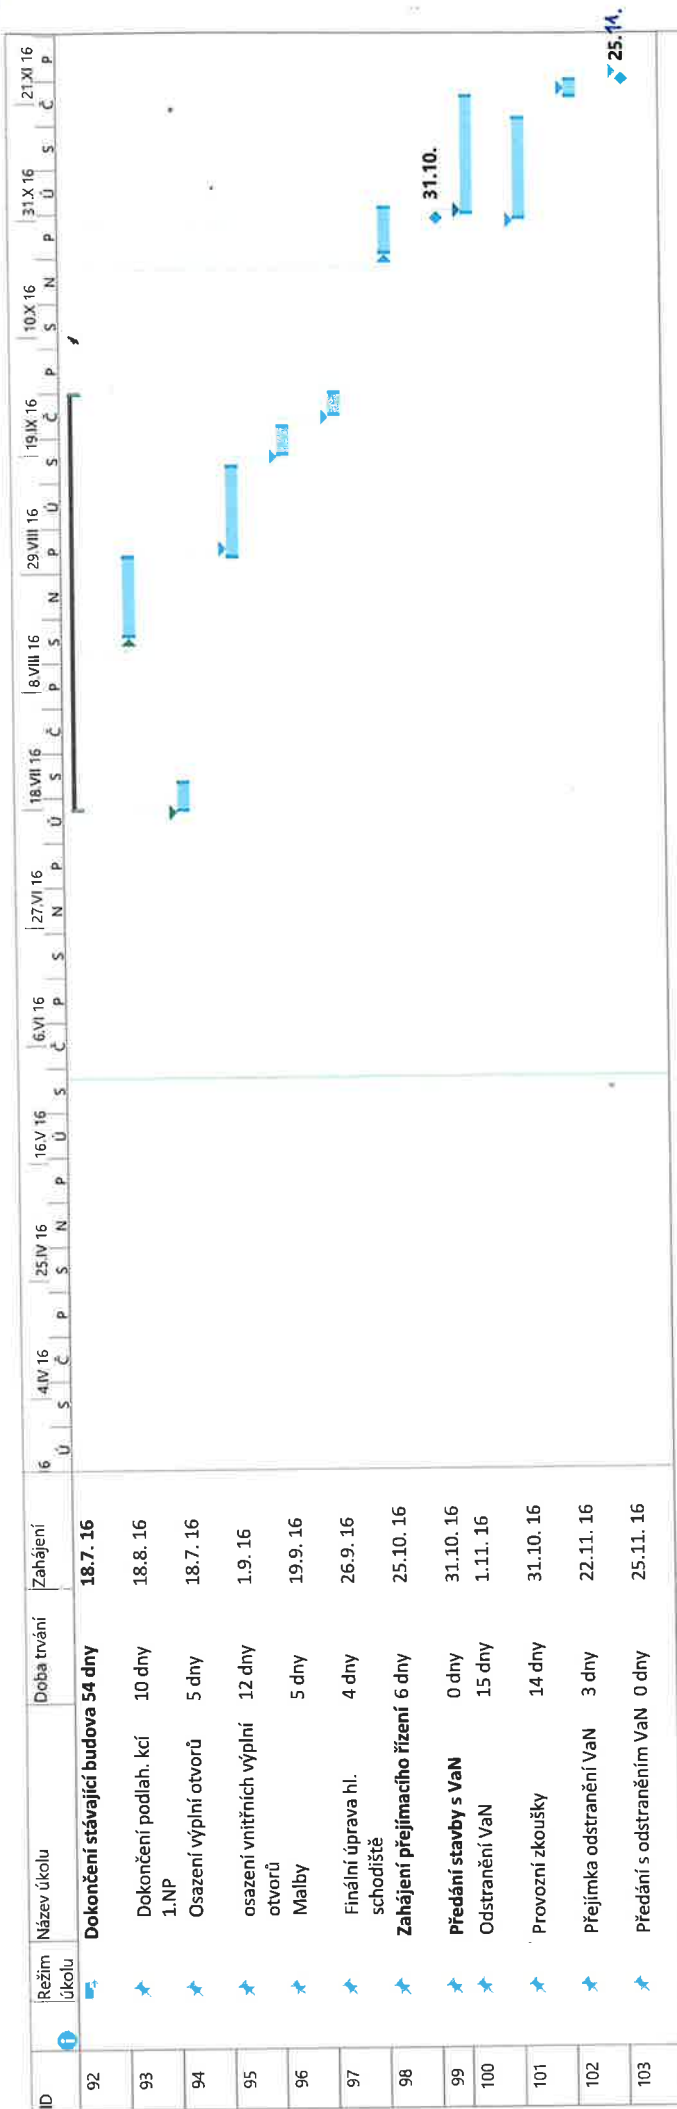

ID	Režim úkolu	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	6	4.IV.16	25.IV.16	16.V.16	16.VI.16	27.VI.16	18.VII.16	8.VIII.16	29.VIII.16	19.IX.16	10.X.16	31.X.16	21.XI.16
92		Dokončení stávající budova 54 dny		18.7.16													
93		Dokončení podlah. kčí 1.NP	10 dny	18.8.16													
94		Osazení výplní otvorů	5 dny	18.7.16													
95		osazení vnitřních výplní otvorů	12 dny	1.9.16													
96		Malby	5 dny	19.9.16													
97		Finální úprava hl. schodiště	4 dny	26.9.16													
98		Zahájení přejímacího řízení 6 dny		25.10.16													
99		Předání stavby s VaN	0 dny	31.10.16													
100		Odstranění VaN	15 dny	1.11.16													
101		Provozní zkoušky	14 dny	31.10.16													
102		Přejímka odstranění VaN	3 dny	22.11.16													
103		Předání s odstraněním VaN	0 dny	25.11.16													

PLNÁ MOC

společnost **GEOSAN GROUP a. s.**, IČO: 28169522, se sídlem U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 12459, zastoupená Luděkem Kostkou, členem představenstva, tímto

z m o c ň u j e

Ivana Havla, nar. dne 9. 1. 1962, bytem U Háje 1651, 252 63 Roztoky, výkonného ředitele společnosti
Ing. Kamila Vykydala, nar. dne 26. 5. 1974, bytem Otopašská 892/24, 158 00 Praha 5 – Jinonice, výrobního ředitele společnosti,
Ing. Jaromíra Kazdu, nar. dne 7. 4. 1964, bytem Žitomířská 38, 101 00 Praha 10 Vršovice, ředitele Závodu ekologických a inženýrských staveb,
Pavla Prokúpeka, nar. dne 30. 10. 1972, bytem Makovského 1223, 163 00 Praha 6 – Řepy, ředitele Závodu pozemních staveb,

aby za společnost GEOSAN GROUP a. s. na základě této plné moci:

- právně jednali vůči všem třetím osobám, včetně podepisování objednávek a uzavírání smluv,
- zastupovali zmocnitele před všemi správními orgány,
- právně jednali v řízeních o veřejných zakázkách, včetně podávání nabídek a uzavírání smluv,
- právně jednali vůči zaměstnancům zmocnitele,
- jinak právně jednali ve věcech, ke kterým dochází při běžné činnosti zmocnitele,

a v těchto věcech aby uzavírali veškeré smlouvy, dohody, smíry a narovnání, podávali a brali zpět návrhy, podněty, žádosti, stížnosti, námitky, odvolání a jiná podání, podávali přihlášky a účastnili se výběrových řízení, vydávali stanoviska a prohlášení, přijímali plnění, uplatňovali nároky a vzdávali se jich.

V rámci výše popsaného jednání jsou zmocněnci oprávněni jednat za zmocnitele tak, že za zmocnitele vždy musí jednat Ivan Havel a dále alespoň jeden z dalších tří zmocněnců.

Zmocněnci jsou oprávněni pověřit dalšího zástupce v rozsahu jim udělené plné moci.

V Praze dne 1. října 2015

Luděk Kostka
člen představenstva
GEOSAN GROUP a. s.

Přijímám zmocnění:


Ivan Havel
výkonný ředitel


Ing. Kamil Vykydal
výrobní ředitel


Ing. Jaromír Kazda
ředitel Závodu ekologických a inženýrských staveb


Pavel Prokúpek
ředitel Závodu pozemních staveb

PROHLÁŠENÍ O PRAVOSTI PODPISU NA LISTINĚ NESEPSANÉ ADVOKÁTEM

Běžné číslo knihy o prohlášeních o pravosti podpisu 009923/181/2015/C

Já, níže podepsaný

Mgr. Daniel Thelen

advokát vykonávající advokacii jako společník Advokátní kanceláře Thelen, Šaldová a partneři, v. o. s., IČO: 29143063

se sídlem U Průhonu 1516/32, 170 00 Praha 7 – Holešovice

zapsaný v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev. č. 12327,

prohlašuji, že tuto listinu přede mnou vlastnoručně v šesti (6) vyhotoveních podepsal

Luděk Kostka

narozený dne 11. května 1965

bytem Zahradní 418, Velim, okr. Kolín

jehož totožnost jsem zjistil z občanského průkazu č. 200267218 vydaného Městským úřadem Kolín dne 6. 3. 2012.

Podepsaný advokát tímto prohlášením o pravosti podpisu nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených v této listině, ani její soulad s právními předpisy.

V Praze dne 1. 10. 2015



Mgr. Daniel Thelen, advokát



[Handwritten signature in blue ink]
