

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo uzavřené ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též „**občanský zákoník**“) mezi:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, Praha 5, Smíchov PSČ: 150 00

IČO: 00066001

DIČ: CZ00066001

zastoupená: Ing. Janem Lichtnegerem, ředitelem

č. smlouvy: S-3027/00066001/2020

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

Froněk, spol. s.r.o.

se sídlem: Rakovník, Zátíší 2488, 269 01

IČO: 47534630

DIČ: CZ47534630

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 15879

zastoupená: Ing. Kamilem Hrbkem, prokuristou

č. smlouvy: 120081

dále jen „**Zhotovitel**“ na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „**smluvní strany**“)

Preamble:

Smluvní strany tímto prohlašují, že dne 23. 10. 2020 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na veřejné zakázce s názvem: „**III/2371 Lužná**“ (dále jen „**Smlouva o dílo**“). Na základě dohody smluvních stran a ve vazbě na čl. 14. odst. 14. Smlouvy o dílo, uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo (dále jen „**Dodatek č. 2**“).

I. Předmět Dodatku č. 2

1. S ohledem na vznik objektivně nepředvídaných okolností v průběhu realizace prací na díle, které nemohl zhotovitel před zahájením prací předpokládat, a které zapříčinily změnu rozsahu prací v podobě méněprací a víceprací, upravuje se po dohodě smluvních stran předmět Smlouvy o dílo. Změna rozsahu prací v podobě méněprací a víceprací obsahují Objednatel schválené změnové listy, které jsou přílohou tohoto Dodatku č. 2. Na základě změny předmětu díla se mění i celková cena za dílo uvedená v čl. 8. odst. 8.1. Smlouvy o dílo, který nově zní:

- 8.1. Smluvní strany se dohodly, že celková cena Díla je stanovena jako neměnná a konečná a činí:

Původní Cena Díla bez DPH	22.804.711,06 Kč
Nová Cena díla dle Dodatku č. 2 bez DPH	23.002.192,94 Kč

DPH 21%	4.830.460,52 Kč
DPH 15 %	0,- Kč
Cena Díla včetně DPH	27.832.653,46 Kč

Daň z přidané hodnoty (dále též „**DPH**“) bude na základě výslovné dohody smluvních stran připočtena ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že veškerá množství uvedená v soupise prací k Dílu a jeho jednotlivým částem jsou pouze odhadovaná, a jejich změna neznamena změnu ceny Díla.

Přílohou tohoto Dodatku č. 2 jsou Objednatelem odsouhlaseny Změnové listy 1-6.

II. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 2 bude uveřejněn dle § 219 zákona o ZVZ na profilu Objednatele.
2. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tento Dodatek č. 2 uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento Dodatek č. 2 je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy o dílo. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, která nejsou tímto Dodatkem č. 2 výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
4. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze smluvních stran obdrží její elektronický originál.
5. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento Dodatek č. 2 uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto Dodatku č. 2 za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku č. 2 rozhodující.

V Říčanech dne _____

V Rakovníku dne _____

**Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace**

Ing. Jan Lichtneger, ředitel

Froněk, spol. s.r.o.
Ing. Kamil Hrbek, prokurista

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

III/2371 Lužná - S-3027/00066001/2020

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

201 - Rekonstrukce mostu ev.č. 2371-1

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

201 - Rekonstrukce mostu ev.č. 2371-1

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

201/1

Číslo ZBV:

1

Objednatel:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov
IČ 00066001

Zhotovitel:

Froněk, spol.s r.o.
Zátiší 2488, 269 01 Rakovník
IČ 47534690

Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.3	-116 307,43	260 775,76	144 468,33

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1	-116 307,43	260 775,76	144 468,33

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré:

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: III/2371 Lužná - S-3027/00066001/2020 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 201 - Rekonstrukce mostu ev.č. 2371-1	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 201/1	Číslo ZBV: 1.3
---	--	-----------------------

Strany smlouvy o dílo objednatel č.: S-3027/00066001/2020 a zhotovitel č.: 120081 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 23.10.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: Froněk, spol.s r.o., Zátěží 2488, 269 01 Rakovník

Přílohy Změnového listu:

1. Krycí list	1	počet listů
2. Změnový list	2	počet listů
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů
4. Rozpis ocenění Změn položek ZBV 1	2	počet listů
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů
Další doklady dle přehledu dokladů	24	počet listů

Paré č.	Příjemce
1, 2	Objednatel
3	Zhotovitel
4	Projektant (AD)
5	Stavební dozor

Initiátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Změny mostní konstrukce dle skutečné potřeby pro řádné dokončení Díla

1) V PDPS pro SO 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 2371-1 bylo předpokládáno provedení opravy mostu dle provedených předběžných průzkumů a rešerše původní dokumentace mostu. Dle těchto dokumentů byla navržena specifická rekonstrukce tohoto mostu.

2) V průběhu provádění prací byly, po odhalení zakrytých částí mostu, zjištěny odchylky od původně předpokládaných rozměrů, kde se lišila délka NK, tloušťka opěr, a také konstrukce křídel. Zde je nutno poukázat na skutečnost, že po odkrytí přechodových oblastí nebyla zjištěna žádná původní křídla ve směru rovnoběžném s osou komunikace. Navíc bylo zjištěno, že není možné provést původně plánovaná křídla K1, K2, K3 z důvodu kolize se stávajícími inženýrskými sítěmi. S ohledem na tyto skutečnosti bylo nutné navrhnout změny v technickém řešení stavebních úprav mostu.

3) Vzhledem k uvedenému zjištění byly změny projednány se všemi zúčastněnými stranami. Zastížené skutečnosti byly zapsány TDI do SD (viz doklad č. 08 – Zápis TDI ve SD ze dne 03.05.2021). Současně AD stavby ke stavu mostu zpracoval vyjádření předané elektronickou poštou 28. 4. 2021 (viz doklad č. 09) a navrhl možná řešení. Byla pořízena fotodokumentace po odhalení konstrukcí mostu (viz doklad č. 10).

Bylo navrženo, že se provedou změny v návrhu řešení křídel, říms a zábradlí. Budou provedeny drobné úpravy řešení křídel na levé straně. Křídlo K4 u opěry O1 se provede v prodloužení NK a oproti RDS bude zkráceno. Křídlo K5 u O2 vlevo se provede v prodloužení NK a provede se v původně uvažované délce. Horní římsová část pro obě křídla vlevo se zrealizuje až ke konci NK, kde bude svislá dílační spára mezi římsou na NK a římsou na křídlech. Zábradlí na levé straně se realizuje dle původního návrhu. Křídlo K3 u O2 vpravo se nebude realizovat. Provede se nová římsová část na stávající nábrežní zeď, která navazuje na opěru mostu. Tato římsová část překryje ocelovou chráničku s kabely CETIN a zároveň vytvoří podporu pro přechod vodovodu. U původně navržených křídel K1 a K2 u opěry O1 vpravo dochází ke kolizi se stávajícími sítěmi technického vybavení. Současně bylo nutné řešení pozměnit s ohledem na funkčnost odvodňovacích prvků vozovky, konstrukci chodníku a ochranu přilehlých budov. Vzhledem k tomu, že není nutné zajišťovat stabilitu zeminy ani svahu, není realizace křídel nezbytná. Nutností bylo připravit podklad pro osazení zábradlí a lemující hranu chodníku. Bylo proto navrženo, že se křídla K1 a K2 nebudou realizovat a provedou se pouze patky pro zábradlí, které se rozmístí tak, aby se vyhnuly trase chrániček existujících sítí.

Na základě uvedených skutečností lze konstatovat, že změny v řešení stavebních úprav mostu oproti návrhu PDPS vyplynuly až v rámci samotné realizace Díla. Průzkumy v rámci zpracování PDPS, které byly provedeny v rozsahu dostatečném pro tento typ dokumentace, neodhalily skutečný stav mostní konstrukce a přesnou polohu stávajících inženýrských sítí. Jedná se tudíž o okolnosti, které zadavatel (ani projektant) Zadávací dokumentace) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

4) Změny byly iniciovány Zhotovitelem na základě skutečně zastiženého stavu mostní konstrukce po odkopání a odhalení skrytých částí mostu.

5) Tato změna se týká úpravy množství položek poř. č. 1, 2, 3, 5, 9, 10, 12, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 51, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 66, 74, 75, 78, 79 a 84 a zařazení nové položky poř. č. 85.

V rámci předmětných změn nedochází k jejich řetězení, neboť tyto změny nevyvolávají potřebu jiných změn.

Uvedené změny vznikly na základě nepředvídaných fyzických podmínek po odkopání a odhalení skrytých částí mostu, které nezohledňovala PDPS, která byla provedena dle předběžných průzkumů a rešerše původní dokumentace mostu, které byly dostatečné pro tuto fázi projektování. Na základě uvedeného je tedy možné konstatovat, že změny jsou nevyhnutelné a technicky i ekonomicky neoddelitelné od realizované stavby. Jedná se o Změny nepodstatné, nepředvídané, které jsou tak podle § 5 odst. 1, c), resp. podle § 10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29. 05. 2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazené do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tyto Změny nepředstavují vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná o změny nepředvídané.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-116 307,43	260 775,76	144 468,33	377 083,19

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí):	jméno	Bc. Jiří Karel	datum	15.12.2021	podpis
Projektant (autorský dozor):	jméno	Ing. Miroslav Seidl	datum	15.12.2021	podpis
Stavební dozor:	jméno	Ing. Michal Pietsch	datum	15.12.21	podpis
Zástupce Objednatel: KSÚS SK, p.o.	jméno	Karel Motál	datum	15.12.2021	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitel sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel)	jméno	Ing. Jan Lichneger	datum	17-12-2021	podpis
Zhotovitel	jméno	Ing. Kamel Hrbek	datum	15.12.2021	podpis
					Číslo paré

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 1**

Název a evidenční číslo Stavby: III/2371 Lužná - S-3027/00066001/2020
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 201/1
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 201 - Rekonstrukce mostu ev.č. 2371-1

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
1 291 102,78

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	1 291 102,78	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-116 307,43	260 775,76	260 775,76	20,20%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-116 307,43	1 435 571,11	144 468,33	11,19%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

souhlasím Bc. Jiří Karel

Projektant (autorský dozor):

souhlasím Ing. Miroslav Seidl

Stavební dozor:

souhlasím Ing. Michal Pietsch

Zástupce Objednatel KSÚS:

souhlasím Karel Motal

 Zaměstnanec KSÚS
 odpovědný za cenové
 projednání Změny:

souhlasím Ing. Jaroslava Jurková

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 1.3

Název a evidenční číslo stavby: III/2371 Lužná - S-3027/00066001/2020								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: 201 - Rekonstrukce mostu ev.č. 2371-1								201/1					
Číslo a název podobjektu/rozpočtu: 201 - Rekonstrukce mostu ev.č. 2371-1								Skupina změn 3					
Pol. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Podíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	014101	POPLATKY ZA SKLADKU - zemina	M3	77,810	88,507	10,787	60,00	4 668,60	0,00	647,22	5 315,82	647,22	13,86%
2	014101	POPLATKY ZA SKLADKU - kamenivo, kámen	M3	12,195	18,462	6,267	133,00	1 621,94	0,00	833,51	2 455,45	833,51	51,39%
3	014101	POPLATKY ZA SKLADKU - prostý beton, ořez	M3	17,541	10,206	-7,335	300,00	5 262,30	-2 200,50	0,00	3 061,80	-2 200,50	-41,82%
5	02940	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	KPL	1,000	0,000	-1,000	22 000,00	22 000,00	-22 000,00	0,00	0,00	-22 000,00	-100,00%
9	11315	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU	M3	8,054	0,000	-8,054	1 835,00	14 779,09	-14 779,09	0,00	0,00	-14 779,09	-100,00%
10	11317	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK	M3	4,114	4,877	0,763	486,00	1 917,12	0,00	355,56	2 272,68	355,56	18,55%
12	11332	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMĚLENÉHO	M3	7,306	12,810	5,504	249,00	1 819,19	0,00	1 370,50	3 189,69	1 370,50	75,34%
20	13173	HLoubení jam zápaž i nepaž tr. i	M3	30,250	43,893	13,643	398,00	12 039,50	0,00	5 429,91	17 469,41	5 429,91	45,10%
21	13273	HLoubení ryh šíř do 2m paž i nepaž tr. i	M3	7,560	4,704	-2,856	720,00	5 443,20	-2 056,32	0,00	3 386,88	-2 056,32	-37,78%
22	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	37,810	48,597	10,787	15,00	567,15	0,00	181,81	728,96	181,81	28,53%
24	21341	DRĚNAŽNÍ VRSTVY Z PLAST. BETONU (PLASTMALTY)	M3	0,060	0,071	0,011	65 000,00	3 900,00	0,00	715,00	4 615,00	715,00	18,33%
25	21363	DRĚNAŽNÍ VRSTVY Z GEOMATRACE	M2	43,850	40,979	-2,871	480,00	21 048,00	-1 378,08	0,00	19 669,92	-1 378,08	-6,55%
26	26154	VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TR. V D DO 200MM	M	1,500	4,400	2,900	3 820,00	5 730,00	0,00	11 078,00	16 808,00	11 078,00	193,33%
27	285391	DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VYZTUŽE D DO 10MM DO VRTU	KUS	336,000	396,000	60,000	240,00	80 640,00	0,00	15 120,00	95 760,00	15 120,00	18,75%
28	285392	DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VYZTUŽE D DO 16MM DO VRTU	KUS	46,000	9,000	-37,000	280,00	12 880,00	-10 360,00	0,00	2 520,00	-10 360,00	-80,43%
29	28999	OPĚŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FOLIE	M2	26,000	26,780	0,780	65,00	2 210,00	0,00	66,30	2 276,30	66,30	3,00%
30	31717	KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ RIMS	KG	60,000	72,000	12,000	140,00	8 400,00	0,00	1 680,00	10 080,00	1 680,00	20,00%
31	317325	RIMS Z ŽELEZOBETONU DO C30/37	M3	6,863	6,882	0,019	9 850,00	65 630,55	0,00	187,15	65 817,70	187,15	0,29%
32	317365	VYZTUŽ RIMS Z OCELI 1050S, B500B	T	1,086	0,866	-0,180	32 000,00	34 112,00	-5 760,00	0,00	28 352,00	-5 760,00	-16,89%
33	327325	ZDI OPĚRNÉ, ŽARUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37	M3	0,696	4,147	3,451	28 900,00	20 114,40	0,00	99 733,90	119 848,30	99 733,90	495,83%
34	327365	VYZTUŽ ZDI OPĚRNÝCH, ŽARUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 1050S, B500B	T	0,111	0,416	0,305	32 000,00	3 552,00	0,00	9 760,00	13 312,00	9 760,00	274,77%
36	451314	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	8,308	11,497	2,989	2 800,00	23 822,40	0,00	8 369,20	32 191,60	8 369,20	35,13%
37	45152	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRČENÉHO	M3	12,168	15,157	2,989	820,00	9 977,76	0,00	2 450,98	12 428,74	2 450,98	24,56%
38	45157	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	8,198	8,256	0,060	840,00	6 884,54	0,00	50,40	6 935,04	50,40	0,73%
39	457324	VYROVNÁVACÍ A SPAD ŽELEZOBETON DO C25/30	M3	7,420	8,449	1,029	3 300,00	24 486,00	0,00	3 395,70	27 881,70	3 395,70	13,87%
40	457366	VYZTUŽ VYROVNÁVACÍHO A SPADOVÉHO BETONU Z KARI SÍTI	T	0,581	0,573	-0,008	32 000,00	18 562,00	-256,00	0,00	18 306,00	-256,00	-1,38%
41	45860	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDI MI Z MEZEROVITÉHO BETONU	M3	24,000	32,641	8,641	3 650,00	87 600,00	0,00	31 539,65	119 139,65	31 539,65	36,00%
43	465513	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	8,904	12,890	3,986	4 100,00	36 506,40	0,00	16 342,60	52 849,00	16 342,60	44,77%
44	487314	STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	4,200	4,704	0,504	3 250,00	13 650,00	0,00	1 638,00	15 288,00	1 638,00	12,00%
45	572213	SPOJOVACÍ POŠTRÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	33,750	81,158	47,408	8,00	270,00	0,00	379,26	649,26	379,26	140,47%
46	574034	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACQ 11+ 11S TL	M2	33,750	40,579	6,829	136,00	4 590,00	0,00	928,74	5 518,74	928,74	20,23%
47	575043	LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL 35MM	M2	32,250	38,794	6,544	650,00	20 962,50	0,00	4 253,60	25 216,10	4 253,60	20,29%
48	576413	POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 4KG/M2	M2	32,250	38,794	6,544	20,00	645,00	0,00	130,88	775,88	130,88	20,29%
51	626113	REPROFILACE PODHLÉDOU, SVRŠLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST. TL 30MM	M2	43,850	36,050	-7,800	2 250,00	98 662,50	-17 550,00	0,00	81 112,50	-17 550,00	-17,79%
54	62661	INJEKTÁŽ TRHLIN UZAVÍRAČI	M	20,000	0,000	-20,000	1 890,00	37 800,00	-37 800,00	0,00	0,00	-37 800,00	-100,00%
55	711112	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	43,850	39,950	-3,900	380,00	16 663,00	-1 482,00	0,00	15 181,00	-1 482,00	-8,89%
56	711442	IZOLACE MOSTOVÉK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETIČÍ VRSTVOU	M2	53,000	65,190	12,190	680,00	36 040,00	0,00	8 289,20	44 329,20	8 289,20	23,00%
57	711502	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	20,750	24,693	3,943	280,00	5 810,00	0,00	1 104,04	6 914,04	1 104,04	19,00%
58	721174	VNITŘNÍ KANALIZACE Z PLAST. TRUB DN 200	M	2,000	5,000	3,000	750,00	1 500,00	0,00	2 250,00	3 750,00	2 250,00	150,00%
60	78362	NATĚRY BETON KONSTR. TYP S2 (OS-B)	M2	7,000	8,330	1,330	340,00	2 380,00	0,00	452,20	2 832,20	452,20	19,00%
61	78362	NATĚRY BETON KONSTR. TYP S2 (OS-B)	M2	89,320	87,304	-2,016	340,00	30 368,80	-685,44	0,00	29 683,36	-685,44	-2,26%

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 1.3

Název a evidenční číslo stavby: III/2371 Lužná - S-3027/00066001/2020								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: 201 - Rekonstrukce mostu ev.č. 2371-1								201/1					
Číslo a název podobjektu/rozpočtu: 201 - Rekonstrukce mostu ev.č. 2371-1								Skupina změn 3					
Pol. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
62	78383	NATERY BETON KONSTR. TYP S4 (OS-C)	M2	3,000	3,570	0,570	840,00	1 920,00	0,00	364,80	2 284,80	364,80	19,00%
66	911281	ZABRADLI MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODAVKA A MONTÁŽ	M	15,500	20,250	4,750	4 800,00	71 300,00	0,00	21 850,00	93 150,00	21 850,00	30,65%
74	931325	TESNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF. ZALIVKOU MODIFIK. PRŮR. DO	M	24,300	26,200	1,900	120,00	2 916,00	0,00	228,00	3 144,00	228,00	7,82%
75	93135	TESNĚNÍ DILATAČ SPAR PRYŽ. PÁSKOU NEBO KRUH. PROFILEM	M	10,000	11,900	1,900	150,00	1 500,00	0,00	285,00	1 785,00	285,00	19,00%
78	938552	OCISTĚNÍ BETON KONSTR. OTŘYSKÁNÍM NA SUCHO KREMLÍK	M2	53,000	63,070	10,070	320,00	16 960,00	0,00	3 222,40	20 182,40	3 222,40	19,00%
79	938554	OCISTĚNÍ BETON KONSTR. OTŘYSKÁNÍM NA SUCHO KOVOVOU	M2	53,000	63,070	10,070	330,00	17 490,00	0,00	3 323,10	20 813,10	3 323,10	19,00%
84	97817R	ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE	M2	53,000	63,070	10,070	180,00	9 540,00	0,00	1 812,60	11 352,60	1 812,60	19,00%
Nové položky													
85	574E46,N	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL 50MM	M2	0,000	6,829	6,829	143,00	0,00	0,00	976,55	976,55	976,55	100,00%
Celkem								927 172,04	- 116 367,43	260 775,76	1 071 680,37	144 468,33	

Odpovědný zástupce Objednatelů i odpovědný zástupce Zhotovitelů odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu. Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Bc. Jiří Karel, stavbyvedoucí

Datum: 15. 10. 2021

Podpis:

Za Objednatelů: Karel Motál, vedoucí oblasti KSÚS Kladno

Datum:

Podpis:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: III/2371 Lužná - S-3027/00066001/2020

1	Přijata smluvní částka bez rezervy a DPH	22 804 711,04
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	22 949 179,39
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	27 768 507,04
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	100,83%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(26/1)*100	Sledování změny položek (Skupina 2)	0,00%
40=(18/1)*100	Sledování změny 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, odst. 1b, písm. b)	-0,81%

8=(12+36)	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	144 468,33
9=(8/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	0,83%
8+10,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	8 841 413,32

9=(32/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	1,65%
10=(36/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,00%
10A=32A+36A	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	377 683,19
11=10,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	11 402 366,83

12=(17/15)	Limit	3 420 796,68
13=(08/1)	Sledování limitu (15%)	0,00%
14=(ABS(37)+(38))	Hodnota skupiny 6	0,00

SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	- 1 -			- 2 -			- 3 -				- 4 -				- 5 -		
						Vyhrazené změny (Domény) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nepředvídané (dle §222 odst. (8) zákona č. 134/2016 Sb.)				Změny nestvorné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)				Změny de minimis Změny neměnnosti celkovou prořadu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)		
						Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Limit 15 %
18	17	18	19=23+26+29+33 6+37+38	20=24+27+30+3 4+37+38	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	31=29+30	32A+ABS(29)+30	33	34	35=33+34	36A+ABS(33)+34	37	38	39=ABS(37)+38
		III/2371 Lužná - S-3027/00066001/2020	- 116 307,43	260 775,76	144 468,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 116 307,43	260 775,76	144 468,33	377 683,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	1	Wskazatelka změny pro č. 2371-1 / dílna 1M, 1M2, 1M3, 1M4, 1M5, 1M6, 1M7, 1M8, 1M9, 1M10, 1M11, 1M12, 1M13, 1M14, 1M15, 1M16, 1M17, 1M18, 1M19, 1M20, 1M21, 1M22, 1M23, 1M24, 1M25, 1M26, 1M27, 1M28, 1M29, 1M30, 1M31, 1M32, 1M33, 1M34, 1M35, 1M36, 1M37, 1M38, 1M39, 1M40, 1M41, 1M42, 1M43, 1M44, 1M45, 1M46, 1M47, 1M48, 1M49, 1M50, 1M51, 1M52, 1M53, 1M54, 1M55, 1M56, 1M57, 1M58, 1M59, 1M60, 1M61, 1M62, 1M63, 1M64, 1M65, 1M66, 1M67, 1M68, 1M69, 1M70, 1M71, 1M72, 1M73, 1M74, 1M75, 1M76, 1M77, 1M78, 1M79, 1M80, 1M81, 1M82, 1M83, 1M84, 1M85, 1M86, 1M87, 1M88, 1M89, 1M90, 1M91, 1M92, 1M93, 1M94, 1M95, 1M96, 1M97, 1M98, 1M99, 1M100, 1M101, 1M102, 1M103, 1M104, 1M105, 1M106, 1M107, 1M108, 1M109, 1M110, 1M111, 1M112, 1M113, 1M114, 1M115, 1M116, 1M117, 1M118, 1M119, 1M120, 1M121, 1M122, 1M123, 1M124, 1M125, 1M126, 1M127, 1M128, 1M129, 1M130, 1M131, 1M132, 1M133, 1M134, 1M135, 1M136, 1M137, 1M138, 1M139, 1M140, 1M141, 1M142, 1M143, 1M144, 1M145, 1M146, 1M147, 1M148, 1M149, 1M150, 1M151, 1M152, 1M153, 1M154, 1M155, 1M156, 1M157, 1M158, 1M159, 1M160, 1M161, 1M162, 1M163, 1M164, 1M165, 1M166, 1M167, 1M168, 1M169, 1M170, 1M171, 1M172, 1M173, 1M174, 1M175, 1M176, 1M177, 1M178, 1M179, 1M180, 1M181, 1M182, 1M183, 1M184, 1M185, 1M186, 1M187, 1M188, 1M189, 1M190, 1M191, 1M192, 1M193, 1M194, 1M195, 1M196, 1M197, 1M198, 1M199, 1M200, 1M201, 1M202, 1M203, 1M204, 1M205, 1M206, 1M207, 1M208, 1M209, 1M210, 1M211, 1M212, 1M213, 1M214, 1M215, 1M216, 1M217, 1M218, 1M219, 1M220, 1M221, 1M222, 1M223, 1M224, 1M225, 1M226, 1M227, 1M228, 1M229, 1M230, 1M231, 1M232, 1M233, 1M234, 1M235, 1M236, 1M237, 1M238, 1M239, 1M240, 1M241, 1M242, 1M243, 1M244, 1M245, 1M246, 1M247, 1M248, 1M249, 1M250, 1M251, 1M252, 1M253, 1M254, 1M255, 1M256, 1M257, 1M258, 1M259, 1M260, 1M261, 1M262, 1M263, 1M264, 1M265, 1M266, 1M267, 1M268, 1M269, 1M270, 1M271, 1M272, 1M273, 1M274, 1M275, 1M276, 1M277, 1M278, 1M279, 1M280, 1M281, 1M282, 1M283, 1M284, 1M285, 1M286, 1M287, 1M288, 1M289, 1M290, 1M291, 1M292, 1M293, 1M294, 1M295, 1M296, 1M297, 1M298, 1M299, 1M300, 1M301, 1M302, 1M303, 1M304, 1M305, 1M306, 1M307, 1M308, 1M309, 1M310, 1M311, 1M312, 1M313, 1M314, 1M315, 1M316, 1M317, 1M318, 1M319, 1M320, 1M321, 1M322, 1M323, 1M324, 1M325, 1M326, 1M327, 1M328, 1M329, 1M330, 1M331, 1M332, 1M333, 1M334, 1M335, 1M336, 1M337, 1M338, 1M339, 1M340, 1M341, 1M342, 1M343, 1M344, 1M345, 1M346, 1M347, 1M348, 1M349, 1M350, 1M351, 1M352, 1M353, 1M354, 1M355, 1M356, 1M357, 1M358, 1M359, 1M360, 1M361, 1M362, 1M363, 1M364, 1M365, 1M366, 1M367, 1M368, 1M369, 1M370, 1M371, 1M372, 1M373, 1M374, 1M375, 1M376, 1M377, 1M378, 1M379, 1M380, 1M381, 1M382, 1M383, 1M384, 1M385, 1M386, 1M387, 1M388, 1M389, 1M390, 1M391, 1M392, 1M393, 1M394, 1M395, 1M396, 1M397, 1M398, 1M399, 1M400, 1M401, 1M402, 1M403, 1M404, 1M405, 1M406, 1M407, 1M408, 1M409, 1M410, 1M411, 1M412, 1M413, 1M414, 1M415, 1M416, 1M417, 1M418, 1M419, 1M420, 1M421, 1M422, 1M423, 1M424, 1M425, 1M426, 1M427, 1M428, 1M429, 1M430, 1M431, 1M432, 1M433, 1M434, 1M435, 1M436, 1M437, 1M438, 1M439, 1M440, 1M441, 1M442, 1M443, 1M444, 1M445, 1M446, 1M447, 1M448, 1M449, 1M450, 1M451, 1M452, 1M453, 1M454, 1M455, 1M456, 1M457, 1M458, 1M459, 1M460, 1M461, 1M462, 1M463, 1M464, 1M465, 1M466, 1M467, 1M468, 1M469, 1M470, 1M471, 1M472, 1M473, 1M474, 1M475, 1M476, 1M477, 1M478, 1M479, 1M480, 1M481, 1M482, 1M483, 1M484, 1M485, 1M486, 1M487, 1M488, 1M489, 1M490, 1M491, 1M492, 1M493, 1M494, 1M495, 1M496, 1M497, 1M498, 1M499, 1M500, 1M501, 1M502, 1M503, 1M504, 1M505, 1M506, 1M507, 1M508, 1M509, 1M510, 1M511, 1M512, 1M513, 1M514, 1M515, 1M516, 1M517, 1M518, 1M519, 1M520, 1M521, 1M522, 1M523, 1M524, 1M525, 1M526, 1M527, 1M528, 1M529, 1M530, 1M531, 1M532, 1M533, 1M534, 1M535, 1M536, 1M537, 1M538, 1M539, 1M540, 1M541, 1M542, 1M543, 1M544, 1M545, 1M546, 1M547, 1M548, 1M549, 1M550, 1M551, 1M552, 1M553, 1M554, 1M555, 1M556, 1M557, 1M558, 1M559, 1M560, 1M561, 1M562, 1M563, 1M564, 1M565, 1M566, 1M567, 1M568, 1M569, 1M570, 1M571, 1M572, 1M573, 1M574, 1M575, 1M576, 1M577, 1M578, 1M579, 1M580, 1M581, 1M582, 1M583, 1M584, 1M585, 1M586, 1M587, 1M588, 1M589, 1M590, 1M591, 1M592, 1M593, 1M594, 1M595, 1M596, 1M597, 1M598, 1M599, 1M600, 1M601, 1M602, 1M603, 1M604, 1M605, 1M606, 1M607, 1M608, 1M609, 1M610, 1M611, 1M612, 1M613, 1M614, 1M615, 1M616, 1M617, 1M618, 1M619, 1M620, 1M621, 1M622, 1M623, 1M624, 1M625, 1M626, 1M627, 1M628, 1M629, 1M630, 1M631, 1M632, 1M633, 1M634, 1M635, 1M636, 1M637, 1M638, 1M639, 1M640, 1M641, 1M642, 1M643, 1M644, 1M645, 1M646, 1M647, 1M648, 1M649, 1M650, 1M651, 1M652, 1M653, 1M654, 1M655, 1M656, 1M657, 1M658, 1M659, 1M660, 1M661, 1M662, 1M663, 1M664, 1M665, 1M666, 1M667, 1M668, 1M669, 1M670, 1M671, 1M672, 1M673, 1M674, 1M675, 1M676, 1M677, 1M678, 1M679, 1M680, 1M681, 1M682, 1M683, 1M684, 1M685, 1M686, 1M687, 1M688, 1M689, 1M690, 1M691, 1M692, 1M693, 1M694, 1M695, 1M696, 1M697, 1M698, 1M699, 1M700, 1M701, 1M702, 1M703, 1M704, 1M705, 1M706, 1M707, 1M708, 1M709, 1M710, 1M711, 1M712, 1M713, 1M714, 1M715, 1M716, 1M717, 1M718, 1M719, 1M720, 1M721, 1M722, 1M723, 1M724, 1M725, 1M726, 1M727, 1M728, 1M729, 1M730, 1M731, 1M732, 1M733, 1M734, 1M735, 1M736, 1M737, 1M738, 1M739, 1M740, 1M741, 1M742, 1M743, 1M744, 1M745, 1M746, 1M747, 1M748, 1M749, 1M750, 1M751, 1M752, 1M753, 1M754, 1M755, 1M756, 1M757, 1M758, 1M759, 1M760, 1M761, 1M762, 1M763, 1M764, 1M765, 1M766, 1M767, 1M768, 1M769, 1M770, 1M771, 1M772, 1M773, 1M774, 1M775, 1M776, 1M777, 1M778, 1M779, 1M780, 1M781, 1M782, 1M783, 1M784, 1M785, 1M786, 1M787, 1M788, 1M789, 1M790, 1M791, 1M792, 1M793, 1M794, 1M795, 1M796, 1M797, 1M798, 1M799, 1M800, 1M801, 1M802, 1M803, 1M804, 1M805, 1M806, 1M807, 1M808, 1M809, 1M810, 1M811, 1M812, 1M813, 1M814, 1M815, 1M816, 1M817, 1M818, 1M819, 1M820, 1M821, 1M822, 1M823, 1M824, 1M825, 1M826, 1M827, 1M828, 1M829, 1M830, 1M831, 1M832, 1M833, 1M834, 1M835, 1M836, 1M837, 1M838, 1M839, 1M840, 1M841, 1M842, 1M843, 1M844, 1M845, 1M846, 1M847, 1M848, 1M849, 1M850, 1M851, 1M852, 1M853, 1M854, 1M855, 1M856, 1M857, 1M858, 1M859, 1M860, 1M861, 1M862, 1M863, 1M864, 1M865, 1M866, 1M867, 1M868, 1M869, 1M870, 1M871, 1M872, 1M873, 1M874, 1M875, 1M876, 1M877, 1M878, 1M879, 1M880, 1M881, 1M882, 1M883, 1M884, 1M885, 1M886, 1M887, 1M888, 1M889, 1M890, 1M891, 1M892, 1M893, 1M894, 1M895, 1M896, 1M897, 1M898, 1M899, 1M900, 1M901, 1M902, 1M903, 1M904, 1M905, 1M906, 1M907, 1M908, 1M909, 1M910, 1M911, 1M912, 1M913, 1M914, 1M915, 1M916, 1M917, 1M918, 1M919, 1M920, 1M921, 1M922, 1M923, 1M924, 1M925, 1M926, 1M927, 1M928, 1M929, 1M930, 1M931, 1M932, 1M933, 1M934, 1M935, 1M936, 1M937, 1M938, 1M939, 1M940, 1M941, 1M942, 1M943, 1M944, 1M945, 1M946, 1M947, 1M948, 1M949, 1M950, 1M951, 1M952, 1M953, 1M954, 1M955, 1M956, 1M957, 1M958, 1M959, 1M960, 1M961, 1M962, 1M963, 1M964, 1M965, 1M966, 1M967, 1M968, 1M969, 1M970, 1M971, 1M972, 1M973, 1M974, 1M975, 1M976, 1M977, 1M978, 1M979, 1M980, 1M981, 1M982, 1M983, 1M984, 1M985, 1M986, 1M987, 1M988, 1M989, 1M990, 1M991, 1M992, 1M993, 1M994, 1M995, 1M996, 1M997, 1M998, 1M999, 1M1000, 1M1001, 1M1002, 1M1003, 1M1004, 1M1005, 1M1006, 1M1007, 1M1008, 1M1009, 1M1010, 1M1011, 1M1012, 1M1013, 1M1014, 1M1015, 1M1016, 1M1017, 1M1018, 1M1019, 1M1020, 1M1021, 1M1022, 1M1023, 1M1024, 1M1025, 1M1026, 1M1027, 1M1028, 1M1029, 1M1030, 1M1031, 1M1032, 1M1033, 1M1034, 1M1035, 1M1036, 1M1037, 1M1038, 1M1039, 1M1040, 1M1041, 1M1042, 1M1043, 1M1044, 1M1045, 1M1046, 1M1047, 1M1048, 1M1049, 1M1050, 1M1051, 1M1052, 1M1053, 1M1054, 1M1055, 1M1056, 1M1057, 1M1058, 1M1059, 1M1060, 1M1061, 1M1062, 1M1063, 1M1064, 1M1065, 1M1066, 1M1067, 1M1068, 1M1069, 1M1070, 1M1071, 1M1072, 1M1073, 1M1074, 1M1075, 1M1076, 1M1077, 1M1078, 1M1079, 1M1080, 1M1081, 1M1082, 1M1083, 1M1084, 1M1085, 1M1086, 1M1087, 1M1088, 1M1089, 1M1090, 1M1091, 1M1092, 1M1093, 1M1094, 1M1095, 1M1096, 1M1097, 1M1098, 1M1099, 1M1100, 1M1101, 1M1102, 1M1103, 1M1104, 1M1105, 1M1106, 1M1107, 1M1108, 1M1109, 1M1110, 1M1111, 1M1112, 1M1113, 1M1114, 1M1115, 1M1116, 1M1117, 1M1118, 1M1119, 1M1120, 1M1121, 1M1122, 1M1123, 1M1124, 1M1125, 1M1126, 1M1127, 1M1128, 1M1129, 1M1130, 1M1131, 1M1132, 1M1133, 1M1134, 1M1135, 1M1136, 1M1137, 1M1138, 1M1139, 1M1140, 1M1141, 1M1142, 1M1143, 1M1144, 1M1145, 1M1146, 1M1147, 1M1148, 1M1149, 1M1150, 1M1151, 1M1152, 1M1153, 1M1154, 1M1155, 1M1156, 1M1157, 1M1158, 1M1159, 1M1160, 1M1161, 1M1162, 1M1163, 1M1164, 1M1165, 1M1166, 1M1167, 1M1168, 1M1169, 1M1170, 1M1171, 1M1172, 1M1173, 1M1174, 1M1175, 1M1176, 1M1177, 1M1178, 1M1179, 1M1180, 1M1181, 1M1182, 1M1183, 1M1184, 1M1185, 1M1186, 1M1187, 1M1188, 1M1189, 1M1190, 1M1191, 1M1192, 1M1193, 1M1194, 1M1195, 1M1196, 1M1197, 1M1198, 1M1199, 1M1200, 1M1201, 1M1202, 1M1203, 1M1204, 1M1205, 1M1206, 1M1207, 1M1208, 1M1209, 1M1210, 1M1211, 1M1212, 1M1213, 1M1214, 1M1215, 1M1216, 1M1217, 1M1218, 1M1219, 1M1220, 1M1221, 1M1222, 1M1223, 1M1224, 1M1225, 1M1226, 1M1227, 1M1228, 1M1229, 1M1230, 1M1231, 1M1232, 1M1233, 1M1234, 1M1235, 1M1236, 1M1237, 1M1238, 1M1239, 1M1240, 1M1241, 1M1242, 1M1243, 1M1244, 1M1245, 1M1246, 1M1247, 1M1248, 1M1249, 1M1250, 1M1251, 1M1252, 1M1253, 1M1254, 1M1255, 1M1256, 1M1257, 1M1258, 1M1259, 1M1260, 1M1261, 1M1262, 1M1263, 1M1264, 1M1265, 1M1266, 1M1267, 1M1268, 1M1269, 1M1270, 1M1271, 1M1272, 1M1273, 1M1274, 1M1275, 1M1276, 1M1277, 1M1278, 1M1279, 1M1280, 1M1281, 1M1282, 1M1283, 1M1284, 1M1285, 1M1286, 1M1287, 1M1288, 1M1289, 1M1290, 1M1291, 1M1292, 1M1293, 1M1294, 1M1295, 1M1296, 1M1297, 1M1298, 1M1299, 1M1300, 1M1301, 1M1302, 1M1303, 1M1304, 1M1305, 1M1306, 1M1307, 1M1308, 1M1309, 1M1310, 1M1311, 1M1312, 1M1313, 1M1314, 1M1315, 1M1316, 1M1317, 1M1318, 1M1319, 1M1320, 1M1321, 1M1322, 1M1323, 1M1324, 1M1325, 1M1326,																				

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	1
Název a evidenční číslo stavby:	III/2371 Lužná - S-3027/00066001/2020
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	201 - Rekonstrukce mostu ev.č. 2371-1
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	201/1

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
07 Změnový soupis prací SO 201 po změně 1	7	
08 Vyjádření AD ze dne 28.04.2021 el. poštou	4	
09 Oznámení zhotovitele o změně ze dne 28. 4. 2021	1	
10 Pokyn objednatele ke změně ze dne 30.4.2021	1	
11 Zápis TDI v SD ze dne 03.05.2021	1	
12 Fotodokumentace	6	
13 Stanovisko TDI k ZBV 1	2	
14 Stanovisko AD k ZBV 1	2	
-		
Počet listů celkem	24	

Změnový soupis prací SO 201 po změně 1 pro ZBV 1

Název a evidenční číslo stavby:							ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SOIPS)						
Číslo a název SO/PS:							201/1						
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:													
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
	0	Všeobecné konstrukce a práce						88 796,34	- 24 200,80	1 485,73	66 075,27	- 22 715,77	-25,59%
1	014101	POPLATKY ZA SKLADKU - zemina 20,0*4,0*0,50=40,000 [A] dle položky 12960 SKL 2*10,00*1,00*1,0*0,750=30,250 [B] dle položky 13173 SKL 0*0,80*1,50*4,20=7,560 [C] dle položky 13273 SKL Celkem: A+B+C=77,810 [D] ZBV 1 16,787M3 Celkem: 77,810+16,787=94,597M3	M3	77,810	94,597	16,787	90,00	4 984,80	0,00	947,22	5 931,02	947,22	13,88%
2	014101	POPLATKY ZA SKLADKU - kameninový kámen 4,114=4,114 [A] dle pol. 11317 SKL 7,306=7,306 [B] dle pol. 11332 SKL 15,910,25*0,25=0,775 [C] dle pol. 11353 SKL Celkem: A+B+C=12,195 [D] ZBV 1 6,267M3 Celkem: 12,195+6,267=18,462M3	M3	12,195	18,462	6,267	133,00	1 831,94	0,00	833,61	2 455,45	833,61	51,39%
3	014101	POPLATKY ZA SKLADKU - prsty beton, cihla 6,054=6,054 [A] dle pol. 11315 SKL 4,50*0,25*0,05=0,056 [B] dle pol. 11331 SKL 7,240=7,240 [C] dle pol. 96615 SKL 2,191=2,191 [C] dle pol. 96716 SKL Celkem: A+B+C=17,541 [D] ZBV 1 -7,325M3 Celkem: 17,541-7,325=10,216M3	M3	17,541	10,216	-7,325	300,00	5 382,30	-2 300,30	0,00	3 081,99	-2 300,30	-41,62%
4	014103	POPLATKY ZA SKLADKU - jeřáb 0,475=0,475 [A] dle pol. 96718 SKL	T	0,475	0,475	0,000	600,00	285,00	0,00	0,00	285,00	0,00	0,00%
5	02940	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE Stanovení zatížitelnosti mostu dle ČSN 73 5222 1=1,000 [A] ZBV 1 -7,000KPL Celkem: 7,000-7,000=0,000	KPL	1,000	0,000	-1,000	22 000,00	22 000,00	-22 000,00	0,00	0,00	-22 000,00	-100,00%
6	029412	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU mnozí sál vs formátu pol a png včetně zadání údajů do SMS 1=1,000 [A] ZBV 1 -7,000KPL Celkem: 7,000-7,000=0,000	KPL	1,000	1,000	0,000	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00%
7	02942	OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA První hlavní mostní prohlídka (1 HPM) provedená v SMS, listový výstup 1=1,000 [A] ZBV 1 -7,000KPL Celkem: 7,000-7,000=0,000	KPL	1,000	1,000	0,000	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00%
8	02730	POMOC PRÁCE ŽALSTĚ NEBO ŽÁDZ OCHRANY INŽENÝRSKÝCH SÍŤÍ manipulace a ochrana stávajících inženýrských sítí vedených v chodníku plus most bílkem provádění prací na mostě a v předpolí, levá firma (kabely VO), pravá firma (kabely CETN) 1=1,000 [A] ZBV 1 -7,000KPL Celkem: 7,000-7,000=0,000	KPL	1,000	1,000	0,000	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00%
9	11315	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU odstr. a uložení na skládce podklad stávající vstřevky na mostě a chodníku na mostě a v oblasti vjezdů vstřevka na mostě: (7,70*2*0,25)*5,00*0,15=4,106 [A] pod chodníky na mostě: (5,70*0,83)*5,00*0,15=1,306 [B] pod chodníky mimo most: (1,55*1,50)*5,00*0,15+1,70*0,90*0,15=2,746 [C] Celkem: A+B+C=6,154 [D] ZBV 1 -6,054M3 Celkem: 6,154-6,054=0,100	M3	6,154	0,100	-6,054	1 835,00	14 776,20	-14 776,20	0,00	0,00	-14 776,20	-100,00%
10	11317	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK odstr. a uložení na skládce stávající vstřevka a chodník na mostě vpravo vstřevka: 7,70*5,0*0,10=3,850 [A] první chodník: 0,83*5,30*0,06=0,264 [B] Celkem: A+B=4,114 [C] ZBV 1 0,703 M3 Celkem: 4,114+0,703=4,817M3	M3	4,114	4,817	0,703	496,00	1 811,12	0,00	364,66	2 275,68	388,90	18,35%
11	11318	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽBOV odstr. a uložení na skládce stávající vstřevka a chodník na mostě vpravo vstřevka: 7,70*5,0*0,10=3,850 [A] první chodník: 0,83*5,30*0,06=0,264 [B] Celkem: A+B=4,114 [C] ZBV 1 0,703 M3 Celkem: 4,114+0,703=4,817M3	M3	0,994	0,994	0,000	587,00	583,48	0,00	0,00	583,48	0,00	0,00%

[illegible]

[illegible]

51	626113	REPROFILACE POHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 30MM	M2	43,850	38,950	-7,900	2 250,00	98 882,50	-17 550,00	0,00	81 112,50	-17 550,00	-17,79%
		uprava podkladu a plochy pro připevnění izolace na rubu spěr a křidel											
		rub spěr: 2*1,75*10,30=36,050 [A]											
		rub křidel: 4*1,50*1,30=7,800 [B]											
		Celkem: A+B=43,850 [C]											
		ZBV 1 -7,000M2											
		Celkem 43,850-7,000=36,850M2											
52	626113	REPROFILACE POHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 30MM	M2	4,456	4,456	0,000	2 250,00	10 048,50	0,00	0,00	10 048,50	0,00	0,00%
		izové plochy spěr a podhled NK, odhad 5% plochy											
		delní plochy spěr - 5%: 2*11,300*2,00*0,05=2,260 [A]											
		podhled NK - 5%: 10,60*4,20*0,05=2,236 [B]											
		Celkem: A+B=4,496 [C]											
53	626122	REPROFILACE POHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU DVOUVRST TL 30MM	M2	0,893	0,893	0,000	3 850,00	3 438,05	0,00	0,00	3 438,05	0,00	0,00%
		izové plochy spěr a podhled NK, odhad 1% plochy											
		delní plochy spěr - 1%: 2*11,300*2,00*0,01=0,452 [A]											
		podhled NK - 1%: 10,60*4,20*0,01=0,445 [B]											
		Celkem: A+B=0,893 [C]											
54	62661	INJEKTAŽ TRHLIN ÚZAVŘENÍ	M	20,000	0,000	-20,000	1 800,00	37 800,00	-37 800,00	0,00	0,00	-37 800,00	-190,00%
		injektáž tržin na podkladě a křídlech, odhad											
		10*3 0=30,000 [A]											
		ZBV 1 -20,000M2											
		Celkem 20,000-20,000=0,000											
55	711113	POKLADKA BEZVÝSTAVNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOŠTI ASFALTOVÝMI PASTY	M2	43,850	38,950	-4,900	580,00	16 565,50	-1 462,00	0,00	15 103,50	-1 462,00	-9,99%
		nádobový AP na penetrace-podkladě nátěr na rubu spěr a křidel											
		rub spěr: 2*1,75*10,30=36,050 [A]											
		rub křidel: 4*1,50*1,30=7,800 [B]											
		Celkem: A+B=43,850 [C]											
		ZBV 1 -3,900M2											
		Celkem 43,850-3,900=39,950M2											
56	711442	IZOLACE MOSTOVÝCH OKLOUPLOSNÁ ASFALTOVÝMI PASTY S PRČETKOVÝMI VRSTVAMI	M2	53,000	68,190	15,190	880,00	56 046,50	0,00	0,00	56 046,50	0,00	0,00%
		vt. 2x katevní impregnační nátěr (pešeski uřehat)											
		10,60*3,00=31,800 [A]											
		ZBV 1 13,190M2											
		Celkem 53,000+13,190=66,190M2											
57	711502	OCHRANA IZOLACE NA ROVNÝCH ASFALTOVÝMI PASTY	M2	20,750	34,655	13,905	380,00	5 151,95	0,00	1 104,04	6 255,99	1 104,04	19,90%
		ast. pás s hliněnou vlněnou - přisaz 150 mm											
		pod římsami: 11,60+3,55+5,50=30,750 [A]											
		ZBV 1 3,945M2											
		Celkem 20,750+13,905=34,655M2											
58	721114	VÝSTAVNÍ KANALIZACE Z PLAST TRUB DN 200	M	3,000	3,000	0,000	750,00	2 250,00	0,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00%
		výstavění drenáž: prostupem dráhem zd, HDPE DN180 mm, s přírubou, přisaz min. 150 mm											
		před lis. spěr											
		2*1 0=2,000 [A]											
		ZBV 1 3,000M											
		Celkem 2,000+3,000=5,000											
59	783121	PROTIKOROZ OCHR OK NÁTEREM VÍCEVRST SE ZAK. S VYS ORSAHEM ZN	M2	0,348	0,348	0,000	890,00	309,10	0,00	0,00	309,10	0,00	0,00%
		olejnení oběmažných kolev přičného seprudi											
		2*12*0,12*0,12=0,346 [A]											
60	78382	NATĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B)	M2	7,388	6,338	-1,050	340,00	2 538,50	0,00	452,25	2 990,75	452,25	18,30%
		schranný náter typ S2 (dle TKP, kap. 31)											
		sazba krasp: 2*15 40+0 30*5 0=7,000 [A]											
		ZBV 1 -1,000M2											
		Celkem 7,000+1,000=8,000M2											
61	78382	NATĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B)	M2	86,320	87,394	1,074	340,00	29 505,60	488,44	0,00	29 994,04	488,44	1,61%
		schranný a křehozující nátěr na bázi akrylátové disperze - N, stříkané plochy spěr a NK											
		delní plochy spěr: 2*11,200*2,00=44,800 [A]											
		podhled NK: 10,60*4,20=44,520 [B]											
		Celkem: A+B=89,320 [C]											
		ZBV 1 -3,018M2											
		Celkem 86,320+3,018=89,338M2											
62	78383	NATĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C)	M2	1,000	3,376	2,376	640,00	1 920,00	0,00	364,80	2 284,80	364,80	19,30%
		náter odobu římsy (typ S4, dle TKP, kap. 31)											
		2*10 15+0 15*5 00=3,000 [A]											
		ZBV 1 -0,570M2											
		Celkem 3,000+0,370=3,370M2											
63	87532	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST (N DO 150MM)	M	25,600	25,600	0,000	380,00	7 416,00	0,00	0,00	7 416,00	0,00	0,00%
		drenážní tr. HDPE DN 150 vrchního řádu S48, vč. "T" klap. př. napojení, resp. výustění											

		je vyřazen 10,27=20,600 [A]											
64	87827	CHRANÍČKY A TRUB PĚSTOVÝCH DN DO 100MM 3x rozestaví obrobek prům. 110/94 mm v římách 2*7,0=14,000 [A]	M	14,000	14,000	0,000	180,00	2 240,00	0,00	0,00	2 240,00	0,00	0,00%
65	87727	CHRANÍČKY PLEŠE Z TRUS PLAST DN DO 100MM přesná chránící páska 110/94 mm do řím pro sčítací kabely 2*7,0=14,000 [A]	M	14,000	14,000	0,000	280,00	3 920,00	0,00	0,00	3 920,00	0,00	0,00%
66	81128	9. Ostatní konstrukce a práce ZÁKLADY MOSTŮ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ kompletní provedení, vč. PKO, včetně patní desky a kotvení šroubů, vč. spojovacího materiálu 6,0*7,0=42,000 [A]	M	15,000	20,250	4,750	4 600,00	71 300,00	0,00	0,00	71 300,00	0,00	0,00%
67	81345	280V 1,470W Celkem 13,300+4,750=18,050 [A]											
68	81442	NYVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ desky provedení, osazené v římách 6=6,000 [A]	KUS	6,000	6,000	0,000	750,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00%
69	81443	EV ČÍSLO MOSTU OCEL S FOLIE TR 1 DODÁVKA A MONTÁŽ dodávka a montáž železného označení mostu, vč. sloupky a bet.parky 2=2,000 [A]	KUS	2,000	2,000	0,000	3 400,00	6 800,00	0,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00%
70	81443	EV ČÍSLO MOSTU OCEL S FOLIE TR 1 DEMONTÁŽ demontáž sloupčového označení mostu, vč. sloupky a bet.parky 2=2,000 [A]	KUS	2,000	2,000	0,000	150,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00%
71	81723	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBKOU ŠÍŘ 100MM obrubka 100/250 z betonu C35/45 XF4, vč. spárování cem. maltou MC25-XF4, vč. beton. izol. G20/25h-XF3 umístění strana levého chodníku: 1,0+2,0=2,000 [A]	M	3,000	3,000	0,000	360,00	1 080,00	0,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00%
72	81724	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBKOU ŠÍŘ 100MM sloupč. obrubka 150/250 v provedení do prostředí XF4 z betonu C35/45-XF4, včetně zabetonování do betonu C20/25h-XF3 a spárování cem. maltou MC25-XF4, použit původní rozšíření, odhad výměny 30% za nové 3,0+4,0=7,000 [A]	M	13,500	13,500	0,000	375,00	4 995,00	0,00	0,00	4 995,00	0,00	0,00%
73	81813	REZÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 30MM říznutí dráhy do betonu, odhadnout původního zpevnění před lozem opěr 2*11,20=22,400 [A]	M	22,400	22,400	0,000	1 500,00	33 600,00	0,00	0,00	33 600,00	0,00	0,00%
74	81914	REZÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 50MM provedení odřezu horní části řimy nad povrchem mostovky NK dantovým lánem na projektovanou úroveň, položka zahrnuje řezání betonových konstrukcí, včetně spotřeby vody 2*8,0=16,000 [A]	M	12,000	12,000	0,000	2 700,00	32 400,00	0,00	0,00	32 400,00	0,00	0,00%
75	83133	TERÉNNÍ DLATAC SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK. PRŮR DO 800MM2 závlka za horka, teplota závlky typy N2 do CEN EN 14188, včetně úpravy spár a přípravy povrchu podtl. obrubníků z obrobků vstřik podtl. obrubníků 2*5,00=10,000 [A] přítlak na koso NK: 2,10+7,20=9,300 [B] Celkem: A+B=19,300 [C]	M	24,300	26,300	1,900	120,00	2 916,00	0,00	0,00	2 916,00	0,00	0,00%
76	83133	280V 1,470W Celkem 24,300+1,900=26,200 [A]											
77	83543	TERÉNNÍ DLATAC SPAR FYZ. PASÍVOU NEBO KRM. PROFILEM přetřesnutí podtl. obrubky hma podtl. obrubníků 2*5,00=10,000 [A] 280V 1,470W Celkem 10,000+1,900=11,900 [A]	M	10,000	11,900	1,900	150,00	1 785,00	0,00	0,00	1 785,00	0,00	0,00%
78	938542	OCISTĚNÍ BETON KONSTR. OTŘYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 500 BARŮ očštění lozových povrchů opěr od prachu, vyluhů a nečistot, vč. předúpravy (mechanické odstránění povrch. vrstev betonu a nesoudrž. částí) opěrky 2*11,200=22,400 [A]	MC	44,800	44,800	0,000	280,00	12 544,00	0,00	0,00	12 544,00	0,00	0,00%
79	938543	OCISTĚNÍ BETON KONSTR. OTŘYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 1000 BARŮ tl. průběžnou / mechanické odstránění povrch. vrstev betonu a nesoudrž. částí) desky plochy sčítacích prvků: 2*11,200=22,400 [A] poky NK: 2*5,300=10,600 [B] podhled NK: 10,600+20=30,600 [C] Celkem: A+B+C=53,000 [C]	MC	70,520	70,520	0,000	330,00	23 271,60	0,00	0,00	23 271,60	0,00	0,00%
80	938544	OCISTĚNÍ BETON KONSTR. OTŘYSKÁNÍM NA SUCHO KŘEMÍČ. PÍSKEM odstránění povrchu NK po odstránění původních rozbitých a podkladních vrstev vozovky 10,600*5,00=53,000 [A] 280V 1,470W Celkem 53,000+1,900=54,900 [A]	MC	83,090	83,090	10,070	320,00	26 588,80	0,00	0,00	26 588,80	0,00	0,00%
81	938545	OCISTĚNÍ BETON KONSTR. OTŘYSKÁNÍM NA SUCHO KOVOVOU DRŮT odstránění povrchu NK před pokladením nové izolace 10,600*5,00=53,000 [A] 280V 1,470W Celkem 53,000+1,900=54,900 [A]	MC	83,090	83,090	10,070	330,00	27 419,70	0,00	0,00	27 419,70	0,00	0,00%

80	830032	OCISTENÍ OCELI KONSTR. OHTYSKANÍM NA SUCHO KŘEMÍČ POKRÉM	M2	7,838	7,838	0,000	930,00	2 619,87	0,00	0,00	2 619,87	0,00	0,00%
		odštěpní odštěpné a obrábění betonu/železa vyřazené a kotelny z/čistého kotelny											
		borý NK - 50% 270,20*4,20=2,840 [A]											
		podhled fins - 100% 270,20*4,20=2,840 [B]											
		podhled NK - 5% (10,80-270,35*4,20*0,05=2,079 [C])											
		část plochy ústředních prahů - 10% 271,1,20*0,50*0,10=1,120 [D]											
		Celkem: A+B+C+D=7,939 [E]											
81	85613	BOURÁNÍ KONSTRUKCI Z PROSTÉHO BETONU	M3	7,240	7,240	0,000	3 300,00	23 840,00	0,00	0,00	23 840,00	0,00	0,00%
		vč. odvzdušnění a uložení na skládce											
		část opěvnění železa pod mostem: (270,60*11,200+3,0*2,80)*0,30=6,552 [A]											
		horní část křídla mostu mostní fins: 271,50*0,40*0,40+1,20*0,40*0,40=0,688 [B]											
		Celkem: A+B=7,240 [C]											
82	86716	VYBOURÁNÍ ČÁSTI KONSTRUKCI ŽELEZOBET	M3	3,181	3,181	0,000	4 200,00	9 202,20	0,00	0,00	9 202,20	0,00	0,00%
		vč. odvzdušnění a uložení na skládce, včetně případné separace výztuže a její odkup z/čistěním											
		skupky zábradlí: 0,27*0,18*1,05*16=3,498 [A]											
		horní část fins: 0,47*0,30*0,00*2=1,680 [B]											
		Celkem: A+B=2,181 [C]											
83	88718	VYBOURÁNÍ ČÁSTI KONSTRUKCI KOVOVÝCH	T	0,475	0,475	0,000	16 900,00	7 837,50	0,00	0,00	7 837,50	0,00	0,00%
		vč. odvzdušnění a uložení na skládce, resp. do lomu											
		madla zábradlí: (274,50*271,50*2+375,00*271,30)*7,40/1000=0,275 [A]											
		reflexní prvky pod mostem: 13,50*14,800/1000=0,200 [B]											
		Celkem: A+B=0,475 [C]											
84	978178	OSTRANNÍ MOSTNÍ IZOLACE	M2	63,079	63,079	10,070	140,00	9 540,00	0,00	1 812,90	11 352,90	1 812,90	16,00%
		vč. odvzdušnění, uložení a poplachu na skládce (nebezpečný odpad)											
		10 60*5,00=53,000 [A]											
		ZBV 1: 10,070 [B]											
		Celkem 23,000+10,070=33,070 [C]											
		Nové položky						0,00	0,00	978,56	978,56	978,56	100,00%
85	974646 N	ASTALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+ 16S TL 50MM	M2	0,300	6,829	6,829	143,00	978,56	0,00	978,56	978,56	978,56	100,00%
		Cena odpovídá položce ve výkrytu - objekt SO 101.1											
		ZBV 1											
		skládky mostu vztuhy na mostě, ACP 16+ 50/70											
		celkem: 6,829 [C]											
		Celkem						1 291 182,78	-118 307,43	388 775,76	1 435 571,11	144 468,33	11,19%

Aleš Vlk

Od: Monika Topková
Odesláno: pátek 1. října 2021 7:55
Komu: Aleš Vlk
Kopie: Jana Malířová
Předmět: FW: Lužná, most 2371-1 - AD - prohlídka stavby

Příznak pro zpracování: Zpracovat
Stav příznaku: Opatřeno příznakem

Dobrý den,

Přeposílám e-mail od AD - prohlídka mostu (viz níže).

S pozdravem

Bc. Monika Topková
Přípravářka zakázek

Froněk, spol. s r.o.
Zátiší 2488, CZ 269 01 Rakovník
www.fronek.cz

-----Original Message-----

From: Jiří Karel
Sent: Friday, October 1, 2021 6:59 AM
To: 'Monika Topková'
Subject: FW: Lužná, most 2371-1 - AD - prohlídka stavby

Jiří Karel
Stavbyvedoucí

Froněk, spol. s r.o.
Zátiší 2488, CZ 269 01 Rakovník
www.fronek.cz

-----Original Message-----

From: Miroslav Seidl
Sent: Wednesday, April 28, 2021 3:31 PM
To: Ondřej Červený

Cc: Vladimír Koníček
Subject: Lužná, most 2371-1 - AD - prohlídka stavby

Dobrý den všem,

Včera odpoledne jsem provedl prohlídku stavby mostu ev. č. 2371-1 v obci Lužná.

Následné činnosti a práce bych neviděl tak dramaticky, jak se podle ohlasů, které se ke mně donesly z pondělního KD, zdály.

Dovolil bych si shrnout situaci. Jedná se o klasické stavební úpravy mostu, kdy se po odhalení zakrytých částí mostu zjistí odchylky od původně předpokládaných rozměrů (délka NK, tloušťka opěr, konstrukce křídel apod.), takže je na tyto nově zjištěné skutečnosti nutno zareagovat a technické řešení patřičným způsobem upravit.

RDS je zpracována dle původních předpokladů a nyní v průběhu výstavby je třeba určité navazující konstrukce na základě zjištěných skutečností mírně upravit.

Jedná se především o křídla, římsy a zábradlí.

Shrnutí stavu stavby mostu:

- je realizováno nadbetonování desky NK a připraveny výkopy pro navazující křídla;
- šířka desky NK je dle předpokladů, délka však nikoli, deska NK má délku 6,0 m (v šikmém směru ve směru osy komunikace, resp. 5,85 m kolmo na líc opěr) a zasahuje až téměř k rubu opěr;
- odskočení rubové plochy opěr od konce NK je u O1 i O2 rozdílné, navíc není ani stejné vlevo a vpravo v rámci jedné opěry;
- kvalita povrchu nové desky NK je velmi dobrá;
- po odkrytí přechodových oblastí nebyla zjištěna žádná původní křídla ve směru rovnoběžném s osou komunikace, ačkoli v daném směru přesahovalo původní zábradlí;
- fyzická křídla mostu jsou v podstatě jen na opěry navazující betonové nábrežní zdi rovnoběžné s osou potoka
- výkopy pro rovnoběžná křídla jsou provedeny na hloubku cca 1,0 m pod úroveň horního povrchu desky mostovky
- na levé straně u O1 (co je trafostanice) je realizován výkop pro křídlo s úpravou podkladním betonem do vzdálenosti cca 1,90 m od konce NK, tj. cca 1,60 m od rubu opěry;
- na levé straně u O2 je realizován výkop pro křídlo s úpravou podkladním betonem do vzdálenosti cca 2,65 m od konce NK, tj. cca 2,50 m od rubu opěry;
- na pravé straně u O1 je odkryt výkop se sítěmi od mostu až k rohu domu s prodejnou, sítě jsou v chráničkách, je obnažena kanalizace a další různé prvky odvodnění (v různém stavu a funkcích);
- na pravé straně u O2 je odkryt výkop jen v krátké vzdálenosti kvůli blízkému vjezdu

Návrh řešení křídel, římsy a zábradlí:

Křídla na levé straně jsou jednoduchá.

Křídlo K4 u O1 vlevo se provede v prodloužení NK a oproti RDS bude jen kratší, do připraveného výkopu se vejde délka cca 1,50 m (měřeno v boční lícové hraně NK) od rubové plochy opěr, kvůli výstupku na rubu opěry od konce NK se tam nevejde připravený armokoš, který se bude muset zkrátit na příslušný tvar; vodorovná pracovní spára pod římsovou částí bude nad úrovní odskočení rubové plochy opěr, což stavebně vyhovuje;

Křídlo K5 u O2 vlevo se provede v prodloužení NK a provede se v délce přesně podle RDS, jen bude polohově posunuto až za rub opěry, tzn.

využije se připravený armokoš spodní části, který je na délku cca 1,85 m v boční lícové ploše křídla.

Horní římsová část pro obě křídla vlevo se pochopitelně dotáhne až ke konci NK, kde bude svislá dilatační spára mezi římsou na NK a římsou na křídlech. Dilatační spára bude orientována s koncem NK, tj. šikmo k boční podélné hraně. Zábradlí na této levé straně se realizuje v délce přesně dle RDS a osadí se symetricky k NK, tj. vždy bude přesahovat 1,0 m za dilatační spáru konce NK. Není nutné, aby bylo zábradlí prodlužováno dále od mostu.

Křídla na pravé straně jsou složitější, ale řešitelná. Začnu tím jednodušším.

Křídlo K3 u O2 vpravo: zde se žádné křídlo dělat nebude, jen se zrealizuje nová římsová část na stávající nábrežní zeď, která navazuje na opěru mostu.

Nová římsová část povede od římsy na mostě ke sloupku oplocení, tj.

délky 1,50 m. Nejdříve se udělá římsa na mostě na NK a až pak následně se provede tato římsová část na nábrežní zdi, aby to výškově navazovalo. Tloušťka nábrežní zdi je 550 mm, šířka této římsové části však bude 800 mm, aby navázala na konec římsy na NK a byla dotažena až ke sloupku stávajícího oplocení. Tato římsová část překryje

ocelovou chráničku s kabely CETIN a zároveň vytvoří podporu pro přechod vodovodu, výškově se tedy provede do úrovně spodního povrchu izolační trubky vodovodu.

Pro kotvení této římsové části navrhuji vytáhnout vodorovné 4 prof. 16 po 200 mm z římsy na NK ve spodní úrovni s ochranným epoxidovým nátěrem proti korozi, v horní úrovni se přizná spára - bude tedy fungovat jako smršťovací spára, resp. kloubové připojení. Dále do horního povrchu nábrežní zdi v části mezi vodovodem a plotem navrhuji doplnit 4 ks vlepovaného kotevního háku tvaru obráceného "L" z prof. 16. Výztuž této římsy standardní pro danou šířku 800 mm.

Křídla K1 a K2 u O1 vpravo: zde je třeba vyřešit několik souvislostí s kabely a odvodňovacími prvky vozovky, chodníku a přilehlých budov.

Fyzicky zde však žádné křídlo být nemusí, neboť není třeba zajišťovat stabilitu zeminy ani svahu, jen je třeba připravit podklad pro osazení zábradlí a lemující hranu chodníku.

Návaznosti: v daném místě je vyústění staré kanalizace pomocí betonových trub DN500, ta je shora obnažená s vrcholem v hloubce cca

880 mm od horního povrchu nové desky NK a je patrné, že druhá trubka je propadlá oproti té, která je zabetonována do opěry. Do této kanalizace jsou zaústěny různé prvky ze svodů střech okolních budov a povrchu chodníku před prodejnou. Dále by se sem měla zaústit nová uliční vpust z komunikace i nově doplněná uliční vpust z opačné strany komunikace u trafostanice.

Takže nejdříve je tedy třeba vyřešit všechna tato napojení různých odvodňovacích prvků, jednak aby byly dostatečné spády, ale také aby stávající kanalizace bezpečně odváděla vodu do potoka. Bude potřeba něco udělat s tou propadlou trubkou, aby nám voda náhodou díky odsokou nesýtila zásyp za opěrou. Až poté se může přistoupit k realizaci řešení "křídla". Kanalizační trubky bych navrhoval v rozsahu výkopu stejně ještě přebetonovat, aby byly polohově zafixovány a ochráněny.

Mám 2 možnosti, byť v daném případě si myslím, že jednodušší bude lepší, tj. fyzicky bez křídla.

a) křídlo vyskládat z prolévaných bednicích tvárnic s horní monolitickou "římsovou" částí pro lem chodníku a kotvení sloupků zábradlí; v tomto konstrukčním řešení křídla lze relativně jednoduše vyřešit prostup pro chráničky.

b) žádné fyzické křídlo nerealizovat a udělat jen patky pro zábradlí, polohy patek se rozmístí tak, aby se vyhnuly trase chrániček s kabely, ty by se mohly obalit půlenou chráničkou v rozsahu přechodové obalsti mostu, kde má být zásyp z mezerovitěho betonu, na zbylé části se provede standardní zásyp, zachycení výškového rozdílu mezi povrchem chodníku a terénem vpravo se zajistí pomocí chodníkového obrubníku š. 100 mm nebo při větším rozdílu palisádou.

To je nyní vše.

Omlouvám se, že je to tak dlouhé.

Na levé straně lze rovnou pokračovat, není nutné nic kreslit ani zaměřovat.

Na pravé straně by se mělo nejdříve dořešit to odvodnění a kanalizace a je tedy možné rozmyslet možnost a) či b) pro prostor před O1.

Děkuji a pěkný den.

Ing. Miroslav Seidl

Tato zpráva je určena výhradně pro adresáta a obsahuje důvěrné informace. Neoprávněná distribuce, upravování nebo neoprávněné šíření jejího obsahu je protiprávní. Pokud jste omylem obdrželi tuto zprávu, oznamte toto prosím neprodleně odesílateli, zasláním zprávy zpět. Poté prosím vymažte zprávu z Vašeho systému, aniž byste jí kopírovali, či seznámili s jejím obsahem třetí osobu. Společnost PRAGOPROJEKT, a.s.

nepřijímá odpovědnost za správný a kompletní přenos informací, ani za zpoždění nebo přerušení přenosu, ani za škody, vyplývající z použití nebo využití informací obsažených v této zprávě. Tato zpráva má pouze informativní a nezávazný charakter, společnost PRAGOPROJEKT, a.s.

výslovně upozorňuje, a to bez ohledu na obsah této zprávy, že tato zpráva není závazným právním jednáním vedoucím k uzavření, ukončení či změně jakékoli smlouvy se společností PRAGOPROJEKT, a.s., ani potvrzením přijetí nabídky. Uzavření, změna, ukončení, doplnění smlouvy, nebo přijetí nabídky společností PRAGOPROJEKT, a.s. je možná pouze písemně, a to formou listiny podepsané oprávněným zástupcem společnosti PRAGOPROJEKT, a.s. Jiné formě jednání (např. e-mailem,

telefonicky) nelze přisuzovat žádné právní následky. Příloženou zprávu není možné považovat ani za jakékoliv jiné jednání společnosti PRAGOPROJEKT, a.s., ze kterého by bylo možné usuzovat, že se uzavření jakékoli smlouvy či akceptování jakékoli nabídky společností PRAGOPROJEKT, a.s. jeví jako vysoce pravděpodobné, pokud společnost PRAGOPROJEKT, a.s. výslovně písemně neuvede, že se jedná o závažný charakter obsahu této zprávy. Adresát této zprávy současně bere na vědomí, že z případného ukončení vyjednání o smlouvě v jakékoliv fázi a to i bez vážného důvodu nelze vyvozovat žádné následky.

--

Tento e-mail byl zkontrolován na viry programem AVG.
<http://www.avg.cz>

Froněk, spol. s r.o.
Zátiší 2488, CZ 269 01 Rakovník
tel. +420 313 517 276
fax +420 313 516 361
www.fronek.cz, info@fronek.cz

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, p.o.
Šárka Balážová
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5 Smíchov

Vyřizuje: Bc. Jiří Karel

datum: 28.4.2021

Stavba: III/2371 Lužná – rekonstrukce silnice
S-3027/00066001/2020
Věc: Oznámení SO 201

Vážená paní Balážová,

Po odkrytí částí mostu byly zjištěny odchylky od původně předpokládaných rozměrů, bude nutné na tyto skutečnosti zareagovat.

Jedná se především o křídla, římsy a zábradlí mostního objektu, která budou muset být upravena, čímž dojde ke změně oproti SoD.

Upozorňujeme, že na SO 201 bude muset být zpracováno ZBV.

Přílohou přikládáme vyjádření AD Ing. Seidla. Prosíme o zaslání žádosti objednatele o změnu rozsahu díla.

S pozdravem

Jiří Karel
stavbář

Froněk, spol. s r.o.
Zátiší 2488
269 01 Rakovník

Váš dopis značky/ze dne

Naše značka

Vyřizuje/telefon:
Š. Balázová

Kladno
30.4.2021

III/2371 Lužná - vyjádření k nepředvídatelným změnám

Na základě oznámení zhotovitele stavby „III/2371 Lužná“ ze dne 28.4.2021 se jedná o následující nepředvídatelnou změnu:

- po odhalení zakrytých částí mostu ev. č. 2371-I byly zjištěny odchylky od původně předpokládaných rozměrů (délka NK, tloušťka opěr, konstrukce křídel, říms a zábradlí). AD této stavby na nově zjištěné skutečnosti ve svém vyjádření reaguje a navrhuje úpravu technického řešení, viz. přiložené vyjádření Ing. Miroslava Seidla.


Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace (dále jen KSÚS SK), jako správce a zároveň zástupce Středočeského kraje jako vlastníka silnic II. a III. tříd, tj. dotčené krajské komunikace III/2371 včetně mostu s ev. č. 2371-I, a jako zadavatele výše zmíněné stavby tímto vydává pokyn k realizaci dle zhotovitelem předloženého navrženého řešení a zároveň žádá zhotovitele o zpracování ZBV k těmto změnám stavby, a to v souladu se zákonem o zadávání VR a příslušnou směrnicí KSÚS SK.


Přílohy: Oznámení zhotovitele o nepředvídatelných změnách ze dne 28.4.2021 včetně vyjádření AD

S pozdravem


Karel Motal
vedoucí TSÚ - oblast Kladno
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje

Datum	Denní záznamy stavby
	<u>ZAPIS TDS</u> NA ZÁKLADĚ ODKRYTÍ PROSTORU PROKŘÍDELA NA ZÁKLADĚ ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO STAVU MOSTU BYLO MĚŘENO JEDINĚ, ŽE SKUTEČNÁ DĚLKA MOSTU JE CÍLA 170 CM DÉLKA, NEJEDNÁ SE O PROJEKT. ZAROVNĚ NEMŮJEME PROVEZET KŘÍDLA K1, K2, K3 2 DŮVODY KOLÍ JE SILNĚ SÍŤENÍ. Z TĚCHTO DŮVODŮ JE POTŘEBA PŘEPRAVIT PRÁCE NA OBJEKTU MOSTU AŽ DO PROTEKČNÍHO VYDEŠENÍ PROVEDENÍ VÍŠECH KŘÍDEL. OBZEDNATEL VÝPLA AD KURGENTNÍMU ŘEŠENÍ. ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO STAVU VE FOTODOKUMENTACI PŘED OKAMŽÍTE FOTODOKUMENTACE. <u>ZATDS</u> <u>ZABH</u> <u>ZAKUSK. MOKO</u> <u>Za krom. s. u.</u> <u>21 AD</u>
3.5.21	POČASÍ: 12°C Prac. doba 7⁰⁰ - 18⁰⁰ hod Počet lidí 1TAT + 3 Práce: brauzování desky po betonu odbednění desky ještě odstraňování desky

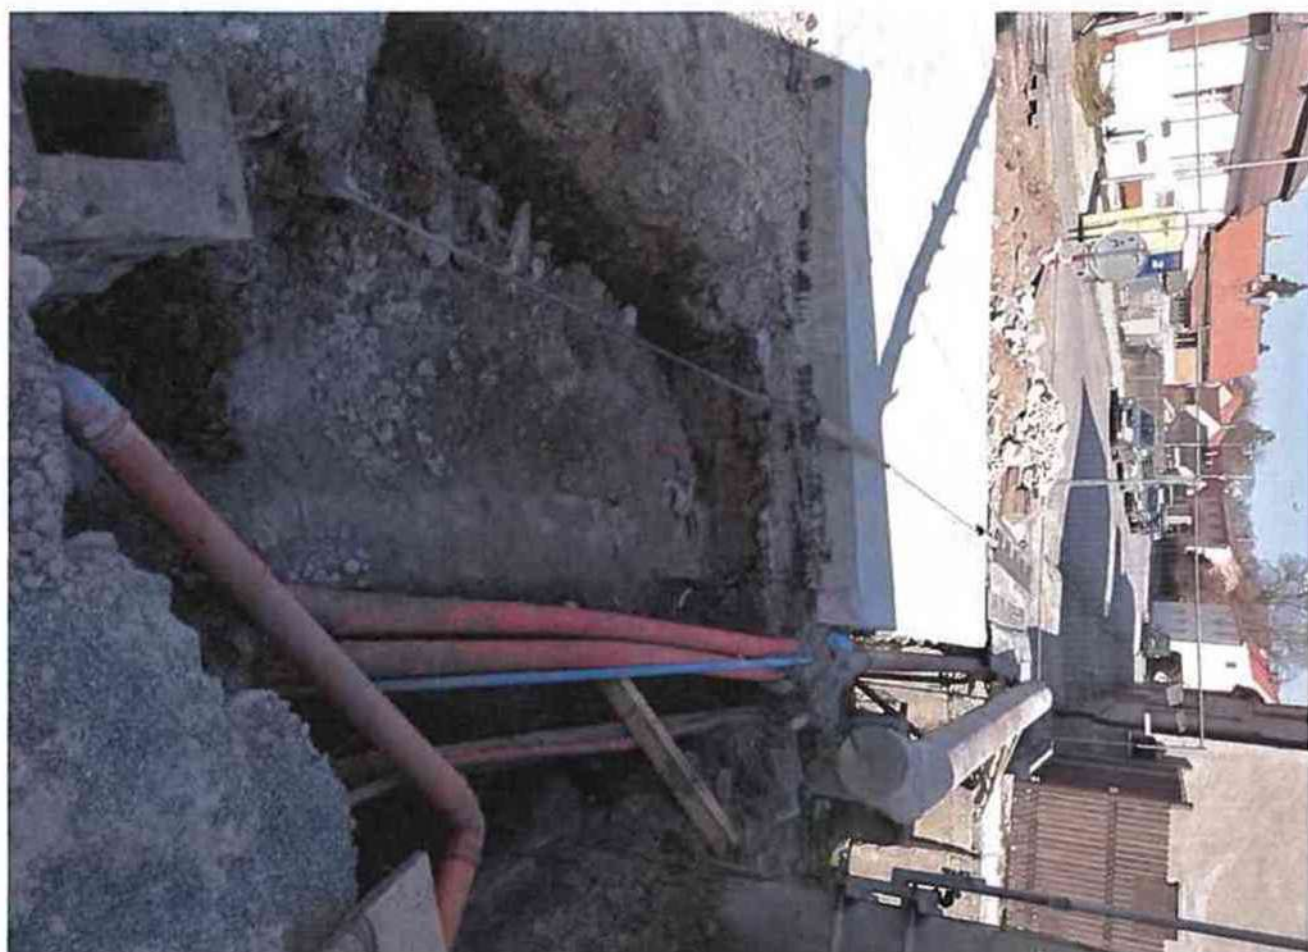

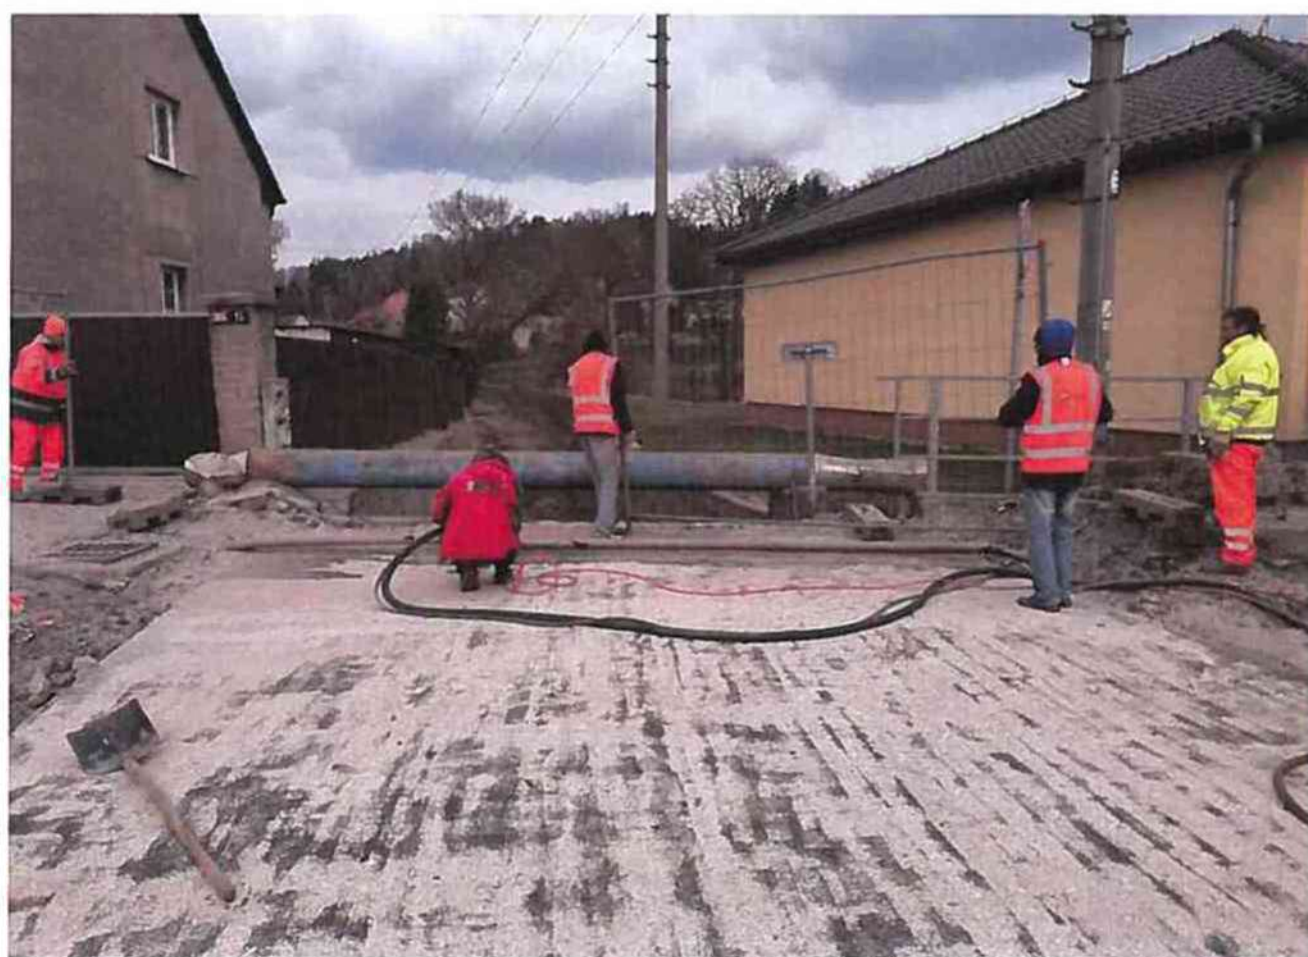



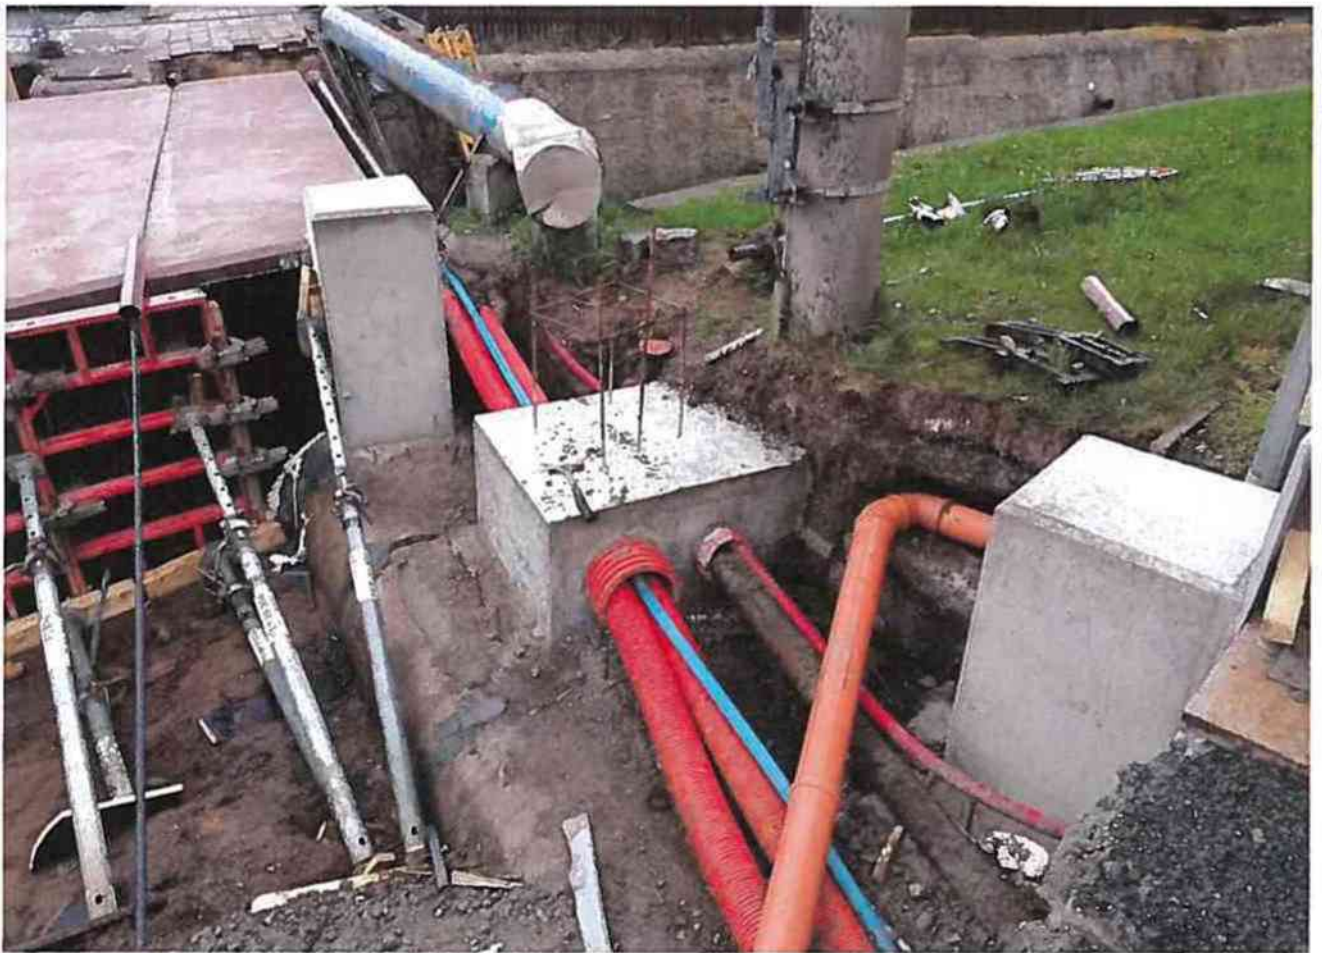





REKONSTRUKCE KOMUNIKACE LUŽNÁ III/2371 LUŽNÁ

STANOVISKO K ZBV č. 1

Změny mostní konstrukce dle skutečné potřeby pro řádné dokončení Díla

V PDPS pro SO 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 2371-1 bylo předpokládáno provedení opravy mostu dle provedených předběžných průzkumů a rešerše původní dokumentace mostu.

V průběhu provádění prací byly, po odhalení zakrytých částí mostu, zjištěny odchylky od původně předpokládaných rozměrů, kde se lišila délka NK, tloušťka opěr, a také konstrukce křídel. Zde je nutno poukázat na skutečnost, že po odkrytí přechodových oblastí nebyla zjištěna žádná původní křídla ve směru rovnoběžném s osou komunikace. Navíc bylo zjištěno, že není možné provést původně plánovaná křídla K1, K2, K3 z důvodu kolize se stávajícími inženýrskými sítěmi. S ohledem na tyto skutečnosti bylo nutné navrhnout změny v technickém řešení stavebních úprav mostu.

Bylo navrženo, že se provedenou změny v návrhu řešení křídel, říms a zábradlí. Budou provedeny drobné úpravy řešení křídel na levé straně. Křídlo K4 u opěry O1 se provede v prodloužení NK a oproti RDS bude zkráceno. Křídlo K5 u O2 vlevo se provede v prodloužení NK a provede se v původně uvažované délce. Horní římsová část pro obě křídla vlevo se zrealizuje až ke konci NK, kde bude svislá dilatační spára mezi římsou na NK a římsou na křídlech. Zábradlí na levé straně se realizuje dle původního návrhu. Křídlo K3 u O2 vpravo se nebude realizovat. Provede se nová římsová část na stávající nábrežní zeď, která navazuje na opěru mostu. Tato římsová část překryje ocelovou chráničku s kabely CETIN a zároveň vytvoří podporu pro přechod vodovodu. U původně navržených křídel K1 a K2 u opěry O1 vpravo dochází ke kolizi se stávajícími sítěmi technického vybavení. Současně bylo nutné řešení pozměnit s ohledem na funkčnost odvodňovacích prvků vozovky, konstrukci chodníku a ochranu přilehlých budov. Vzhledem k tomu, že není nutné zajišťovat stabilitu zeminy ani svahu, není realizace křídel nezbytná. Nutností bylo připravit podklad pro osazení zábradlí a lemující hranu chodníku. Bylo proto navrženo, že se křídla K1 a K2 nebudou realizovat a provedou se pouze patky pro zábradlí, které se rozmístí tak, aby se vyhnuly trase chrániček existujících sítí.

S navrženými změnami a zpracováním ZBV souhlasím.



.....
Ing. Michal Pietsch
TDI

NAŠE ZNAČKA: MO II-Se-0058-2021

VYŘIZUJE: Ing. Miroslav Seidl

TEL.:

EMAIL:

DATUM: 14. 12. 2021

**KSÚS Středočeského kraje, p. o.
Vedoucí TSÚ – oblast Kladno
Karel Motal**

**Zborovská 11
150 21 Praha 5**

Věc: III/2371 Lužná - S-3027/00066001/2020

VYJÁDŘENÍ AUTORSKÉHO DOZORU

Akce: III/2371 Lužná - S-3027/00066001/2020

Objekt: SO 201 – Rekonstrukce mostu ev. č. 2371-1

Vyjádření AD k ZBV č. 1 (201/1)

Na základě písemné výzvy a vydaného pokynu KSÚS Středočeského kraje, p. o. k průběhu stavby III/2371 Lužná a úpravě technického řešení mostního objektu SO 201 Rekonstrukce mostu ev. č. 2371-1 vydává autorský dozor následující stanovisko k ZBV č. 1 (201/1), které se týká úpravy technického řešení mostu SO 201 na základě zjištěných skutečností při samotné realizaci stavby.

Autorský dozor prostudoval jednotlivé podklady a údaje uvedené v návrhu ZBV č. 1 (201/1) a sděluje následující:

Zhotovitel výše uvedené stavby předložil návrh Změny, v rámci které se reaguje na skutečnosti zjištěné v průběhu samotné realizace prací při rekonstrukci mostu ev. č. 2371-1 po odkrytí vrstev vozovky a obnažení stávajících původních konstrukcí mostu a křídel v přechodové oblasti za rubem opěr. Byly zjištěny odchylky od původně předpokládaných rozměrů (délka NK, tloušťka opěr, délka a orientace křídel a říms, apod.). S ohledem na průběh stavby bylo nezbytné na tyto nově zjištěné skutečnosti zareagovat a upravit technické řešení dílčích konstrukčních částí mostu.

Předložený návrh ZBV č. 1 (201/1) tak v sobě zahrnuje úpravu množství u položek soupisu prací a též doplnění nové položky do soupisu prací, které zohledňují již upravené technické řešení jako reakci na nové skutečnosti zjištěné až v průběhu samotné realizace prací. Tato změna se týká následujících položek soupisu prací poř. č.: 1, 2, 3, 5, 9, 10, 12, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 51, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 66, 74, 75, 78, 79 a 84 a zařazení nové položky poř. č. 85.

Předložená změna již v sobě zahrnuje úpravu technického řešení dle doporučení a návrhu AD (viz písemné stanovisko ze dne 28. 04. 2021).

Stanovisko Autorského dozoru:

Za Autorský dozor výše uvedené stavby s navrženými změnami množství u výše zmíněných položek soupisu prací po technické stránce souhlasíme. Jedná se o reakci na nově zjištěné skutečnosti během samotné realizace prací na základě nepředvídatelných fyzických podmínek po odkopání a odhalení skrytých částí

původních konstrukcí mostu, na které bylo nezbytné zareagovat adekvátní úpravou technického řešení dílčích konstrukčních částí mostu.

Navržené úpravy v rámci předložené Změny u měněných položek soupisu prací již nevyvolávají potřebu dalších změn (tzv. „řetězení Změn“) a nemění charakter prováděného díla.

Navrhované řešení a změny u výše zmíněných položek soupisu prací ve výsledku nemění provozní a užitné vlastnosti stavby oproti původnímu řešení z PDPS.

S pozdravem,

Ing. Miroslav Seidl

PRAGOPROJEKT, a.s.
pověřen výkonem AD
pro mostní objekty stavby

Kopie: KSÚS Středočeského kraje, p. o. – Šárka Balážová
Froněk, spol. s r.o. – Bc. Jiří Karel
PRAGOPROJEKT, a.s. – Ing. Vladimír Koníček

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby: III/2371 Lužná - S-3027/00066001/2020	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 101.1/1	Číslo ZBV: 2
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 101.1 Údržba sil. III/2371, ZÚ-km 0,912		
Číslo a název podobjektu/rozpočtu: 101.1 Údržba sil. III/2371, ZÚ-km 0,912		

Objednatel: **Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**
 Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov
 IČ 00066001

Zhotovitel: **Froněk, spol.s r.o.**
 Zátíší 2488, 269 01 Rakovník
 IČ 47534690

Rekapitulace ZBV č. 2 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.3	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.5	0,00	3 154 769,61	3 154 769,61

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2	0,00	3 154 769,61	3 154 769,61

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
 Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
 a pro Rozpis ocenění změn položek.

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: III/2371 Lužná - S-3027/00066001/2020 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 101.1 Údržba sil. III/2371, ZÚ-km 0,912		Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 101.1/1	Číslo ZBV: 2.5																															
Strany smlouvy o dílo objednatel č.: S-3027/00066001/2020 a zhotovitel č.: 120081 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 23.10.2020 (dále jen Smlouva): Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov Zhotovitel: Froněk, spol.s r.o., Zátíší 2488, 269 01 Rakovník																																		
Přehled Změnového listu: <table border="0"> <tr> <td>1. Krycí list</td> <td>1</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>2. Změnový list</td> <td>2</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací</td> <td>1</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>4. Rozpis ocenění Změn položek ZBV 2</td> <td>1</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>5. Přehled zařazení změn do skupin</td> <td>1</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>6. Přehled dalších dokladů</td> <td>1</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>Další doklady dle přehledu dokladů</td> <td>17</td> <td>počet listů</td> </tr> </table>		1. Krycí list	1	počet listů	2. Změnový list	2	počet listů	3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů	4. Rozpis ocenění Změn položek ZBV 2	1	počet listů	5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů	6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů	Další doklady dle přehledu dokladů	17	počet listů	<table border="0"> <tr> <td>Paré č.</td> <td>Příjemce</td> </tr> <tr> <td>1, 2</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Projektant (AD)</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Stavební dozor</td> </tr> </table>		Paré č.	Příjemce	1, 2	Objednatel	3	Zhotovitel	4	Projektant (AD)	5	Stavební dozor
1. Krycí list	1	počet listů																																
2. Změnový list	2	počet listů																																
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů																																
4. Rozpis ocenění Změn položek ZBV 2	1	počet listů																																
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů																																
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů																																
Další doklady dle přehledu dokladů	17	počet listů																																
Paré č.	Příjemce																																	
1, 2	Objednatel																																	
3	Zhotovitel																																	
4	Projektant (AD)																																	
5	Stavební dozor																																	
Iniciátor změny: Zhotovitel Popis a zdůvodnění Změny:																																		
Provedení obrusných vrstev na navazujícím úseku silnice III/2371 - od konce obce Lužná až po křižovatku na obec Lišany 1) V rámci zakázky „III/2371 Lužná“ byla dle PDPS plánována oprava silnic v ulicích Čsl. armády, Masarykovo nám. a Tyršova pouze na území obce Lužná. 2) V průběhu provádění stavby byla projednána možnost opravit navíc nevyhovující stav vozovky v navazujícím úseku silnice III/2371 od konce obce Lužná až po křižovatku na obec Lišany. Tento nevyhovující stav v dotčeném úseku se projevil v důsledku zvýšeného provozu na silnici při provádění stavebních prací na její rekonstrukci v obci a vlivem kámatických podmínek v průběhu zimního období 2020/2021. S ohledem na tyto skutečnosti bylo Objednatelům rozhodnuto o provedení nových asfaltových vrstev. Tento návrh vede k rozšíření ploch obrusných vrstev oproti PDPS. Provedení těchto víceprací představuje změny v rozšíření objemů frézování a zhotovení nových asfaltových vrstev. 3) Vzhledem k uvedené skutečnosti byly navrženy změny projednány oběma Smluvními stranami a bylo rozhodnuto, že dojde k opravě obrusných vrstev silnice III/2371 od km 2,561 po křižovatku se silnicí III/22915 o předpokládané výměře 7.720,000 m². Byla navržena oprava v podobě odfrézování stávajícího asfaltového krytu vozovky v dotčeném úseku a následná pokládka obrusné vrstvy finišerem v celé šíři komunikace za úplné uzavírky. Geodetickým zaměřením byla skutečná plocha opravovaného úseku stanovena na 7.837,000 m², viz doklad č. 10 - Geodetické zaměření. 4) Změny byly, po předchozím projednání mezi Smluvními stranami, iniciovány Zhotovitelem v rámci oznámení Zhotovitele, které následně Objednatel svým pokynem schválil. Podkladem pro tyto změny jsou doklady č. 08 – Oznámení Zhotovitele ze dne 09.08.2021 a č. 09 – Pokyn Objednatel ze dne 10.08.2021. 5) Tato změna se týká úpravy množství položek poř. č. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 32, 33, 35 a 37 a zařazení nové položky č. 39. Tato změna má za následek řetězení, neboť pro uvedené práce vyžaduje zajistit DIO s úplnou uzavírkou silnice III/2371. Změna - rozšíření DIO - je řešena v ZBV 6. Uvedené změny vznikly na základě nutnosti opravy obrusných vrstev v dotčeném úseku silnice III/2371, k jejímuž poškození došlo zejména v průběhu zimního období 2020/2021, tj. až po provedení zadávacím řízení této zakázky. Jedná se o Změny de minimis, které jsou podle § 5, odst.1 písm. e), resp. podle § 12 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29. 05. 2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek zařazených do Skupiny 5 jako změny de minimis. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst.4) se jedná o změnu de minimis.																																		

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
0,00	3 154 769,61	3 154 769,61	3 154 769,61

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavitel/vedoucí):	jméno	Bc. Jiří Karel	datum	15.12.2021	podpis
Projektant (autorský dozor):	jméno	Ing. Vladimír Koniček	datum	15.12	podpis
Stavební dozor:	jméno	Petr Štoklasek	datum		podpis
Zástupce Objednatel: KSÚS SK, p.o.	jméno	Karel Motal	datum	15.12.2021	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitel sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel)	jméno	Ing. Jan Lichneger	datum	17-12-2021	podpis
Zhotovitel	jméno	Ing. Kamal Hrbek	datum	15.12.2021	podpis
					Cíle paré:

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 2**

Název a evidenční číslo Stavby: III/2371 Lužná - S-3027/00066001/2020
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 101.1/1
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 101.1 Údržba sil. III/2371, ZÚ-km 0,912

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
3 216 806,01

Poznámka:

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	3 216 806,01	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	3 154 769,61	3 154 769,61	98,07%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	0,00	6 371 575,62	3 154 769,61	98,07%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

souhlasím

Bc. Jiří Karel

15.12.2021

Projektant (autorský dozor):

souhlasím

Ing. Vladimír Koniček

Stavební dozor:

souhlasím

Petr Stoklasa

Zástupce Objednatele KSÚS:

souhlasím

Karel Motal

Zaměstnanec KSÚS
odpovědný za cenové
projednání Změny:

souhlasím

Ing. Jaroslava Jurková

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 2.5

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

101.1/1

Skupina změn 5

Por. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	4,650	44,330	39,680	103,00	478,95	0,00	4 087,04	4 565,99	4 087,04	853,33%
2	014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU - zemina	M3	517,750	888,020	370,270	60,00	31 065,00	0,00	22 216,20	53 281,20	22 216,20	71,52%
3	11343	ODŠTRÁNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU	M3	4,650	44,330	39,680	265,00	1 232,25	0,00	10 515,20	11 747,45	10 515,20	853,33%
4	11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	485,800	1 076,800	611,000	265,00	123 437,00	0,00	161 915,00	285 352,00	161 915,00	131,17%
6	12373	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I	M3	517,750	701,270	183,520	188,00	97 337,00	0,00	34 501,76	131 838,76	34 501,76	35,45%
8	129958R	ČIŠTĚNÍ STÁVAJÍCÍCH PROPUSTKŮ	M	60,000	75,000	15,000	220,00	13 200,00	0,00	3 300,00	16 500,00	3 300,00	25,00%
17	561431	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TR. I TL. DO 150MM	M2	12,400	582,118	569,718	234,00	2 901,60	0,00	133 314,01	136 215,61	133 314,01	4594,50%
18	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI	M3	2,790	187,157	184,367	485,00	1 353,15	0,00	89 418,00	90 771,15	89 418,00	6608,14%
20	56963	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO	M2	1 113,735	2 358,735	1 245,000	60,00	66 824,10	0,00	74 700,00	141 524,10	74 700,00	111,79%
21	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	5 964,000	13 808,000	7 844,000	15,00	89 460,00	0,00	117 660,00	207 120,00	117 660,00	131,52%
22	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	5 890,000	13 734,000	7 844,000	8,00	47 120,00	0,00	62 752,00	109 872,00	62 752,00	133,17%
24	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL	M2	5 890,000	13 527,000	7 637,000	136,00	801 040,00	0,00	1 038 632,00	1 839 672,00	1 038 632,00	129,66%
25	574E46	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM	M2	5 964,000	13 683,000	7 719,000	143,00	852 852,00	0,00	1 103 817,00	1 956 669,00	1 103 817,00	129,43%
26	577A1	VÝSPRAVA ASFALTOVOU ZÁLVKOU	M	267,800	280,100	12,300	80,00	21 424,00	0,00	984,00	22 408,00	984,00	4,59%
32	91228	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	90,000	140,000	50,000	445,00	40 050,00	0,00	22 250,00	62 300,00	22 250,00	56,56%
33	915111	VODODŮVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	259,900	726,800	466,900	150,00	38 985,00	0,00	70 035,00	109 020,00	70 035,00	179,65%
35	915231	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - DOD A POKLÁDKA	M2	248,600	715,500	466,900	316,00	78 557,60	0,00	147 540,40	226 098,00	147 540,40	187,81%
37	919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTŮ VOZOVEK	M	167,800	180,100	12,300	90,00	15 102,00	0,00	1 107,00	16 209,00	1 107,00	7,33%
Nové položky													
39	11130	SEJMUTÍ DRNŮ	M2	0,000	1 245,000	1 245,000	45,000	0,00	0,00	56 025,00	56 025,00	56 025,00	100,00%
Celkem								2 322 418,55	0,00	3 154 769,61	5 477 188,26	3 154 769,61	

Odpovědný zástupce Objednatelů i odpovědný zástupce Zhotovitelů odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Bc. Jiří Karel, stavbyvedoucí

Za Objednatel: Karel Motal, vedoucí oddělení KSÚS Kladno

Datum: 15. 12. 2021

Datum:

Podpis:

Podpis:

1.

10

1

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: III/2371 Lužná - S-3027/00066001/2020

1	Přijaté smluvní částka bez rezervy a DPH	22 884 711,06
2=1+10+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	26 103 949,00
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	31 585 778,29
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	114,47%
4=(26/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(36/1)*100	Sledování záporných změn (Skupina 2)	0,00%
40=(18/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, odst. (b), písm. b)	-0,51%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	144 468,33
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	0,83%
8=1*10,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	6 841 413,32

9=(32A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	1,88%
10=(36A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,00%
10A=(32A+36A)	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	377 083,19
11=1*10,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	11 402 365,53

12=(1/1)*10	Limit	3 420 708,88
13=(38/1)	Sledování limitu (15%)	13,83%
14=(A88(37)+(18))	Hodnota skupiny 5	3 154 769,51

SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	- 1 -			- 2 -			- 3 -				- 4 -				- 5 -		
						Vyhrazené změny (Dotěrný) (dle §102 zákona č. 134/2016 Sb.)			Záměrná přírůstek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nepředvídané (dle §222 odst. (8) zákona č. 134/2016 Sb.)				Změny nečtybné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)				Změny de minimis (Změny neměrné) (sekce 10, povaha veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)		
18	17	18	15=23+28+29+33	20=24+27+35+3	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	32=23+30	32A+A88(29)+30	33	34	35=33+34	36A+A88(33)+34	37	38	39=A88(37)+38
		III/2371 Lužná - S-3027/00066001/2020	- 116 387,43	3 415 945,37	3 299 557,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 116 387,43	369 775,76	144 468,33	377 083,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 154 769,51	3 154 769,51
201	1	Rekonstrukce mostu ev.č. 2371-1 / úprava MK, Míst, políček pro zřízení a ochrany kolejeřizných cest	- 116 387,43	3 415 945,37	3 299 557,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 116 387,43	369 775,76	144 468,33	377 083,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	2	Úprava ul. II/2371, ZÚAn 0,812 / úprava a nové políčky vstupu ul. kance obce Lužná po MŽDovské na Ličany	0,00	3 154 769,51	3 154 769,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 154 769,51	3 154 769,51

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	2
Název a evidenční číslo stavby:	III/2371 Lužná - S-3027/00066001/2020
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	101.1 Údržba sil. III/2371, ZÚ-km 0,912
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	101.1/1

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
07 Změnový soupis prací SO 101.1 po změně 1	8	
08 Oznámení Zhotovitele změně ze dne 09.08.2021	1	
09 Pokyn Objednatele ke změně ze dne 10.08.2021	1	
10 Geodetické zaměření	4	
11 Stanovisko TDI k ZBV 2	1	
12 Stanovisko AD k ZBV 2 - 6	2	
Počet listů celkem	17	

Název a evidenční číslo stavby:	II/2371 Lužná - S-3027/60066001/2529	ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
Číslo a název SO/PS:	101.1 Úprava sil. II/2371, ZÚ-ak 0.912	
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:	101.1 Úprava sil. II/2371, ZÚ-ak 0.912	101.1/1

Pol. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
		0 Všeobecné konstrukce a práce												
1	014101	POPLATKY ZA SKLADBU 4,68+4,68 [A] -dle pol. 11343 SKL zahrnuje veškeré postátky provozování skládky související s uložením odpadu na skládce ZEV 1 39,88M3 Celkem 4,68+36,88+44,33M3	M3	4,680	44,330	39,650	103,80	479,94	0,00	4 087,54	4 567,48	4 087,54	853,33%	
2	014101	POPLATKY ZA SKLADBU - zeme 517,75+517,75 [A] -dle pol. 12373 SKL - položka obsahuje veškeré postátky provozování skládky související s uložením odpadu na skládce - v pond zahrnuje stažení, manipulace při skládání na řízné skládce a zaplacení poplatku skládce ZEV 1 370,27M3 Celkem 517,75+517,75+444,02M3	M3	517,750	888,020	370,270	86,90	31 960,00	0,00	22 216,20	53 281,20	22 216,20	71,52%	
		1 Zelení práce						263 940,08	0,00	219 231,86	573 172,94	310 231,86	57,83%	
3	11343	ODSTRAN KRYTÚ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU odvoz z uložení na skládce Vybavení konstrukce vtrazky 2*4,2*0,15+1,5*5,2*0,3+4,680 [A] Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybořením terénu a s vybořovacími hradlemi vč. uložení na skládce. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 014111" (s výjimkou malého množství bouvaného materiálu, kde je možná poplatek zahrnout do jednorázové ceny bourání) – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce ZEV 1 39,88M3 Celkem 4,68+36,88+44,33M3	M3	4,680	44,330	39,650	265,08	1 232,25	0,00	19 515,20	11 747,45	10 515,20	653,33%	
4	11373	PREZOVANÉ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH sčup zhotovilem Prizování v š. 0,08 m 800*0,08+484,000 [A] Prizování vjezdů v š. 0,02 m 90*0,02+1,800 [B] Celkem: A+B=485,800 [C] Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybořenou suti a s vybořovacími hradlemi vč. uložení na skládce. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 014111" (s výjimkou malého množství bouvaného materiálu, kde je možná poplatek zahrnout do jednorázové ceny bourání) – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce ZEV 1 911,03M3 Celkem 485,800+411,000+573,900M3	M3	485,800	1 076,900	591,100	285,06	123 437,80	0,00	181 915,00	285 352,00	181 915,00	131,11%	
5	12373	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I odvoz na dopravní 12+12,000 [A] -dle pol. 11343	M3	12,000	12,000	0,000	172,00	2 064,00	0,00	0,00	2 064,00	0,00	0,00%	

		položka zahrnuje: - vodotěrná a svahová doprava, přemísťování, přeházání, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopky nespazování i zapážování - odřezání výkopky po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - stěžení výkopky v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zastavení - stěžení pod vozem, v okolí vybudová, ve stíněných prostorech a pod - přikládání za klapku - třídění po vrstvách, písečkách a po jiných kruzích částech (figurách) - čerpání vody vč. bezpečnosti želez, potrubí a pohotovosti bezpečnosti dopravy (viz ustanovení k par. 118.2) - polštářování stěžíteřní podstavce vody - třídění a rozdělení jednotlivých částí - vytahování a nošení výkopu - různé výkopové, odstranění klenby a zapážování - pažení, vzpěření a zastavení vč. připevňování (výhled stěžíteřní stěny) - oprava, ochrana a udržování stěny, základové spáry, stěny a svahy - udržování výkopky a jeho ochrana proti vodě - odvětrání nebo obvětrání vody v okolí výkopky a ve výkopě - třídění výkopu - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopky (příčky, spojky, náklady, klenby, podpory, kory, přemostění, zpevněné plochy, zábrty a pod.) položka nezahrnuje:		
8	129600	ČISTĚNÍ STÁVAJÍCÍCH PROPLUSTKŮ	M	
		úroveň odvozu a likvidace vzniklého odpadu 3-20-80.000 (M) Sčítání položky je vodotěrná a svahová doprava, přemísťování, přeházání, manipulace s materiálem a úložení na skládce. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykonává v položce 0141¹¹ (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento bod musí být uveden v descriptionu této položky) CENA 15.0000 Celkem 80.000+15.000+15.000		
9	17110	ULOŽENÍ SYSTÉMU DO NÁSTYPU SE ZAHNUTÍM	M3	
		základ vyčištěný materiálem, hutnění na 95 % PS položka zahrnuje: - kompletní provedení zemi konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - oprava ukládání materiálu vložení, třídění, promíchání nebo vysoušení, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - odřezání úložky po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - stěžení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zastavení - stěžení provádění vč. hutnění ve stěžených podmínkách a stíněných prostorech - stěžení ukládání systému pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných kruzích částech (figurách) vč. dopravy - spečování a nošení materiálu - výměna částí zemi konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - různé hutnění a vyplňování a promíchání v podkladě - oprava, ochrana, ochrana a zhuštění podkladě - uzavření, hutnění a uzavření povrchů svahů - třídění látek na svazích - udržování úložky a jeho ochrana proti vodě - odvětrání nebo obvětrání vody v okolí úložky a v úložce		

0.00	0.00	600.00	0.00	0.00%
------	------	--------	------	-------

0.00	0.00	768.00	0.00	0.00%
------	------	--------	------	-------

0.00	3 300.00	16 500.00	3 300.00	25.00%
------	----------	-----------	----------	--------

12.000	12.000	0.000	50.00	600.00
--------	--------	-------	-------	--------

12.000	12.000	0.000	84.00	768.00
--------	--------	-------	-------	--------

60.000	75.000	15.000	220.00	13.200.00
--------	--------	--------	--------	-----------

		položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - očištění úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatizujících opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zaplnění - zřízení provětrání ve zvláštních podmínkách a stálých prostorách - zřízení ukládky zařízení pod vodou - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dopravy - spouštění a odlezení materiálů - oprava, očistění a ochrana pedstří a svahů - osvětlení, uzavírání povrchů snáhů - uchování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvody nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - velké průrazné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, spoje, náklady, klíny, podpěrné konstrukce, přenosové, zpevňovací plochy, zakrytí a podob.)	M3	181,712	181,712	0,000	607,20	92 089,18	0,00	0,00	92 089,18	0,00	0,00%
12	1748	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Zdroj kotenovan B. 2232 Ø 431'352+181,712 [A] položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a doprav materiálu do zastávky dokumentace - oprava ukázaného materiálu vzhledem, třídícím, promícháním nebo vysušením, příp. jiné opravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé mýly hutnění - očištění úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatizujících opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zaplnění - zřízení provětrání vč. hutnění ve zvláštních podmínkách a stálých prostorách - zřízení ukládky zařízení pod vodou - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dopravy - spouštění a odlezení materiálů - výměna části zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvody nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - velké průrazné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, národy, klány, podpěrné konstrukce, přenosové, zpevňovací plochy, zakrytí a podob.)	M3	38,290	38,290	0,000	987,00	34 182,40	0,00	0,00	34 182,40	0,00	0,00%
13	1798	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Obtyp kotenzován V. 8116 Ø 2510 4'352+38,290 [B] položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a doprav materiálu do zastávky dokumentace - oprava ukázaného materiálu vzhledem, třídícím, promícháním nebo vysušením, příp. jiné opravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé mýly hutnění - očištění úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatizujících opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zaplnění - zřízení provětrání vč. hutnění ve zvláštních podmínkách a stálých prostorách - zřízení ukládky zařízení pod vodou - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dopravy - spouštění a odlezení materiálů - výměna části zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a vyplnění jam a prohlubní v podkladu - oprava, očistění, ochrana a zhotovení podkory - opravování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na jezích - uchování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvody nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - velké průrazné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, spoje, náklady, klány, podpěrné konstrukce, přenosové, zpevňovací plochy, zakrytí a podob.)	M3	422,400	422,400	0,000	41,00	17 218,40	0,00	0,00	17 218,40	0,00	0,00%
		2 Základy						38 118,40	0,00	0,00	38 118,40	0,00	0,00%
14	28967	OPĚLAŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE Vodorovná geotextilie 1,2'352+422,400 [A] Položka zahrnuje: - dodávku předepsané geotextilie - opravy, očistění a ochranu podkladu - přípravné v podkladu, případně zatčení - opravy spojů a zaplnění okrajů - opravy pro odvození - nutné přesady - ostatní požadavky a vyznačením všech čar	M2	800,000	800,000	0,000	41,00	32 800,00	0,00	0,00	32 800,00	0,00	0,00%
15	28967	OPĚLAŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE Separátér geotextilie na lokální zpevnění podkladu položka bude hrazena ze sdruženosti TOJ 300'723+800,000 [AT]	M2	800,000	800,000	0,000	41,00	32 800,00	0,00	0,00	32 800,00	0,00	0,00%

		Podoba zahrnuje: - dotěru předepsané podkladu - správu, odělení a ochranný podklad - přechyzení k podkladu, případně zvláštní - správu spojů a zajištění okrajů - správu pro odvětrání - nutné přesahy - vodorovné vrstvy a vodorovné vrstvy						926,23	0,00	0,00	926,23	0,00	0,00%
16	45127	4. Vodorovné konstrukce PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO Lůžka ze SP-V, Ø 0,5 - 0,1 m, hustění 95 % PS 113,17*74,5=8,430,313 (4%) podoba zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, vodorovné vrstvy a vodorovné vrstvy dopravy a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o rekultivovaný materiál	M3	1,478	1,478	0,000	626,30	926,23	0,00	0,00	926,23	0,00	0,00%
17	961431	8. Komunikace KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TR. 1 TL DO 150MM Ø 0,52 Ø 0,13 l. 0,15 m 278,2=12,400 (4%) - dodání směsi v požadované kvalitě - odělení podkladu - uložení směsi do předepsaného technologického předpisu a zvláštní vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rušení síly, pokládání vrstvy po etapách, včetně provozních spár a spojů - oprava napojení, ukončení - oprava dilatačních spár včetně předepsané výztuže - rozestavení postřiky, nátěry - rozestavení směsi směsí směsí ZBV 2 540,719M2 Celkem 12,400+12,400=24,800	M2	12,400	962,118	968,118	234,00	2 901,60	0,00	2 421 277,61	4 997 799,86	2 621 277,61	110,38%
18	96830	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE STĚRKODRŮ Vrstva Ø 0,52 Ge. tl. 0,3 m 0,3*1,878*2=790 (4%) - dodání kameniva předepsané kvality a zvláštní - rozestavení a zvláštní vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rušení síly, pokládání vrstvy po etapách - rozestavení postřiky, nátěry ZBV 2 184,307M2 Celkem 2,790+184,307=187,187	M3	2,790	187,157	184,307	485,00	1 503,15	0,00	89 418,00	90 771,15	89 418,00	9868,14%
19	96830	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE STĚRKODRŮ Vrstva Ø 0,52 Ge. tl. 0,3 m zvláštní vrstvy předepsané po odělení TDI 0,30*2,0*3=120,000 (4%) - dodání kameniva předepsané kvality a zvláštní - rozestavení a zvláštní vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rušení síly, pokládání vrstvy po etapách - rozestavení postřiky, nátěry ZBV 2 120,000M2 Celkem 2,790+120,000=122,790	M3	120,000	120,000	0,000	386,30	34 320,00	0,00	0,00	34 320,00	0,00	0,00%
20	96830	ZPEVNĚNÉ KRAJNICE Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM Zpevnění krajnic z R. 0,15 - at. směs Ø 0,22, hustění 0,1357*1112,8=153,735 (4%) - dodání recyklovatelného materiálu v požadované kvalitě - odělení podkladu - uložení směsi do předepsaného technologického předpisu, zvláštní vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rušení síly, pokládání vrstvy po etapách, včetně provozních spár a spojů - oprava napojení, ukončení - rozestavení postřiky, nátěry ZBV 2 153,735M2 Celkem 1112,735+153,735=1266,470	M2	1 112,735	2 358,735	1 245,000	60,00	89 824,10	0,00	74 700,00	161 524,10	74 700,00	111,79%
21	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 Infiltrační postřik PI-C 0,5 kg/m2 3904*5 954,000 (4%) - dodání všech předepsaných materiálů pro postřik v předepsaném množství - provedení do předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rušení síly, pokládání vrstvy po etapách - oprava napojení, ukončení ZBV 2 7944,000M2 Celkem 3904,000+7944,000=11848,000	M2	5 964,000	13 808,000	7 944,000	15,00	89 490,00	0,00	117 660,00	207 150,00	117 660,00	131,52%
22	572113	OPLOVNACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 Oplovnací postřik PS-C 0,35 kg/m2 3904*5 840,000 (4%) - dodání všech předepsaných materiálů pro postřik v předepsaném množství - provedení do předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rušení síly, pokládání vrstvy po etapách - oprava napojení, ukončení ZBV 2 7944,000M2 Celkem 3904,000+7944,000=11848,000	M2	5 880,000	13 734,000	7 944,000	8,00	47 120,00	0,00	62 752,00	109 872,00	62 752,00	133,17%

		ZSM 3 7944,000M2 Celkem 5890,000+7944,000+12734,000M2												
23	57473	VÝSTUŽNÍ VÝZTUŽNÍ VÝSTUŽNÍ ŽELEZOBETONOVÝ výztužná ocelová síť dvojitá dvojitá šedivá s okem 6x10, drát 2,4 mm, příchyt drát 4,4 mm, odměry v tahu 300-350 N/mm2 5890+5 844,000 [A] - dodání síti v požadované kvalitě a s množství včetně přesahu (přesahy započítány v jednotkové ceně) - očištění podkladu - pokládka sítě dle předepsaného technologického předpisu	M2	5 964,000	5 964,000	0,000	77,00	488 228,00	0,00	0,00	488 228,00	0,00	0,00%	
24	57484	ASFALTOVÝ BETON PRO OBKLADNÉ VÝSTUŽNÍ ACC 11+ 11S TL 40MM ACC 11+ 10/10 S 40 mm 5800+90+5 890,000 [A] - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - ukládání směsi dle předepsaného technologického předpisu, ztuhlání vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozdělení sítky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spár a spojů - opravy napájení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - rozložení proužků, nálety - nastavení tloušťky podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. ZSM 3 7637,000M2 Celkem 5800,000+7637,000+1027,000M2	M2	5 890,000	10 827,000	7 837,000	136,00	801 940,90	0,00	1 038 632,90	1 839 572,90	1 038 632,90	128,98%	
25	57484	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VÝSTUŽNÍ ACP 18+ 18S TL 30MM ACP 18+ 10/10 S 30 mm 5964+5 964,000 [A] - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - ukládání směsi dle předepsaného technologického předpisu, ztuhlání vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozdělení sítky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spár a spojů - opravy napájení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - rozložení proužků, nálety - nastavení tloušťky podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. ZSM 3 7718,000M2 Celkem 5964,000+7718,000+1083,000M2	M2	5 964,000	10 893,000	7 718,000	143,00	852 802,00	0,00	1 103 817,00	1 986 669,00	1 103 817,00	128,43%	
26	57767	VÝPRAVA ASFALTOVOU ZÁLIVKOU Oprava asfaltovou zálivkou N2 za horka 100+7,4+12,6+2*18+0,7+13,1+14+30+27+12+287,800 [A] - vyhrdování drátů sítky do 30mm tloušťky do 40mm - vyhládky - nálet - vjezd předepsanou zálivkovou tloušťkou ZSM 3 12,300M Celkem 367,800+12,300+380,100M	M	367,800	380,100	12,300	80,00	21 424,00	0,00	984,00	22 408,00	984,00	4,39%	
	8	Potrubi	M					87 901,90	0,00	0,00	87 901,90	0,00	0,00%	
27	57444	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPAVNÍCH DN DO 250MM Dvoudílná trubka DN 250, HDPE-SN 12 klasická 15,9+15,900 [A] - položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na stranu odměry: - vyřízení dokumentace (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trubky, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, zvláštěných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a očištění podkladu a podpěr - očištění plně funkčního potrubí, kompletní studie, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spár a spojů, pracovních záložních konců a pod. - oprava průchodů, průchodů šachetami a komerční, okraj podpěr a vyhládky, zajištění, napojení, vyvedení a upevnění odpadů, vjezd - ochrana potrubí náletem (až opravy proužků, případně izolací, resp. v této práci prováděním jiné položky) - oprava, očištění a očištění prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapáleném i nezapáleném a i v kuzelových, tržních - položky zahrnují i práce spojené s nutnými dotazy, přiblížením a bezpečnostní vody - provádění okružní upevňovací a těsnící vyhládky ZSM 3 15,900M Celkem 367,800+15,900+383,700M	M	15,900	15,900	0,000	850,00	10 075,00	0,00	0,00	10 075,00	0,00	0,00%	
28	57633	POTRUBÍ DŘEVNÍ Z TRUB PLAST DN DO 150MM Dvoudílná trubka DN 150, HDPE-SN4 perforovaná 332+29+352,000 [A]	M	352,000	352,000	0,000	96,00	33 792,00	0,00	0,00	33 792,00	0,00	0,00%	

[illegible]

Froněk, spol. s r.o.
Zátiší 2488, CZ 269 01 Rakovník
tel. +420 313 517 276
fax +420 313 516 361
www.fronek.cz, info@fronek.cz

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, p.o.
Karel Motál
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5 Smíchov

Vyřizuje: Bc. Jiří Karel

datum: 9.8.2021

Stavba: III/2371 Lužná – rekonstrukce silnice
S-3027/00066001/2020
Věc: Oznámení o vzniku variace

Vážený pane Motale,
Dovoluji si Vás oslovit z důvodu vzniku variace na výše zmíněné stavbě.

Popis variace: Při pochůzce stavby během kontrolního dne 9.8.2021, byl zjištěn nevyhovující stav současného povrchu komunikace III/2371 od KÚ 2,561 po křížení s komunikací III/229 15 ve výměře cca 7 720m², která plynule navazuje na prováděnou stavební akci III/2371 Lužná. Při úkonech KD byla navržena oprava tohoto úseku v podobě odfrézování stávajícího živичného krytu vozovky a následná pokládka obrusné vrstvy finišerem na celou šířku komunikace za plné uzavírky opravovaného úseku.

Žádám o schválení této změny a pokynu k provedení variace.

S pozdravem

Jiří Karel
stavbyvedoucí

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková
organizace**
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

Froněk, spol. s r.o.
Zátiší 2488
269 01 Rakovník

Váš dopis značíte dne

Naše značka

Vyřizuje/telefon
Š. Balážová

Kladno
10.8.2021

III/2371 Lužná - vyjádření k nepředvídatelným změnám

Na základě oznámení zhotovitele stavby „**III/2371 Lužná**“ ze dne 9.8.2021 se jedná o následující nepředvídatelnou změnu:

- zjištěn nevyhovující stav současného povrchu krajské komunikace III/2371 od km 2,561 po křižovatku s III/22915 o výměře cca 7 720m², tento úsek navazuje na prováděnou stavební akci, a byla navržena oprava v podobě odfrézování stávajícího živého krytu vozovky a následná pokládka obrusné vrstvy finišerem v celé šíři komunikace za plné uzavírky (k nepředvídatelné změně stavu povrchu komunikace došlo během zimního období 2020/2021 vlivem klimatických podmínek)

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace (dále jen KSÚS SK), jako správce a zároveň zástupce Středočeského kraje jako vlastníka silnic II. a III. tříd, tj. dotčené krajské komunikace III/2371, a jako zadavatele výše zmíněné stavby tímto vydává pokyn k realizaci dle zhotovitelem předloženého navrženého řešení a zároveň žádá zhotovitele o zpracování ZBV k těmto změnám stavby, a to v souladu se zákonem o zadávání VŘ a příslušnou směrnicí KSÚS SK.

Přílohy: Oznámení zhotovitele o nepředvídatelných změnách ze dne 9.8.2021

S pozdravem

Karel Motal
vedoucí TSÚ - oblast Kladno
Krajská správa a údržba silnic



TECHNICKÁ ZPRÁVA

Název akce/zakázky : **III/2371 Lužná**
Rekonstrukce silnice
Číslo zakázky : 380/2020
Katastrální území : Lužná u Rakovníka, Rakovník
Obec : Lužná, Rakovník
Kraj : Ústecký
Souřadnicový systém : **S - JTSK**
Výškový systém : **Bpv**
Datum provedení měření : 14.7., 17.8., 2.9., 20.9., 24.9. 2021
Zaměřil : MESS GEO s.r.o.
Objednatel geodet.dokumentace : **FRONĚK, spol. s r.o.**

POLNÍ PRÁCE

Na základě objednávky bylo provedeno zaměření skutečného provedení komunikace a rekonstrukce ulic Čsl. armády, Masarykovo Nám. a Tyršova v Lužné u Rakovníka. Polohové a výškové měření bylo provedeno metodou GPS RTK. Měření odpovídá 3.třídě přesnosti.

KANCELÁŘSKÉ PRÁCE

Výpočty byly zpracovány programovým systémem Geus 23.0, grafické výstupy byly zpracovány programovým systémem Bentley Map PowerView V8i (SELECTseries 4), určeným ke zpracování naměřených dat, souřadnicovým výpočtům a grafickým výstupům v zeměměřičské praxi.

Inženýrské síťe byly zakresleny dle ukázky stavbyvedoucího.

Jako podklad pro grafické zpracování byla použita digitální katastrální mapa.

Veškeré polní a kancelářské práce byly provedeny podle norem platných pro zeměměřičské práce ve výstavbě a přesností a způsobem provedení těmito předpisy odpovídají. Měřičské zápisníky, náčrty a protokoly o výpočtech jsou uloženy v dokumentaci firmy, která měření provedla.

Zakázka je vyhotovena dle platných norem ČSN 01 3410, ČSN 73 0415 a ČSN ISO 4463.

POUŽITÉ MĚŘICKÉ POMŮCKY:

- GPS Trimble R2
- TS Trimble S6

SEZNAM PŘÍLOH:

1. Technická zpráva
2. Seznam souřadnic zaměřených bodů.
3. Výkres zaměření skutečného provedení.
4. CD s výstupními formáty txt, dgn, dwg, dxf a pdf.

V Mostě 4.10.2021

Ověřil dne: 4.10. 2021

Číslo ověření: 124/2021/01

Dílo náležitostmi a přesností odpovídá právním předpisům a podmínkám dohodnutým s objednatelem

Kristýna Gregorová

Ověřil:
Ing. Vokřálková Petra



asfalt I.č. : 5 901 m² (lak, křižovatka - začátek vesnice)
asfalt II.č. : 10 887 m² (průjezd vesnicí)
asfalt III.č. : 7 637 m² (konec vesnice - říznutí)

ZAMĚŘIL:	VYHOTOVIL:	OVĚŘIL:
Gregorová Kristýna	Gregorová Kristýna	Ing. Vokřálková Petra
Adolf Sigmund		
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:	OBEC:	KRAJ:
Lužná, Rakovník	Lužná, Rakovník	Středočeský
OBJEDNÁVATEL:	PROJEKT, spol. s r.o.	
AKCE/ZAKÁZKA:	III/2371 Lužná	
	Rekonstrukce silnice	
PROJEKT:		
OBSAH:	zaměření skutečného provedení	

MESS GEO s.r.o.
gsm: 777014069 tel.: 476108945 e-mail: messgeo@volny.cz fax: 479108920
ČÍSLO ZAKÁZKY: 380/2020
SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv
DATUM MĚŘENÍ: 24.9.2021
MĚŘÍTKO: 1:500 FORMÁT VÝKRESU: A1 PÁŘE: 1



REKONSTRUKCE KOMUNIKACE LUŽNÁ III/2371 LUŽNÁ

STANOVISKO K ZBV č. 2

Provedení obrusných vrstev na navazujícím úseku silnice III/2371 - od konce obce Lužná až po křižovatku na obec Lišany

V rámci zakázky „III/2371 Lužná“ byla dle PDPS plánovaná oprava silnic v ulicích Čsl. armády, Masarykovo nám. a Tyršova pouze na území obce Lužná. Objednatel byl rozhodnut o opravě silnice III/2371 v úseku od konce obce Lužná až po křižovatku na obec Lišany o předpokládané výměře 7 720 m².

Provedení těchto víceprací představuje změny v rozšíření objemů frézování a zhotovení nových asfaltových vrstev.

S navrženými změnami a zpracováním ZBV souhlasím.

31.2.2021

Petr Stoklasa

TDI

NAŠE ZNAČKA:

PH I-Kon-0106-2021
Ing. Vladimír Koniček

VYŘIZUJE:

DATUM:

23. 09. 2021

**Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, p.o.
Karel Motal
Zborovská 11
150 21 Praha 5**

Akce: III/2371 Lužná, rekonstrukce silnice

Věc: Stanovisko AD k ZBV č. 2 až ZBV č. 6

AD byl požádán o stanovisko k ZBV č. 2 SO 101.1/1, č. 3 SO 101.1/2, č. 4 SO 101.2/1, č. 5 SO 301/1 a č. 6 SO 190/1. Pro vyjádření AD je podkladem předložený koncept ZBV.

AD prověřil návrh změn ZBV č. 2 až č. 6 a vydává následující stanovisko k předloženým dokladům:

ZBV č. 2 SO 101.1/1

ad 1: AD souhlasí se změnou. Změna vychází z:

- Oznámení zhotovitele z 9.8.2021
- Pokyn objednatele z 10.8.2021
- Stanovisko TDI z 21.8.2021

ad 2: AD bere změnu na vědomí. Změna vznikla na základě zjištění nepředvídatelné skutečnosti – zhoršeného stavu vozovky.

ad 3: AD souhlasí s navrženým řešením.

1. Dle AD je navrhované řešení technicky přijatelné, neboť nepředstavuje podstatnou technickou změnu díla. K ceně ZBV se AD nevyjadřuje.
2. Ověření objemů provedených prací (tj. výměry či objemy provedených změn na stavbě) a dohled nad jejich kvalitou, je odpovědností TDI.

ZBV č. 3 SO 101.1/2

ad 1: AD souhlasí se změnou. Změna vychází z:

- Zápis z KD z 31.8.2021
- Oznámení zhotovitele z 2.9.2021
- Pokyn objednatele z 3.9.2021
- Stanovisko TDI z 21.8.2021

ad 2: AD bere změnu na vědomí. Změna vznikla na základě zjištění nepředvídatelné skutečnosti – zastížení podkladních vrstev vozovky v takovém stavu, který umožňuje jejich ponechání bez navržených sanací.

ad 3: AD souhlasí s navrženým řešením.

1. Dle AD je navrhované řešení technicky přijatelné, neboť nepředstavuje podstatnou technickou změnu díla. K ceně ZBV se AD nevyjadřuje.
2. Ověření objemů provedených prací (tj. výměry či objemy provedených změn na stavbě) a dohled nad jejich kvalitou, je odpovědností TDI.

ZBV č. 4 SO 101.2/1

ad 1: AD souhlasí se změnou. Změna vychází z:

- Zápis z KD z 31.8.2021
- Oznámení zhotovitele z 2.9.2021
- Pokyn objednatele z 3.9.2021
- Stanovisko TDI z 21.8.2021

ad 2: AD bere změnu na vědomí. Změna vznikla na základě zjištění nepředvídatelné skutečnosti – zjištění, že stávající propustek je po vyčištění plně funkční a není třeba realizovat propustek nový.

ad 3: AD souhlasí s navrženým řešením.

3. Dle AD je navrhované řešení technicky přijatelné, neboť nepředstavuje podstatnou technickou změnu díla. K ceně ZBV se AD nevyjadřuje.
4. Ověření objemů provedených prací (tj. výměry či objemy provedených změn na stavbě) a dohled nad jejich kvalitou, je odpovědností TDI.

ZBV č. 5 SO 301/1

ad 1: AD souhlasí se změnou. Změna vychází z:

- Zápis z KD z 31.8.2021
- Oznámení zhotovitele z 2.9.2021
- Pokyn objednatele z 3.9.2021
- Stanovisko TDI z 21.8.2021

ad 2: AD bere změnu na vědomí. Změna vznikla na základě zjištění nepředvídatelné skutečnosti – možnost nahrazení navržené HV stávající plastovou šachtou.

ad 3: AD souhlasí s navrženým řešením.

5. Dle AD je navrhované řešení technicky přijatelné, neboť nepředstavuje podstatnou technickou změnu díla. K ceně ZBV se AD nevyjadřuje.
6. Ověření objemů provedených prací (tj. výměry či objemy provedených změn na stavbě) a dohled nad jejich kvalitou, je odpovědností TDI.

ZBV č. 6 SO 190/1

ad 1: AD souhlasí se změnou. Změna vychází z:

- Oznámení zhotovitele z 9.8.2021
- Pokyn objednatele z 10.8.2021
- Stanovisko TDI

ad 2: AD bere změnu na vědomí. Změna vznikla na základě řešení nepředvídatelné skutečnosti v rámci ZBV č.2 – změna rozsahu opravy vozovky si vyžádala změnu rozsahu DIO

ad 3: AD souhlasí s navrženým řešením.

7. Dle AD je navrhované řešení technicky přijatelné, neboť nepředstavuje podstatnou technickou změnu díla. K ceně ZBV se AD nevyjadřuje.

Ověření objemů provedených prací (tj. výměry či objemy provedených změn na stavbě) a dohled nad jejich kvalitou, je odpovědností TDI.

Další připomínky k ZBV AD neuplatňuje.

S pozdravem

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

III/2371 Lužná - S-3027/00066001/2020

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

101.1 Údržba sil. III/2371, ZÚ-km 0,912

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

101.1 Údržba sil. III/2371, ZÚ-km 0,912

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

101.1/2

Číslo ZBV:

3

Objednatel:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

IČ 00066001

Zhotovitel:

Froněk, spol.s r.o.

Zátiší 2488, 269 01 Rakovník

IČ 47534690

Rekapitulace ZBV č. 3 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3.3	-177 933,50	0,00	-177 933,50

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3.4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3	-177 933,50	0,00	-177 933,50

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré:

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: III/2371 Lužná - S-3027/00066001/2020 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 101.1 Údržba sil. III/2371, ZÚ-km 0,812	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 101.1/2	Číslo ZBV: 3.3																															
Strany smlouvy o dílo objednatel č.: S-3027/00066001/2020 a zhotovitel č.: 120081 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 23.10.2020 (dále jen Smlouva): Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov Zhotovitel: Froněk, spol. s r.o., Zátalš 2488, 269 01 Rakovník																																	
Přílohy Změnového listu: <table border="0"> <tr> <td>1. Krycí list</td> <td>1</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>2. Změnový list</td> <td>2</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací</td> <td>1</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>4. Rozpis ocenění Změn položek ZBV 2</td> <td>1</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>5. Přehled zařazení změn do skupin</td> <td>1</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>6. Přehled dalších dokladů</td> <td>1</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>Další doklady dle přehledu dokladů</td> <td>23</td> <td>počet listů</td> </tr> </table>	1. Krycí list	1	počet listů	2. Změnový list	2	počet listů	3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů	4. Rozpis ocenění Změn položek ZBV 2	1	počet listů	5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů	6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů	Další doklady dle přehledu dokladů	23	počet listů	<table border="0"> <tr> <th>Paré č.</th> <th>Příjemce</th> </tr> <tr> <td>1, 2</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Projektant (AD)</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Stavební dozor</td> </tr> </table>		Paré č.	Příjemce	1, 2	Objednatel	3	Zhotovitel	4	Projektant (AD)	5	Stavební dozor
1. Krycí list	1	počet listů																															
2. Změnový list	2	počet listů																															
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů																															
4. Rozpis ocenění Změn položek ZBV 2	1	počet listů																															
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů																															
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů																															
Další doklady dle přehledu dokladů	23	počet listů																															
Paré č.	Příjemce																																
1, 2	Objednatel																																
3	Zhotovitel																																
4	Projektant (AD)																																
5	Stavební dozor																																
Iniciátor změny: Zhotovitel Popis a zdůvodnění Změny:																																	
Měněpráce s ohledem na skutečně zastižené podmínky v průběhu provádění prací Díleč změna č.1: Měněpráce na sanacích podloží. 1) V rámci zakázky s názvem „III/2371 Lužná“ byla dle PDPS plánovaná oprava silnic na území obce Lužná v ulicích Čsl. armády, Masarykovo nám. a Tyršova. Dle předběžných průzkumů pro zpracování PDPS bylo předpokládáno určité množství prací nezbytných pro sanaci podloží na úsecích silnice, v místech, kde sondáž průzkumu vykazovala nevhodný stav podloží. 2) V průběhu provádění stavby, po odkrytí obrusných a ložných vrstev vozovky, bylo na více místech zastiženo soudržné podloží, resp. vhodné konstrukční vrstvy původní vozovky ze štetové dlažby. V dotčených místech byly provedeny statické zatěžovací zkoušky, které prokázaly vyhovující stav podkladu. S ohledem na tyto skutečnosti, v místech, kde byly v PDPS původně předpokládány sanace podloží, nebylo nutné tyto sanace provádět. 3) Vzhledem k uvedeným skutečnostem bylo v dotčených místech navrženo ponechání stávající konstrukce vozovky, na které nebylo nutné provádět navržené sanace, což prokázaly statické zatěžovací zkoušky. Na základě těchto skutečností lze konstatovat, že změny, týkající se snížení rozsahu prací na sanaci podloží, bylo možné odhalit až během samotné realizace Díla, na základě skutečně zastižených podmínek po odkrytí vozovkového souvrství. Sondáž provedená v rámci předběžných průzkumů pro potřeby návrhu PDPS totiž neposkytuje zcela detailní obraz o podpovrchových podmínkách dané lokality. Lze tedy konstatovat, že se jedná o okolnosti, které zadavatel (ani projektant Zadávací dokumentace) jednající s náležitou péčí nemohli rozumně předvídat. 4) Změny byly iniciovány Zhotovitelem a podkladem pro tyto změny jsou doklady č. 09 – Oznámení Zhotovitele ze dne 20.06.2021 a č. 10 – Vyjádření Objednatele ze dne 24.06.2021. 5) Tato změna se týká úpravy množství položek poř. č. 4, 15, 17 a 19.																																	

Díleč změna č.2: Měněpráce týkající se nerealizace propustku.

1) V návrhu zakázky bylo předpokládáno provedení propustku převádějícího vodu pod silnici III/2371. Tento návrh byl zakreslen ve výkresové části dokumentace a ve výkazu výměr PDPS byly obsaženy položky pro provedení plánovaného propustku.

2) V průběhu provádění stavby však bylo odhaleno těleso stávajícího propustku, téměř v trase uvažované v PDPS. Tento stávající propustek byl pročištěn a bylo konstatováno, že je v provozuschopném stavu. Proplachem byla ověřena jeho kapacita a funkčnost.

3) Vzhledem k uvedenému bylo konstatováno, že nebude realizován nový propustek, resp. nebudou čerpány položky pro jeho provedení. Zhotovitel tudíž navrhl neprovádění nového propustku, který byl projektován v PDPS, neboť se jeho provedení jeví jako nadbytečné. Tento návrh byl odsouhlasen TDI. Na základě uvedených skutečností lze konstatovat, že změny, týkající se neprovedení původně navrženého propustku, bylo možné odhalit až během samotné realizace Díla, na základě skutečně zastižených podmínek v místě provádění prací. K tomuto tvrzení je dlužno dodat, že existenci stávajícího propustku bylo obtížné odhalit v průběhu návrhu PDPS, neboť okolí propustku bylo zcela neprostupné a zarostlé vegetací. Dále s ohledem na neexistující archivní dokumentaci k předmětné komunikaci lze konstatovat, že se jedná o okolnosti, které zadavatel (ani projektant Zadávací dokumentace) jednající s náležitou péčí nemohl rozumně předvídat.

4) Změny byly iniciovány Zhotovitelem a podkladem pro předmětné změny je doklad č. 11 – Zápis z KO stavby č. 16 ze dne 31. 8. 2021.

5) Tato změna se týká odpočtu množství položek poř. č. 27, 30 a 31.

V rámci uvedených změn změn nedochází k jejich fetězení, neboť tyto změny nevyvolávají potřebu jiných změn.

Uvedené změny vznikly na základě nepředvídaného zjištěného skutečného stavu stávajících konstrukcí po zahájení stavby. Byly nevyhnutelné a technicky i ekonomicky neoddelitelné od realizované stavby. Jednalo se o Změny nepodstatné, nepředvídané, které jsou tak podle § 5 odst. 1, c), resp. podle § 10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29. 05. 2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazený do Skupiny 3. Zároveň se jednalo o práce, které neměnily celkovou povahu veřejné zakázky.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tyto Změny nepředstavují vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jednalo o změny nepředvídané.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-177 933,50	0,00	-177 933,50	177 933,50

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí):	jméno	Bc. Jiří Karel	datum	15.4.2021	podpis
Projektant (autorský dozor):	jméno	Ing. Vladimír Koniček	datum	15.12.	podpis
Stavební dozor:	jméno	Petr Štoklase	datum		podpis
Zástupce Objednatel: KSÚS SK, p.o.	jméno	Karel Motál	datum	15.12.2021	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SÚIPS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitel sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel):	jméno	Ing. Jan Lichneger	datum	17-12-2021	podpis
Zhotovitel	jméno	Ing. Kamel Hrbek	datum	15.12.2021	podpis
					Číslo paré:

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 3**

Název a evidenční číslo Stavby: III/2371 Lužná - S-3027/00066001/2020
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 101.1/2
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 101.1 Údržba sil. III/2371, ZÚ-km 0,912

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
3 216 806,01

Poznámka:

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	3 154 769,61	6 371 575,62	3 154 769,61

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-177 933,50	0,00	3 154 769,61	98,07%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-177 933,50	6 193 642,12	2 976 836,11	92,54%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

souhlasím

Bc. Jiří Karel

Projektant (autorský dozor):

souhlasím

Ing. Vladimír Koníček

Stavební dozor:

souhlasím

Petr Stoklasa

Zástupce Objednatele KSÚS:

souhlasím

Karel Motal

 Zaměstnanec KSÚS
 odpovědný za cenové
 projednání Změny:

souhlasím

Ing. Jaroslava Jurkové

 P
S
F
Z
K

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 3

Název a evidenční číslo stavby: III/2371 Lužná - S-3027/00066001/2020 Číslo a název SO/PS: 101.1 Údržba sil. III/2371, ZÚ-km 0,912 Číslo a název podobjektu/rozpočtu: 101.1 Údržba sil. III/2371, ZÚ-km 0,912								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) 101.1/2 Skupina změn 3					
Pol. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	11372	FŘEZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	465,800	209,000	-256,800	295,00	123 437,00	-68 052,00	0,00	55 385,00	-68 052,00	-55,13%
15	289971	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE	M2	800,000	0,000	-800,000	41,00	32 800,00	-32 800,00	0,00	0,00	-32 800,00	-100,00%
17	561431	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TR. I TL. DO 150MM	M2	12,400	0,000	-12,400	234,00	2 901,60	-2 901,60	0,00	0,00	-2 901,60	-100,00%
19	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	120,000	0,000	-120,000	286,00	34 320,00	-34 320,00	0,00	0,00	-34 320,00	-100,00%
27	87444	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPAVNÍCH DN DO 250MM	M	15,500	0,000	-15,500	650,00	10 075,00	-10 075,00	0,00	0,00	-10 075,00	-100,00%
30	89721R	Úprava stávající horské vpusť, zákrytová deska s mříží	KPL	1,000	0,000	-1,000	25 000,00	25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	-25 000,00	-100,00%
31	89952A	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C20/25	M3	1,622	0,000	-1,622	2 950,00	4 784,90	-4 784,90	0,00	0,00	-4 784,90	-100,00%
Celkem								233 318,50	-177 933,50	0,00	55 385,00	-177 933,50	

Odpovědný zástupce Objednatelů i odpovědný zástupce Zhotovitelů odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
 Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Bc. Jiří Karel, stavbyvedoucí

Datum:

Podpis:

Za Objednatelů: Karel Mohr, vedoucí oddělení KSÚS Kladno

Datum:

Podpis:

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	3
Název a evidenční číslo stavby:	III/2371 Lužná - S-3027/00066001/2020
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	101.1 Údržba sil. III/2371, ZÚ-km 0,912
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	101.1/2

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
07 Změnový soupis prací SO 101.1 po změně 2	9	
08 Protokoly statických zatěžovacích zkoušek	4	
09 Oznámení Zhotovitele o změně ze dne 20.06.2021	1	
10 Vyjádření Objednatele ke změně ze dne 24.06.2021	1	
11 Zápis z KD stavby č. 16 ze dne 31.8.2021	3	
12 Oznámení zhotovitele ze dne 2.9.2021	1	
13 Pokyn objednatele ze dne 3.9.2021	1	
14 Stanovisko TDI k ZBV 3	1	
15 Stanovisko AD k ZBV 2 - 6	2	
Počet listů celkem	23	

Změnový soupis prací SO 101.1 po změně 2 pro ZBV 3

Název a evidenční číslo stavby: 102371 Lúžná - S-3027/00066001/2020
 Číslo a název SO/PS: 101.1 Údržba sil. 102371, ZÚ- km 0,912
 Číslo a název podobjektu/růzpočtu: 101.1 Údržba sil. 102371, ZÚ- km 0,912

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

101.1/1

Průř. č. pol.	Název položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Průř. cen celkem v %
		8 Všeobecné konstrukce a práce											
1	014101	POPLATKY ZA SKLADBU 4,85+4,850 [M] - dle pol. 11343 SKL zahrnuje veškeré poplatky provozovatel skládky související s ukládáním odpadu na skládce ZBV 3 30,00M2 Celkem 4,850+30,00=34,850	M3	4,850	44,330	39,480	123,00	594,90	0,00	39 503,34	57 847,19	26 343,24	83,29%
2	014101	POPLATKY ZA SKLADBU - změna 517,75+517,750 [M] - dle pol. 10373 SKL - položka obsahuje veškeré poplatky provozovatel skládky související s ukládáním odpadu na skládce - v ceně zahrnuje složení, manipulaci při skládání na řívně skládce a zaplacení poplatků skládkovně ZBV 3 376,270M2 Celkem 517,750+376,270=894,020	M3	517,750	896,020	378,270	60,00	31 065,00	0,00	22 216,20	53 281,20	22 216,20	71,52%
3	11343	ODSTRANĚNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM VOZEM VČET POKLADU odstr. a uložení na skládce Vybavení konstrukce vozny 2*6,2*0,16+1,5*6,2*0,3=4,850 [M] Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybavením sudi a s vybavenými hmotami vli. uložení na skládce. Nezahrnuje poplatky za skládce, který se vyžaduje v položce 01411** (s. výjimkou malého množství bouracího materiálu, kdy je možné poplatky zahrnout do jednotlivé ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) ZBV 3 30,00M2 Celkem 4,850+30,00=34,850	M3	4,850	44,330	39,480	363,00	1 332,21	0,00	10 516,20	11 747,41	10 516,20	90,53%
4	11373	PREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH vklap. chotavském Prizemní v š. 0,08 m 580*0,08=46,400 [M] Prizemní v š. 0,02 m 80*0,02=1,600 [M] Celkem 4+8=46,400 [M] Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybavením sudi a s vybavenými hmotami vli. uložení na skládce. Nezahrnuje poplatky za skládce, který se vyžaduje v položce 01411** (s. výjimkou malého množství bouracího materiálu, kdy je možné poplatky zahrnout do jednotlivé ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) ZBV 3 611,000M2 Celkem 46,400+611,00=657,400 ZBV 3 -256,800M2 Celkem 46,400+611,00-256,80=820,600 M2	M3	465,800	826,000	360,200	363,00	123 437,00	-68 052,00	161 915,00	217 300,00	93 065,00	79,64%
5	12373	ODKOP PRO ŠPOT STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I odvoz na depozit 12*12,000 [M] - dle pol. 17110	M3	12,000	12,000	0,000	172,00	2 064,00	0,00	0,00	2 064,00	0,00	9,86%

počítka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, překlázení, manipulace s výkopky
- kompletní provedení výkopky nazažehně a zapažene
- střešení výkopků po celou dobu práce v něm vč. klimatizace opatření
- střešení výkopků v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasné zaplavení
- střešení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepení
- střežení po vstřelích, pádech a po jiných nutných činnostech (řezání)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- požetné střežení tláčky podzemní vody
- střežení a nupozování jednotlivých těles
- vytahování a nošení výkopky
- svahování a přesah. svahů do konečné hran, výměna hornin v podlaží a v pláni
- zjednodušené klimatizace výlety
- nošení výkopky, odstraňování kořenů a nupozování
- pažení, vzápění a nupozování vč. přepážování (výhled stěhových stěn)
- úprava, ochrana a oddělení dna, základové spáry, stěn a svahů
- zrušení podlaží, případně i svahů vč. svahování
- střežení stěhů v podlaží a tělov na dvazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná počítka
- střežení výkopků a jeho ochrana proti vodě
- odvězení nebo odvození vody v okolí výkopků a ve výkopku
- střežení výkopky
- velká pomocná konstrukce usnadňující provedení výkopky (přístřeší, střeší, nástroje, tělov, podpory, kančí, přikostření, zpevňovací plochy, základy a pod.)
- nezahrnuje ukládání zemin (na skládku, do návozu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce 2.03.01.01

8

12373 OKOP PRO SPOD STAMBU SALNG A ŽELEZNOG TR. I

sdězu na skládku

200=177,75+120*(2+20)=29,750 (A)

-12=-12,000 (B) pro pol 17110

Časem: A+B=917,750 (C)

počítka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, překlázení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení výkopky nazažehně i zapažene
- střešení výkopků po celou dobu práce v něm vč. klimatizace opatření
- střešení výkopků v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasné zaplavení
- střežení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepení
- střežení po vstřelích, pádech a po jiných nutných činnostech (řezání)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- požetné střežení tláčky podzemní vody
- střežení a nupozování jednotlivých těles
- vytahování a nošení výkopky
- svahování a přesah. svahů do konečné hran, výměna hornin v podlaží a v pláni
- zjednodušené klimatizace výlety
- nošení výkopky, odstraňování kořenů a nupozování
- pažení, vzápění a nupozování vč. přepážování (výhled stěhových stěn)
- úprava, ochrana a oddělení dna, základové spáry, stěn a svahů
- zrušení podlaží, případně i svahů vč. svahování

917,750	701,210	180,320	188,00	67,537,00	0,00	34,901,76	131,838,76	34,901,76	25,48%
---------	---------	---------	--------	-----------	------	-----------	------------	-----------	--------

12,000	12,000	0,000	72,00	884,00	0,00	0,00	884,00	0,00	0,00%
--------	--------	-------	-------	--------	------	------	--------	------	-------

		početka zahrnuje: - vodotěrnost a vnitřní doprava, přemístění, překlázení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopky napájení a zapojení - oděření výkopků po celou dobu práce v něm vč. klimatizace spáření - zřízení výkopků v blízkosti pevnostního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zapojení - zřízení pod vodou, v okolí výkopků, ve stávajících prostorech a pod - přívodní za teploty - těžení po vrstvách, plovoucích a po jiných různých částech (figurách) - (včetně vody vč. čerpadla jímek, potrubí a pohotovostní čerpadla soupravy vč. ustanovení k pol. 1111.2) - potěpě oděření hladiny podzemní vody - těžení a rozpojení jednotlivých částí - vyřazení a nošení výkopku - ruční výkopky, odstranění kulturní a napájení - palení, vzepření a rozepření vč. přepažení (výma šitových stěn) - úpravy, ochrana a oděření dna, ukládání spár, stěn a tvrdě - oděření výkopků a jeho ochrana proti vodě - oděření nebo oděření vody v okolí výkopků a ve výkopě - těžení výkopku - větší pomocné konstrukce umožňující provedení výkopky (přívody, spáry, náklady, těžení, podpora, tunel, přemístění, zpevnění spár, zábrty a pod.)		
8	129888	ODĚŘENÍ STÁVAJÍCÍCH PROPUSTKŮ celkové oděření a likvidace vzniklého odpadu 2*2040 000 (M) Společnost poskytl je vodotěrnost a vnitřní doprava, přemístění, překlázení, manipulace s materiálem a uložení na skládce. Realizace potrubí ze skla, který se vykopává v potrubí 5141** je výjimek matně (málo) materiálu, kde je nutné použít potrubí do (jednotlivé) tuny potrubí – tedy takový hotový výrobek a (převážně) (tun) k (převážně) 2040 2 15 000M Celkem 20.2040 15.000M 15.000M	M	
9	17118	ULOŽENÍ SYSTÉMU DO KLASIFIKACE SE ZHUTNĚNÍM základ vyplněným materiálem, hutnění na 95 % P₀ početka zahrnuje: - kompletní provedení zřízení konstrukce vč. vnitřní vzhledu materiálu - úprava ukládání materiálu vhlazení, tlakování, promíchání nebo vyzrání, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mechanických vlastností - hutnění i různé formy hutnění - oděření ukázků po celou dobu práce v něm vč. klimatizace spáření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zapojení - zřízení provedení vč. hutnění ve zvláštních podmínkách a stávajících prostorech - zřízení ukládání systému pod vodou - ukládání po vrstvách a po jiných různých částech (figurách) vč. dopravy - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zřízení konstrukce znehodnocené klimatizací vč. výv - ruční hutnění a vyplnění jam a promíchání v potrubí - úpravy, oděření, ochrana a zpevnění podlaží - ochrana, hutnění a utěnění povrchů stěn - zřízení latic na zpevnění - oděření ukázků a jeho ochrana proti vodě - oděření nebo oděření vody v okolí ukázků a v ukázkách	MO	

80.000	75.000	15.000	200.00	13.200.00	0.00	9.300.00	10.500.00	3.300.00	25.00%
--------	--------	--------	--------	-----------	------	----------	-----------	----------	--------

12.000	12.000	0.000	64.00	768.00	0.00	0.00	768.00	0.00	0.00%
--------	--------	-------	-------	--------	------	------	--------	------	-------

12.000	12.000	0.000	90.00	900.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00%
--------	--------	-------	-------	--------	------	------	--------	------	-------

		Pracná zahrnuje: - dodávku predpísanej geotextílie - úpravu, odčistenie a ochranu podkladu - priloženie k podkladu, prípadné potlačenie - úpravu spoj a zádržní okraj - úpravy pri odvodnení - hrubé príklady - montážové štítky a vyčistávacími štítkami ZBV 3 - 400,000M2 Celkom 800,000-800,000+0,000						808,23	0,00	0,00	808,23	0,00	0,00%
16	45157	PODKLADNÉ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TEJŠNÉHO Lúže ze SP II, Dtl B, 0,1 m, hrubší 85 % PS 1*0,1*14,5+0,2*0,3*1,14*0,1*1,478 (M) pracná zahrnuje dodávku predpísaného kameniva, montážové štítky a vyčistávacími štítkami doprava a jeho uloženie práci s v požiadavkách dokumentácie vykonáva zrak, jedná sa o zakúpený materiál	M3	1,478	1,478	0,000	525,00	525,23	0,00	0,00	525,23	0,00	0,00%
		6 Kamenikové						2 376 522,85	-07 221,86	2 621 277,01	4 980 578,26	2 894 855,41	198,73%
17	56143	KAMENNOVÉ ZPEVNENÉ KAMENOM TR 1 TL DO 100MM SC 0/32 08/10 II, 0,15 m 1*0,2*12,400 (M) - dodanie smetá v požadovanej kvalite - súčasná podkladu - uloženie smetá do predpísaného technologického predpisu a zhutnení vrstvy v predpísanej tloušťke - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spoj a spojů - úpravu napojení, ukončení - úpravu dilatačních spoj včetně predpísanej výškové - rozčítanie postřiky, nářky - rozčítanie postřiky, nářky ZBV 3 594,71M2 Celkom 12,400+594,71M2+12,400M2 ZBV 3 - 12,400M2 Celkom 12,400-12,400+0,000	M2	12,400	594,718	597,318	234,00	2 901,85	-2 901,86	133 314,01	133 314,01	133 412,41	8494,50%
18	56139	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRŮ Vrstvy ŠD 0/32 Gt. 6, 0,3 m 0,3*1,2*0,2*2,790 (M) - dodání kameniva předepsané kvality a množství - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - rozčítanie postřiky, nářky ZBV 3 184,367M3 Celkom 2,790+184,367+187,427M3	M3	2,790	187,157	184,367	483,00	1 253,13	0,00	89 418,00	90 771,13	89 418,00	9908,14%
19	56138	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRŮ Vrstva ŠD 0/32 Gt. 6, 0,3 m požiadka bude čerpána pri schvaľovaní TDR 250*1*0,3*130,000 (M) - dodání kameniva předepsané kvality a množství - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - rozčítanie postřiky, nářky ZBV 3 - 12,400M3 Celkom 12,400-12,400+0,000	M3	130,000	0,000	120,390	290,00	34 320,30	-34 320,30	0,00	0,00	-34 320,30	-106,00%
20	56963	ZPEVNENÉ KRAJNC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM Zpevnění krajnice v tl. 0,15 - azf, recyklat 0/22, hrubší 0,120*1+1113,8+1 113,736 (M) - dodání recyklatu v požadovanej kvalite - súčasná podkladu - uloženie recyklatu do predpísaného technologického predpisu, zhutnení vrstvy v predpísanej tloušťke - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spoj a spojů - úpravu napojení, ukončení - rozčítanie postřiky, nářky ZBV 3 1343,000M2 Celkom 1113,736+1343,000+1388,736M2	M2	1 113,736	2 388,736	1 245,000	80,00	98 834,10	0,00	14 790,00	141 924,10	14 790,00	111,79%
21	572123	SPPOJNACÍ POKRÝV Z EMALU ZE DO 1 (KJUM2) Emalovací povlak P1-C 0,8 kg/m2 594+0 994,000 (M) - dodání všech předepsaných materiálů pro povlak v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení ZBV 3 7844,000M2 Celkom 594+200+7844,000+1388,736M2	M2	5 994,000	13 888,000	7 844,000	15,00	89 480,00	0,00	117 880,00	207 120,00	117 880,00	131,52%
22	572213	SPPOJNACÍ POKRÝV Z EMALU ZE DO 0,8 (KJUM2) Spojovací povlak PS-C 0,35 kg/m2	M2	5 990,000	13 734,000	7 844,000	0,00	47 120,00	0,00	47 120,00	189 872,00	47 120,00	133,17%

		položky při zhotovení potrubí platí bez ohledu na šířku zahrnuje: - výrobu dokumentaci (účelová technologická předpisy) - dodání veškerého tvářiva a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěry, zdvižných a upevňovacích prvků, včetně potřebných oprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - očištění celé funkční potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spár a spojů, pracovních zastávek kolen a pod. - úprava průtoků, průchodů, šachetami a komerami, okoli podpěr a vyústění, zastávek, napojení, vyvedení a upevnění odpad, výustí - ochrana potrubí náhledem (vř. opravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předem jasně položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapuštěném i nezapuštěném a i v kotevních, chráněných - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, přiváděním a vypáčením vody rozpočtové množství uvažované a kolovratu rozpočtu ZOV 3 - 15 500M Celkem 15 500-15 500=0,000		
28	87133	POTRUBÍ OŘEN Z TRUB PLAST DN OD 150MM	48	3
		Dimenzní trubka DN 150, HDPE-8N4 perforovaná 332+33+352,000 (M) položky při zhotovení potrubí platí bez ohledu na šířku zahrnuje: - výrobu dokumentaci (účelová technologická předpisy) - dodání veškerého tvářiva a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěry, zdvižných a upevňovacích prvků, včetně potřebných oprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - očištění celé funkční potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spár a spojů, pracovních zastávek kolen a pod. - úprava průtoků, průchodů, šachetami a komerami, okoli podpěr a vyústění, zastávek, napojení, vyvedení a upevnění odpad, výustí - ochrana potrubí náhledem (vř. opravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předem jasně položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapuštěném i nezapuštěném a i v kotevních, chráněných - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, přiváděním a vypáčením vody		
29	89815R	OŘENAŽNÍ ŠACHTY DN 600	KUŠ	
		položka zahrnuje: - pokládku s těsnem z předepsaného materiálu z tváří - připevnění plastové okružní, dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kamenné nebo betonů) - výustí, úhledu a tvářiva spár a spojů - očištění a ošetření uvnitřních ploch - sřezávání podkladní konstrukce		
30	88721R	Úprava stávající keramické výustí, skrytá (včetně a odřez)	KP	
		položka zahrnuje:		

0.00%	00.0	00.000.00	00.000.00
-------	------	-----------	-----------

0.00%	14.350.00	00.0	0.00%
-------	-----------	------	-------

0.00%	33.750.00	00.0	0.00%
-------	-----------	------	-------

00' 00" S2	00' 00" S2	00' 00" S2	00' 1	00' 0	00' 1
------------	------------	------------	-------	-------	-------

00' 0	00' 00Z #1	00' 00Z #1	00' 0	00' 1	00' 1
-------	------------	------------	-------	-------	-------

00' 0	00' 00Z #1	00' 00	00' 0	00' 00Z	00' 00Z
-------	------------	--------	-------	---------	---------

Statická zatěžovací zkouška č.:

98

Objednatel: Froněk, spol. s r.o.

Stavba: III/2371 Lužná - II. etapa

číslo zakázky: 1/20/081

Zkoušeno podle: ČSN 72 1006

Místo zkoušení: SO 101.2 - km 1,270, střed, č.p. 166

Záznam výsledků měření

	napětí (MPa)	deformace (mm)
1. zatěžovací cyklus	0,08	0,23
	0,16	0,63
	0,24	0,86
	0,32	0,98
	0,40	1,11
	0,45	1,17
	0,50	1,27
<u>Odléhčení</u>	0,25	1,17
	0,12	1,00
	0,00	0,75
2. zatěžovací cyklus	0,08	0,83
	0,16	0,94
	0,24	1,03
	0,32	1,11
	0,40	1,18
	0,45	1,27

Poloha v konstrukci

podkladní štrkovaná vrstva

Datum zkoušení: 29.3.21

Hodina zkoušení: 8.30 h

Počasí: polojasno

Tepnota vzduchu: 6°C

Materiál pod deskou: původní podklad


Výsledky zkoušky:

$E_{det,1}$ 85,32 MPa

$E_{det,2}$ 199,97 MPa

$E_{det,2}/E_{det,1}$ 2,34

Grafický záznam naměřených hodnot

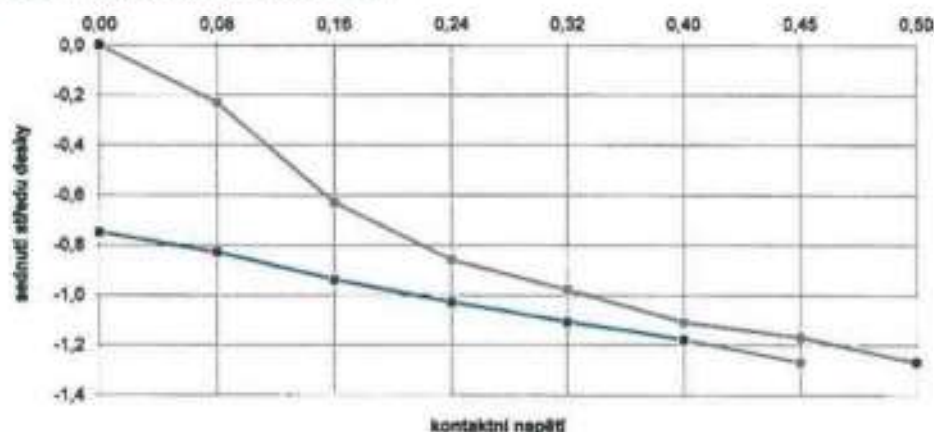

zkoušku provedl: Radek Pazyna

zpracoval: Radek Pazyna

datum vydání protokolu: 29.03.2021

schválil: Radek Pazyna

Zpráva obsahuje jednu stránku a bez písemného souhlasu laboratoře nesmí být reprodukována jinak, než celá.

Ve zprávě uvedené výsledky se vztahují pouze na uvedené místo a čas měření a nelze je vztahovat k jiným místům.

převzal:

datum:

Statická zatěžovací zkouška č.:

99

Objednatel: Froněk, spol. s r.o.

Stavba: III/2371 Lužná - II. etapa

Číslo zakázky: 1/20/081

Zkoušeno podle: ČSN 72 1006

Místo zkoušení: SO 101.2 - km 1,330, LS, č.p. 642

Záznam výsledků měření

	napětí (MPa)	deformace (mm)
1. zatěžovací cyklus	0,08	0,24
	0,16	0,60
	0,24	0,99
	0,32	1,17
	0,40	1,32
	0,45	1,41
	0,50	1,50
Odlehčení	0,25	1,37
	0,12	1,26
	0,00	0,87
2. zatěžovací cyklus	0,08	1,08
	0,16	1,19
	0,24	1,30
	0,32	1,38
	0,40	1,47
	0,45	1,53

Poloha v konstrukci

podkladní štěrková vrstva

Datum zkoušení: 29.3.21

Hodina zkoušení: 9.30 h

Počasí: polojasno

Teplota vzduchu: 6°C

Materiál pod deskou: původní podklad


Výsledky zkoušky:

$E_{def,1}$ 66,96 MPa

$E_{def,2}$ 171,99 MPa

$E_{def,2}/E_{def,1}$ 2,57

Grafický záznam naměřených hodnot

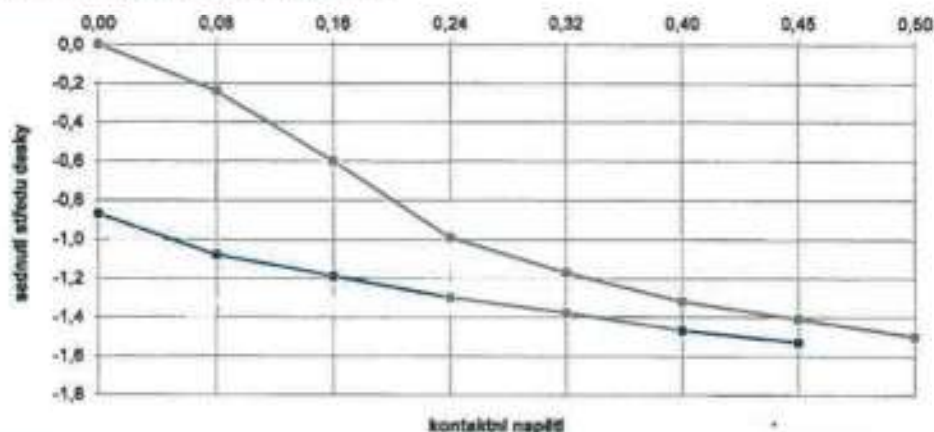

zkoušku provedl: Radek Pazyna

schválil: Radek Pazyna

zpracoval: Radek Pazyna

datum vydání protokolu: 29.03.2021

Zpráva obsahuje jednu stranu a bez písemného souhlasu laboratoře nesmí být reprodukována jinak, než celá.

Ve zprávě uvedené výsledky se vztahují pouze na uvedené místo a čas měření a nelze je vztahovat k jiným místům.

převzal:

datum:

Statická zatěžovací zkouška č.: 100

Objednatel: Froněk, spol. s r.o.

Stavba: III/2371 Lužná - II. etapa

číslo zakázky: 1/20/081

Zkoušeno podle: ČSN 72 1006

Místo zkoušení: SO 101.2 - km 1,380, LS, křižovatka

Záznam výsledků měření

	napětí (MPa)	deformace (mm)
1. zatěžovací cyklus	0,08	0,07
	0,16	0,20
	0,24	0,28
	0,32	0,40
	0,40	0,50
	0,45	0,55
	0,50	0,59
Odlehčení	0,25	0,53
	0,12	0,36
	0,00	0,07
2. zatěžovací cyklus	0,08	0,15
	0,16	0,24
	0,24	0,34
	0,32	0,43
	0,40	0,50
	0,45	0,54

Položka v konstrukci

podkladní šetrková vrstva

Datum zkoušení: 29.3.21

Hodina zkoušení: 10.30 h

Počasí: polojasno

Teplota vzduchu: 6°C

Materiál pod deskou: původní podklad


Výsledky zkoušky:

 $E_{def,1}$ 173,10 MPa

 $E_{def,2}$ 212,54 MPa

 $E_{def,2}/E_{def,1}$ 1,23

Grafický záznam naměřených hodnot

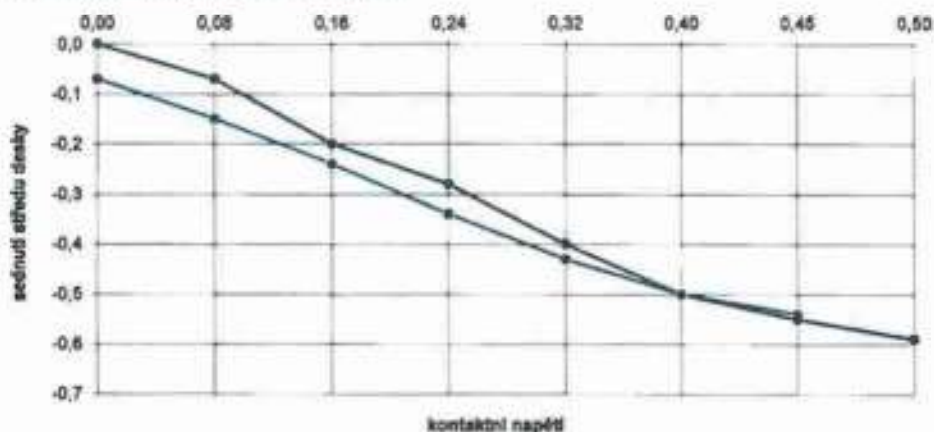

zkoušku provedl: Radek Pazyna

schválil: Radek Pazyna

zpracoval: Radek Pazyna

datum vydání protokolu: 29.03.2021

Zpráva obsahuje jednu stranu a bez písemného souhlasu laboratoře nesmí být reprodukována jinak, než celá.

Ve zprávě uvedené výsledky se vztahují pouze na uvedené místo a čas měření a nelze je vztahovat k jiným místům.

převzal:

datum:

Statická zatěžovací zkouška č.:

101

Objednatel: Froněk, spol. s r.o.

Stavba: III/2371 Lužná - II. etapa

Číslo zakázky: 1/20/081

Zkoušeno podle: ČSN 72 1006

Místo zkoušení: SO 101.2 - km 1,380, PS, č.p.78

Záznam výsledků měření

	napětí (MPa)	deformace (mm)
1. zatěžovací cyklus	0,08	0,25
	0,16	0,38
	0,24	0,49
	0,32	0,55
	0,40	0,63
	0,45	0,68
	0,50	0,73
Odlehčení	0,25	0,70
	0,12	0,55
	0,00	0,25
2. zatěžovací cyklus	0,08	0,41
	0,16	0,46
	0,24	0,53
	0,32	0,62
	0,40	0,68
	0,45	0,73

Poloha v konstrukci

podkladní šetrková vrstva

Datum zkoušení: 29.3.21

Hodina zkoušení: 11.30 h

Počasí: jasno

Teplota vzduchu: 6°C

Materiál pod deskou: původní podklad


Výsledky zkoušky:

$E_{det,1}$ 191,76 MPa

$E_{det,2}$ 232,79 MPa

$E_{det,2}/E_{det,1}$ 1,21

Grafický záznam naměřených hodnot

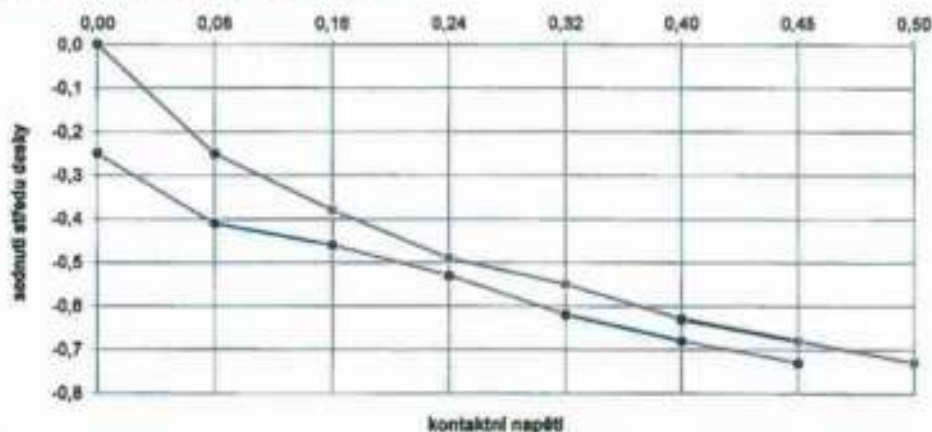

zkoušku provedl: Radek Pazyna

schválil: Radek Pazyna

zpracoval: Radek Pazyna

datum vydání protokolu: 29.03.2021

Zpráva obsahuje jednu stranu a bez písemného souhlasu laboratoře nesmí být reprodukována jinak, než celá.

Ve zprávě uvedené výsledky se vztahují pouze na uvedené místo a čas měření a nelze je vztahovat k jiným místům.

převzal:

datum:

Froněk, spol. s r.o.
Zátiší 2488, CZ 269 01 Rakovník
tel. +420 313 517 276
fax +420 313 516 361
www.fronek.cz, info@fronek.cz

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, p.o.
Šárka Balážová
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5 Smíchov

Vyřizuje: Jiří Karel

datum 20.6.2021

OZNÁMENÍ

Při odstranění žulových kostek v komunikaci průtahu III/2371 Lužná, byla nalezena vyhovující konstrukce původní komunikace (viz protokoly SZZ – příloha č. 1). Parametry konstrukce jsou vyhovující dle RDS. Tímto oznamujeme vznik méněprací, které vyčíslíme formou ZBV.

S pozdravem

Přílohy:

Protokoly – statická zatěžovací zkouška

**Froněk, spol. s r.o.
Zátiší 2488
269 01 Rakovník**

Váš dopis značky/ze dne

Naše značka

Vyřizuje/telefon
Š. Balážová

Kladno
24.6.2021

III/2371 Lužná - vyjádření k nepředvídatelným změnám


Na základě oznámení zhotovitele stavby „III/2371 Lužná“ ze dne 20.6.2021 se jedná o následující nepředvídatelnou změnu:

- při odstranění žulových kostek na komunikaci III/2371 v průtahu obce Lužná byly zjištěny vyhovující konstrukční vrstvy původní komunikace (viz. protokoly statické zatěžovací zkoušky), a proto je navrženo ponechání stávající konstrukce komunikace

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace (dále jen KSÚS SK), jako správce a zároveň zástupce Středočeského kraje jako vlastníka silnic II. a III. tříd, tj. dotčené krajské komunikace III/2371, a jako zadavatele výše zmíněné stavby tímto vydává pokyn k realizaci dle zhotovitelem předloženého navrženého řešení a zároveň žádá zhotovitele o zpracování ZBV k těmto změnám stavby, a to v souladu se zákonem o zadávání VR a příslušnou směrnicí KSÚS SK.

Přílohy: Oznámení zhotovitele o nepředvídatelných změnách ze dne 20.6.2021 včetně doložených protokolů (statické zatěžovací zkoušky č.: 98 - 101)

S pozdravem

 **Karel Motal**
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Zápis z kontrolního dne stavby ze dne 31.8.2021 Akce: Rekonstrukce komunikace Lužná III/2371

Kontrolní den stavby.

číslo : 16 konaný dne 31.8.2021 Rekonstrukce komunikace Lužná III/2371

Účastníci

Seznam účastníků je uveden v příloze č. 1 – Prezenční listina

Program kontrolního dne.

1. Plnění Technické specifikace (TP, TKP, ZTKP, normy, technologické předpisy, atd.)
2. Plnění věcného harmonogramu
3. Popis provedených prací
4. Kontrola kvality provedených prací
5. Odsouhlasení a převzetí prací
6. Různá
7. Nové úkoly
8. Závěr

1. Plnění Technické specifikace (TP, TKP, ZTKP, normy, TaPf, atd.)

- 1.1. Zhotovitel předal technologické předpisy na pokládku asfaltových směsí a ocelové sítě Road Mesh L 20.11.2020
- 1.2. Harmonogram prací – splněno a předáno 9.11.2020
- 1.3. V případě zpoždění prací zhotovitel provede aktualizaci harmonogramu.
- 1.4. Dne 27.11.2020 byl předán kontrolní a zkušební plán na komunikaci.
- 1.5. Dopracovat detaily odvodnění a výšek na objektu SO 201 most – **splněno**.
- 1.6. Přepracovat KZP na objekt SO201 most – **splněno**.

2. Plnění věcného harmonogramu

Stavební práce ukončeny dle harmonogramu.

3. Popis provedených prací

Stavební práce ukončeny.

4. Kontrola kvality provedených prací

Stavební práce ukončeny.

5. Odsouhlasení a převzetí prací

Stavební práce ukončeny.

6. Různá

Dnešního dne proběhlo jednání ohledně ZBV na stavbu Lužná. Bylo odsouhlaseno mezi zhotovitelem, TDS a investorem toto:

- 1) **Sanace** – po odfrézování komunikace byl zjištěn skutečný stav podkladních vrstev, které nevykazují známky deformace. Položky související se sanací v km 0,000 – km 0,912 nebudou zhotovitelem čerpány a budou součástí ZBV
- 2) **Propustek** – po vyčištění krajnic a příkopů byl v místě nově navrženého propustku zjištěn skutečný stav v podobě plně funkčního stávajícího propustku DN 800 pod komunikací. Z důvodu zásahu do

skladby únosné konstrukce komunikace se zhotovení nového propustku nebude realizovat, pouze dojde k propláchnutí a vyčištění stávajícího propustku.

- 3) **Horská vpust** – při pochůzce na KD byl zjištěn stav kontrolní plastové šachty SO 101.1, na kterou bude osazen kanalizační poklop, který bude výškově upraven do stávajícího terénu. Tato šachta bude plnit funkci navrhované horské vpusti, do které bude zaústěna drenáž z SO 101.1 a SO 101.2.

7. Předchozí úkoly

Úkol číslo	Název	Obsah úkolu a požadovaný cílový stav	Odpovídá	Termín
------------	-------	--------------------------------------	----------	--------

Zaseal

Jméno
Petr Stoklasa
Technický dozor stavby
SAFETY PRO s.r.o.

Podpis

Přílohy

Číslo	Název
Rekonstrukce silnice Lužná III/2371	
1	Prezenční listina
	Viz příloha č. 1

Průběh:

K zápisu z KČ stavby: Rekonstrukce silnice Lužná III/2371

Účastníci kontrolního dne stavby

Prezence listina

Kontrolní den stavby

Číslo	Konání dne	Rekonstrukce silnice Lužná III/2371		
Jméno, příjmení, titul	Organizace, funkce	Telefon, e-mail	Podpis	
Petr Prokopa	SAFETY PRO s.r.o.	+36 90 8 45 1		
Jiří Kaňgl	FRONEX	+36 90 8 45 2		
Anna Balcerová	KSU S4	+36 90 8 45 3		

Froněk, spol. s r.o.
Zátiší 2488, CZ 269 01 Rakovník
tel. +420 313 517 276
fax +420 313 516 361
www.fronek.cz, info@fronek.cz

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, p.o.
Šárka Balážová
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5 Smíchov

Vyřizuje: Bc. Jiří Karel

datum: 2.9.2021

Stavba: III/2371 Lužná – rekonstrukce silnice
S-3027/00066001/2020
Věc: Oznámení

Vážená paní Balážová,

Na základě zápisu z KD ze dne 31.8.2021 posíláme oznámení o vzniku méněprací na SO 101.1 (menší rozsah sanací, zachování původního propustku) a SO 301 (nahrazení horské vpusti stávající plastovou šachtou).

Přílohou přikládáme zápis z KD ze dne 31.8.2021. Prosíme o zaslání pokynu pro zpracování ZBV na shora uvedené stavební objekty.

S pozdravem

Jiří/Karel
stavbyvedoucí

**Froněk, spol. s r.o.
Zátiší 2488
269 01 Rakovník**

Váš dopis značka/ze dne

Naše značka

Vyřizuje/telefon
Š. Balážová /

Kladno
3.9.2021

III/2371 Lužná - vyjádření k nepředvídatelným změnám

Na základě oznámení zhotovitele stavby „III/2371 Lužná“ ze dne 2.9.2021 se jedná o následující nepředvídatelnou změnu:

- po odfrézování komunikace na SO 101.1 bylo zjištěno, že podkladní vrstvy nevykazují známky deformace, a proto rozsah sanací v km 0,000 – 0,912 nebude dle zadaného rozpočtu čerpán a dále bylo po vyčištění krajnic a příkopů zjištěno, že stávající propustek DN 600 pod komunikací je plně funkční (propláchnutí a vyčištění stávajícího propustku), z tohoto důvodu se nebude realizovat budování nového se zásahem do únosné skladby konstrukce komunikace
- na KD bylo rozhodnuto o zachování plastové šachty, na kterou bude osazen kanalizační poklop s výškovou úpravou, místo navrhované horské vpusti

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace (dále jen KSÚS SK), jako správce a zároveň zástupce Středočeského kraje jako vlastníka silnic II. a III. tříd, tj. dotčené krajské komunikace III/2371, a jako zadavatele výše zmíněné stavby tímto vydává pokyn k realizaci dle zhotovitelem předloženého navrženého řešení a zároveň žádá zhotovitele o zpracování ZBV k těmto změnám stavby, a to v souladu se zákonem o zadávání VŘ a příslušnou směrnicí KSÚS SK.

Přílohy: Oznámení zhotovitele o nepředvídatelných změnách ze dne 2.9.2021 včetně zápisu z KD ze dne 31.8.2021

S pozdravem

Karel Motal
vedoucí TSÚ - oblast Kladno

REKONSTRUKCE KOMUNIKACE LUŽNÁ III/2371 LUŽNÁ

STANOVISKO K ZBV č. 3

Měněpráce s ohledem na skutečně zastižené podmínky v průběhu provádění prací

Dílčí změna č. 1: Měněpráce na sanacích podloží.

Dle předběžných průzkumů pro zpracování PDPS bylo předpokládáno určité množství prací nezbytných pro sanaci podloží na úsecích silnice, v místech, kde byl zjištěn nevhodný stav podloží.

V průběhu provádění stavby byly na více místech vhodné konstrukční vrstvy původní vozovky ze štetové dlažby. V dotčených místech byly provedeny statické zatěžovací zkoušky, které prokázaly vyhovující stav podkladu.

V dotčených místech bylo navrženo ponechání stávající konstrukce vozovky, na které nebylo nutné provádět navržené sanace, což prokázaly statické zatěžovací zkoušky.

Dílčí změna č. 2: Měněpráce týkající se nerealizace propustku.

Bylo předpokládáno provedení propustku převádějícího vodu pod silnici III/2371. V průběhu provádění stavby však bylo odhaleno těleso stávajícího propustku, téměř v trase uvažované v PDPS. Tento stávající propustek byl pročištěn a bylo konstatováno, že je v provozuschopném stavu. Proplachem byla ověřena jeho kapacita a funkčnost.

Po zjištění této skutečnosti bylo rozhodnuto, že se nový propustek realizovat nebude.

S navrženými změnami a zpracováním ZBV souhlasím.

21.9.2021
Petr Stoklasa
TDI

NAŠE ZNAČKA:

PH I-Kon-0106-2021
Ing. Vladimír Koniček

VYŘIZUJE:

DATUM:

23. 09. 2021

**Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, p.o.
Karel Motal
Zborovská 11
150 21 Praha 5**

Akce: III/2371 Lužná, rekonstrukce silnice

Věc: Stanovisko AD k ZBV č. 2 až ZBV č. 6

AD byl požádán o stanovisko k ZBV č. 2 SO 101.1/1, č. 3 SO 101.1/2, č. 4 SO 101.2/1, č. 5 SO 301/1 a č. 6 SO 190/1. Pro vyjádření AD je podkladem předložený koncept ZBV.

AD prověřil návrh změn ZBV č. 2 až č. 6 a vydává následující stanovisko k předloženým dokladům:

ZBV č. 2 SO 101.1/1

ad 1: AD souhlasí se změnou. Změna vychází z:

- Oznámení zhotovitele z 9.8.2021
- Pokyn objednatele z 10.8.2021
- Stanovisko TDI z 21.8.2021

ad 2: AD bere změnu na vědomí. Změna vznikla na základě zjištění nepředvídatelné skutečnosti – zhoršeného stavu vozovky.

ad 3: AD souhlasí s navrženým řešením.

1. Dle AD je navrhované řešení technicky přijatelné, neboť nepředstavuje podstatnou technickou změnu díla. K ceně ZBV se AD nevyjadřuje.
2. Ověření objemů provedených prací (tj. výměry či objemy provedených změn na stavbě) a dohled nad jejich kvalitou, je odpovědností TDI.

ZBV č. 3 SO 101.1/2

ad 1: AD souhlasí se změnou. Změna vychází z:

- Zápis z KD z 31.8.2021
- Oznámení zhotovitele z 2.9.2021
- Pokyn objednatele z 3.9.2021
- Stanovisko TDI z 21.8.2021

ad 2: AD bere změnu na vědomí. Změna vznikla na základě zjištění nepředvídatelné skutečnosti – zastížení podkladních vrstev vozovky v takovém stavu, který umožňuje jejich ponechání bez navržených sanací.

ad 3: AD souhlasí s navrženým řešením.

1. Dle AD je navrhované řešení technicky přijatelné, neboť nepředstavuje podstatnou technickou změnu díla. K ceně ZBV se AD nevyjadřuje.
2. Ověření objemů provedených prací (tj. výměry či objemy provedených změn na stavbě) a dohled nad jejich kvalitou, je odpovědností TDI.

ZBV č. 4 SO 101.2/1

ad 1: AD souhlasí se změnou. Změna vychází z:

- Zápis z KD z 31.8.2021
- Oznámení zhotovitele z 2.9.2021
- Pokyn objednatele z 3.9.2021
- Stanovisko TDI z 21.8.2021

ad 2: AD bere změnu na vědomí. Změna vznikla na základě zjištění nepředvídatelné skutečnosti – zjištění, že stávající propustek je po vyčištění plně funkční a není třeba realizovat propustek nový.

ad 3: AD souhlasí s navrženým řešením.

3. Dle AD je navrhované řešení technicky přijatelné, neboť nepředstavuje podstatnou technickou změnu díla. K ceně ZBV se AD nevyjadřuje.
4. Ověření objemů provedených prací (tj. výměry či objemy provedených změn na stavbě) a dohled nad jejich kvalitou, je odpovědností TDI.

ZBV č. 5 SO 301/1

ad 1: AD souhlasí se změnou. Změna vychází z:

- Zápis z KD z 31.8.2021
- Oznámení zhotovitele z 2.9.2021
- Pokyn objednatele z 3.9.2021
- Stanovisko TDI z 21.8.2021

ad 2: AD bere změnu na vědomí. Změna vznikla na základě zjištění nepředvídatelné skutečnosti – možnost nahrazení navržené HV stávající plastovou šachtou.

ad 3: AD souhlasí s navrženým řešením.

5. Dle AD je navrhované řešení technicky přijatelné, neboť nepředstavuje podstatnou technickou změnu díla. K ceně ZBV se AD nevyjadřuje.
6. Ověření objemů provedených prací (tj. výměry či objemy provedených změn na stavbě) a dohled nad jejich kvalitou, je odpovědností TDI.

ZBV č. 6 SO 190/1

ad 1: AD souhlasí se změnou. Změna vychází z:

- Oznámení zhotovitele z 9.8.2021
- Pokyn objednatele z 10.8.2021
- Stanovisko TDI

ad 2: AD bere změnu na vědomí. Změna vznikla na základě řešení nepředvídatelné skutečnosti v rámci ZBV č.2 – změna rozsahu opravy vozovky si vyžádala změnu rozsahu DIO

ad 3: AD souhlasí s navrženým řešením.

7. Dle AD je navrhované řešení technicky přijatelné, neboť nepředstavuje podstatnou technickou změnu díla. K ceně ZBV se AD nevyjadřuje.

Ověření objemů provedených prací (tj. výměry či objemy provedených změn na stavbě) a dohled nad jejich kvalitou, je odpovědností TDI.

Další připomínky k ZBV AD neuplatňuje.

S pozdravem

Ing. Vladimír Koniček
ředitel Ateliéru Praha I

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby: III/2371 Lužná - S-3027/00066001/2020 Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 101.2 Rekonstrukce sil. III/2371, km 0,912 - KÚ Číslo a název podobjektu/rozpočtu: 101.2 Rekonstrukce sil. III/2371, km 0,912 - KÚ	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 101.2/1	Číslo ZBV: 4
---	---	----------------------------

Objednatel: **Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov
IČ 00066001

Zhotovitel: **Froněk, spol.s r.o.**
Zátiší 2488, 269 01 Rakovník
IČ 47534690

Rekapitulace ZBV č. 4 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4.3	-2 919 572,55	0,00	-2 919 572,55

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4.4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4	-2 919 572,55	0,00	-2 919 572,55

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby:

III/2371 Lužná - S-3027/00066001/2020

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

101.2 Rekonstrukce sil. III/2371, km 0,912 - KÚ

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

101.2/1

Číslo ZBV:

4.3

Strany smlouvy o dílo objednatel č.: S-3027/00066001/2020 a zhotovitel č.: 120081 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 23.10.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: Froněk, spol.s r.o., Zátalí 2488, 269 01 Rakovník

Přílohy Změnového listu

1. Krycí list	1	počet listů
2. Změnový list	2	počet listů
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů
4. Rozpis ocenění Změn položek ZBV 2	1	počet listů
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů
Další doklady dle přehledu dokladů	23	počet listů

Paré č.

Přijemce

1, 2

Objednatel

3

Zhotovitel

4

Projektant (AD)

5

Stavební dozor

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Měněpráce na sanacích podloží s ohledem na skutečně zastížené podmínky v průběhu provádění prací

1) V rámci zakázky s názvem „III/2371 Lužná“ byla dle PDPS plánovaná oprava silnic na území obce Lužná v ulicích Čsl. armády, Masarykovo nám. a Tyršova. Dle předběžných průzkumů pro zpracování PDPS bylo předpokládáno určité množství prací nezbytných pro sanaci podloží na úsecích silnice, v místech, kde sondáž průzkumu vykazovala nevhodný stav podloží.

2) V průběhu provádění stavby, po odkrytí obrusných a ložných vrstev vozovky, bylo na více místech zastíženo soudržné podloží, resp. vhodné konstrukční vrstvy původní vozovky ze štětové dlažby. V dotčených místech byly provedeny statické zatěžovací zkoušky, které prokázaly vyhovující stav podkladu. S ohledem na tyto skutečnosti, v místech, kde byly v PDPS původně předpokládány sanace podloží, nebylo nutné tyto sanace provádět.

3) Vzhledem k zjištěnému stavu bylo v dotčených místech navrženo ponechání stávající konstrukce vozovky, na které nebylo nutné provádět navržené sanace, což prokázaly statické zatěžovací zkoušky.

Na základě uvedených skutečností lze konstatovat, že změny, týkající se snížení rozsahu prací na sanaci podloží, bylo možné odhalit až během samotné realizace Díla, na základě skutečně zastížených podmínek po odkrytí vozovkového souvrství. Sondáž provedená v rámci předběžných průzkumů pro potřeby návrhu PDPS totiž neposkytuje zcela detailní obraz o podpovrchových podmínkách dané lokality. Lze proto konstatovat, že se jedná o okolnosti, které zadavatel (ani projektant Zadávací dokumentace) jednající s náležitou péčí nemohl rozumně předvídat.

4) Změny byly iniciovány Zhotovitelem a podkladem pro ně jsou doklady č. 09 – Oznámení Zhotovitele ze dne 20.06.2021 a č. 10 – Vyjádření Objednatel ze dne 24.06.2021.

5) Tato změna se týká úpravy množství položek poř. č. 1, 2, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23 a 31.

V rámci uvedených změn nedochází k jejich řetězení, neboť tyto změny nevyvolávají potřebu jiných změn.

Tyto změny vznikly na základě nepředvídaného zjištěného skutečného stavu stávajících konstrukcí po zahájení stavby. Byly nevyhnutelné a technicky i ekonomicky neoddelitelné od realizované stavby. Jednalo se o Změny nepodstatné, nepředvídané, které jsou tak podle § 5 odst. 1, c), resp. podle § 10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29. 05. 2017) upfeshující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazených do Skupiny 3. Zároveň se jednalo o práce, které neměnily celkovou povahu veřejné zakázky.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tyto Změny nepředstavují vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jednalo o změny nepředvídané.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-2 919 572,55	0,00	-2 919 572,55	2 919 572,55

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí):	jméno	Bc. Jiří Karel	datum	15.12.2021	podpis
Projektant (autorský dozor):	jméno	Ing. Vladimír Koniček	datum	15.12.	podpis
Stavební dozor:	jméno	Petr Stoklása	datum		podpis
Zástupce Objednatel: KSÚS SK, p.o.	jméno	Karel Motál	datum	15.12.2021	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, doloženy a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitel sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel)	jméno	Ing. Jan Lichneger	datum	17-12-2021	podpis
Zhotovitel	jméno	Ing. Kamil Hrbek	datum	15.12.2021	podpis
					Číslo paré:

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 4

Název a evidenční číslo Stavby: III/2371 Lužná - S-3027/00066001/2020
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 101.2/1
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 101.2 Rekonstrukce sil, III/2371, km 0,912 - KÚ

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
15 442 546,47

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	15 442 546,47	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-2 919 572,55	0,00	0,00	0,00%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-2 919 572,55	12 522 973,92	-2 919 572,55	-18,91%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

souhlasím

Bc. Jiří Karel

Projektant (autorský dozor):

souhlasím

Ing. Vladimír Koníček

Stavební dozor:

souhlasím

Petr Stoklasa

Zástupce Objednatele KSÚS:

souhlasím

Karel Motal

Zaměstnanec KSÚS
odpovědný za cenové
projednání Změny:

souhlasím

Ing. Jaroslava Jurková

7 15.12.2021

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 4.3

Název a evidenční číslo stavby: III/2371 Lužná - S-3027/00066001/2020 Číslo a název SO/PS: 101.2 Rekonstrukce sil. III/2371, km 0,912 - KÚ Číslo a název podobjektu/rozpočtu: 101.2 Rekonstrukce sil. III/2371, km 0,912 - KÚ								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) 101.2/1 Skupina změn 3					
Por. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	3 368,331	1 516,000	-1 852,331	103,00	346 938,09	-190 790,09	0,00	156 148,00	-190 790,09	-54,98%
2	014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU - zemina	M3	3 858,586	1 027,000	-2 831,586	60,00	231 515,16	-169 895,16	0,00	61 620,00	-169 895,16	-73,38%
11	11332	ODSTRANĚNÍ POVLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELĚNÉHO	M3	911,625	0,000	-911,625	249,00	226 994,63	-226 994,63	0,00	0,00	-226 994,63	-100,00%
12	11332R	ODSTRANĚNÍ POVLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH	M3	2 978,751	1 273,000	-1 705,751	267,00	795 326,52	-455 435,52	0,00	339 891,00	-455 435,52	-57,36%
13	11343	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM VČET POVLADU	M3	410,101	284,042	-126,059	265,00	108 678,77	-33 405,64	0,00	75 273,13	-33 405,64	-30,74%
15	12373	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I	M3	96,464	0,000	-96,464	172,00	16 591,81	-16 591,81	0,00	0,00	-16 591,81	-100,00%
16	12373	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I	M3	3 858,586	1 027,000	-2 831,586	188,00	725 414,17	-532 338,17	0,00	193 076,00	-532 338,17	-73,38%
17	12573	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKU A SKLÁDEK TR. I	M3	1 008,089	0,000	-1 008,089	72,00	72 582,41	-72 582,41	0,00	0,00	-72 582,41	-100,00%
19	17110	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ SE ZHUTNĚNÍM	M3	96,464	0,000	-96,464	64,00	6 173,70	-6 173,70	0,00	0,00	-6 173,70	-100,00%
20	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	96,464	0,000	-96,464	50,00	4 823,20	-4 823,20	0,00	0,00	-4 823,20	-100,00%
21	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	3 858,586	0,000	-3 858,586	15,00	57 878,79	-57 878,79	0,00	0,00	-57 878,79	-100,00%
22	17130	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM	M3	911,625	0,000	-911,625	64,00	58 344,00	-58 344,00	0,00	0,00	-58 344,00	-100,00%
23	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	2 127,125	1 230,230	-896,895	234,00	497 747,25	-209 873,43	0,00	287 873,82	-209 873,43	-42,16%
31	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	2 643,600	820,000	-1 823,600	485,00	1 282 146,00	-884 446,00	0,00	397 700,00	-884 446,00	-68,98%
CELKEM								4 431 152,50	-2 919 572,55	0,00	1 511 579,95	-2 919 572,55	

Odpovědný zástupce Objednatelů i odpovědný zástupce Zhotovitelů odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Bc. Jiří Karel, stavbyvedoucí

Datum: 15.12.2021

Podpis:

Za Objednatelů: Karel Motál, vedoucí oddělení KSÚS Kladno

Datum: 15.12.2021

Podpis:

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	4
Název a evidenční číslo stavby:	III/2371 Lužná - S-3027/00066001/2020
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	101.2 Rekonstrukce sil. III/2371, km 0,912 - KÚ
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	101.2/1

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
07 Změnový soupis prací SO 101.1 po změně 2	9	
08 Protokoly statických zatěžovacích zkoušek	4	
09 Oznámení Zhotovitele o změně ze dne 20.06.2021	1	
10 Vyjádření Objednatele ke změně ze dne 24.06.2021	1	
11 Zápis z KD stavby č. 16 ze dne 31.8.2021	3	
12 Oznámení zhotovitele ze dne 2.9.2021	1	
13 Pokyn objednatel ze dne 3.9.2021	1	
14 Stanovisko TDI k ZBV 4	1	
15 Stanovisko AD k ZBV 2 - 6	2	
Počet listů celkem	23	

Změnový soupis prací SO 101.2 po změně 1 pro ZBV 4													
Název a evidenční číslo stavby: 802371 Lúžná - S-0027/0006001/0020							ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)						
Číslo a název SO/PS: 101.2 Rekonstrukce sil. 802371, km 0,912 - KÚ													
Číslo a název položky a rozpočtu: 101.2 Rekonstrukce sil. 802371, km 0,912 - KÚ							101.2/1						
Pol. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství nově	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	014101	POPLATKY ZA SKLADBU 2370,751+2 978,751 [M] -dle pol. 11332R SKL 410,201+20,021+388,580 [M] -dle pol. 11343 SKL (z odpočtem nedopracované odpady) Celkem: 4+3+3 368,321 [M] Zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s ukládáním odpadu na skládce. ZBV 4 - 1992,33180 Celkem: 3368,321+1992,331+1992,331=8393,002	M3	3 368,321	1 316,380	-1 862,321	100,00	336 832,10	-186 232,10	0,00	150 600,00	-186 232,10	-54,99%
2	014101	POPLATKY ZA SKLADBU - zemina 3104,300+3 858,586 [M] -dle pol. 12372 SKL - položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s ukládáním odpadu na skládce - v ceně zahrnuje složení, manipulace při skládání na řízené skládce a zaplacení poplatků skládkovně ZBV 4 - 2031,33943 Celkem: 3858,586+2031,339+1096,007=6985,932	M3	3 858,586	1 027,000	-2 831,586	60,00	231 515,16	-189 895,56	0,00	61 620,00	-189 895,56	-73,38%
3	014101	POPLATKY ZA SKLADBU - kamenná 108,889+108,889 [M] -dle pol. 11315 SKL Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s ukládáním odpadu na skládce - v ceně zahrnuje složení, manipulace při skládání na řízené skládce a zaplacení poplatků skládkovně	M3	108,889	108,889	0,000	130,00	14 155,77	0,00	0,00	14 155,77	0,00	0,00%
4	014101	POPLATKY ZA SKLADBU - smetový beton 17,7+17,700 [M] -dle pol. 11315 SKL - položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s ukládáním odpadu na skládce - v ceně zahrnuje složení, manipulace při skládání na řízené skládce a zaplacení poplatků skládkovně	M3	17,700	17,700	0,000	300,00	5 310,00	0,00	0,00	5 310,00	0,00	0,00%
5	014101	POPLATKY ZA SKLADBU - nedopracovaný odpad z střešních stromů 20,521+20,521 [M] -dle pol. 11343 SKL - položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s ukládáním odpadu na skládce - v ceně zahrnuje složení, manipulace při skládání na řízené skládce a zaplacení poplatků skládkovně	M3	20,521	20,521	0,000	35 000,00	718 235,00	0,00	0,00	718 235,00	0,00	0,00%
6	014211	POPLATKY ZA ZEMNÍ - OMACE 8470,12+12,600 [M] -dle pol. 18223 Zahrnuje veškeré poplatky majiteli zařízení související s nakupem zeminy (písků a štěrku z přírodních)	M3	12,600	12,600	0,000	650,00	8 190,00	0,00	0,00	8 190,00	0,00	0,00%
7	014101	POPLATKY ZA SKLADBU 17,700+17,700 [M] -dle pol. 11315 SKL - položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s ukládáním odpadu na skládce - v ceně zahrnuje složení, manipulace při skládání na řízené skládce a zaplacení poplatků skládkovně ZBV 4 - 1992,33180 Celkem: 3368,321+1992,331+1992,331=8393,002	M3	17,700	17,700	0,000	1 825,00	32 192,50	-1 825,00	0,00	30 367,50	-1 825,00	-5,63%
8	11317	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK odstranění stávajícího žulového dlažby R 6,7 m vč. odraz 18336,6+32,5+2813,5+788,8+134,4+13,670; 1+971,670 [M] 226870,17= 226,800 [M] - pro zpevnění povrchu v pol. 587202R Celkem: 8+8+745,170 [M] Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou soú a s vybouranými hmotami vč. ukládání na skládce. Nezahrnuje poplatek za skládce, který se vyžaduje v položce 0141** (s výjimkou malého množství boureného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotlivé ceny bouření) - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce	M3	745,170	745,170	0,000	498,00	372 093,60	0,00	0,00	372 093,60	0,00	0,00%
9	11317	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK odraz a ukládání na skládce 226870,17=226,800 [M] - pro zpevnění povrchu v pol. 587202R Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou soú a s vybouranými hmotami vč. ukládání na skládce. Nezahrnuje poplatek za skládce, který se vyžaduje v položce 0141** (s výjimkou malého množství boureného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotlivé ceny bouření) - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce	M3	226,800	226,800	0,000	424,00	96 163,20	0,00	0,00	96 163,20	0,00	0,00%
10	11318	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB odraz a ukládání na skládce Odstranění stávajícího kamenného dlažby R 6,7 m 188678,1+213,3+137,3+77,3+824,3+58,3+788,8+6											

		8887+8 887 000 (J) - dodání kamenná předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez nutnosti sítky, pokládání vrstvy po stupích - nasazení podtlaků, nářky											
31	56355	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKOPRTI ŠD 0/63 Gt min. 200 mm (8887+2268)*0,21+2 552,500 (J) ŠD 0/63 Gt min. 150 mm - představení chodníků 607*8,10+1,000 (J) Celkem: A=8+2 543,800 (J) - dodání kamenná předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez nutnosti sítky, pokládání vrstvy po stupích - nasazení podtlaků, nářky DN 4 - 1623,00000 Celkem: 2642,000 7423,800+20,00000	M2	2 443,000	820,000	-1 823,500	485,00	1 282 148,00	-884 448,00	0,00	387 700,00	-884 448,00	-88,38%
32	56963	OPLOŠENÍ KRAJIN Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 10MM Základní rozpočtové kritéria aut. rozložením 0,5-15 m 24,73+7,03+77,83+43,690 (J) - dodání rozptýlené v požadované kvalitě - odložení podkladu - uložení rozptýlené dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez nutnosti sítky, pokládání vrstvy po stupích, včetně pracovních spár a spojů - opravy napojení, ukončení - nasazení podtlaků, nářky	M2	43,890	43,890	0,000	80,00	2 621,40	0,00	0,00	2 621,40	0,00	
33	572123	OPLOŠENÍ POSTELNÍK Z EMULZE DO 1,5KG/M2 Výfuková pasta P-C 0,6 kg/m2 8887+8 887 000 (J) - dodání všech předepsaných materiálů pro postelky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez nutnosti sítky, pokládání vrstvy po stupích - opravy napojení, ukončení	M2	9 887,000	9 887,000	0,000	13,00	148 505,00	0,00	0,00	148 505,00	0,00	
34	572213	SPLOUVACÍ POSTELNÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 Splovnost pasta P-C 0,35 kg/m2 52990+10 699 000 (J) - dodání všech předepsaných materiálů pro postelky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez nutnosti sítky, pokládání vrstvy po stupích - opravy napojení, ukončení	M2	10 699,000	10 699,000	0,000	9,00	85 542,00	0,00	0,00	85 542,00	0,00	
35	574434	ASFALTOVÝ BETON PRO ODVLIVNÉ VRSTVY ACD 11+ 11S TL 40MM ACD 11+ 50/75 TL 40 mm 8887+8170+10 699 000 (J) - dodání směsi v požadované kvalitě - odložení podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez nutnosti sítky, pokládání vrstvy po stupích, včetně pracovních spár a spojů - opravy napojení, ukončení podlahy obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpusť, šachet a pod. - nasazení podtlaků, nářky - nasazení těsnění podlahy obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpusť, šachet a pod.	M2	10 699,000	10 699,000	0,000	138,00	1 455 084,00	0,00	0,00	1 455 084,00	0,00	
36	574508	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+ 16S TL 10MM ACP 16+ 50/75 TL 70 mm 8887+8 887 000 (J) - dodání směsi v požadované kvalitě - odložení podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez nutnosti sítky, pokládání vrstvy po stupích, včetně pracovních spár a spojů - opravy napojení, ukončení podlahy obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpusť, šachet a pod. - nasazení podtlaků, nářky - nasazení těsnění podlahy obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpusť, šachet a pod.	M2	9 887,000	9 887,000	0,000	200,00	1 977 400,00	0,00	0,00	1 977 400,00	0,00	
37	577141	VÝSPRAVA ASFALTOVOU ZALIVKOU Zalivka spár mezi vozovkou a příslušením, napojení frezování 2581-812+36,4+37,4+30,2+47,5+24,4+107,5+33,2+107,7+37+47,9+77,9+42+68,9+2 888 500 (J) - vyhlazování drážky sítky do 20mm tloušťky do 40mm - vyhlazování - nářky - všech předepsaných zvláštností	M	2 388,500	2 388,500	0,000	80,00	191 960,00	0,00	0,00	191 960,00	0,00	
38	5872028	GLAZOVANÉ KRYTÍ Z DROBNÝCH KOSTEK - BEZ DODÁVKY	M2	2 288,000	2 288,000	0,000	797,00	1 871 518,00	0,00	0,00	1 871 518,00	0,00	

		položka zahrnuje: - stavby a sprovádění přípravy včetně jejich osazení betonovými patkami, včetně příjezdů											
47	914823	SLoupky a stoupy z oceli truben do patky demontáž	KL	13 000	13 000	0,000	292,00	3 796,00	0,00	0,00	3 796,00	0,00	0,00%
		Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odvoz materiálu s odvazem na předepsané místo											
48	915111	VOZOVÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - LOKÁLNÍ A POPLAČKA	W	261 800	261 800	0,000	150,00	39 270,00	0,00	0,00	39 270,00	0,00	0,00%
		položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátlakového materiálu (má se pouze natíratá plocha) - předznačení a reflexní zábrny											
49	91522	VOZOV DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POPLAČKA	W	261 800	261 800	0,000	316,00	82 728,80	0,00	0,00	82 728,80	0,00	0,00%
		položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátlakového materiálu (má se pouze natíratá plocha) - předznačení a reflexní zábrny											
50	917224	SILNIČNÍ A CHODKOVÉ OBRUBKY Z BETONOVÝCH OBRUBEK ŠÍŘ 150MM	M	3 037 100	3 037 100	0,000	370,00	1 133 727,00	0,00	0,00	1 133 727,00	0,00	0,00%
		Betonové obruby šířky 150x200 včetně betonového lože s opěrnou C25/30-XF3 50+50+100+14,5+202,5+10+170+16,5+21+148+100+31+46+88,5+4+73+220+249,5+153+32 7+33,2+7,3+20,2+36,6+14,7+18,9+2 037 100 MJ											
		Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubek o rozměrech předepsaných zakázkou dokumentací betonové lože i ložní betonovou opěrkou											
51	91781	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBEK BETONOVÝCH	M	454 000	454 000	0,000	905,00	410 470,00	0,00	0,00	410 470,00	0,00	0,00%
		Práce na stávajících betonových obrubkách silničních včetně betonového lože s opěrnou C25/30-XF3 (772,5+186,500+454 000 MJ)											
		Položka výškové úpravy obrub zahrnuje jejich vyčištění, sčíslení, manipulaci, nové betonové lože a osazení. Případně nutné doplnění rozjmy obrubami se uvádí v položkách 9172 až 9177											
		CELKEM						16 462 946,47	-2 919 873,80	0,00	12 522 972,67	-2 919 873,80	-18,91%

Statická zatěžovací zkouška č.:

98

Objednatel: Froněk, spol. s r.o.

Stavba: III/2371 Lužná - II. etapa

číslo zakázky: 1/20/081

Zkoušeno podle: ČSN 72 1006

Místo zkoušení: SO 101.2 - km 1,270, střed, č.p. 166

Záznam výsledků měření

	napětí (MPa)	deformace (mm)
1. zatěžovací cyklus	0,08	0,23
	0,16	0,63
	0,24	0,86
	0,32	0,98
	0,40	1,11
	0,45	1,17
	0,50	1,27
Odlehčení	0,25	1,17
	0,12	1,00
	0,00	0,75
2. zatěžovací cyklus	0,08	0,83
	0,16	0,94
	0,24	1,03
	0,32	1,11
	0,40	1,18
	0,45	1,27

Poloha v konstrukci

podkladní štěrková vrstva

Datum zkoušení: 29.3.21

Hodina zkoušení: 8.30 h

Počasí: polojasno

Tepnota vzduchu: 6°C

Materiál pod deskou: původní podklad


Výsledky zkoušky:

$E_{det,1}$ 85,32 MPa

$E_{det,2}$ 199,97 MPa

$E_{det,2}/E_{det,1}$ 2,34

Grafický záznam naměřených hodnot

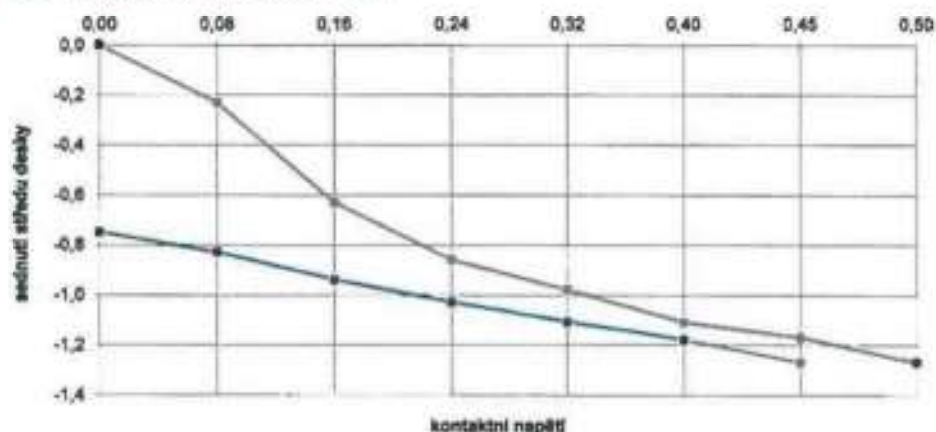

zkoušku provedl: Radek Pazyna

zpracoval: Radek Pazyna

datum vydání protokolu: 29.03.2021

schválil: Radek Pazyna

Zpráva obsahuje jednu stránku a bez písemného souhlasu laboratoře nesmí být reprodukována jinak, než celá.

Ve zprávě uvedené výsledky se vztahují pouze na uvedené místo a čas měření a nelze je vztahovat k jiným místům.

převzal:

datum:

Statická zatěžovací zkouška č.:

99

Objednatel: Froněk, spol. s r.o.

Stavba: III/2371 Lužná - II. etapa

Číslo zakázky: 1/20/081

Zkoušeno podle: ČSN 72 1006

Místo zkoušení: SO 101.2 - km 1,330, LS, č.p. 642

Záznam výsledků měření

	napětí (MPa)	deformace (mm)
1. zatěžovací cyklus	0,08	0,24
	0,16	0,60
	0,24	0,99
	0,32	1,17
	0,40	1,32
	0,45	1,41
	0,50	1,50
Odlehčení	0,25	1,37
	0,12	1,26
	0,00	0,87
	0,00	0,87
2. zatěžovací cyklus	0,08	1,08
	0,16	1,19
	0,24	1,30
	0,32	1,38
	0,40	1,47
	0,45	1,53

Poloha v konstrukci

podkladní štěrková vrstva

Datum zkoušení: 29.3.21

Hodina zkoušení: 9.30 h

Počasí: polojasno

Teplota vzduchu: 6°C

Materiál pod deskou: původní podklad


Výsledky zkoušky:

$E_{def,1}$ 66,96 MPa

$E_{def,2}$ 171,99 MPa

$E_{def,2}/E_{def,1}$ 2,57

Grafický záznam naměřených hodnot

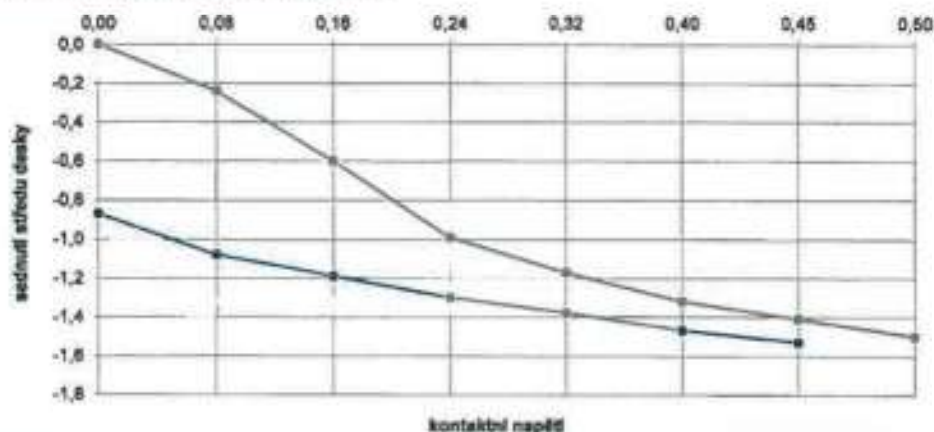

zkoušku provedl: Radek Pazyna

schválil: Radek Pazyna

zpracoval: Radek Pazyna

datum vydání protokolu: 29.03.2021

Zpráva obsahuje jednu stranu a bez písemného souhlasu laboratoře nesmí být reprodukována jinak.

Ve zprávě uvedené výsledky se vztahují pouze na uvedené místo a čas měření a nelze je vztahovat k jiným místům.

převzal:

datum:

Statická zatěžovací zkouška č.: 100

Objednatel: Froněk, spol. s r.o.

Stavba: III/2371 Lužná - II. etapa

číslo zakázky: 1/20/081

Zkoušeno podle: ČSN 72 1006

Místo zkoušení: SO 101.2 - km 1,380, LS, křižovatka

Záznam výsledků měření

	napětí (MPa)	deformace (mm)
1. zatěžovací cyklus	0,08	0,07
	0,16	0,20
	0,24	0,28
	0,32	0,40
	0,40	0,50
	0,45	0,55
	0,50	0,59
Odlehčení	0,25	0,53
	0,12	0,36
	0,00	0,07
	0,00	0,07
2. zatěžovací cyklus	0,08	0,15
	0,16	0,24
	0,24	0,34
	0,32	0,43
	0,40	0,50
	0,45	0,54

Poloha v konstrukci

podkladní šetrková vrstva

Datum zkoušení: 29.3.21

Hodina zkoušení: 10.30 h

Počasí: polojasno

Teplota vzduchu: 6°C

Materiál pod deskou: původní podklad


Výsledky zkoušky:

 $E_{def,1}$ 173,10 MPa

 $E_{def,2}$ 212,54 MPa

 $E_{def,2}/E_{def,1}$ 1,23

Grafický záznam naměřených hodnot

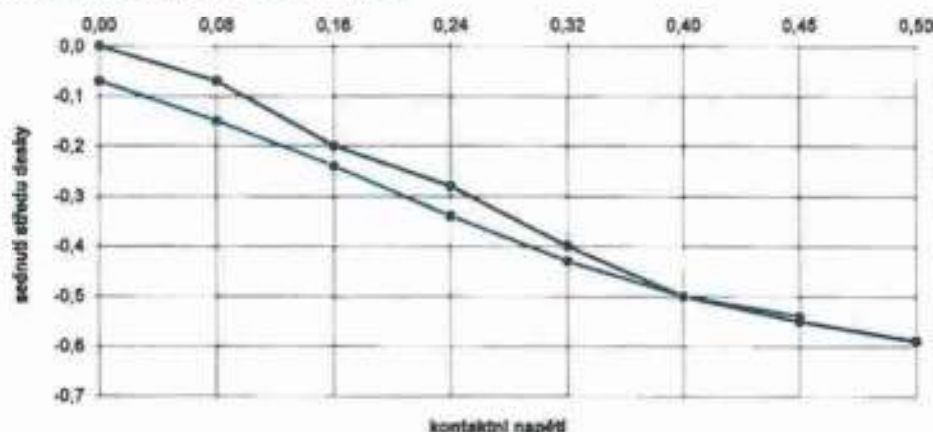

zkoušku provedl: Radek Pazyna

zpracoval: Radek Pazyna

datum vydání protokolu: 29.03.2021

schválil: Radek Pazyna

Zpráva obsahuje jednu stranu a bez písemného souhlasu laboratoře nesmí být reprodukována jinak, než celá.

Ve zprávě uvedené výsledky se vztahují pouze na uvedené místo a čas měření a nelze je vztahovat k jiným místům.

převzal:

datum:

Statická zatěžovací zkouška č.:

101

Objednatel: Froněk, spol. s r.o.

Stavba: III/2371 Lužná - II. etapa

Číslo zakázky: 1/20/081

Zkoušeno podle: ČSN 72 1006

Místo zkoušení: SO 101.2 - km 1,380, PS, č.p.78

Záznam výsledků měření

	napětí (MPa)	deformace (mm)
1. zatěžovací cyklus	0,08	0,25
	0,16	0,38
	0,24	0,49
	0,32	0,55
	0,40	0,63
	0,45	0,68
	0,50	0,73
Odlehčení	0,25	0,70
	0,12	0,55
	0,00	0,25
2. zatěžovací cyklus	0,08	0,41
	0,16	0,46
	0,24	0,53
	0,32	0,62
	0,40	0,68
	0,45	0,73

Poloha v konstrukci

podkladní šetrková vrstva

Datum zkoušení: 29.3.21

Hodina zkoušení: 11.30 h

Počasí: jasno

Teplota vzduchu: 6°C

Materiál pod deskou: původní podklad


Výsledky zkoušky:

$E_{det,1}$ 191,76 MPa

$E_{det,2}$ 232,79 MPa

$E_{det,2}/E_{det,1}$ 1,21

Grafický záznam naměřených hodnot

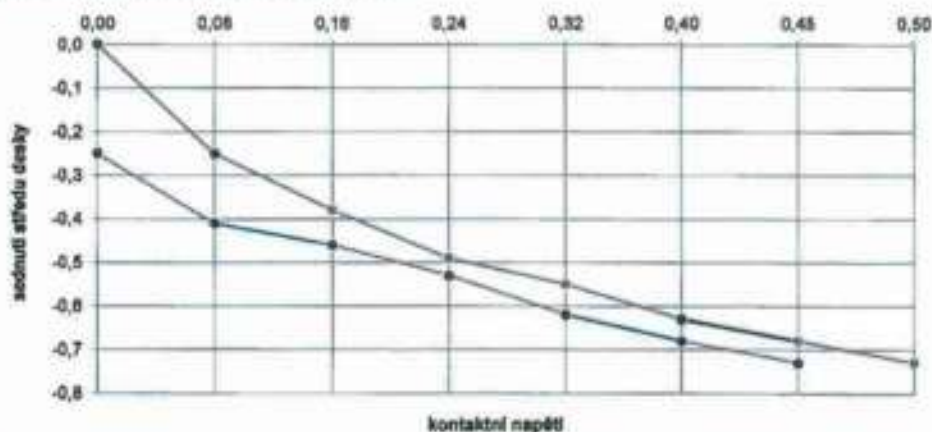

zkoušku provedl: Radek Pazyna

zpracoval: Radek Pazyna

datum vydání protokolu: 29.03.2021

schválil: Radek Pazyna

Zpráva obsahuje jednu stranu a bez písemného souhlasu laboratoře nesmí být reprodukována jinak, než celá.

Ve zprávě uvedené výsledky se vztahují pouze na uvedené místo a čas měření a nelze je vztahovat k jiným místům.

převzal:

datum:

Froněk, spol. s r.o.
Zátiší 2488, CZ 269 01 Rakovník
tel. +420 313 517 276
fax +420 313 516 361
www.fronek.cz, info@fronek.cz

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, p.o.
Šárka Balážová
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5 Smíchov

Vyřizuje: Jiří Karel

datum 20.6.2021

OZNÁMENÍ

Při odstranění žulových kostek v komunikaci průtahu III/2371 Lužná, byla nalezena vyhovující konstrukce původní komunikace (viz protokoly SZZ – příloha č. 1). Parametry konstrukce jsou vyhovující dle RDS. Tímto oznamujeme vznik méněprací, které vyčíslíme formou ZBV.

S pozdravem

Jiří Karel
www.fronek.cz

Přílohy:

Protokoly – statická zatěžovací zkouška

**Froněk, spol. s r.o.
Zátiší 2488
269 01 Rakovník**

Váš dopis značky/ze dne

Naše značka

Vyřizuje/telefon
Š. Balázová / 607 584 721

Kladno
24.6.2021

III/2371 Lužná - vyjádření k nepředvídatelným změnám

Na základě oznámení zhotovitele stavby „III/2371 Lužná“ ze dne 20.6.2021 se jedná o následující nepředvídatelnou změnu:

- při odstranění žulových kostek na komunikaci III/2371 v průtahu obce Lužná byly zjištěny vyhovující konstrukční vrstvy původní komunikace (viz. protokoly statické zatěžovací zkoušky), a proto je navrženo ponechání stávající konstrukce komunikace

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace (dále jen KSÚS SK), jako správce a zároveň zástupce Středočeského kraje jako vlastníka silnic II. a III. tříd, tj. dotčené krajské komunikace III/2371, a jako zadavatele výše zmíněné stavby tímto vydává pokyn k realizaci dle zhotovitelem předloženého navrženého řešení a zároveň žádá zhotovitele o zpracování ZBV k těmto změnám stavby, a to v souladu se zákonem o zadávání VR a příslušnou směrnicí KSÚS SK.

Přílohy: Oznámení zhotovitele o nepředvídatelných změnách ze dne 20.6.2021 včetně doložených protokolů (statické zatěžovací zkoušky č.: 98 - 101)

S pozdravem

Karel Motal

Zápis z kontrolního dne stavby ze dne 31.8.2021 Akce: Rekonstrukce komunikace Lužná III/2371

Kontrolní den stavby.

číslo : 16 konaný dne 31.8.2021 Rekonstrukce komunikace Lužná III/2371

Účastníci

Seznam účastníků je uveden v příloze č. 1 – Prezenční listina

Program kontrolního dne.

1. Plnění Technické specifikace (TP, TKP, ZTKP, normy, technologické předpisy, atd.)
2. Plnění věcného harmonogramu
3. Popis provedených prací
4. Kontrola kvality provedených prací
5. Odsouhlasení a převzetí prací
6. Různá
7. Nové úkoly
8. Závěr

1. Plnění Technické specifikace (TP, TKP, ZTKP, normy, TaPf, atd.)

- 1.1. Zhotovitel předal technologické předpisy na pokládku asfaltových směsí a ocelové sítě Road Mesh L 20.11.2020
- 1.2. Harmonogram prací – splněno a předáno 9.11.2020
- 1.3. V případě zpoždění prací zhotovitel provede aktualizaci harmonogramu.
- 1.4. Dne 27.11.2020 byl předán kontrolní a zkušební plán na komunikaci.
- 1.5. Dopracovat detaily odvodnění a výšek na objektu SO 201 most – **splněno**.
- 1.6. Přepracovat KZP na objekt SO201 most – **splněno**.

2. Plnění věcného harmonogramu

Stavební práce ukončeny dle harmonogramu.

3. Popis provedených prací

Stavební práce ukončeny.

4. Kontrola kvality provedených prací

Stavební práce ukončeny.

5. Odsouhlasení a převzetí prací

Stavební práce ukončeny.

6. Různá

Dnešního dne proběhlo jednání ohledně ZBV na stavbu Lužná. Bylo odsouhlaseno mezi zhotovitelem, TDS a investorem toto:

- 1) **Sanace** – po odfrézování komunikace byl zjištěn skutečný stav podkladních vrstev, které nevykazují známky deformace. Položky související se sanací v km 0,000 – km 0,912 nebudou zhotovitelem čerpány a budou součástí ZBV
- 2) **Propustek** – po vyčištění krajnic a příkopů byl v místě nově navrženého propustku zjištěn skutečný stav v podobě plně funkčního stávajícího propustku DN 800 pod komunikací. Z důvodu zásahu do

skladby únosné konstrukce komunikace se zhotovení nového propustku nebude realizovat, pouze dojde k propláchnutí a vyčištění stávajícího propustku.

- 3) **Horská vpust** – při pochůzce na KD byl zjištěn stav kontrolní plastové šachty SO 101.1, na kterou bude osazen kanalizační poklop, který bude výškově upraven do stávajícího terénu. Tato šachta bude plnit funkci navrhované horské vpusti, do které bude zaústěna drenáž z SO 101.1 a SO 101.2.

7. Předchozí úkoly

Úkol číslo	Název	Obsah úkolu a požadovaný cílový stav	Odpovídá	Termín
------------	-------	--------------------------------------	----------	--------

Zasegal

Jméno
Petr Stoklasa
Technický dozor stavby
SAFETY PRO s.r.o.

Podpis

Přílohy

Číslo	Název
Rekonstrukce silnice Lužná III/2371	
1	Prezenční listina
	Viz příloha č. 1

Průběh:

K zápisu z KD stavby: **Rekonstrukce silnice Lužná III/2371**

*Účastníci jednání: **Ing. Jiří Kříž**
Prezident hostů*

Kontrolní den stavby

Číslo	Konání dne	Rekonstrukce silnice Lužná III/2371		
Jméno, příjmení, titul	Organizace, funkce	Telefon	E-mail	Podpis
Petr Prokopa	SAFETY PRO s.r.o.			
Jiří Kříž	FRONEX			
Anna Balcerová	KSU S.S4			

Froněk, spol. s r.o.
Zátíší 2488, CZ 269 01 Rakovník
tel. +420 313 517 276
fax +420 313 516 361
www.fronek.cz, info@fronek.cz

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, p.o.
Šárka Balážová
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5 Smíchov

Vyřizuje: Bc. Jiří Karel
tel. 778 752 408
jiri.karel@fronek.cz

datum: 2.9.2021

Stavba: III/2371 Lužná – rekonstrukce silnice
S-3027/00066001/2020
Věc: Oznámení

Vážená paní Balážová,

Na základě zápisu z KD ze dne 31.8.2021 posíláme oznámení o vzniku méněprací na SO 101.1 (menší rozsah sanací, zachování původního propustku) a SO 301 (nahrazení horské vpusti stávající plastovou šachtou).

Přílohou přikládáme zápis z KD ze dne 31.8.2021. Prosíme o zaslání pokynu pro zpracování ZBV na shora uvedené stavební objekty.

S pozdravem

Jiří/Karel
stavbyvedoucí

**Froněk, spol. s r.o.
Zátiší 2488
269 01 Rakovník**

Váš dopis značka/ze dne

Naše značka

Vyřizuje/telefon
Š. Balážová /

Kladno
3.9.2021

III/2371 Lužná - vyjádření k nepředvídatelným změnám

Na základě oznámení zhotovitele stavby „III/2371 Lužná“ ze dne 2.9.2021 se jedná o následující nepředvídatelnou změnu:

- po odfrézování komunikace na SO 101.1 bylo zjištěno, že podkladní vrstvy nevykazují známky deformace, a proto rozsah sanací v km 0,000 – 0,912 nebude dle zadaného rozpočtu čerpán a dále bylo po vyčištění krajnic a příkopů zjištěno, že stávající propustek DN 600 pod komunikací je plně funkční (propláchnutí a vyčištění stávajícího propustku), z tohoto důvodu se nebude realizovat budování nového se zásahem do únosné skladby konstrukce komunikace
- na KD bylo rozhodnuto o zachování plastové šachty, na kterou bude osazen kanalizační poklop s výškovou úpravou, místo navrhované horské vpusti

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace (dále jen KSÚS SK), jako správce a zároveň zástupce Středočeského kraje jako vlastníka silnic II. a III. tříd, tj. dotčené krajské komunikace III/2371, a jako zadavatele výše zmíněné stavby tímto vydává pokyn k realizaci dle zhotovitelem předloženého navrženého řešení a zároveň žádá zhotovitele o zpracování ZBV k těmto změnám stavby, a to v souladu se zákonem o zadávání VŘ a příslušnou směrnicí KSÚS SK.

Přílohy: Oznámení zhotovitele o nepředvídatelných změnách ze dne 2.9.2021 včetně zápisu z KD ze dne 31.8.2021

S pozdravem

Karel Motal
vedoucí TSÚ - oblast Kladno

REKONSTRUKCE KOMUNIKACE LUŽNÁ III/2371 LUŽNÁ

STANOVISKO K ZBV č. 4

Méněpráce na sanacích podloží s ohledem na skutečně zastižené podmínky v průběhu provádění prací

Dle předběžných průzkumů pro zpracování PDPS bylo předpokládáno určité množství prací nezbytných pro sanaci podloží na úsecích silnice, v místech, kde byl zjištěn nevhodný stav podloží.

V průběhu provádění stavby byly na více místech vhodné konstrukční vrstvy původní vozovky ze štětové dlažby. V dotčených místech byly provedeny statické zatěžovací zkoušky, které prokázaly vyhovující stav podkladu.

V dotčených místech bylo navrženo ponechání stávající konstrukce vozovky, na které nebylo nutné provádět navržené sanace, což prokázaly statické zatěžovací zkoušky.

S navrženými změnami a zpracováním ZBV souhlasím.

21.9.2021

Petr Stoklasa

TDI

NAŠE ZNAČKA:

PH I-Kon-0106-2021
Ing. Vladimír Koniček
tel:

VYŘIZUJE:

DATUM:

23. 09. 2021

**Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, p.o.
Karel Motal
Zborovská 11
150 21 Praha 5**

Akce: III/2371 Lužná, rekonstrukce silnice

Věc: Stanovisko AD k ZBV č. 2 až ZBV č. 6

AD byl požádán o stanovisko k ZBV č. 2 SO 101.1/1, č. 3 SO 101.1/2, č. 4 SO 101.2/1, č. 5 SO 301/1 a č. 6 SO 190/1. Pro vyjádření AD je podkladem předložený koncept ZBV.

AD prověřil návrh změn ZBV č. 2 až č. 6 a vydává následující stanovisko k předloženým dokladům:

ZBV č. 2 SO 101.1/1

ad 1: AD souhlasí se změnou. Změna vychází z:

- Oznámení zhotovitele z 9.8.2021
- Pokyn objednatele z 10.8.2021
- Stanovisko TDI z 21.8.2021

ad 2: AD bere změnu na vědomí. Změna vznikla na základě zjištění nepředvídatelné skutečnosti – zhoršeného stavu vozovky.

ad 3: AD souhlasí s navrženým řešením.

1. Dle AD je navrhované řešení technicky přijatelné, neboť nepředstavuje podstatnou technickou změnu díla. K ceně ZBV se AD nevyjadřuje.
2. Ověření objemů provedených prací (tj. výměry či objemy provedených změn na stavbě) a dohled nad jejich kvalitou, je odpovědností TDI.

ZBV č. 3 SO 101.1/2

ad 1: AD souhlasí se změnou. Změna vychází z:

- Zápis z KD z 31.8.2021
- Oznámení zhotovitele z 2.9.2021
- Pokyn objednatele z 3.9.2021
- Stanovisko TDI z 21.8.2021

ad 2: AD bere změnu na vědomí. Změna vznikla na základě zjištění nepředvídatelné skutečnosti – zastížení podkladních vrstev vozovky v takovém stavu, který umožňuje jejich ponechání bez navržených sanací.

ad 3: AD souhlasí s navrženým řešením.

1. Dle AD je navrhované řešení technicky přijatelné, neboť nepředstavuje podstatnou technickou změnu díla. K ceně ZBV se AD nevyjadřuje.
2. Ověření objemů provedených prací (tj. výměry či objemy provedených změn na stavbě) a dohled nad jejich kvalitou, je odpovědností TDI.

ZBV č. 4 SO 101.2/1

ad 1: AD souhlasí se změnou. Změna vychází z:

- Zápis z KD z 31.8.2021
- Oznámení zhotovitele z 2.9.2021
- Pokyn objednatele z 3.9.2021
- Stanovisko TDI z 21.8.2021

ad 2: AD bere změnu na vědomí. Změna vznikla na základě zjištění nepředvídatelné skutečnosti – zjištění, že stávající propustek je po vyčištění plně funkční a není třeba realizovat propustek nový.

ad 3: AD souhlasí s navrženým řešením.

3. Dle AD je navrhované řešení technicky přijatelné, neboť nepředstavuje podstatnou technickou změnu díla. K ceně ZBV se AD nevyjadřuje.
4. Ověření objemů provedených prací (tj. výměry či objemy provedených změn na stavbě) a dohled nad jejich kvalitou, je odpovědností TDI.

ZBV č. 5 SO 301/1

ad 1: AD souhlasí se změnou. Změna vychází z:

- Zápis z KD z 31.8.2021
- Oznámení zhotovitele z 2.9.2021
- Pokyn objednatele z 3.9.2021
- Stanovisko TDI z 21.8.2021

ad 2: AD bere změnu na vědomí. Změna vznikla na základě zjištění nepředvídatelné skutečnosti – možnost nahrazení navržené HV stávající plastovou šachtou.

ad 3: AD souhlasí s navrženým řešením.

5. Dle AD je navrhované řešení technicky přijatelné, neboť nepředstavuje podstatnou technickou změnu díla. K ceně ZBV se AD nevyjadřuje.
6. Ověření objemů provedených prací (tj. výměry či objemy provedených změn na stavbě) a dohled nad jejich kvalitou, je odpovědností TDI.

ZBV č. 6 SO 190/1

ad 1: AD souhlasí se změnou. Změna vychází z:

- Oznámení zhotovitele z 9.8.2021
- Pokyn objednatele z 10.8.2021
- Stanovisko TDI

ad 2: AD bere změnu na vědomí. Změna vznikla na základě řešení nepředvídatelné skutečnosti v rámci ZBV č.2 – změna rozsahu opravy vozovky si vyžádala změnu rozsahu DIO

ad 3: AD souhlasí s navrženým řešením.

7. Dle AD je navrhované řešení technicky přijatelné, neboť nepředstavuje podstatnou technickou změnu díla. K ceně ZBV se AD nevyjadřuje.

Ověření objemů provedených prací (tj. výměry či objemy provedených změn na stavbě) a dohled nad jejich kvalitou, je odpovědností TDI.

Další připomínky k ZBV AD neuplatňuje.

S pozdravem

Ing. Vladimír Koniček
ředitel Ateliéru Praha I

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby: III/2371 Lužná - S-3027/00066001/2020 Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 301 Doplnění uličních vpustí Číslo a název podobjektu/rozpočtu: 301 Doplnění uličních vpustí		Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 301/1	Číslo ZBV: 5
Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov IČ 00066001			
Zhotovitel: Froněk, spol.s r.o. Zátíší 2488, 269 01 Rakovník IČ 47534690			

Rekapitulace ZBV č. 5 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5.3	-38 980,00	0,00	-38 980,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5.4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5	-38 980,00	0,00	-38 980,00

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
 Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
 a pro Rozpis ocenění změn položek.

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: III/2371 Lužná - S-3027/00066001/2020 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 301 Doplnění uličních vpustí	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 301/1	Číslo ZBV: 5.3
--	--	-------------------

Strany smlouvy o dílo objednatel č.: S-3027/00066001/2020 a zhotovitel č.: 120081 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 23.10.2020 (dále jen Smlouva).

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: Froněk, spol.s r.o., Zátěží 2486, 269 01 Rakovník

Přílohy Změnového listu:

1. Krycí list	1	počet listů
2. Změnový list	2	počet listů
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů
4. Rozpis ocenění Změn položek ZBV 2	1	počet listů
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů
Další doklady dle přehledu dokladů	12	počet listů

Paré č.	Příjemce
1, 2	Objednatel
3	Zhotovitel
4	Projektant (AD)
5	Stavební dozor

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Méněpráce – neprovedení horské vpusti – s ohledem na skutečně zastížené podmínky v průběhu provádění prací

1) V návrhu zakázky bylo předpokládáno provedení dvou kusů kanalizačních horských vpustí z betonových dílců, které spočívalo ve výměně stávajících vpustí. Kompletní provedení vpustí bylo ve Smluvním soupisu prací zahrnuto v položce poř. č. 16-89722 (2 kusy).

2) V průběhu provádění stavby byl při pochůzce na KD ověřen stav a funkčnost kontrolní plastové šachty SO 101.1, na kterou bude osazen kanalizační poklop, výškově upravený do stávajícího terénu. Do této šachty bude zaústěna drenáž z SO 101.1 a SO 101.2. Tímto bude šachta plnit funkci nové horské vpusti navrhované v PDPS.

3) Vzhledem k uvedenému bylo konstatováno, že nebude nutné provádět jednu horskou vpust, jejíž provedení bylo předpokládáno v PDPS, neboť bylo zhodnoceno, že se její realizace jeví jako nadbytečná. Tento návrh byl odsouhlasen TDI.

Na základě uvedených skutečností lze konstatovat, že změny, týkající se neprovedení původně navržené horské vpusti, bylo možné odhalit až během samotné realizace Díla, na základě skutečně zastížených podmínek v místě provádění prací. Skutečný stav stávající kontrolní šachty a její využití namísto nové horské vpusti, bylo možné odhalit během realizace stavby. Proto je možné konstatovat, že se jedná o okolnosti, které zadavatel (ani projektant Zadávací dokumentace) jednající s náležitou péčí nemohli rozumně předvídat.

4) Změny byly iniciovány Zhotovitelem a podkladem pro tuto změnu je doklad č. 08 -- Zápis z KD stavby č. 16 ze dne 31. 8. 2021.

5) Tato změna se týká odpočtu jednoho kusu položky poř. č. 16.

V rámci této změny nedochází k řetězení změn, neboť tato změna nevyvolává potřebu jiných změn.

Uvedená změna vznikla na základě nepředvídaného zjištěného skutečného stavu stávajících konstrukcí po zahájení stavby. Jednalo se o Změnu nepodstatnou, nepředvídanou, která je tak podle § 5 odst. 1, c), resp. podle § 10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29. 05. 2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 3. Zároveň se jednalo o práce, které neměly celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tyto Změny nepředstavují vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jednalo o změny nepředvídané.

Údaje v Kč bez DPH

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-38 980,00	0,00	-38 980,00	38 980,00

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí):	jméno	Bc. Jiří Karel	datum	15.12.2021	podpis
Projektant (autorský dozor):	jméno	Ing. Vladimír Koniček	datum	15.12	podpis
Stavební dozor:	jméno	Per Stoklasa	datum		podpis
Zástupce Objednatel: KSÚS SK, p.o.	jméno	Karel Motál	datum	15.12.2021	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitel sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel)	jméno	Ing. Jan Lichneger	datum	17-12-2021	podpis
Zhotovitel	jméno	Ing. Kamil Hrbek	datum	15.12.2021	podpis

Číslo par

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 5

Název a evidenční číslo Stavby: III/2371 Lužná - S-3027/00066001/2020
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 301/1
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 301 Doplnění uličních vpustí

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
1 080 125,80

Poznámka:

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	1 080 125,80	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-38 980,00	0,00	0,00	0,00%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-38 980,00	1 041 145,80	-38 980,00	-3,61%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

souhlasím

Bc. Jiří Karel

15.12.2021

Projektant (autorský dozor):

souhlasím

Ing. Vladimír Koniček

Stavební dozor:

souhlasím

Per Stoklasa

Zástupce Objednatelů KSÚS:

souhlasím

Karel Motal

Zaměstnanec KSÚS
odpovědný za cenové
projednání Změny:

souhlasím

Ing. Jaroslava Jurková

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 5.3

Název a evidenční číslo stavby: III/2371 Lužná - S-3027/00066001/2020 Číslo a název SO/PS: 301 Doplnění uličních vpustí Číslo a název podobjektu/rozpočtu: 301 Doplnění uličních vpustí								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) 301/1 Skupina změn 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	89722	VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ	KU/S	2,000	1,000	-1,000	38 980,00	77 960,00	-38 980,00	0,00	38 980,00	-38 980,00	-50,00%
CELKEM								77 960,00	-38 980,00	0,00	38 980,00	-38 980,00	

Odpovědný zástupce Objednatelů i odpovědný zástupce Zhotovitelů odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
 Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Bc. Jiří Karel, stavbyvedoucí

Datum: 15.12.2021

Podpis:

Za Objednatelů: Karel Motál, vedoucí oblasti KSÚS Kladno

Datum:

Podpis:

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	5
Název a evidenční číslo stavby:	III/2371 Lužná - S-3027/00066001/2020
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	301 Doplnění uličních vpustí
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	301/1

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
07 Změnový soupis prací SO 301 po změně 1	4	
08 Zápis z KD stavby č. 16 ze dne 31.8.2021	3	
09 Oznámení zhotovitele o změně ze dne 2.9.2021	1	
10 Pokyn objednatele ke změně ze dne 3.9.2021	1	
11 Stanovisko TDI k ZBV 5	1	
12 Stanovisko AD k ZBV 2 - 6	2	
Počet listů celkem	12	

Změnový soupis prací SO 301 po změně 1 pro ZBV 5

Název a evidenční číslo stavby:	112371 Lučná - S-3027/0000001/2020	ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
Číslo a název SO/PS:	301 Doplnění uličních vpustí	
Číslo a název podobjektu/rápočtu:	301 Doplnění uličních vpustí	

Por. č. pol.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny připomně v Kč	Změny klasické v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
0 Všeobecné konstrukce a práce													
1	014101	POPLATKY ZA SKLADKU - změna 167 300 (A) dle pol. 13273 SO	M3	157,300	157,300	0,000	90,00	9 438,00	0,00	0,00	9 438,00	0,00	0,00%
- položka obsahuje veškeré poplatky provozovatel skalky související s umístěním odpadu na skládce													
- v ceně zahrnuté odčernění, manipulace při skládání na řízené skládce a zaplacení poplatku skalkovně													
1 Zemní práce													
2	11130	SEJMUTÍ ZEMNÍ 50" x 1000 000 (A)	M3	96,000	96,000	0,000	43,00	4 128,00	0,00	0,00	4 128,00	0,00	0,00%
- vyčištění, odvoz a uložení zru. zařízení rozpuštěním													
- včetně vodotěsné obložky a uložení na skládce													
3	12573	VÝKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLADKOVÝ TR. I 200 2=200 200 (A) pro pol. 17477	M3	200,200	200,200	0,000	72,00	14 414,40	0,00	0,00	14 414,40	0,00	0,00%
- položka zahrnuje													
- vodotěsná a svahová doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem													
- kompletní provedení výkopky nezápalné i zapalné													
- střežení výkopků po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření													
- střežení výkopků v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zaplacení													
- střežení pod vodou, v okolí výhledů, ve střežných prostorech a pod													
- příplatek za teplost													
- měření po vrstvách, pásech a po jiných rutných částech (figurách)													
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpadla skupiny (viz ustanovení k pol. 1151.2)													
- potřebné snížení hladiny podzemní vody													
- měření a rozpočítání jednotlivých balvanů													
- vytahování a nošení výkopů													
- ruční výkopky, odstraňování kořenů a napátek													
- pažení, vzpříčení a narušení vč. přepažování (význa žlutých zábr)													
- oprava, ochrana a odložení dna, základové spáry, stěn a svahů													
- udržování výkopků a jeho ochrana proti vodě													
- odvedení nebo odvězení vody v okolí výkopků a ve výkopcích													
- vlastní výkopku													
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopky (říjce, spazky, náklady, lešení, podpory, kotevné, přetahovací, zpevňovací prvky, zakrytí a pod.)													
- výhledy a bezpečnost													
4	13273	HLUBŠÍ RYH (SR DO 2M PAŽ) (NEPAŽ TR. I) 200 2=200 200 (A) pro pol. 17477	M3	200,200	200,200	0,000	272,00	54 454,40	0,00	0,00	54 454,40	0,00	0,00%
- položka zahrnuje													
- vodotěsná a svahová doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem													
- kompletní provedení výkopky nezápalné i zapalné													
- střežení výkopků po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření													
- střežení výkopků v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zaplacení													
- střežení pod vodou, v okolí výhledů, ve střežných prostorech a pod													
- příplatek za teplost													
- měření po vrstvách, pásech a po jiných rutných částech (figurách)													
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpadla skupiny (viz ustanovení k pol. 1151.2)													
- potřebné snížení hladiny podzemní vody													
- měření a rozpočítání jednotlivých balvanů													
- vytahování a nošení výkopů													
- svahování a přehozování svahů do konečného tvaru, výměna termit v podlaží a v pláči													
- zneškodnění klimatických věv													
- ruční výkopky, odstraňování kořenů a napátek													
- pažení, vzpříčení a narušení vč. přepažování (význa žlutých zábr)													
- oprava, ochrana a odložení dna, základové spáry, stěn a svahů													
- udržování výkopků a jeho ochrana proti vodě													
- odvedení nebo odvězení vody v okolí výkopků a ve výkopcích													
- vlastní výkopku													
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopky (říjce, spazky, náklady, lešení, podpory, kotevné, přetahovací, zpevňovací prvky, zakrytí a pod.)													
5	13273	HLUBŠÍ RYH (SR DO 2M PAŽ) (NEPAŽ TR. I) 200 2=200 200 (A) pro pol. 17477 Celkem: A+B=157,300 (C)	M3	157,300	157,300	0,000	288,00	45 302,40	0,00	0,00	45 302,40	0,00	0,00%

		položka zahrnuje: - odřez s tlakem, kole na talnu, - dodání čerstvého betonu (betonové lamby) požadované kvality, jeho uložení do požadované tvary při jakémkoliv množství výstuže, součástí čerstvého betonu a způsobu uzavření, ošetření a ochrany betonu, - zhotovení nepraskavého, uzavíracího betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologi výroby betonu, - příjezd pracovníků a stavebních apar, včetně potřebných úprav, výšek, vlnček, opasování, odřezání a ošetření, - bednění požadovaných tvarů (i ztracený) s úpravou do požadované kvality povrchu betonu, včetně odobívacích a odvětrávacích průsvitů, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, průstupů, dutin, drážek a podob., vč. zřízení prázny a úpravy kolem nich, - náklady odstraňující stouplý beton a bednění, - vyplň, těsnění a tesaření spojů a spár, - ošetření povrchů betonu izolací proti zemi vlnkami v čládech, kde příjezd do styku se zemí nebo kamenivem, - předmontáž podkladní konstrukce	KUJ	47,000	47,000	0,000	7 780,00	383 980,00	0,00	0,00	383 980,00	0,00	0,00%
14	89712	VÝPUSŤ KANAIZAČNÍ LAJČNÍ KOMPLETNĚ Z BETONOVÝCH DLČO	KUJ	18,000	18,000	0,000	3 540,00	83 900,00	0,00	0,00	83 900,00	0,00	0,00%
		položka zahrnuje: - dodávku a osazení předepsaných dílů včetně odřez - vyplň, těsnění a tesaření spojů a spár, - ošetření povrchů betonu izolací proti zemi vlnkami v čládech, kde příjezd do styku se zemí nebo kamenivem, - předmontáž podkladní konstrukce	KUJ	2,000	2,000	-1,000	38 980,00	77 960,00	-38 980,00	0,00	38 980,00	-38 980,00	-50,00%
16	89720	VÝPUSŤ KANAIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNĚ Z BETON DLČO	KUJ	1,000	1,000	0,000	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00%
		položka zahrnuje: - dodávku a osazení předepsaných dílů včetně odřez - vyplň, těsnění a tesaření spojů a spár, - ošetření povrchů betonu izolací proti zemi vlnkami v čládech, kde příjezd do styku se zemí nebo kamenivem, - předmontáž podkladní konstrukce	KUJ	44,000	44,000	0,000	2 300,00	127 600,00	0,00	0,00	127 600,00	0,00	0,00%
17	89720R	VÝPUSŤ HORSKÁ - VYBOURÁNÍ	KUJ	37,186,88	37,186,88	0,00	0,00	37 186,88	0,00	0,00	37 186,88	0,00	0,00%
		kompletní provedení, odřez a uložení vybořeného materiálu na skládku, včetně poplatku za skládku položka zahrnuje: - dodávku a osazení předepsaných dílů včetně odřez - vyplň, těsnění a tesaření spojů a spár, - ošetření povrchů betonu izolací proti zemi vlnkami v čládech, kde příjezd do styku se zemí nebo kamenivem, - předmontáž podkladní konstrukce	KUJ	108,000	108,000	0,000	330,00	37 100,00	0,00	0,00	37 100,00	0,00	0,00%
18	899001	PŘÍPOJE PN PŘÍPOJEK	KUJ	108,000	108,000	0,000	330,00	37 100,00	0,00	0,00	37 100,00	0,00	0,00%
		napojení přípoje na stěh, potrubí, zastřešení položka zahrnuje i: na potrubí, dodání a osazení příslušných tvarovek a armatur						37 186,88	0,00	0,00	37 186,88	0,00	0,00%
19	900204R	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM	M	108,000	108,000	0,000	330,00	37 100,00	0,00	0,00	37 100,00	0,00	0,00%
		kompletní provedení, odřez a uložení vybořeného materiálu na skládku, včetně poplatku za skládku vyboření stávajícího potrubí 1000 108 000 (M) - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybořenou sítí a tesaření včetně uložení na skládku. Nezapomíná poplatek za skládku. Měly by vykazovat v položce 0141** či výjimkou malého množství bořného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny boření - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce - položka zahrnuje veškeré náklady práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů						37 186,88	0,00	0,00	37 186,88	0,00	0,00%
		CELNEM					1 088 125,80	-38 980,00	0,00	1 049 145,80	-38 980,00	-3,81%	

Zápis z kontrolního dne stavby ze dne 31.8.2021 Akce: Rekonstrukce komunikace Lužná III/2371

Kontrolní den stavby.

číslo : 16 konaný dne 31.8.2021 Rekonstrukce komunikace Lužná III/2371

Účastníci

Seznam účastníků je uveden v příloze č. 1 – Prezenční listina

Program kontrolního dne.

1. Plnění Technické specifikace (TP, TKP, ZTKP, normy, technologické předpisy, atd.)
2. Plnění věcného harmonogramu
3. Popis provedených prací
4. Kontrola kvality provedených prací
5. Odsouhlasení a převzetí prací
6. Různá
7. Nové úkoly
8. Závěr

1. Plnění Technické specifikace (TP, TKP, ZTKP, normy, TaPf, atd.)

- 1.1. Zhotovitel předal technologické předpisy na pokládku asfaltových směsí a ocelové síť Road Mesh L 20.11.2020
- 1.2. Harmonogram prací – splněno a předáno 9.11.2020
- 1.3. V případě zpoždění prací zhotovitel provede aktualizaci harmonogramu.
- 1.4. Dne 27.11.2020 byl předán kontrolní a zkušební plán na komunikaci.
- 1.5. Dopracovat detaily odvodnění a výšek na objektu SO 201 most – **splněno**.
- 1.6. Přepracovat KZP na objekt SO201 most – **splněno**.

2. Plnění věcného harmonogramu

Stavební práce ukončeny dle harmonogramu.

3. Popis provedených prací

Stavební práce ukončeny.

4. Kontrola kvality provedených prací

Stavební práce ukončeny.

5. Odsouhlasení a převzetí prací

Stavební práce ukončeny.

6. Různá

Dnešního dne proběhlo jednání ohledně ZBV na stavbu Lužná. Bylo odsouhlaseno mezi zhotovitelem, TDS a investorem toto:

- 1) **Sanace** – po odfrézování komunikace byl zjištěn skutečný stav podkladních vrstev, které nevykazují známky deformace. Položky související se sanací v km 0,000 – km 0,912 nebudou zhotovitelem čerpány a budou součástí ZBV
- 2) **Propustek** – po vyčištění krajnic a příkopů byl v místě nově navrženého propustku zjištěn skutečný stav v podobě plně funkčního stávajícího propustku DN 800 pod komunikací. Z důvodu zásahu do

skladby únosné konstrukce komunikace se zhotovení nového propustku nebude realizovat, pouze dojde k propláchnutí a vyčištění stávajícího propustku.

- 3) **Horská vpust** – při pochůzce na KD byl zjištěn stav kontrolní plastové šachty SO 101.1, na kterou bude osazen kanalizační poklop, který bude výškově upraven do stávajícího terénu. Tato šachta bude plnit funkci navrhované horské vpusti, do které bude zaústěna drenáž z SO 101.1 a SO 101.2.

7. Předchozí úkoly

Úkol číslo	Název	Obsah úkolu a požadovaný cílový stav	Odpovídá	Termín
------------	-------	--------------------------------------	----------	--------

Zaseal

Jméno
Petr Stoklasa
Technický dozor stavby
SAFETY PRO s.r.o.

Podpis

Přílohy

Číslo	Název
1	Rekonstrukce silnice Lužná III/2371
	Prezenční listina
	Viz příloha č 1

Průběh:

K zápisu z KČ stavby: **Rekonstrukce silnice Lužná III/2371**

Účastníci jednání:

Prezencem listem

Kontrolní den stavby

číslo: konaný dne:

Rekonstrukce silnice Lužná III/2371

Jméno, příjmení, titul

Organizace, funkce

Telefon, e-mail

Podpis

Petr Prokopa

SAFETY PRO s.r.o.

+420 602 451

Jiří Kaňgl

FRONEX

+420 602 462

Štěpán Balcar

KSU S.S.

+420 602 711

Froněk, spol. s r.o.
Zátíší 2488, CZ 269 01 Rakovník
tel. +420 313 517 276
fax +420 313 516 361
www.fronek.cz, info@fronek.cz

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, p.o.
Šárka Balážová
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5 Smíchov

Vyřizuje: Bc. Jiří Karel

datum: 2.9.2021

Stavba: III/2371 Lužná – rekonstrukce silnice
S-3027/00066001/2020
Věc: Oznámení

Vážená paní Balážová,

Na základě zápisu z KD ze dne 31.8.2021 posíláme oznámení o vzniku méněprací na SO 101.1 (menší rozsah sanací, zachování původního propustku) a SO 301 (nahrazení horské vpusti stávající plastovou šachtou).

Přílohou přikládáme zápis z KD ze dne 31.8.2021. Prosimе o zaslání pokynu pro zpracování ZBV na shora uvedené stavební objekty.

S pozdravem


Jiří Karel
stavbyvedoucí

**Froněk, spol. s r.o.
Zátiší 2488
269 01 Rakovník**

Váš dopis značka/ze dne

Naše značka

Vyřizuje/telefon
Š. Balážová

Kladno
3.9.2021

III/2371 Lužná - vyjádření k nepředvídatelným změnám

Na základě oznámení zhotovitele stavby „III/2371 Lužná“ ze dne 2.9.2021 se jedná o následující nepředvídatelnou změnu:

- po odfrézování komunikace na SO 101.1 bylo zjištěno, že podkladní vrstvy nevykazují známky deformace, a proto rozsah sanací v km 0,000 – 0,912 nebude dle zadaného rozpočtu čerpán a dále bylo po vyčištění krajnic a příkopů zjištěno, že stávající propustek DN 600 pod komunikací je plně funkční (propláchnutí a vyčištění stávajícího propustku), z tohoto důvodu se nebude realizovat budování nového se zásahem do únosné skladby konstrukce komunikace
- na KD bylo rozhodnuto o zachování plastové šachty, na kterou bude osazen kanalizační poklop s výškovou úpravou, místo navrhované horské vpusti

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace (dále jen KSÚS SK), jako správce a zároveň zástupce Středočeského kraje jako vlastníka silnic II. a III. tříd, tj. dotčené krajské komunikace III/2371, a jako zadavatele výše zmíněné stavby tímto vydává pokyn k realizaci dle zhotovitelem předloženého navrženého řešení a zároveň žádá zhotovitele o zpracování ZBV k těmto změnám stavby, a to v souladu se zákonem o zadávání VŘ a příslušnou směrnicí KSÚS SK.

Přílohy: Oznámení zhotovitele o nepředvídatelných změnách ze dne 2.9.2021 včetně zápisu z KD ze dne 31.8.2021

S pozdravem

Karel Mořál
vedoucí TSÚ -

REKONSTRUKCE KOMUNIKACE LUŽNÁ III/2371 LUŽNÁ

STANOVISKO K ZBV č. 5

Měněpráce – neprovedení horské vpusti – s ohledem na skutečně zastížené podmínky v průběhu provádění prací

V návrhu zakázky bylo předpokládáno provedení dvou kusů kanalizačních horských vpustí z betonových dílců, které spočívalo ve výměně stávajících vpustí

Při pochůzce na KD byl ověřen stav a funkčnost kontrolní plastové šachty SO 101.1, na kterou bude osazen kanalizační poklop, výškové upravený do stávajícího terénu. Do předmětné šachty bude zaústěna drenáž z SO 101.1 a SO 101.2. Tímto bude šachta plnit funkci nové horské vpusti navrhované v PDPS.

S navrženými změnami a zpracováním ZBV souhlasím.

11.9.2021

Petr Stoklasa

TDI

NAŠE ZNAČKA:

PH I-Kon-0106-2021
Ing. Vladimír Koniček

VYŘIZUJE:

DATUM:

23. 09. 2021

**Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, p.o.
Karel Motal
Zborovská 11
150 21 Praha 5**

Akce: III/2371 Lužná, rekonstrukce silnice

Věc: Stanovisko AD k ZBV č. 2 až ZBV č. 6

AD byl požádán o stanovisko k ZBV č. 2 SO 101.1/1, č. 3 SO 101.1/2, č. 4 SO 101.2/1, č. 5 SO 301/1 a č. 6 SO 190/1. Pro vyjádření AD je podkladem předložený koncept ZBV.

AD prověřil návrh změn ZBV č. 2 až č. 6 a vydává následující stanovisko k předloženým dokladům:

ZBV č. 2 SO 101.1/1

ad 1: AD souhlasí se změnou. Změna vychází z:

- Oznámení zhotovitele z 9.8.2021
- Pokyn objednatele z 10.8.2021
- Stanovisko TDI z 21.8.2021

ad 2: AD bere změnu na vědomí. Změna vznikla na základě zjištění nepředvídatelné skutečnosti – zhoršeného stavu vozovky.

ad 3: AD souhlasí s navrženým řešením.

1. Dle AD je navrhované řešení technicky přijatelné, neboť nepředstavuje podstatnou technickou změnu díla. K ceně ZBV se AD nevyjadřuje.
2. Ověření objemů provedených prací (tj. výměry či objemy provedených změn na stavbě) a dohled nad jejich kvalitou, je odpovědností TDI.

ZBV č. 3 SO 101.1/2

ad 1: AD souhlasí se změnou. Změna vychází z:

- Zápis z KD z 31.8.2021
- Oznámení zhotovitele z 2.9.2021
- Pokyn objednatele z 3.9.2021
- Stanovisko TDI z 21.8.2021

ad 2: AD bere změnu na vědomí. Změna vznikla na základě zjištění nepředvídatelné skutečnosti – zastížení podkladních vrstev vozovky v takovém stavu, který umožňuje jejich ponechání bez navržených sanací.

ad 3: AD souhlasí s navrženým řešením.

1. Dle AD je navrhované řešení technicky přijatelné, neboť nepředstavuje podstatnou technickou změnu díla. K ceně ZBV se AD nevyjadřuje.
2. Ověření objemů provedených prací (tj. výměry či objemy provedených změn na stavbě) a dohled nad jejich kvalitou, je odpovědností TDI.

ZBV č. 4 SO 101.2/1

ad 1: AD souhlasí se změnou. Změna vychází z:

- Zápis z KD z 31.8.2021
- Oznámení zhotovitele z 2.9.2021
- Pokyn objednatele z 3.9.2021
- Stanovisko TDI z 21.8.2021

ad 2: AD bere změnu na vědomí. Změna vznikla na základě zjištění nepředvídatelné skutečnosti – zjištění, že stávající propustek je po vyčištění plně funkční a není třeba realizovat propustek nový.

ad 3: AD souhlasí s navrženým řešením.

3. Dle AD je navrhované řešení technicky přijatelné, neboť nepředstavuje podstatnou technickou změnu díla. K ceně ZBV se AD nevyjadřuje.
4. Ověření objemů provedených prací (tj. výměry či objemy provedených změn na stavbě) a dohled nad jejich kvalitou, je odpovědností TDI.

ZBV č. 5 SO 301/1

ad 1: AD souhlasí se změnou. Změna vychází z:

- Zápis z KD z 31.8.2021
- Oznámení zhotovitele z 2.9.2021
- Pokyn objednatele z 3.9.2021
- Stanovisko TDI z 21.8.2021

ad 2: AD bere změnu na vědomí. Změna vznikla na základě zjištění nepředvídatelné skutečnosti – možnost nahrazení navržené HV stávající plastovou šachtou.

ad 3: AD souhlasí s navrženým řešením.

5. Dle AD je navrhované řešení technicky přijatelné, neboť nepředstavuje podstatnou technickou změnu díla. K ceně ZBV se AD nevyjadřuje.
6. Ověření objemů provedených prací (tj. výměry či objemy provedených změn na stavbě) a dohled nad jejich kvalitou, je odpovědností TDI.

ZBV č. 6 SO 190/1

ad 1: AD souhlasí se změnou. Změna vychází z:

- Oznámení zhotovitele z 9.8.2021
- Pokyn objednatele z 10.8.2021
- Stanovisko TDI

ad 2: AD bere změnu na vědomí. Změna vznikla na základě řešení nepředvídatelné skutečnosti v rámci ZBV č.2 – změna rozsahu opravy vozovky si vyžádala změnu rozsahu DIO

ad 3: AD souhlasí s navrženým řešením.

7. Dle AD je navrhované řešení technicky přijatelné, neboť nepředstavuje podstatnou technickou změnu díla. K ceně ZBV se AD nevyjadřuje.

Ověření objemů provedených prací (tj. výměry či objemy provedených změn na stavbě) a dohled nad jejich kvalitou, je odpovědností TDI.

Další připomínky k ZBV AD neuplatňuje.

S pozdravem

Ing. Vladimír Koniček
ředitel Ateliéru Praha I/

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby: III/2371 Lužná - S-3027/00066001/2020 Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 190 Dopravně inženýrská opatření Číslo a název podobjektu/rozpočtu: 190 Dopravně inženýrská opatření		Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 190/1	Číslo ZBV: 6
Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov IČ 00066001			
Zhotovitel: Froněk, spol.s r.o. Zátíší 2488, 269 01 Rakovník IČ 47534690			

Rekapitulace ZBV č. 6 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
6.1	0,00	0,00	0,00
6.2	0,00	0,00	0,00
6.3	0,00	0,00	0,00
6.4	0,00	0,00	0,00
6.5	0,00	34 730,00	34 730,00
Suma ZBV č. 6	0,00	34 730,00	34 730,00

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
 Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
 a pro Rozpis ocenění změn položek.

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: III/2371 Lužná - S-3027/00066001/2020	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 190/1	Číslo ZBV: 6.4
---	---	--------------------------

Strany smlouvy o dílo objednatel č.: S-3027/00066001/2020 a zhotovitel č. 120081 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 23.10.2020 (dále jen Smlouva).

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: Froněk, spol.s r.o., Zátíší 2488, 289 01 Rakovník

Přílohy Změnového listu:			Paré č.	Příjemce:
1. Krycí list	1	počet listů	1, 2	Objednatel
2. Změnový list	2	počet listů	3	Zhotovitel
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů	4	Projektant (AD)
4. Rozpis ocenění Změn položek ZBV 2	1	počet listů	5	Stavební dozor
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů		
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů		
Další doklady dle přehledu dokladů	9	počet listů		

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

DIO pro provedení obrusných vrstev na navazujícím úseku silnice III/2371 - od konce obce Lužná až po křižovatku na obec Lišany

1) V rámci zakázky „III/2371 Lužná“ byla dle PDPS plánována oprava silnic v ulicích Čsl. armády, Masarykovo nám. a Tyršova pouze na území obce Lužná a pro tento úsek komunikace bylo také v PDPS uvažováno s DIO.

2) V průběhu provádění stavby bylo rozhodnuto o provedení nových asfaltových vrstev v navazujícím úseku silnice III/2371 od konce obce Lužná až po křižovatku na obec Lišany, který byl v nevyhovujícím stavu. Tento nevyhovující stav v dotčeném úseku se projevil v důsledku zvýšeného provozu na silnici při provádění stavebních prací na její rekonstrukci v obci a vlivem klimatických podmínek v průběhu zimního období 2020/2021. Tyto změny byly projednány v rámci ZBV 2.

3) Vzhledem k uvedené skutečnosti bylo nezbytné na práce spočívající v provedení nových asfaltových vrstev na dotčeném úseku komunikace zajistit DIO nad rámec PDPS.

4) Změny byly, po předchozím projednání mezi Smluvními stranami, iniciovány Zhotovitelem v rámci oznámení Zhotovitele, které následně Objednatel svým pokynem schválil. Podkladem pro tyto změny jsou doklady č. 09 – Oznámení Zhotovitele ze dne 09.08.2021 a č. 10 – Pokyn Objednatel ze dne 10.08.2021.

5) Tato změna se týká zařazení nové položky poř. č. 2.

Uvedená změna je důsledkem řešení změn ze ZBV 2, která se týká samotného provedení obrusných vrstev na navazujícím úseku silnice III/2371 - od konce obce Lužná až po křižovatku na obec Lišany.

Změna vznikla na základě nutnosti zajištění DIO pro opravy obrusných vrstev v dotčeném úseku silnice III/2371, k jejímuž poškození došlo zejména v průběhu zimního období 2020/2021. V návaznosti na ZBV 2, kde jsou opravy obrusných vrstev řešeny, se i v tomto případě jedná o Změnu de minimis, které je podle § 5, odst.1 písm. e), resp. podle § 12 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29. 05. 2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 5 jako změna de minimis. Zároveň se jedná o práce, které nemějí celkovou povahu veřejné zakázky.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst.4) se jedná o změnu de minimis.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
0,00	34 730,00	34 730,00	34 730,00

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí):	jméno	Bc. Jiří Karel	datum	15.12.2021	podpis
Projektant (autorský dozor):	jméno	Ing. Vladimír Koniček	datum	15.12.	podpis
Stavební dozor:	jméno	Per Stoklasa	datum		podpis
Zástupce Objednatele: KSÚS SK, p.o.	jméno	Karel Motál	datum	15.12.2021	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SOVPS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, doloženy a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Ing. Jan Lichneger	datum	17-12-2021	podpis
Zhotovitel	jméno	Ing. Kamil Hrbek	datum	15.12.2021	podpis

Číslo paré:

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 6**

Název a evidenční číslo Stavby: III/2371 Lužná - S-3027/00066001/2020
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 190/1
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 190 Dopravně inženýrská opatření

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
74 026,00

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	74 026,00	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	34 730,00	34 730,00	46,92%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	0,00	108 756,00	34 730,00	46,92%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

souhlasím

Bc. Jiří Karel

15.12.2021

Projektant (autorský dozor):

souhlasím

Ing. Vladimír Koníček

Stavební dozor:

souhlasím

Per Stoklasa

Zástupce Objednatel KSÚS:

souhlasím

Karel Motal

Zaměstnanec KSÚS
odpovědný za cenové
projednání Změny:

souhlasím

Ing. Jaroslava Jurková

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 6

Název a evidenční číslo stavby: III/2371 Lužná - S-3027/00066001/2020 Číslo a název SO/PS: 190 Dopravně inženýrská opatření Číslo a název podobjektu/rozpočtu: 190 Dopravně inženýrská opatření								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) 190/1 Skupina změn 5					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Nové položky													
2	nabídky	Dopravně inženýrská opatření - asfalt křižovatka Lišany	KPl	0,000	1,000	1,000	34 730,00	0,00	0,00	34 730,00	34 730,00	34 730,00	100,00%
		CELKEM						0,00	0,00	34 730,00	34 730,00	34 730,00	100,00%

Odpovědný zástupce Objednatelů i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.

Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Bc. Jiří Karel, stavbyvedoucí

Datum: 15. 12. 2024

Podpis:

Za Objednatelů: Karel Motal, vedoucí oblasti KSÚS Kladno

Datum: 15. 12. 2024

Podpis:

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	6
Název a evidenční číslo stavby:	III/2371 Lužná - S-3027/00066001/2020
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	190 Dopravně inženýrská opatření
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	190/1

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
07 Změnový soupis prací SO 190 po změně 1	1	
08 Cenové nabídky na DIO a jejich vyhodnocení	3	
09 Oznámení Zhotovitele o změně ze dne 09.08.2021	1	
10 Pokyn Objednatele ke změně ze dne 10.08.2021	1	
11 Stanovisko TDI k ZBV 6	1	
12 Stanovisko AD k ZBV 2 - 6	2	
Počet listů celkem	9	

Změnový soupis prací SO 190 po změně 1 pro ZBV 6

Název a evidenční číslo stavby:	102571 Lužná - S-3027/0000001/2020	ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
Číslo a název SO/PS:	190 Opravné inženýrské opatření	
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:	190 Opravné inženýrské opatření	
		190/1

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Směrově	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena 32 m.j. x K2	Cena celkem ve Směrově v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
0 Všeobecná konstrukce a práce													
1	02720R	Dopravní inženýrské opatření v sítí, "102571 Lužná, rekonstrukce silnice" dle dokumentace DSP zahrnující: -Přechodné svahy i vodorovné dopravní značení, dopravní zařízení a světelné signály, popří. dodávka, montáž, demontáž, kontrola, údržba, servis, přemístování, přesouvání a manipulace s nimi; -Odbornou správu stávajícího dopravního značení, zakrytí, demontáž či doplnění/opravy značení; -Výpracovní realizaci dokumentace DIO a zaplnění inženýrské činnosti - stanovení přechodné úpravy provozu na PK a rozhodnutí o stavbě; -Zahrnuje výskum nákladů spojené s objednáním požadovaných zařízení	KPL	1,000	1,000	0,000	34 026,00	34 026,00	0,00	0,00	34 026,00	0,00	0,00%
Nové položky													
2	02720R	DIO - doplnění stávajících vjezdů od kance obce Lužná po křižovatku na Lužany Cena dle cenové nabídky poddávatele	KPL	0,000	1,000	1,000	34 730,00	0,00	0,00	34 730,00	34 730,00	34 730,00	100,00%
ZBV 6 Kompletní dodávka a zaplnění DIO na ucelový úsek silnice. Včetně a koordinovanému prodloužení úseku silnice 102571 dojde k její doplnění ucelovně včetně příslušných na stanic na Lužany, což si vyžaduje provedení samostatného DIO nad rámec přílohy PDP5. Cena dle nejvyššího výskumu je 34 730,00 Kč (základ č. 6).													
CELKEM								34 026,00	0,00	34 730,00	106 756,00	34 730,00	48,92%

Froněk, spol. s r.o.
Zátiší 2488, CZ 269 01 Rakovník
tel. +420 313 517 276
fax +420 313 516 361
www.fronek.cz, info@fronek.cz

VYHODNOCENÍ CENOVÝCH NABÍDEK

Dopravně inženýrská opatření – asfalty křižovatka Lišany

Stavba: III/2371 Lužná

1. Cenová nabídka – ADSUM s.r.o. – cena 30 200 Kč
2. Cenová nabídka – GC FIELD s.r.o. – cena 36 500 Kč

Nejvýhodnější nabídkou je nabídka firmy ADSUM s.r.o.

Cena bez DPH	30 200 Kč
Správní režie (5%)	1 510 Kč
Výrobní režie (5%)	1 510 Kč
Zisk (5%)	1 510 Kč
Celková cena bez DPH	34 730 Kč

Froněk, spol. s r.o.

Zátiší 2488

269 01 Rakovník

Jiří Karel

e-mail

Cenová nabídka č. CN_129_21

Přechodné dopravní značení stavby "III/2371 Lužná" - 3b. etapa

Text	MJ	Počet MJ	Počet dnů pronájmu	Cena za MJ	Celkem
Ostatní					
zpracování projektu DIO, projednání, schválení a vyřízení DÍR	kpl	1,00		3 000,00 Kč	3 000,00 Kč
					3 000,00 Kč
Montáž + demontáž DO - 3b.etapa					
osazení + snesení DO	kpl	1,00		3 500,00 Kč	3 500,00 Kč
technologická doprava	kpl	2,00		750,00 Kč	1 500,00 Kč
					5 000,00 Kč
Pronájem DO - 3b.etapa					
pronájem DO	kpl	1,00	60	370,00 Kč	22 200,00 Kč
					22 200,00 Kč
CELKEM bez DPH					30 200,00 Kč

Zpracoval: Martin Frolik, tel

V Uhohšti dne 15.7.2021



GC .FIELD, s.r.o.

IČO: 06391745

Rybná 716/24 Praha 1

Kateřina Bažantová

Jednatel

Mail:

CENOVÁ NABÍDKA

DIO – silnice III/2371 v obci Lužná - rozšíření

Dne 15.7.2021

Dopravní opatření	
Montáž	7000,-
Demontáž	5000,-
Pronájem	24 500,-
CENA CELKEM:	36 500,-

Froněk, spol. s r.o.
Zátíší 2488, CZ 269 01 Rakovník
tel. +420 313 517 276
fax +420 313 516 361
www.fronek.cz, info@fronek.cz

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, p.o.
Karel Motál
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5 Smíchov

Vvřizulie: Bc. Jiří Karel
tx
ji

datum: 9.8.2021

Stavba: III/2371 Lužná – rekonstrukce silnice
S-3027/00066001/2020
Věc: Oznámení o vzniku variace

Vážený pane Motale,
Dovoluji si Vás oslovit z důvodu vzniku variace na výše zmíněné stavbě.

Popis variace: Při pochůzce stavby během kontrolního dne 9.8.2021, byl zjištěn nevyhovující stav současného povrchu komunikace III/2371 od KÚ 2,561 po křížení s komunikací III/229 15 ve výměře cca 7 720m², která plynule navazuje na prováděnou stavební akci III/2371 Lužná. Při úkonech KD byla navržena oprava tohoto úseku v podobě odfrézování stávajícího živého krytu vozovky a následná pokládka ohrubné vrstvy finišerem na celou šířku komunikace za plné uzavírky opravovaného úseku.

Žádám o schválení této změny a pokynu k provedení variace.

S pozdravem

Jiří Karel
stavbyvedoucí

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková
organizace**
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

Froněk, spol. s r.o.
Zátiší 2488
269 01 Rakovník

Váš dopis značíte dne

Naše značka

Vyřizuje/telefon
Š. Balázová /

Kladno
10.8.2021

III/2371 Lužná - vyjádření k nepředvídatelným změnám

Na základě oznámení zhotovitele stavby „III/2371 Lužná“ ze dne 9.8.2021 se jedná o následující nepředvídatelnou změnu:

- zjištěn nevyhovující stav současného povrchu krajské komunikace III/2371 od km 2,561 po křižovatku s III/22915 o výměře cca 7 720m², tento úsek navazuje na prováděnou stavební akci, a byla navržena oprava v podobě odfrézování stávajícího živého krytu vozovky a následná pokládka obrusné vrstvy finišerem v celé šíři komunikace za plné uzavírky (k nepředvídatelné změně stavu povrchu komunikace došlo během zimního období 2020/2021 vlivem klimatických podmínek)

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace (dále jen KSÚS SK), jako správce a zároveň zástupce Středočeského kraje jako vlastníka silnic II. a III. tříd, tj. dotčené krajské komunikace III/2371, a jako zadavatele výše zmíněné stavby tímto vydává pokyn k realizaci dle zhotovitelem předloženého navrženého řešení a zároveň žádá zhotovitele o zpracování ZBV k těmto změnám stavby, a to v souladu se zákonem o zadávání VŘ a příslušnou směrnicí KSÚS SK.

Přílohy: Oznámení zhotovitele o nepředvídatelných změnách ze dne 9.8.2021

S pozdravem


Karel Motal
vedoucí TSÚ - oblast Klad

REKONSTRUKCE KOMUNIKACE LUŽNÁ III/2371 LUŽNÁ

STANOVISKO K ZBV č. 6

DIO pro provedení obrusných vrstev na navazujícím úseku silnice III/2371 - od konce obce Lužná až po křižovatku na obec Lišany

V rámci zakázky „III/2371 Lužná“ byla dle PDPS plánovaná oprava silnic v ulicích Čsl. armády, Masarykovo nám. a Tyršova pouze na území obce Lužná a pro tento úsek komunikace bylo také v PDPS uvažováno s DIO.

V průběhu provádění stavby bylo rozhodnuto o provedení nových asfaltových vrstev v navazujícím úseku silnice III/2371 od konce obce Lužná až po křižovatku na obec Lišany, který byl v nevyhovujícím stavu.

Vzhledem k uvedené skutečnosti bylo nezbytné na práce spočívající v provedení nových asfaltových vrstev na dotčením úseku komunikace zajistit DIO nad rámec PDPS.

S navrženými změnami a zpracováním ZBV souhlasím.

31.8.2021

Petr Stoklasa

TDI

NAŠE ZNAČKA:

PH I-Kon-0106-2021
Ing. Vladimír Koniček

VYŘIZUJE:

DATUM:

23. 09. 2021

**Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, p.o.
Karel Motal
Zborovská 11
150 21 Praha 5**

Akce: III/2371 Lužná, rekonstrukce silnice

Věc: Stanovisko AD k ZBV č. 2 až ZBV č. 6

AD byl požádán o stanovisko k ZBV č. 2 SO 101.1/1, č. 3 SO 101.1/2, č. 4 SO 101.2/1, č. 5 SO 301/1 a č. 6 SO 190/1. Pro vyjádření AD je podkladem předložený koncept ZBV.

AD prověřil návrh změn ZBV č. 2 až č. 6 a vydává následující stanovisko k předloženým dokladům:

ZBV č. 2 SO 101.1/1

ad 1: AD souhlasí se změnou. Změna vychází z:

- Oznámení zhotovitele z 9.8.2021
- Pokyn objednatele z 10.8.2021
- Stanovisko TDI z 21.8.2021

ad 2: AD bere změnu na vědomí. Změna vznikla na základě zjištění nepředvídatelné skutečnosti – zhoršeného stavu vozovky.

ad 3: AD souhlasí s navrženým řešením.

1. Dle AD je navrhované řešení technicky přijatelné, neboť nepředstavuje podstatnou technickou změnu díla. K ceně ZBV se AD nevyjadřuje.
2. Ověření objemů provedených prací (tj. výměry či objemy provedených změn na stavbě) a dohled nad jejich kvalitou, je odpovědností TDI.

ZBV č. 3 SO 101.1/2

ad 1: AD souhlasí se změnou. Změna vychází z:

- Zápis z KD z 31.8.2021
- Oznámení zhotovitele z 2.9.2021
- Pokyn objednatele z 3.9.2021
- Stanovisko TDI z 21.8.2021

ad 2: AD bere změnu na vědomí. Změna vznikla na základě zjištění nepředvídatelné skutečnosti – zastížení podkladních vrstev vozovky v takovém stavu, který umožňuje jejich ponechání bez navržených sanací.

ad 3: AD souhlasí s navrženým řešením.

1. Dle AD je navrhované řešení technicky přijatelné, neboť nepředstavuje podstatnou technickou změnu díla. K ceně ZBV se AD nevyjadřuje.
2. Ověření objemů provedených prací (tj. výměry či objemy provedených změn na stavbě) a dohled nad jejich kvalitou, je odpovědností TDI.

ZBV č. 4 SO 101.2/1

ad 1: AD souhlasí se změnou. Změna vychází z:

- Zápis z KD z 31.8.2021
- Oznámení zhotovitele z 2.9.2021
- Pokyn objednatele z 3.9.2021
- Stanovisko TDI z 21.8.2021

ad 2: AD bere změnu na vědomí. Změna vznikla na základě zjištění nepředvídatelné skutečnosti – zjištění, že stávající propustek je po vyčištění plně funkční a není třeba realizovat propustek nový.

ad 3: AD souhlasí s navrženým řešením.

3. Dle AD je navrhované řešení technicky přijatelné, neboť nepředstavuje podstatnou technickou změnu díla. K ceně ZBV se AD nevyjadřuje.
4. Ověření objemů provedených prací (tj. výměry či objemy provedených změn na stavbě) a dohled nad jejich kvalitou, je odpovědností TDI.

ZBV č. 5 SO 301/1

ad 1: AD souhlasí se změnou. Změna vychází z:

- Zápis z KD z 31.8.2021
- Oznámení zhotovitele z 2.9.2021
- Pokyn objednatele z 3.9.2021
- Stanovisko TDI z 21.8.2021

ad 2: AD bere změnu na vědomí. Změna vznikla na základě zjištění nepředvídatelné skutečnosti – možnost nahrazení navržené HV stávající plastovou šachtou.

ad 3: AD souhlasí s navrženým řešením.

5. Dle AD je navrhované řešení technicky přijatelné, neboť nepředstavuje podstatnou technickou změnu díla. K ceně ZBV se AD nevyjadřuje.
6. Ověření objemů provedených prací (tj. výměry či objemy provedených změn na stavbě) a dohled nad jejich kvalitou, je odpovědností TDI.

ZBV č. 6 SO 190/1

ad 1: AD souhlasí se změnou. Změna vychází z:

- Oznámení zhotovitele z 9.8.2021
- Pokyn objednatele z 10.8.2021
- Stanovisko TDI

ad 2: AD bere změnu na vědomí. Změna vznikla na základě řešení nepředvídatelné skutečnosti v rámci ZBV č.2 – změna rozsahu opravy vozovky si vyžádala změnu rozsahu DIO

ad 3: AD souhlasí s navrženým řešením.

7. Dle AD je navrhované řešení technicky přijatelné, neboť nepředstavuje podstatnou technickou změnu díla. K ceně ZBV se AD nevyjadřuje.

Ověření objemů provedených prací (tj. výměry či objemy provedených změn na stavbě) a dohled nad jejich kvalitou, je odpovědností TDI.

Další připomínky k ZBV AD neuplatňuje.

S pozdravem

Ing. Vladimír Koniček
ředitel Ateliéru Praha I/
