

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též „**občanský zákoník**“) mezi:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, Praha 5, Smíchov PSČ: 150 00

IČO: 00066001

DIČ: CZ00066001

zastoupená: Ing. Janem Lichtnegerem, ředitelem

č. smlouvy: S-2216/00066001/2021

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

COLAS CZ, a.s.

se sídlem: Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 - Vysočany

IČO: 261 77 005

DIČ: CZ26177005

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556

zastoupená: Ing. Pavlem Kellerem, ředitelem oblasti Sever a zplnomocněným zástupcem společnosti

č. smlouvy: 211211789

dále jen „**Zhotovitel**“ na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „**smluvní strany**“)

Preambule:

Smluvní strany tímto prohlašují, že dne 21. 09. 2021 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na veřejné zakázce s názvem: „**II/101 D1-D7, km 89,777 – km 90,927, Libiš II. Etapa**“ (dál jen „**Smlouva o dílo**“). Na základě dohody smluvních stran a ve vazbě na čl. 14. odst. 13. Smlouvy o dílo, uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jen „**Dodatek č. 1**“).

I. Předmět Dodatku č. 1

1. S ohledem na vznik objektivně nepředvídaných okolností v průběhu realizace prací na díle, které nemohl zhotovitel před zahájením prací předpokládat, a které zapříčinily změnu rozsahu prací v podobě méněprací a víceprací, upravuje se po dohodě smluvních stran předmět Smlouvy o dílo. Změna rozsahu prací v podobě méněprací a víceprací obsahují Objednatel schválené změnové listy, které jsou přílohou tohoto Dodatku č. 1. Na základě změny předmětu díla se mění i celková cena za dílo uvedená v odst. 8.1. Smlouvy o dílo, který nově zní:

- 8.1. Smluvní strany se dohodly, že celková Cena Díla je stanovena jako neměnná a konečná a činí:

Původní Cena Díla bez DPH	6.395.833,00 Kč
Nová Cena díla dle Dodatku č. 1 bez DPH	5.383.963,50 Kč
DPH 21%	1.130.632,34 Kč
DPH 15 %	0,- Kč
Cena Díla včetně DPH	6.514.595,84 Kč

Daň z přidané hodnoty (dále též „DPH“) bude na základě výslovné dohody smluvních stran připočtena ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že veškerá množství uvedená v soupise prací k Dílu a jeho jednotlivým částem jsou pouze odhadovaná, a jejich změna neznamena změnu Ceny Díla.

Přílohou tohoto Dodatku č. 1 je Objednatelem odsouhlasen Změnový list 1.

II. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 bude uveřejněn dle § 219 zákona o ZVZ na profilu Objednatele.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tento Dodatek č. 1 uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy o dílo. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, která nejsou tímto Dodatkem č. 1 výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze smluvních stran obdrží její elektronický originál.
5. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento Dodatek č. 1 uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto Dodatku č. 1 za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku č. 1 rozhodující.

V Říčanech dne _____

V Praze dne _____

**Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace**

Ing. Jan Lichtneger, ředitel

COLAS CZ, a.s.

Ing. Pavel Keller

ředitel oblasti Sever

a zplnomocněný zástupce společnosti

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

II/101 D1-D7, km 89,777 - km 90,927, Libiš II. etapa

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 101 - Komunikace

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

101/1

Číslo ZBV:

1

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov
IČ: 00066001

Zhotovitel: Colas CZ, a.s.
Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 - Vysočany
IČ: 26177005

Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.3	-1 002 382,50	0,00	-1 002 382,50

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.4	-39 362,00	29 875,00	-9 487,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1	-1 041 744,50	29 875,00	-1 011 869,50

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré:

1

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: II/101 D1-D7, km 89,777 - km 90,927, Libiš II. etapa Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101 - Komunikace	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 101/1	Číslo ZBV: 1.3
--	--	-----------------------

Strany smlouvy o dílo objednatel č.: S-2216/00066001/2021 a zhotovitel č.: 211211789 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 4.11.2020 (dále jen Smlouva).

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9, Vysočany

Přílohy Změnového listu:	Paré č.	Přijemce
1. Krycí list 1 počet listů	1, 2	Objednatel
2. Změnový list 1 počet listů	3	Zhotovitel
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů	4	Stavební dozor
4. Rozpis ocenění Změn položek ZBV 1 1 počet listů		
5. Přehled zařazení změn do skupin 1 počet listů		
6. Přehled dalších dokladů 1 počet listů		
Další doklady dle přehledu dokladů 12 počet listů		

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Díliční změna č.1 - Změna rozsahu prováděné opravy asfaltových vrstev

Předpokladem zadávací dokumentace byl rozsah obnovovaných asfaltových ploch s výměrou 10 430,5 m².

Po geodetickém zaměření skutečného provedení stavby (viz doklad č. 10 - Geodetické zaměření) byla zjištěna výměra pouze 8 580 m². Rozsah stavby je přesně vymezen, a to křižovatkou se silnicí I/9 a na druhé straně styčnou příčnou spárou v místě, kde byl asfaltový kryt již nedávno obnovován.

Z tohoto důvodu byly provedeny menší objemy prací u frézování, asfaltových vrstev, spojovacího postřiku a čištění komunikace.

Díliční změna č.1 je vyjádřena položkami č. 2, 3, 4, 5 a 6 a snižuje smluvní cenu o 1 002 382,50 Kč.

Jedná se o Změnu nepodstatnou, nepředvídanou, která je tak podle § 5, odst. 1 písm. c), resp. podle § 10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29. 05. 2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemějí celkovou povahu veřejné zakázky.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná o změnu nepředvídanou.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-1 002 382,50	0,00	-1 002 382,50	1 002 382,50

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí): Colas CZ, a.s.	jméno	Ing. Jaroslav Píhara	datum	6. 12. 2021	podpis
Stavební dozor: KSÚS SK	jméno	Tomáš Pecka	datum		podpis
Zástupce Objednatel: KSÚS SK vedoucí TSÚ oblasti M.H.	jméno	Lenka Chmelová	datum		podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, vyžadovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitel sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel)	jméno	Ing. Jan Lichneger	datum		podpis
Zhotovitel	jméno	Pavel Lněnička	datum	06. 12. 2021	podpis

Číslo paré:

1

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: II/101 D1-D7, km 89,777 - km 90,927, Libiš II. etapa Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101 - Komunikace	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 101/1	Číslo ZBV: 1.4
--	---	--------------------------

Strany smlouvy o dílo objednatel č.: 5-2216/00066001/2021 a zhotovitel č.: 211211789 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 4.11.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9, Vysočany

Přílohy Změnového listu:	Paré č.	Příjemce
1. Krycí list 1 počet listů	1, 2	Objednatel
2. Změnový list 1 počet listů	3	Zhotovitel
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů	4	Stavební dozor
4. Rozpis ocenění Změn položek ZBV 1 počet listů		
5. Přehled zařazení změn do skupin 1 počet listů		
6. Přehled dalších dokladů 1 počet listů		
Další doklady dle přehledu dokladů 12 počet listů		

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Díčí změna 1: Rektifikace uličních povrchových znaků

Dle zadávací dokumentace bylo uvažováno s určitým počtem rektifikace uličních vpustí, poklopů kanalizace a šoupat.

Po odřezování asfaltových vrstev bylo zjištěno, že se počet povrchových znaků v rozpočtu neshoduje se skutečností. Pro zdárné dokončení díla bylo nutné rektifikovat veškeré povrchové znaky.

Skutečný počet upravovaných znaků vychází z místního šetření - mříží bylo o 2 ks méně a krycích hrnců o 25 ks více oproti zadání.

Soupis a počet prvků je odsouhlasen a potvrzen odpovědným zástupcem objednatel (viz doklad č. 08 - Zápis ve SD).

Díčí změna 1 je vyjádřena položkami č. 9 a 11 a zvyšuje smluvní cenu stavby o 29 675 Kč.

Díčí změna 2: Změna počtu osazovaných svislých dopravních značek

Dle zadávací dokumentace bylo uvažováno s určitým počtem obnovovaných svislých DZ, a to 16 ks v základní velikosti a 9 ks ve zmenšené velikosti.

Po místním šetření bylo zástupcem objednatel rozhodnuto, že bude osazeno svislé DZ základní velikosti v počtu 14 ks a zmenšené velikosti v počtu 1 ks.

Dále se z původně plánovaných 19 ks nových sloupků pro osazení SDZ vyměnilo pouze 5 ks, jelikož některé značky byly montovány na stožáry VO nebo nadzemního vedení (viz doklad č. 08 - Zápis ve SD a doklad č. 09 - Pokyn objednatel).

Díčí změna 2 je vyjádřena položkami č. 22, 23 a 25 a snižuje smluvní cenu stavby o 39 362 Kč.

Jedná se o Změnu nepodstatnou, která je podle § 5, odst.1 písm.d), resp podle § 11 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29. 05. 2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek zařazena **do skupiny 4** jako nezbytná. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 5) se jedná o změnu nezbytnou.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-9 487,00	0,00	-9 487,00	9 487,00

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí): Colas CZ, a.s.	jméno	Ing. Jaroslav Pihera	datum	6.12.2021	podpis
Stavební dozor: KSÚS SK	jméno	Tomáš Pecka	datum		podpis
Zástupce Objednatel: KSÚS SK vedoucí TSÚ oblasti M.H.	jméno	Lenka Chmelová	datum		podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitel sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel)	jméno	Ing. Jan Lichtnegor	datum	06.12.2021	podpis
Zhotovitel	jméno	Pavel Lněnička	datum		podpis
					Číslo paré:

1

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 1

Název Stavby:	II/101 D1-D7, km 89,777 - km 90,927, Libiš II. etapa
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	101/1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	SO 101 - Komunikace

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
6 395 833,00

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	6 395 833,00	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-1 041 744,50	29 875,00	29 875,00	0,47%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-1 041 744,50	5 383 963,50	-1 011 869,50	-15,82%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):
COLAS CZ, a.s.

souhlasím

Ing. Jaroslav Pihera

6.12.2022

Stavební dozor:
KSÚS SK - silniční technik

souhlasím

Tomáš Pecka

Zástupce Objednatele:
vedoucí TSÚ oblasti M.H.

souhlasím

Lenka Chmelová

Zaměstnanec KSÚS SK
odpovědný za cenové
projednání Změny:

souhlasím

Ing. Jaroslava Jurková

Rozpis ocenění Změn položek - celkem

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

SO 101/1

Skupina změn 3

Pol. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	113728	frézování asphalt. ploch, odvoz do 20km	m3	1043,00	858,000	-185,000	667,00	695 681,00	-123 395,00	0,00	572 286,00	-123 395,00	-17,74%
3	93818	čištění vozovek samosběrem	m2	20861,00	17160,000	-3701,000	1,00	20 861,00	-3 701,00	0,00	17 160,00	-3 701,00	-17,74%
4	572223	spojovací postřik ze sil. emulze do 1,0kg/m2	m2	20861,00	17160,000	-3701,000	10,00	208 610,00	-37 010,00	0,00	171 600,00	-37 010,00	-17,74%
5	574046	asfaltový beton pro ložní vrstvy modifik. ACI 16+, 16S tl. 50mm	m2	10430,50	8580,000	-1850,500	209,00	2 179 974,50	-386 754,50	0,00	1 793 220,00	-386 754,50	-17,74%
6	574844	asfaltový beton pro obrusné vrstvy modifik. ACO 11+, 11S tl. 50mm	m2	10430,50	8580,000	-1850,500	244,00	2 545 042,00	-451 522,00	0,00	2 093 520,00	-451 522,00	-17,74%
		Celkem							- 1 002 382,50	0,00		- 1 002 382,50	

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu. Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: ing. Jaroslav Pihera, (stavbyvedoucí)

Datum: 6. 12. 2021

Podpis:

Za Objednatele: Tomáš Pecka, (TDI, technik KSÚS)

Datum:

Podpis:

Rozpis ocenění Změn položek - celkem

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

SO 101/1

Skupina změn 4

Evidenční číslo a název stavby: II/101 D1-D7, km 89,777 - km 90,927, Libiš II. etapa													
Číslo a název SO/PS: SO 101 - Komunikace													
Číslo a název rozpočtu: SO 101.1 - Komunikace ZBV1													
Pof. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	89922	výšková úprava mříží	kus	14,00	12,000	-2,000	2 671,00	37 394,00	-5 342,00	0,00	32 052,00	-5 342,00	-14,29%
11	89923	výšková úprava krycích hrnců (vodovodní uzávěry)	kus	21,00	46,000	25,000	1 195,00	25 095,00	0,00	29 875,00	54 970,00	29 875,00	119,05%
22	914111	dopravní znač. zákl. vel. ocel nerefl.-dodáv a montáž	ks	16,00	14,000	-2,000	1 448,00	23 168,00	-2 896,00	0,00	20 272,00	-2 896,00	-12,50%
23	914311	dopravní znač. zmenšené vel. ocel nerefl.-dodáv a montáž	ks	9,00	1,000	-8,000	1 178,00	10 602,00	-9 424,00	0,00	1 178,00	-9 424,00	-88,89%
25	914924	sloupky a stojky DZ z ocel trubek zabeton-dod. mont., demont	ks	19,00	5,000	-14,000	1 550,00	29 450,00	-21 700,00	0,00	7 750,00	-21 700,00	-73,68%
		Celkem							- 39 362,00	29 875,00		- 9 487,00	

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu. Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: ing. Jaroslav Pihera, (stavbyvedoucí)

Datum:

6. 12. 2021

Podpis:

Za Objednatele: Tomáš Pecka, (TDI, technik KSÚS)

Datum:

Podpis:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: II/101 D1-D7, km 89,777 - km 90,927, Libiš II. etapa

1	Přijaté smluvní částka bez rezervy a DPH	6 395 833,00
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	5 383 963,50
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	6 514 595,84
3=(21)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	84,18%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	Sledování záporných položek (Skupina 2)	0,00%
40=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro pořizovací změny pro Změny záporné dle § 14, odst. (5), písm. b)	-16,29%

6=32+30	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	-1 011 869,50
7=(9/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	-15,82%
8=1*10,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	1 918 749,90

9=(32/4)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	15,67%
10=(36/4)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	1,08%
10A=32A+36A	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	1 071 619,50
11=1*10,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	3 197 916,50

12=(17/0,15)	Limit	959 374,95
13=(29)/(1)	Sledování limitu (15%)	0,00%
14=(A55/(37)-(38))	Hodnota skupiny 5	0,00

SO	ZBV č.	Název SO/PS / přednět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	- 1 - Vyhrazené změny (Dotěrný) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)			- 2 - Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)			- 3 - Změny nepředvídané (dle §222 odst. (8) zákona č. 134/2016 Sb.)				- 4 - Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)				- 5 - Změny de minimis Změny nemající celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)		
						Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	limit 15 %
18	17	18	19=23+26+29+33	20=24+27+30+34+37+39	21=19+30	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	32=29+30	33A=A55(29)+30	33	34	36=33+34	36A=A55(33)+34	37	38	39=A55(37)+38
		II/101 D1-D7, km 89,777 - km 90,927, Libiš II. etapa	- 1 041 744,50	29 875,00	- 1 011 869,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1 002 382,50	0,00	- 1 002 382,50	1 002 382,50	- 38 362,00	29 875,00	- 9 487,00	69 237,00	0,00	0,00	0,00
101	1	Změna výměry sbovy asfaltu a počtu rektifikovaných povrchových znaků	- 1 041 744,50	29 875,00	- 1 011 869,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1 002 382,50	0,00	- 1 002 382,50	1 002 382,50	- 38 362,00	29 875,00	- 9 487,00	69 237,00	0,00	0,00	0,00
	2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Poznámka: Formulář má informační charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	1
Název a evidenční číslo stavby:	II/101 D1-D7, km 89,777 - km 90,927, Libiš II. etapa
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 101 - Komunikace
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	101/1

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
07 Soupis prací SO po změnách	2	
08 Zápisy ve SD	4	
09 Pokyn objednatele	2	
10 Geodetické zaměření	2	
11a Substituční plná moc (digitální podpis)	1	
11b Plná moc (oboustranně podepsaná)	1	
Počet listů celkem	12	

Rozpis ocenění Změn položek - celkem

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

SO 101/1

celkem

Evidenční číslo a název stavby: II/101 D1-D7, km 89,777 - km 90,927, Libiš II. etapa

Číslo a název SO/PS: SO 101 - Komunikace

Číslo a název rozpočtu: SO 101.1 - Komunikace

Pol. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Položky z rozpočtu								6 395 833,00	- 1 041 744,50	29 875,00	5 383 963,50	- 1 011 869,50	-15,82%
1	R položka	DIO vč. zajištění, zjištění a vytyčení inž. sítí, geodetické zaměření stavby	kpl	1,00	0,000	0,000	110 023,00	110 023,00	0,00	0,00	110 023,00	0,00	0,00%
2	113728	frézování asfalt. ploch, odvoz do 20km	m3	1043,00	858,000	-185,000	667,00	695 681,00	-123 395,00	0,00	572 286,00	-123 395,00	-17,74%
		ZBV1 - odpočet ze menší výměru obnovovaného asfaltového krytu dle geodetického zaměření skutečného provedení. Frézování dle geodetického zaměření 8580 m2 * 0,1m = 858 m3											
3	93818	čištění vozovek samosběrem	m2	20861,00	17160,000	-3701,000	1,00	20 861,00	-3 701,00	0,00	17 160,00	-3 701,00	-17,74%
		ZBV1 - odpočet ze menší výměru obnovovaného asfaltového krytu dle geodetického zaměření skutečného provedení. Frézování dle geodetického zaměření 8580 m2. Výpočet: 8580 * 2 = 17160 m2; 17160-20861 = -3701 m2 [A]											
4	572223	spojovací postřik ze sil. emulze do 1,0kg/m2	m2	20861,00	17160,000	-3701,000	10,00	208 610,00	-37 010,00	0,00	171 600,00	-37 010,00	-17,74%
		ZBV1 - odpočet ze menší výměru obnovovaného asfaltového krytu dle geodetického zaměření skutečného provedení. Frézování dle geodetického zaměření 8580 m2. Výpočet: 8580 * 2 = 17160 m2; 17160-20861 = -3701 m2 [A]											
5	574D46	asfaltový beton pro ložní vrstvy modifik. ACI.16+, 16S tl. 50mm	m2	10430,50	8580,000	-1850,500	209,00	2 179 974,50	-386 754,50	0,00	1 793 220,00	-386 754,50	-17,74%
		ZBV1 - odpočet ze menší výměru obnovovaného asfaltového krytu dle geodetického zaměření skutečného provedení. Frézování dle geodetického zaměření 8580 m2. Výpočet: 8580 - 10430,50 = -1850,5 m2 [A]											
6	574B44	asfaltový beton pro obrusné vrstvy modifik. ACO.11+, 11S tl. 50mm	m2	10430,50	8580,000	-1850,500	244,00	2 545 042,00	-451 522,00	0,00	2 093 520,00	-451 522,00	-17,74%
		ZBV1 - odpočet ze menší výměru obnovovaného asfaltového krytu dle geodetického zaměření skutečného provedení. Frézování dle geodetického zaměření 8580 m2. Výpočet: 8580 - 10430,50 = -1850,5 m2 [A]											
7	113762	frézování spár š. do 10mm, hl. do 20mm	m	1400,00	0,000	0,000	38,00	53 200,00	0,00	0,00	53 200,00	0,00	0,00%
8	931312	Zalévání spár dilatační záplivkou za studena	m	1400,00	0,000	0,000	33,00	46 200,00	0,00	0,00	46 200,00	0,00	0,00%
9	89922	výšková úprava mříží	kus	14,00	12,000	-2,000	2 671,00	37 394,00	-5 342,00	0,00	32 052,00	-5 342,00	-14,29%
		ZBV1 - úprava počtu dle skutečnosti - dle odsouhlaseného soupisu ve SD. V rozpočtu uvažováno s rektifikací 14 ks mříží UV, ve skutečnosti realizováno 12 ks. Výpočet: 12 - 14 = -2 ks [A]											
10	89921	výšková úprava poklopů (kanal. šachty)	kus	29,00	0,000	0,000	3 411,00	98 919,00	0,00	0,00	98 919,00	0,00	0,00%
11	89923	výšková úprava krycích hrnců (vodovodní uzávěry)	kus	21,00	46,000	25,000	1 195,00	25 095,00	0,00	29 875,00	54 970,00	29 875,00	119,05%
		ZBV1 - úprava počtu dle skutečnosti - dle odsouhlaseného soupisu ve SD. V rozpočtu uvažováno s rektifikací 21 ks krycích hrnců na Soupata, ve skutečnosti realizováno 46 ks. Výpočet: 46 - 21 = 25 ks [A]											
12	12922	čištění krajnic od nánosu tl. do 100 mm s odvozem na skládku	m2	350,00	0,000	0,000	59,00	20 650,00	0,00	0,00	20 650,00	0,00	0,00%
13	56962	zpevnění krajnic z recyklátu do tl. 100mm	m2	350,00	0,000	0,000	71,00	24 850,00	0,00	0,00	24 850,00	0,00	0,00%
14	15112	poplatky za likvidaci odpadu nekontaminovaných	t	80,00	0,000	0,000	121,00	9 680,00	0,00	0,00	9 680,00	0,00	0,00%
15	91228	směrové sloupky z plast hmot včetně odrazného pásu	ks	20,00	0,000	0,000	435,00	8 700,00	0,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00%
16	915111	VDZ - vodící proušky V2 -12,5cm, barvou zákl.	m2	293,25	0,000	0,000	87,00	25 512,75	0,00	0,00	25 512,75	0,00	0,00%
17	915211	VDZ - vodící proušky V2 -12,5cm, plastem	m2	293,25	0,000	0,000	263,00	77 124,75	0,00	0,00	77 124,75	0,00	0,00%

Rozpis ocenění Změn položek - celkem

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

SO 101/1

celkem

Evidenční číslo a název stavby: II/101 D1-D7, km 89,777 - km 90,927, Libiš II. etapa

Číslo a název SO/PS: SO 101 - Komunikace

Číslo a název rozpočtu: SO 101.1 - Komunikace

Por. č. poř.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18	915111	VDZ - dělič čára V2 - 12,5cm, barvou zákl.	m2	146,60	0,000	0,000	87,00	12 754,20	0,00	0,00	12 754,20	0,00	0,00%
19	915211	VDZ, 12,5cm dělič čára plastem	m2	146,60	0,000	0,000	263,00	38 555,80	0,00	0,00	38 555,80	0,00	0,00%
20	915111	VDZ - přechod pro chodce atd., barvou zákl.	m2	166,50	0,000	0,000	217,00	36 130,50	0,00	0,00	36 130,50	0,00	0,00%
21	915211	VDZ - přechod pro chodce atd., plast, retroflex	m2	166,50	0,000	0,000	309,00	51 448,50	0,00	0,00	51 448,50	0,00	0,00%
22	914111	dopravní znač. zákl. vel. ocel nerefl.-dodáv a montáž	ks	16,00	14,000	-2,000	1 448,00	23 168,00	-2 896,00	0,00	20 272,00	-2 896,00	-12,50%
		ZBV 1 - skutečně dodány počet dle požadavku TDI = 14 ks: 4x P2 + 9x E2b + 1x A11 Vypočet 14 - 16 = - 2 ks [A]											
23	914311	dopravní znač. zmenšené vel. ocel nerefl.-dodáv a montáž	ks	9,00	1,000	-8,000	1 178,00	10 602,00	-9 424,00	0,00	1 178,00	-9 424,00	-88,89%
		ZBV 1 - skutečně dodány počet značek zmenšeného formátu dle požadavku TDI = 1 ks: 1x E3a "150 m" Vypočet 1 - 9 = - 8 ks [A]											
24	914221	dopravní znač. zvětšené vel. ocel folie tř.1-dodávka a montáž	ks	3,00	0,000	0,000	2 069,00	6 207,00	0,00	0,00	6 207,00	0,00	0,00%
25	914924	sloupky a stojky DZ z ocel trubek zabeton-dod. mont., demont.	ks	19,00	5,000	-14,000	1 550,00	29 450,00	-21 700,00	0,00	7 750,00	-21 700,00	-73,68%
		ZBV 1 - skutečně dodány počet spoupek dle požadavku TDI = 5 ks; Vypočet 5 - 19 = -14 ks [A]											
		Nové položky - JC dle ÚRS 2021/II						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Nové položky - R - položky						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Celkem						6 395 833,00	0,00	29 875,00	5 383 963,50	-1 011 869,50	100,00%

ZÁPIS FOTOVITKLE

16.11.20

DURČENO DNE PŘEBĚHU NA SPADU
MÍSTNÍ SESTAVY, KDE BYLY ZJIŠTENY
NÁSLEDUJÍCÍ ZMĚNY:

ÚTĚRY

- VÝMĚNA ASFALTOVÁNÍ PLOCH BUDE
POKRYTÁ O CCA 1500 m² DLE SKUTČNOSTI
- VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ BUDE POKRYTÁ
O 245 A VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH
HRANŮ BUDE NAVIŠTĚNO O 25 KS
- SVISLÝ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BUDE
POKRYTÁ O 10 KS ZNAČEK A
14 SLoupků

SOUHRNĚ S VÍŠE UVE
JENANÍ.

POČET: ZATAŽENO

TEPLOTA 5-8°C

17.11.20

PRACOVNÍ DOBA: 6⁰⁰-16⁰⁰ POUŽÍ 11-12⁰⁰

STŘEHA

TYP: PÍLEK

DELEKČI: HANICS, FISTER, ČOŘKJ, TSUBAKI
PALIVKAS, SAVU, SUCIO, ZYABKO
BAKUV, BARTOS, CYMBALINA
POPADYCH, KASČE

STROJE: 2x NAKLADAČ

MATERIÁL: BN 20

- PRÁCE: - USAZOVÁNÍ POUKROVŮCH
ZNAKŮ
- ÚKLID STAVBY
 - SPOJOVACÍ PŘEFŘÍK

SOUHRNĚ S PŘEDCHOZÍM AČO

Denní záznamy stavby:

List č.

28531

Datum:

Pobes.: 2070720

TEMPERATURA 2-10°C

26.11.2021

PRACOVNÍ DOBA: 7⁰⁰ - 12⁰⁰

PÁTEK

TRIP: PIMBND

DĚLNÍCI: HANICE, ČORBJ, FISTEBZ, PALINKAS
CYMBALISPAK

STROJNÍK: SKULSKY

STROJ: KVALASOČ

DOPRAVA: KVALASOČ AUTO S 4R

PRÁČE - ÚKLID STAVBY

- ODLOUČENÍ KVALASOČI STAVBY

KVALASOČI DOKONČENÍ PRÁČE 26.11.2021

ČINNOST STAVBY. PRÁČE / PRÁČNÍK

TRVÁ 1. PRÁČNÍK BUDE STAVBA

PRÁČNÍK TO JEHO PRÁČNÍK.

VDĚ V PRÁČNÍ. BUDE PRÁČNÍK TO

20.4.2022.

Počasi: DOLOJASNO TEMPERATURA 6-10°C 22.11.2021

PRACOVNÍ DOBA: 7⁰⁰ - 16⁰⁰ PÁVA 11-12⁰⁰ Pondělí

THP: PINEA, FORT

DĚLNÍCI: HANICS, FISTER, PALIVNAS,
 ŽONEL, TŠUBERT, CYMBALISTO,
 KRSK, POPADYCH

STRANIČI: PAUR, ADY, JANAČ

STROJE: FINISER, VIBRAČNÍ VALEK
 2x NAKLADAC, KROVICE

MATERIÁL: ACO 11+

DOPRAVA: 3x NAKLADNÍ AUTO

PRÁCE: - POKLÁDKA OBLUČNÉ ASFALTOVÉ
 Vrstvy v křižovatce
 - ŠKOLNÍ BORD
 - KONTAKT DIO

Počasi: ZATVĚŽENO TEMPERATURA 7-11°C 23.11.2021

PRACOVNÍ DOBA: 7⁰⁰ - 16⁰⁰ PÁVA 11-12⁰⁰ Úterý

THP: PINEA

DĚLNÍCI: HANICS, FISTER, PALIVNAS,
 ŽONEL, TŠUBERT, CYMBALISTO

STRANIČI: ŠMULSKY, VUCHERILY

STROJE: 2x NAKLADAC

PRÁCE: - TERÉNNÍ ÚPRAVY
 - ODVOD SŮTI NA SKLADNĚ

SUBDODAVATEL: ŽADUS

- PROŘÍZUTÍ A
 ŽALUZIE ASFALTOVÉ ŽKIVKY
 PRACOVNÍM SPŮS

GEODETICKÉ PRÁCE - GEODETICKÝ PAMĚŤEN

TECHNIE A FUNK STAVBY

GEODETICKÉ JAMĚNĚNÍ GEOTECHNICKÉHO STAVU

BUDE POKRYTO PRŮSKUMNÝM ROZSAH

POKRYTÝCH PRÁCI. UJÁVĚNÉ TÍMŮ →

→ FOTOWITĚ K UTVOŘENÍ FEN KE
FENY V PŘÍPĚCH MONTÁŽE DŮA.

23.11.2021

Počasí: POLNÁSNO TEPLOTA 6-10°C 24.11.2021

PRACOVNÍ DOBA: 7⁰⁰-16⁰⁰ PAUZA 11-12⁰⁰ STŘEBA

TYP: PÍHRA

DĚLAČI: HANIC, ČORJ, FISTER, PALINKA
TSUBBA, CYMBALISTA

STROJNÍ: SHULSU, KUCHARA

STROJ: VAKUOVÉ, OVOČNÍ PÁČ

PRÁČE: - ÚLOD PŘÍPĚCH STROJNÍ
- OVOČNÍ PŘÍPĚCH MONTÁŽE
NA SKLÁDĚ
- TERÉNNÍ PRÁČE

SUBDODAVATEL: PŘÍPĚCH SKLÁDĚ

PRÁČE: PŘÍPĚCH MONTÁŽE
- MONTÁŽE MONTÁŽE

Počasí: ZATNĚNO TEPLOTA 3-8°C 25.11.2021

PRACOVNÍ DOBA 7⁰⁰-16⁰⁰ PAUZA 11-12⁰⁰ ČIŠTĚNÍ

TYP: PÍHRA

DĚLAČI: HANIC, ČORJ, FISTER, PALINKA
CYMBALISTA

STROJNÍ: SHULSU, KUCHARA

STROJ: VAKUOVÉ

PRÁČE - TERÉNNÍ PRÁČE

- STROJNÍ SKLÁDĚ SDZ

- OVOČNÍ SKLÁDĚ

COLAS a.s.
Rubeška 215/1
190 00 Praha 9

Váš dopis značky / ze dne

Naše značka
8669/21/KSUS/MHT/Pec

Vyřizuje/telefon
Pecka/736623713

Praha
22.11.2021

Věc : „II/101 D1-D7, km 89,777 – km 90,927, Libiš II.etapa“ – Pokyn (ZBV č. 1)

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje jako správce a zároveň zástupce Středočeského kraje jako vlastníka nemovitostí, tj. předmětné komunikace č. II/101, Vám tímto v souladu s článkem 6.8. smlouvy o dílo č. S-2216/00066001/2021 vydává **Pokyn** k zajištění technického řešení a pokračování ve výše zmíněné akci při zpracování změn během výstavby na stavebním objektu:

II/101 D1-D7, km 89,777 – km 90,927, Libiš II.etapa

Na základě Oznámení zhotovitele o vhodnosti změny :

- 1.) výměra asfaltových ploch bude понížena na základě geodetického zaměření skutečně provedených prací
- 2.) - výšková úprava mříží bude понížena o 2 kusy oproti zadání
- výšková úprava krycích hrnců bude navýšena o 25 kusů oproti zadání
- 3.) - svislé dopravní značení bude понíženo o 10 značek
- svislé dopravní značení bude понíženo o 14 sloupků

Vydáváme tímto pokyn k provedení těchto úprav a ke zpracování ZBV

Rozsah změn během výstavby bude stanoven na základě skutečného zaměření stavby nebo správcem schválené realizační dokumentace.


Cenově musí změnu posoudit příslušné majetkové oddělení objednatele.


S pozdravem

Lenka Chmelová
Vedoucí oblasti Mnichovo Hradiště

Telefon

e-mail

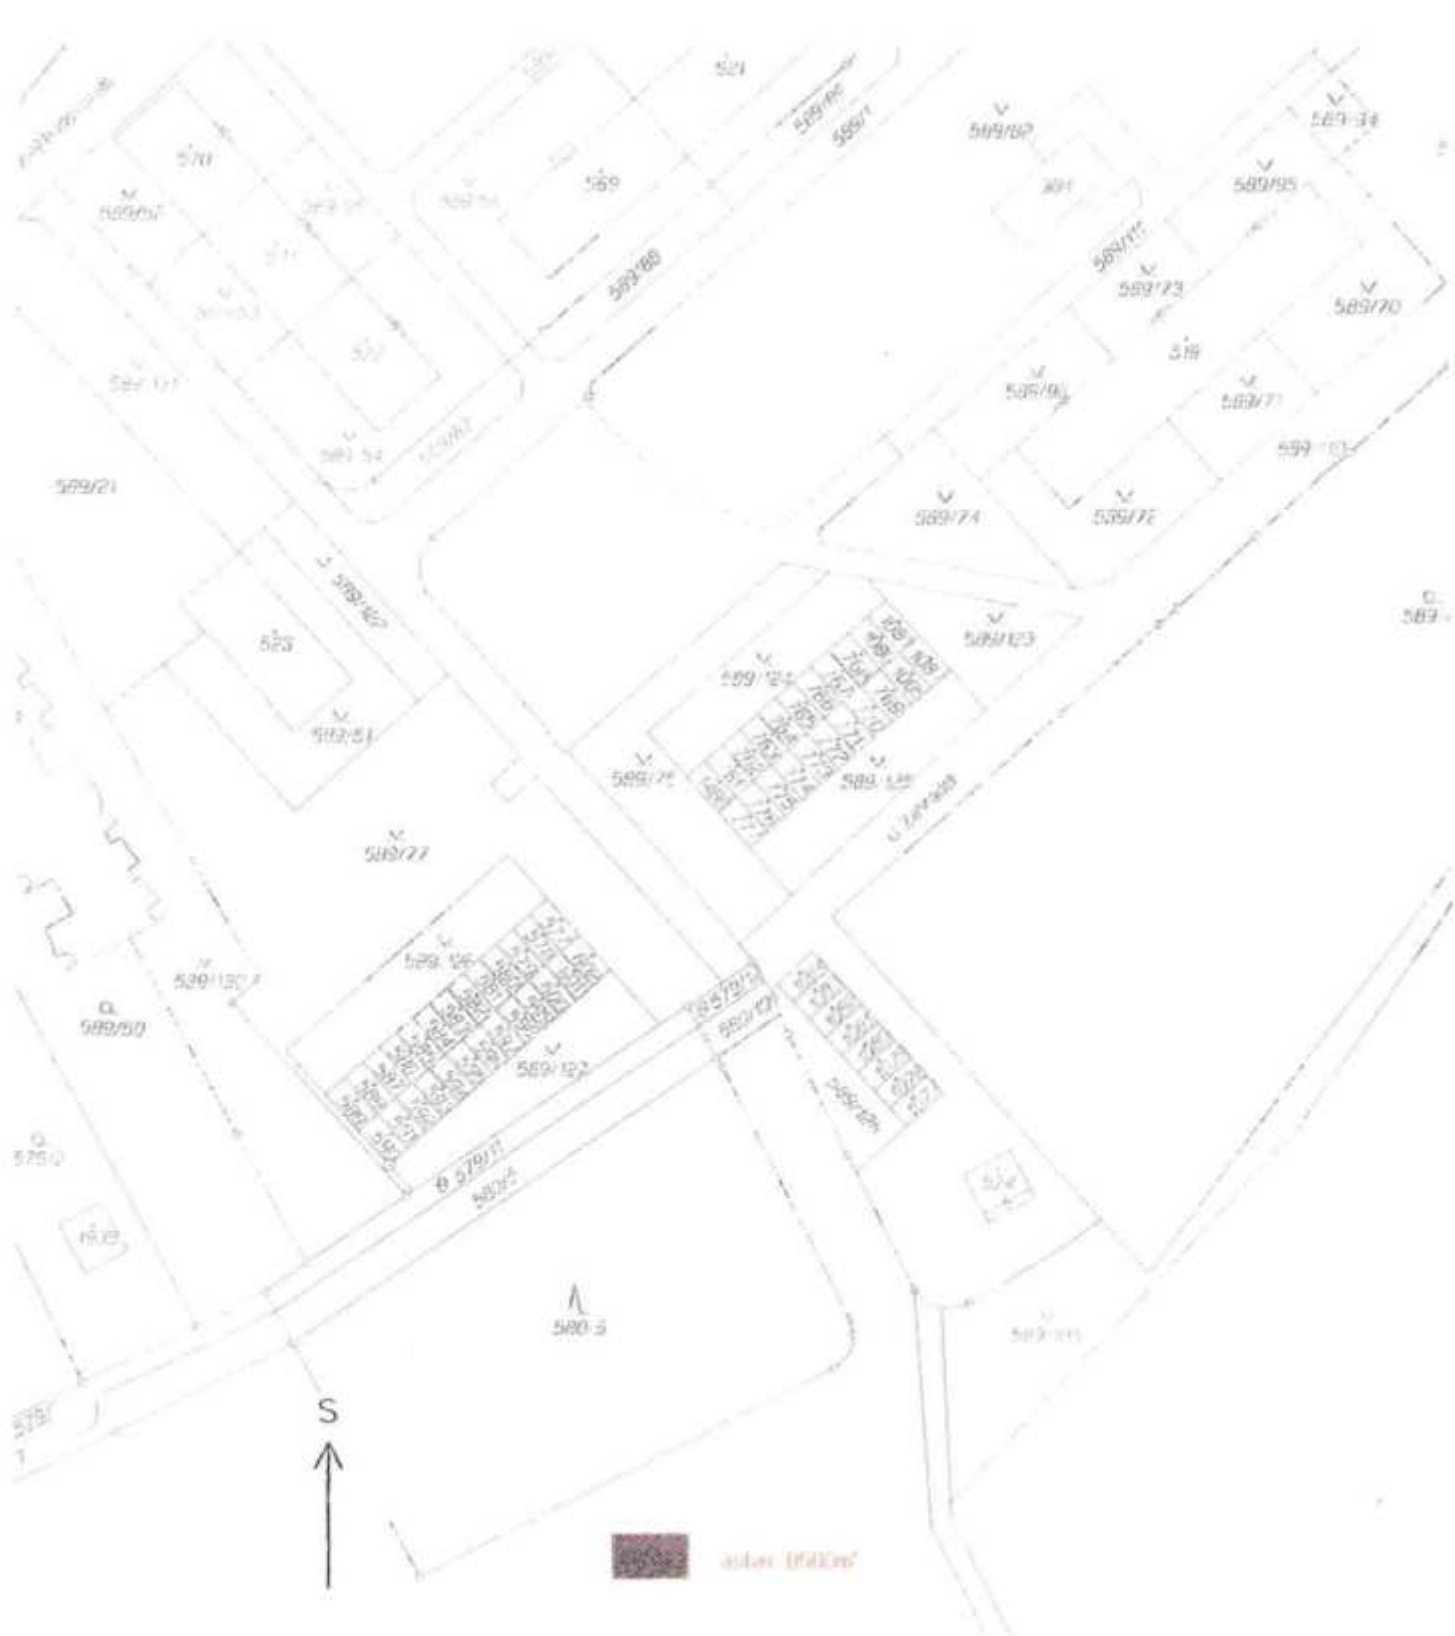

Zaměřil		Zpracoval		 Tesářík & Frank projektová práce, s.r.o. U Stadionu 467 277 11 Neratovice tel: 315 663 133 E-mail: ptesarik@tisk.cz	
Martin Kvapil		Ing. Jan Frank, CSc			
Objednatel :	Colas CZ a.s.	čís. ov. evkt. :	6309/2021	Datum :	25.11.2021
Kat. území :	Libeň	Souř. systém :	S - JTSK		
Formát :	A0	Číslo zakázky :	644/2021	Měřítko :	1:1000
Název výkresu :		Libeň - ul. Mělnická		Číslo listu/celkem :	1/1
		Zaměření nového povrchu silnice			



Náležitosti a přesnosti odpovídá
 právním předpisům a podmínkám
 písemně dohodnutým s objednatelem



SUBSTITUČNÍ PLNÁ MOC

Ing. Pavel Keller

Ředitel oblasti Sever

Datum narození: 5.1.1964

bytem Pod ZDŠ 364, 294 73 Brodce nad Jizerou

v souladu s plnou mocí ze dne 15.12.2020, která mu byla udělena zmocnitelem společnosti COLAS CZ, a.s., IČO: 261 770 05, se sídlem Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556 (dále jen „Společnost“) tímto dále zmocňuje

Pavla Lněničku

Manažera regionu Praha

Datum narození: 5.1.1986

bytem Na Průhoně 952/21, 276 01 Mělník

(dále jen „Zmocněnec“)

k zastupování Společnosti dle bodu g) přiložené plné moci k ukončení stavební akce a k projednání změn během výstavby na akci II/101 D1-D7, km 89,777 - km 90,927, Libiš II. etapa

Tato plná moc je platná do 30.6.2022

V Praze, dne 30.11.2021

....

Ing. Pavel Keller

Zmocnění v celém rozsahu přijímám.

.....

Pavel Lněnička

SUBSTITUČNÍ PLNÁ MOC

Ing. Pavel Keller

Ředitel oblasti Sever

Datum narození: _____

bytem _____

v souladu s plnou mocí ze dne 15.12.2020, která mu byla udělena zmocnitelem společnosti COLAS CZ, a.s., IČO: 261 770 05, se sídlem Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556 (dále jen „Společnost“) tímto dále zmocňuje

Pavla Lněničku

Manažera regionu Praha

Datum narození: _____

bytem _____

(dále jen „Zmocněnec“)

k zastupování Společnosti dle bodu g) přiložené plné moci k ukončení stavební akce a k projednání změn během výstavby na akci II/101 D1-D7, km 89,777 - km 90,927, Libiš II. etapa

Tato plná moc je platná do 30.6.2022

V Praze, dne 30.11.2021

Ing. Pavel Keller

Zmocnění v celém rozsahu přijímám.

.....
Pavel Lněnička
