

Krycí list ZBV

Název Stavby dle SOD:

III/27940 Domousnice - Bačálka

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

silnice III/27940, km 0,000 - 3,353

Číslo SO/PS /

/ pořadí Změny SO/PS:

101/01

Číslo ZBV:

1

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001

Zhotovitel: SILNICE ČÁSLAV, s.r.o.
Zbraslavice 2, 285 21 Zbraslavice
IČ: 284 47 085

Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

| ZBV č./ Skupina | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
|--------------------|-------------------------------------|---------------------------------|--|
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| ZBV č./ Skupina | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
|--------------------|-------------------------------------|---------------------------------|--|
| 1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| ZBV č./ Skupina | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
|--------------------|-------------------------------------|---------------------------------|--|
| 1.3 | -162 000,00 | 0,00 | -162 000,00 |

| ZBV č./ Skupina | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
|--------------------|-------------------------------------|---------------------------------|--|
| 1.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| ZBV č./ Skupina | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
|--------------------|-------------------------------------|---------------------------------|--|
| 1.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| ZBV č./ SUMA | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
|-----------------|-------------------------------------|---------------------------------|--|
| 1 | -162 000,00 | 0,00 | -162 000,00 |

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Změnové listy (02)
a pro Rozpis ocenění změn položek (04).

Změnový list

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|-------------|-----------------|---|-------------|---|---|-------------|--------------------------------|---|-------------|------------------------------------|---|-------------|--------------------|---|-------------|------------------------------------|---|-------------|---|
| Název Stavby dle SOD: III/27940 Domousnice - Bačálka Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): silnice III/27940, km 0,000 - 3,353 | Číslo SO/PS / / pořadí Změny SO/PS: 101/01 | Číslo ZBV / Skupina změny: 1.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Strany smlouvy o dílo objednatel č.: S-2554/00066001/2023 a zhotovitel č.: 2023/030 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 05.09.2023 (dále jen Smlouva): Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov Zhotovitel: SILNICE ČÁSLAV, s.r.o., Zbraslavice 2, 285 21 Zbraslavice, IČ: 284 47 085 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <u>Přílohy Změnového listu:</u> <table border="0"> <tr><td>1. Krycí list</td><td>1</td><td>počet listů</td></tr> <tr><td>2. Změnový list</td><td>2</td><td>počet listů</td></tr> <tr><td>3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací</td><td>1</td><td>počet listů</td></tr> <tr><td>4. Rozpis ocenění Změn položek</td><td>1</td><td>počet listů</td></tr> <tr><td>5. Přehled zařazení změn do skupin</td><td>1</td><td>počet listů</td></tr> <tr><td>6. Přehled dokladů</td><td>1</td><td>počet listů</td></tr> <tr><td>Další doklady dle přehledu dokladů</td><td>6</td><td>počet listů</td></tr> </table> | 1. Krycí list | 1 | počet listů | 2. Změnový list | 2 | počet listů | 3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací | 1 | počet listů | 4. Rozpis ocenění Změn položek | 1 | počet listů | 5. Přehled zařazení změn do skupin | 1 | počet listů | 6. Přehled dokladů | 1 | počet listů | Další doklady dle přehledu dokladů | 6 | počet listů | <u>Příjemce</u> Objednatel Zhotovitel |
| 1. Krycí list | 1 | počet listů | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Změnový list | 2 | počet listů | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací | 1 | počet listů | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Rozpis ocenění Změn položek | 1 | počet listů | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Přehled zařazení změn do skupin | 1 | počet listů | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Přehled dokladů | 1 | počet listů | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Další doklady dle přehledu dokladů | 6 | počet listů | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Iniciátor změny: Zhotovitel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Předmět Změny: Změna technologie pokládky ACO 11 bez podélné spáry | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Dílčí změna 1: Změna technologie pokládky ACO 11</p> <p>Zhotovitel upřesnil technologii provedení pokládky asfaltového betonu. V ZD byla navržena pokládka asfaltového betonu ACO 11 po polovinách komunikace s podélnou spárou. Zhotovitel navrhuje pokládku v celé šíři vozovky, bez podélné spáry (příloha č. 08 - Oznámení zhotovitele o změně rozsahu stavby ze dne 20.11.2023). Zhotovitel po projednání s objednatelem navrhl řešení, které zlepší životnost asfaltového krytu tím, že pokládka proběhne v celé šíři vozovky, pracovní spára nebude realizována a nebude nutný zásah do nově položeného krytu. Objednatel změnu odsouhlasil vydaným pokynem č. 1 (příloha č. 09 ze dne 21.11.2023). Z těchto důvodů je v rozpočtu proveden odpočet frézování drážky i následného zalití asfaltovou zálivkou v celé délce opravovaného úseku.</p> <p>Dílčí změna č. 1 je vyjádřena stávajícími položkami č. 113761 a 931312 a snižuje smluvní cenu stavby o -125 400,00 Kč.</p> <p>Výše popsané změny byly nepředvídatelné, zjištěné po odkrytí jednotlivých konstrukcí mostu. Změny jsou podle § 5 odst. 1, písmeno c) resp. § 10 Směrnice RSM- 36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 01.01.2022) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazený do Skupiny 3.</p> <p>Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazu a dle § 222, odst. 6 je změnou nepředvídatelnou.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Údaje v Kč bez DPH:

| Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem | Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných |
|----------------------------------|---------------------------------|---|--|
| -162 000,00 | 0,00 | -162 000,00 | 162 000,00 |

| | | | |
|-----------------------------|-------|----------------|--------|
| Technická pomoc Objednatele | jméno | Daniel Löffler | podpis |
|-----------------------------|-------|----------------|--------|

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

| | | | |
|-----------------------------|-------|------------------|--------|
| Zhotovitel (stavbyvedoucí): | jméno | Ing. Alois Holík | podpis |
|-----------------------------|-------|------------------|--------|

| | | | |
|-----------------|-------|-------------|--------|
| Stavební dozor: | jméno | Tomáš Pecka | podpis |
|-----------------|-------|-------------|--------|

| | | | |
|--|-------|--|--------|
| Supervize (Regionální dotační kancelář): | jméno | | podpis |
|--|-------|--|--------|

| | | | |
|-----------------------|-------|----------------|--------|
| Zástupce Objednatele: | jméno | Lenka Chmelová | podpis |
|-----------------------|-------|----------------|--------|

| | | | |
|--|-------|------------------------|--------|
| Zástupce Objednatele odpovědný za cenové projednání Změny: | jméno | Ing. Jaroslava Jurková | podpis |
|--|-------|------------------------|--------|

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Obchodních podmínek. **Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo.** Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněně jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

| | | | |
|-------------------------------------|-------|-----------------------|--------|
| Objednatel (Oprávněná osoba) | jméno | Ing. Jan Fidler, DiS. | podpis |
|-------------------------------------|-------|-----------------------|--------|

| | | | |
|-------------------|-------|-------------------|--------|
| Zhotovitel | jméno | Ing. Michal Holík | podpis |
|-------------------|-------|-------------------|--------|

Číslo paré:

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 1**

| | |
|---|---------------------------------------|
| Název Stavby: | III/27940 Domousnice - Bačálka |
| Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: | 101/01 |
| Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): | 101 |
| silnice III/27940, km 0,000 - 3,353 | |

Údaje v Kč bez DPH

| |
|-------------------------------|
| Cena SO/PS dle Smlouvy |
| 1 - zadat |
| 8 860 000,00 |

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

| | Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS | Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS | Cena SO/PS po všech předchozích Změnách | Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě |
|-------------------------|--|---|---|---|
| 2 | 3 - zadat | 4 - zadat | 5=1+3+4 | 6=5-1 |
| stavební/montážní práce | 0,00 | 0,00 | 8 860 000,00 | 0,00 |

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

| | Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS | Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS | Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných) | Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v % |
|-------------------------|---|--|--|--|
| 7 | 8 - zadat | 9 - zadat | 10=4+9 | 11=10/1 |
| stavební/montážní práce | -162 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

| | Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných) | Cena SO/PS po této Změně | Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy | Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v % |
|-------------------------|---|--------------------------|---|---|
| 12 | 13=3+8 | 14=1+13+10 | 15=14-1 | 16=15/1 |
| stavební/montážní práce | -162 000,00 | 8 698 000,00 | -162 000,00 | -1,83% |

| Rozpis položek a cen Změny | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|---|------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|
| Evidenční číslo a název stavby: III/27940 Domousnice - Bačálka Číslo a název SO/PS: SO 101 - silnice III/27940, km 0,000 - 3,353 Číslo a název rozpočtu: SO 101 - silnice III/27940, km 0,000 - 3,353 | | | | | | | | ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) | | | | | |
| | | | | | | | | SO 101 | | | | | |
| | | | | | | | | Skupina změn 3 | | | | | |
| Poř. č. pol. | Kód položky | Název položky | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem po Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Podíl cen celkem v % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 11 | 113761 | frézování spár š. do 10mm , hl. do 20mm způsob stanovení měněné výměry: změna technologie pokládky - v celé šíři vozovky odečet středové spráry = 3365 - 125 (příčné napojení) = 3240 m Zalévání spár dilatační záhlvkou za studena | m | 3365,00 | 125,00 | -3240,000 | 25,00 | 84 125,00 | -81 000,00 | 0,00 | 3 125,00 | -81 000,00 | -96,29% |
| 12 | 931312 | způsob stanovení měněné výměry: změna technologie pokládky - v celé šíři vozovky odečet středové spráry = 3365 - 125 (příčné napojení) = 3240 m | m | 3365,00 | 125,00 | -3240,000 | 25,00 | 84 125,00 | -81 000,00 | 0,00 | 3 125,00 | -81 000,00 | -96,29% |
| Celkem | | | | | | | | 168 250,00 | - 162 000,00 | 0,00 | 6 250,00 | - 162 000,00 | -96,29% |

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Alois Holík

Za Objednatele: Tomáš Pecka

Datum:

Datum:

Podpis:

Podpis:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby:

III/27940 Domousnice - Bačálka

| | | |
|--------------|---|----------------------|
| 1 | Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH | 8 860 000,00 |
| 2=1+19+20 | Aktuální smluvní částka (cena stavby) | 8 698 000,00 |
| | Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH | 10 524 580,00 |
| 3=(2/1)*100 | Procento změny Přijáté smluvní částky | 98,17% |
| 4=(25/1)*100 | Sledování vyhrazených změn (Skupina 1) | 0,00% |
| 5=(28/1)*100 | Sledování záměny položek (Skupina 2) | 0,00% |

| | | |
|-------------|---|--------------|
| 6=32+36 | Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4 | -162 000,00 |
| 7=(6/1)*100 | Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4 | -1,83% |
| 8=1*0,3 | Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4 | 2 658 000,00 |

| | | |
|----------------|--|--------------|
| 9=(32A/1)*100 | Sledování limitu 50 % Skupina 3 | 1,83% |
| 10=(36A/1)*100 | Sledování limitu 50 % Skupina 4 | 0,00% |
| 10A=32A+36A | Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4 | 162 000,00 |
| 11=1*0,5 | Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4 | 4 430 000,00 |

| | | |
|-------------------|------------------------|--------------|
| 12=(1)*0,15 | Sledování limitu (15%) | 1 329 000,00 |
| 13=(39)/(1) | Sledování limitu v % | 0% |
| 14=(ABS(37)+(38)) | Hodnota skupiny 5 | 0,00 |

| PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--------|---|--|----------------------|--------------|--|--|-------------------------------------|--|--------------|-------------------------------------|--|--------------|-------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------|--|--|--|---------------|
| | | - 1 - | | | | | - 2 - | | | | | - 3 - | | | | | - 4 - | | | | - 5 - | |
| | | Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.) | | | | | Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.) | | | | | Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.) | | | | | Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.) | | | | Změny de minimis (Změny neměnní celkovou povahou veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.) | |
| SO | ZBV č. | Název SO/PS / předmět Změny | Změny záporné (zadávat se znaménkem minus) | Změny kladné | Hodnota ZBV | Změny záporné (zadávat se znaménkem minus) | Změny kladné | Suma Změn záporných a Změn kladných | Změny záporné (zadávat se znaménkem minus) | Změny kladné | Suma Změn záporných a Změn kladných | Změny záporné (zadávat se znaménkem minus) | Změny kladné | Suma Změn záporných a Změn kladných | Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných | Změny záporné (zadávat se znaménkem minus) | Změny kladné | Suma Změn záporných a Změn kladných | Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných | Změny záporné (zadávat se znaménkem minus) | Změny kladné | limit 15 % |
| 16 | 17 | 18 | 19=23+26+29+33 | 20=24+27+30+34+37+39 | 21=19+20 | 23 | 24 | 25=23+24 | 26 | 27 | 28=26+27 | 29 | 30 | 32=29+30 | 32A=ABS(29)+30 | 33 | 34 | 36=33+34 | 36A=ABS(33)+34 | 37 | 38 | 39=ABS(37)+38 |
| | | III/27940 Domousnice - Bačálka | - 162 000,00 | 0,00 | - 162 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 162 000,00 | 0,00 | -162 000,00 | 162 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101 | 1 | silnice III/27940, km 0,000 - 3,353 / Změna technologie pokládky ACO 11 bez podélné spáry | - 162 000,00 | 0,00 | - 162 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 162 000,00 | 0,00 | -162 000,00 | 162 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

Přehled dalších dokladů

| | |
|--|-------------------------------------|
| Číslo ZBV: | 1 |
| Název a evidenční číslo stavby: | III/27940 Domousnice - Bačálka |
| Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS): | silnice III/27940, km 0,000 - 3,353 |
| Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: | 101/01 |

| Doklad | počet listů |
|---|-------------|
| 07 Soupis prací SO po všech změnách | 1 |
| 08 Žádost zhotovitele o změnu rozsahu díla | 3 |
| 09 Pokyn objednatele k provedení změny během výstavby | 3 |
| | |
| Počet listů celkem | 7 |

| Rozpis ocenění Změn položek - celkem | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|--|------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|
| Evidenční číslo a název stavby: III/27940 Domousnice - Bačálka | | | | | | | | ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) | | | | | |
| Číslo a název SO/PS: SO 101 - silnice III/27940, km 0,000 - 3,353 | | | | | | | | SO 101 | | | | | |
| Číslo a název rozpočtu: SO 101 - silnice III/27940, km 0,000 - 3,353 | | | | | | | | celkem | | | | | |
| Poř. č. pol. | Kód položky | Název položky | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Podíl cen celkem v % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | 5 | Komunikace | | | | | | 8 860 000,00 | - 162 000,00 | 0,00 | 8 698 000,00 | - 162 000,00 | -1,83% |
| 1 | R položka | DIO vč. zajištění, zjištění a vytyčení inž. sítí , geodetické zaměření stavby | kpl | 1,00 | 1,00 | 0,000 | 50 672,00 | 50 672,00 | 0,00 | 0,00 | 50 672,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2 | 113728 | frézování asfalt. ploch, odvoz do 20km | m3 | 160,00 | 160,00 | 0,000 | 800,00 | 128 000,00 | 0,00 | 0,00 | 128 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3 | 15670 | poplatky za likvidaci odpadu nebezpečných, kontaminovaných (recyklát) | t | 384,00 | 384,00 | 0,000 | 300,00 | 115 200,00 | 0,00 | 0,00 | 115 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4 | 919111 | řezání asfaltového krytu vozovek do 50mm | bm | 50,00 | 50,00 | 0,000 | 100,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5 | 93818 | čištění vozovek samosběrem | m2 | 3000,00 | 3000,00 | 0,000 | 2,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 6 | 574C06 | vyrovnávka asfalt. bet. ACL 16+ , | m3 | 684,00 | 684,00 | 0,000 | 3 650,00 | 2 496 600,00 | 0,00 | 0,00 | 2 496 600,00 | 0,00 | 0,00% |
| 7 | 573223 | spojovací postřik ze sil. emulze do 1,0kg/m2 | m2 | 37554,00 | 37554,00 | 0,000 | 10,00 | 375 540,00 | 0,00 | 0,00 | 375 540,00 | 0,00 | 0,00% |
| 8 | 574A44 | asfalt. beton ACO 11+ 50/70 tl. 50 mm, | m2 | 18777,00 | 18777,00 | 0,000 | 229,00 | 4 299 933,00 | 0,00 | 0,00 | 4 299 933,00 | 0,00 | 0,00% |
| 9 | 899921 | výšková úprava šachty, vpusti | ks | 8,00 | 8,00 | 0,000 | 2 500,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 10 | 899923 | výšková úprava krycích hrnců | ks | 22,00 | 22,00 | 0,000 | 1 500,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11 | 113761 | frézování spár š. do 10mm , hl. do 20mm způsob stanovení měněné výměry: změna technologie pokládky - v celé šíři vozovky odečet středové správy = 3365 - 125 (příčné napojení) = 3240 m | m | 3365,00 | 125,00 | -3240,000 | 25,00 | 84 125,00 | -81 000,00 | 0,00 | 3 125,00 | -81 000,00 | -96,29% |
| 12 | 931312 | Zalévání spár dilatační závlukou za studena způsob stanovení měněné výměry: změna technologie pokládky - v celé šíři vozovky odečet středové správy = 3365 - 125 (příčné napojení) = 3240 m | m | 3365,00 | 125,00 | -3240,000 | 25,00 | 84 125,00 | -81 000,00 | 0,00 | 3 125,00 | -81 000,00 | -96,29% |
| 13 | 12922 | čištění krajnic od nánosů tl do 100 mm s odvozem na skládku | m2 | 3353,00 | 3353,00 | 0,000 | 25,00 | 83 825,00 | 0,00 | 0,00 | 83 825,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14 | 56962 | zpevnění krajnic z recyklátu do tl. 100mm | m2 | 3353,00 | 3353,00 | 0,000 | 70,00 | 234 710,00 | 0,00 | 0,00 | 234 710,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15 | 12932 | čištění příkopu do 0,5m3/m s odvozem na skládku | m | 1100,00 | 1100,00 | 0,000 | 80,00 | 88 000,00 | 0,00 | 0,00 | 88 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 16 | 15112 | poplatky za likvidaci odpadu nekontaminovaných | t | 1027,00 | 1027,00 | 0,000 | 50,00 | 51 350,00 | 0,00 | 0,00 | 51 350,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17 | 915111 | VDZ barva hladká, 25cm vodící čáry-dodávka a pokládka | m2 | 1676,00 | 1676,00 | 0,000 | 90,00 | 150 840,00 | 0,00 | 0,00 | 150 840,00 | 0,00 | 0,00% |
| 18 | 915211 | VDZ plastem, 25cm vodící čáry | m2 | 1676,00 | 1676,00 | 0,000 | 330,00 | 553 080,00 | 0,00 | 0,00 | 553 080,00 | 0,00 | 0,00% |
| Celkem | | | | | | | | 8 860 000,00 | - 162 000,00 | 0,00 | 8 698 000,00 | - 162 000,00 | -1,83% |



Silnice Čáslav s.r.o.
Zbraslavice 2
28521 Zbraslavice

Věc: oznámení změny rozsahu díla dle zaměření

Dobrý den, na základě zaměření stavby III/27940 Domousnice – Bačálka, SOD S-2554/00066001/2023, projednaného DIO a povahy díla provedeme stavbu při pokládce AHV na jednu šířku, tzn bez středové spáry. Dojde tím k změně rozsahu díla a žádáme Vás o stanovení dalšího postupu.

S pozdravem

Miroslav Kunt, stavbyvedoucí

SILNICE ČÁSLAV

601 074 016

Přílohy:

zaměření stavby po očištění okrajů

rozpočet stavby se zaznamenanou aktualizací výměr


Stavba: III/27940 Domousnice - Bačálka
Objekt: sil. III / 27940 km 0,000 - 3,353

Objednatel: **Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**

Zhotovitel:
rozpočet

Zpracoval: Milan Bláha
Datum: 20.9.2022

| Číslo položky | Popis položky | MJ | Výměra | Kč/MJ | Celkem Kč |
|---------------|---|-----|----------|-----------|---------------|
| R položka | DIO vč. zajištění, zjištění a vytyčení inž. sítí , geodetické zaměření stavby | kpl | 1,00 | 50 672,00 | 50 672,00 |
| 113728 | frézování asfalt. ploch, odvoz do 20km | m3 | 160,00 | 800,00 | 128 000,00 |
| 15670 | poplatky za likvidaci odpadu nebezpečných, kontaminovaných (recyklát) | t | 384,00 | 300,00 | 115 200,00 |
| 919111 | řezání asfaltového krytu vozovek do 50mm | bm | 50,00 | 100,00 | 5 000,00 |
| 93818 | čištění vozovek samosběrem | m2 | 3000,00 | 2,00 | 6 000,00 |
| 574C06 | vyrovnávka asfalt. bet. ACL 16+ , | m3 | 684,00 | 3 650,00 | 2 496 600,00 |
| 573223 | spojovací postřík ze sil. emulze do 1,0kg/m2 | m2 | 37554,00 | 10,00 | 375 540,00 |
| 574A44 | asfalt. beton ACO 11+ 50/70 tl. 50 mm, | m2 | 18777,00 | 229,00 | 4 299 933,00 |
| 899921 | výšková úprava šachty, vpusti | ks | 8,00 | 2 500,00 | 20 000,00 |
| 899923 | výšková úprava krycích hrnců | ks | 22,00 | 1 500,00 | 33 000,00 |
| 113761 | frézování spár š. do 10mm , hl. do 20mm | m | 125,00 | 25,00 | 3 125,00 |
| 931312 | Zalévání spár dilatační zálivkou za studena | m | 125,00 | 25,00 | 3 125,00 |
| 12922 | čištění krajnic od nánosů tl do 100 mm s odvozem na skládku | m2 | 3353,00 | 25,00 | 83 825,00 |
| 56962 | zpevnění krajnic z recyklátu do tl. 100mm | m2 | 3353,00 | 70,00 | 234 710,00 |
| 12932 | čištění příkopu do 0,5m3/m s odvozem na skládku | m | 1100,00 | 80,00 | 88 000,00 |
| 15112 | poplatky za likvidaci odpadu nekontaminovaných | t | 1027,00 | 50,00 | 51 350,00 |
| 915111 | VDZ barva hladká, 25cm vodící čáry-dodávka a pokládka | m2 | 1676,00 | 90,00 | 150 840,00 |
| 915211 | VDZ plastem, 25cm vodící čáry | m2 | 1676,00 | 330,00 | 553 080,00 |
| | Celkem bez DPH | | | | 8 698 000,00 |
| | DPH 21% | | | | 1 826 580,00 |
| | Celkem vč. DPH | | | | 10 524 580,00 |

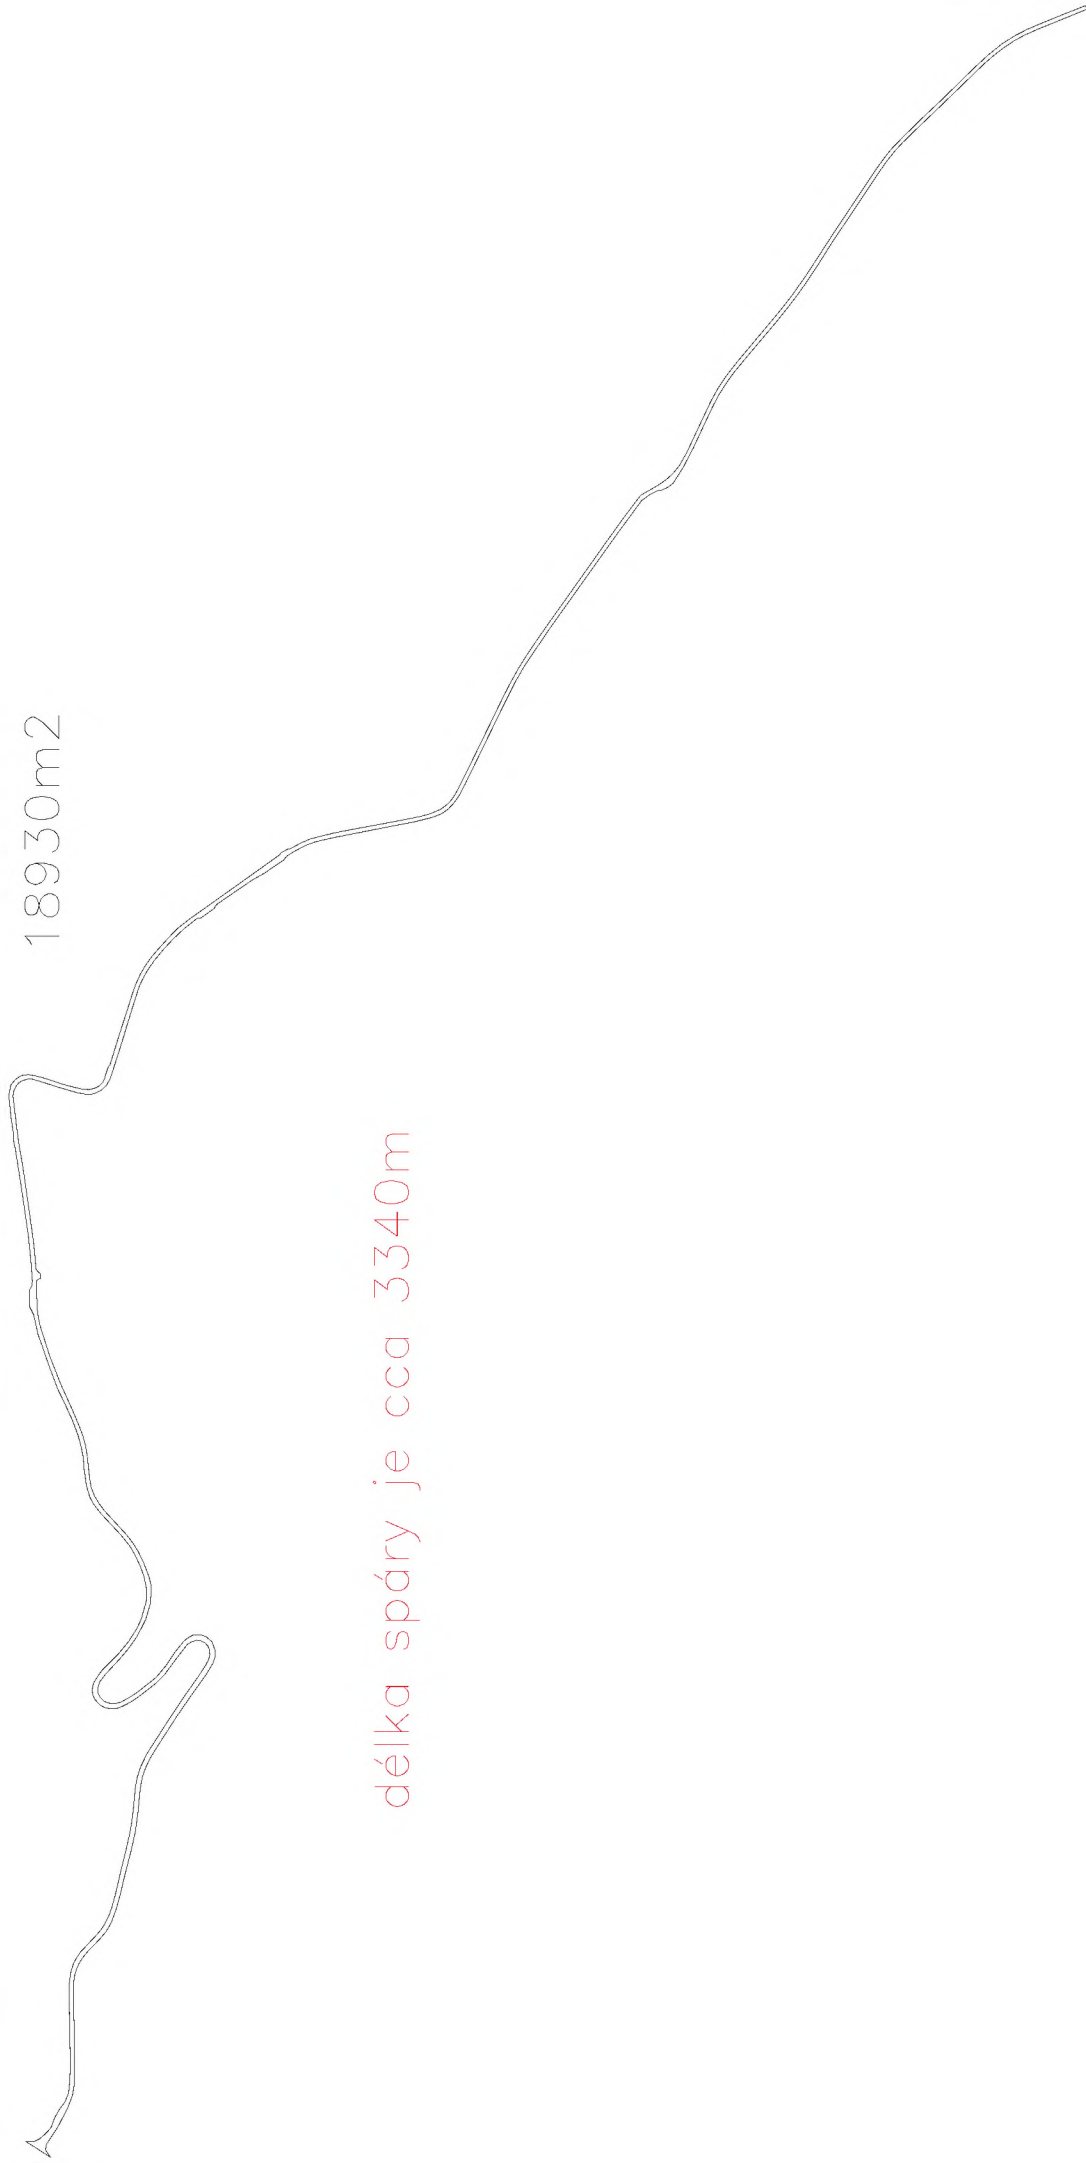

18930m²

délka spáry je cca 3340m

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11**

**Silnice Čáslav s.r.o.
Zbraslavice 2
28521 Zbraslavice**

Váš dopis značky / ze dne

Naše značka

Vyřizuje/telefon
Pecka/736623713

Praha
21.11.2023

Věc: „III/27940 Domousnice - Bačálka“ – Pokyn (ZBV č. 1)

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje jako správce a zároveň zástupce Středočeského kraje jako vlastníka nemovitostí, tj. předmětné komunikace č. II/27940, Vám tímto v souladu s článkem 6.7. smlouvy č. S-2554/00066001/2023 vydává **Pokyn** k zajištění technického řešení a pokračování ve výše zmíněné akci při zpracování změn během výstavby na stavebním objektu:

„III/27940 Domousnice - Bačálka“

Na základě Oznámení zhotovitele o zjištěných odlišnostech oproti zadávací dokumentaci stavby:

- Bude provedena pokládka ACO v plné šíři komunikace, tzn. bez středové spáry

vydáváme tímto **pokyn** k provedení těchto úprav a ke zpracování ZBV.

Rozsah změn během výstavby bude stanoven na základě skutečného zaměření stavby nebo správcem schválené realizační dokumentace.

Změnové listy budou vypracovány v souladu se směrnicí KSÚS, která je nedílnou součástí Smlouvy o dílo. Tyto ZBV budou následně projednány a podrobně posouzeny supervizorem zakázky, následně budou posouzeny vedením KSÚS.

S pozdravem



Silnice Čáslav s.r.o.

Zbraslavice 2

28521 Zbraslavice

Věc: oznámení změny rozsahu díla dle zaměření

Dobrý den, na základě zaměření stavby III/27940 Domousnice – Bačálka, SOD S-2554/00066001/2023, projednaného DIO a povahy díla provedeme stavbu při pokládce AHV na jednu šířku, tzn bez středové spáry. Dojde tím k změně rozsahu díla a žádáme Vás o stanovení dalšího postupu.

S pozdravem

Miroslav Kunt, stavbyvedoucí

SILNICE ČÁSLAV

601 074 016

Přílohy:

zaměření stavby po očištění okrajů

rozpočet stavby se zaznamenanou aktualizací výměř

18930m²

délka spóry je cca 3340m

