

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

Okružní křižovatka Mariánovice - západ, oplocení

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

Číslo ZBV:

1

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

701 / 1**Oplocení**

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5
IČ: 00066001

Zhotovitel: TANNACO, a.s.
Choťánky 38, 290 01 Poděbrady
IČ: 608 38 744

Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.3	0,00	121 219,20	121 219,20

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1	0,00	121 219,20	121 219,20

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré:

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: Okružní křižovatka Mariánovice - západ, oplocení	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 701 / 1	Číslo ZBV: 1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Oplocení		

Strany smlouvy o dílo č. 3219/00066001/2017 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 19.10.2017(dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: TANNACO, a.s., Choťánky 38, 29001 Poděbrady, IČO: 61677272

Přílohy Změnového listu:			Paré č.	Příjemce
1. Krycí list	1	počet listů	1	Objednatel
2. Změnový list	1	počet listů	2	Zhotovitel
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů	3	Projektant
4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů	4	Stavební dozor
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů		
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů		
7. Další doklady	10	počet listů		

Iniciátor změny: zhotovitel


Popis a zdůvodnění Změny:

Předmětem PDPS byl návrh plného oplocení v místech stávajícího drátěného oplocení, tedy na hranici pozemků soukromých vlastníků. Součástí dokumentace jsou i vrata s ručním posuvem a vrátka umožňující vjezd a vstup na pozemky. Plné oplocení bylo navrženo jako ochrana stávající zástavby proti hluku ze stávající silnice III/1103h a z navrhované okružní křižovatky. Při předání staveniště byl uplatněn požadavek třetích osob - majitelů nemovitosti č.p. 1176 a č.p. 1177 na doplnění ocelových vrat v oplocení elektrickým pohonem. Osazení elektrického ovládání vrat bylo při místním šetření dne 4.12.2017 všemi účastníky řízení schváleno. Tento požadavek majitelů pozemků (č.p. 1179, parcela č. 2284/26 a 2284/59) a (č.p. 1177, parcela č. 2284/27 a 2284/25) nebyl v době vydání PDPS znám, a proto nemohl být v soupisu prací zahrnutý. Tato změna vznikla z nepředvídaných důvodů. Změně nebylo možné v zadávací dokumentaci předjet ani při vynaložení náležité péče ze strany všech věcně příslušných útvarů odpovědných za zpracování zadávací dokumentace. Změna je tak podle § 5, odst. 1, písm.c) Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (změna č. 2 účinná od 29.5.2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 3.


Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
0,00	121 219,20	121 219,20	121 219,20

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí)	jméno	David Kuttich	datum	25.04.2018	podpis	
Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Dominika Urbanová	datum	26.5.2018	podpis	
Stavební dozor	jméno	Miloslav Pohunek	datum	26.4.2018	podpis	
Supervize	jméno	xxx	datum		podpis	
Zástupce Objednatel:	jméno	Miloslav Pohunek	datum	26.4.2018	podpis	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitel sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel)	jméno	Bc. Zdeněk Dvořák	datum	27.04.2018	podpis	
Zhotovitel	jméno	Pavel Machek	datum	25.04.2018	podpis	
					Číslo paré	

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 1**

Název Stavby: Okružní křižovatka Mariánovice - západ, oplocení	
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	701 / 1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Oplocení	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
635 589,71

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	635 589,71	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	121 219,20	121 219,20	19,07%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	0,00	756 808,91	121 219,20	19,07%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

David Kuttich 25. 04. 2018

Projektant (autorský dozor):

Ing. Dominika Urbanová

Stavební dozor:

Miloslav Pohunek

Zástupce Objednatel:

Miloslav Pohunek

Supervize (RDK)

Zaměstnanec KSÚS SK
odpovědný za cenové
projednání Změny:

JUDr. Luděk Beneš

26. 04. 2018

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 1													
Evidenční číslo a název stavby:				ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)									
Okružní křižovatka Mariánovice - západ, oplocení				701 / 1									
Číslo SO/PS: 701				Skupina Změn: 3									
Název SO/PS: Oplocení													
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílů	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
101	R350 - 99	Montáž pohonu vrat vč. přípojek a revize	kpl	0	2,00	2,00	60 609,60	0,00	0,00	121 219,20	121 219,20	121 219,20	100,00
		Celkem						0,00	0,00	121 219,20	121 219,20	121 219,20	100,00

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: „Okružní křižovátka Mariánovice - západ oplocení“

1	Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH	635 589,71
2=1+18+19	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	756 808,91
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	915 738,78
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	119,07%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%
40=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, odst. (5), písm. b)	0,00%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	121 219,20
7=(5/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	19,07%
8=1*0,2	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 3	190 676,91

9=(32A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	19,07%
10=(36A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,00%
10A=32A+36A	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	121 219,20
11=1*0,4	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 3	317 794,86

12=(37/1)*100	Sledování limitu 15 %	0,00%
13=37	Sledování limitu 149 224 000 Kč	0,00
14=142688000-37		149 224 000,00

40=(19/1)*100						Středování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, odst. (5), písm. b)		0,00%															
						- 1 -			- 2 -			- 3 -					- 4 -					- 5 -	
						Vyhrazená změna (Doměrky)			Záměna položek (Započítávání)			Nepředvídanost					Nezbytnost					Změny de minimis	
SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Procentní vyjádření Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Procentní vyjádření Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny de minimis (15% nebo limit 149 224 000 Kč)	limit 15 %
16	17	18	19=23+26+29+33	20=24+27+30+34+37+39	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	31=(30/1)*100	32=29+30	32A=ABS(29)+30	33	34	35=(34/1)*100	36=33+34	36A=ABS(33)+34	37	38=(37/1)*100
		Okružní křižovatka Mariánovice - západ, oplocení	0,00	121 219,20	121 219,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 219,20	19,07%	121 219,20	121 219,20	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
701	1	Oplocení / el. Pohon vrat	0,00	121 219,20	121 219,20			0,00			0,00	0,00	121 219,20	0,00%	121 219,20	121 219,20			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%</									

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	1
Název a evidenční číslo stavby:	Okružní křižovatka Mariánovice - západ, oplocení
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Oplocení
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	701 / 1

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
Cenové nabídky - elektrický pohon vrat	5	
Zápis z předání staveniště stavby - dohoda s majiteli 4.12.2017	2	
Emailová korespondence účastníků	2	
Žádost o změnu rozsahu díla	1	
Počet listů celkem	10	

Zřízení přívodu pro el. otvírání vrat - Mariánovice

Zemní práce	m.j.	výměra	jedn.cena	cena celkem
provedení kabelových výkopů	bm	25	140,00 Kč	3 500,00 Kč
zřízení kabelového lože	m3	25	114,00 Kč	2 850,00 Kč
zásyp kabelových výkopů	m3	7	589,00 Kč	4 123,00 Kč
zhutnění kabelových výkopů	m2	7	110,00 Kč	770,00 Kč
zplanýrování porostů výkopů	m2	7	98,00 Kč	686,00 Kč
odstr. přebyt. výkopů vč. likvidace a odvozu na skládku s popl. za uložení	soub	1	550,00 Kč	550,00 Kč
doprava materiálu, mechanizace a náhrada cestovného	soub	1	1 400,00 Kč	1 400,00 Kč
Materiál elektro				
materiál elektro - kabel CYKY 5 x 4	m	45	40,00 Kč	1 800,00 Kč
ochranná trubka KOPOFLEX pr.70	m	25	28,00 Kč	700,00 Kč
jistič PL6 - 6A/230V	ks	1	150,00 Kč	150,00 Kč
Pohon FAAC T21	soub	1	27 400,00 Kč	27 400,00 Kč
lišta PVC 40x20 HA	m	15	35,00 Kč	525,00 Kč
materiál montážní	soub	1	600,00 Kč	600,00 Kč
Montáže elektro				
(dva prac. á 8 hod)	hod	20	350,00 Kč	7 000,00 Kč
doprava materiálu + náhrada cestovného	soub	1	650,00 Kč	650,00 Kč
cena bez DPH				52 704,00 Kč

Poznámky :

- 1 - provedení zemních prací (výkop, zahrnutí atd...) bude provedeno objednatелеm
- 2 - pohony (motory včetně příslušenství) vrat bude dodán objednatелеm

Maděra a Šípek, spol. s r.o.

Kluk 116, 290 01 Poděbrady
IČO: 45144664 DIČ: CZ45144664
TEL: 325 800 300 FAX: 325 600 330

(2)

Zřízení přívodu pro el. otvírání vrat - Mariánovice

zadání : prohlídka na místě	m.j.	výměra	jedn.cena	cena celkem
Zemní práce				
provedení kabelových výkopů	bm	25	110,00	2 750,00 Kč
zřízení kabelového lože	m3	25	102,00	2 550,00 Kč
zásyp kab výkopů	m3	7	489,00	3 423,00 Kč
zhuštění kabelových výkopů	m2	7	82,00	574,00 Kč
zplanýrování prostorů výkopů	m2	7	72,00	504,00 Kč
odstranění přebytek výkopů, jejich likvidace vč.odvozu na skládku a vč.poplatku za uložení	soub	1	300,00	300,00 Kč
doprava materiálu, mechanizace a náhrada cestovního	soub	1	500,00	500,00 Kč
Materiál elektro				
materiál elektro - kabel CYKY 5 x 4	m	45	32,00 Kč	1 440,00 Kč
ochranná trubka KOPOFLEX pr.70	m	25	24,00 Kč	600,00 Kč
jistič PL6 - 6A/230V	ks	1	122,00 Kč	122,00 Kč
lišta PVC 40x20 HA	m	15	28,00 Kč	420,00 Kč
pohon FAAC 741	soub.	2	16 300,00 Kč	32 600,00 Kč
materiál montážní	soub	1	400,00 Kč	400,00 Kč
Montáže elektro	hod	16	300,00 Kč	4 800,00 Kč
(dva prac. á 8 hod.)				
doprava materiálu + náhrada cestovního	soub	1	500,00 Kč	500,00 Kč
mezisoučet	soub	1	51 483,00 Kč	
provvozní režie 15% - 51.483,- Kč	soub	1	7 722,00 Kč	7 722,00 Kč
cena bez DPH				59 205,00 Kč

Zhotovitel:

podpis:

jméno: **Vladimír Nerad**

funkce: majitel firmy

datum: 19.3.2018

VLADIMÍR NERAD
ELEKTROSLUŽBY

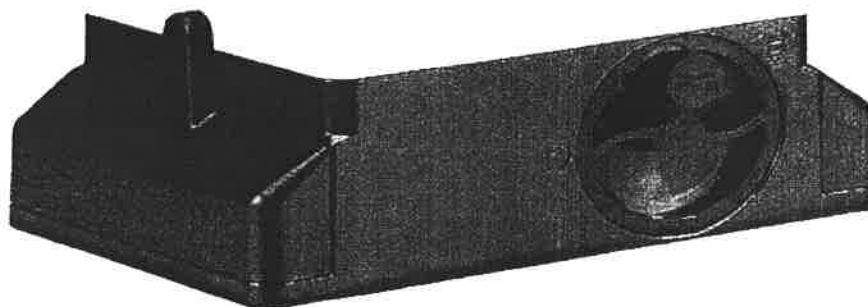
Nová Pražská 1125

256 01 Benešov

IČO: 122 25 361 DIČ: CZ551205919

Pohon 741 kit pro posuvnou bránu do 900 kg FAAC

16.300,- Kč bez DPH / 1 ks



Napájení: 230 V

- Příkon: 500 W
- Proud: 2,2 A
- Tlačná síla: 65 daN
- Otáčky: 1400 ot./min
- Tepelná ochrana motoru: 140 °C
- Převodový poměr: 1:25
- Rychlost brány: 9,6 m/min (pastorek Z16)
- Provozní teplota: - 20 °C až 55 °C
- Třída krytí: IP 44

Sada pohonu pro posuvnou bránu do 900 kg.

Montáž je snadná a rychlá díky předpřipravené kabeláži a vestavěné řídící jednotce, kterou lze jednoduše programovat pomocí displeje. Pohon není reverzní, proto není nutná instalace el. zámku. V případě výpadku proudu lze pohon odblokovat pomocí klíče a bránu lze poté manipulovat manuálně. Pohon má magnetické snímače koncových poloh a elektronickou kontrolu točivého momentu, rozpozná tak překážku a nehrozí přivření.

Sada obsahuje:

- Pohon FAAC 741
- Přijímač RP868
- 1x dálkový ovladač XT2 868 SLH LR
- Výstražný maják FAAC Light
- 2x fotobuňku Safebeam

David Najbrt tel.: +420 775 706 146

Příprava a realizace staveb

TANNACO

TANNACO, a.s.

Choťánky 38

290 01 Poděbrady

Praha 21.3.2018

Nabídka: Zřízení přívodu pro el.otvírání vrat- Mariánovice

Materiál elektro, ochranná trubka, jistič, lišta, montážní mater., vlastní montáž 16h.,
doprava materiálu + cestovní náhrady a režie.

Smluvní cena bez DPH:.....71200,- Kč

Roman Skružný-jednatel

Dne 4.12.2017 v 8:00 hodin se v rámci předání staveniště stavby „OK Mariánovice, západ – oplocení“ uskutečnila schůzka za účasti :

investor Krajská správa a údržba silnic Stř. kraje, p.o. : Miloslav Pohunek, silniční technik,
projektant PRAGOPROJEKT, a.s. : Ing. D.Urbanová, HIP,
zhotovitel TANNACO, a.s. : výrobní ředitel Kamil Mlynář,
majitel nemovitosti č.p. 1176 (č. parc. 2284/26, 2284/59) : Miroslav Barsan, pí Barsanová,
spolumajitelé nemovitosti č.p. 1177 (č. parc. 2284/27, 2284/25) zastoupení pí Zdeňkou
Píchovou, ta v plné moci zast. budoucím nabyvatelem panem Jaroslavem Sobolíkem (mobil
731595774, jarda.sobolik@gmail.com).

Zopakovány byly dosavadní zásady, dohodnuté pověřeným zpracovatelem projektové dokumentace Pragoprojektem a.s. a zpracované do „smlouvy o výpůjčce“ :

- Investor KSÚS SK prostřednictvím zhotovitele TANNACO, a.s. odstraní stávající uliční oplocení a na jeho místě postaví oplocení nové, vč. vrat s elektrickým pohonem, který bude doplněn na základě požadavku majitelů dotčených nemovitostí,
- oplocení bude provedeno podle PDPS z 06/2017 na pozemcích č. parc. 2284/59, 2284/25, 2319/24 a 2284/24,
- po dokončení stavby oplocení si jej majitelé nemovitostí č.p. 1176 a 1177 převezmou do svého vlastnictví.

Z hlediska zásahu do pozemků č. parc. 2284/59 a 2284/25 zhotovitelem TANNACO, a.s. požadují vlastníci pozemků :

- pokusit se opatrně vyzvednout stávající zeleň ze země včetně balu a uložit na určené místo na pozemku,
- prvky stávajícího oplocení (vrata, branka, rámové pletivo, ocelové sloupky apod. – bude ještě specifikováno) použije zhotovitel na provizorní oplocení (pes v obou nemovitostech),
- požadujeme, abychom byli v předstihu alespoň jednoho týdne seznámeni s technologickými postupy výstavby a s časovým harmonogramem stavby,
- na oplocení budou použity betonové bloky štípané, barva pískovec nebo okr,
- vrata a branka – povrchová úprava žárové zinkování, příprava pro domácího vrátného.

Pokud budou dodrženy výše uvedené požadavky, souhlasí majitelé nemovitostí s podpisem smlouvy o výpůjčce a konstatují, že dokončené oplocení si převezmou do svého vlastnictví.

Skončeno, přečteno, podepsáno :

SOBELIK



46

M. Pohunek

URBANIA'

Bavsaan

Мелков

Варшавская

Stredoslovenského kraja,
15. 11. 1944, 14. 12. 1944
1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619,

Od: KSUS / Miloslav Pohunek <miloslav.pohunek@ksus.cz>
Komu: 'Jarda Sobolík' <jarda.sobolik@gmail.com>
Datum: 7.11.2017 8:59
Věc: RE: oplocení
Kopie: "ludek.benes@ksus.cz" <ludek.benes@ksus.cz>

Vážený pane,

Váš požadavek jsme předložili na včerejší schůzce, konané na Pragoprojektu Praha.

Zhruba do týdne bude svolána schůzka za účasti projektanta, investora a zhotovitele, na kterou budete přizván.

Miloslav Pohunek

Silniční technik, dozor a ochrana silniční sítě

KSÚS Středočeského kraje, oblast Benešov

Mobil: 725 880 215

Email: miloslav.pohunek@ksus.cz

From: Jarda Sobolík [jarda.sobolik@gmail.com]

Sent: Monday, November 06, 2017 7:44 AM

To: KSUS / Miloslav Pohunek

Subject: Re: oplocení

Dobrý den

Při pročítání technické dokumentace jsem natrefil na problém s posuvnými vraty. V kapitole s vraty se píše: Posuv vrat je předpokládán ruční. V případě navýšení provozu na komunikaci před domem by bylo vyjíždění a zajiždění životu nebezpečné.

Bylo by dobré toto ještě projednat s tím, kdo bude realizovat stavbu.

Díky

Jaroslav Sobolík

Dne 3. listopadu 2017 12:36 KSUS / Miloslav Pohunek <miloslav.pohunek@ksus.cz> napsal (a):

Dobrý den,

v příloze posílám zápis z dnešního jednání ohledně předání a převzetí staveniště na pozemcích č. parc. 2284/59 a 2284/25 v k.ú. Benešov.

Dále posílám základní dokumenty projektové dokumentace pro provedení stavby (PDPS) z 06/2017, podle které se stavba oplocení bude realizovat.

Paní Píchovou prosím o to, aby mi zaslala plnou moc od neteří, jakmile ji bude mít podepsanou (stačí naskenovat).

Miloslav Pohunek

Silniční technik, dozor a ochrana silniční sítě

KSÚS Středočeského kraje, oblast Benešov

Mobil: 725 880 215

Email: miloslav.pohunek@ksus.cz

From: KSUS / Miloslav Pohunek [mailto:miloslav.pohunek@ksus.cz]
Sent: Thursday, November 02, 2017 3:38 PM
To: 'mlynar@tannaco.cz'; 'kuttich@tannaco.cz'
Cc: 'mbarsan@seznam.cz'; 'pichovazdenka@seznam.cz'; 'jarda.sobolik@gmail.com'
Subject: oplocení

Dobrý den,
na základě předběžné telefonické dohody svoláváme schůzku za účelem předání staveniště akce „Okružní křižovatka Mariánovice – západ, oplocení“.
Schůzka se uskuteční zítra 3.11.2017 v 9:00 hodin na místě stavby před rodinnými domy č.p. 1176 a 1177 v Křížkově ulici v Benešově (vedle areálu ČSAD v Mariánovicích).
Předmětem předání staveniště jsou pozemky č. parc. 2284/25, 2284/59 a 2319/24 v k.ú. Benešov.
Za KSÚS Středočeského kraje, oblast Benešov
Miloslav Pohunek,
silniční technik, dozor a ochrana silniční sítě
Mobil: 725 880 215
Email: miloslav.pohunek@ksus.cz

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

TANNACO, a.s.
se sídlem Choťánky 38,
okres Nymburk,
PSČ 29001
IČO 616 77 272

Věc: „Okružní křižovatka Marianovice – západ, oplocení“

S odvoláním na ust. čl. 6 Práva a povinnosti Objednatele Smlouvy o dílo č. 3219/00066001/2017, odst. 6.6. může Objednatel požadovat změnu rozsahu Díla, a to při respektování povinnosti Objednatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „Zákon o ZVZ“). Zhotovitel je v takovém případě povinen vyhovět požadavku Objednatele a (i) snížit rozsah Díla nebo (ii) bez zbytečného odkladu podat nabídku na zvýšení rozsahu Díla o plnění stejného charakteru jako Dílo sjednané ve smlouvě s tím, že :

- a) při snížení rozsahu se Cena Díla odpovídajícím způsobem sníží,
- b) při zvýšení rozsahu bude Cena Díla v nabídce Zhotovitele stanovena na základě cen uvedených v nabídce v Oceněném soupisu prací,
- c) termín dokončení Díla se ve vhodných případech přiměřeně upraví dohodou smluvních stran,
- d) snížení či zvýšení rozsahu bude upraveno písemným dodatkem Smlouvy, kterým může být i evidenční list změny stavby podepsaný ze strany osob oprávněných jednat za Objednatele a Zhotovitele.

Žádáme o změnu rozsahu díla v souladu s návrhem :

SO 701 Oplocení :

SO 701 Oplocení řeší náhradu stávajícího oplocení nemovitostí č.p. 1176 a č.p. 1177 oplocením novým.

Při předání staveniště byl uplatněn požadavek třetích osob - majitelů nemovitostí č.p. 1176 a č.p. 1177 na doplnění ocelových vrat v oplocení elektrickým pohonem. Majitelé nemovitostí postavili svůj požadavek tak, že se stavbou oplocení souhlasí jen při splnění jejich podmínky.

Tato změna rozsahu Díla tedy vznikla z nepředvidatelných důvodů. Změně nebylo možné v zadávací dokumentaci předejít ani při vynaložení náležité péče ze strany všech věcně příslušných útvarů odpovědných za zpracování zadávací dokumentace. Nové položky jsou podle § 5, odst. 1, písm. c) Směrnice R-Sm-36 (změna č. 2 účinná od 29.5.2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek zařazeny do Skupiny 3.

V Benešově 11.4.2017

Miloslav Pohunek, silniční technik
TSÚ, oblast Benešov

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje
příspěvková organizace
Zborovská 11 150 21 Praha 5
IČO: 616 77 272

Bank. spoj.: 7730161 0100
IČ: 00066001
DIČ: CZ00066001

Telefon: 602577895

E- mail:
kvetuse.zoubkova@ksus.cz

NAŠE ZNAČKA: SDI-Ud-0025-2018
Ing. Urbanová / 226 066 135
VYŘIZUJE: email: urbanova@pragoprojekt.cz
DATUM: 5. 4. 2018

**Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 11
150 21 Praha 5**

Věc: Vyjádření autorského dozoru

Stavba: Okružní křižovatka Mariánovice - západ, oplocení

Na dotaz zástupce zhotovitele pana Najbrta sdělujeme, že na schůzce v rámci předání staveniště, která se konala 4.12. 2017, požadovali vlastníci pozemků, manželé Barsanovi (č.p. 1179, parcela 2284/26 a 2284/59) i v té době budoucí vlastník a dnes vlastník pan Sobolík (č.p. 1177, parcela č. 2284/27 a 2284/25) instalovat vrata s elektrickým pohonem. V době vydání PDPS v 06.2017 tento požadavek nebyl znám, proto nemohl být v soupisu prací zahrnutý.

S pozdravem


Ing. Jan Zapletal
ředitel Ateliéru Praha I

PRAGOPROJEKT, a.s.,
K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
IČ: 452 72 397, zapsán v OR
oddíl B, vložka 1434

Příloha: záznam z předání staveniště ze dne 4. 12. 2017

CO: KSUS SK - Miloslav Pohůnek miloslav.pohunek@ksus.cz
TANNACO, a.s. - Ing. Najbrt najbrt@tannaco.com
