

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: 293/KSÚS/2016
Číslo smlouvy zhotovitele: 841/DCAA/077/16

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

IČ: 00066001

DIČ: CZ00066001

Jednající: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

(dále jen „**Objednatel**“)

na straně jedné

a

STRABAG, a.s.

se sídlem: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

IČ: 60838744

DIČ: CZ60838744

zápis v OR: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 7634

Jednající: Ing. Richard Romolini, Ing. Vladimír Král

osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních: Ing. Richard Romolini na základě plné moci

Ing. Vladimír Král, na základě plné moci

(dále jen „**Zhotovitel**“)

na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním § 2586 a násl., § 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“)

I. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 15.4.2016 smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva o dílo**“) na plnění veřejné zakázky s názvem „**III/11611 Bubovice - Loděnice**“ (dále jen „**Dílo**“).
2. V návaznosti na probíhající stavební práce, byly zjištěny změny spočívající v potřebě snížení výměr u některých položek (dále jen „**Méněpráce**“).
3. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se Smluvní strany dohodly na sjednání změny Smlouvy o dílo, jak je uvedeno níže.
4. Tento Dodatek je změnou Smlouvy o dílo v rozsahu Méněprací.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Článek 8.1. Smlouvy o dílo se nahrazuje následujícím textem:

Smluvní strany se dohodly, že celková cena Díla je stanovena jako neměnná a konečná a činí:

Cena stavby bez DPH	DPH	Celková nabídková cena stavby
(a)	(b)	(c) = (a) + (b)
1 838 656,40 Kč	386 117,84 Kč	2 224 774,24 Kč

2. Oceněný soupis prací s výkazem výměr, který byl Zhotovitelem zpracován a Objednatelům odsouhlasen v souvislosti s uzavřením Smlouvy o dílo, se upravuje o soupis prací s výkazem výměr, který je přílohou č. 1 tohoto Dodatku.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti v den podpisu Dodatku oběma Smluvními stranami.
2. Tento Dodatek je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a Zhotovitel dva (2) stejnopisy.
3. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

Příloha: Plná moc

Přezkoumal:

V Říčanech dne 27.7.2016
Objednatel:

V Praze dne
Zhotovitel:

krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Zborovská 11
100 000 0001
Praha 5
DIČ: CZ00003001

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

STRABAG, a.s.

Ing. Richard Romolini, na základě plné moci
Ing. Vladimír Král, na základě plné moci

STRABAG

STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21, 100 00 Praha 5
(24)

Výtisk č.

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: „III/11611 Bubovice - Loděnice“ - NZ		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: / 1	Číslo změny stavby: 1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Silnice III/11611			
Objednatel:	název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace adresa: Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5 - Smíchov IČ: 00066001	Centrální podatelna  B000356653 Ev. č.: 30860/2016-KSÚS Listy/přil.: 1/0 26.7.2016 - 0:00 0:00 Číslo jednací:	
Zastoupený:	název: adresa: IČ:		
Zhotovitel:	název: STRABAG a.s. adresa: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5 IČ: 60838744		

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: „III/11611 Bubovice - Loděnice“ - NZ	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: /1	Číslo změny stavby: 1																				
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Silnice III/11611																						
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené č. objednatele 293/KSÚS/2016 a č. smlouvy zhotovitele 841/DCAA/077/16 ze dne 12. 4. 2016, resp. 15. 4. 2016 (dále jen Smlouva): Objednatel: KSÚS Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem : Zborovská 11, 150 00 Praha 5 Zhotovitel: STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5																						
Obsah: Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění změn položek - počet listů A4 Přehled změn Rozpis ocenění změn - počet listů A4 Přehled víceprací a méněprací- počet listů A4 Soupis prací - počet listů A4 Pasport změn - počet listů A4 Ostatní přílohy (přehled dokumentů, foto, zápis z tech rady) - počet listů A4	<table border="1" style="margin: auto;"> <tr><td style="width: 50px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; text-align: center;">1</td></tr> <tr><td style="width: 50px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; text-align: center;">1</td></tr> <tr><td style="width: 50px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; text-align: center;">1</td></tr> <tr><td style="width: 50px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; text-align: center;">1</td></tr> <tr><td style="width: 50px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; text-align: center;">1</td></tr> <tr><td style="width: 50px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; text-align: center;">1</td></tr> <tr><td style="width: 50px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; text-align: center;">4</td></tr> </table>		1		1		1		1		1		1		4	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th style="width: 30%;">Paré č.</th> <th style="width: 70%;">Příjemce</th> </tr> <tr> <td>1,2,3</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td>4,5</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> </table>	Paré č.	Příjemce	1,2,3	Objednatel	4,5	Zhotovitel
	1																					
	1																					
	1																					
	1																					
	1																					
	1																					
	4																					
Paré č.	Příjemce																					
1,2,3	Objednatel																					
4,5	Zhotovitel																					
Iniciátor změny: Objednatel Popis a zdůvodnění změny:																						
1.1. Pro stavbu bylo počítáno s realizací bez uzavírky, po projednání s odborem dopravy v Berouně je možno provést opravu živičného krytu silnice za úplné uzavírky. Z tohoto důvodu dodavatel souhlasí s realizací ohrubné vrstvy v celé šíři vozovky. Tímto řešením odpadá provedení středové spáry i možnost jejího ošetření dle zadávacích podmínek. 1.2. Takto navrhované řešení přinese zejména vyšší kvalitu díla a finanční úsporu.																						
Údaje v Kč bez DPH:																						
<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <th style="width: 33%;">Cena navrhovaných Méněprací</th> <th style="width: 33%;">Cena navrhovaných Víceprací</th> <th style="width: 33%;">Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem</th> </tr> <tr> <td>-96 342,80</td> <td>0,00</td> <td>-96 342,80</td> </tr> </table>			Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem	-96 342,80	0,00	-96 342,80														
Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem																				
-96 342,80	0,00	-96 342,80																				
Podpis vyjadřuje souhlas se změnou:																						
KSÚS SK - provozní cestmistr	jméno	Luboš Krejčí																				
		datum <u>1.7.2016</u> podpis																				
KSÚS SK - správní cestmistr	jméno	Milan Kysilka																				
		datum <u>1.7.2016</u> podpis																				
Strabag a. s.	jméno	Ing. Richard Romolini																				
		datum <u>1.7.2016</u> podpis																				
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.																						
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Bc Zdeněk Dvořák																				
		datum <u>1.7.2016</u> podpis																				
Zhotovitel	jméno	Ing. Richard Romolini																				
		datum <u>1.7.2016</u> podpis																				
Zhotovitel	jméno																					
		datum <u>1.7.2016</u> podpis																				
Změna stavby (ZBV) - krycí list		Číslo paré:																				

ZÁPIS**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru pro změnu stavby (ZBV) č.:1**

Název stavby: „III/11611 Bubovice - Loděnice - NZ“	
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): „III/11611 Bubovice - Loděnice - NZ“	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
1 934 999,20

Poznámka: Cenu všech Méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena SO/PS v předchozích změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech Víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	1 934 999,20	0,00

Číslo změny SO/PS: 1

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných Víceprací na SO/PS	Cena všech Víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-96 342,80	0,00	0,00	0,00%

Nová cena SO/PS po této změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-96 342,80	1 838 656,40	-96 342,80	-4,98%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpisZhotovitel Strabag a.s. -
hlavní stavbyvedoucí

souhlasím

Ing. Richard Romolini

KSÚS SK - provozní
cestmistr

souhlasím

Luboš Krejčí

KSÚS SK - správní
cestmistr

souhlasím

Milan Kysilka

Zaměstnanec KSÚS SK
odpovědný za cenové
projednání Změny:

souhlasím

Václav Pavlík

**„III/11611 Bubovice - Loděnice“ - NZ
Silnice III/11611**

Stavba:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Strabag a. s.
od 0,600 – 1,670 km

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

[illegible]

Za zhotovitele :

Ing. Richard Romolini

Za objednatele :

Bc. Zdeněk Dvořák

Datum :

Datum:

PŘEHLED MĚNĚPRACÍ		Počet příloh: 0
Stavba: (název a evidenční číslo stavby)	SO/PS: (číslo a název) SO /1	
„III/11611 Bubovice - Loděnice“ - NZ	Silnice III/11611	
Název změny:	Kategorie *)	
snížení objemu frézování a úpravy pracovní spáry	D	
Seznam víceprací v rámci SO.		
Měněpráce se týkají níže uvedených položek.		
Položky soupisu prací, které změna/úprava ovlivní:		
02022817VD	Frézování spár a prasklin	
02022831VD	Zalévání spár asfaltovou zálivkou	
Cenový dopad změny/úpravy v rámci objektu:	-96 342,80 Kč	z ceny SO
Cenové ovlivnění sousedních objektů		
Bez vlivu. Projekt neobsahuje žádné další SO/PS.		
Poznámky :		

*) kategorie změn

A - změna je ku prospěchu objednatelů (OP čl. 13.2)

B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS

D - změna vyplývá z důlišné úrovně řešení v PDPS a RDS

D - změna, která vyplynula v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření

Stavba:
Objekt:

„III/11611 Bub
silnice III/11611

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Strabag a. s.
od 0,600 – 1,670 km

[illegible]

Za zhotovitele :

Ing. Richard Romolini

Datum:

1.2.2016

Za objednatele:

Bc. Zdeněk Dvořák

Datum:

PASPORT ZMĚNY V PDPS		Počet příloh: 1
Stavba: (název a evidenční číslo stavby) „III/11611 Bubovice - Loděnice“ - NZ	SO/PS: (číslo a název) /1 Silnice III/11611	
Název změny: změna v rozsahu frézování spár a zalévání spár asfaltovou záhlvkou		Kategorie ^{*)} D
Kdo požadoval: (organizace, jméno) Porr a.s., odštěpný závod - Čechy, Dubečská 3238/36, Praha 10- Strašnice 100 00	Změny projednány na technické radě dne / zápis č.j. z technické rady ze dne 29. 6. 2016	
Podrobný technický popis změny/úpravy: Pro stavbu bylo počítáno s realizací bez uzavírky, po projednání s odborem dopravy v Berouně je možno provést opravu živičného krytu silnice za úplné uzavírky. Z tohoto důvodu dodavatel souhlasí s realizací obrusné vrstvy v celé šíři vozovky. Tímto řešením odpadá provedení středové spáry i možnost jejího ošetření dle zadávacích podmínek.		
Zdůvodnění změny/úpravy: Pro zdárné dokončení a bezpečné užívání díla je nutno zajistit obnovu obrusné vrstvy v celém profilu silnice III/11611 vymezené zadáním. Frézování spáry i její ošetření o celkovém rozsahu 1 083 m, bude sníženo o 1 070 m. Cena za úpravu bude dle schváleného rozpočtu. Takto navrhované řešení přinese zejména vyšší kvalitu díla a finanční úsporu.		
Položky soupisu prací, které změna/úprava ovlivní: 02022817VD Frézování spár a prasklin 02022831VD Zalévání spár asfaltovou záhlvkou		
Cenový dopad změny/úpravy v rámci objektu:	vícepráce	- Kč
	méněpráce	-96 342,80 Kč
Cenové ovlivnění sousedních objektů	neovlivní	
Poznámky :		

*) kategorie změn

A - změna je ku prospěchu objednatel (OP čl. 13.2)

B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS

C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitečných parametrů nebo životnosti díla

D - změna, která vyplynula v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření

**Přehled dokladů tvořících součást dokumentace
změny stavby**

Číslo změny stavby:	ZBV – 1
Název a evidenční číslo stavby:	„III/11611 Bubovice – Loděnice“ - NZ
Název stavebního objektu provozního souboru (SO/PS):	Silnice III/11611
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	/1

Doklad	Součást dokumentace ZBV (počet A4)	
	ANO	NE - Uloženo
Krycí list změny	1	
Evidenční list změny stavby	1	
Zápis o projednání	1	
Přehled změn stavby	1	
Rozpis ocenění změn	1	
Přehled víceprací a méněprací	1	
Rozpočet (soupis prací) - změnový	1	
Pasport změny	1	
Fotodokumentace	1	
Rozhodnutí OD Beroun	1	
Zápis z technické rady	1	

„III-11611 Bubovice - Loděnice“ - NZ – ZBV 1

Fotodokumentace



Městský úřad Beroun
Odbor dopravy a správních agend

Datum
15.6.2016

Číslo jednací
MBE/39387/2016/DOPR-KuK

Spisová značka
7180/2016/DOPR

Vytvořeno telefonem
Kubáň /311630224

E-mail
doprava10@muberon.cz

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Beroun, odbor dopravy a správních agend obdržel dne 3.9.2016 **žádost** od STRABAG a.s., IČ: 60838744, Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, v zastoupení ADSUM spol. s r.o., Lidická 7, 273 51 Unhošť, IČ: 45144991, **o povolení, uzavírky a nařízení objížděky silnice III/11611, v k.ú. Bubovice, od výjezdu z obce Bubovice ve směru na obec Loděnice v délce 1070 m, z důvodu opravy povrchu silnice.**

Městský úřad Beroun, odbor dopravy a správních agend, jako silniční správní úřad obce s rozšířenou působností, podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „zákon o pozemních komunikacích“ příslušný rozhodovat ve věcech silnic,

p o v o l u j e

- podle § 24 zákona o pozemních komunikacích a § 39 vyhlášky č.104/1997 Sb., kterou se zákon o pozemních komunikacích provádí, ve znění pozdějších předpisů, **úplnou uzavírku silnice III/11611, v k.ú. Bubovice, od výjezdu z obce Bubovice ve směru na obec Loděnice v délce 1070 m, z důvodu opravy povrchu silnice a nařizuje objížděku, po silnicích III/11610, III/10125, III/11612, za těchto podmínek:**

1. Odpovědný pracovník : Ing. František Císař, stavbyvedoucí STRABAG a.s., tel.606732098.
2. **Práce budou provedeny : v sobotu dne 16.7.2016, od 07.00 hod. do 18.00 hod.**
3. Uzavírka silnice a nařízení objížděka bude provedena v místě podle přiloženého situačního plánu, který je nedílnou součástí rozhodnutí.
4. Délka uzavírky : cca. 1070 metrů.
5. Délka objížděky: cca. 8200 metrů.
6. Trasa objížděky: od uzavřeného úseku silnice III/11611 v Bubovicích, dále po této silnici přes obec do křižovatky se silnicí III/11610, dále vlevo po této silnici do Kozolup, do křižovatky se silnicí III/10125, dále po této silnici do křižovatky se silnicí III/11612, dále vlevo po této silnici do křižovatky se silnicí III/11611 a dále po této silnici k uzavírce.
7. Autobusová doprava: netýká se linkové autobusové dopravy, neboť v sobotu zde nejedí.
8. Při provádění prací nesmí být ohrožena stabilita silničního tělesa, dopravního značení a silniční vegetace majetkového správce silnice - KSÚS Středočeského kraje, p.o.
9. Dopravní opatření : dopravní značení bude v souladu se schváleným stanovením přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, odborem dopravy a správních agend, Městského úřadu Beroun, ze dne 16.6.2016, pod č.j.:MBE/39388/2016/DOPR-MiJ
10. Žadatel zhotovitel je povinen po celou dobu uzavírky silnice zajistit přístup k jednotlivým nemovitostem.
11. Podmínkou povolení této stavby je dokončení stavby dešťové kanalizace a oprava povrchu silnic III/10125 a III/11611 Kozolupech, po kterých je nařízena objížděka.

Adresa úřadu
Husovo náměstí 68
266 43 Beroun-Centrum
Tel. +420 311 654 111
Fax +420 311 621 242

Pracoviště
Polnických věžů 20
266 43 Beroun-Město

e-mail: posta@muberon.cz
IČ: 00233129
www.mesto-beroun.cz

účastníci řízení :

- STRABAG a.s., IČ: 60838744, Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, v zastoupení ADSUM spol. s r.o., Lidická 7, 273 51 Unhošť, IČ: 45144991.
- Krajská správa a údržba silnic Stř. kraje, p. o., Zborovská 11, 150 21 Praha 5, IČ: 00066001.
- Obec Bubovice, Bubovice 27, 267 18 Karlštejn, IČ: 00233161.
- Obec Vysoký Újezd, Vysoký Újezd 113, 267 16 Vysoký Újezd.

O d ů v o d n ě n í

Dne 13.5.2016 podala na Městský úřad Beroun, odbor dopravy a správních agend, právnická osoba STRABAG a.s., IČ: 60838744, Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, v zastoupení ADSUM spol. s r.o., Lidická 7, 273 51 Unhošť, IČ: 45144991, žádost o zahájení řízení a svolání ústního jednání, k projednání úplné uzavírky silnice III/11611, v k.ú. Bubovice, v místě od výjezdu z obce Bubovice ve směru na obec Loděnice v délce 1070 m, z důvodu opravy povrchu silnice, v době od 12.7 do 13.7.2016.

Při jednání kterého se zúčastnili zástupci Strabag a.s., ADSUM s.r.o., KSÚS, obce Bubovice, Krajského úřadu Stř. kraje odboru dopravy, dopravce PROBO BUS a ROPID bylo dojednáno, že **stavba bude provedena v sobotu 16.7.2016 od 07.00 do 18.00 hodin**, kdy zde nejedí autobusová linková doprava, ale za předpokladu, že v Kozolupích bude dokončena stavba dešťové kanalizace v silnici III/10125 a oprava povrchu silnice, včetně opravy křižovatky se silnicí III/11610, neboť po těchto silnicích bude nařízena objížďka.

Po projednání podmínek opravy povrchu silnice III/11610 v k.ú. Bubovice, žadatel dne 3.6.2016 předložil žádost o uzavírku a objížďku silnice III/11611 v k.ú. Bubovice, na sobotu 16.7.2016 v době od 07.00 hod. do 18.00 hod. a dále předložil plnou moc k zastupování, DIO odsouhlasené Policií ČR DI Beroun a situační plán se zakreslením místa uzavírky a objížďky.

Po silnici III/11611 v k.ú. Bubovice, kde je plánována jednodenní oprava jejího povrchu v sobotu 16.7.2016, je ale zároveň vedena objížďná trasa z důvodu uzavírky silnice II/116 v Hostimě, kde HIRST CZ – Inženýrské stavby spol. s r.o., provádí rekonstrukce mostu ev. č. 116-012 která je povolena do 1.10.2016. Vozidla jedoucí po objížďce silnice III/11611 mezi obcemi Bubovice – Loděnice budou muset v sobotu 16.7.2016 jet po objížďce Bubovice – Kozolupy – Lužce – Loděnice, po silnicích III/11610, III/10125, III/11612.

Po vyhodnocení žádosti, doložených podkladů a schválení Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, odborem dopravy a správních agend, Městského úřadu Beroun, ze dne 16.6.2016, pod č.j.: MBE/39388/2016/DOPR-MiJ, rozhodl správní orgán jak je ve výroku rozhodnutí uvedeno.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15-ti dnů od dne jeho oznámení, ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, podáním u Městského úřadu Beroun, odboru dopravy a správních agend, Politických vězňů 20, 266 43 Beroun.

Odvolání proti rozhodnutí o uzavírce a objížďce **n e m á**, podle § 24 odst. 4) zákona o pozemních komunikacích, odkladný účinek.

Za správnost vyhotovení:
Jiří Havel

otisk úředního razítka

Mgr. Miroslav Jerling v.r.
vedoucí odboru dopravy
a správních agend

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, se nevyměřuje.

Obdrží : účastníci řízení :

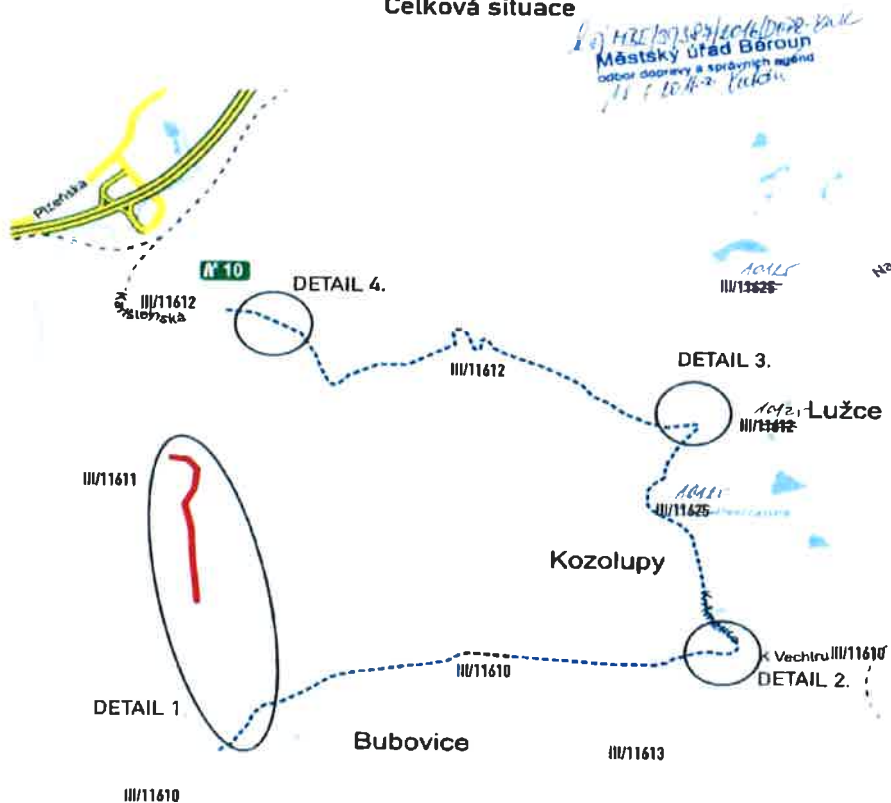
- STRABAG a.s., IČ: 60838744, Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, v zastoupení ADSUM spol. s r.o., Lidická 7, 273 51 Unhošť, IČ: 45144991, .
- Krajská správa a údržba silnic Stř. kraje, p. o., Zborovská 11, 150 21 Praha 5, IČ: 00066001.
- Obec Bubovice, Bubovice 27, 267 18 Karlštejn, IČ: 00233161.
- Obec Vysoký Újezd, Vysoký Újezd 113, 267 16 Vysoký Újezd.

Dotčené orgány:

- Policie ČR, DI Beroun, Tyršova 1635, 266 50 Beroun-Město, IČ: 75151481.

Na vědomí:

- Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Beroun, Pod studánkou 1258, 266 01 Beroun 2, IČ: 70885371.
- JESSENIA a.s., Okružová 1135/44, 155 00 Praha 5, IČ: 26752051, dispečink dopravní zdravotní služby, Profesora Veselého 493, 266 01 Beroun 3.
- Územní středisko záchranné služby Středočeského kraje, Vančurova 1544, 272 01 Kladno, IČ: 75030926, stanoviště Beroun, Profesora Veselého 641, 266 56 Beroun.
- Obec Lužce, Lužce 31, 267 18 Karlštejn, IČ: 00509736.
- HIRST CZ – Inženýrské stavby spol. s r.o., Sochorova 3178/23, Žabovřesky, 616 00 Brno, IČ: 01559621, v zastoupení JMJ Group dopravní značení s.r.o., V Zátíši 284, 273 62 Družec, IČ: 02578921.
- Krajský úřad Středočeského kraje, odbor dopravy, Ing. Josef Bambousek, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, IČ: 70891095.
- PROBO BUS, a.s. Pod Hájem 307, 267 01 Králův Dvůr, IČ: 28170954.
- ROPID, Rytířská 10, 110 00 Praha 1, IČ: 60437359. E-Mail.

Celková situace

Z á p i s

z technické rady na projednání změn v průběhu stavby konané dne 29. 6. 2016 „III/11611 Bubovice - Loděnice“

přítomni :

Luboš Krejčí	-	provozní cestmistr KSÚS
Milan Kysilka	-	správní cestmistr KSÚS
Ing. Richard Romoliny	-	hlavní stavbyvedoucí Strabag a. s.
Ing. František Císař	-	stavbyvedoucí Strabag a. s.

Předmět jednání:

1. Pro stavbu bylo počítáno s realizací bez uzavírky, po projednání s odborem dopravy v Berouně je možno provést opravu živičného krytu silnice za úplné uzavírky – rozhodnutí číslo jednací MBE/39387/2016/DOPR-KuK ze dne 15. 6. 2016. Z tohoto důvodu dodavatel souhlasí s realizací obrusné vrstvy v celé šíři vozovky. Tímto řešením odpadá provedení středové spáry i její ošetření dle zadávacích podmínek.

Navrhované opatření :

Pro zdárné dokončení a bezpečné užívání díla je nutno zajistit obnovu obrusné vrstvy v celém profilu silnice III/11611 vymezené zadáním. Frézování spáry i její ošetření o celkovém rozsahu 1 083 m, bude sníženo o 1 070 m. Takto navrhované řešení přinese zejména vyšší kvalitu díla a finanční úsporu. Cena za úpravu bude dle schváleného rozpočtu.

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, (59)
příspěvková organizace
Žitovská 11 150 21 Praha 5
IČO: 00565001 DIČ: CZ00655001

