

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

**III/10163 Horoušany (SO 1),
III/10164 Horoušany (SO 2)**

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

III/10164 Horoušany (SO 2)Číslo SO/PS /
/ číslo Změny SO/PS:**SO 2 / 1**

Číslo ZBV:

2

Objednatel: **Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001

Zhotovitel:

Skanska a.s.

se sídlem: Křižikova 682/34a, 186 00 Praha 8 - Karlín
IČ: 26271303

Rekapitulace ZBV č. 2 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.3	-225 792,00	48 898,92	-176 893,08

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1	-225 792,00	48 898,92	-176 893,08

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré:

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: III/10163 Horoušany (SO 1), III/10164 Horoušany (SO 2) Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): III/10164 Horoušany (SO 2)	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS. SO 2 / 1	Číslo ZBV: 2
---	--	----------------------------

Strany smlouvy o dílo č. 2951/00066001/2018 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 31.10.2018 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: Skanska a.s. Křížkova 682/34a, 186 00 Praha 8 - Karlín

<u>Přílohy Změnového listu:</u> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>1. Krycí list</td><td style="text-align: center;">1</td><td style="text-align: right;">počet listů</td></tr> <tr><td>2. Změnový list</td><td style="text-align: center;">1</td><td style="text-align: right;">počet listů</td></tr> <tr><td>3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací</td><td style="text-align: center;">1</td><td style="text-align: right;">počet listů</td></tr> <tr><td>4. Rozpis ocenění Změn položek</td><td style="text-align: center;">1</td><td style="text-align: right;">počet listů</td></tr> <tr><td>5. Přehled zařazení změn do skupin</td><td style="text-align: center;">1</td><td style="text-align: right;">počet listů</td></tr> <tr><td>6. Přehled dalších dokladů</td><td style="text-align: center;">1</td><td style="text-align: right;">počet listů</td></tr> <tr><td>Ostatní doklady dle přehledu dokladů</td><td style="text-align: center;">6</td><td style="text-align: right;">počet listů</td></tr> </table>	1. Krycí list	1	počet listů	2. Změnový list	1	počet listů	3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů	4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů	5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů	6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů	Ostatní doklady dle přehledu dokladů	6	počet listů	Paré č. <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="text-align: center;">1,2</td><td>Objednatel</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">3</td><td>Zhotovitel</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">4</td><td>TDI</td></tr> </table>	1,2	Objednatel	3	Zhotovitel	4	TDI
1. Krycí list	1	počet listů																										
2. Změnový list	1	počet listů																										
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů																										
4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů																										
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů																										
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů																										
Ostatní doklady dle přehledu dokladů	6	počet listů																										
1,2	Objednatel																											
3	Zhotovitel																											
4	TDI																											

Iniciátor změny, Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Na základě nově zjištěných skutečností dochází k následujícím změnám:

Z důvodu pokládky obrusné vrstvy na celou šíři komunikace odpadlo provedení středové zálivky. Zálivka byla provedena pouze na napojení stávajících povrchů, místních komunikací a na pracovních spojích.

Dále bylo nutné zrekonstruovat 3 uliční vpusti z důvodu degradace. Nevyhovující stav uličních vpustí byl zjištěn až po odfrézování původních obrusných vrstev silnice.

Pro Objednatele se jedná o nepředvídatelné důvody v době vypsání soutěže.

Obsahem ZBV jsou změny kladné i záporné.

Jedná se o Změnu nepodstatnou, nepředvídanou, která je tak podle § 5, odst. 1, písm.c) Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29.5.2017) upřesňující provádění změn závazku dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do **Skupiny 3**. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná o změnu nepředvídanou.

Údaje v Kč bez DPH.

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-225 792,00	48 898,92	-176 893,08	274 690,92

Zhotovitel (stavbyvedoucí)	jméno	Lukáš Merenus	datum	podpis
Projektant (autorský dozor)	jméno	xxx	datum	podpis
Technický dozor investora	jméno	Karel Sulek	datum	podpis
Supervize	jméno	xxx	datum	podpis
Zástupce Objednatele:	jméno	Karel Sulek	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	Míchal Pfaf Ing. Jan Lintner	datum	podpis
				Číslo paré:

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 2

Název Stavby: III/10163 Horoušany (SO 1), III/10164 Horoušany (SO 2)	
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	SO 2 / 1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): III/10164 Horoušany (SO 2)	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
9 943 160,00

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	9 943 160,00	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-225 792,00	48 898,92	48 898,92	0,49%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-225 792,00	9 766 266,92	-176 893,08	-1,78%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): Lukáš Merenus

Projektant (autorský dozor): xxx

Stavební dozor: Karel Sulek

Zástupce Objednatele: Karel Sulek

Zaměstnanec KSÚS SK
odpovědný za cenové
projednání Změny: Petr Heinrich

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 2													
Evidenční číslo a název stavby: III/10163 Horoušany (SO 1), III/10164 Horoušany (SO 2)								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: III/10164 Horoušany (SO 2) Číslo a název rozpočtu: III/10164 Horoušany (SO 2)													
č. 1													
Skupina Změn: 3													
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6		zalévání spár asfaltovou zálivkou	bm	2512	208	-2304	98,00	246 176,00	-225 792,00	0,00	20 384,00	-225 792,00	-91,72%
NOVÉ POLOŽKY													
14	358315114	Bourání šachty kompletní z prostého betonu	m3	0,00	9,00	9,00	3 090,00	0,00	0,00	27 810,00	27 810,00	27 810,00	100,00%
15	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,00	18,00	18,00	215,00	0,00	0,00	3 870,00	3 870,00	3 870,00	100,00%
16	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku do 20km	t	0,00	360,00	360,00	7,80	0,00	0,00	2 808,00	2 808,00	2 808,00	100,00%
17	997013801	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu betonového	t	0,00	18,00	18,00	125,00	0,00	0,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	100,00%
18	311113151	Šachtová zeď z hladkých tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30	m2	0,00	4,00	4,00	698,00	0,00	0,00	2 792,00	2 792,00	2 792,00	100,00%
19	919535556	Obetonování šachty betonem tř. C 25/30	m3	0,00	1,20	1,20	3 819,10	0,00	0,00	4 582,92	4 582,92	4 582,92	100,00%
20	13021105	tyč ocelová kruhová jakost 10 216.0 výztuž do betonu D 8mm	t	0,00	0,02	0,02	21 200,00	0,00	0,00	424,00	424,00	424,00	100,00%
21	566901124	Vyspravení podkladu stěrkořtí tl.250mm 4x5m2	m2	0,00	20,00	20,00	218,10	0,00	0,00	4 362,00	4 362,00	4 362,00	100,00%
Celkem								246 176,00	-225 792,00	48 898,92	69 282,92	-176 893,08	-71,86%

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

Datum:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: III/10163 Horoušany (SO 1), III/10164 Horoušany (SO 2)

1	Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	15 057 281,00
2=1+18+19	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	14 741 325,92
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) vč. DPH	17 837 004,36
3=(2/1)*100	Procento změny Přijáté smluvní částky	97,90%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%
40=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, odst. (5), písm. b)	-2,42%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	-315 955,08
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	-2,10%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	4 517 184,30

9=(32A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	2,75%
10=(36A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,00%
10A=32A+36A	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	413 752,92
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	7 528 640,50

12=(37/1)*100	Sledování limitu 15 %	0,00%
13=37	Sledování limitu 149 224 000 Kč	0,00
14=149224000-37		149 224 000,00

		- 1 -		- 2 -			- 3 -					- 4 -					- 5 -						
		Vyhrazené změny (Doměrky) dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)		Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nepředvidané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)					Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)					Změny de minimis (Změny neměnicí celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.))						
SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Procentní vyjádření Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Procentní vyjádření Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny de minimis (15% nebo limit 149 224 000 Kč)	limit 15 %
16	17	18	19=23+26+29+33	20=24+27+30+34+37+39	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	31=(30/1)*100	32=29+30	32A=ABS(29)+30	33	34	35=(34/1)*100	36=33+34	36A=ABS(33)+34	37	38=(37/1)*100
		III/10163 Horoušany (SO 1), III/10164 Horoušany (SO 2)	- 364 854,00	48 898,92	- 315 955,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 364 854,00	48 898,92	0,32%	-315 955,08	413 752,92	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1	1	III/10163 Horoušany (SO 1) / neprovedení zalití spar asf. zálivkou	- 139 062,00	0,00	- 139 062,00			0,00			0,00	- 139 062,00	0,00	0,00%	-139 062,00	139 062,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
2	2	III/10164 Horoušany (SO 2) / neprovedení zalití spar asf. zálivkou, výstavba 3 ul. vpustí	- 225 792,00	48 898,92	- 176 893,08			0,00			0,00	- 225 792,00	48 898,92	0,32%	-176 893,08	274 690,92			0,00%	0,00	0,00		0,00%

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	2
Název a evidenční číslo stavby:	III/10163 Horoušany (SO 1), III/10164 Horoušany (SO 2)
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	III/10164 Horoušany (SO 2)
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	SO 2 / 1

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
07 Změnový soupis prací pro ZBV	1	
08 Kopie zápisu ze stavebního deníku	1	
09 Žádost zhotovitele o změnu rozsahu díla - Oznámení zjištěných odlišností oproti zadávací PD a žádost o Pokyn	1	
10 Žádost objednatele o provedení změny	1	
Přafa	2	
Počet listů celkem	6	

ZMĚNOVÝ SOUPIS PRACÍ

Stavba: III/10163 Horoušany (SO 1), III/10164 Horoušany (SO 2)

Objekt: III/10164 Horoušany (SO 2)

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:

SO 2 / 1

Objednatel: KSÚS

Zhotovitel: Skanska a.s.

Místo: III/10163 Horoušany

Zpracoval:

Datum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

9 766 266,92

2 Vozovky

9 345 768,00

1		velkoploš. vyrovnávka 75 kg/m2 vč.spoj.postřiku	t	1 286,000	2 025,00	2 604 150,00
2		velkoploš. Oprava ACO11 5 cm vč.spoj.postřiku	m2	17 140,000	276,00	4 730 640,00
3		frézování ploch do hloubky 6 cm	m2	17 140,000	92,00	1 576 880,00
4		dopravné do 9 km - vyfrézovaný asf.kryt	m3	1 029,000	162,00	166 698,00
5		čištění metením strojně samosběr. vč skládk.	m2	17 140,000	3,00	51 420,00
6		zalévání spár asfaltovou záplvkou	bm	208,000	98,00	20 384,00
7		VDZ plošné s balotinou-zřízení	m2	48,000	111,00	5 328,00
8		VDZ - čáry 12 cm s balotinou - zřízení	bm	4 968,000	13,50	67 068,00
9		krajnice nezp. - seřezávání s naložením	m2	1 400,000	43,00	60 200,00
10		dopravné vč.skládkovného	m3	140,000	450,00	63 000,00
11		krajnice nezp.-zřízení	m2	1 400,000	93,00	130 200,00
12		výšková úprava vpustí, poklopu a uzávěru	ks	38,000	2 800,00	106 400,00
13		DIO	kpl	1,000	135 000,00	135 000,00

Nové položky

Jednotkové ceny nových položek vycházejí z cenové databáze ÚRS 2018-2

14	358315114	Bourání šachty kompletní z prostého betonu	m3	9,000	3 090,00	27 810,00
15	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	18,000	215,00	3 870,00
16	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku do 20km	t	360,000	7,80	2 808,00
17	997013801	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového	t	18,000	125,00	2 250,00
18	311113151	Šachtová zeď z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30	m2	4,000	698,00	2 792,00
19	919535556	Obetonování šachty betonem tř. C 25/30	m3	1,700	3 819,10	4 582,92
20	13021105	tyč ocelová kruhová jakost 10 216,0 výztuž do betonu D 8mm	t	0,020	21 200,00	424,00
21	566901134	Vyspravení podkladu stěrkodrtí tl.250mm 4x5m2	m2	20,000	218,10	4 362,00

Celkem bez DPH




9 766 266,92

Celkem s DPH

11 817 182,97

DENNÍ ZÁZNAMY

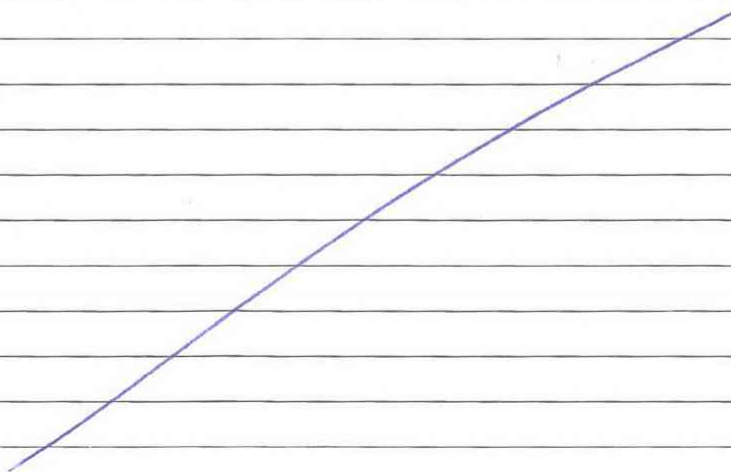

Číslo deníku: 1
Série _____ č. listu * 005869

Datum zápisu	Text zápisu (včetně jmen a podpisů odpovědných osob)
14.3.79	<p>- ZÁSTUPCE KSÚS POŽADUJE REKONSTRUKCI 3 ULIČNÍCH VPUSTÍ PŘED Č.P. 77 A MEZI 7480-472 Z DŮVODU KOMPLETNÍ DEVAŠIACE. TTTO PRÁČEK NEJSOU SOUČÁSTÍ SOD A BUĎOU POVAŽOVÁNY ZA VÍCEPRÁČEK. DE NA SE ZÁSTUPCEM KSÚS BYLO DOHODNUTO ŽE NA TTTO VÍCEPRÁČEK BUĎE VYHOTOVENO ZBV. 2xTH2 16⁰⁰ KONČE PRÁČÍ</p>
	
	<p>КОНС ДОИКАТЪ СЪ СМЪРНЪ В ДОКЛАДЪ ПЪА ТЪ. С ПЪАВОН, БЪЛЕН ТЪИ КЪМЪ УЛИЧЕНЪ КЪМЪТИ (ПЪСТЪВЕНЪ ПЪАЧЕТЪ) КЪЗ. ДЪАДИС УМОТЪИТЕБЪ. КЪМЪ ТЪЕАЪИТЕ ПЪЕДЕОПЪНЪ СОВ А ТЪЕАЪИПЪНЪ ВЪ ПЪАВОНЪМЪ ПЪАБЕНЪ ПЪЕ СО). ДЪА КЪМЪТИ</p>
	<p>SKANSKA</p> 
	

DENNÍ ZÁZNAMY

Číslo deníku: 1

Série _____ č. listu * 005873

Datum zápisu	Text zápisu (včetně jmen a podpisů odpovědných osob)
27.3.19	SO 02
	POČASI: POLOJASNO 4°C 9°C
	STROJE: KIN 1303+i, 4800-7, HAMM HD90
	DV90, HD 12, KAKL. CAT, VISR.
	DESKA, BOČNACÍ KLADIVO
	2xTHZ x 15 x D'
	7 ⁰⁰ PROVEDEN S10J. POSŘÍK NA III ET
	(OD SĚVERNĚHO DVORU - BUS. HODOUSANY)
	- ZAŘÍZENÍ A VYSOUKÁNÍ PRAC. SPÁKŮ
	8 ⁰⁰ POKLADKA ACO77+ x MUTNĚNÍ
	VÁLCEI - III ETAPA
	- VITČENÍ RŠ. KANALIZACE GEOSTEM
	GPK
	- VÝŠKOVÁ ÚPRAVA RŠ. KANALIZACE
	KIRMOU NÄDLER SILNICKÉ TECHNOLO-
	G15
	14 ⁰⁰ KONEC POKLADKY
	- SÍŤOVÁNÍ SÍROJŮ
	- ÚKLID STAVENIŠŤ
	16 ⁰⁰ KONEC PRACÍ
	
	SKANSKA
	

2. Дневных книг технологии работы выполнены в соответствии с требованиями, указанными в проекте, комплексе, при этом в проекте, технологии и проектах указаны детали (референты) работы на асфальтобетонном заливке. При этом проектом предусмотрено, что работы по асфальтобетону выполняются в соответствии с проектом.

Ja km

SKANSKA

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
Ing. Sulek
Zborovská 81/11
Praha 5

Divize Inženýrské stavitelství
Středisko asfaltové technologie

Vyřizuje: Ing. Jan Lintner

Telefon: [REDACTED]

Datum: 4.4.2019

Věc: Akce III/10163 Horoušany (SO1) a III/10164 Horoušany (SO2) – Oznámení zjištěných odlišností
oproti zadávací PD se žádostí Objednateli o pokyn ke způsobu pokračování prací

Na základě skutečností zjištěných v průběhu stavby :

1. Z důvodu změny technologie pokládky obrusné vrstvy, (pokládka na celou šíři vozovky) se neprováděla asfaltová záливka ve středu vozovky. Asfaltová záливka byla provedena pouze na začátku a konci vozovky a na napojení s místními komunikacemi - méněpráce
2. Z důvodu celkové devastace, vyvolaná nutnost rekonstrukce tří kusů uličních vpustí (dešťových šachet) - vícepráce

Vás žádáme o pokyn ke způsobu pokračování stavebních prací na SO 02 -- silnice III/10164 Horoušany.

S pozdravem

[REDACTED]
Ing. Jan Lintner

Vedoucí střediska

Středisko asfaltové technologie

SKANSKA Skanska a.s.
Křížkova 682/34a
186 00 Praha 8 - Karlín
IČO: 26271303
00217 DIČ: CZ699004845



TOP
ODPOVĚDNÁ
FIRMA
ČAS FIRM
01/2019

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

SKANSKA a.s.
Křížikova 682/34a
186 00 Praha 8 Karlín

Vás dopis značky / ze dne

Název značky
2052/19/KSUS/MHT/SUL

Vyřizuje/telefon
Sulek/

Praha
4.4.2019

Věc : „III/10163 Horoušany, III/10164 Horoušany“ – Pokyn (ZBV č. 2)

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, jako správce komunikací a zároveň zástupce Středočeského kraje - vlastníka nemovitostí, tj. i předmětných komunikací č. III/10163 a III/10164 Vám tímto v souladu s článkem 6.6 smlouvy o dílo č. 2951/00066001/2018 vydává pokyn spočívající v zajištění technického řešení a pokračování ve výše zmíněné akci při zpracování změn během výstavby na stavebním objektu:


SO 2 (silnice č. III/10164)

1. Z důvodu změny technologie pokládky obrusné vrstvy (původně plánována pro každou polovinu komunikace zvlášť, nakonec provedeno v celé šíři) odpadá nutnost provedení záložky středové spáry. Zalaty tedy budou pouze spáry pracovní a veškerá napojení jak na stávající povrchy, tak i na místní komunikace.

2. Z důvodu degradace tří kusů uličních vpustí (dešťových šachet), která byla zjištěna po odfrézování stávajících obrusných vrstev bez, možnosti standardní výškové úpravy samotných roštů, je nutné přistoupit k jejich celkové rekonstrukci.

Rozsah změn během výstavby bude stanoven na základě skutečného zaměření stavby a rozdílového výkazu výměr, přičemž změny týkající se věcí ekonomických tj. finančního zajištění stavby musí být nejprve posouzeny příslušným oddělením objednatele.

S pozdravem


Lenka Chmelová
vedoucí TSÚ – oblast Mnichovo Hradiště

PLNÁ MOC

PM/6574/2018

Skanska a.s., IČ: 262 71 303, sídlem Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15904, zastoupená prokuristou Ing. Alešem Krupkou, tímto

z m o c ň u j e

zaměstnance společnosti Skanska a.s.

Michala Pfafa,

bytem: [redacted]
rodné číslo: [redacted]
funkce: ředitel závodu

a

Ing. Jana Lintnera,

bytem: [redacted]
rodné číslo: [redacted]
funkce: vedoucí střediska

- a) aby společně jednali jménem společnosti Skanska a.s. ve všech zadávacích řízeních podle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), jakož i v zadávacích řízeních mimo režim ZZVZ, a činili veškerá právní jednání s tím související, zejména aby jejím jménem podávali a podepisovali žádosti o účast a nabídky s nabídkovou cenou do výše 100 mil. Kč (bez DPH) v každém jednotlivém případě, podávali námítky a návrhy na přezkoumání úkonů zadavatele. V souvislosti s účastí společnosti Skanska a.s. v zadávacích řízeních jsou jmenovaní rovněž oprávněni k uzavření smlouvy o dílo se zadavatelem v případě výběru nabídky společnosti Skanska a.s. jako nejvhodnější a rovněž k uzavírání smluv o dílo, jakož i dalších typů smluv se subdodavateli směřujících ke splnění závazků společnosti Skanska a.s. souvisejících s příslušnou veřejnou zakázkou, a dále
- b) aby společně jednali jménem společnosti Skanska a.s. v zadávacích řízeních podle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jakož i v zadávacích řízeních mimo režim ZZVZ, s uchazečem, který má zájem zúčastnit se jako dodavatel zadávacího řízení na veřejnou zakázku, o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí, jejímž obsahem bude závazek společnosti Skanska a.s. podílet se na plnění veřejné zakázky a/nebo prokázání části chybějící kvalifikace podle ZZVZ s nabídkovou cenou do výše 100 mil. Kč (bez DPH) a v případě výběru nabídky uchazeče ve veřejné zakázce jako nejvýhodnější jsou uvedené osoby oprávněny za společnost Skanska a.s. uzavřít s uchazečem i realizační smlouvu o dílo a rovněž k uzavírání smluv o dílo, jakož i dalších typů smluv se subdodavateli směřujících ke splnění závazků společnosti Skanska a.s. souvisejících s příslušnou veřejnou zakázkou.

Platnost této plné moci je do 31.12.2019.

V Olomouci dne 20. 12. 2018

[redacted]
Ing. Aleš Krupka - prokurista

Plnou moc přijímám: 21. 12. 2018

[redacted]
Michal Pfaf ředitel závodu

[redacted]
Ing. Jan Lintner, vedoucí střediska

Ověření - legalizace

Běžné číslo ověřovací knihy : O II 72 /2018

Ověřuji, že pan Aleš Krupka, datum narození [REDAKCE], s trvalým pobytem a bydlištěm [REDAKCE] jehož totožnost byla prokázána, tuto listinu přede mnou vlastnoručně podepsal.

V Olomouci dne 20. 12. 2018



[REDAKCE]
HANA DUDÍKOVÁ
notářská tajemnice
pověřená Mgr. Lucif Holubovou
notářkou v Olomouci
